DISMET

Villavicencio Octubre 10 de 2024

Señores
ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA
BASE NAVAL ARC MALAGA
ATN. S2LAA CAICEDO GARCIA JORGE ALEJANDRO
Ciudad

Solicitud de prórroga No.2 al contrato No. 042-ARC-CBNL02-2024

Respetados señores;

En atención al contrato de la referencia y de acuerdo a lo conversado con el señor supervisor **S2LAA CAICEDO GARCIA JORGE ALEJANDRO**, solicitamos muy respetuosamente una prórroga No.2 al contrato por un término de tiempo de veinte (20) días calendario a partir del día 26 de octubre y hasta el día 14 de noviembre de 2024.

La presente solicitud la realizó con base a la relación de cantidades ajustadas a entregar en correspondiente a los ITEMS 36 Y 37 (Pupitre y Mesa para primera etapa de preescolar) por parte del Colegio Naval las cuales fueron suministradas solo hasta el 22 de septiembre de 2024 ya que faltaba definir las cantidades por parte del Colegio Naval, y faltaban definir especificaciones técnicas de estos ítems, las cuales ya quedaron aclaradas con el señor supervisor, por lo que fue necesario ajustar nuestros tiempos y nuestra logística de producción, ya que sin esta información no nos era posible iniciar el proceso de fabricación de estos ítems.

Así mismo es el caso de los colchones correspondientes al item 9 , los cuales deben cumplir con todas las especificaciones técnicas y la norma técnica NTMD-0081-A6, por lo que deben ir con forros con líneas de color azul y blanco y el escudo estampado de la Armada Nacional de Colombia , es decir no son elementos de características técnicas uniformes sino que deben cumplir con una normatividad técnica especifica, cantidad que solo pudo ser corroborada una vez nos fueron suministradas el total de las cantidades, ya que para nosotros era indispensable la cantidad total de colchones a fabricar por lo que nuestros proveedores nos informan que las telas para los forros están un poco mas demoradas de lo previsto ya que estas deben de tener el estampado de la Armada y cumplir con la normativa técnica.

Respecto de la fabricación del mobiliario, este se encuentra en proceso de fabricación , elementos tales como los escritorios y puestos de trabajo, las cajoneras, los archivadores, las sillas universitarias , los pupitres para preescolar, las diferentes sillas de oficina.

Los elementos y enseres varios como las mesas plegables, las sillas plásticas, la sala en rattam, , los sofas serán recogidos en la ciudad de Bogotá para transportarse junto con el mobiliario fabricado por nosotros hasta la ciudad de Buenaventura y a Bahía Málaga y sus diferentes unidades navales

Por lo anteriormente expuesto solicitamos muy respetuosamente a esta supervisión y a la Armada Nacional Base Bahía Málaga nos sea concedida esta prorroga en tiempo desde el día

veintiséis (26) de octubre y hasta el día catorce (14) de noviembre de 2024, fecha en la cual se estará entregando e instalando la totalidad del mobiliario.

De ser posible y la producción esta antes de las fechas señaladas se estará entregando el mobiliario previa coordinación con el señor Supervisor del contrato.

Agradeciendo la colaboración brindada a la presente solicitud quedando en gentil deferencia.

Cordialmente,

EDGAR ARIZA VIRVIESCAS
C.C. 13.953.585 de Vélez-Santander
Contratista

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AJUSTADO EJECUCIÓN CONTRATO


ACTIVIDADES	FECHA
FABRICACIÓN EN PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ACUERDO AL AJUSTE EN CANTIDADES (22 SEPTIEMBRE)	23 SEPTIEMBRE AL 25 OCTUBRE
PROCESO DE LAVADO Y TERMINADOS	08 AL 20 OCTUBRE
PROCESO DE PINTURA	10 AL 25 OCTUBRE
PROCESO DE ENSAMBLE Y TERMINADO	26 AL 30 OCTUBRE
PROCESO DE EMPAQUE Y EMBALAJE	31 OCT AL 05 NOVIEMBRE
DESPACHO Y TRANSPORTE FUERZAS NAVALES	06 AL 07 NOVIEMBRE
INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS	08 AL 14 NOVIEMBRE


Adjunto imágenes de producción:


DisMET

SUPERFICIES ESCRITORIOS



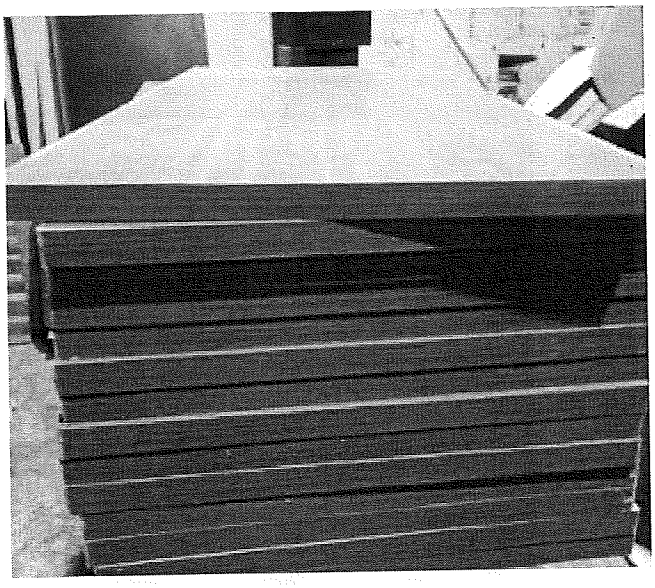


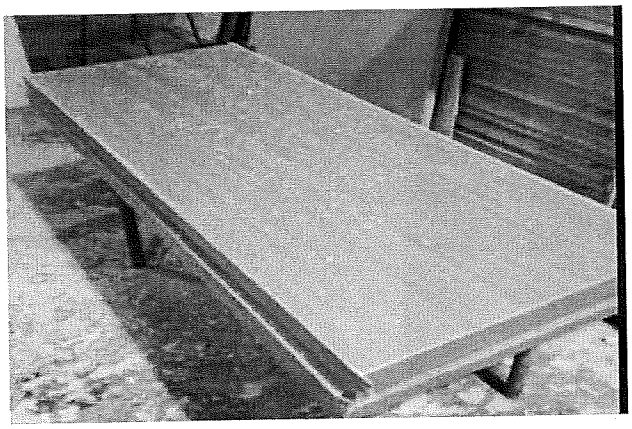

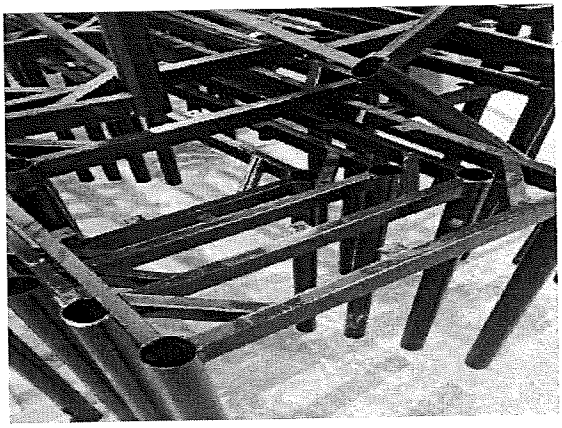

SILLAS UNIVERSITARIAS



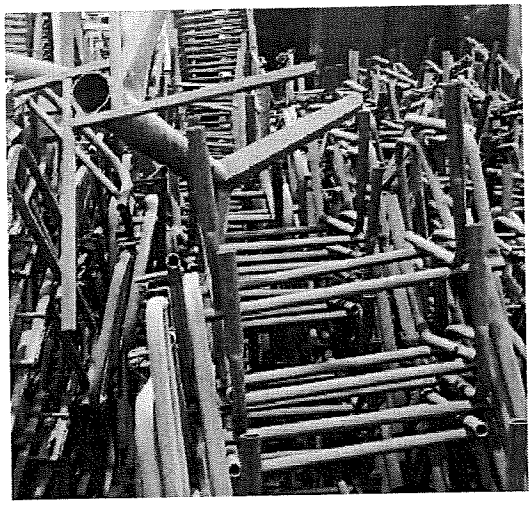

Finca las Palmitas Vereda Barcelona entrando vía Puerto López


301 634 9734

contratación.dismet@hotmail.com


Villavicencio-Meta


DisMET



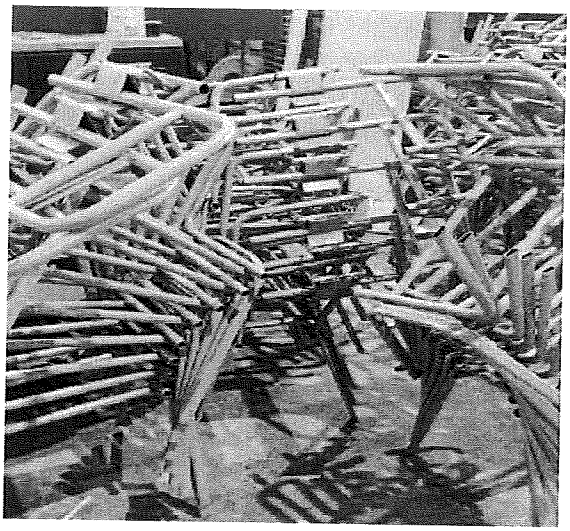

PUPITRES PREESCOLAR

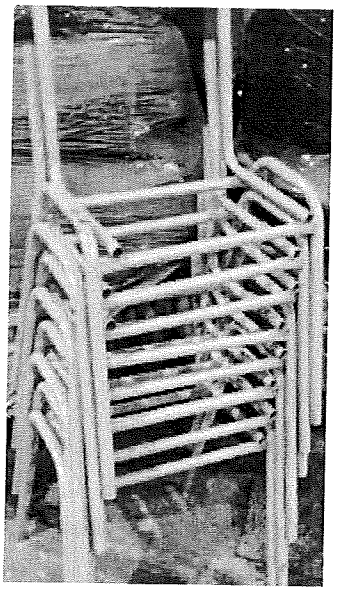


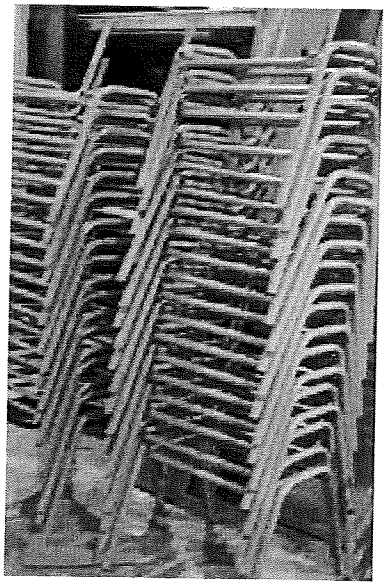

Finca las Palmitas Vereda Barcelona entrando vía Puerto López
301 634 9734
contratación.dismet@hotmail.com
Villavicencio-Meta

DisMET



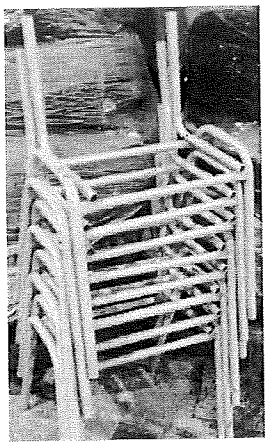


SILLAS DE OFICINA








LOCKERS

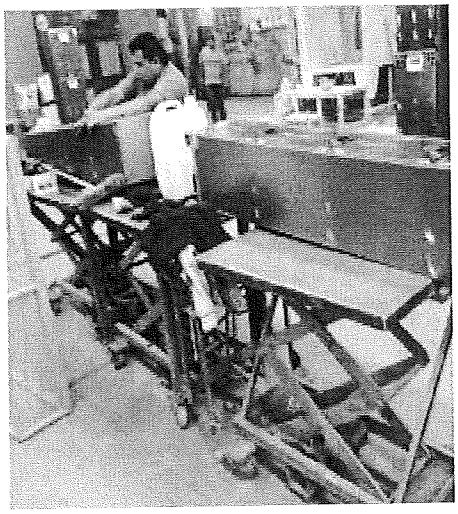

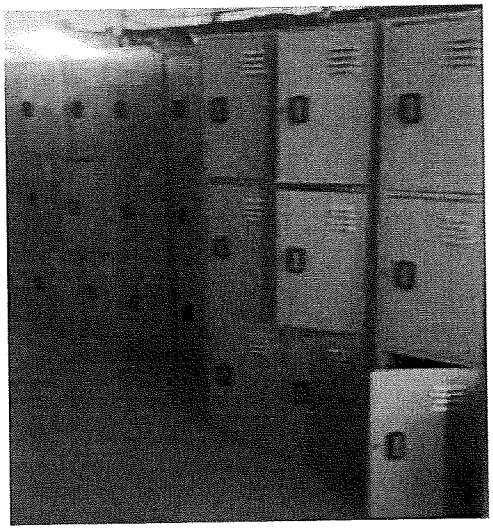

Finca las Palmitas Vereda Barcelona entrando vía Puerto López

301 634 9734

contratación.dismet@hotmail.com

Villavicencio-Meta
