
CONSORCIO OPREC CONSULTORES

Proceso de Contratación IPSE-SPE-CM-001-2020

ESTRUCTURACION DE PROYECTOS POR ZONAS

Id	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**Total ejecución Consultoría Región Pacífico**	**176 días**	**lun 8/06/20**	**mar 1/12/20**	
2		**Firma acta de inicio**	0 días	lun 8/06/20	lun 8/06/20	
3		**FASE I**	**40 días**	**lun 15/06/20**	**sáb 25/07/20**	
4		**Primer pago (15%)**	**26 días**	**lun 15/06/20**	**sáb 11/07/20**	
5		Presentación del equipo de trabajo ante la subdirección del IPSE	1 día	lun 15/06/20	mar 16/06/20	2FC+7 días
6		Evidencias de las reuniones previas con las entidades territoriales, operadores de red o prestadores del servicio correspondiente	15 días	mar 16/06/20	mié 1/07/20	5
7		**Visita inicial a las zonas de los proyectos de estructuración**	**20 días**	**mar 16/06/20**	**lun 6/07/20**	**5**
8		Departamento Choco	5 días	mar 16/06/20	dom 21/06/20	5
9		Departamento Cauca	5 días	dom 21/06/20	vie 26/06/20	8
10		Departamento Valle del Cauca	5 días	vie 26/06/20	mié 1/07/20	9
11		Departamento Nariño	5 días	mié 1/07/20	lun 6/07/20	10
12		**Análisis de información del avance de actividades, con el Respectivo análisis en Project con curva S**	**25 días**	**mar 16/06/20**	**sáb 11/07/20**	
13		Análisis de Información por el equipo de profesionales	10 días	mar 16/06/20	vie 26/06/20	5
14		Documento contentivo del estudio de la situación economica de los departamentos que conforman la region objeto del contrato	15 días	mar 16/06/20	mié 1/07/20	5
15		Documento contentivo de la evaluación técnica, energética y ambiental de los posibles usuarios	15 días	mar 16/06/20	mié 1/07/20	5
16		Documento contentivo de la evaluación de los recursos energéticos disponibles en cada zona	15 días	mar 16/06/20	mié 1/07/20	5
17		Evidencias de las reuniones previas con las entidades públicas que han solicitado apoyo al IPSE	15 días	mar 16/06/20	mié 1/07/20	5
18		Registros y evidencias de las capacitaciones al personal de trabajo en campo sobre el uso y porte de	5 días	lun 6/07/20	sáb 11/07/20	7
19		**Trabajo de campo para la realización de actividades de diagnostico**	**5 días**	**sáb 11/07/20**	**jue 16/07/20**	
20		Análisis de información del avance de actividades, con el Respectivo análisis en Project con curva S	5 días	sáb 11/07/20	jue 16/07/20	12
21		Presentación de informes de actividades mensuales	5 días	jue 16/07/20	mar 21/07/20	19;12;5;6
22		Solicitud pago primer acta	4 días	mar 21/07/20	sáb 25/07/20	21
23		**FASE II**	**133 días**	**mar 21/07/20**	**mar 1/12/20**	
24		**Segundo pago (25%), Tercer pago (25%), Cuarto pago (25%) y Quinto pago (10%)**	**133 días**	**mar 21/07/20**	**mar 1/12/20**	
25	3	**Análisis de Información por el equipo de profesionales para brindar la mejor alternativa**	**45 días**	**mar 21/07/20**	**vie 4/09/20**	
26		Análisis de Información por el equipo de profesionales para brindar la mejor alternativa	30 días	mar 21/07/20	jue 20/08/20	21
27		Análisis de información del avance de actividades, con el Respectivo análisis en Project con curva S	10 días	jue 20/08/20	dom 30/08/20	26
28		Presentación de informes de actividades mensuales	5 días	dom 30/08/20	vie 4/09/20	27
29	5	**Aplicación de protocolos para elaboración de las estructuraciones, comparación de alternativas y diseño**	**40 días**	**vie 4/09/20**	**mié 14/10/20**	
30		Aplicación de protocolos para elaboración de las estructuraciones, comparación de alternativas y diseño definitivo	35 días	vie 4/09/20	vie 9/10/20	28
31		Presentación de informes de actividades mensuales	5 días	vie 9/10/20	mié 14/10/20	30
32	6	**Elaboración de los diseños de detalle con especificaciones técnicas y presentación del proyecto**	**30 días**	**mié 14/10/20**	**vie 13/11/20**	**29**
33		Elaboración de los diseños de detalle con especificaciones técnicas y presentación del proyecto	25 días	mié 14/10/20	dom 8/11/20	31
34		Presentación de informes de actividades mensuales	5 días	dom 8/11/20	vie 13/11/20	33
35		Solicitud pago segunda acta	5 días	vie 13/11/20	mié 18/11/20	34
36		Solicitud pago tercera acta	5 días	mié 18/11/20	lun 23/11/20	35
37		Solicitud pago cuarta acta	4 días	lun 23/11/20	vie 27/11/20	36
38		Solicitud pago quinta acta	4 días	vie 27/11/20	mar 1/12/20	37
39		**Fin de la consultoría**	0 días	mar 1/12/20	mar 1/12/20	38

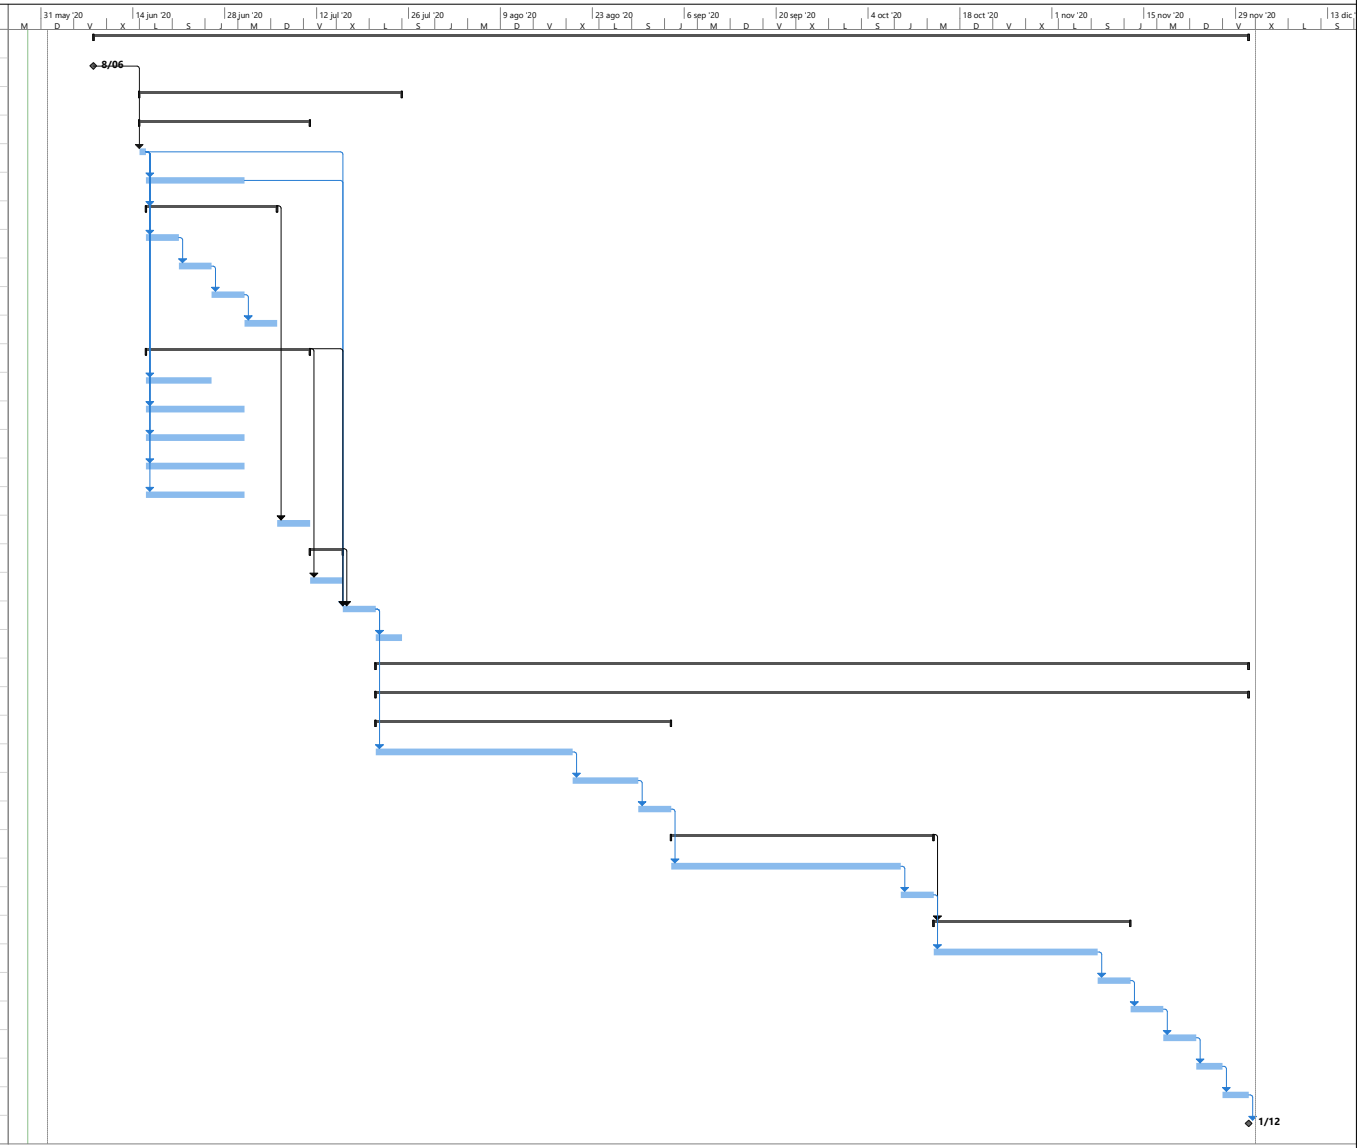

RL JUAN CARLOS LATORRE

Tarea, División, Hito, Resumen, Resumen del proyecto, Tarea inactiva, Hito inactivo, Resumen inactivo, Tarea manual, solo duración, Informe de resumen manual, Resumen manual, solo el comienzo, solo fin, Tareas externas, Hito externo, Fecha límite, Progreso, Progreso manual
