
CRONOGRAMA ACTIVIDADES
PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES (ZNI) IPSE
REGION AMAZONIA

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0	**PROYECTO DE ESTRUCTURACIÓN ESTUDIO PREVIO_AMAZONIA**	**127 días**	**mié 1/07/20**	**jue 3/12/20**
1	**LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO**	**10 días**	**mié 1/07/20**	**lun 13/07/20**
2	Ajustes y legalización del contrato (Presentación de documentos Fase I del proyecto)	10 días	mié 1/07/20	lun 13/07/20
3	Presentación y aprobación del cronograma y equipos de trabajo	1 día	mié 1/07/20	jue 2/07/20
4	**PRELIMINARES**	**23 días**	**jue 2/07/20**	**jue 30/07/20**
5	**Visita inicial Caquetá**	**20 días**	**jue 2/07/20**	**lun 27/07/20**
6	Socialización del proyecto con entidades de administración departamental, municipal o empresa	12 días	jue 2/07/20	jue 16/07/20
7	PRIORIZACIÓN: Recopilación de usuarios y soluciones energéticas previamente estructuradas y/o solicitudes formales de energización remitidas al IPSE u a otra entidad. Según ANEXO	2 días	vie 10/07/20	lun 13/07/20
8	Identificación de las zonas a intervenir, vías de acceso, medios de transporte, análisis de riesgos. A fin de consolidar la mayor cantidad de usuarios.	12 días	jue 2/07/20	jue 16/07/20
9	Elaboración de informe visita inicial	8 días	jue 16/07/20	lun 27/07/20
10	**Visita Inicial Vaupés**	**4 días**	**mié 15/07/20**	**mar 21/07/20**
11	Socialización del proyecto con entidades de administración departamental, municipal o empresa	1 día	jue 16/07/20	vie 17/07/20
12	PRIORIZACIÓN: Recopilación de usuarios y soluciones energéticas previamente estructuradas y/o solicitudes formales de energización remitidas al IPSE u a otra entidad. Según ANEXO	2 días	mié 15/07/20	vie 17/07/20
13	Identificación de las zonas a intervenir, vías de acceso, medios de transporte, análisis de riesgos.	2 días	jue 16/07/20	sáb 18/07/20
14	Elaboración de informe visita inicial	1 día	sáb 18/07/20	mar 21/07/20
15	**Visita Inicial Guainía**	**4 días**	**jue 16/07/20**	**mié 22/07/20**
16	Socialización del proyecto con entidades de administración departamental, municipal o empresa	1 día	vie 17/07/20	sáb 18/07/20

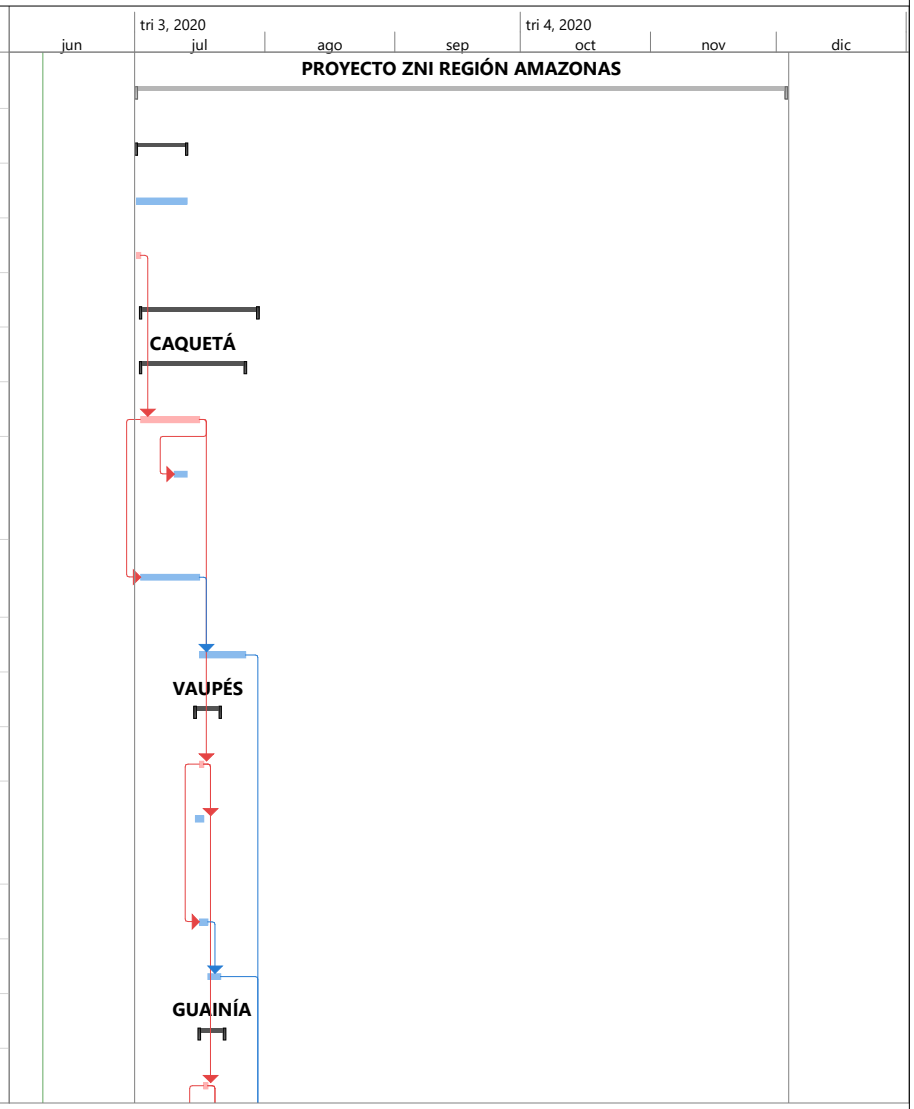


Cronograma Region Amazonia
Proceso IPSESPE-CM-001-2020
V 1.0

Tareas críticas
Progreso de tarea crítica
Tarea
Progreso de tarea
Línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen del proyecto

CRONOGRAMA ACTIVIDADES
PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES (ZNI) IPSE
REGION AMAZONIA

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
17	PRIORIZACIÓN: Recopilación de usuarios y soluciones energéticas previamente estructuradas y/o solicitudes formales de energización remitidas al IPSE u a otra entidad. Según ANEXO	2 días	jue 16/07/20	sáb 18/07/20
18	Identificación de las zonas a intervenir, vías de acceso, medios de transporte, análisis de riesgos.	2 días	vie 17/07/20	mar 21/07/20
19	Elaboración de informe visita inicial	1 día	mar 21/07/20	mié 22/07/20
20	**Visita inicial Guaviare**	**5 días**	**sáb 18/07/20**	**sáb 25/07/20**
21	Socialización del proyecto con entidades de administración departamental, municipal o empresa	2 días	sáb 18/07/20	mié 22/07/20
22	PRIORIZACIÓN: Recopilación de usuarios y soluciones energéticas previamente estructuradas y/o solicitudes formales de energización remitidas al IPSE u a otra entidad. Según ANEXO	2 días	sáb 18/07/20	mié 22/07/20
23	Identificación de las zonas a intervenir, vías de acceso, medios de transporte, análisis de riesgos.	4 días	sáb 18/07/20	vie 24/07/20
24	Elaboración de informe visita inicial	1 día	vie 24/07/20	sáb 25/07/20
25	**Visita Inicial Putumayo**	**7 días**	**mié 22/07/20**	**jue 30/07/20**
26	Socialización del proyecto con entidades de administración departamental, municipal o empresa	3 días	mié 22/07/20	sáb 25/07/20
27	PRIORIZACIÓN: Recopilación de usuarios y soluciones energéticas previamente estructuradas y/o solicitudes formales de energización remitidas al IPSE u a otra entidad. Según ANEXO	2 días	jue 23/07/20	sáb 25/07/20
28	Identificación de las zonas a intervenir, vías de acceso, medios de transporte, análisis de riesgos.	5 días	mié 22/07/20	mar 28/07/20
29	Elaboración de informe visita inicial	2 días	mar 28/07/20	jue 30/07/20
30	**Visita Inicial Amazonas**	**4 días**	**vie 24/07/20**	**mié 29/07/20**
31	Socialización del proyecto con entidades de administración departamental, municipal o empresa	1 día	sáb 25/07/20	lun 27/07/20
32	PRIORIZACIÓN: Recopilación de usuarios y soluciones energéticas previamente estructuradas y/o solicitudes formales de energización remitidas al IPSE u a otra entidad. Según ANEXO. (red de interconexión Perú)	2 días	vie 24/07/20	lun 27/07/20
33	Identificación de las zonas a intervenir, vías de acceso, medios de transporte, análisis de riesgos.	2 días	sáb 25/07/20	mar 28/07/20

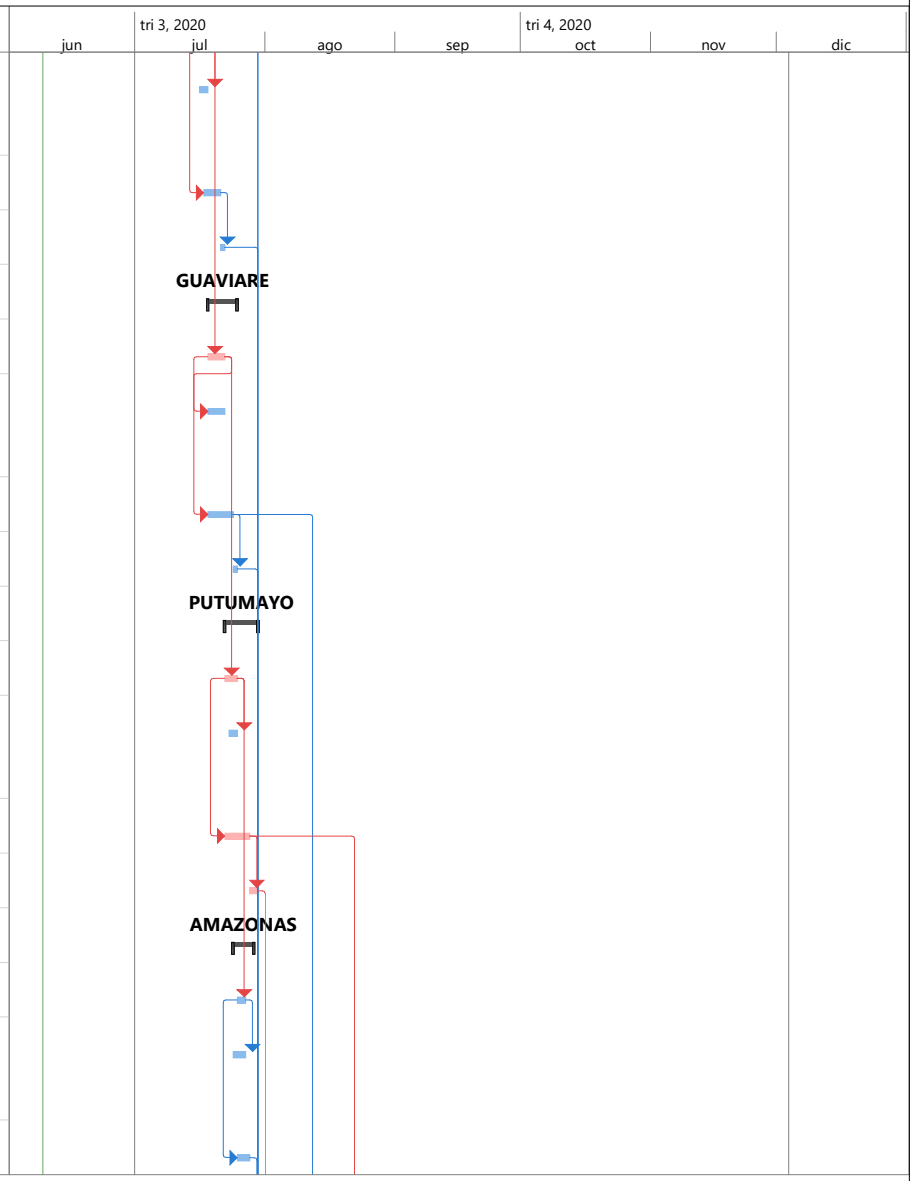


Cronograma Region Amazonia
Proceso IPSESPE-CM-001-2020
V 1.0

Tareas críticas
Progreso de tarea crítica
Tarea
Progreso de tarea
Línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen del proyecto

CRONOGRAMA ACTIVIDADES
PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES (ZNI) IPSE
REGION AMAZONIA

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
34	Elaboración de informe visita inicial	1 día	mar 28/07/20	mié 29/07/20
35	Análisis de información del avance de las actividades, con el respectivo análisis en Project con Curva S	5 días	jue 30/07/20	mié 5/08/20
36	**FASE 2 - DISEÑO**	**107,13 días**	**sáb 25/07/20**	**jue 3/12/20**
37	**DESARROLLO DE ACTIVIDADES Caquetá**	**42 días**	**mié 5/08/20**	**vie 25/09/20**
38	Trabajo de campo para realizar las actividades de diagnostico (censo, georreferenciación, caracterización socioeconómica, ambiental, recursos	30 días	mié 5/08/20	vie 11/09/20
39	Evaluación de obligaciones ambientales y sociales de las regiones identificadas.	7 días	mié 5/08/20	vie 14/08/20
40	Análisis de información por el equipo de profesionales sobre la alternativa seleccionada.(construccion de diseños, planos, cronograma y presupuestos) para aprobacion por los fondos de financiación.	12 días	mar 25/08/20	mar 8/09/20
41	Aplicación de protocolos para la elaboración de las estructuraciones, comparación de alternativas y diseño definitivo de las soluciones; Elaboración de documentos ambientales y sociales, y aprobacion de los mismos, a fin de garantizar la viabilidad.	15 días	mar 8/09/20	vie 25/09/20
42	Elaboración de diseño de detalle con especificaciones técnicas y presentación de proyecto estructurado; Gestion de cartas y aprobaciones de las entidades incunbentes; construccion de esquema de	12 días	mié 19/08/20	mié 2/09/20
43	Análisis de información del avance de las actividades, con el respectivo análisis en Project con Curva S	8 días	mié 2/09/20	vie 11/09/20
44	**DESARROLLO DE ACTIVIDADES VAUPÉS**	**21 días**	**mié 5/08/20**	**mar 1/09/20**
45	Trabajo de campo para realizar las actividades de diagnostico (censo, georreferenciación, caracterización socioeconómica, ambiental, recursos	5 días	mié 5/08/20	mié 12/08/20
46	Evaluación de obligaciones ambientales y sociales de las zonas identificadas.	3 días	mié 5/08/20	lun 10/08/20
47	Análisis de información por el equipo de profesionales sobre la alternativa seleccionada.(construccion de diseños, planos, cronograma y presupuestos) para aprobacion por los fondos de financiación.	8 días	mié 12/08/20	sáb 22/08/20

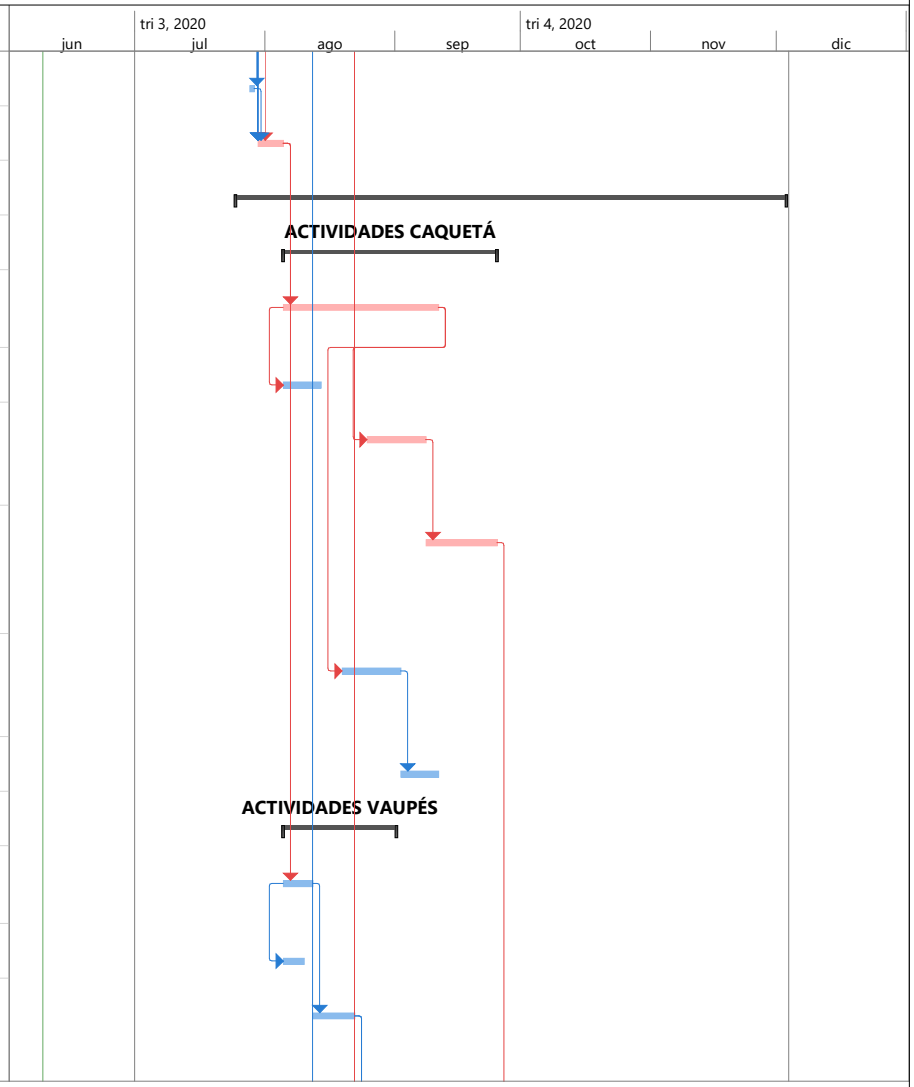


Cronograma Region Amazonia
Proceso IPSESPE-CM-001-2020
V 1.0

Tareas críticas
Progreso de tarea crítica
Tarea
Progreso de tarea
Línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen del proyecto

CRONOGRAMA ACTIVIDADES
PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES (ZNI) IPSE
REGION AMAZONIA

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
48	Aplicación de protocolos para la elaboración de las estructuraciones, comparación de alternativas y diseño definitivo de las soluciones; Elaboración de documentos ambientales y sociales, y aprobacion de los mismos, a fin de garantizar la viabilidad.	8 días	sáb 22/08/20	mar 1/09/20
49	Elaboración de diseño de detalle con especificaciones técnicas y presentación de proyecto estructurado; Gestion de cartas y aprobaciones de las entidades incunbentes; construccion de esquema de	5 días	sáb 22/08/20	vie 28/08/20
50	Análisis de información del avance de las actividades, con el respectivo análisis en Project con Curva S	1 día	vie 28/08/20	sáb 29/08/20
51	**DESARROLLO DE ACTIVIDADES Guainía**	**21 días**	**mar 1/09/20**	**vie 25/09/20**
52	Trabajo de campo para realizar las actividades de diagnostico (censo, georreferenciación, caracterización socioeconómica, ambiental, recursos	5 días	mar 1/09/20	lun 7/09/20
53	Evaluación de obligaciones ambientales y sociales de las regiones identificadas.	3 días	mar 1/09/20	vie 4/09/20
54	Análisis de información por el equipo de profesionales sobre la alternativa seleccionada.(construccion de diseños, planos, cronograma y presupuestos) para aprobacion por los fondos de financiación.	8 días	lun 7/09/20	mié 16/09/20
55	Aplicación de protocolos para la elaboración de las estructuraciones, comparación de alternativas y diseño definitivo de las soluciones; Elaboración de documentos ambientales y sociales, y aprobacion de los mismos, a fin de garantizar la viabilidad.	8 días	mié 16/09/20	vie 25/09/20
56	Elaboración de diseño de detalle con especificaciones técnicas y presentación de proyecto estructurado; Gestion de cartas y aprobaciones de las entidades incunbentes; construccion de esquema de	5 días	mié 16/09/20	mar 22/09/20
57	Análisis de información del avance de las actividades, con el respectivo análisis en Project con Curva S	1 día	mar 22/09/20	mié 23/09/20
58	**DESARROLLO DE ACTIVIDADES GUAVIARE**	**61 días**	**mié 12/08/20**	**sáb 24/10/20**
59	Trabajo de campo para realizar las actividades de diagnostico (censo, georreferenciación, caracterización socioeconómica, ambiental, recursos	8 días	vie 25/09/20	lun 5/10/20
60	Evaluación de obligaciones ambientales y sociales de las zonas identificadas.	3 días	vie 25/09/20	mar 29/09/20

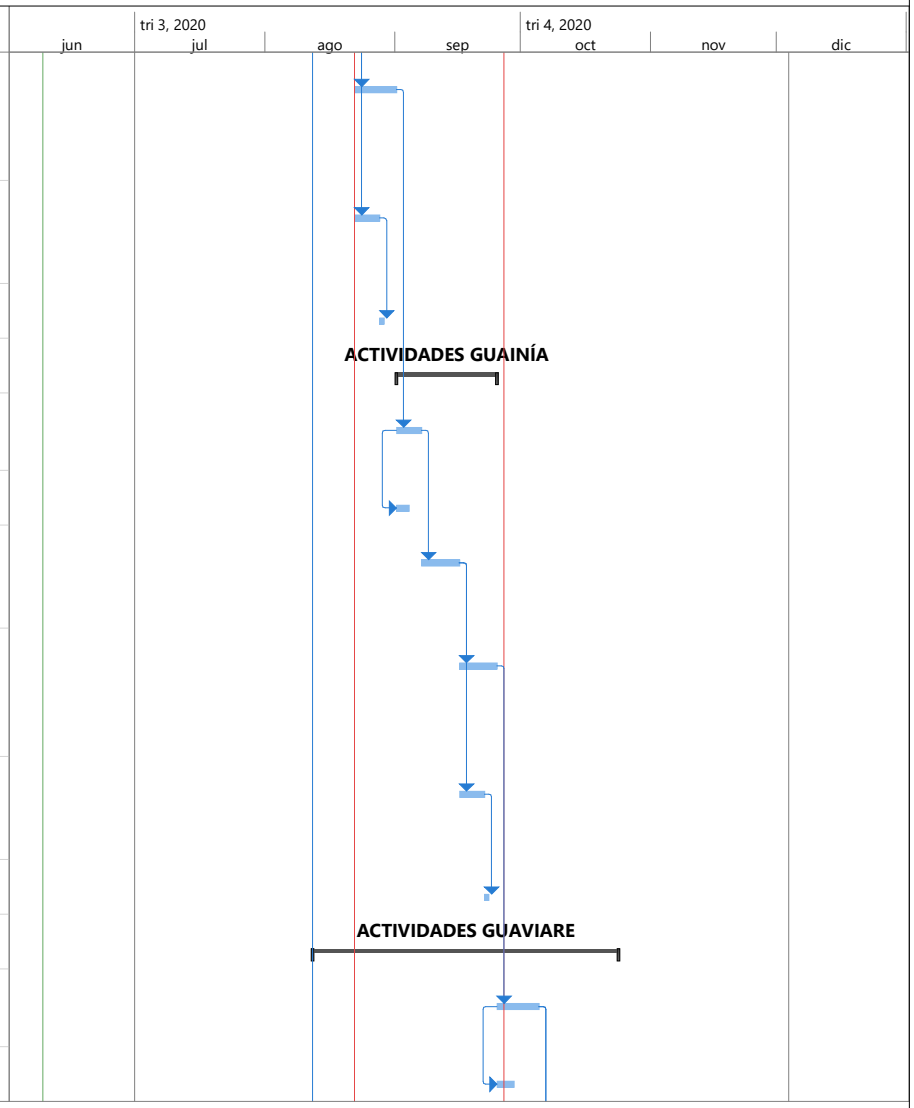


Cronograma Region Amazonia
Proceso IPSESPE-CM-001-2020
V 1.0

Tareas críticas
Progreso de tarea crítica
Tarea
Progreso de tarea
Línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen del proyecto

CRONOGRAMA ACTIVIDADES
PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES (ZNI) IPSE
REGION AMAZONIA


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
61	Análisis de información por el equipo de profesionales sobre la alternativa seleccionada.(construccion de diseños, planos, cronograma y presupuestos) para aprobacion por los fondos de financiación.	8 días	lun 5/10/20	jue 15/10/20
62	Aplicación de protocolos para la elaboración de las estructuraciones, comparación de alternativas y diseño definitivo de las soluciones; Elaboración de documentos ambientales y sociales, y aprobacion de los mismos, a fin de garantizar la viabilidad.	8 días	jue 15/10/20	sáb 24/10/20
63	Estructuración integral de solucion energetica, posiblemente PCH para la comunidad de Corocoro,	27 días	mié 12/08/20	lun 14/09/20
64	Elaboración de diseño de detalle con especificaciones técnicas y presentación de proyecto estructurado; Gestion de cartas y aprobaciones de las entidades incunbentes; construccion de esquema de	5 días	lun 5/10/20	sáb 10/10/20
65	Análisis de información del avance de las actividades, con el respectivo análisis en Project con Curva S	1 día	sáb 10/10/20	mar 13/10/20
66	**DESARROLLO DE ACTIVIDADES Putumayo**	**53 días**	**sáb 22/08/20**	**sáb 24/10/20**
67	Trabajo de campo para realizar las actividades de diagnostico (censo, georreferenciación, caracterización socioeconómica, ambiental, recursos	8 días	vie 25/09/20	lun 5/10/20
68	Evaluación de obligaciones ambientales y sociales de las zonas identificadas.	3 días	vie 25/09/20	mar 29/09/20
69	Análisis de información por el equipo de profesionales sobre la alternativa seleccionada.(construccion de diseños, planos, cronograma y presupuestos) para aprobacion por los fondos de financiación.	8 días	lun 5/10/20	jue 15/10/20
70	Aplicación de protocolos para la elaboración de las estructuraciones, comparación de alternativas y diseño definitivo de las soluciones; Elaboración de documentos ambientales y sociales, y aprobacion de los mismos, a fin de garantizar la viabilidad.	8 días	jue 15/10/20	sáb 24/10/20
71	Estructuración integral de red de interconexión de Puerto Leguizamo - Sopli Vargas (Perú); Estructuracion de soluciones energeticas para comunidades El Tablero, Pto. Ospina, Reforma y	16 días	sáb 22/08/20	jue 10/09/20
72	Elaboración de diseño de detalle con especificaciones técnicas y presentación de proyecto estructurado; Gestion de cartas y aprobaciones de las entidades incunbentes; construccion de esquema de	5 días	lun 5/10/20	sáb 10/10/20
73	Análisis de información del avance de las actividades, con el respectivo análisis en Project con Curva S	1 día	sáb 10/10/20	mar 13/10/20

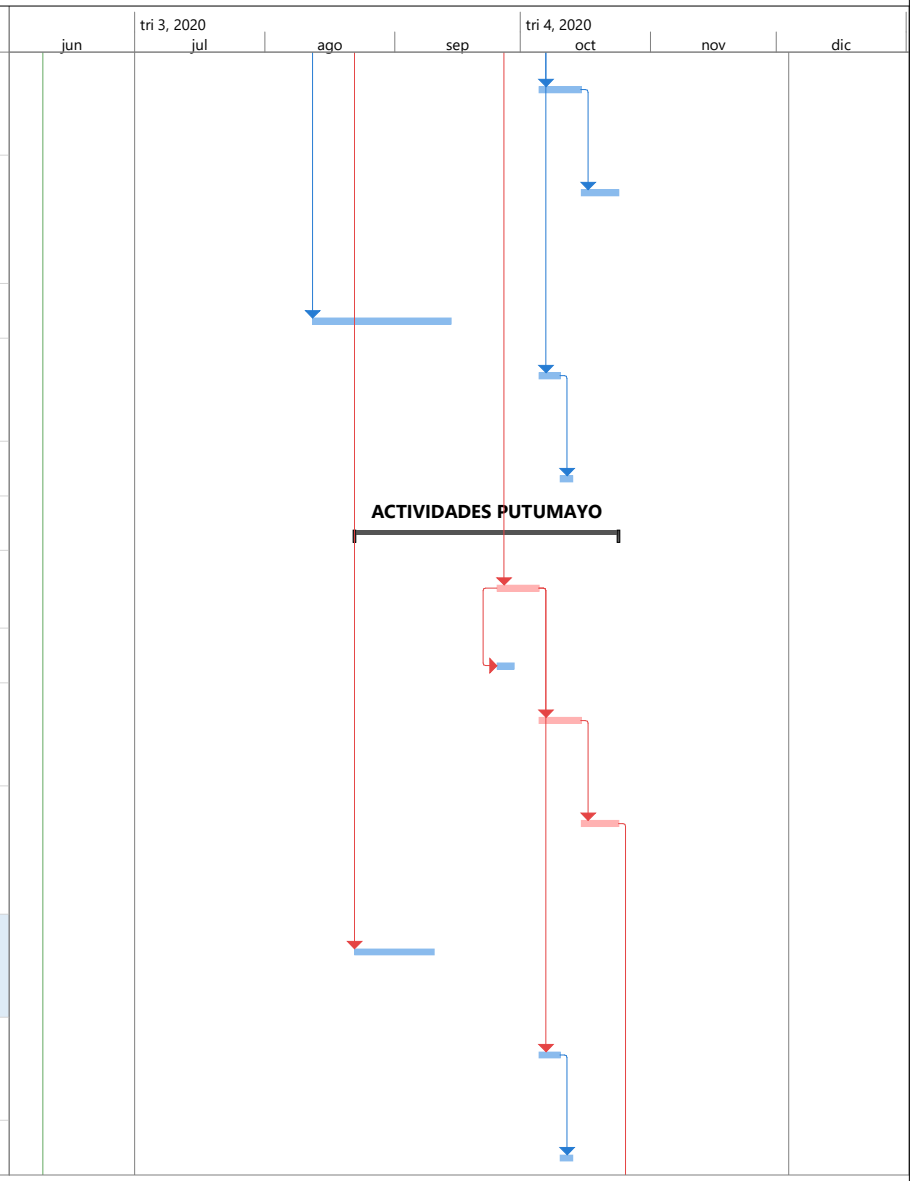

Cronograma Region Amazonia
Proceso IPSESPE-CM-001-2020
V 1.0

Tareas críticas
Progreso de tarea crítica
Tarea
Progreso de tarea
Línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen del proyecto

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
74	**DESARROLLO DE ACTIVIDADES Amazonas**	**19 días**	**sáb 24/10/20**	**mié 18/11/20**
75	Trabajo de campo para realizar las actividades de diagnostico (censo, georreferenciación, caracterización socioeconómica, ambiental, recursos	7 días	sáb 24/10/20	mar 3/11/20
76	Evaluación de obligaciones ambientales y sociales de las zonas identificadas.	3 días	sáb 24/10/20	mié 28/10/20
77	Análisis de información por el equipo de profesionales para brindar la mejor alternativa.	8 días	mié 28/10/20	sáb 7/11/20
78	Aplicación de protocolos para la elaboración de las estructuraciones, comparación de alternativas y diseño definitivo de las soluciones	8 días	sáb 7/11/20	mié 18/11/20
79	Elaboración de diseño de detalle con especificaciones técnicas mínimas y presentación de proyecto	5 días	mar 3/11/20	lun 9/11/20
80	Análisis de información del avance de las actividades, con el respectivo análisis en Project con Curva S	1 día	lun 9/11/20	mar 10/11/20
81	**LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO**	107,13 días	**sáb 25/07/20**	**jue 3/12/20**
82	Registro definitivo de MGA y entrega del mismo a la entidad territorial.	12 días	lun 9/11/20	mar 24/11/20
83	Construcción de consolidado de entregables	2 días	mié 18/11/20	vie 20/11/20
84	Elaboración de actas de entrega a satisfacción	5 días	vie 20/11/20	jue 26/11/20
85	Aprobación de la estructuración contratada	4 días	jue 26/11/20	mar 1/12/20
86	Tramites de cobro 10% final	2 días	mar 1/12/20	jue 3/12/20
87	**Elaboración de informes (mensuales o cuando el IPSE lo requiera)**	**101 días**	**sáb 25/07/20**	**mié 25/11/20**
88	Elaboración de informes (mensuales o cuando el IPSE lo requiera) 1	1 día	sáb 25/07/20	sáb 25/07/20
89	Elaboración de informes (mensuales o cuando el IPSE lo requiera) 2	1 día	mar 25/08/20	mar 25/08/20
90	Elaboración de informes (mensuales o cuando el IPSE lo requiera) 3	1 día	vie 25/09/20	vie 25/09/20
91	Elaboración de informes (mensuales o cuando el IPSE lo requiera) 4	1 día	lun 26/10/20	lun 26/10/20
92	Elaboración de informes (mensuales o cuando el IPSE lo requiera) 5	1 día	mié 25/11/20	mié 25/11/20

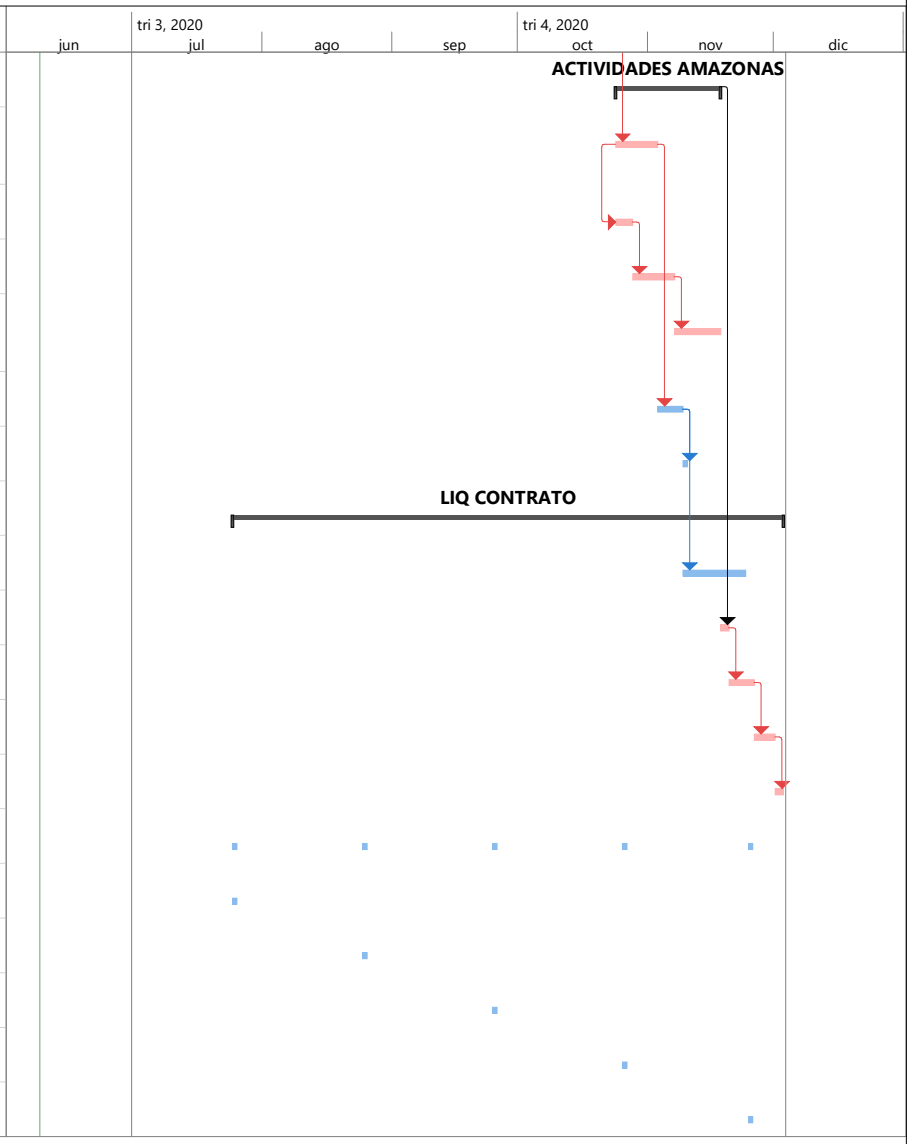

Cronograma Region Amazonia
Proceso IPSESPE-CM-001-2020
V 1.0

Tareas críticas
Progreso de tarea crítica
Tarea
Progreso de tarea
Línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen del proyecto
