
CRONOGRAMA ACTIVIDADES
PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES (ZNI) IPSE
REGION ORINOQUIA

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0	**PROYECTO DE ESTRUCTURACIÓN ESTUDIO PREVIO_ORINOQUIA**	**125 días**	**mié 1/07/20**	**mar 1/12/20**
1	**LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO**	**10 días**	**mié 1/07/20**	**lun 13/07/20**
2	Ajustes y legalización del contrato (Presentación de documentos Fase I del proyecto)	10 días	mié 1/07/20	lun 13/07/20
3	Presentación y aprobación del cronograma	1 día	mié 1/07/20	jue 2/07/20
4	**PRELIMINARES**	**25 días**	**jue 2/07/20**	**sáb 1/08/20**
5	**Visita inicial Vichada**	**20 días**	**jue 2/07/20**	**lun 27/07/20**
6	Socialización del proyecto con entidades de administración departamental, municipal o empresa	10 días	jue 2/07/20	mar 14/07/20
7	PRIORIZACIÓN: Recopilación de usuarios y soluciones energéticas previamente estructuradas y/o solicitudes formales de energización remitidas al IPSE u a otra entidad. Según ANEXO	6 días	mar 7/07/20	mar 14/07/20
8	Identificación de las zonas a intervenir, vías de acceso, medios de transporte, análisis de riesgos.	12 días	jue 2/07/20	jue 16/07/20
9	Elaboración de informe visita inicial	8 días	jue 16/07/20	lun 27/07/20
10	**Visita Inicial Meta**	**5 días**	**mar 14/07/20**	**mar 21/07/20**
11	Socialización del proyecto con entidades de administración departamental, municipal o empresa	5 días	mar 14/07/20	mar 21/07/20
12	PRIORIZACIÓN: Recopilación de usuarios y soluciones energéticas previamente estructuradas y/o solicitudes formales de energización remitidas al IPSE u a otra entidad. Según ANEXO	3 días	jue 16/07/20	mar 21/07/20
13	Identificación de las zonas a intervenir, vías de acceso, medios de transporte, análisis de riesgos.	2 días	mar 14/07/20	jue 16/07/20
14	Elaboración de informe visita inicial	1 día	jue 16/07/20	vie 17/07/20
15	**Visita Inicial Arauca**	**5 días**	**mar 21/07/20**	**lun 27/07/20**
16	Socialización del proyecto con entidades de administración departamental, municipal o empresa	5 días	mar 21/07/20	lun 27/07/20

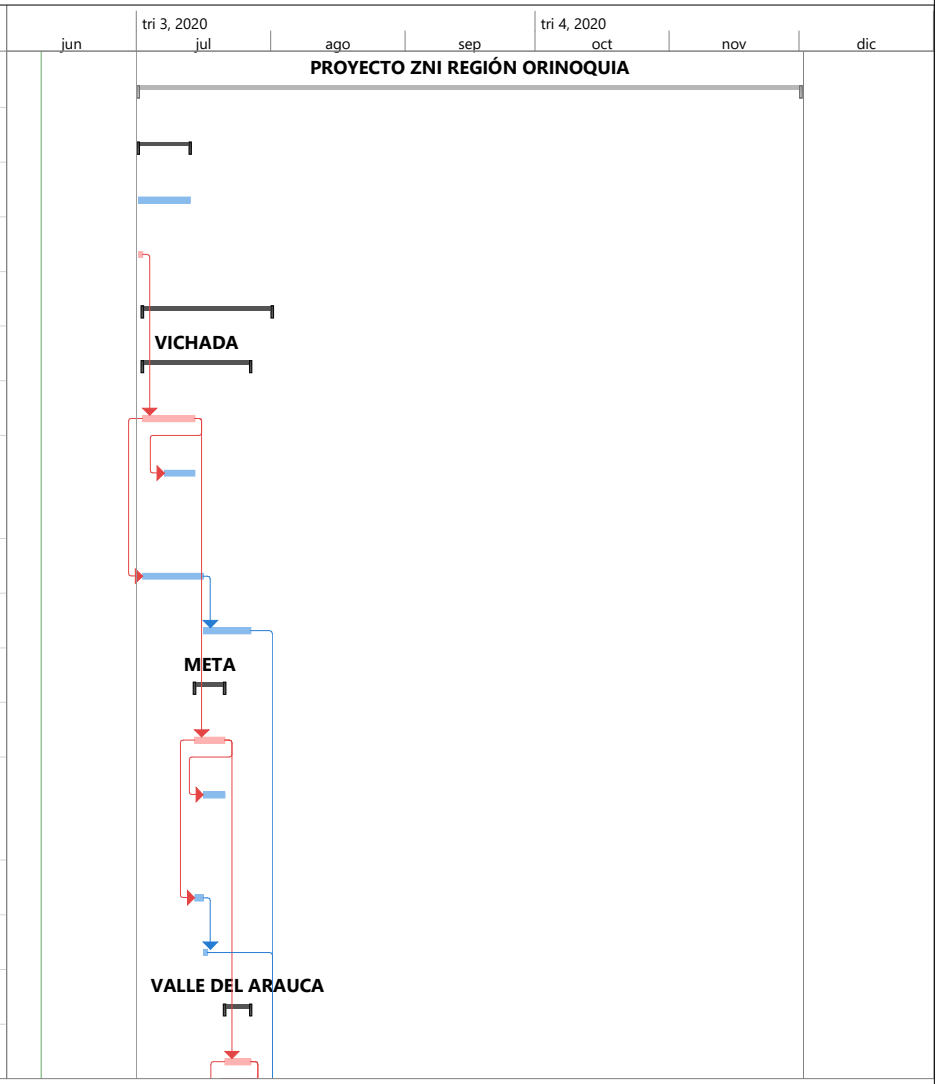


Cronograma Region Orinoquia
Proceso IPSESPE-CM-001-2020
V 1.0

Tareas críticas
Progreso de tarea crítica
Tarea
Progreso de tarea
Línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen del proyecto

CRONOGRAMA ACTIVIDADES
PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES (ZNI) IPSE
REGION ORINOQUIA

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
17	PRIORIZACIÓN: Recopilación de usuarios y soluciones energéticas previamente estructuradas y/o solicitudes formales de energización remitidas al IPSE u a otra entidad. Según ANEXO (Justificación de selección de	3 días	jue 23/07/20	lun 27/07/20
18	Identificación de las zonas a intervenir, vías de acceso, medios de transporte, análisis de riesgos.	2 días	mar 21/07/20	jue 23/07/20
19	Elaboración de informe visita inicial	1 día	jue 23/07/20	vie 24/07/20
20	**Visita inicial Casanare**	**5 días**	**lun 27/07/20**	**sáb 1/08/20**
21	Socialización del proyecto con entidades de administración departamental, municipal o empresa	5 días	lun 27/07/20	sáb 1/08/20
22	PRIORIZACIÓN: Recopilación de usuarios y soluciones energéticas previamente estructuradas y/o solicitudes formales de energización remitidas al IPSE u a otra entidad. Según ANEXO	3 días	mié 29/07/20	sáb 1/08/20
23	Identificación de las zonas a intervenir, vías de acceso, medios de transporte, análisis de riesgos.	4 días	lun 27/07/20	vie 31/07/20
24	Elaboración de informe visita inicial	1 día	vie 31/07/20	sáb 1/08/20
25	Análisis de información del avance de las actividades, con el respectivo análisis en Project con Curva S	5 días	sáb 1/08/20	sáb 8/08/20
26	**FASE 2 - DISEÑO**	**105,13 días**	**sáb 25/07/20**	**mar 1/12/20**
27	**DESARROLLO DE ACTIVIDADES VICHADA**	**37 días**	**sáb 8/08/20**	**mar 22/09/20**
28	Trabajo de campo para realizar las actividades de diagnostico (censo, georreferenciación, caracterización socioeconómica, ambiental, recursos	25 días	sáb 8/08/20	mar 8/09/20
29	Evaluación de obligaciones ambientales y sociales de las regiones identificadas.	7 días	sáb 8/08/20	mar 18/08/20
30	Análisis de información por el equipo de profesionales sobre la alternativa seleccionada.(construccion de diseños, planos, cronograma y presupuestos) para aprobacion por los fondos de financiación.	12 días	vie 21/08/20	vie 4/09/20
31	Aplicación de protocolos para la elaboración de las estructuraciones, comparación de alternativas y diseño definitivo de las soluciones; Elaboración de documentos ambientales y sociales, y aprobacion de los mismos, a fin de garantizar la viabilidad.	15 días	vie 4/09/20	mar 22/09/20

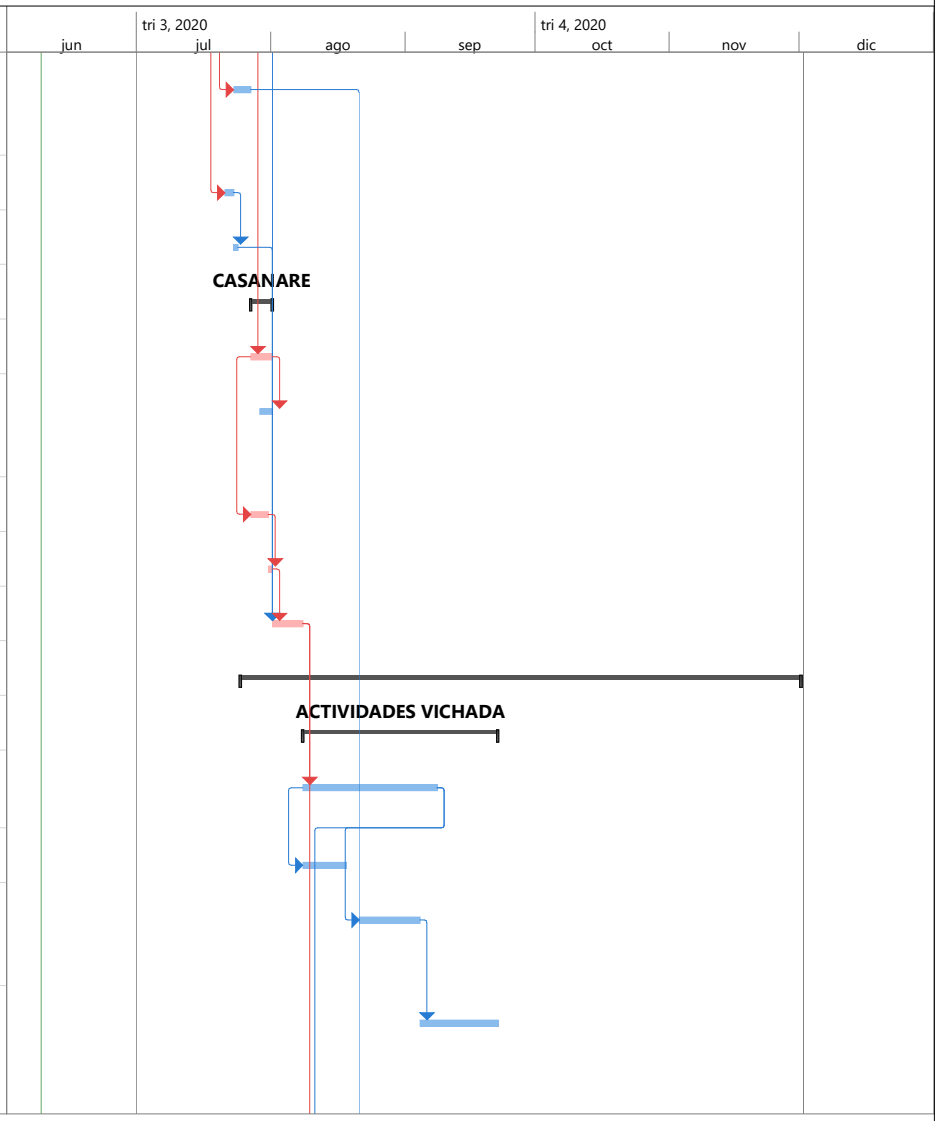


Cronograma Region Orinoquia
Proceso IPSESPE-CM-001-2020
V 1.0

Tareas críticas
Progreso de tarea crítica
Tarea
Progreso de tarea
Línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen del proyecto

CRONOGRAMA ACTIVIDADES
PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES (ZNI) IPSE
REGION ORINOQUIA

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
32	Elaboración de diseño de detalle con especificaciones técnicas y presentación de proyecto estructurado; Gestion de cartas y aprobaciones de las entidades incunbentes; construccion de esquema de	12 días	vie 14/08/20	sáb 29/08/20
33	Análisis de información del avance de las actividades, con el respectivo análisis en Project con Curva S	8 días	sáb 29/08/20	mar 8/09/20
34	**DESARROLLO DE ACTIVIDADES META**	**30 días**	**sáb 8/08/20**	**lun 14/09/20**
35	Trabajo de campo para realizar las actividades de diagnostico (censo, georreferenciación, caracterización socioeconómica, ambiental, recursos	14 días	sáb 8/08/20	mié 26/08/20
36	Evaluación de obligaciones ambientales y sociales de las zonas identificadas.	3 días	sáb 8/08/20	mié 12/08/20
37	Análisis de información por el equipo de profesionales sobre la alternativa seleccionada.(construccion de diseños, planos, cronograma y presupuestos) para aprobacion por los fondos de financiación.	8 días	mié 26/08/20	vie 4/09/20
38	Aplicación de protocolos para la elaboración de las estructuraciones, comparación de alternativas y diseño definitivo de las soluciones; Elaboración de documentos ambientales y sociales, y aprobacion de los mismos, a fin de garantizar la viabilidad.	8 días	vie 4/09/20	lun 14/09/20
39	Elaboración de diseño de detalle con especificaciones técnicas y presentación de proyecto estructurado; Gestion de cartas y aprobaciones de las entidades incunbentes; construccion de esquema de	5 días	vie 4/09/20	jue 10/09/20
40	Análisis de información del avance de las actividades, con el respectivo análisis en Project con Curva S	1 día	jue 10/09/20	vie 11/09/20
41	**DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARAUCA**	**52 días**	**vie 21/08/20**	**jue 22/10/20**
42	Trabajo de campo para realizar las actividades de diagnostico (censo, georreferenciación, caracterización socioeconómica, ambiental, recursos	16 días	lun 14/09/20	vie 2/10/20
43	Evaluación de obligaciones ambientales y sociales de las regiones identificadas.	3 días	lun 14/09/20	jue 17/09/20
44	Análisis de información por el equipo de profesionales sobre la alternativa seleccionada.(construccion de diseños, planos, cronograma y presupuestos) para aprobacion por los fondos de financiación.	8 días	vie 2/10/20	mar 13/10/20

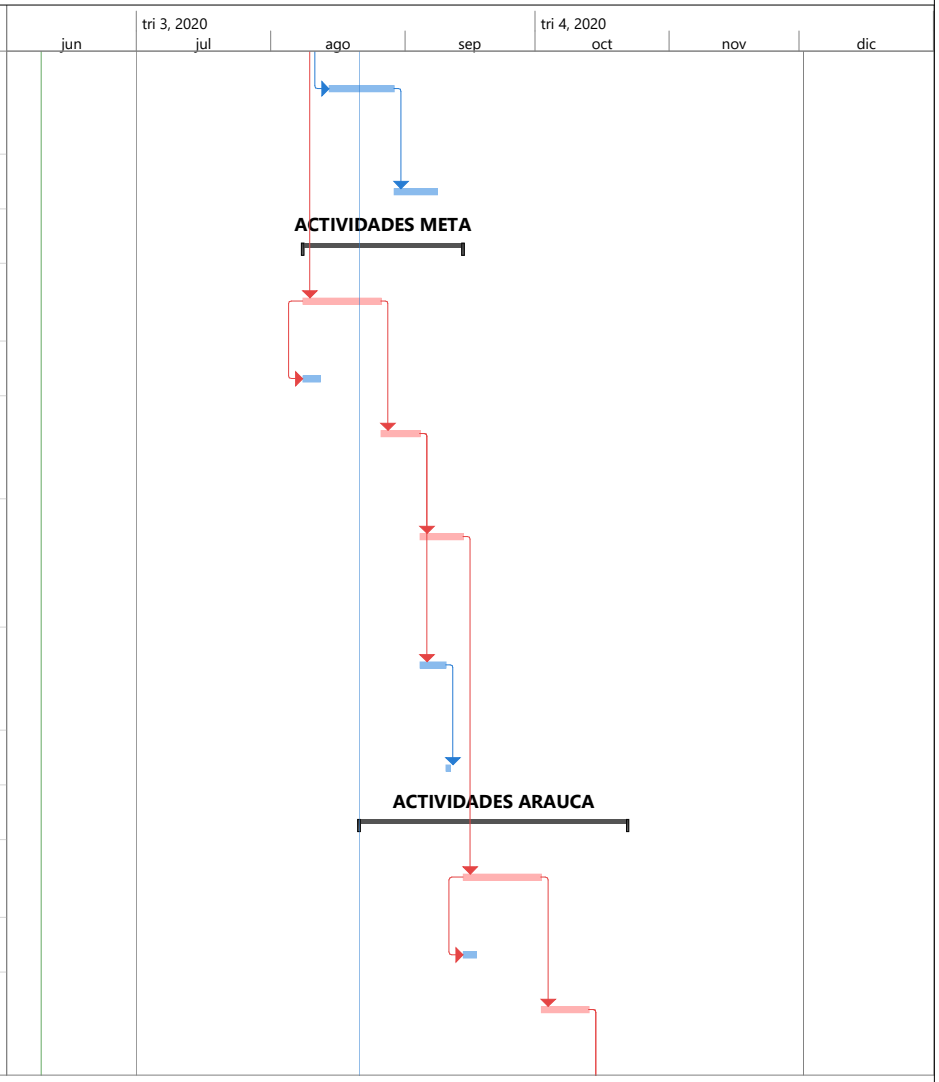


Cronograma Region Orinoquia
Proceso IPSESPE-CM-001-2020
V 1.0

Tareas críticas
Progreso de tarea crítica
Tarea
Progreso de tarea
Línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen del proyecto

CRONOGRAMA ACTIVIDADES
PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES (ZNI) IPSE
REGION ORINOQUIA

IPSE
Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
45	Aplicación de protocolos para la elaboración de las estructuraciones, comparación de alternativas y diseño definitivo de las soluciones; Elaboración de documentos ambientales y sociales, y aprobacion de los mismos, a fin de garantizar la viabilidad.	8 días	mar 13/10/20	jue 22/10/20
46	Estructuración integral de soluciones energéticas para comunidades relacionadas en el ANEXO " Justificación de selección de comunidades"	15 días	vie 21/08/20	mar 8/09/20
47	Elaboración de diseño de detalle con especificaciones técnicas y presentación de proyecto estructurado; Gestion de cartas y aprobaciones de las entidades incunbentes; construccion de esquema de	5 días	mar 13/10/20	lun 19/10/20
48	Análisis de información del avance de las actividades, con el respectivo análisis en Project con Curva S	1 día	lun 19/10/20	mar 20/10/20
49	**DESARROLLO DE ACTIVIDADES CASANARE**	**30 días**	**jue 22/10/20**	**sáb 28/11/20**
50	Trabajo de campo para realizar las actividades de diagnostico (censo, georreferenciación, caracterización socioeconómica, ambiental, recursos	14 días	jue 22/10/20	lun 9/11/20
51	Evaluación de obligaciones ambientales y sociales de las zonas identificadas.	3 días	jue 22/10/20	lun 26/10/20
52	Análisis de información por el equipo de profesionales sobre la alternativa seleccionada.(construccion de diseños, planos, cronograma y presupuestos) para aprobacion por los fondos de financiación.	8 días	lun 9/11/20	jue 19/11/20
53	Aplicación de protocolos para la elaboración de las estructuraciones, comparación de alternativas y diseño definitivo de las soluciones; Elaboración de documentos ambientales y sociales, y aprobacion de los mismos, a fin de garantizar la viabilidad.	8 días	jue 19/11/20	sáb 28/11/20
54	Elaboración de diseño de detalle con especificaciones técnicas y presentación de proyecto estructurado; Gestion de cartas y aprobaciones de las entidades incunbentes; construccion de esquema de	5 días	lun 9/11/20	sáb 14/11/20
55	Análisis de información del avance de las actividades, con el respectivo análisis en Project con Curva S	1 día	sáb 14/11/20	mar 17/11/20
56	**LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO**	105,13 días	**sáb 25/07/20**	**mar 1/12/20**
57	Registro definitivo de MGA y entrega del mismo a la entidad territorial.	10 días	sáb 14/11/20	vie 27/11/20
58	Construcción de consolidado de entregables	2 días	sáb 14/11/20	mié 18/11/20

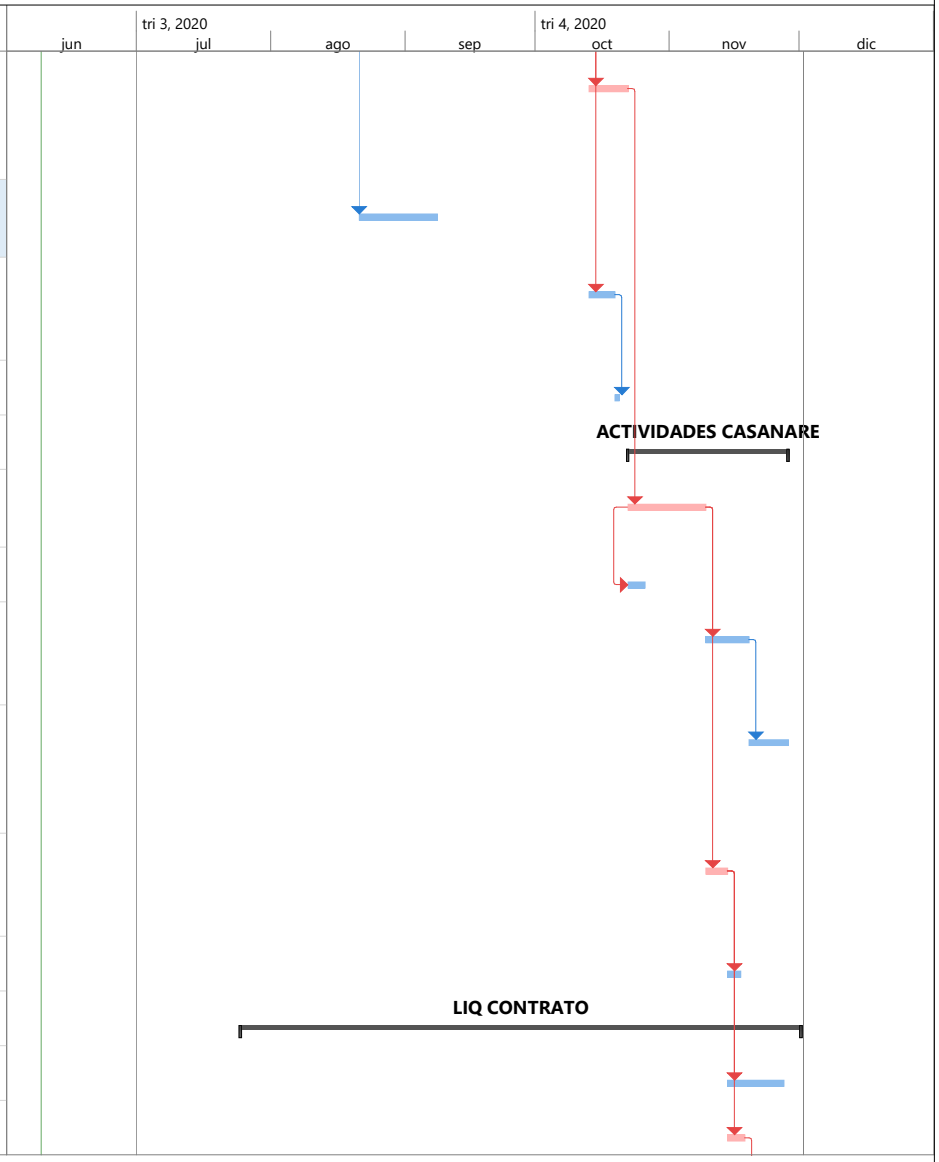

Cronograma Region Orinoquia
Proceso IPSESPE-CM-001-2020
V 1.0

Tareas críticas
Progreso de tarea crítica
Tarea
Progreso de tarea
Línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen del proyecto

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
59	Elaboración de actas de entrega a satisfacción	5 días	mié 18/11/20	mar 24/11/20
60	Aprobación de la estructuración contratada	4 días	mar 24/11/20	sáb 28/11/20
61	Tramites de cobro 10% final	2 días	sáb 28/11/20	mar 1/12/20
62	**Elaboración de informes (mensuales o cuando el IPSE lo requiera)**	**103 días**	**sáb 25/07/20**	**vie 27/11/20**
63	Elaboración de informes (mensuales o cuando el IPSE lo requiera) 1	1 día	sáb 25/07/20	sáb 25/07/20
64	Elaboración de informes (mensuales o cuando el IPSE lo requiera) 2	1 día	mar 25/08/20	mar 25/08/20
65	Elaboración de informes (mensuales o cuando el IPSE lo requiera) 3	1 día	vie 25/09/20	vie 25/09/20
66	Elaboración de informes (mensuales o cuando el IPSE lo requiera) 4	1 día	lun 26/10/20	lun 26/10/20
67	Elaboración de informes (mensuales o cuando el IPSE lo requiera) 5	1 día	vie 27/11/20	vie 27/11/20
68	Elaboración de informes (mensuales o cuando el IPSE lo requiera) 5	1 día	mié 25/11/20	mié 25/11/20

