

Id		Modo de tar	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1			**PUENTE 2**			
2			LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	3 días	mar 01/10/24	jue 03/10/24
3			CAMPAMENTO DE 9 M2 CERRAMIENTO EN MADERA Y CUBIERTA EN TEJA ZINC	2 días	mié 02/10/24	jue 03/10/24
4			DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	7 días	jue 03/10/24	lun 14/10/24
5			TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	4 días	mié 09/10/24	mar 15/10/24
6			CANALIZACION RIO (BULLDOZER TIPO D8K CAT)	12 días	mar 15/10/24	jue 31/10/24
7			EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	8 días	jue 31/10/24	mar 12/11/24
8			MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 3" AUTOCEBANTE A GASOLINA	10 días	lun 11/11/24	lun 25/11/24
9			SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 Mpa (2000 PSI)	1 día	mié 20/11/24	jue 21/11/24
10			COLUMNAS, VIGAS O ESTRIBOS EN CONCRETO 27.6 Mpa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	28 días	jue 21/11/24	mar 31/12/24
11			ACERO DE REFUERZO FY=4200 Mpa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	23 días	mié 20/11/24	lun 23/12/24
12			APOYO ELASTOMÉRICO EN NEOPRENO 30X30X5 CM DUREZA 60 CON REFUERZOS 1/8". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1 día	mié 25/12/24	jue 26/12/24
13			ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	1 día	mar 31/12/24	mié 01/01/25

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

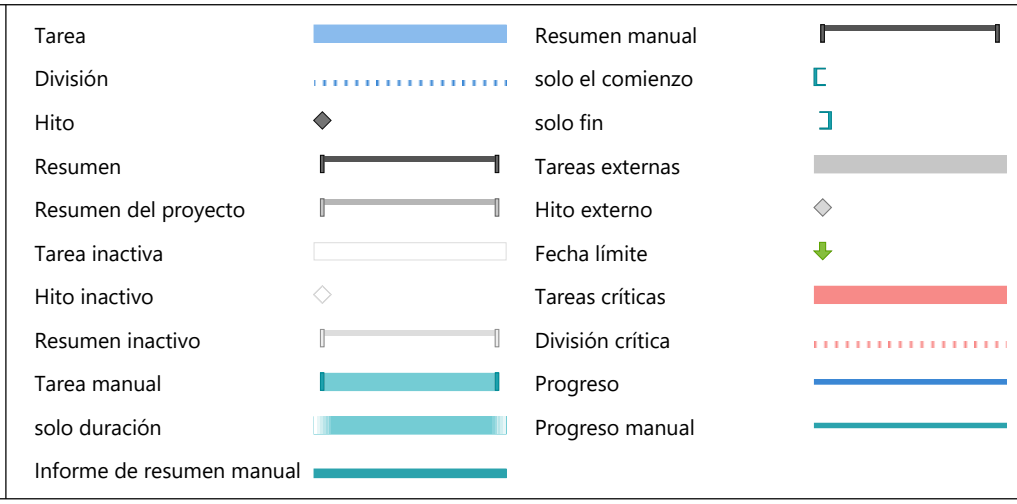


Id		Mo de tar	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
14			ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	3 días	mar 31/12/24	vie 03/01/25
15			RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	2 días	vie 03/01/25	mar 07/01/25
16			TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	2 días	vie 03/01/25	mar 07/01/25
17			SUB-BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y	1 día	lun 06/01/25	mar 07/01/25
18			BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y	1 día	lun 06/01/25	mar 07/01/25
19			RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	1 día	mar 07/01/25	mié 08/01/25
20			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	1 día	mié 08/01/25	jue 09/01/25
21			TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	1 día	mié 08/01/25	jue 09/01/25
22			**PUENTE 1**			
23			LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	3 días	jue 17/10/24	mar 22/10/24
24			CAMPAMENTO DE 9 M2 CERRAMIENTO EN MADERA Y CUBIERTA EN TEJA ZINC	2 días	jue 17/10/24	lun 21/10/24
25			DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	7 días	lun 21/10/24	mié 30/10/24
26			TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	4 días	vie 25/10/24	jue 31/10/24

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

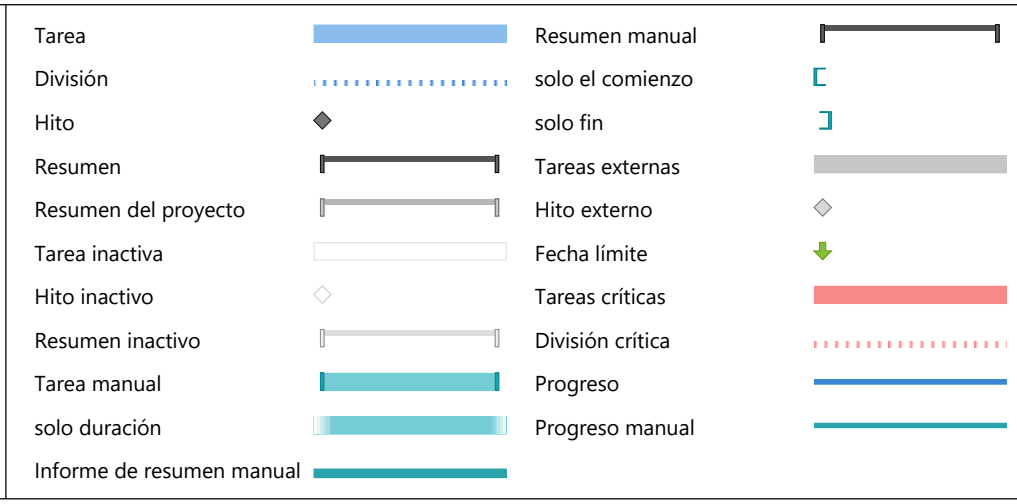


Id		Mo de tar	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
27			CANALIZACION RIO (BULLDOZER TIPO D8K CAT)	12 días	jue 31/10/24	lun 18/11/24
28			EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	8 días	lun 18/11/24	jue 28/11/24
29			MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 3" AUTOCEBANTE A GASOLINA	10 días	mié 27/11/24	mié 11/12/24
30			SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 Mpa (2000 PSI)	1 día	vie 06/12/24	lun 09/12/24
31			COLUMNAS, VIGAS O ESTRIBOS EN CONCRETO 27.6 Mpa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	28 días	lun 09/12/24	jue 16/01/25
32			ACERO DE REFUERZO FY=4200 Mpa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	23 días	vie 06/12/24	mié 08/01/25
33			APOYO ELASTOMÉRICO EN NEOPRENO 30X30X5 CM DUREZA 60 CON REFUERZOS	1 día	vie 10/01/25	lun 13/01/25
34			ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	1 día	jue 16/01/25	vie 17/01/25
35			ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	3 días	jue 16/01/25	mar 21/01/25
36			RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	2 días	mar 21/01/25	jue 23/01/25
37			TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	2 días	mar 21/01/25	jue 23/01/25
38			SUB-BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y	1 día	lun 20/01/25	mar 21/01/25

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

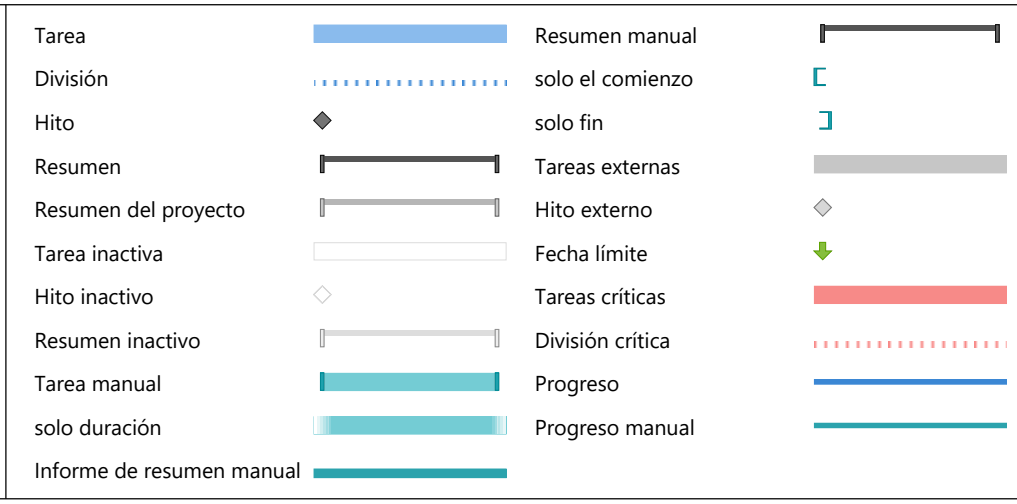


Id		Mo de tar	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
39			BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y	1 día	lun 20/01/25	mar 21/01/25
40			RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	1 día	mar 21/01/25	mié 22/01/25
41			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	1 día	mié 22/01/25	jue 23/01/25
42			TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	1 día	mié 22/01/25	jue 23/01/25
43			**PUENTE 3**			
44			LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	3 días	jue 06/02/25	mar 11/02/25
45			CAMPAMENTO DE 9 M2 CERRAMIENTO EN MADERA Y CUBIERTA EN TEJA ZINC	2 días	jue 06/02/25	lun 10/02/25
46			DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	7 días	lun 10/02/25	mié 19/02/25
47			TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	4 días	vie 14/02/25	jue 20/02/25
48			CANALIZACION RIO (BULLDOZER TIPO D8K CAT)	12 días	jue 20/02/25	lun 10/03/25
49			EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	8 días	lun 10/03/25	jue 20/03/25
50			MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 3" AUTOCEBANTE A GASOLINA	10 días	mié 19/03/25	mié 02/04/25
51			SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 Mpa (2000 PSI)	1 día	vie 28/03/25	lun 31/03/25
52			COLUMNAS, VIGAS O ESTRIBOS EN CONCRETO 27.6 Mpa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	28 días	lun 31/03/25	jue 08/05/25

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

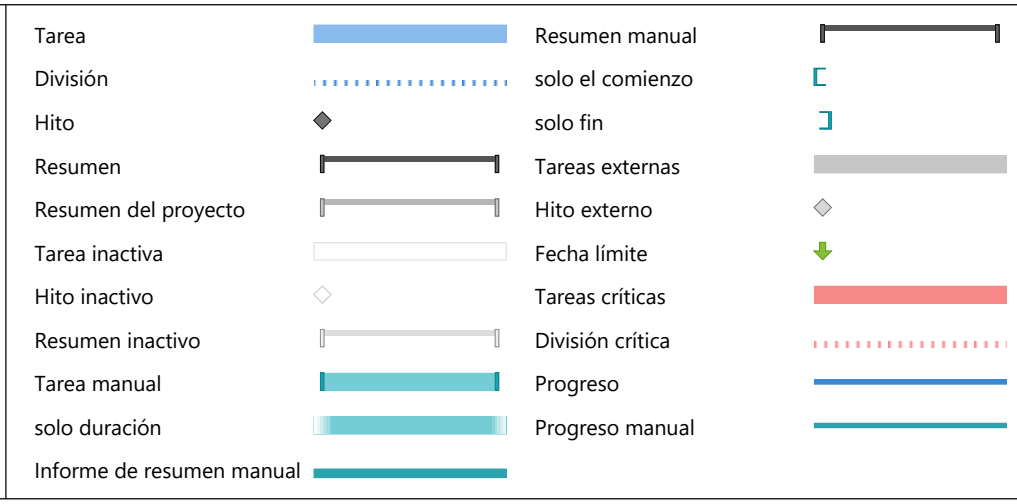


Id	Mo de tar	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
53		ACERO DE REFUERZO FY=4200 Mpa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	23 días	vie 28/03/25	mié 30/04/25
54		ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	1 día	jue 08/05/25	vie 09/05/25
55		ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	3 días	jue 08/05/25	mar 13/05/25
56		RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	2 días	mar 13/05/25	jue 15/05/25
57		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	2 días	mar 13/05/25	jue 15/05/25
58		SUB-BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y	1 día	mié 14/05/25	jue 15/05/25
59		BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y	1 día	mié 14/05/25	jue 15/05/25
60		RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	1 día	jue 15/05/25	vie 16/05/25
61		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	1 día	vie 16/05/25	lun 19/05/25
62		TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	1 día	vie 16/05/25	lun 19/05/25
63		**PUENTE 4**			
64		LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	3 días	mar 25/02/25	vie 28/02/25

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

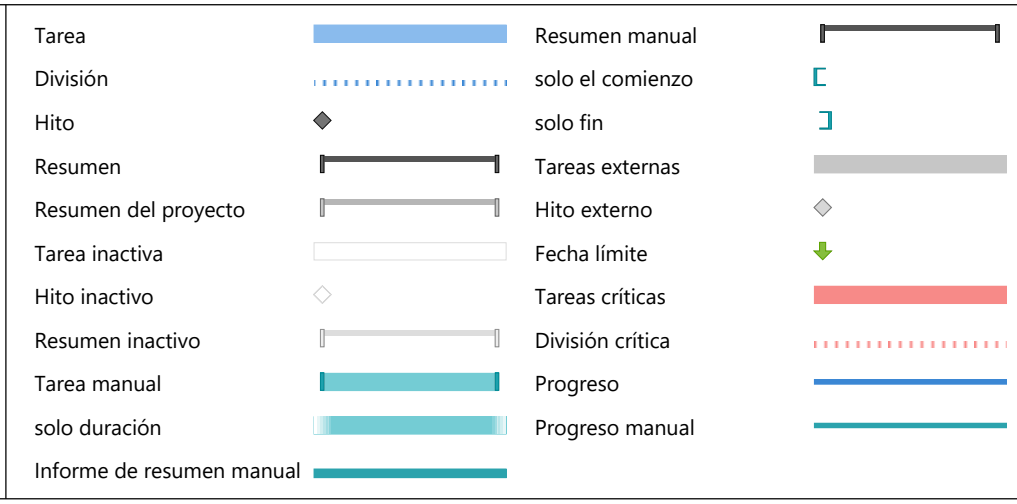


Id		Mc de tar	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
65			CAMPAMENTO DE 9 M2 CERRAMIENTO EN MADERA Y CUBIERTA EN TEJA ZINC	2 días	mar 25/02/25	jue 27/02/25
66			DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	7 días	vie 28/02/25	mar 11/03/25
67			TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	4 días	jue 06/03/25	mié 12/03/25
68			CANALIZACION RIO (BULLDOZER TIPO D8K CAT)	12 días	mié 12/03/25	vie 28/03/25
69			EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	8 días	vie 28/03/25	mié 09/04/25
70			MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 3" AUTOCEBANTE A GASOLINA	10 días	mar 08/04/25	mar 22/04/25
71			SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 Mpa (2000 PSI)	1 día	jue 17/04/25	vie 18/04/25
72			COLUMNAS, VIGAS O ESTRIBOS EN CONCRETO 27.6 Mpa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	28 días	vie 18/04/25	mié 28/05/25
73			ACERO DE REFUERZO FY=4200 Mpa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	23 días	jue 17/04/25	mar 20/05/25
74			APOYO ELASTOMÉRICO EN NEOPRENO 30X30X5 CM DUREZA 60 CON REFUERZOS 1/8". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1 día	jue 22/05/25	vie 23/05/25
75			ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	1 día	mié 28/05/25	jue 29/05/25
76			ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	3 días	mié 28/05/25	lun 02/06/25

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

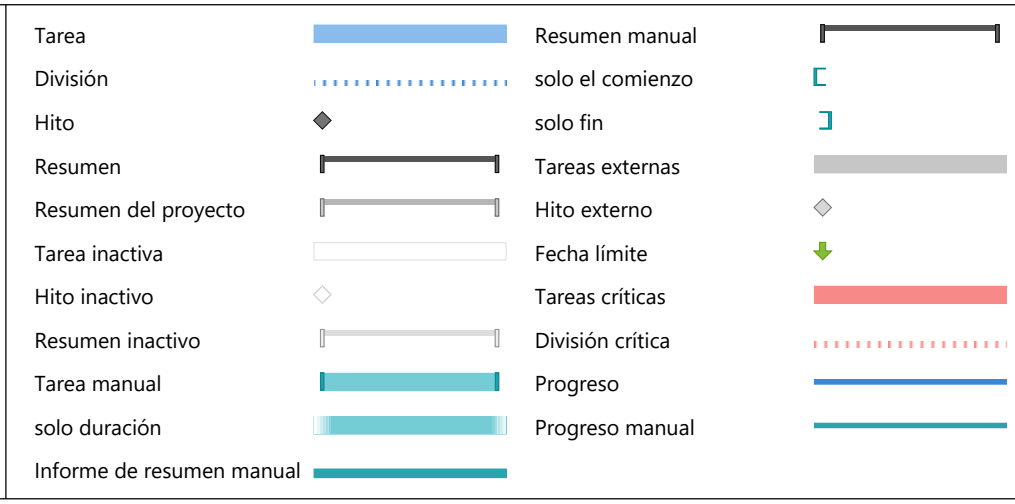


Id	Mo de tar	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
77		RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	2 días	lun 02/06/25	mié 04/06/25
78		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	2 días	lun 02/06/25	mié 04/06/25
79		SUB-BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y	1 día	mar 03/06/25	mié 04/06/25
80		BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y	1 día	mar 03/06/25	mié 04/06/25
81		RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	1 día	mié 04/06/25	jue 05/06/25
82		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	1 día	jue 05/06/25	vie 06/06/25
83		TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	1 día	jue 05/06/25	vie 06/06/25
84		**PUENTE 5**			
85		LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	3 días	vie 20/06/25	mié 25/06/25
86		CAMPAMENTO DE 9 M2 CERRAMIENTO EN MADERA Y CUBIERTA EN TEJA ZINC	2 días	vie 20/06/25	mar 24/06/25
87		DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	7 días	mar 24/06/25	jue 03/07/25
88		TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	4 días	lun 30/06/25	vie 04/07/25
89		CANALIZACION RIO (BULLDOZER TIPO D8K CAT)	12 días	vie 04/07/25	mar 22/07/25
90		EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	6 días	mar 22/07/25	mié 30/07/25

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

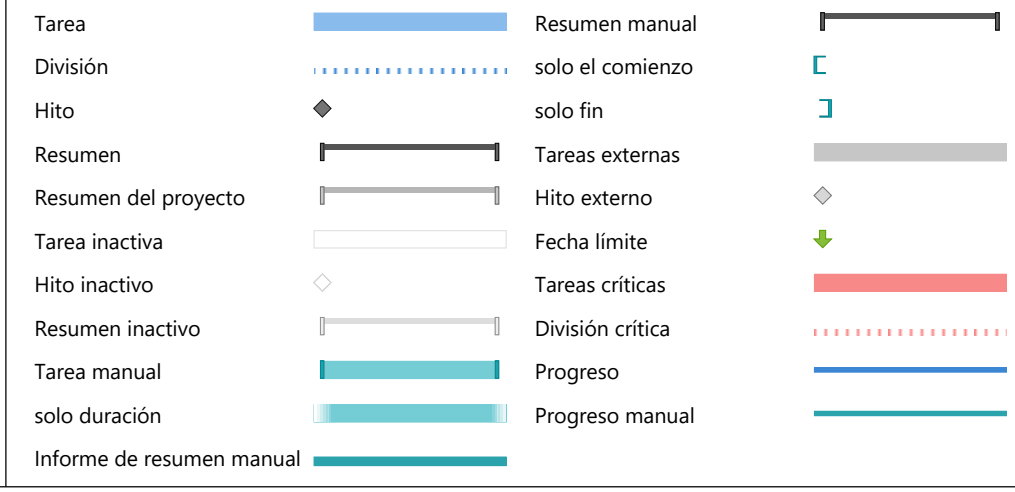


Id		Modo de tar	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
91			MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 3" AUTOCEBANTE A GASOLINA	10 días	mar 29/07/25	mar 12/08/25
92			SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 Mpa (2000 PSI)	1 día	jue 07/08/25	vie 08/08/25
93			COLUMNAS, VIGAS O ESTRIBOS EN CONCRETO 27.6 Mpa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	28 días	vie 08/08/25	mié 17/09/25
94			ACERO DE REFUERZO FY=4200 Mpa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	23 días	jue 07/08/25	mar 09/09/25
95			APOYO ELASTOMÉRICO EN NEOPRENO 30X30X5 CM DUREZA 60 CON REFUERZOS 1/8". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1 día	jue 11/09/25	vie 12/09/25
96			ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	1 día	vie 12/09/25	lun 15/09/25
97			ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	3 días	vie 12/09/25	mié 17/09/25
98			RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	2 días	mié 17/09/25	vie 19/09/25
99			TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	2 días	mié 17/09/25	vie 19/09/25
100			SUB-BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y	1 día	jue 18/09/25	vie 19/09/25
101			BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y	1 día	jue 18/09/25	vie 19/09/25


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

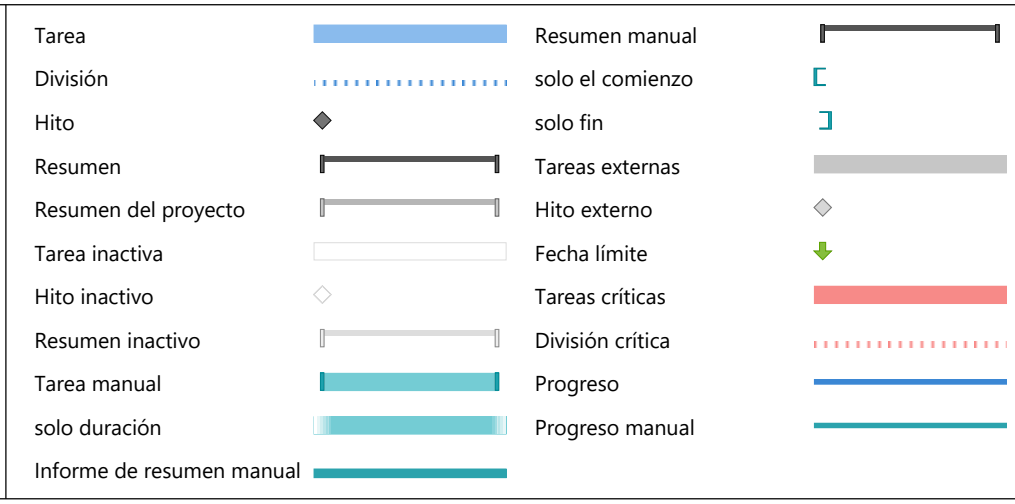

Id		Mo de tar	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
102			RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	1 día	vie 19/09/25	lun 22/09/25
103			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	1 día	lun 22/09/25	mar 23/09/25
104			TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	1 día	lun 22/09/25	mar 23/09/25


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

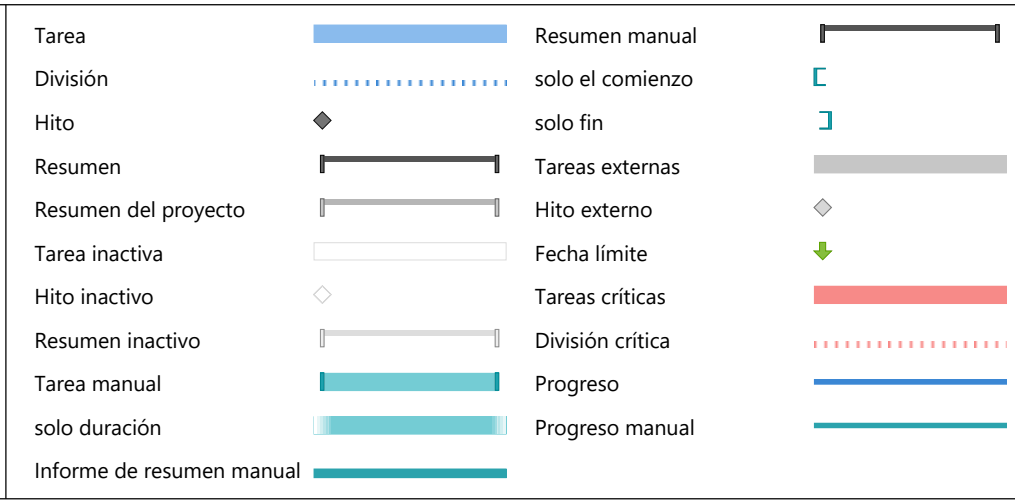

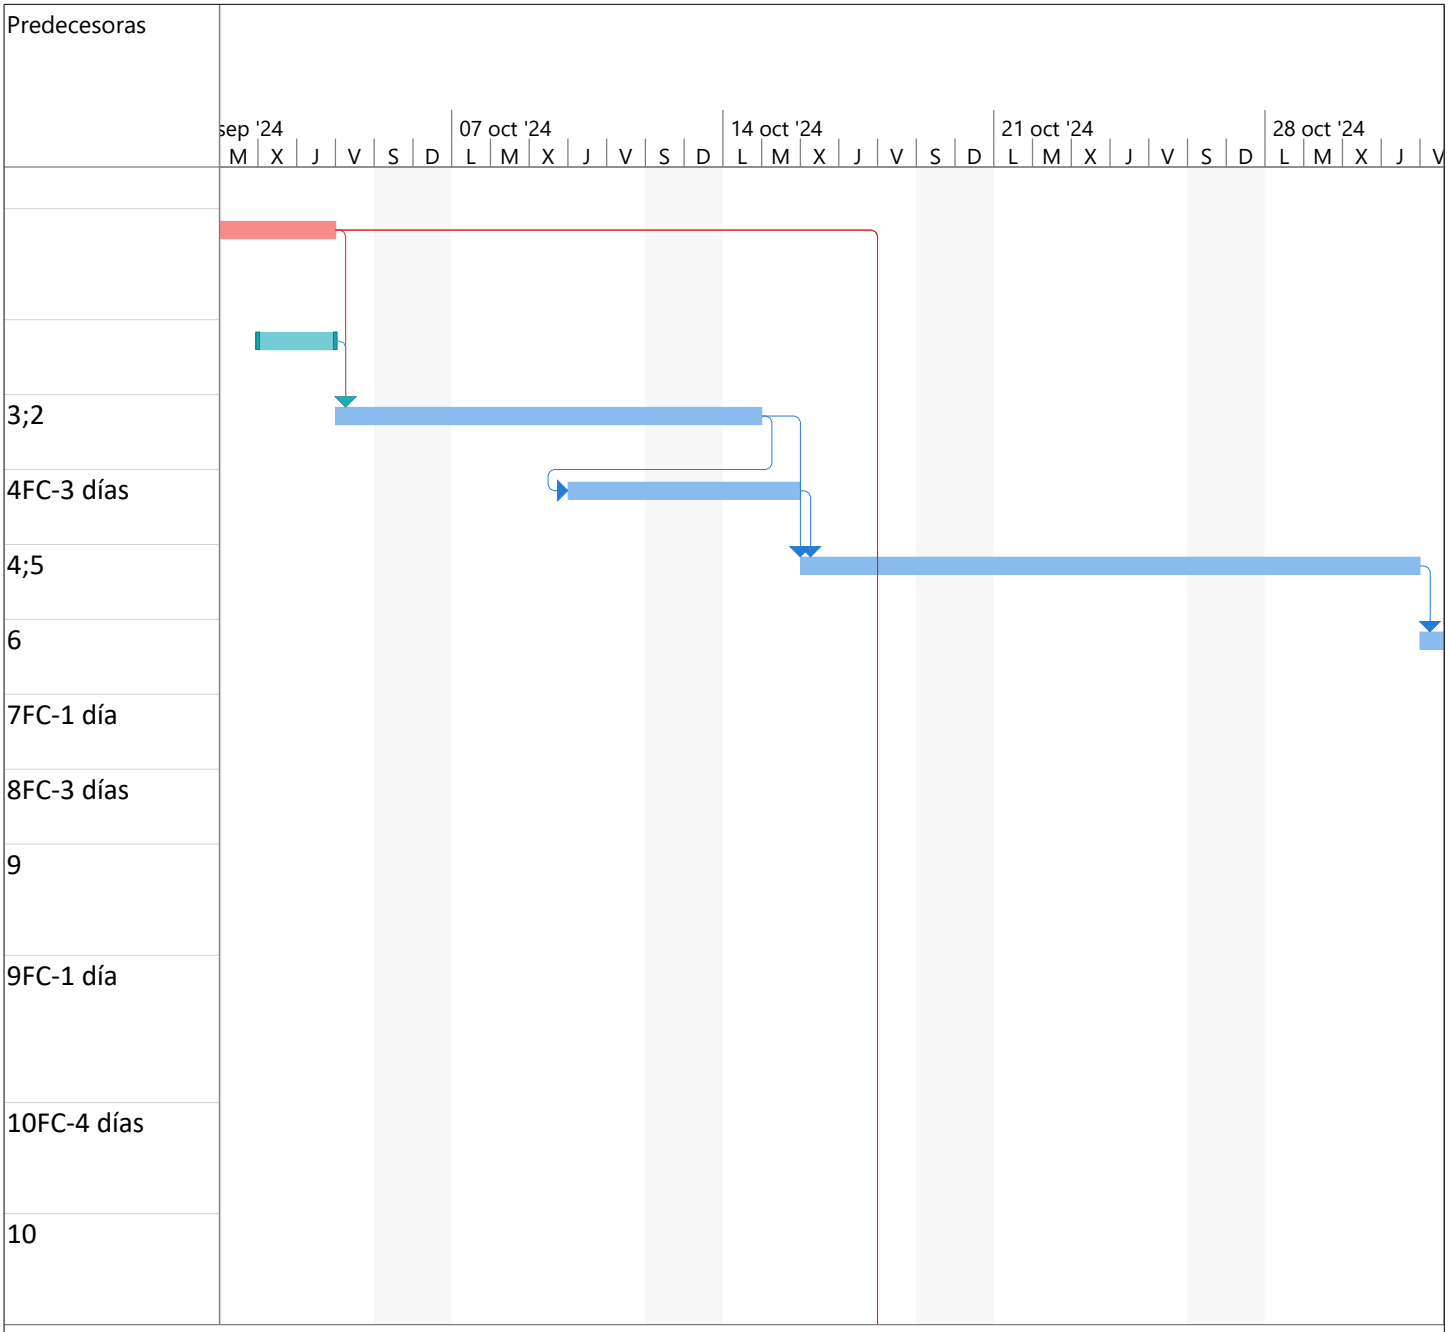


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

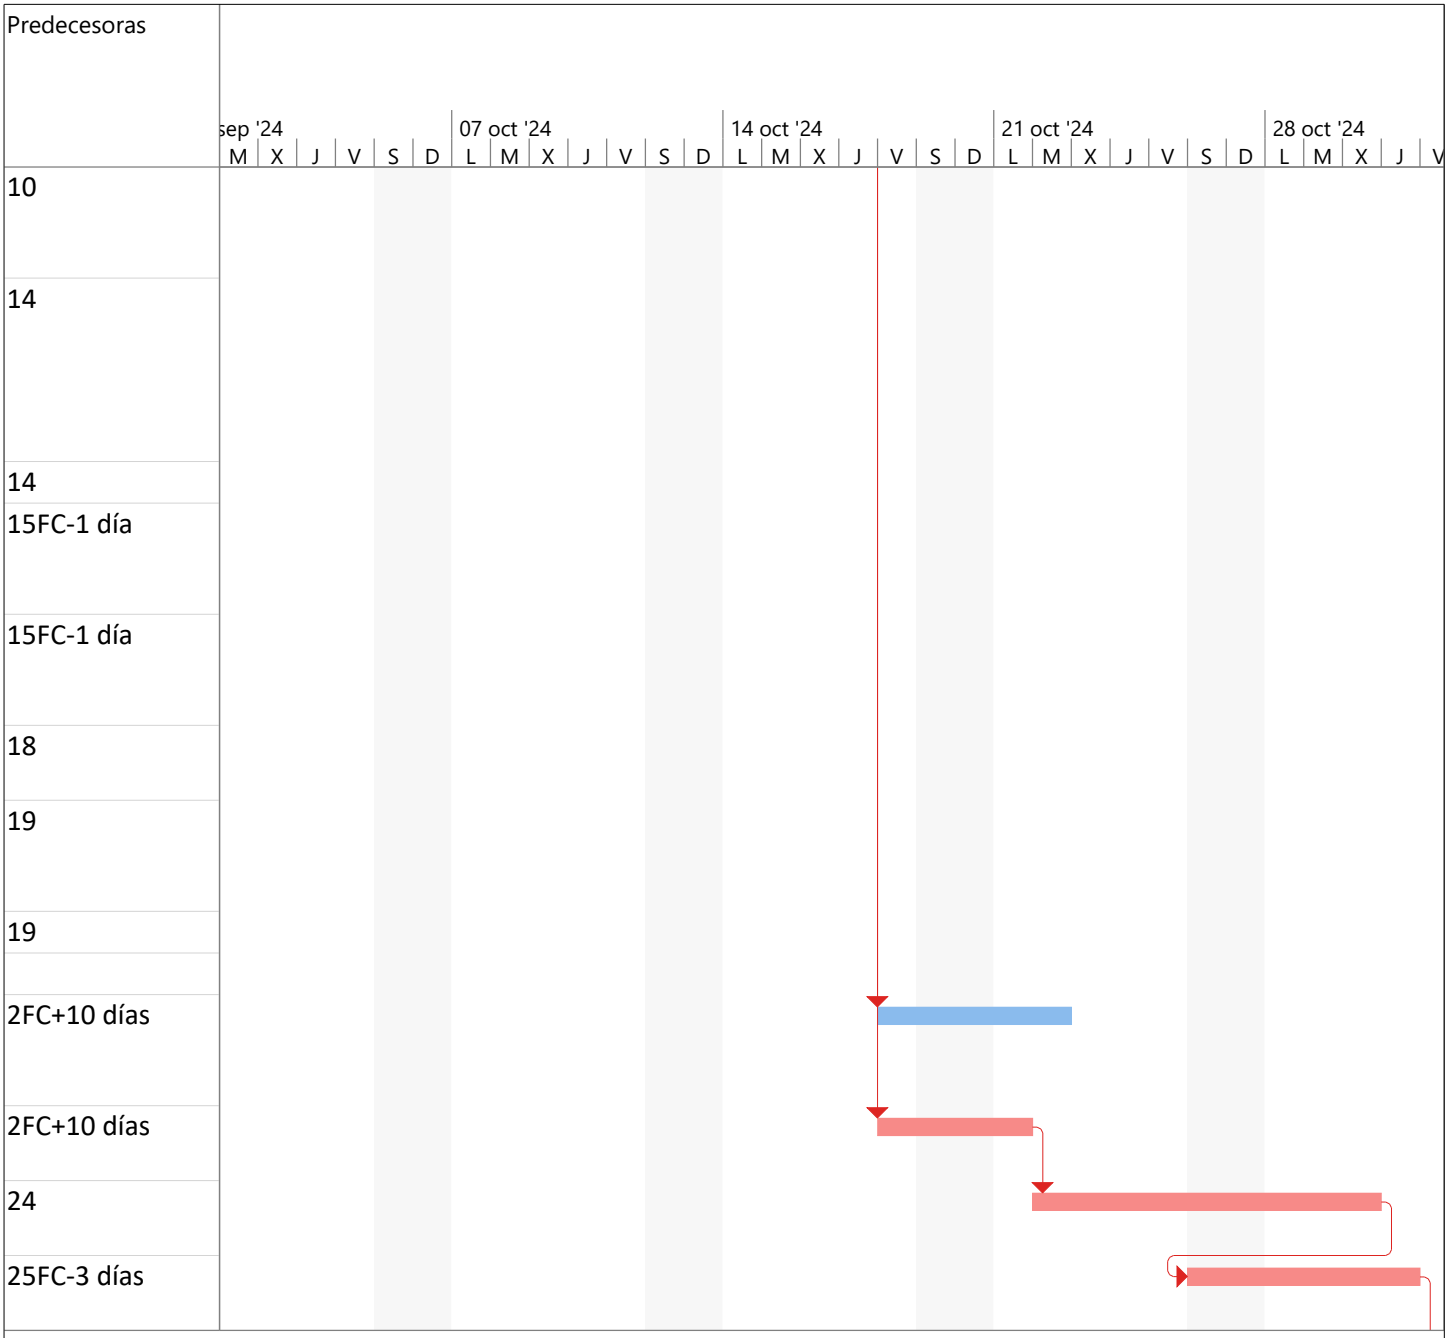

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

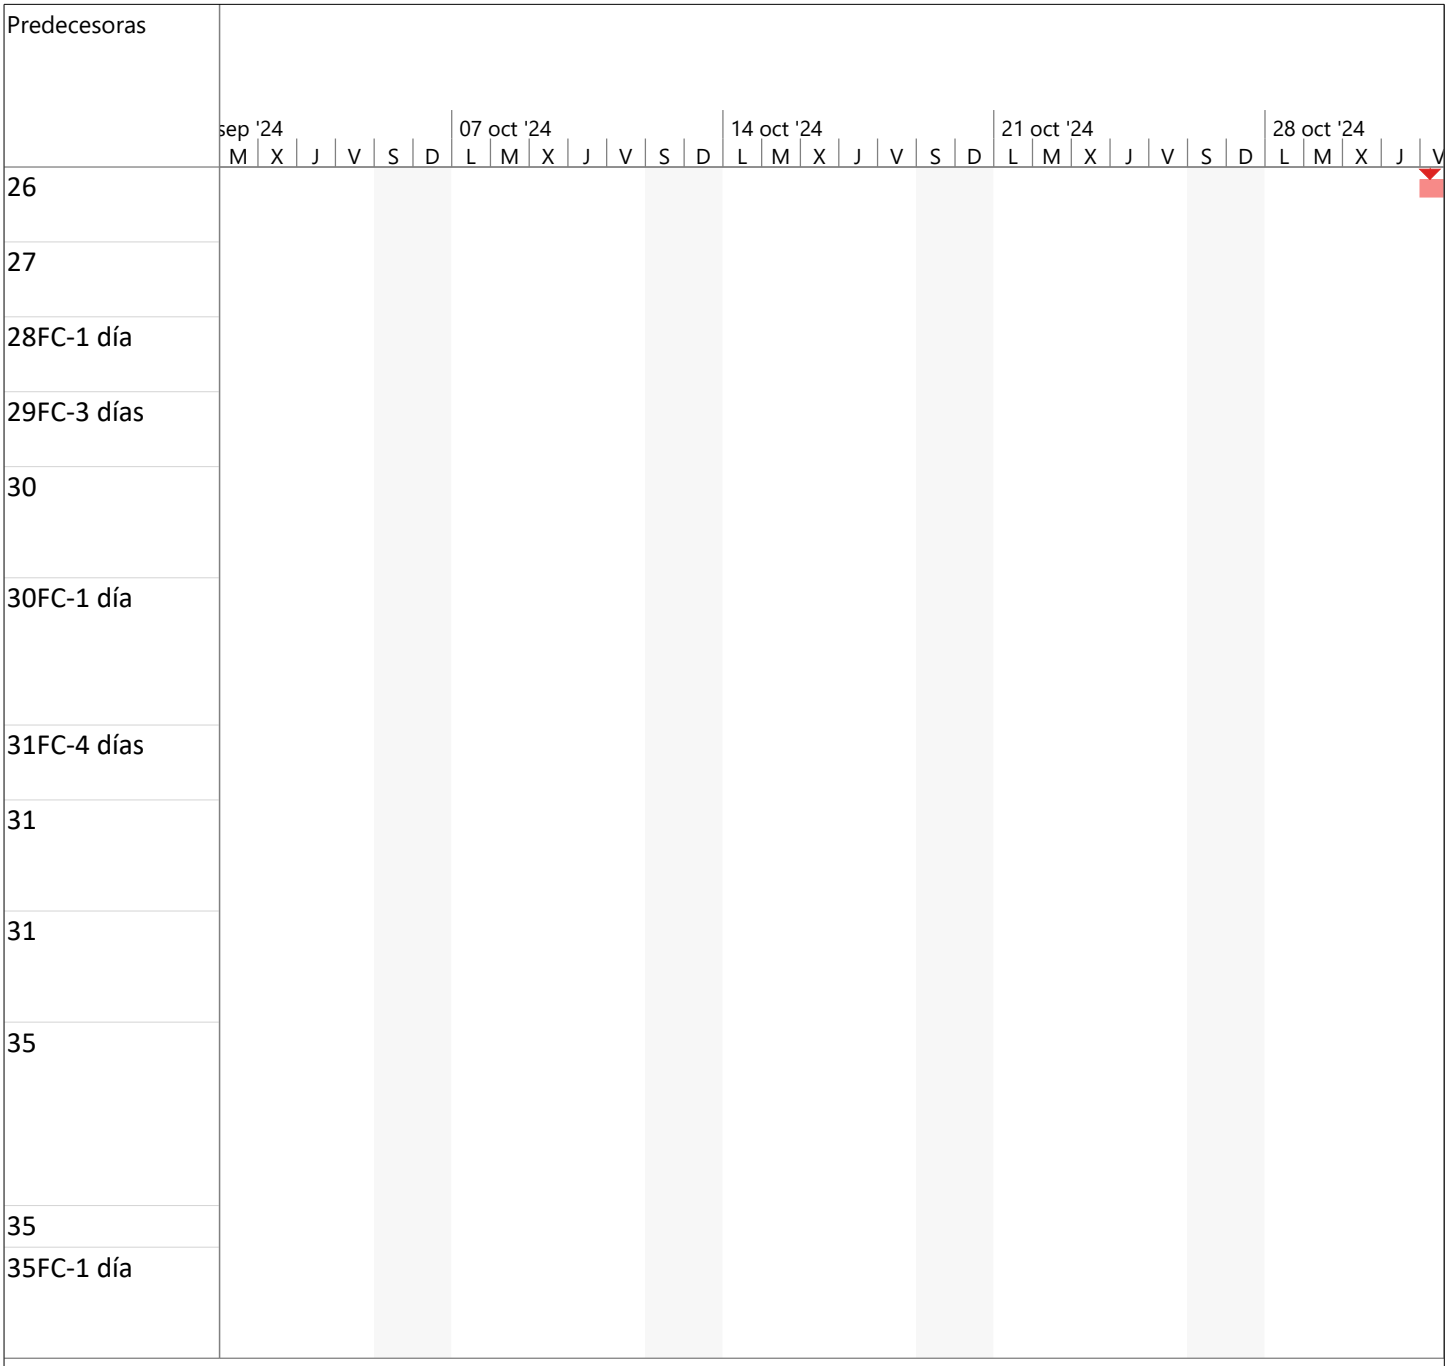


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			


Predecesoras	sep '24 M X J V S D	07 oct '24 L M X J V S D	14 oct '24 L M X J V S D	21 oct '24 L M X J V S D	28 oct '24 L M X J V
35FC-1 día					
39					
40					
40					
42FC+10 días					
42FC+10 días					
45					
46FC-3 días					
47					
48					
49FC-1 día					
50FC-3 días					
51					

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

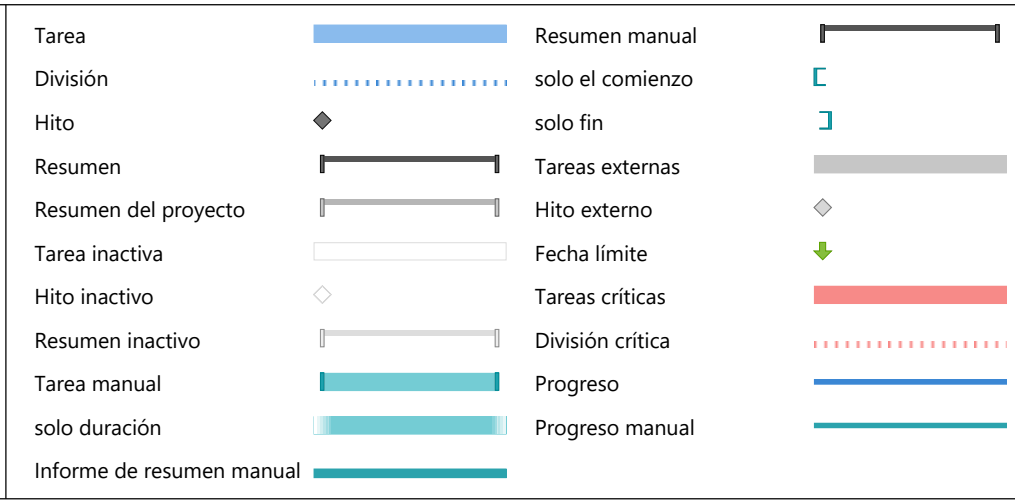

Predecesoras	sep '24 M X J V S D	07 oct '24 L M X J V S D	14 oct '24 L M X J V S D	21 oct '24 L M X J V S D	28 oct '24 L M X J V
51FC-1 día					
52					
52					
55					
55					
56FC-1 día					
56FC-1 día					
59					
60					
60					
44FC+10 días					

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

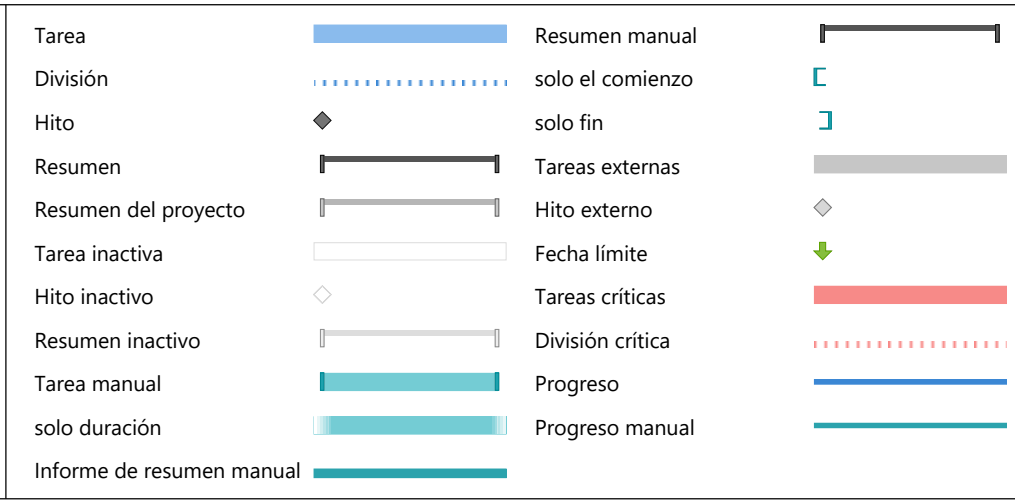


Predecesoras	sep '24 M X J V S D	07 oct '24 L M X J V S D	14 oct '24 L M X J V S D	21 oct '24 L M X J V S D	28 oct '24 L M X J V
44FC+10 días					
64;65					
66FC-3 días					
67					
68					
69FC-1 día					
70FC-3 días					
71					
71FC-1 día					
72FC-4 días					
72					
72					

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

Predecesoras	sep '24 M X J V S D	07 oct '24 L M X J V S D	14 oct '24 L M X J V S D	21 oct '24 L M X J V S D	28 oct '24 L M X J V
76					
76					
77FC-1 día					
77FC-1 día					
80					
81					
81					
83FC+10 días					
83FC+10 días					
86					
87FC-3 días					
88					
89					

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

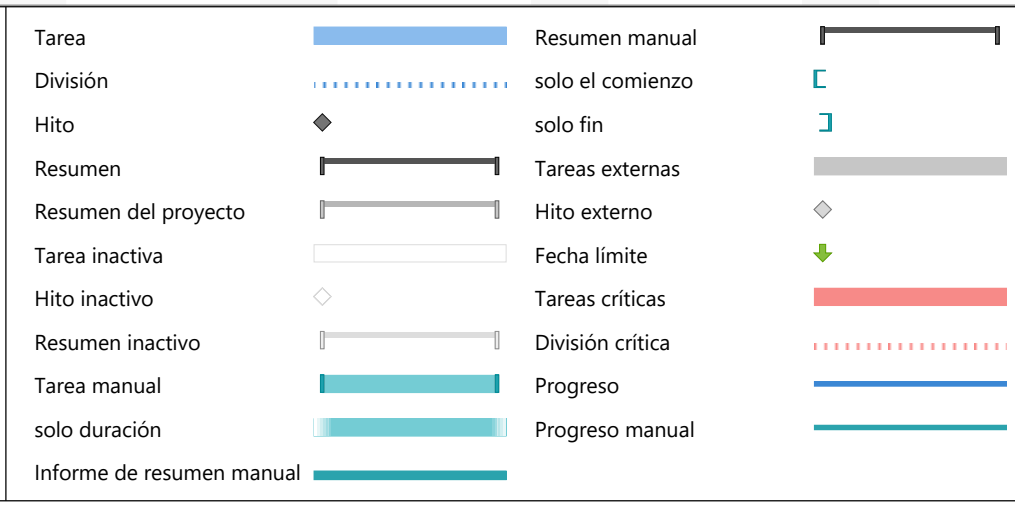


Predecesoras	sep '24 M X J V S D	07 oct '24 L M X J V S D	14 oct '24 L M X J V S D	21 oct '24 L M X J V S D	28 oct '24 L M X J V
90FC-1 día					
91FC-3 días					
92					
92FC-1 día					
93FC-4 días					
95					
95					
97					
97					
98FC-1 día					
98FC-1 día					


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

Predecesoras	sep '24 M X J V S D	07 oct '24 L M X J V S D	14 oct '24 L M X J V S D	21 oct '24 L M X J V S D	28 oct '24 L M X J V
101					
102					
102					


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

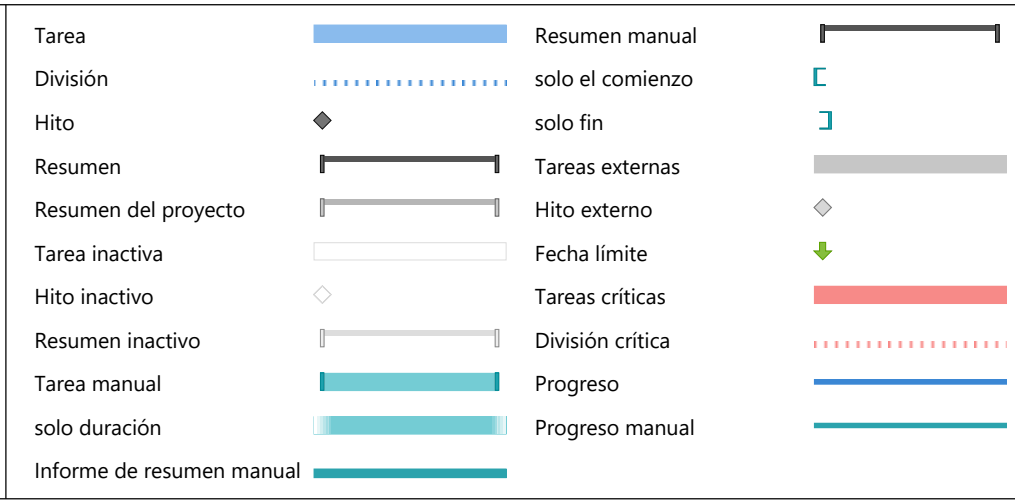

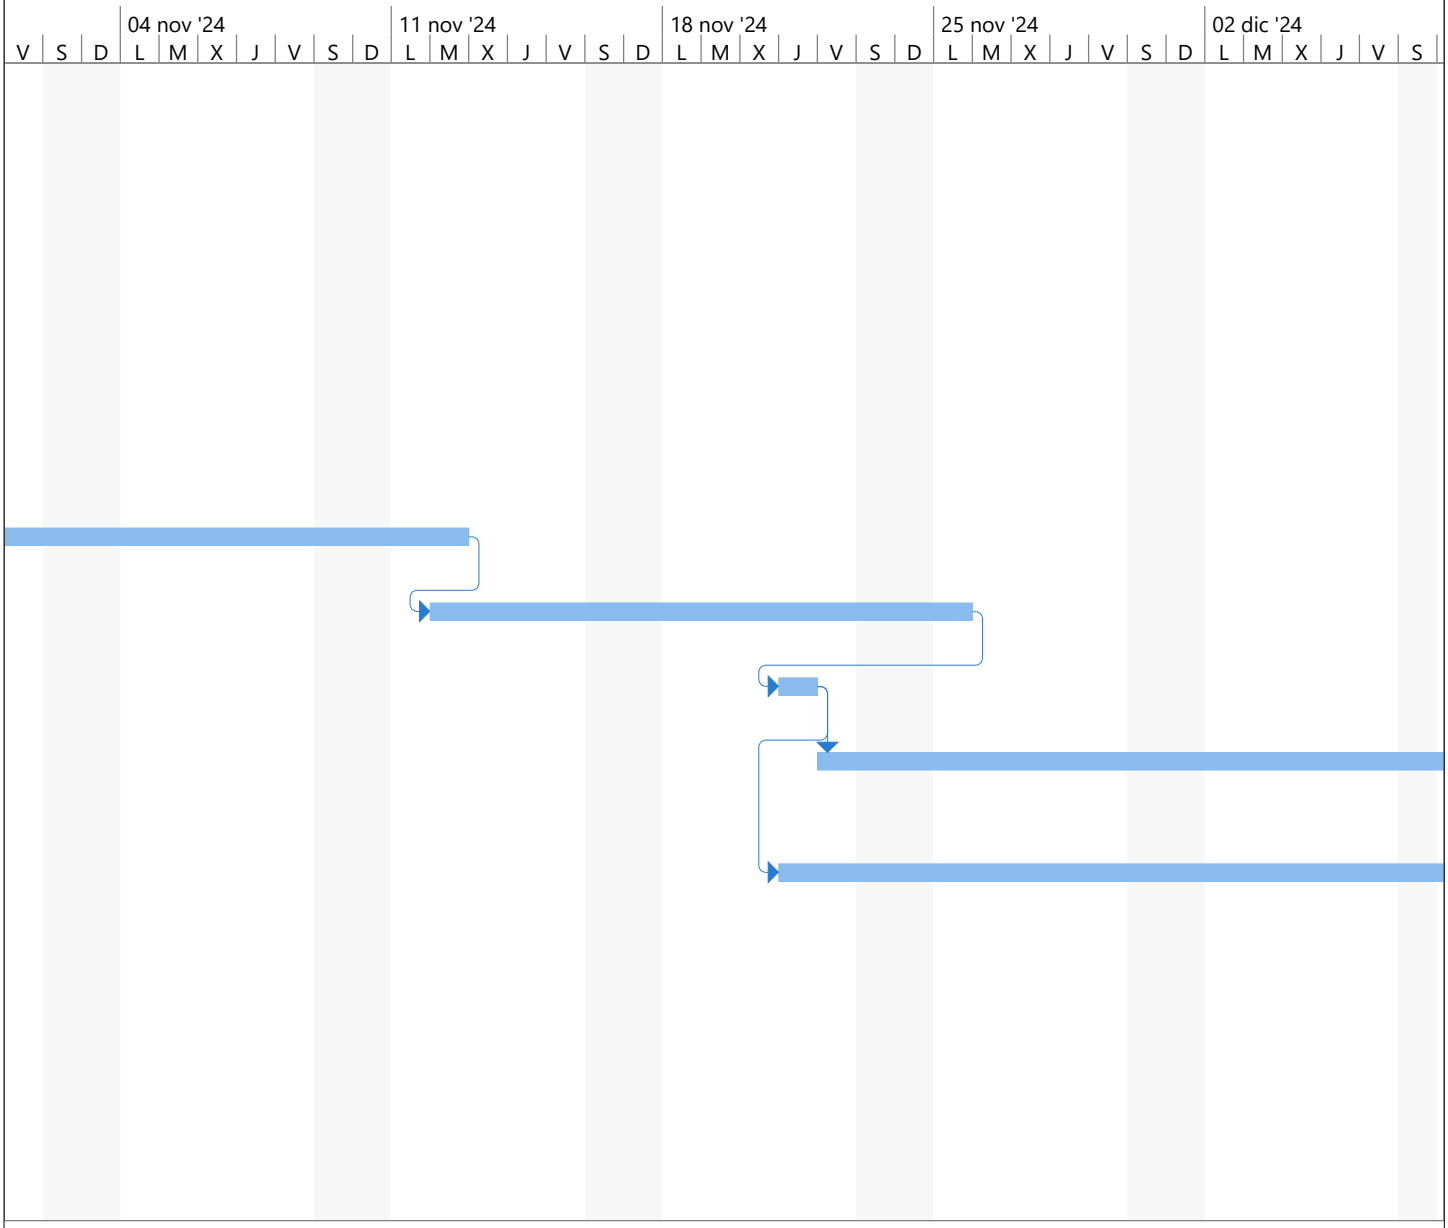


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

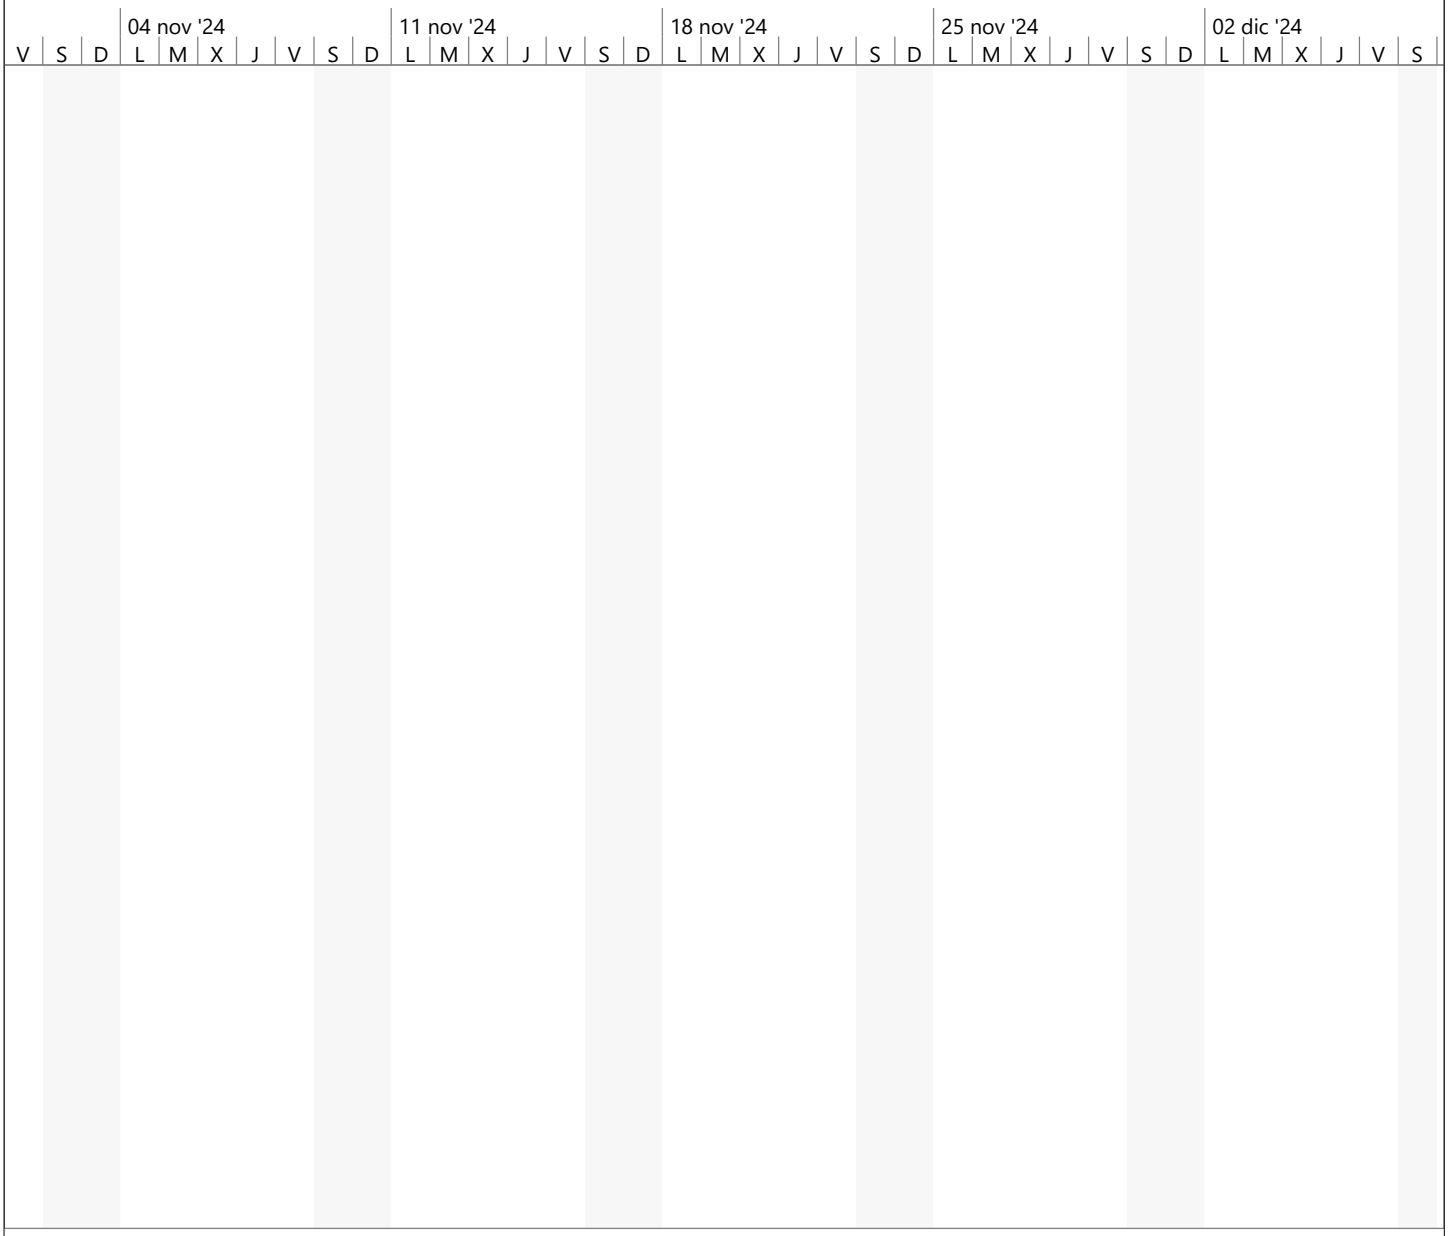


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

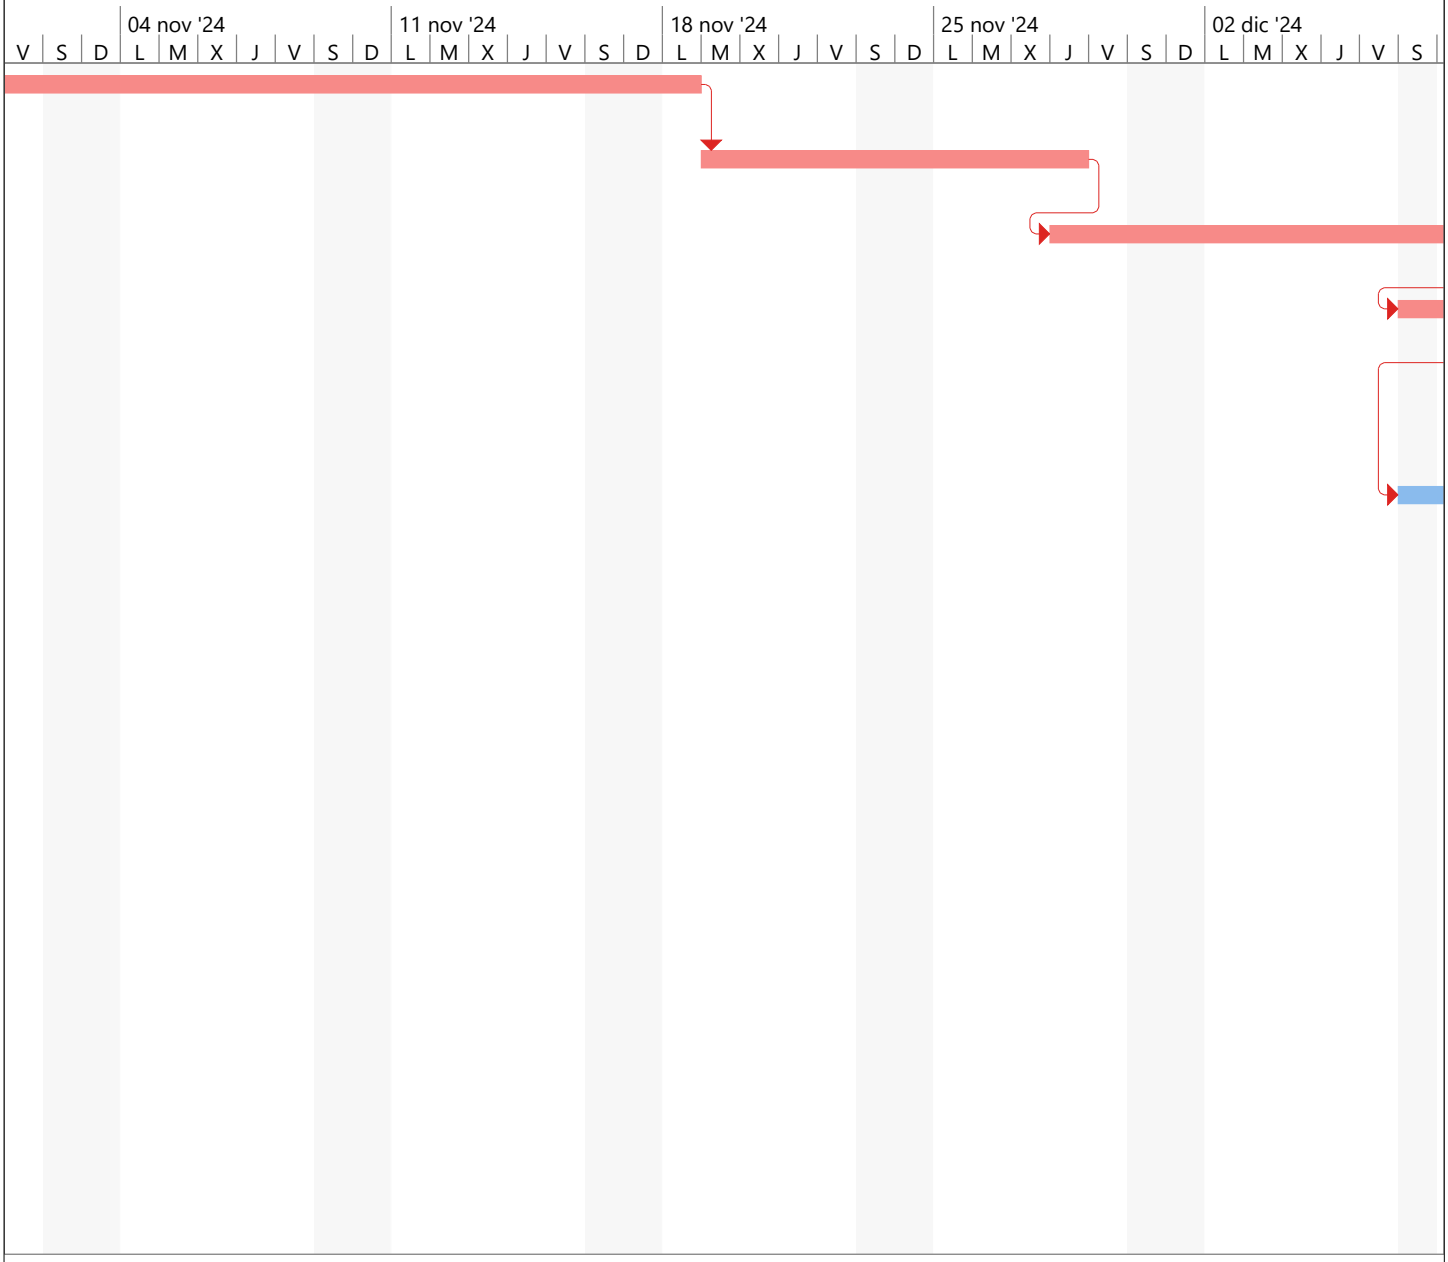


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

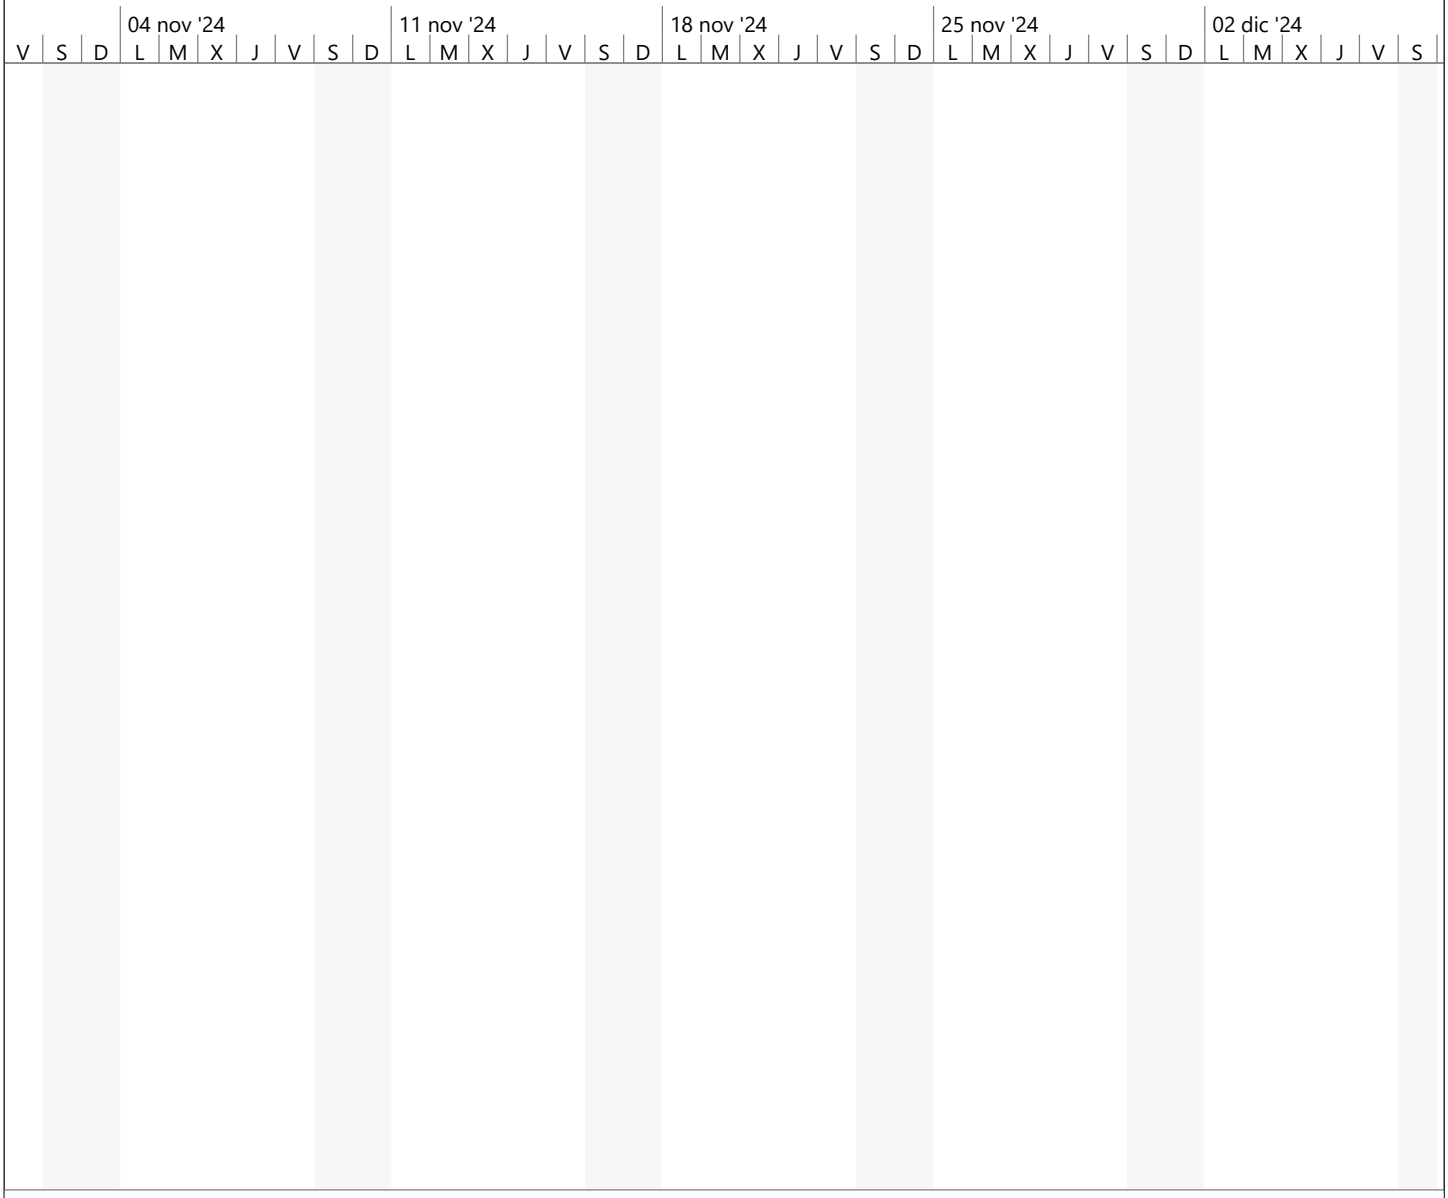


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

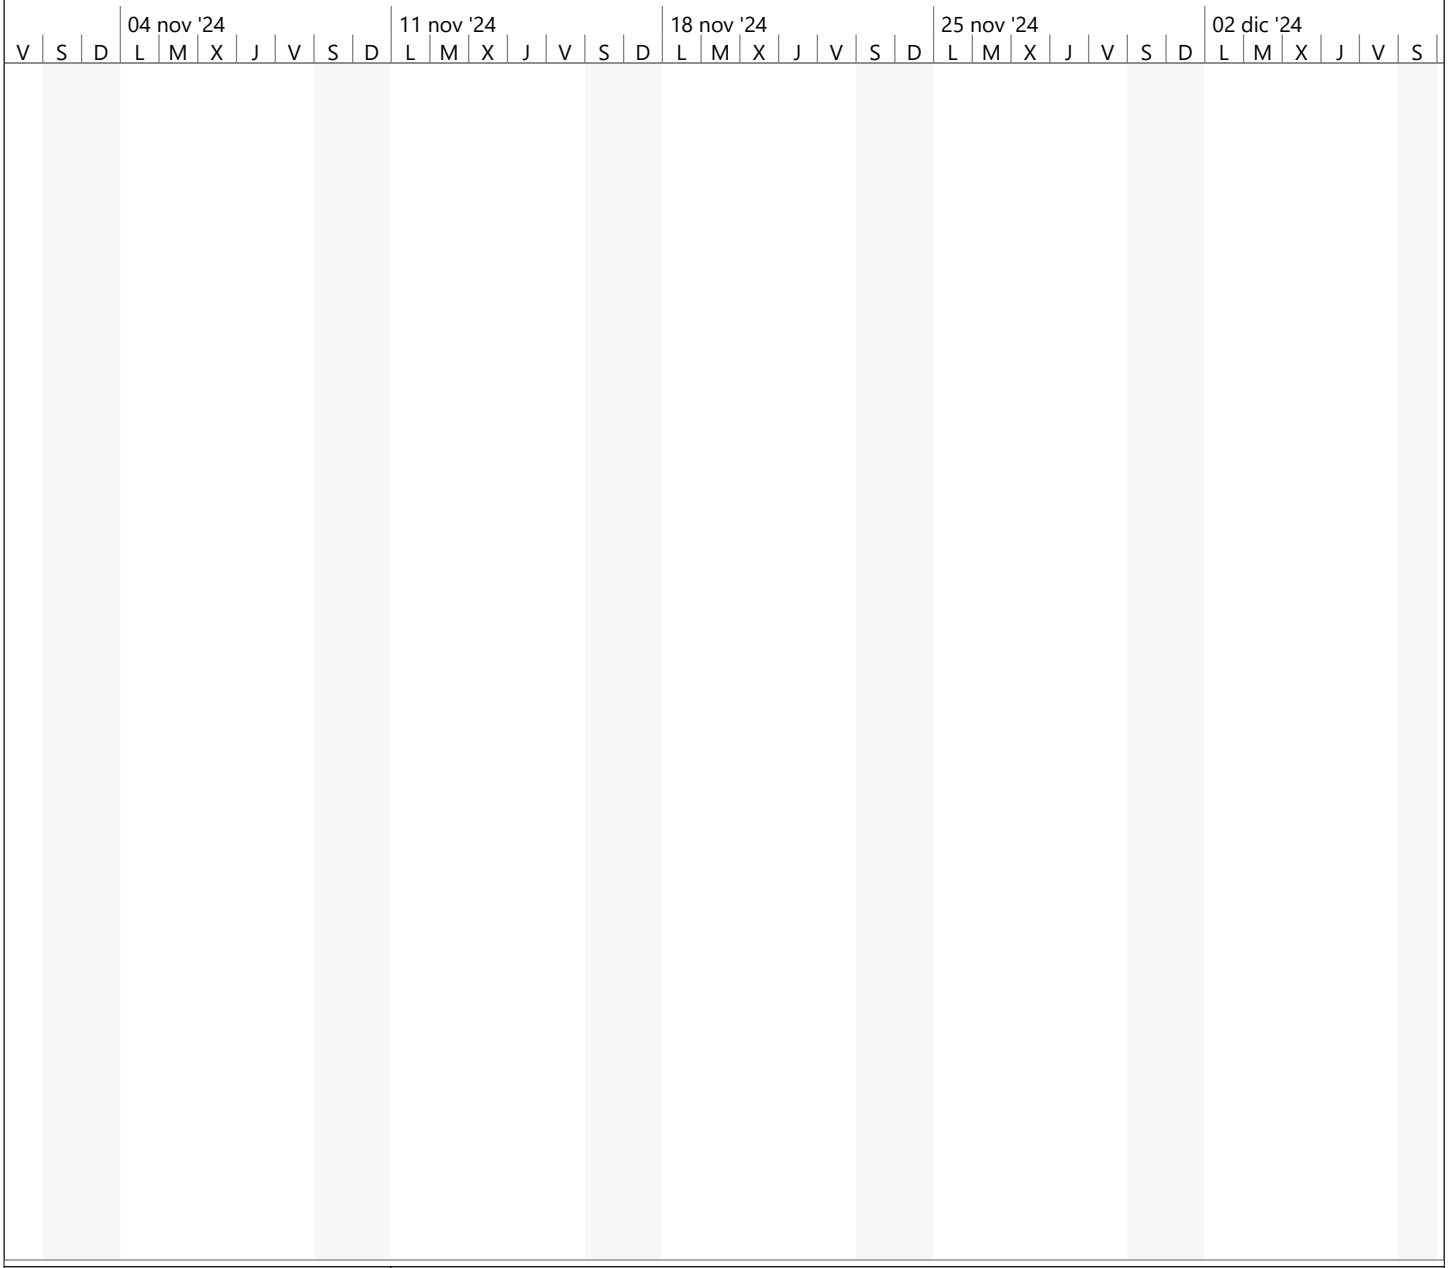


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

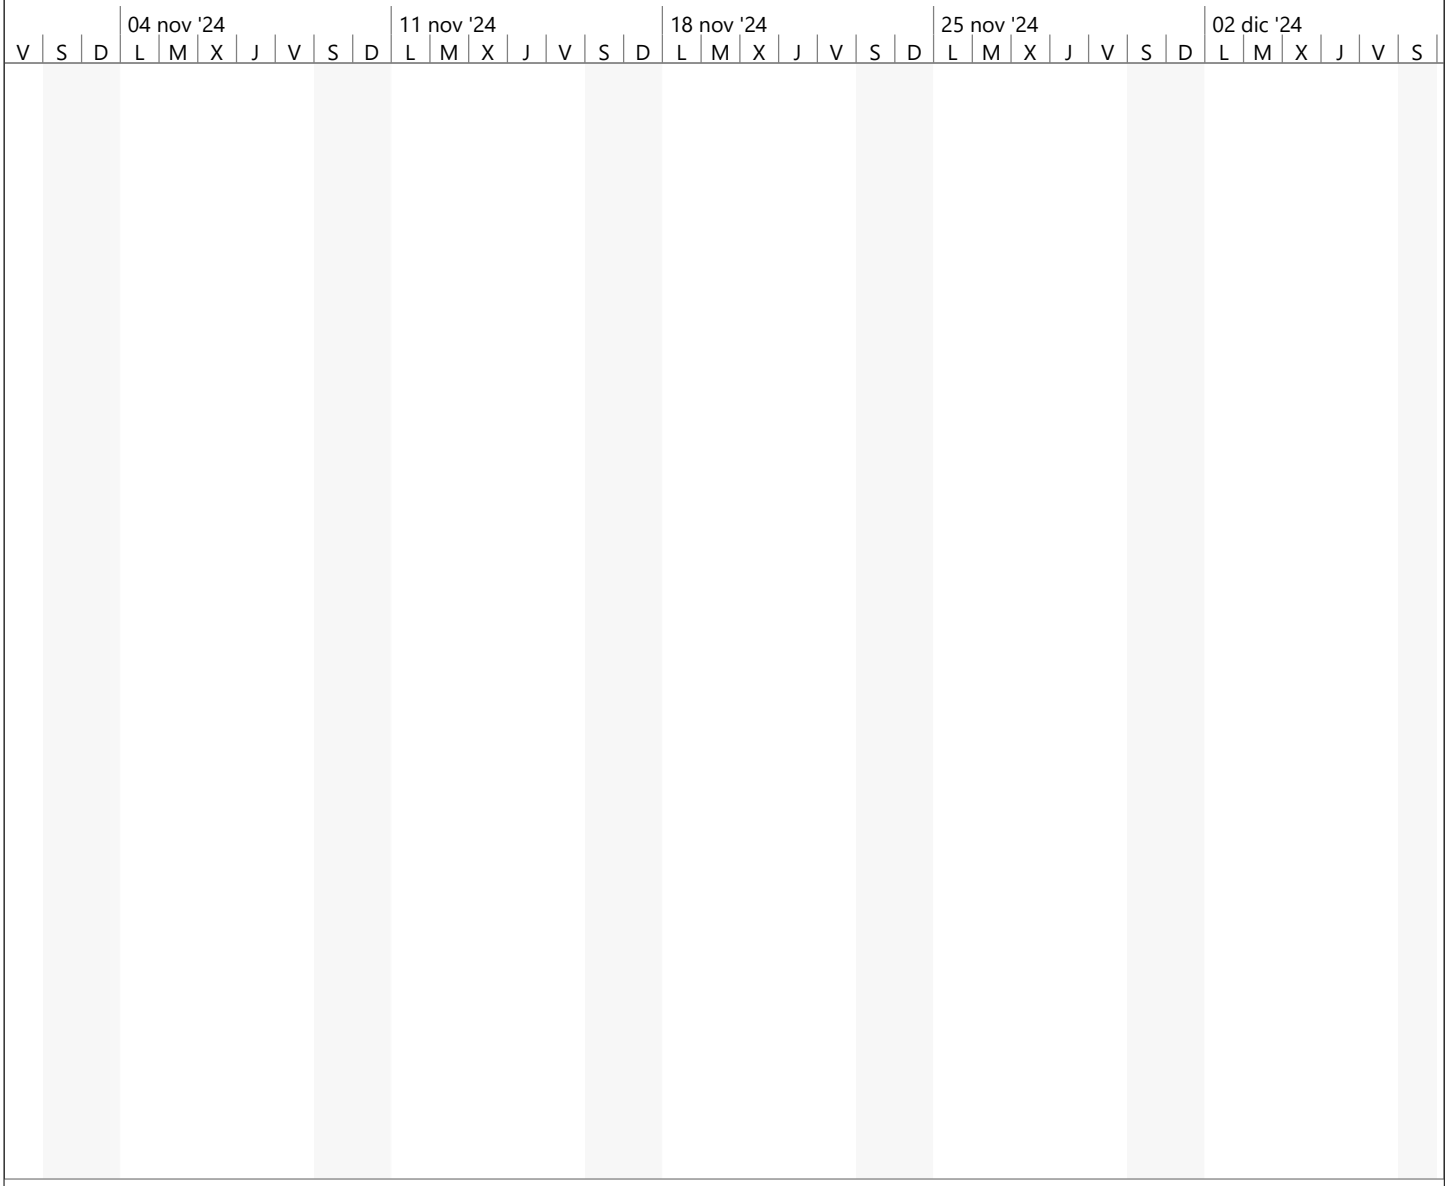


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

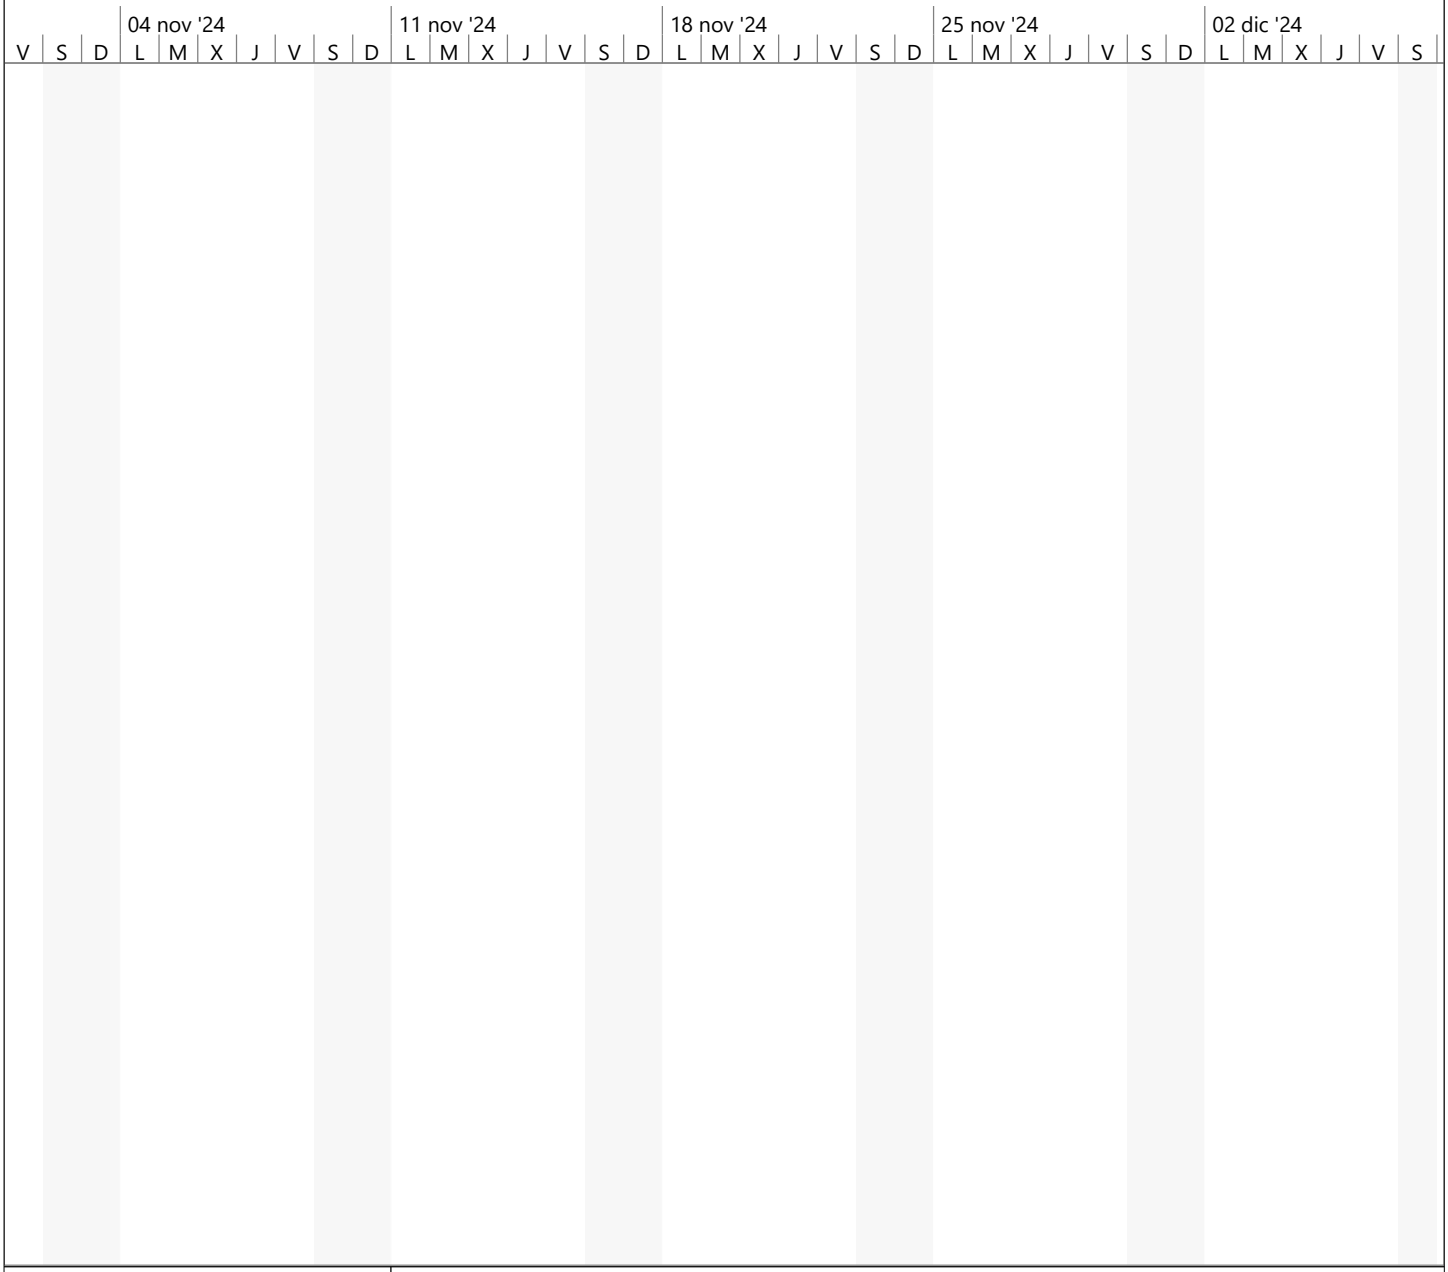


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

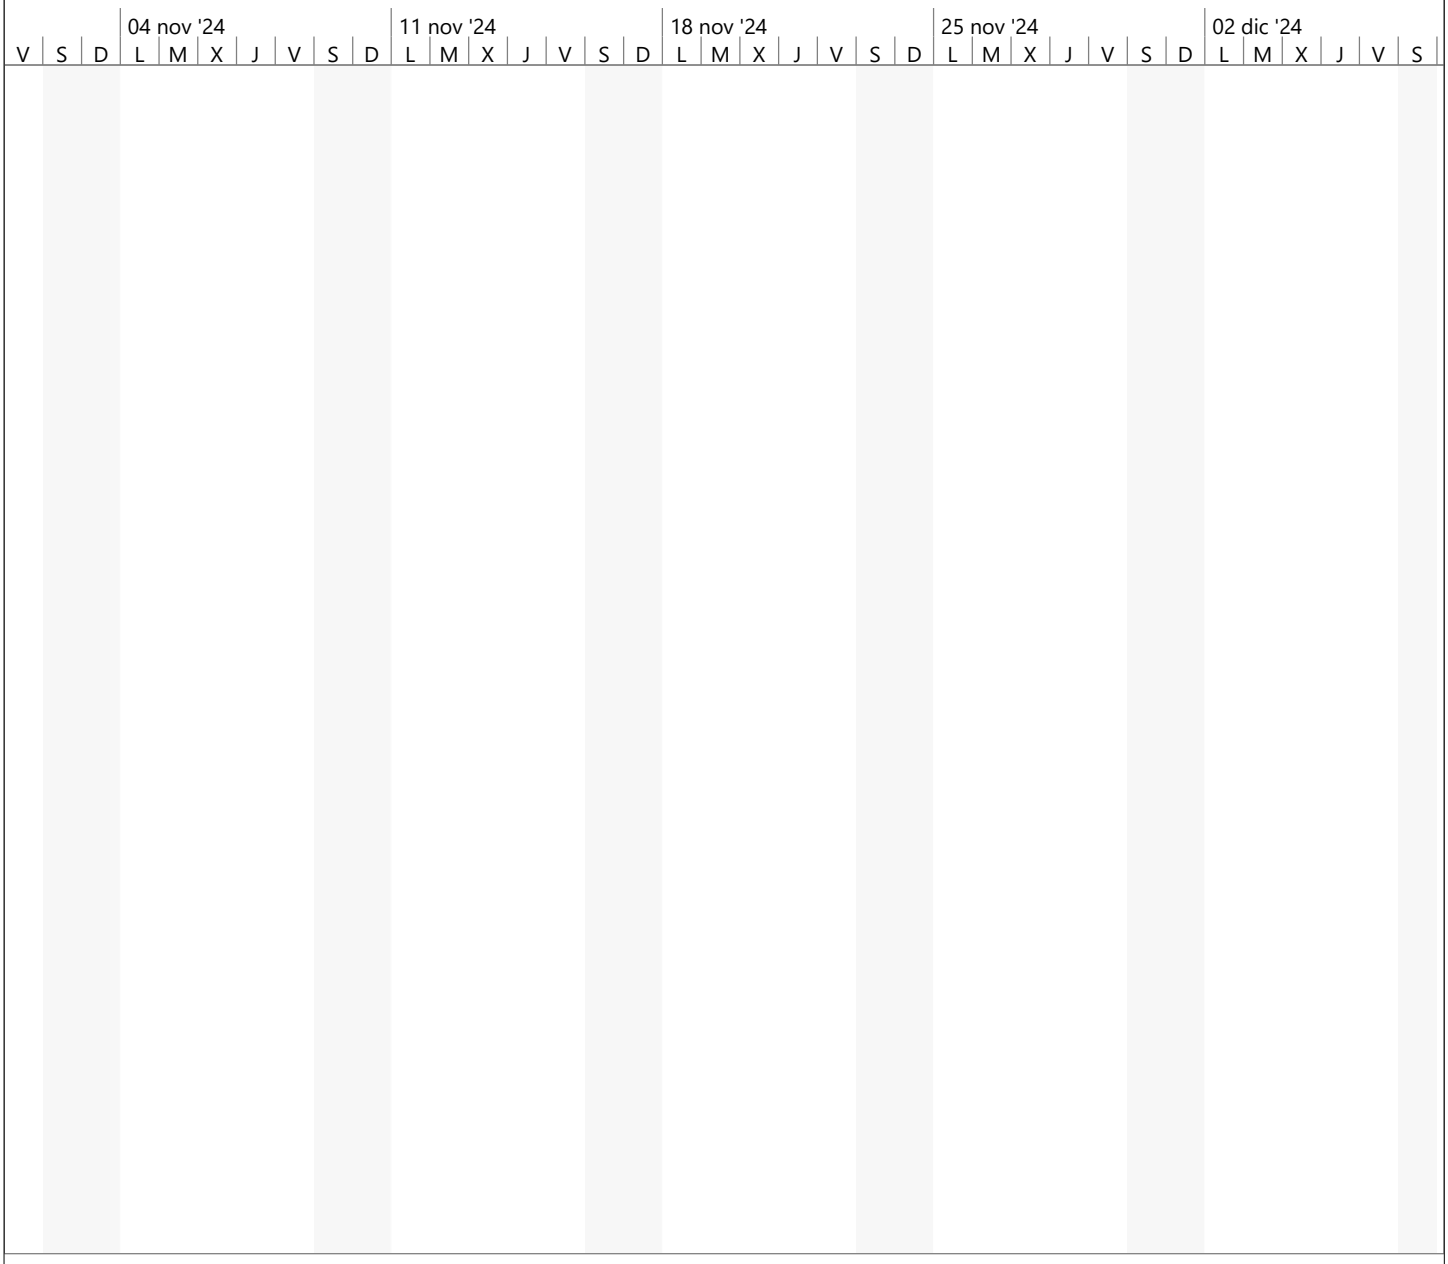


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

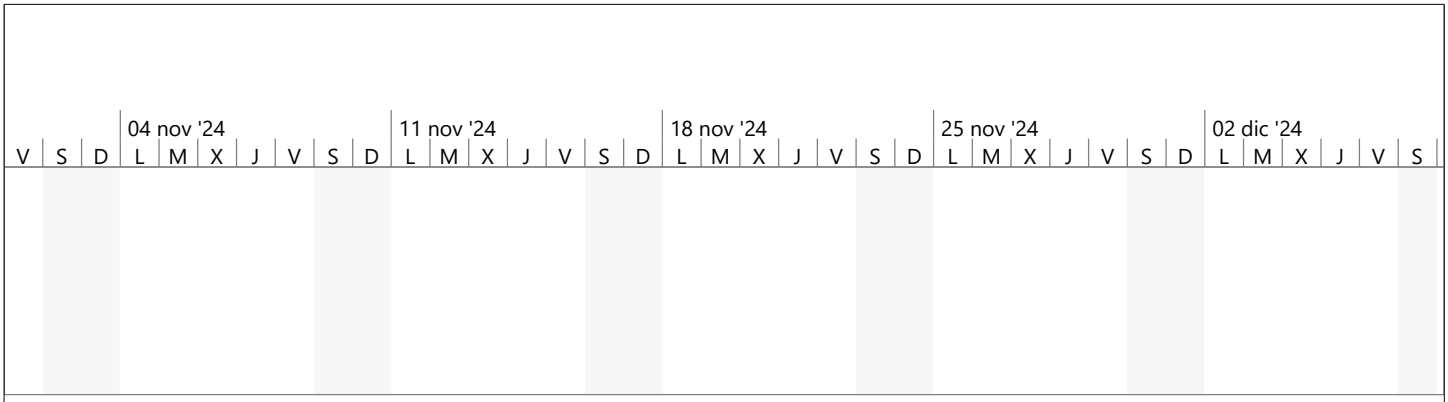


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

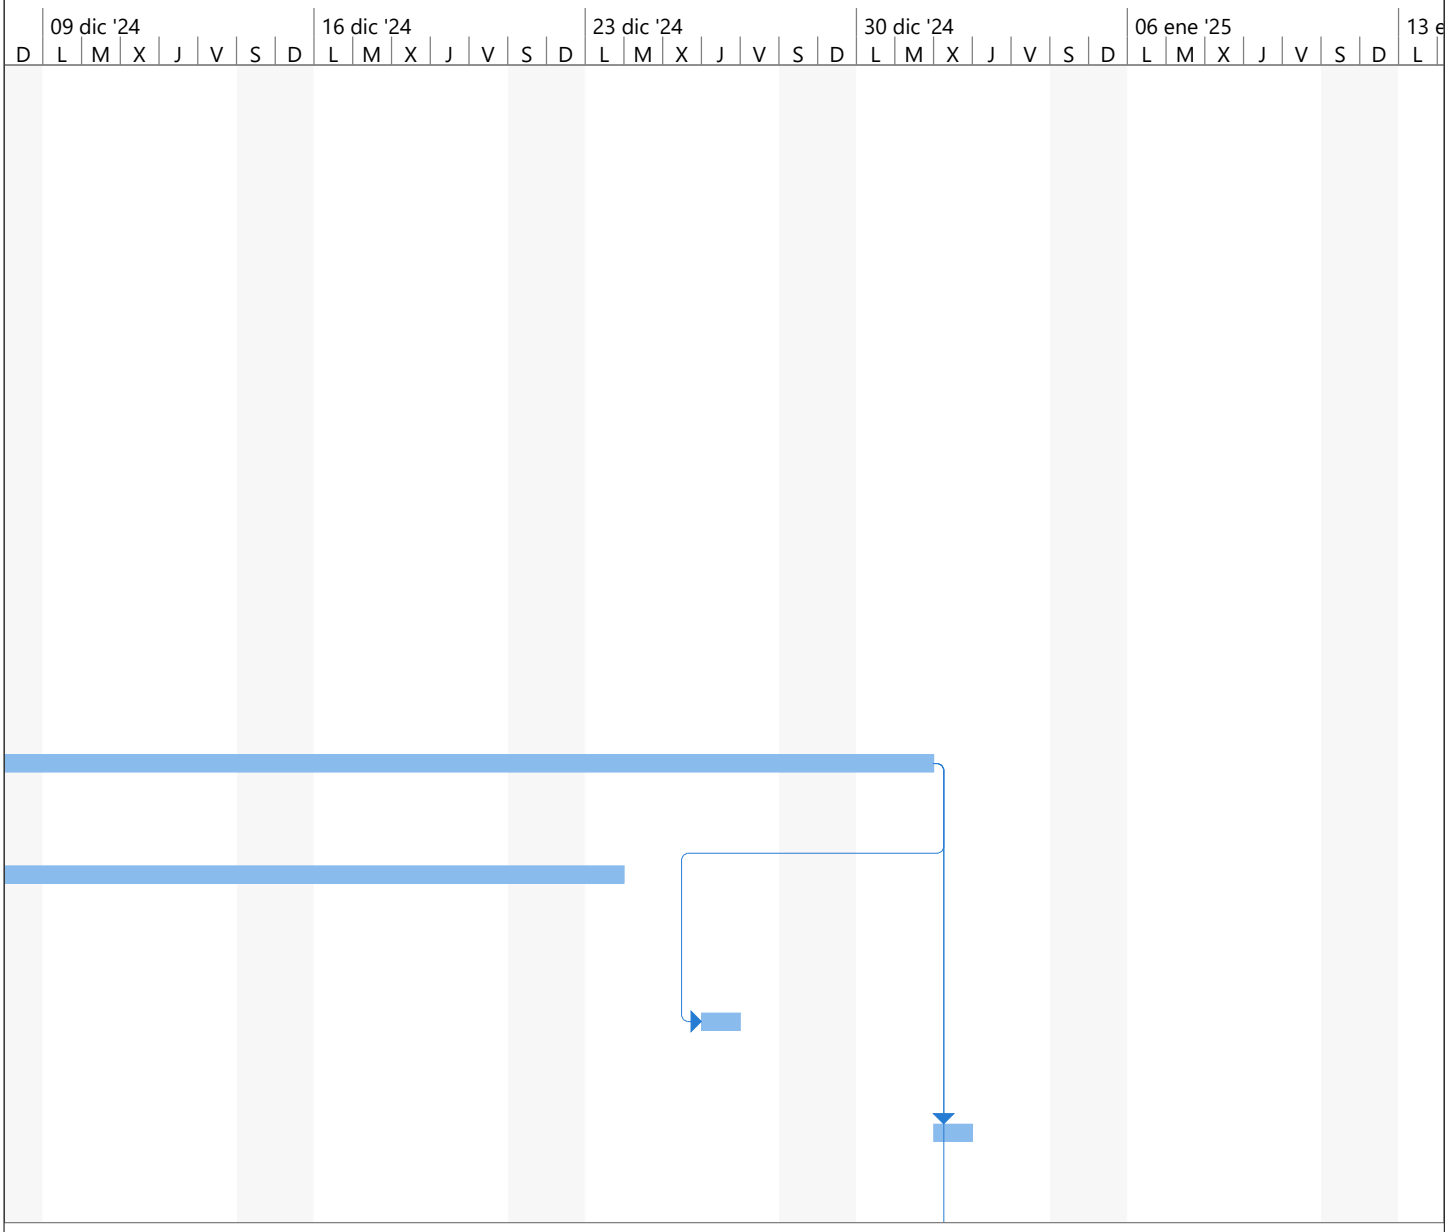


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

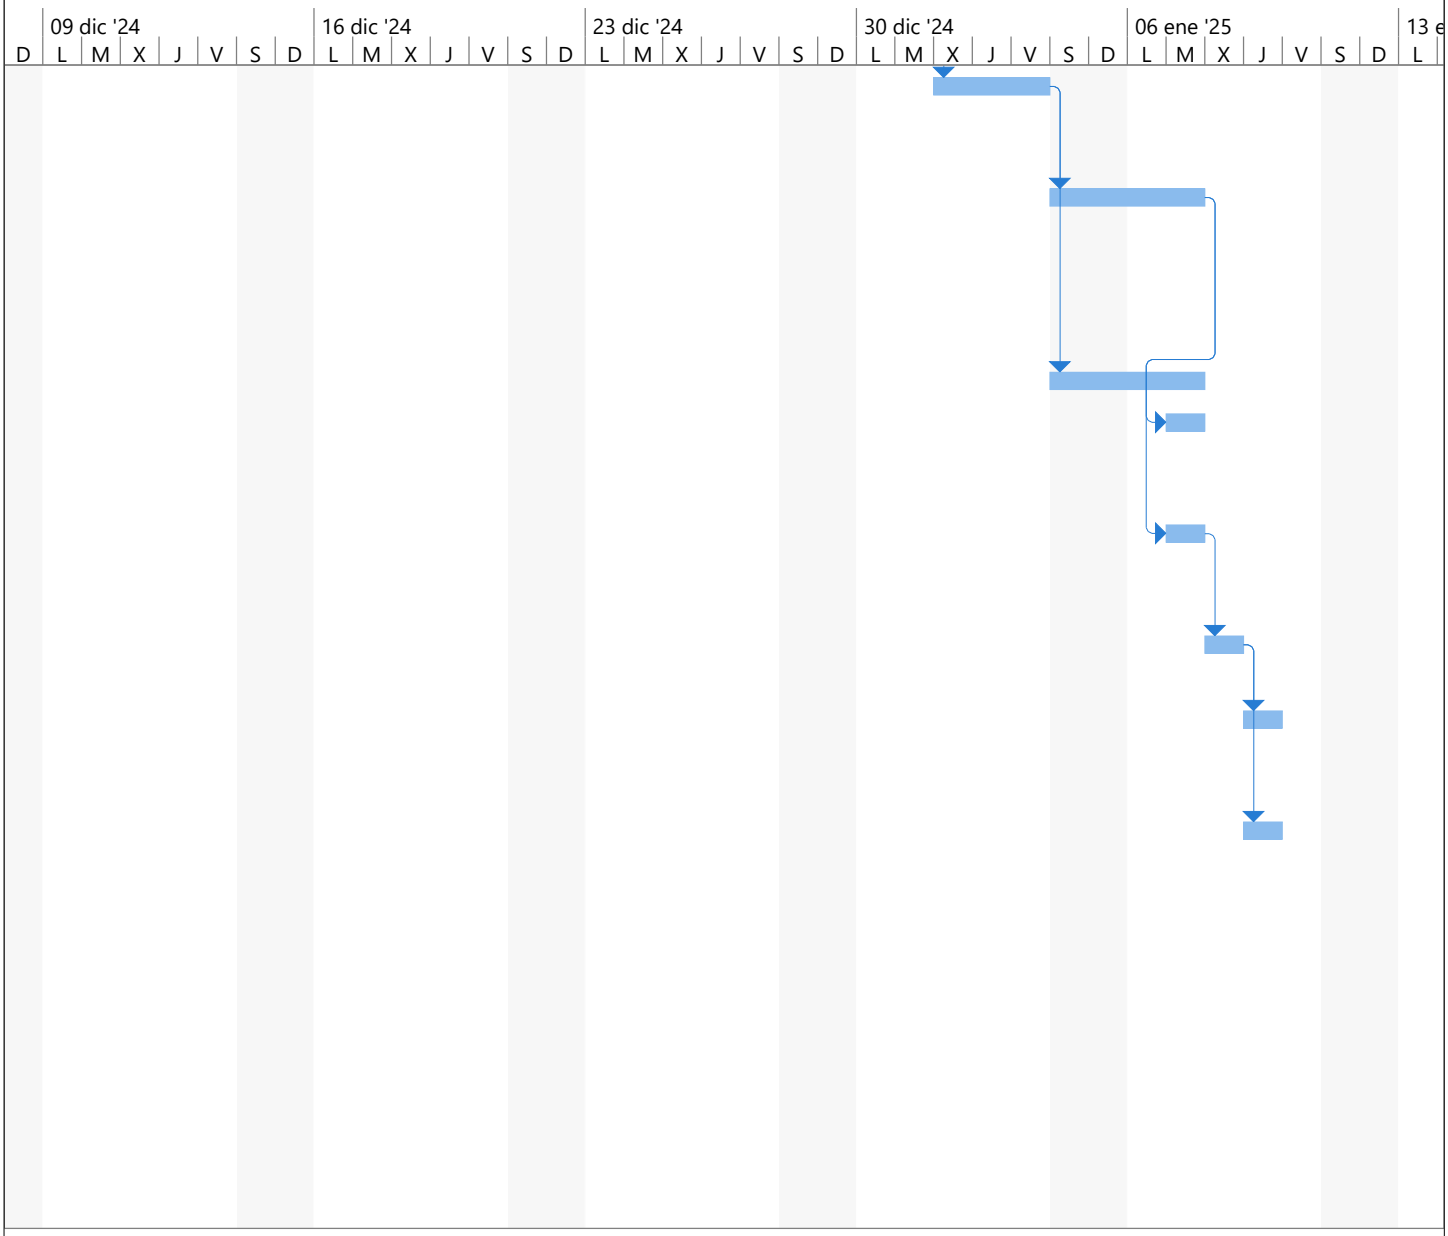


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

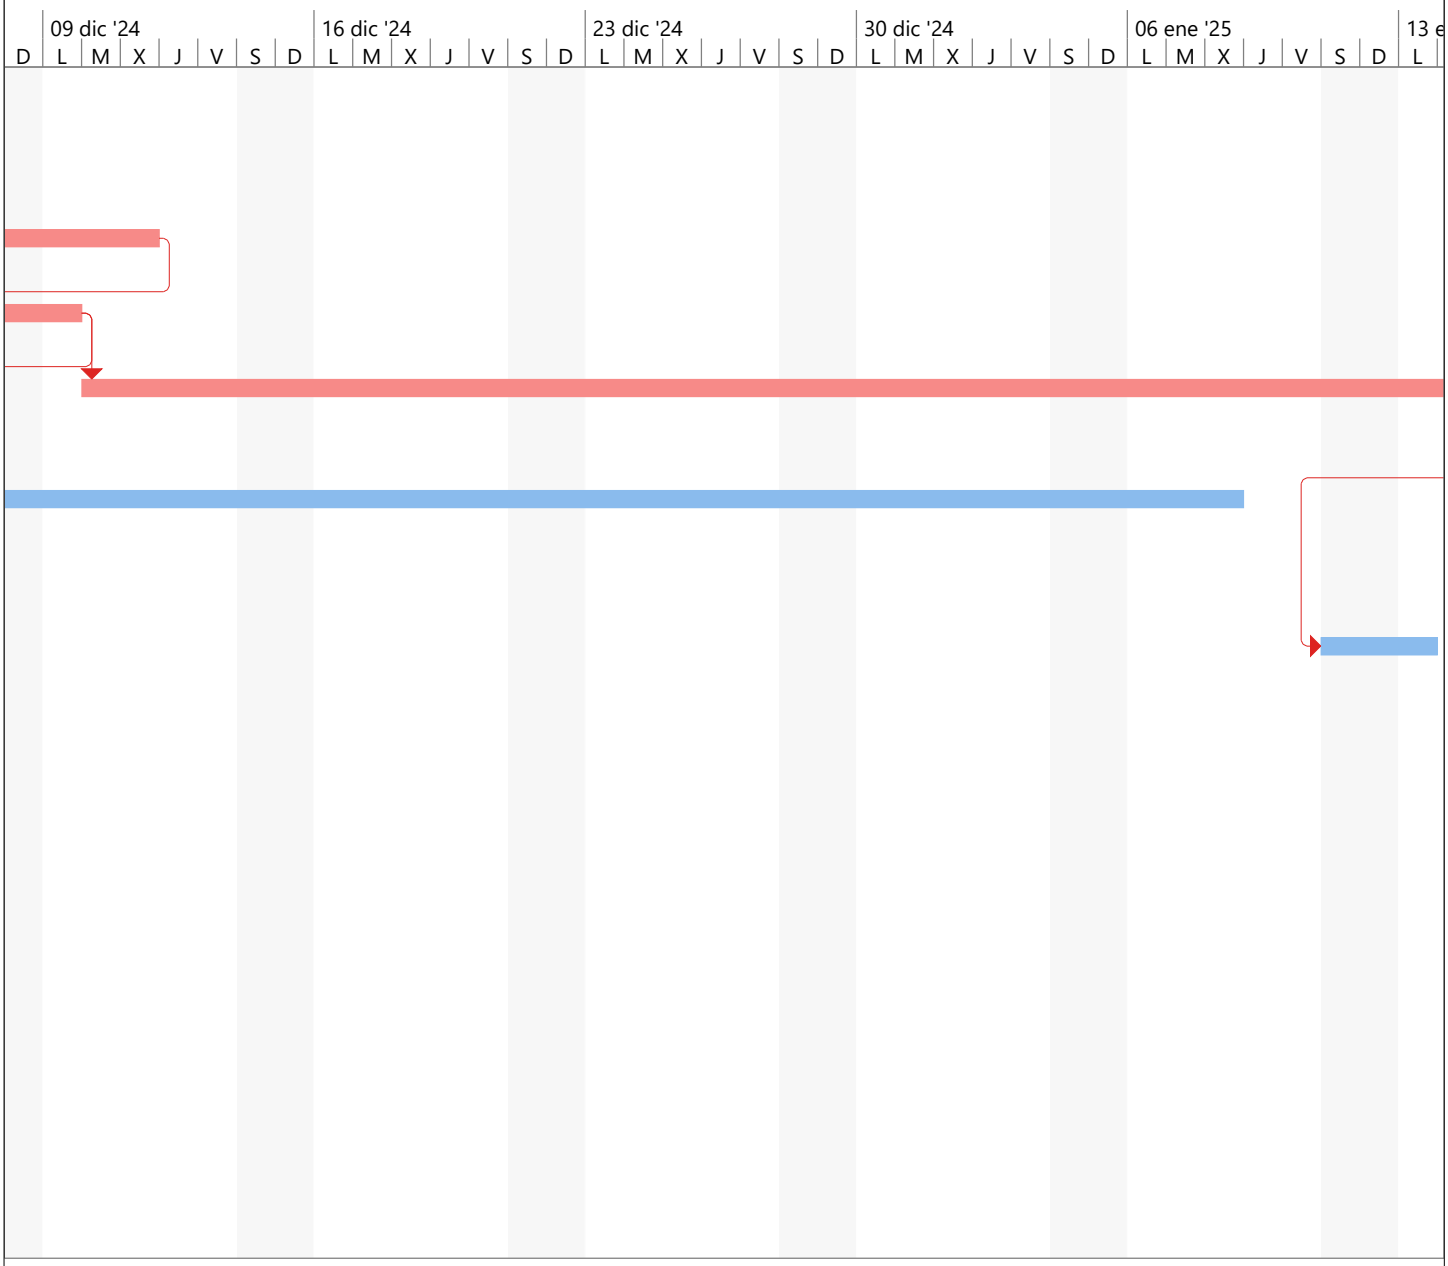


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

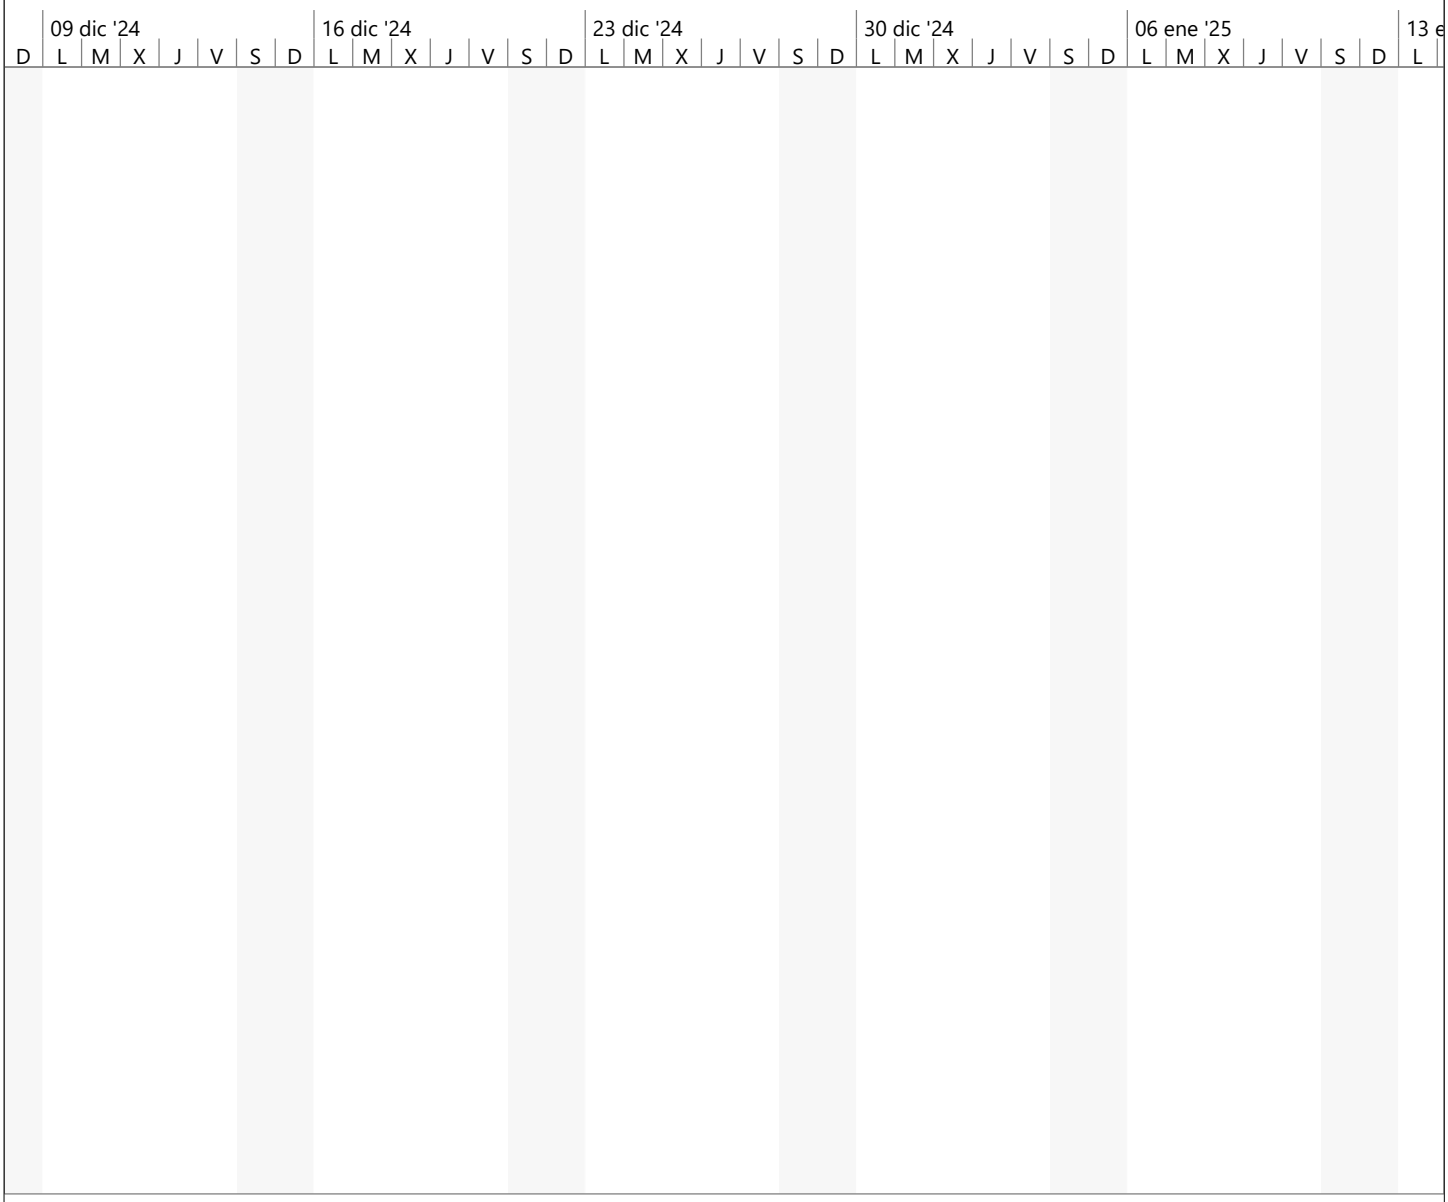


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

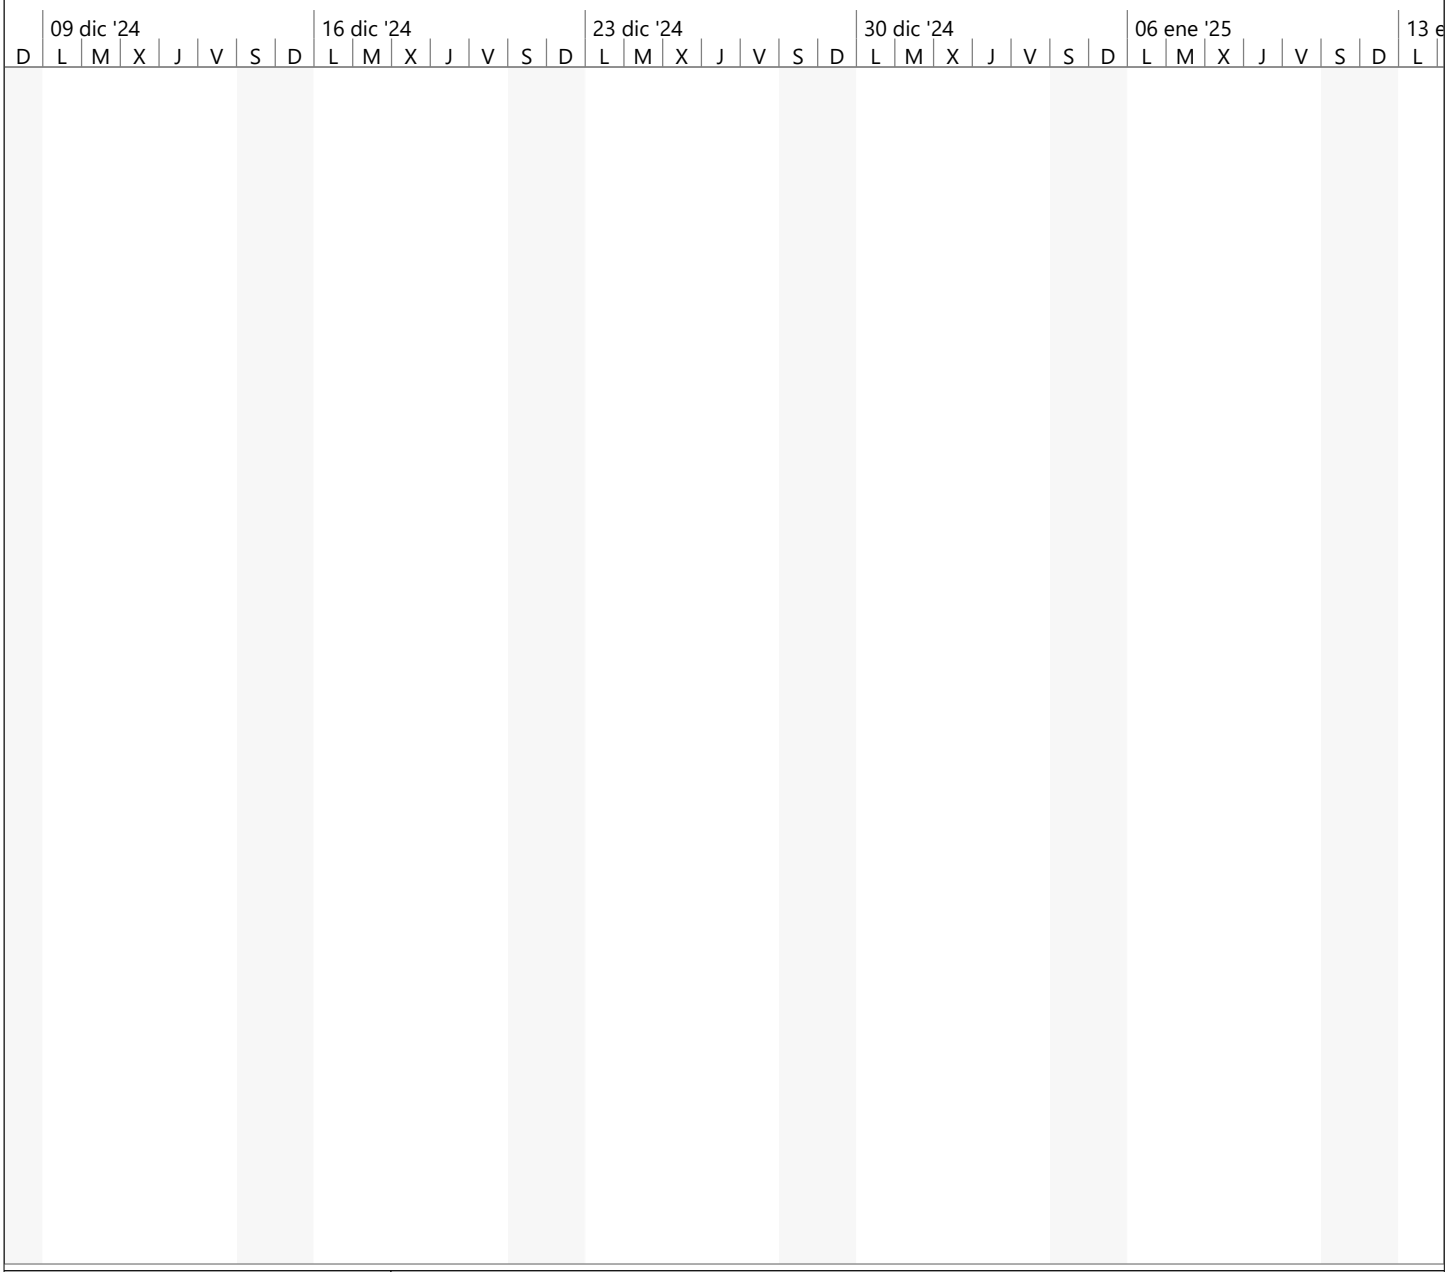


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

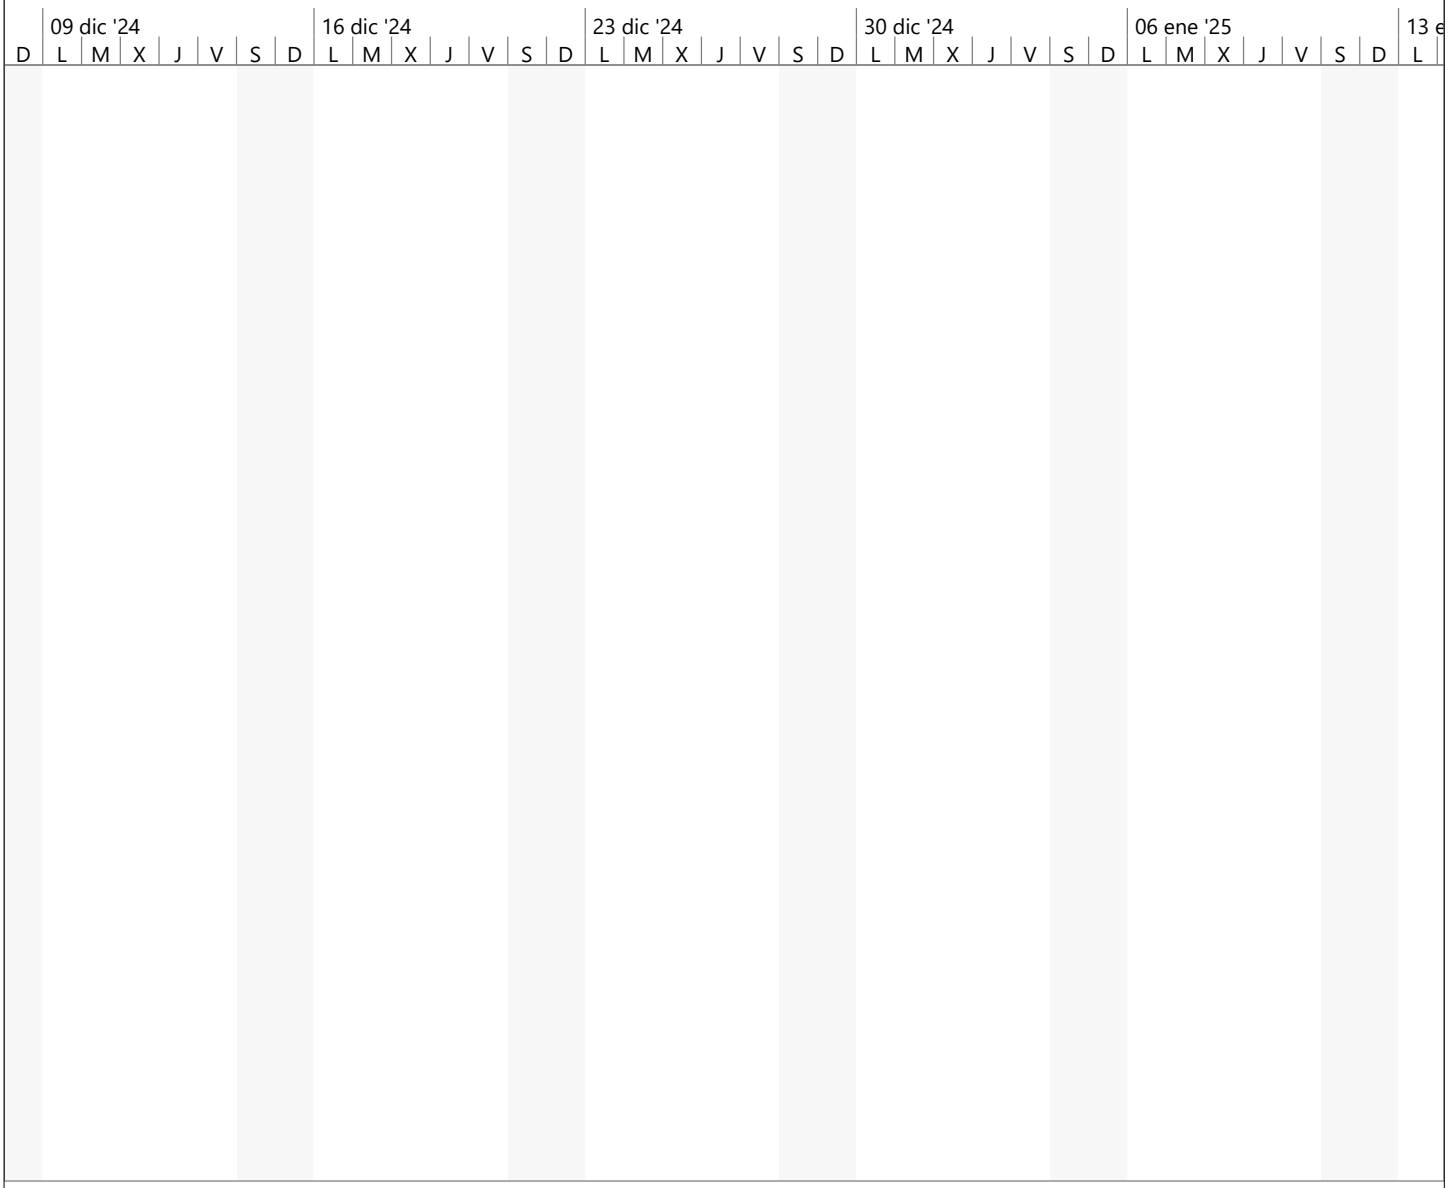


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

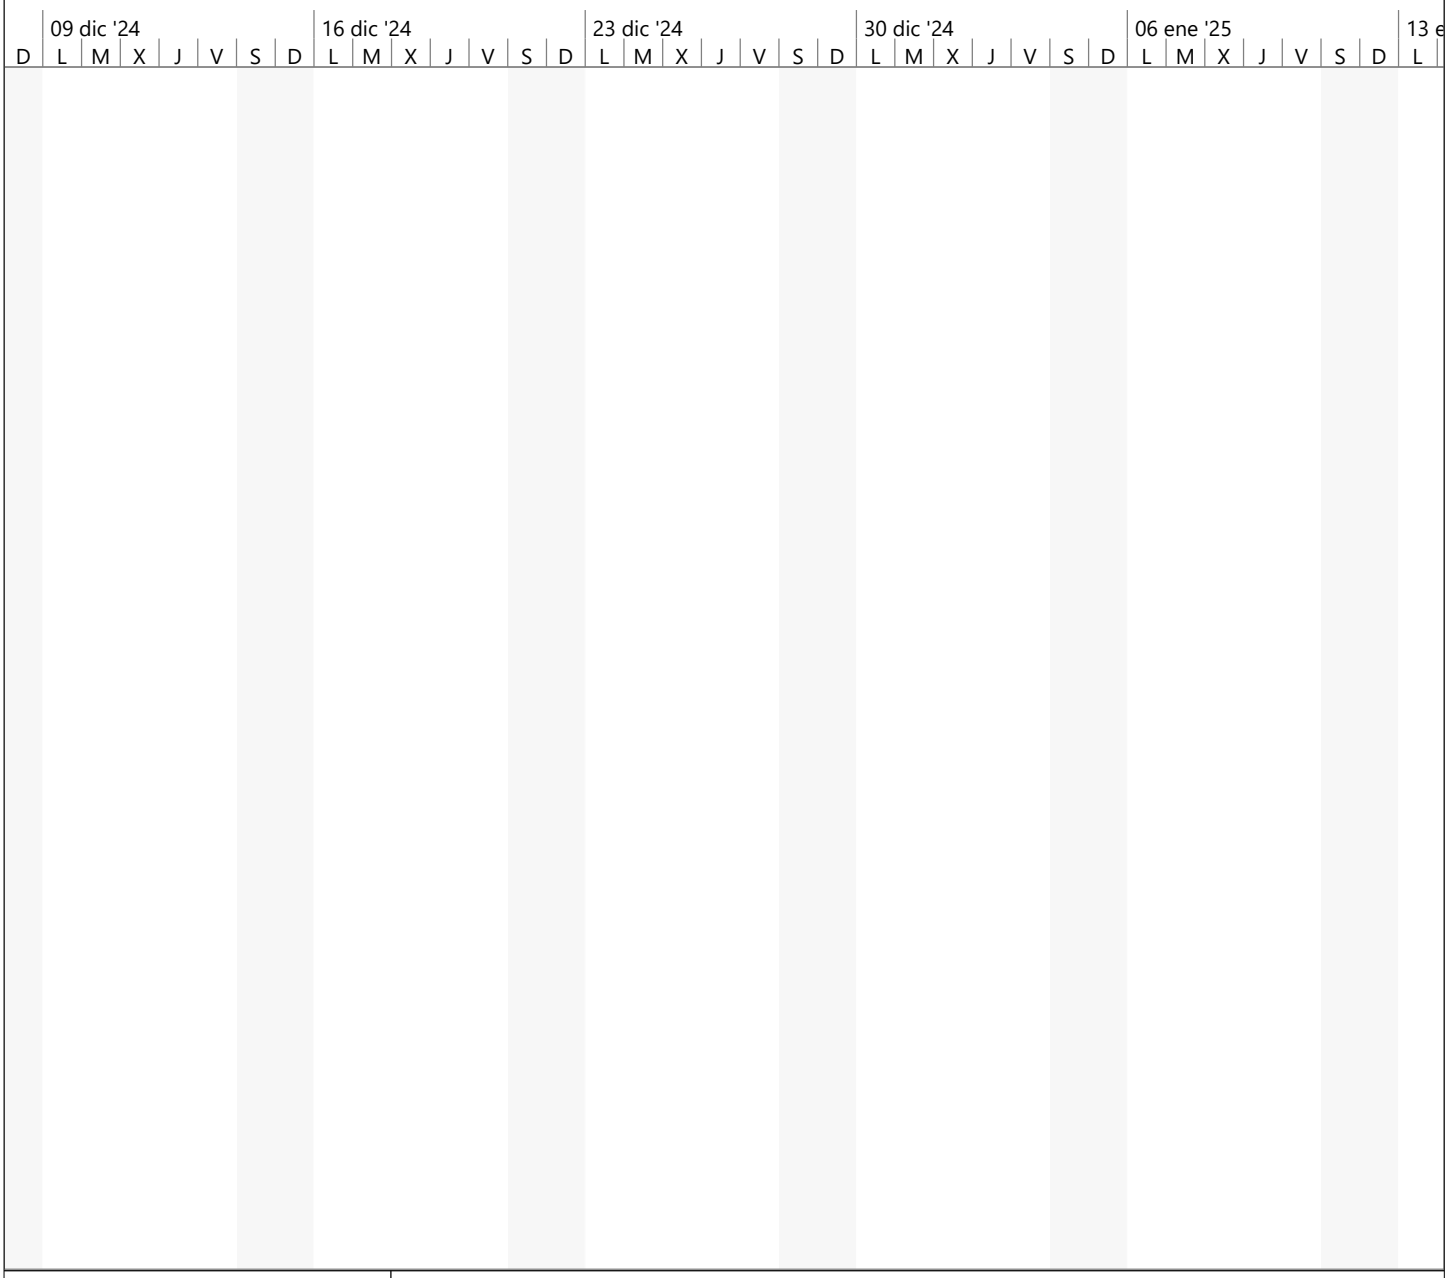


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

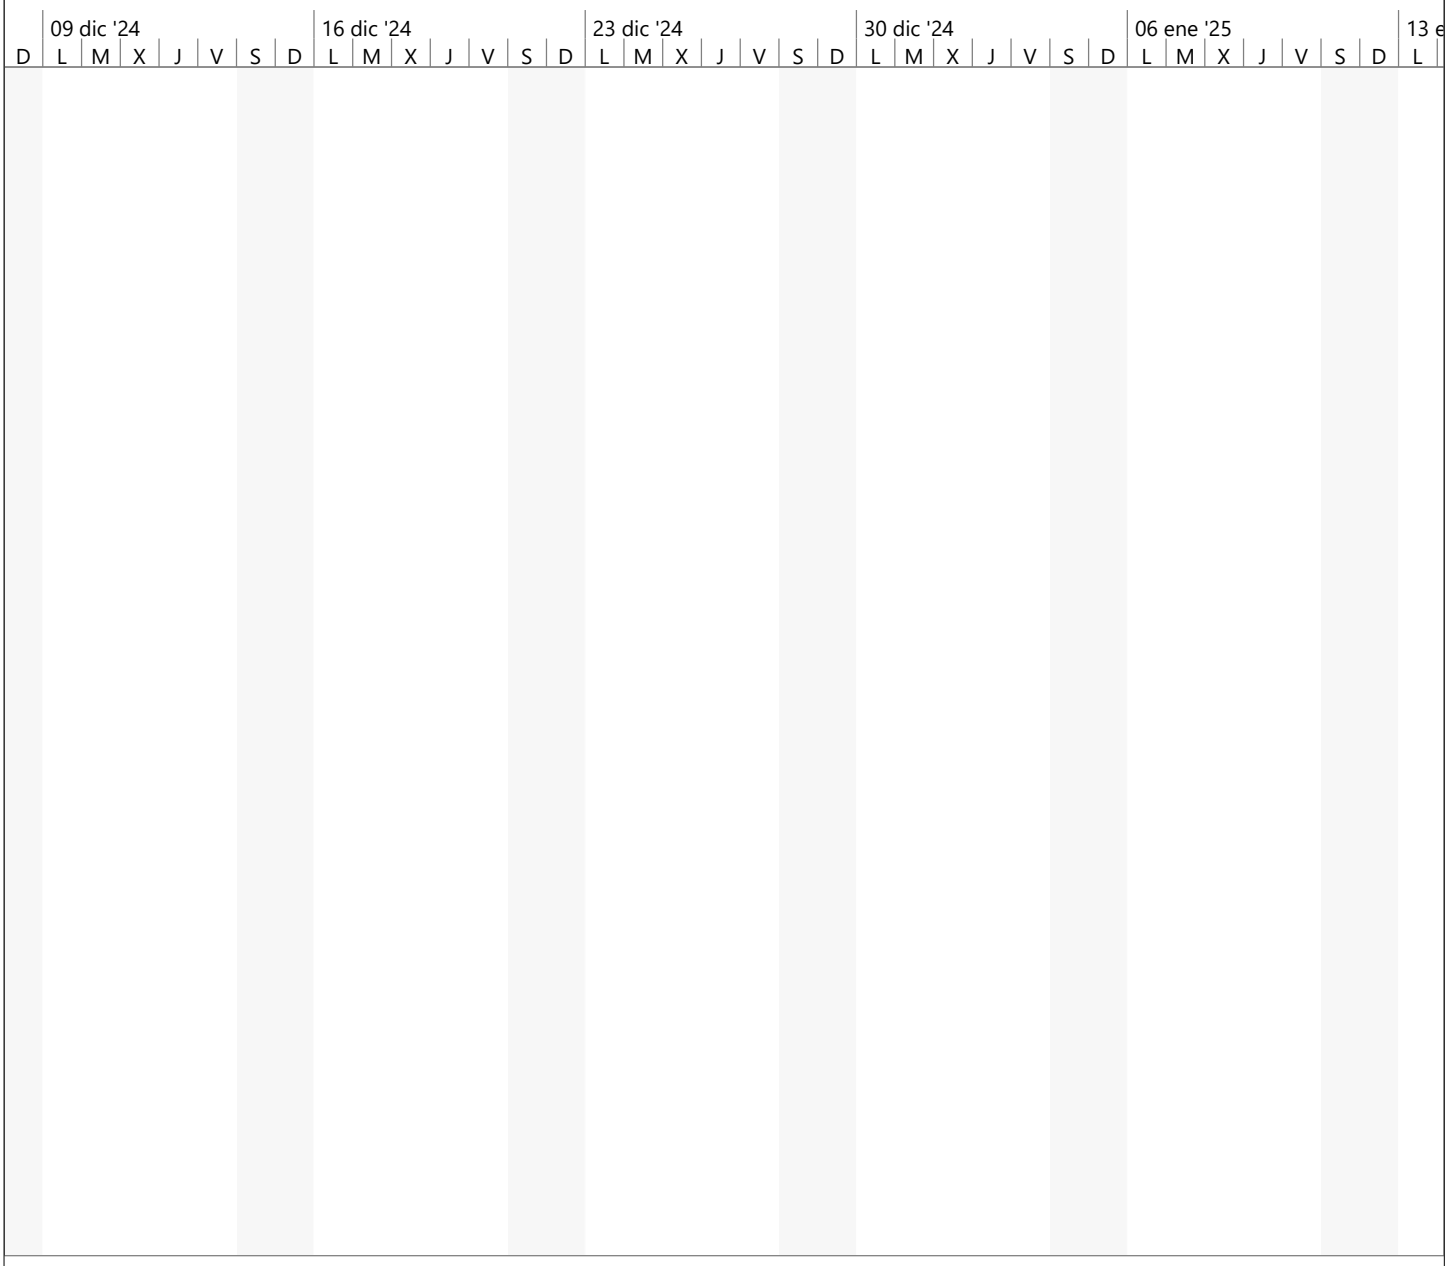


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			




Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

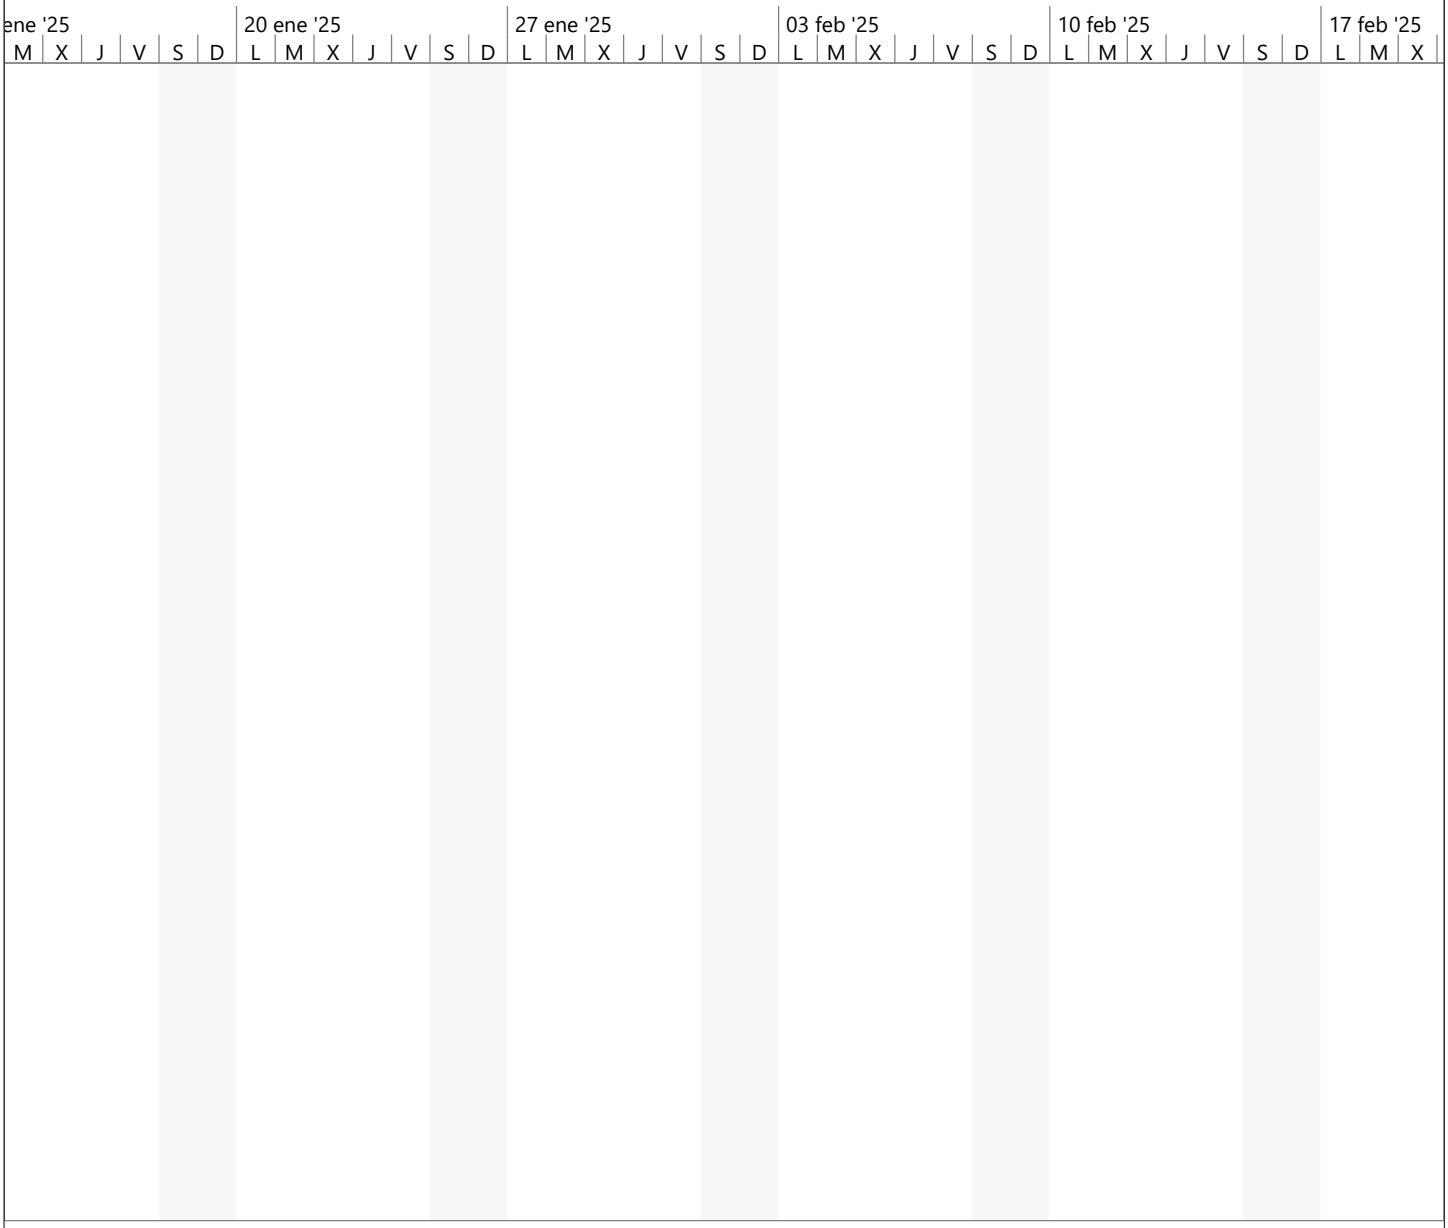


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

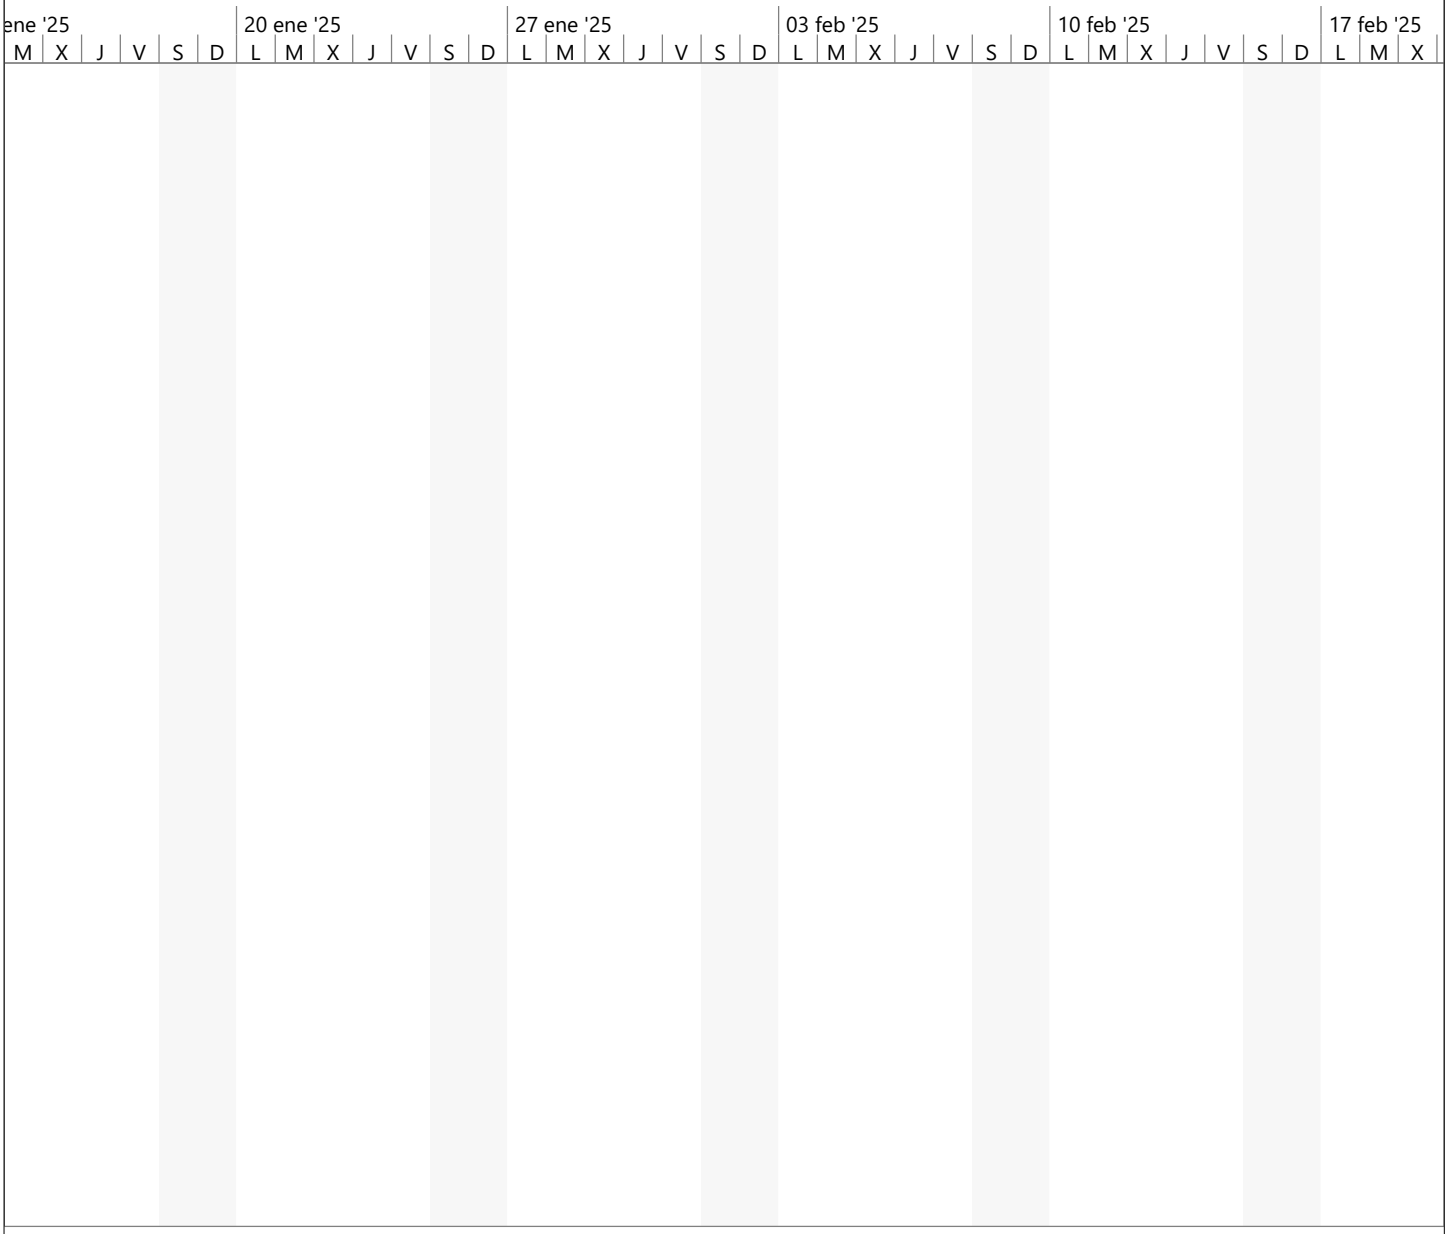


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

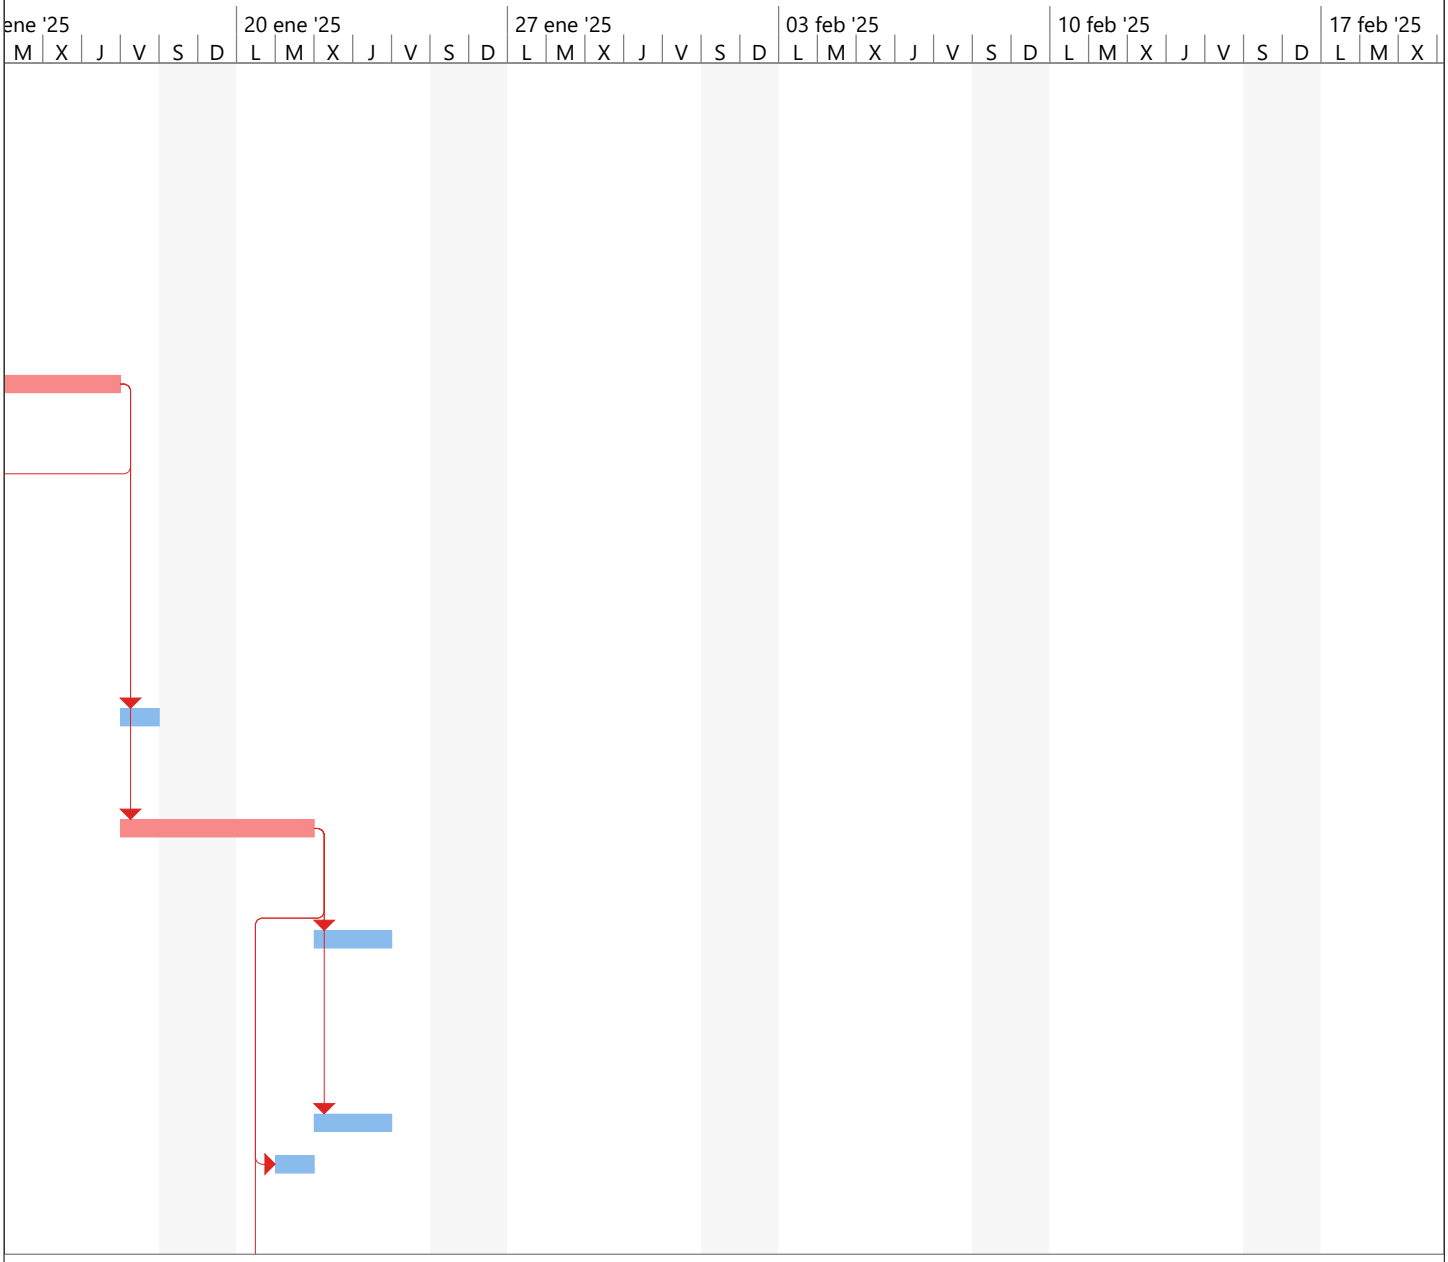


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

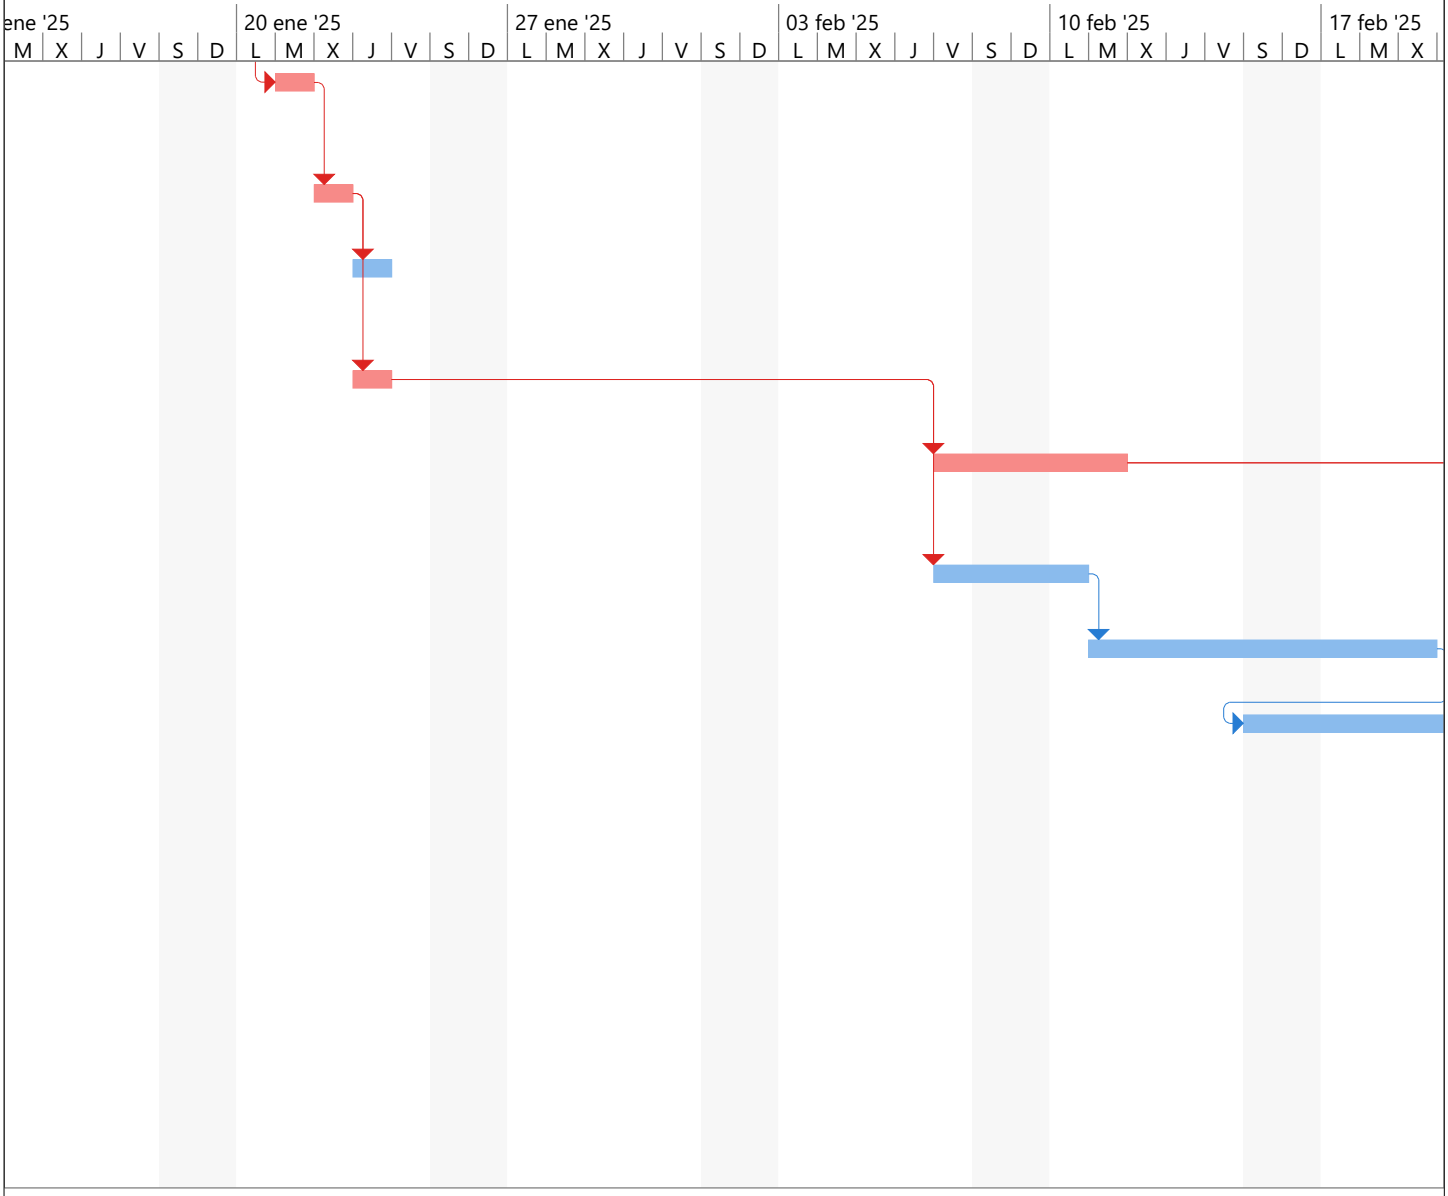


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

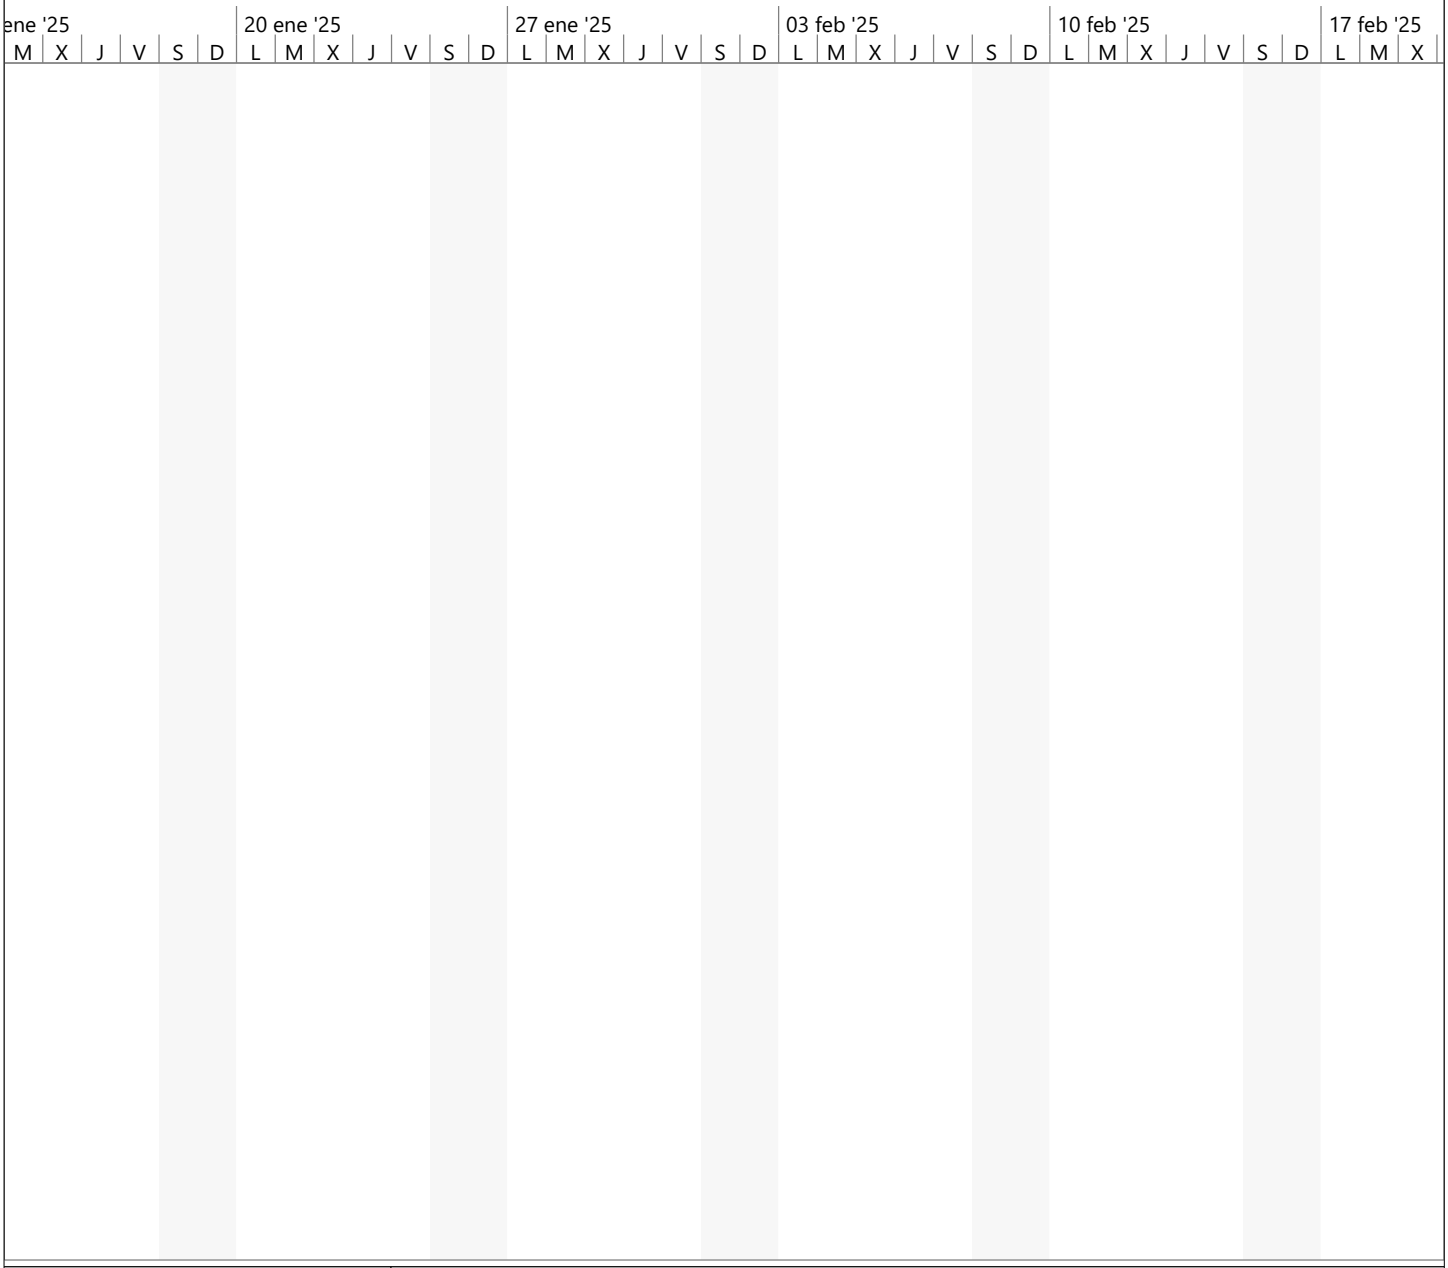


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

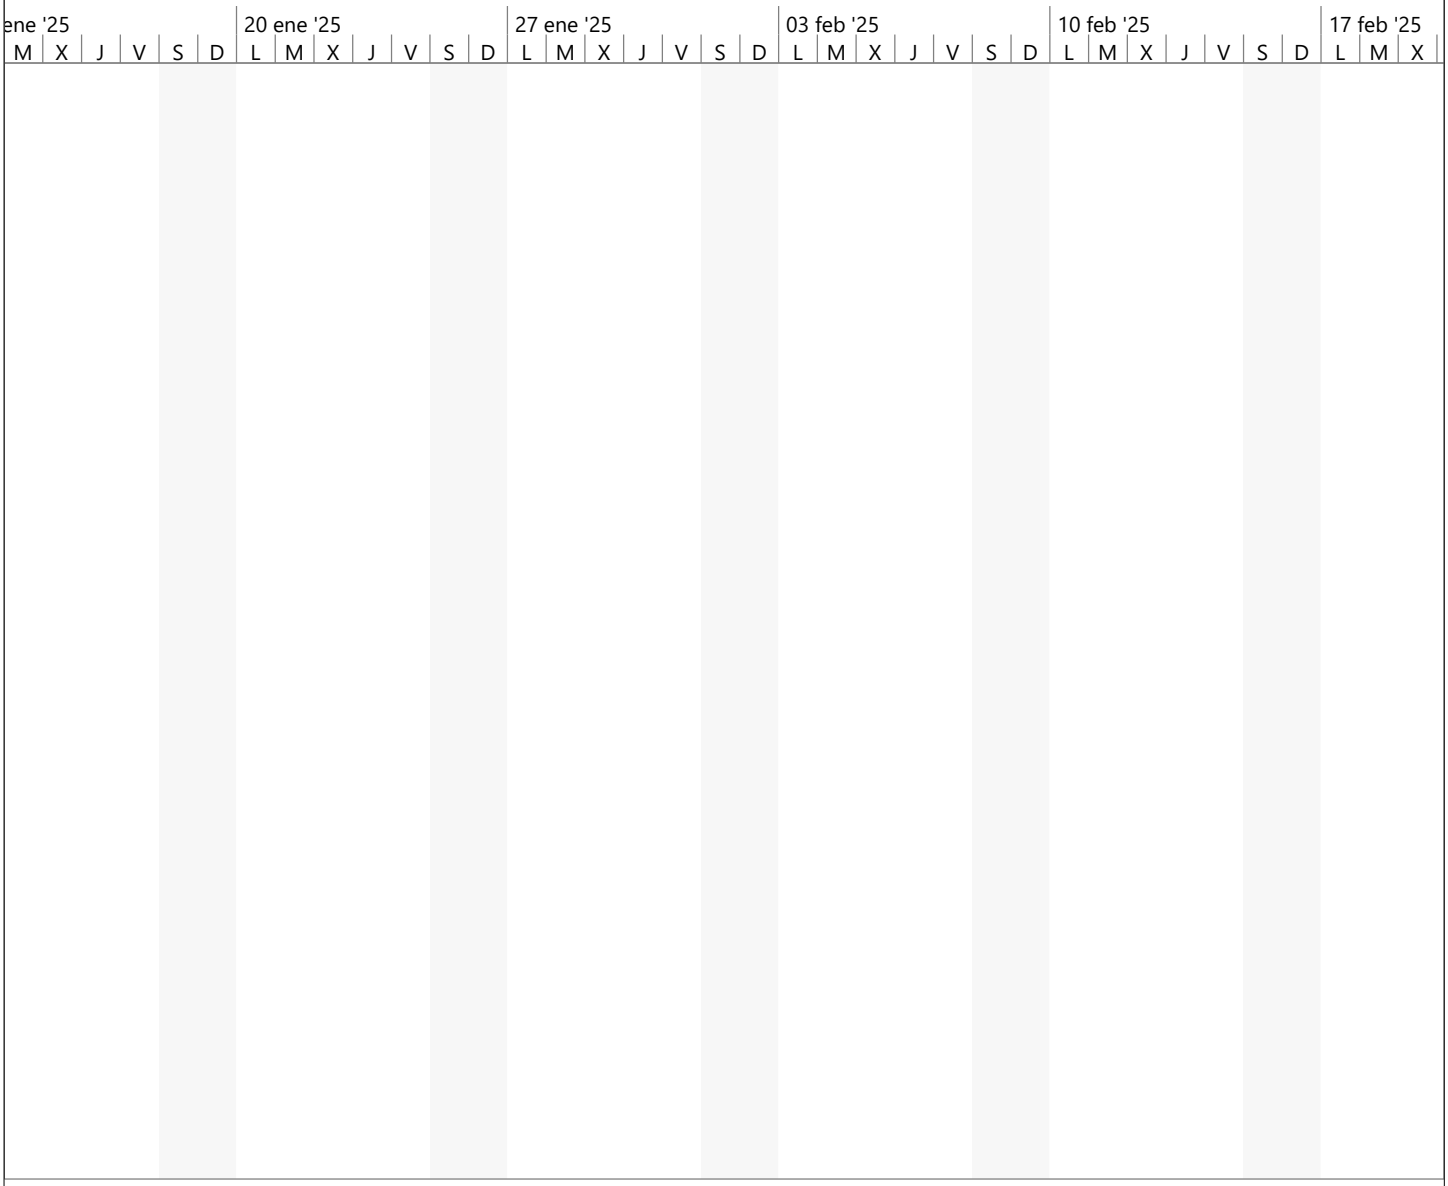


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

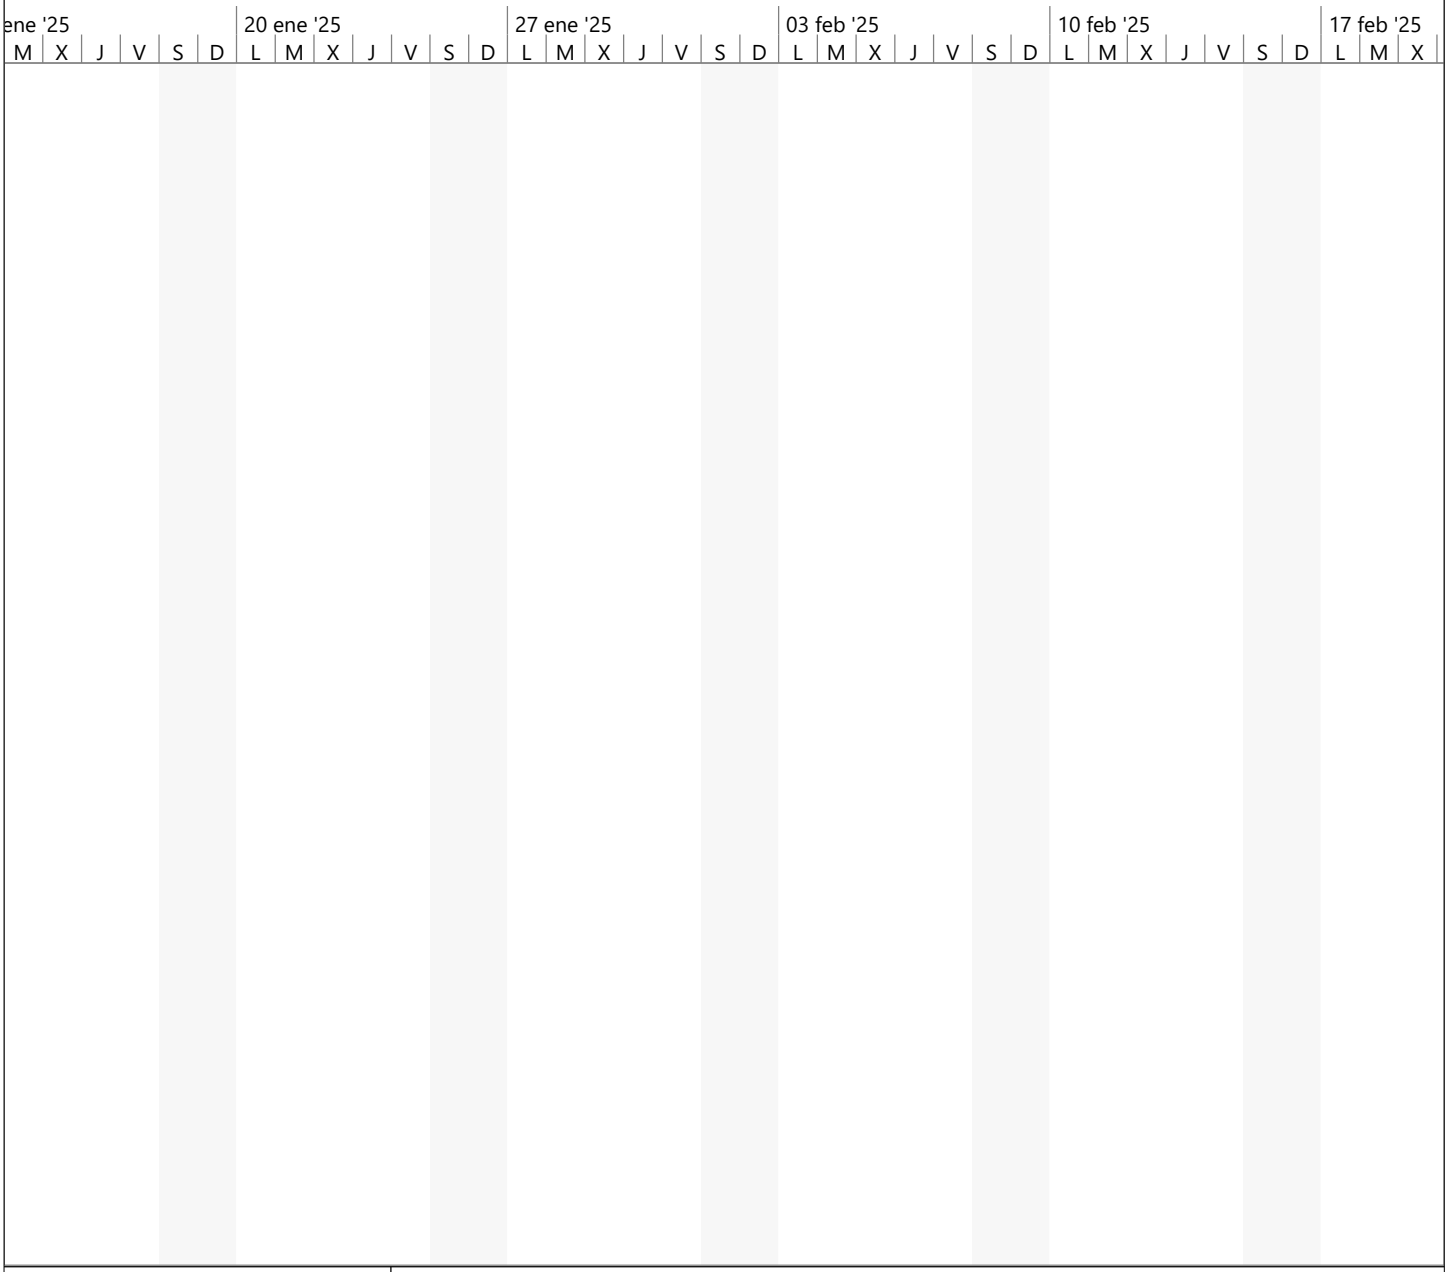


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

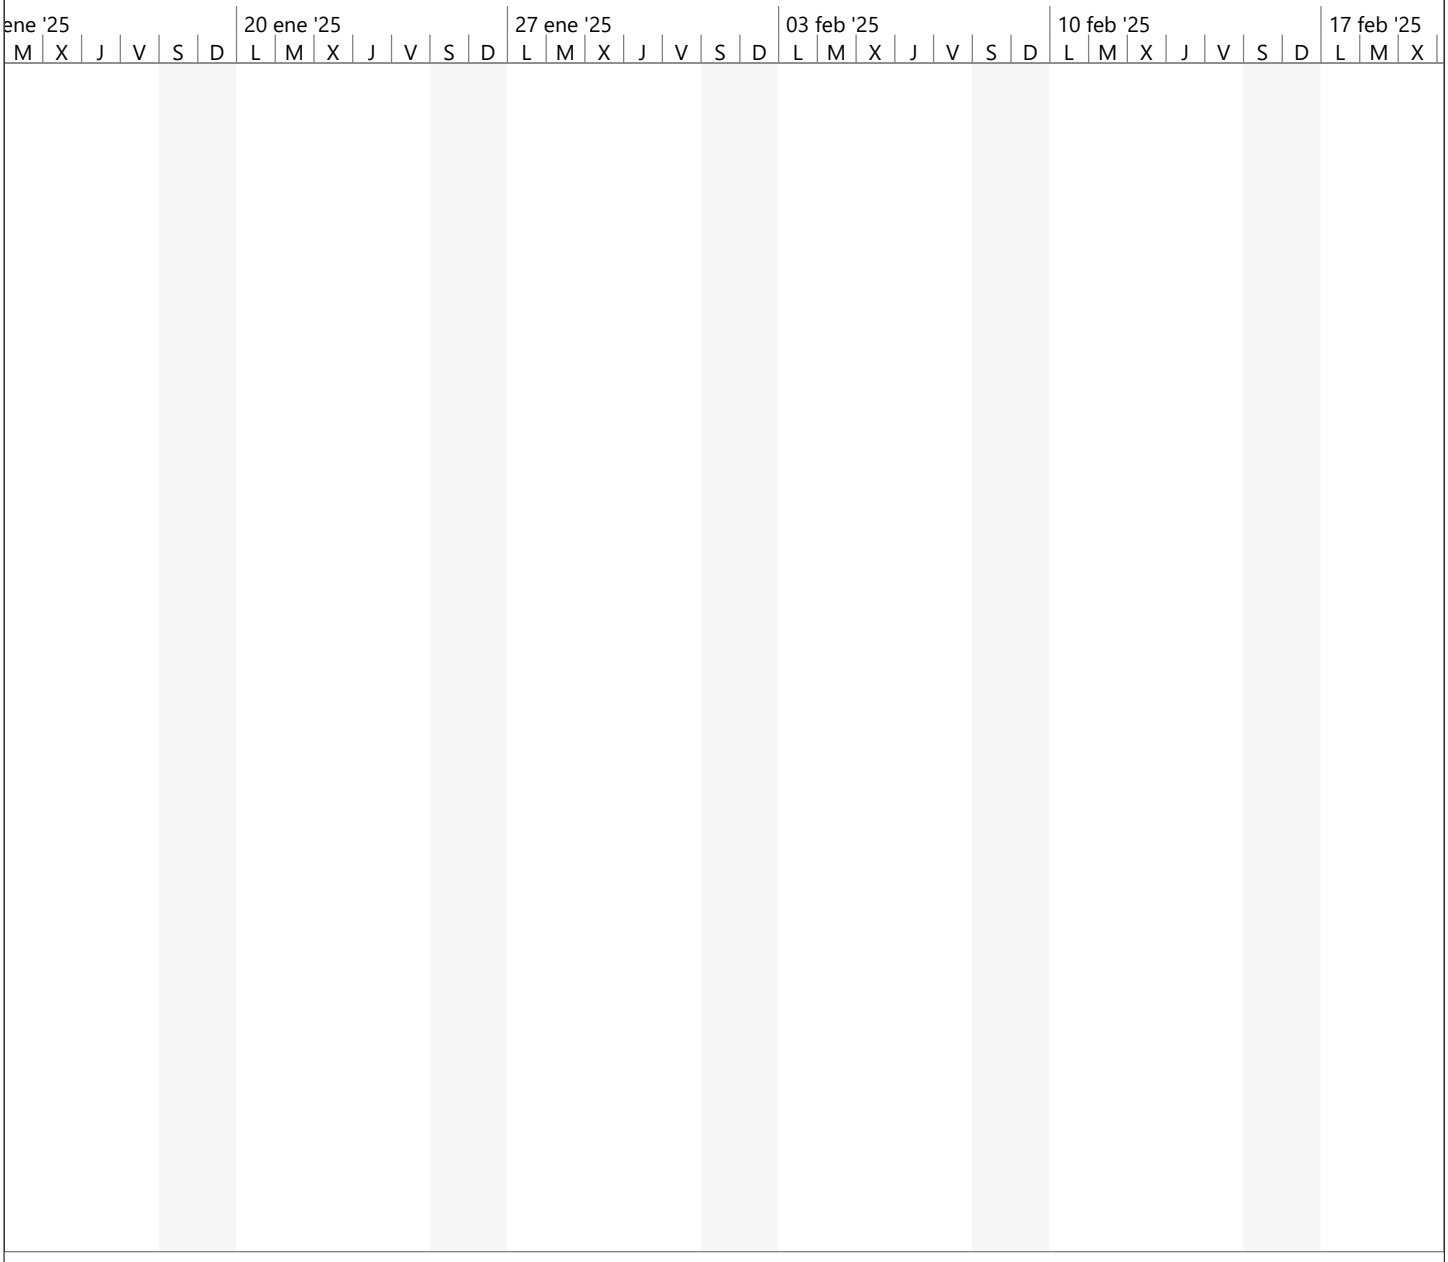


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			




Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

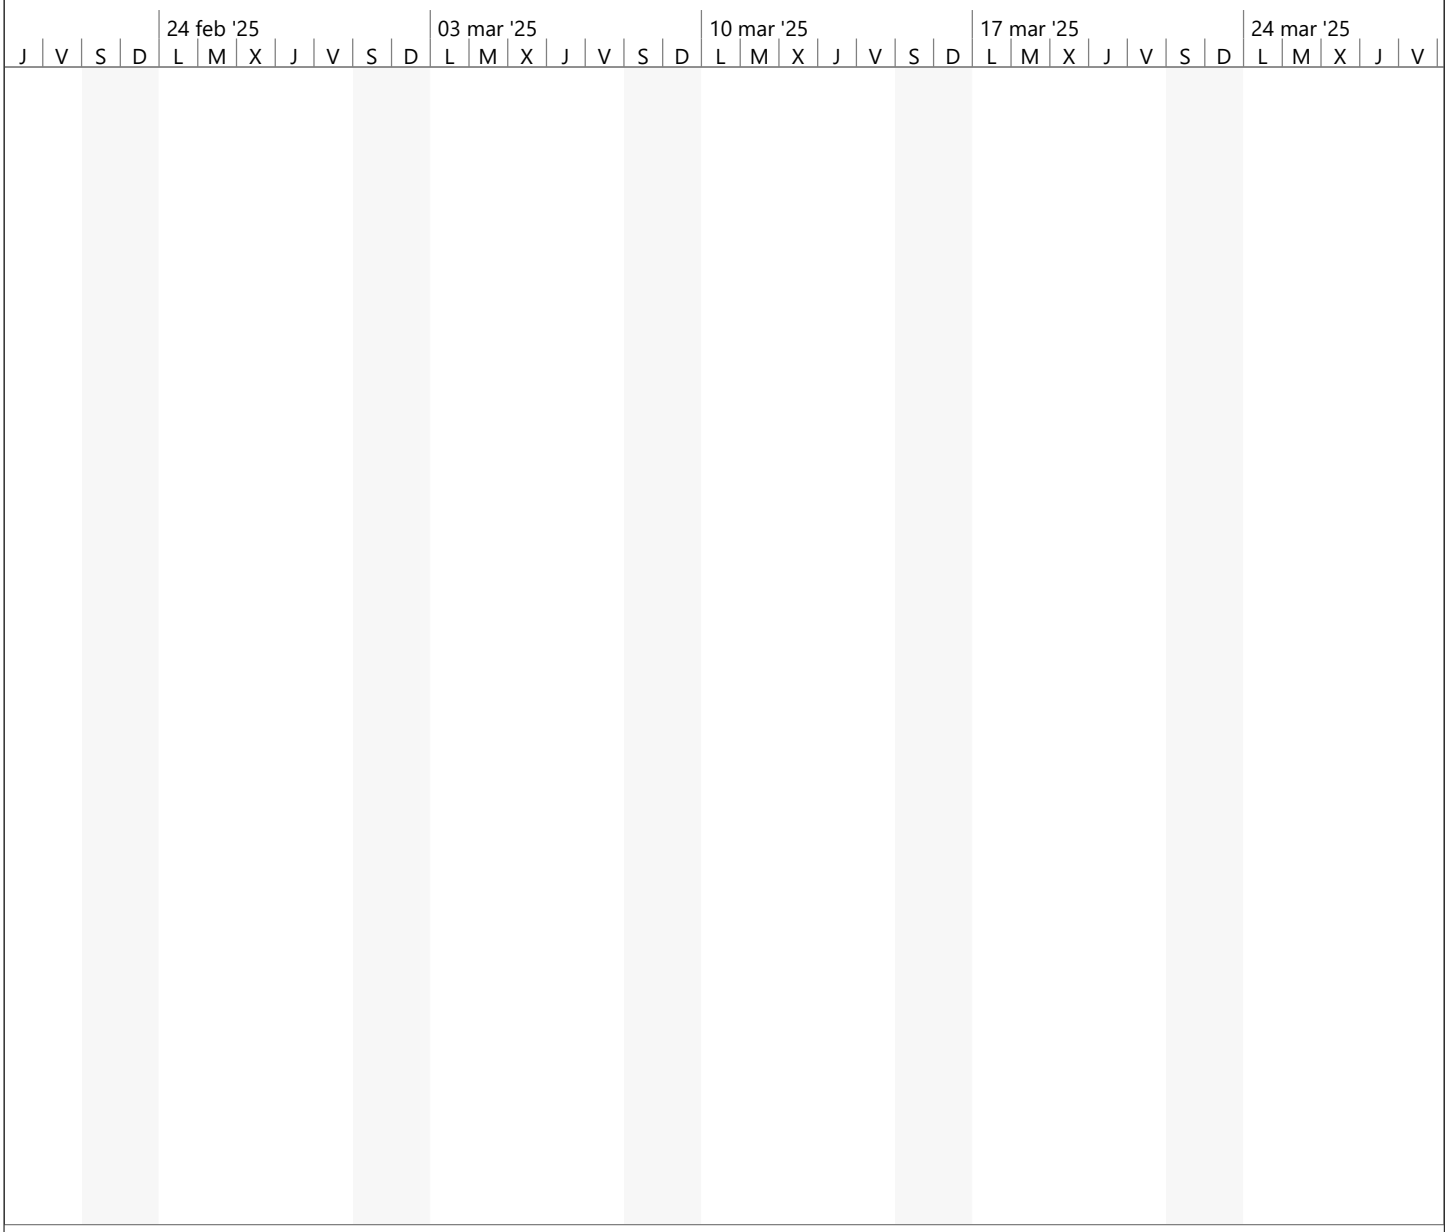


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

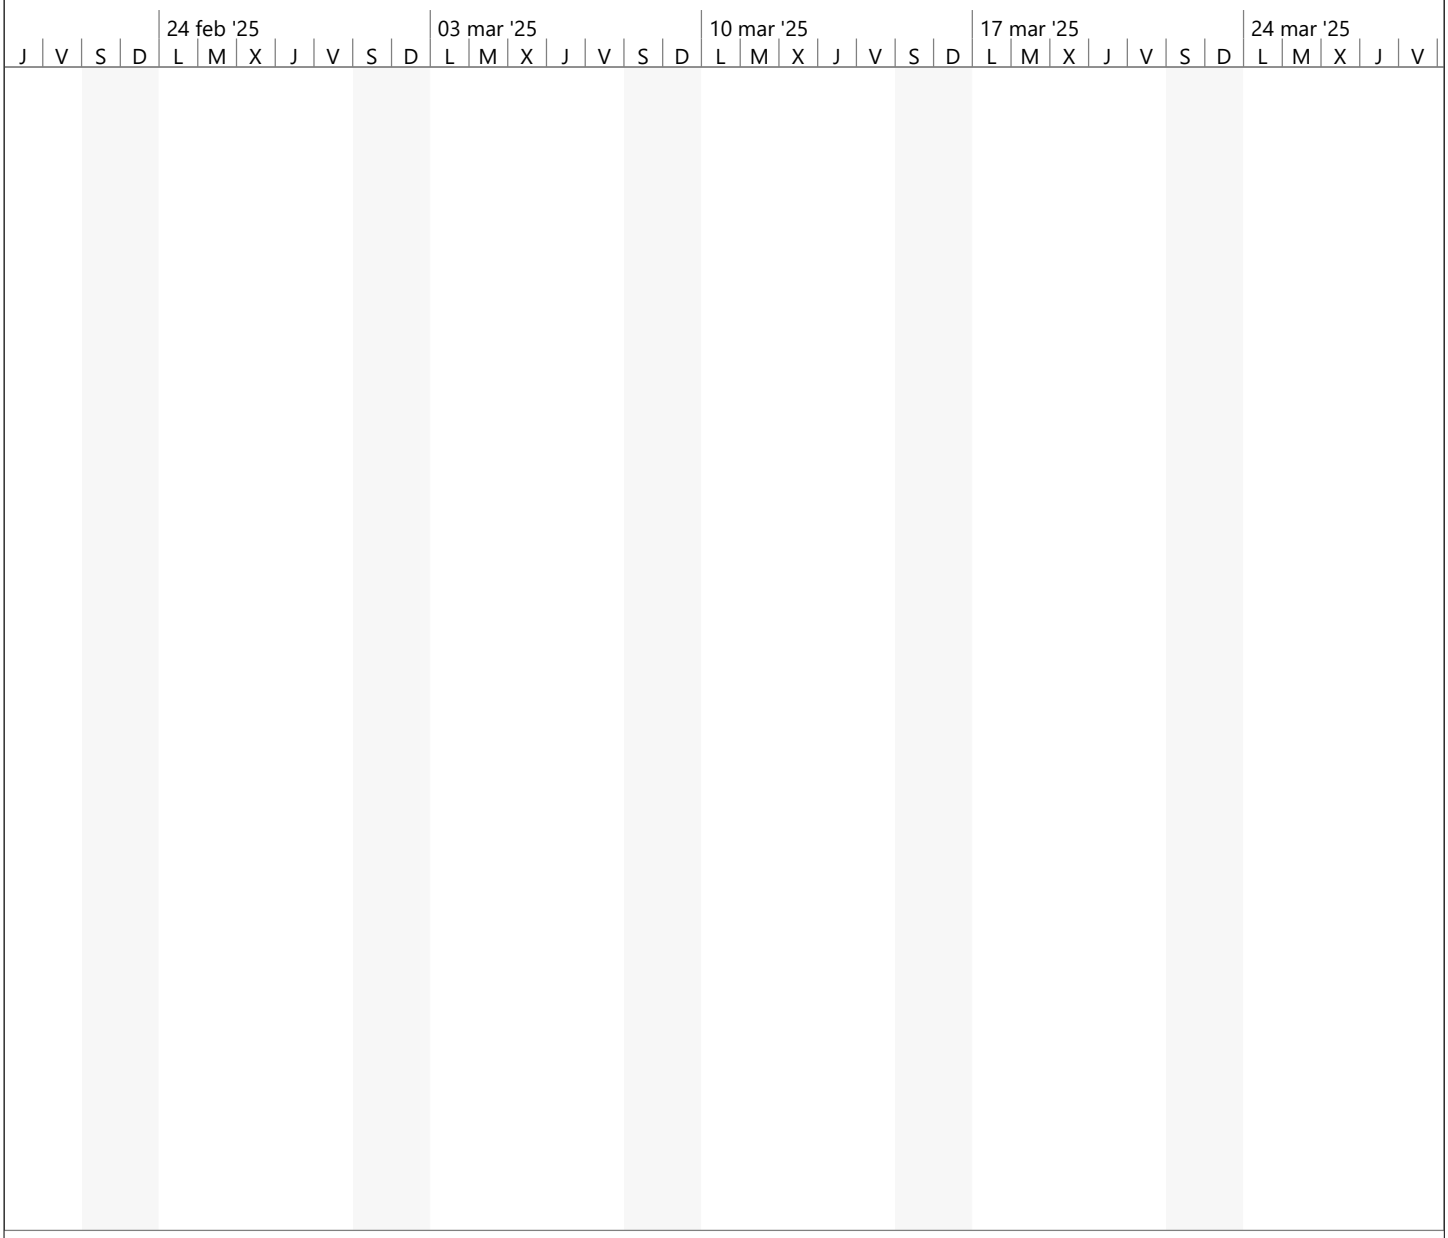


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

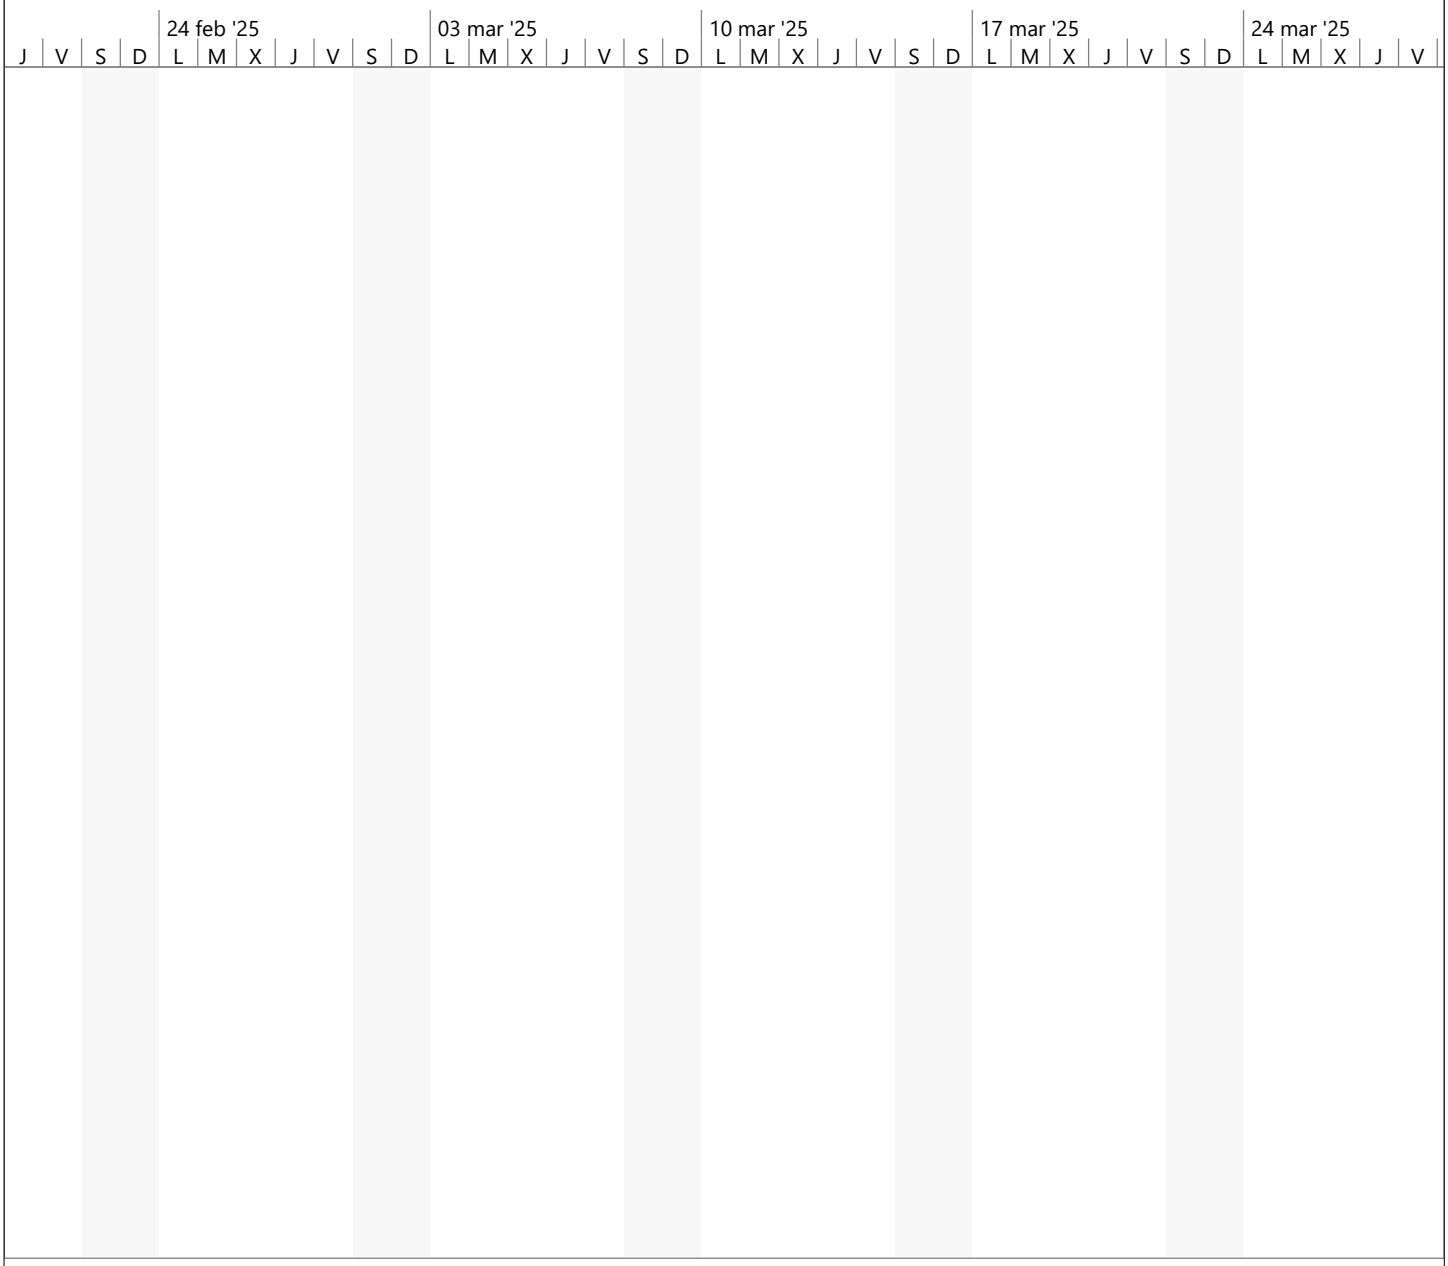


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

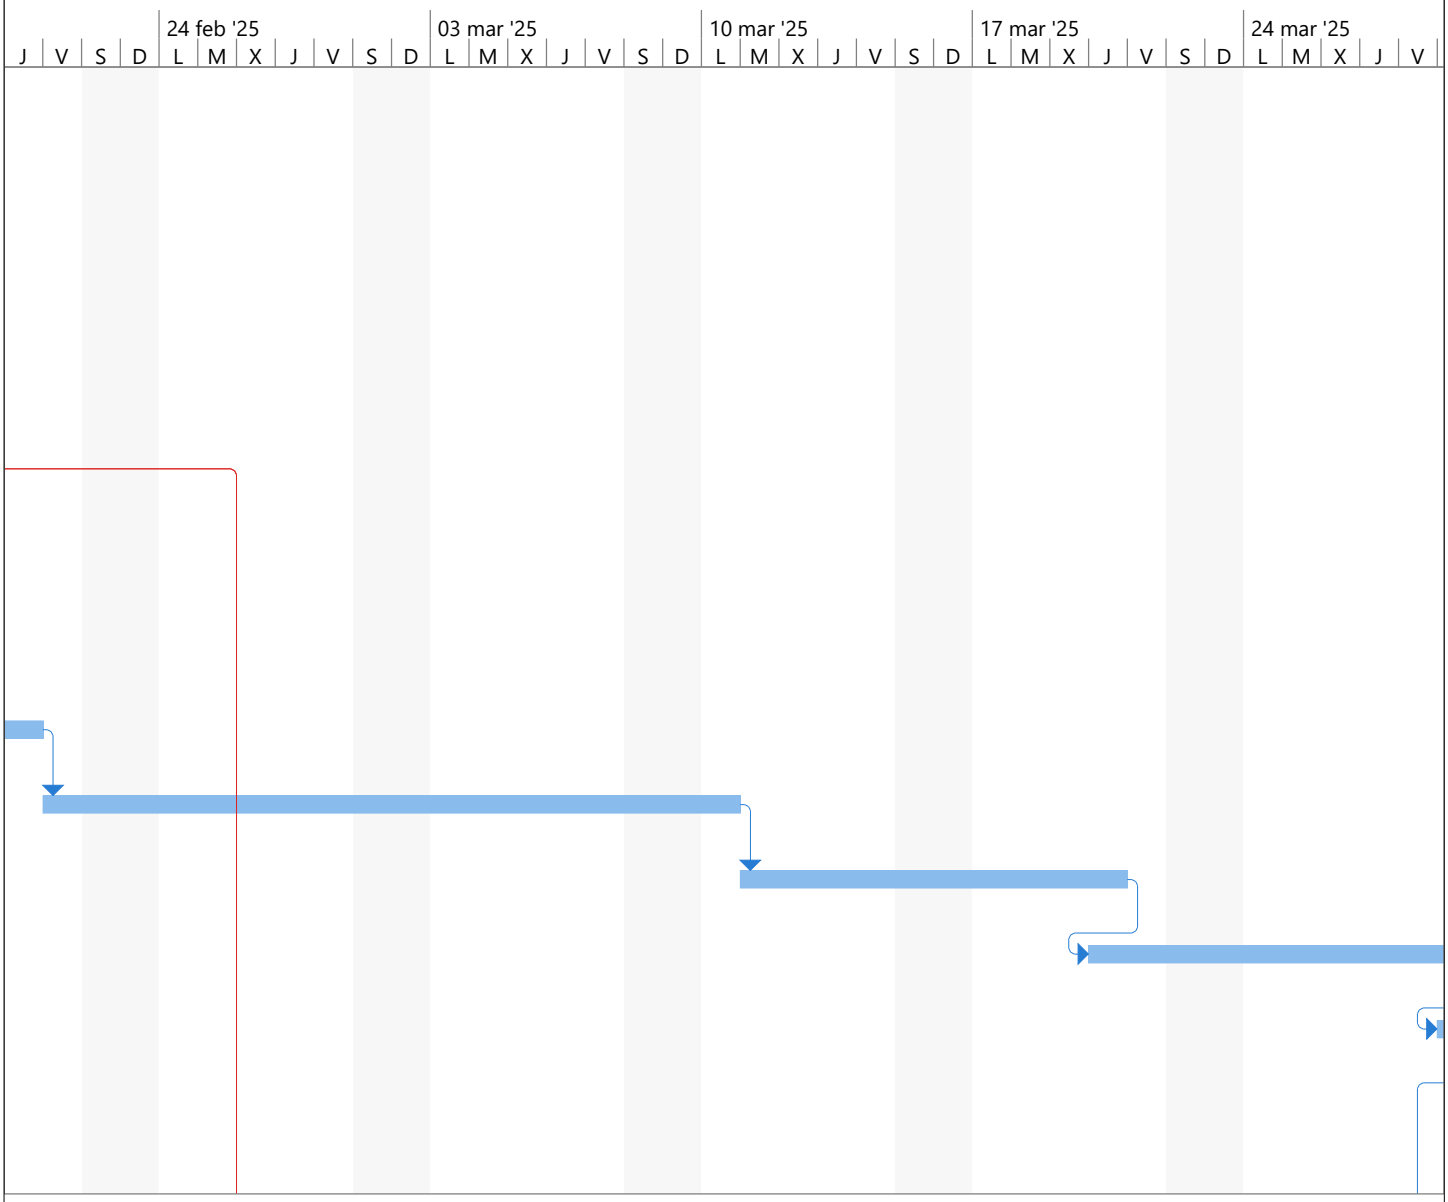


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

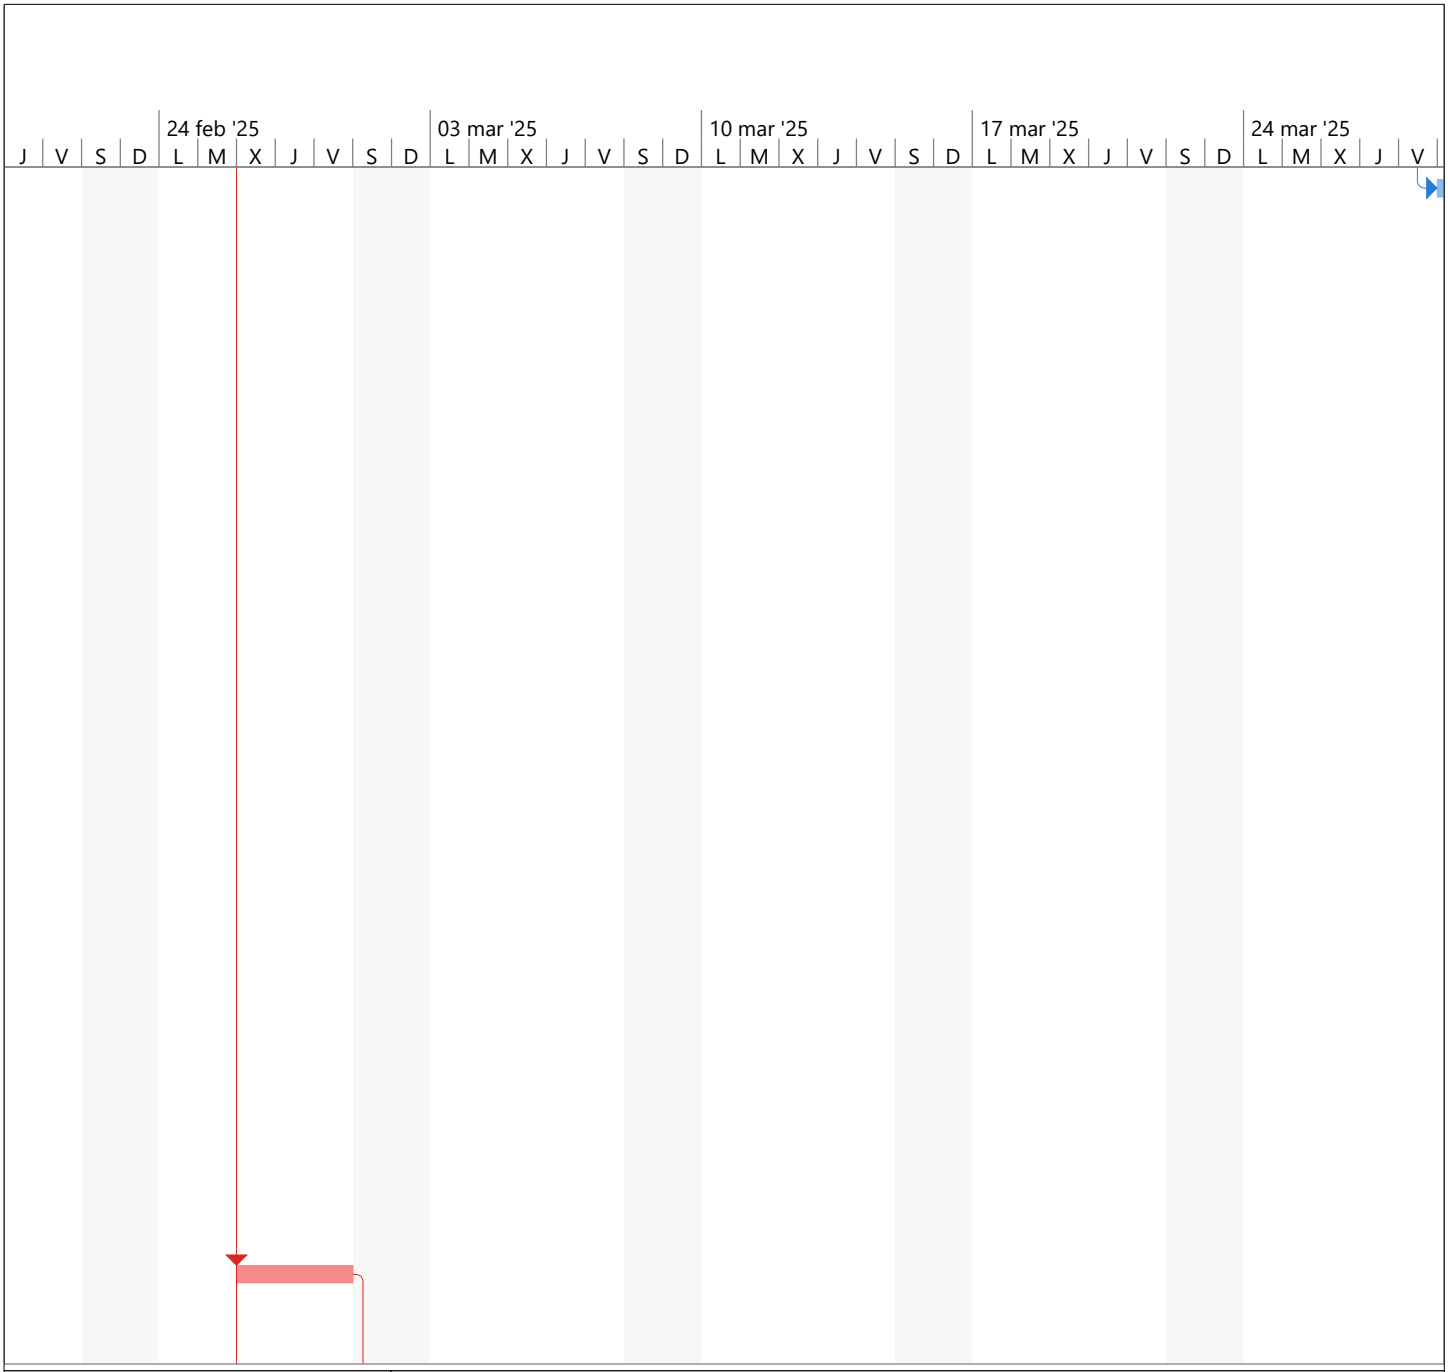


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

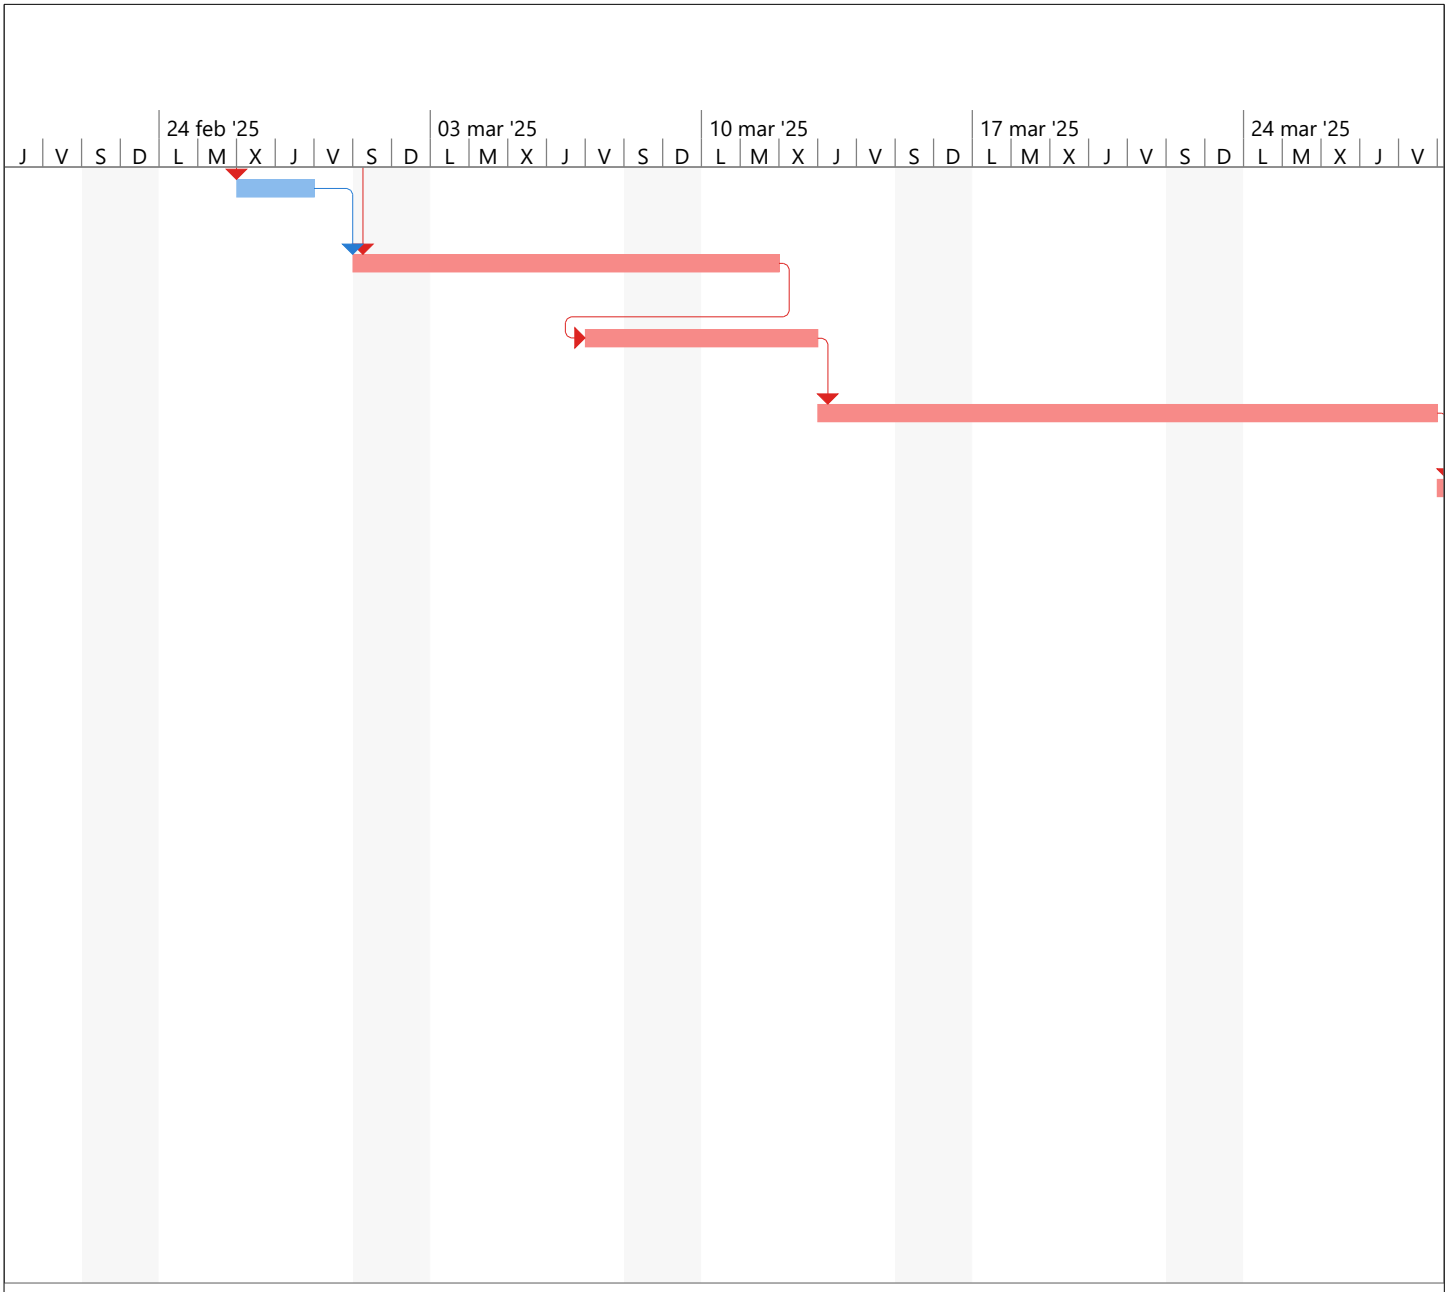


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

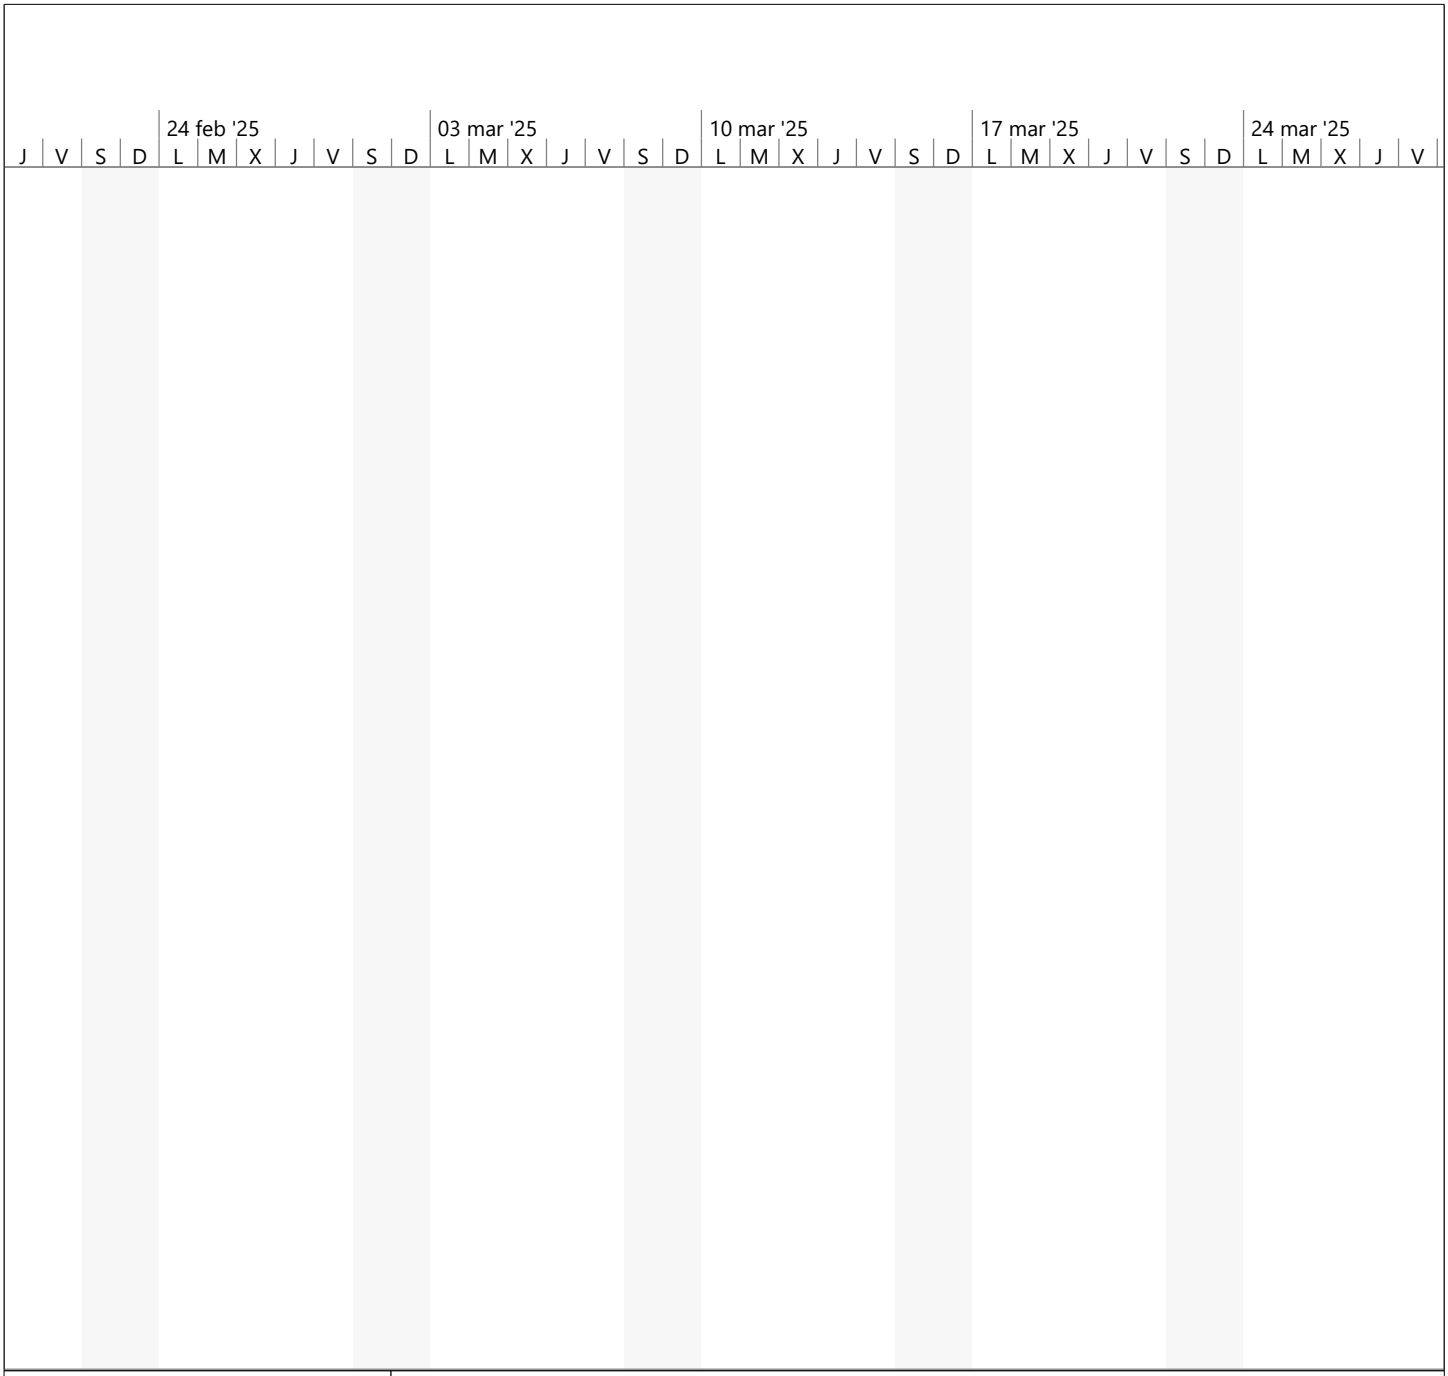


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

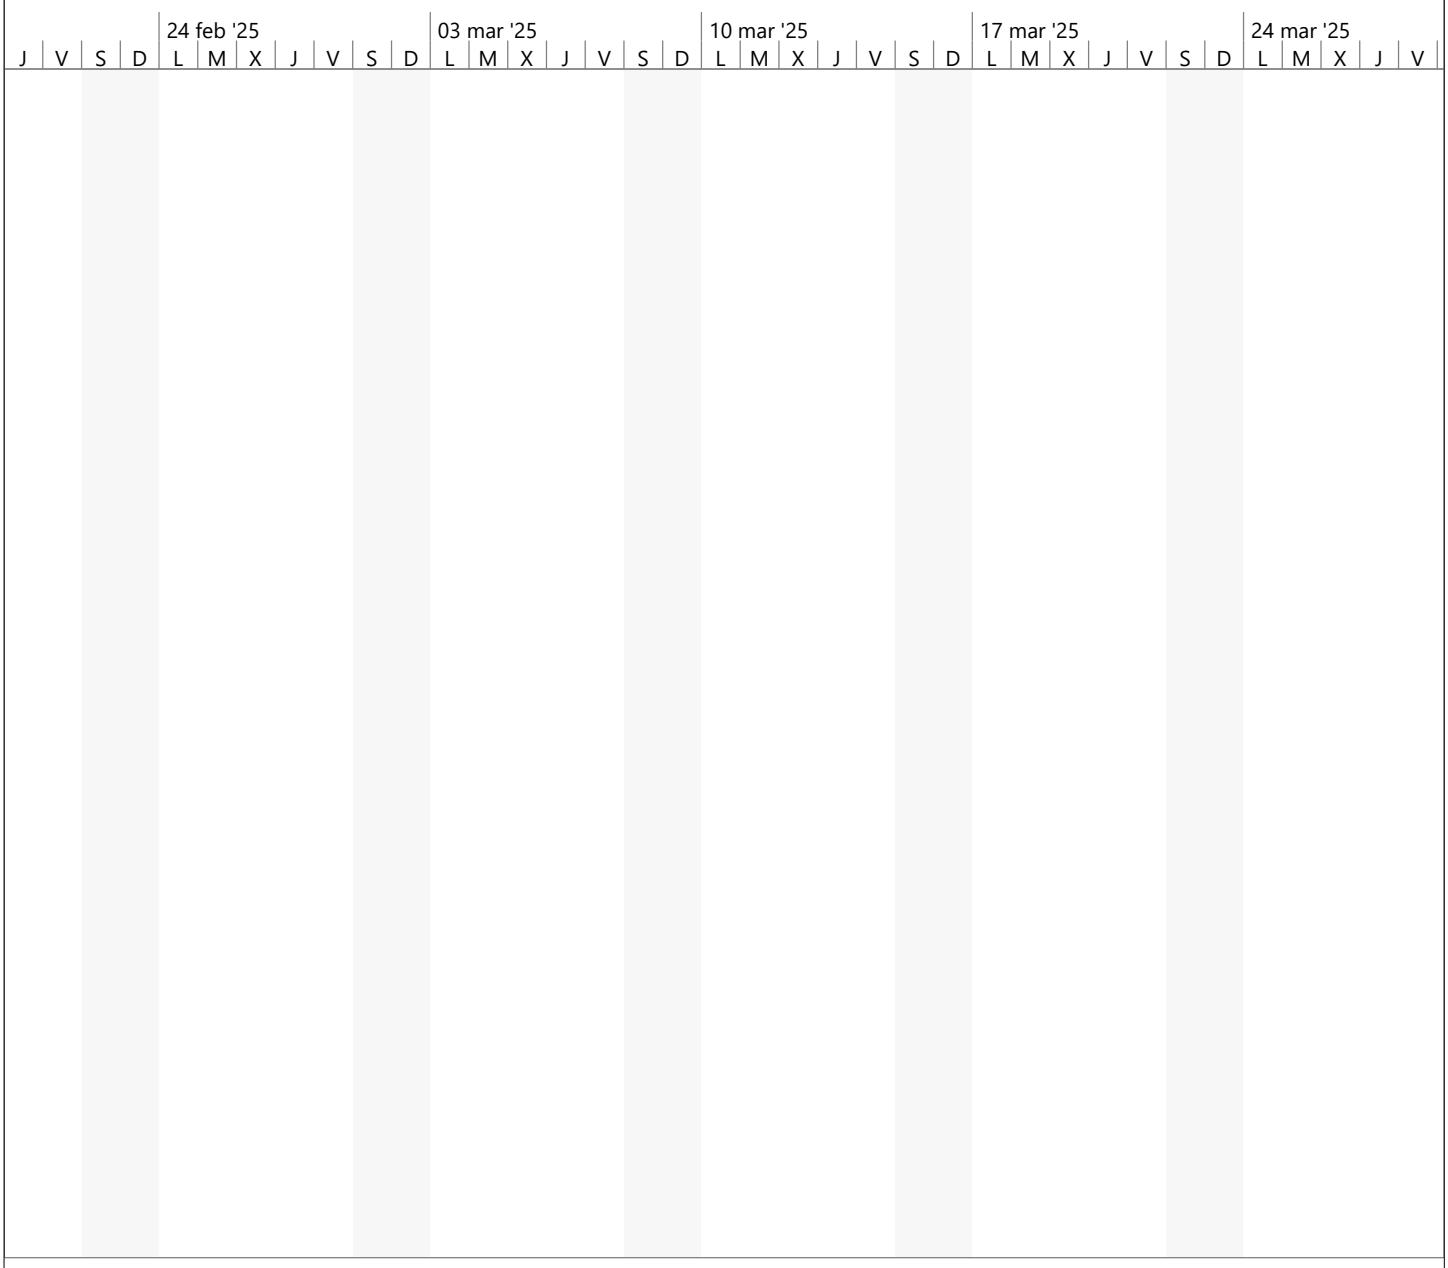

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			



Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			



Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			




Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			




Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

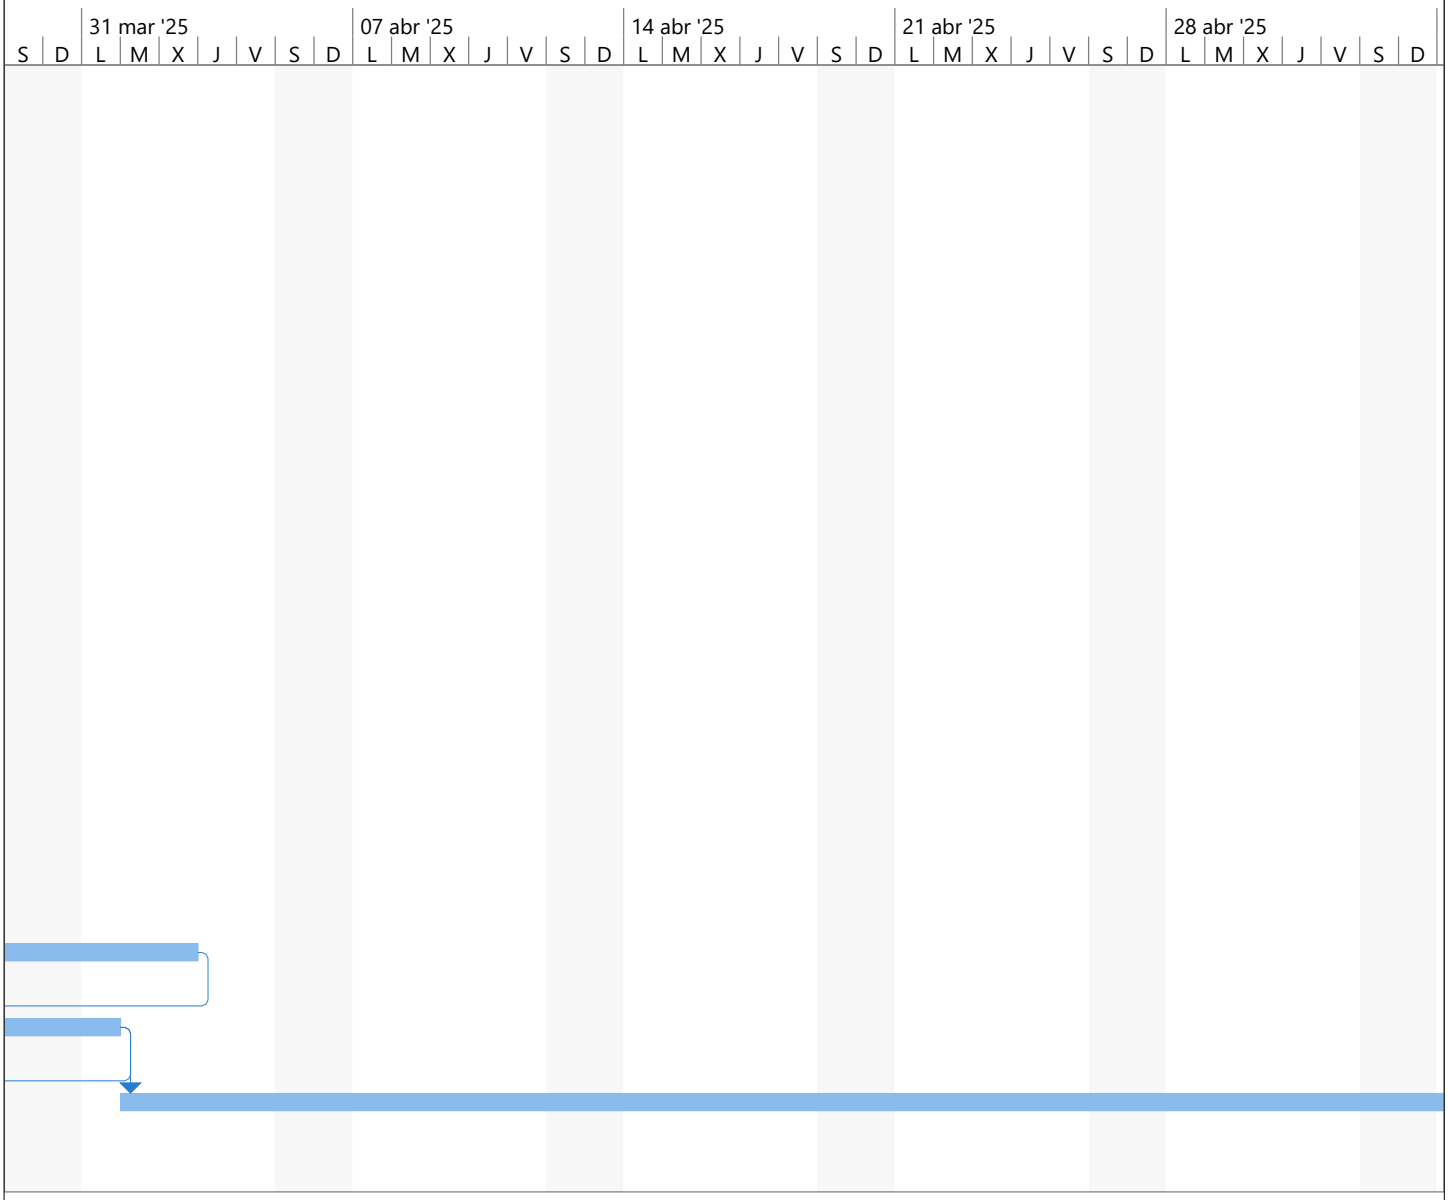


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

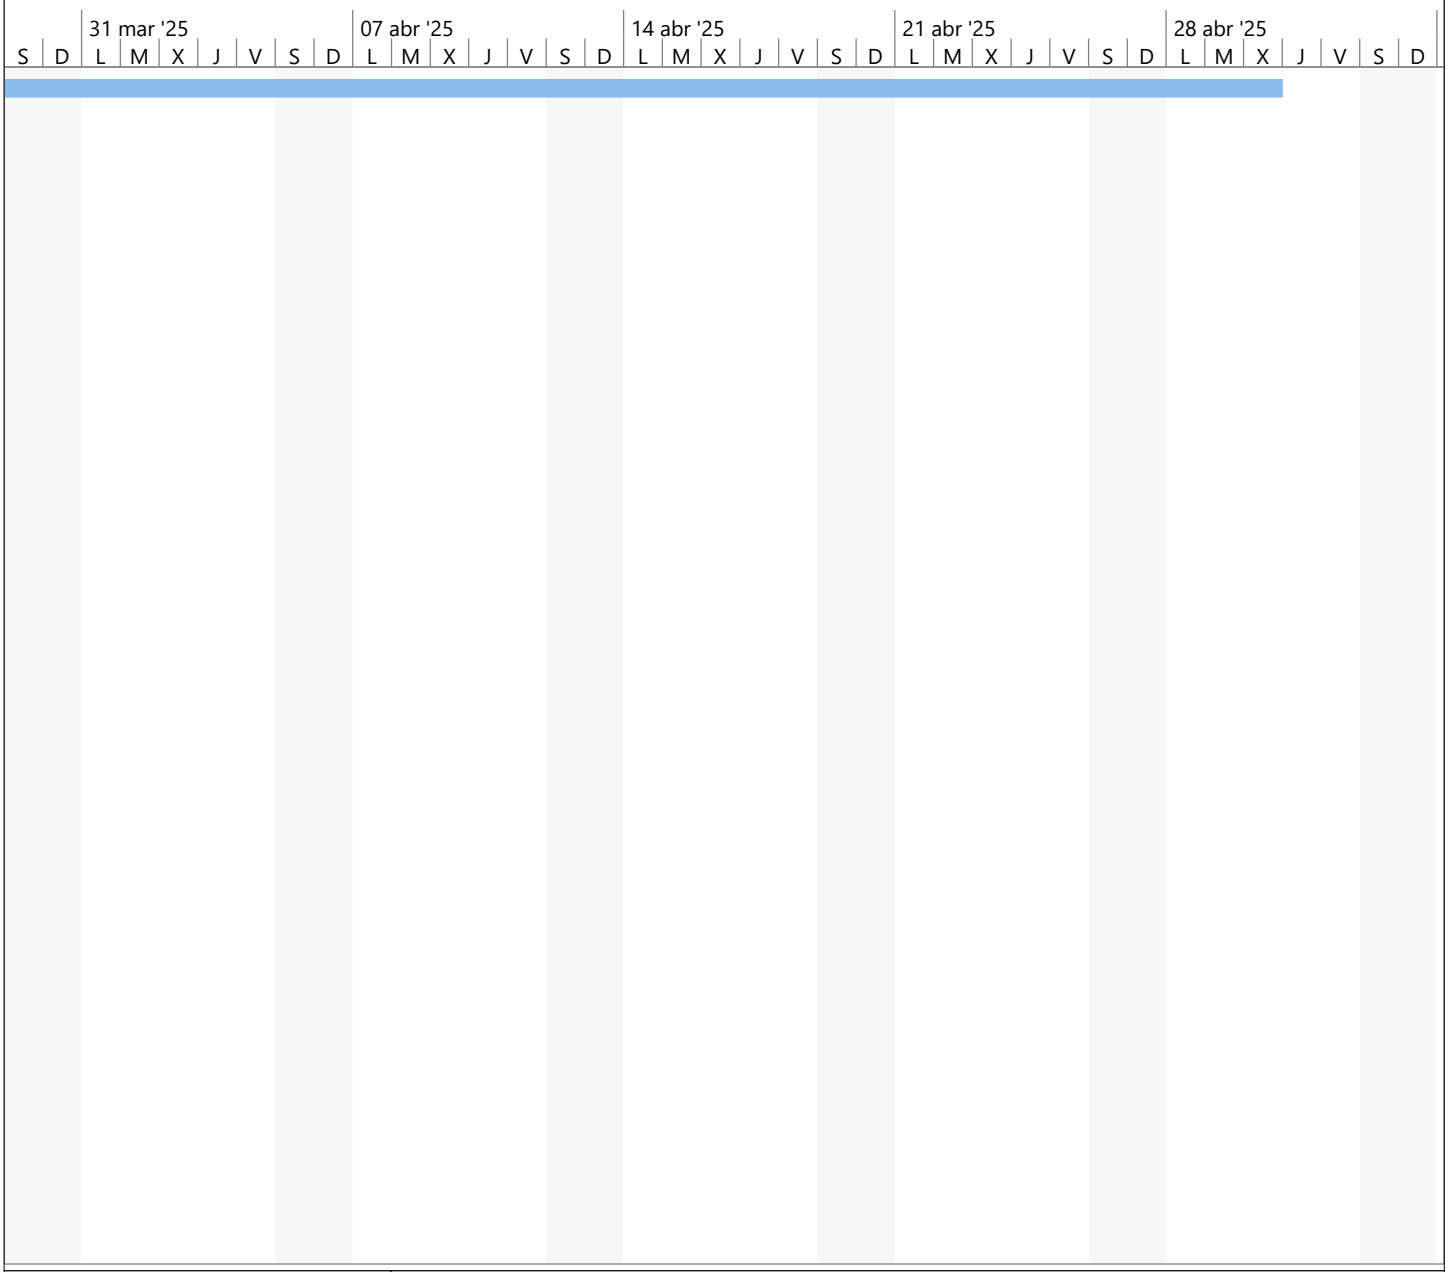

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

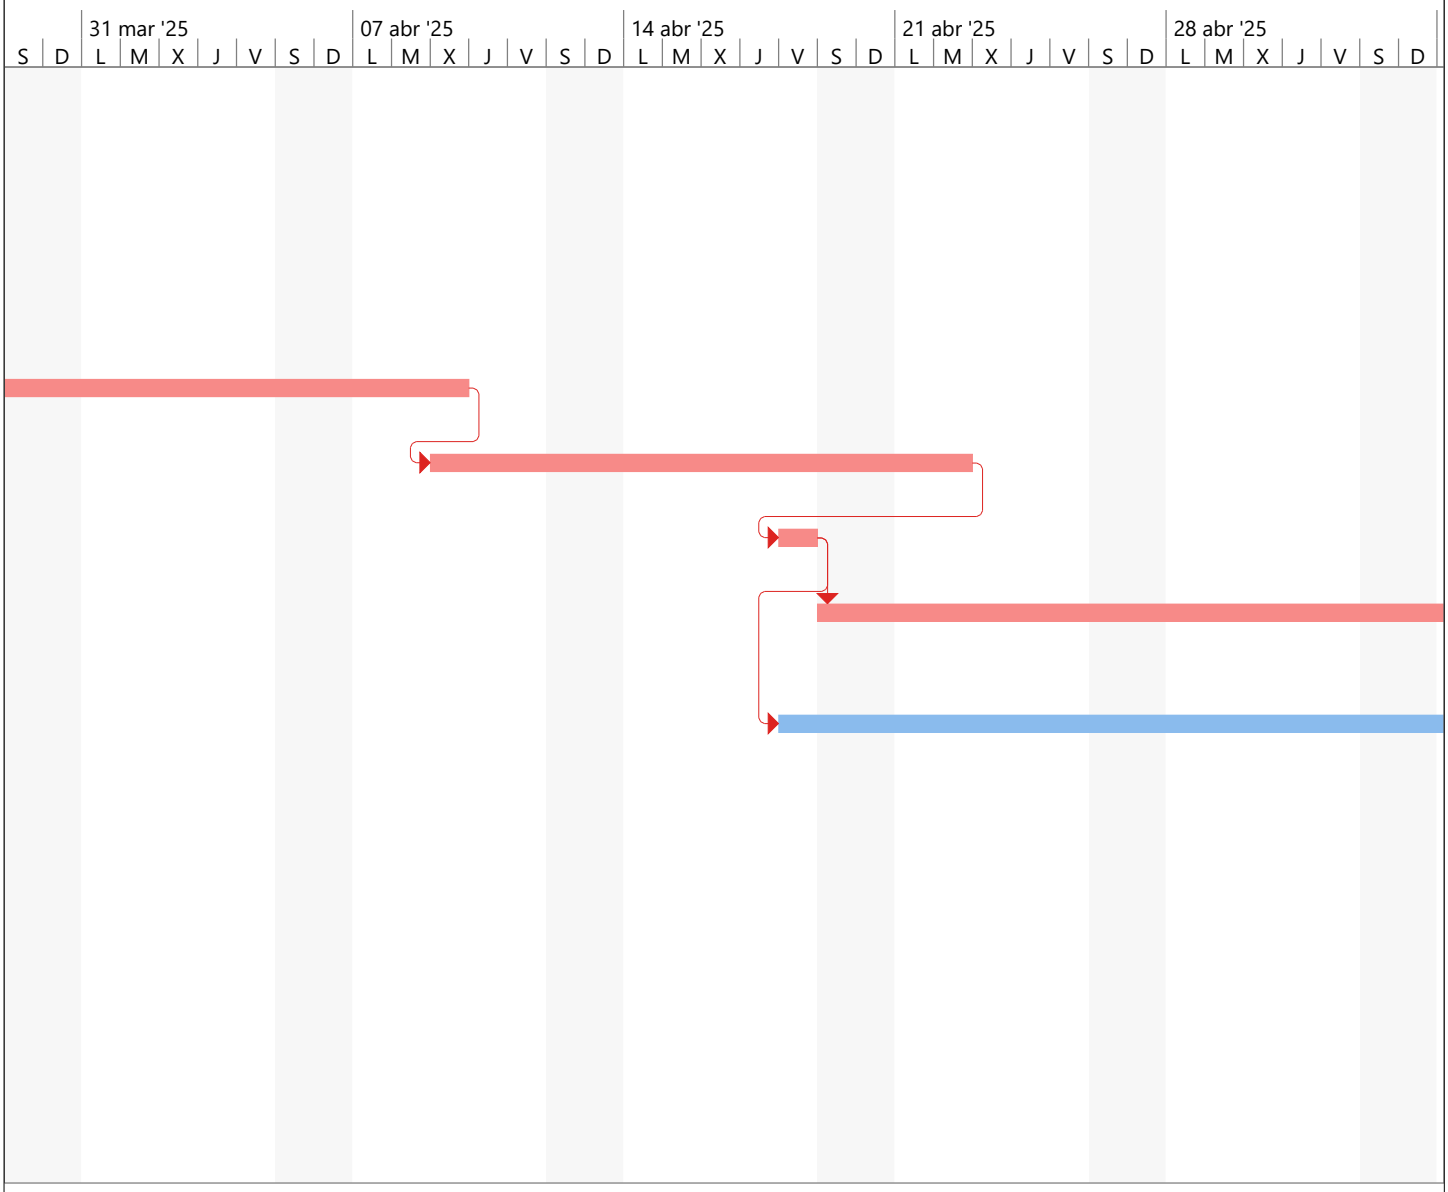

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			




Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			




Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			




Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

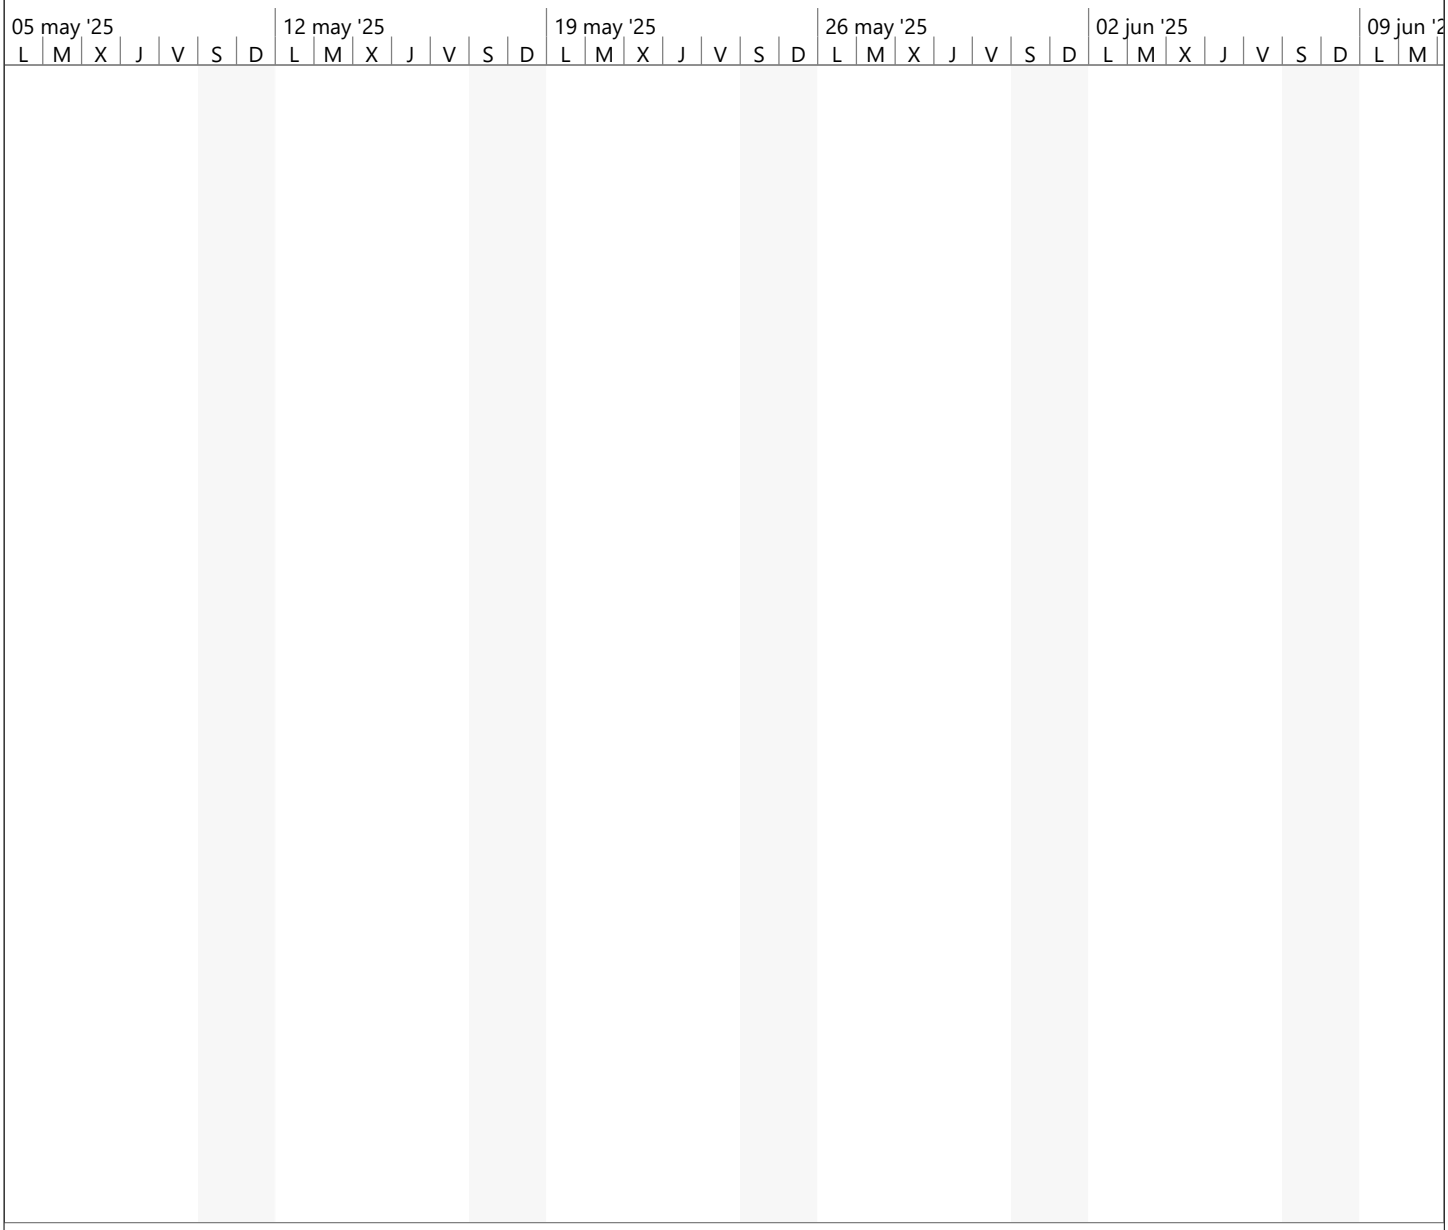

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

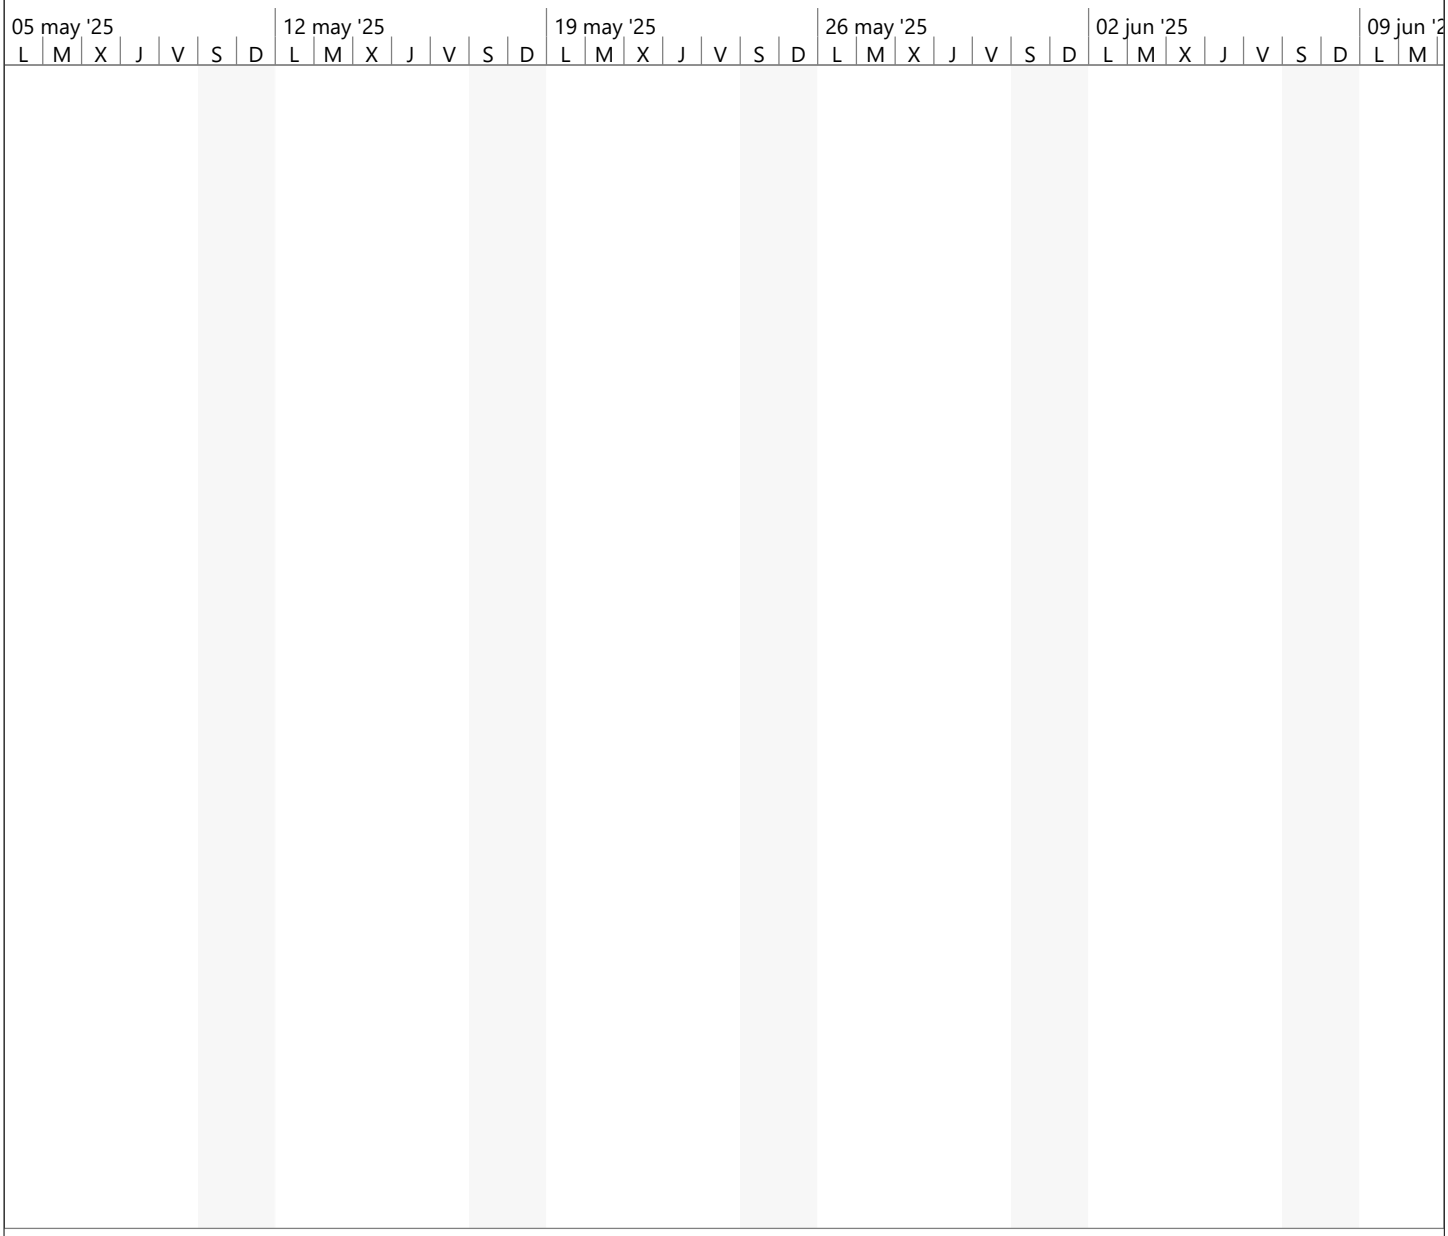


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			




Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

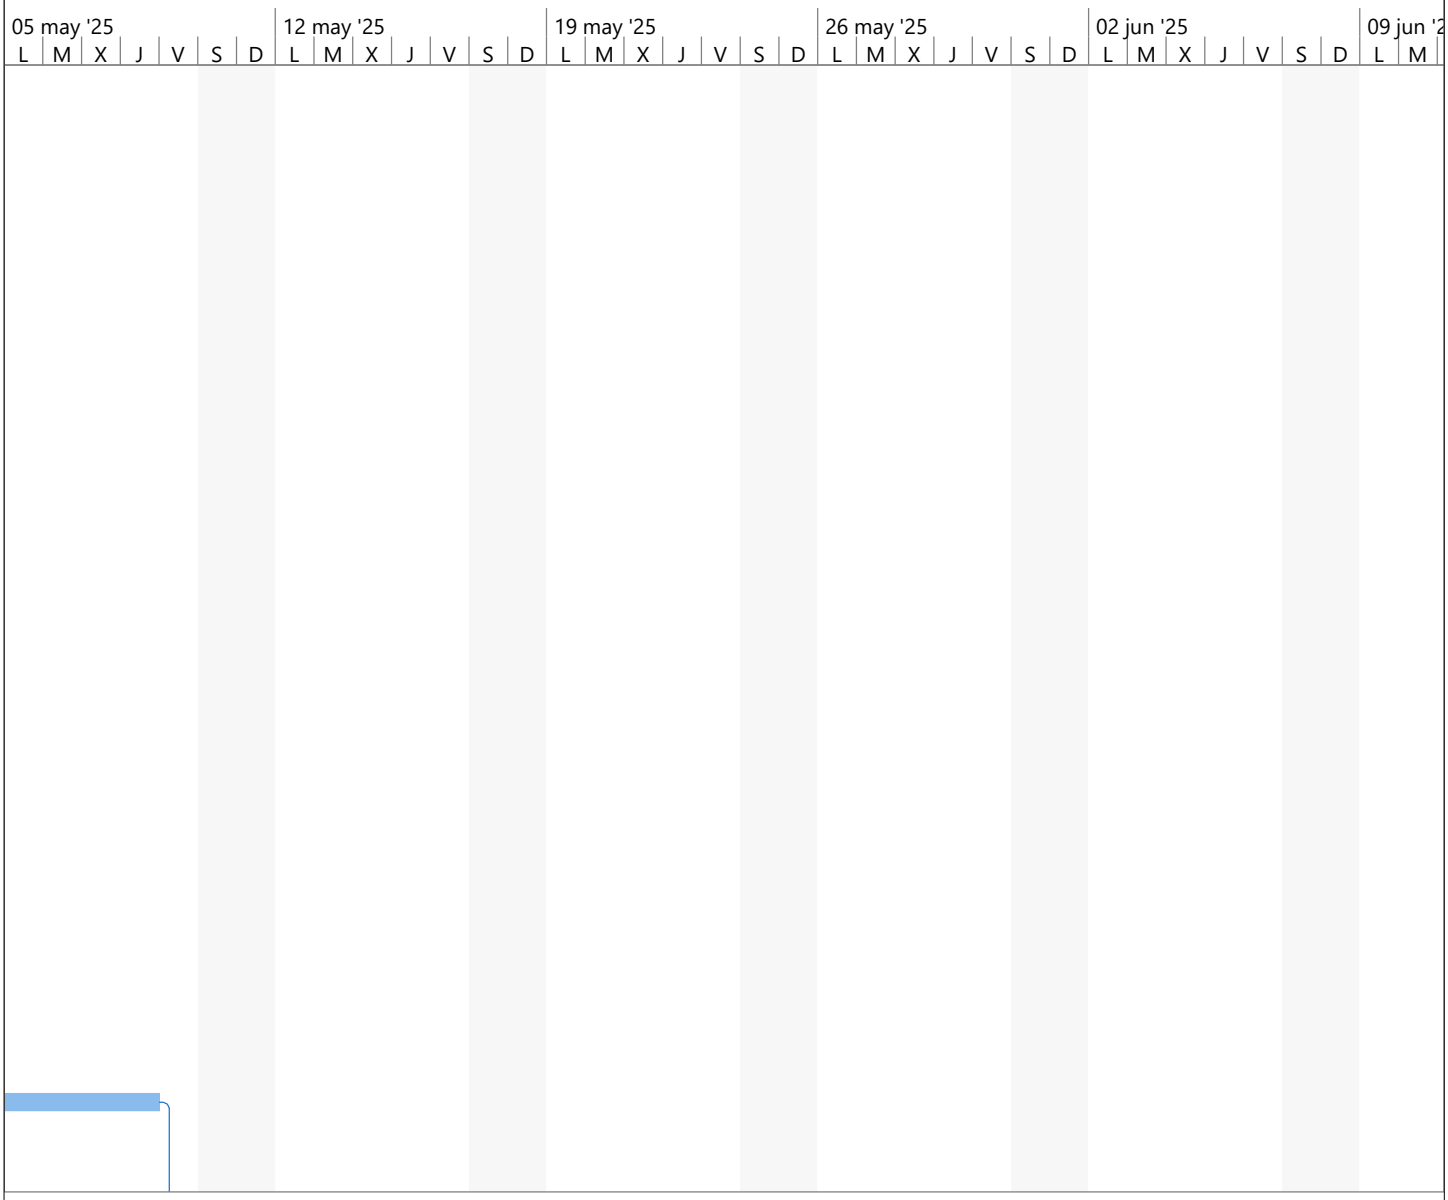


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

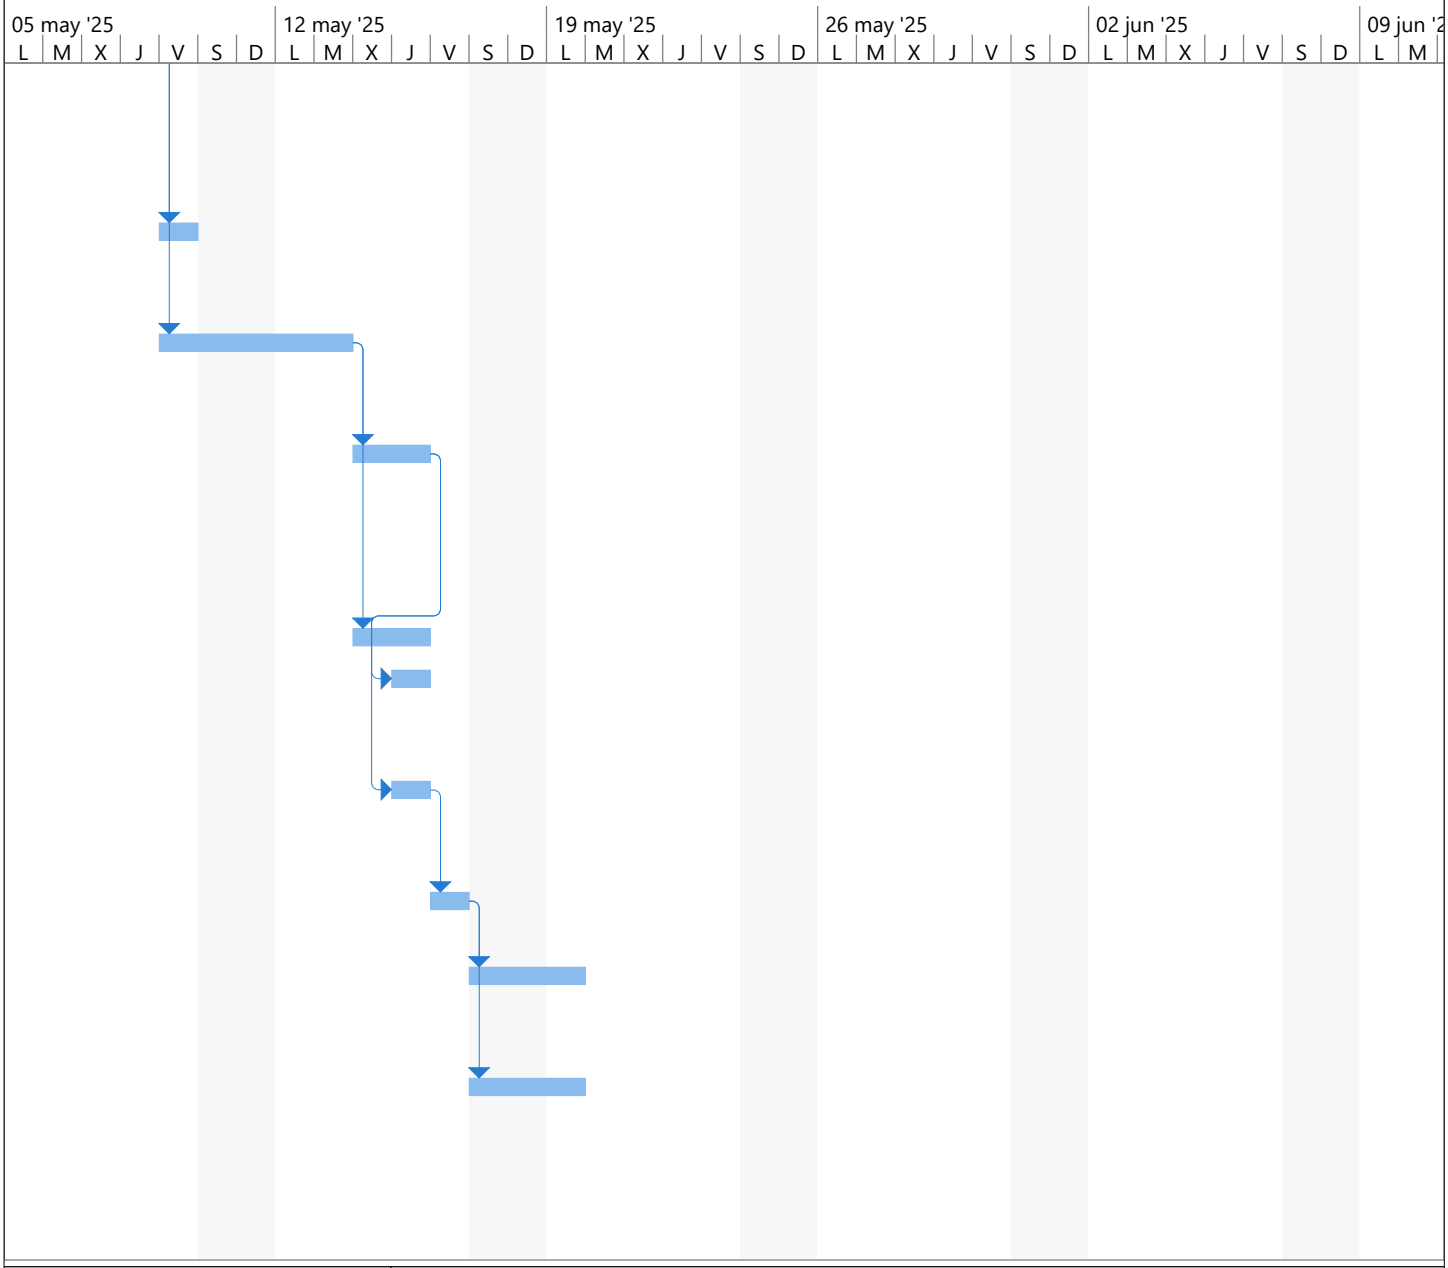


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

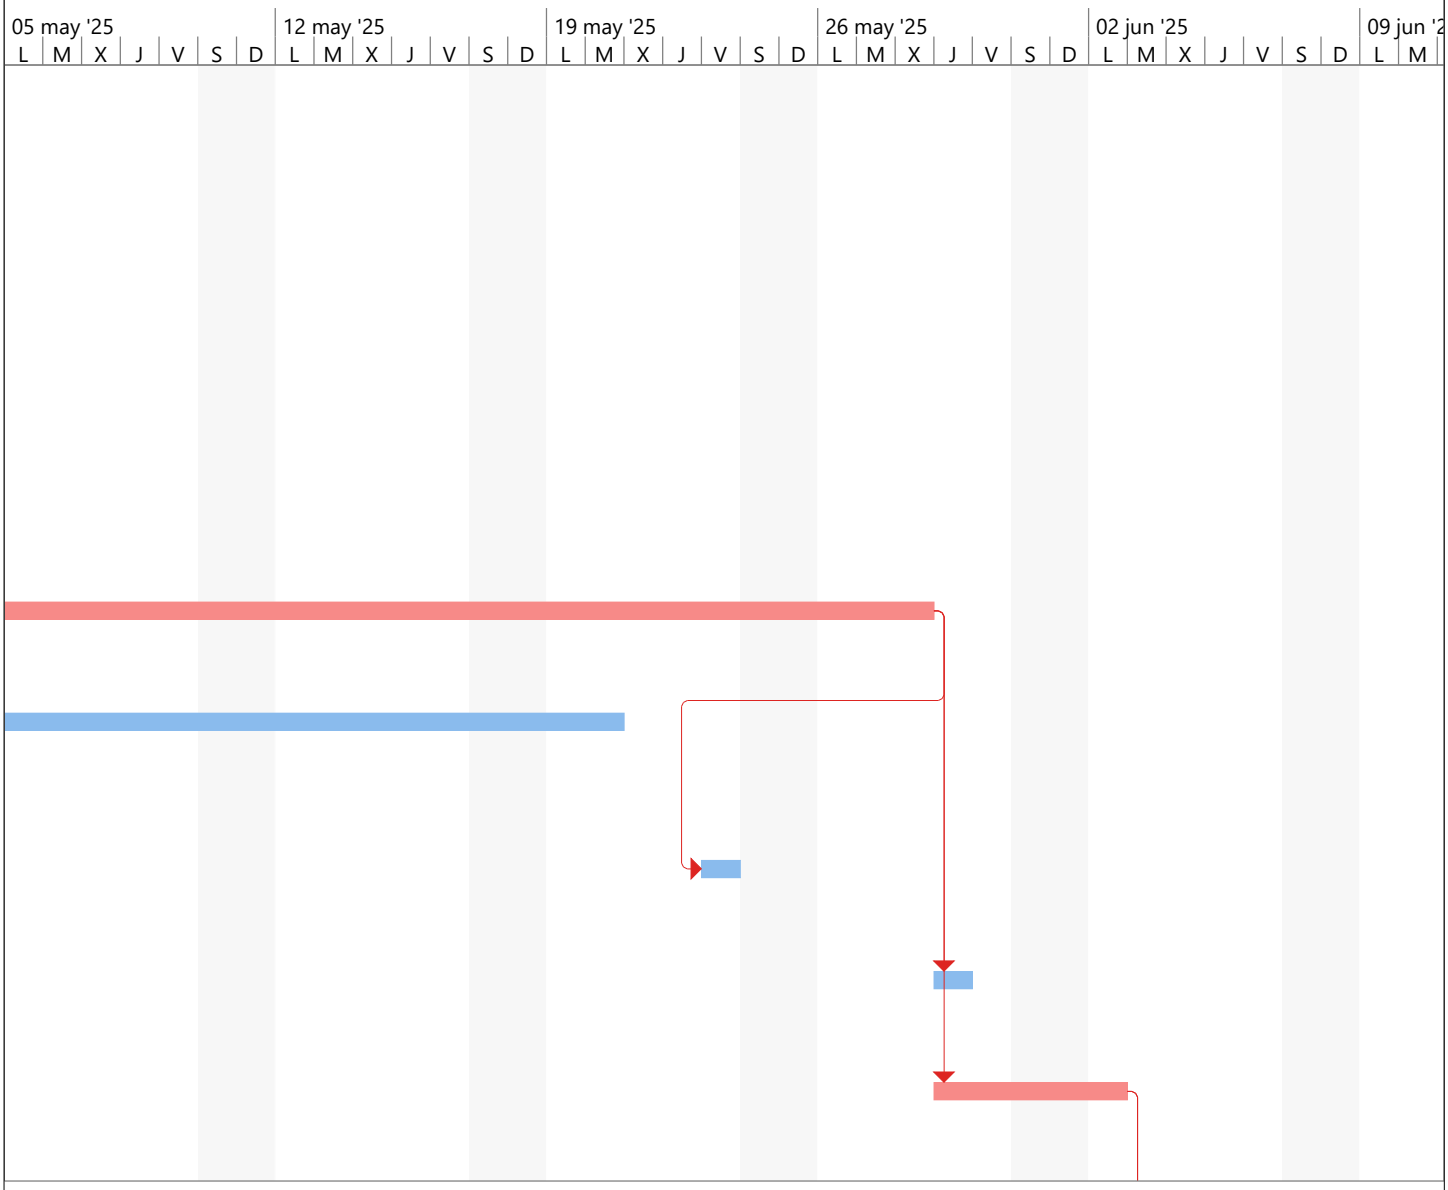


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

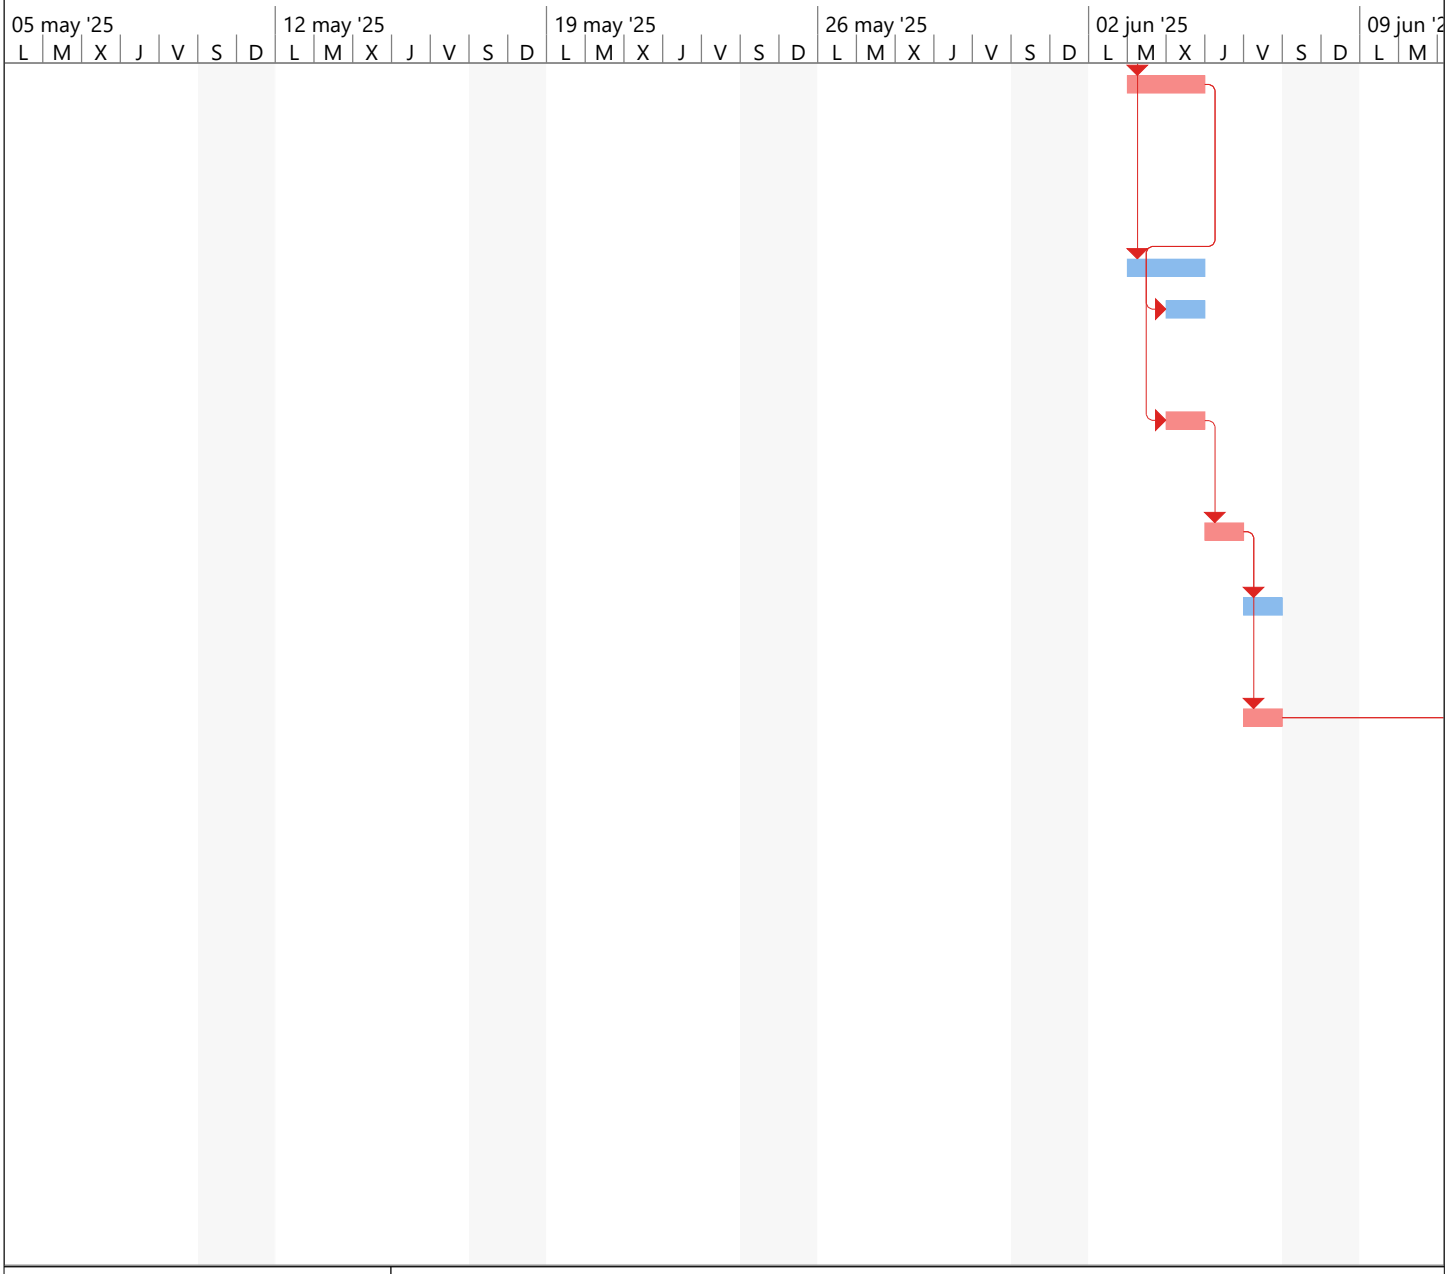


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

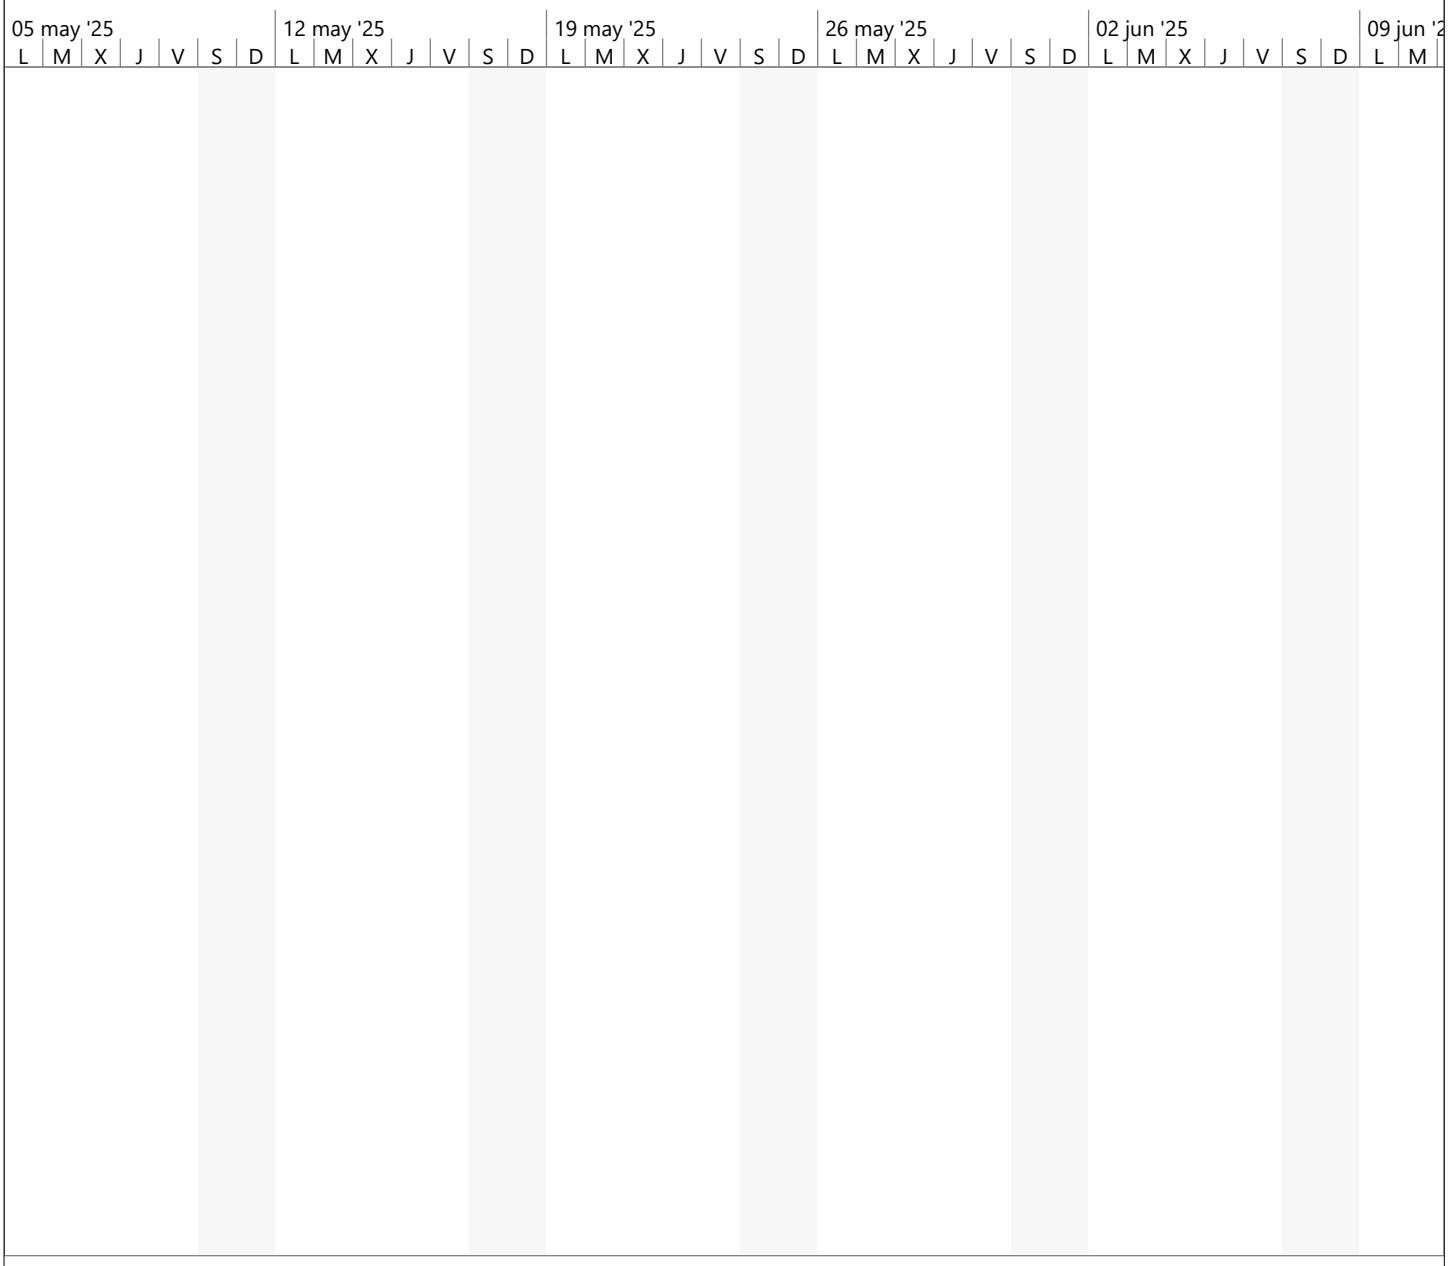


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			




Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

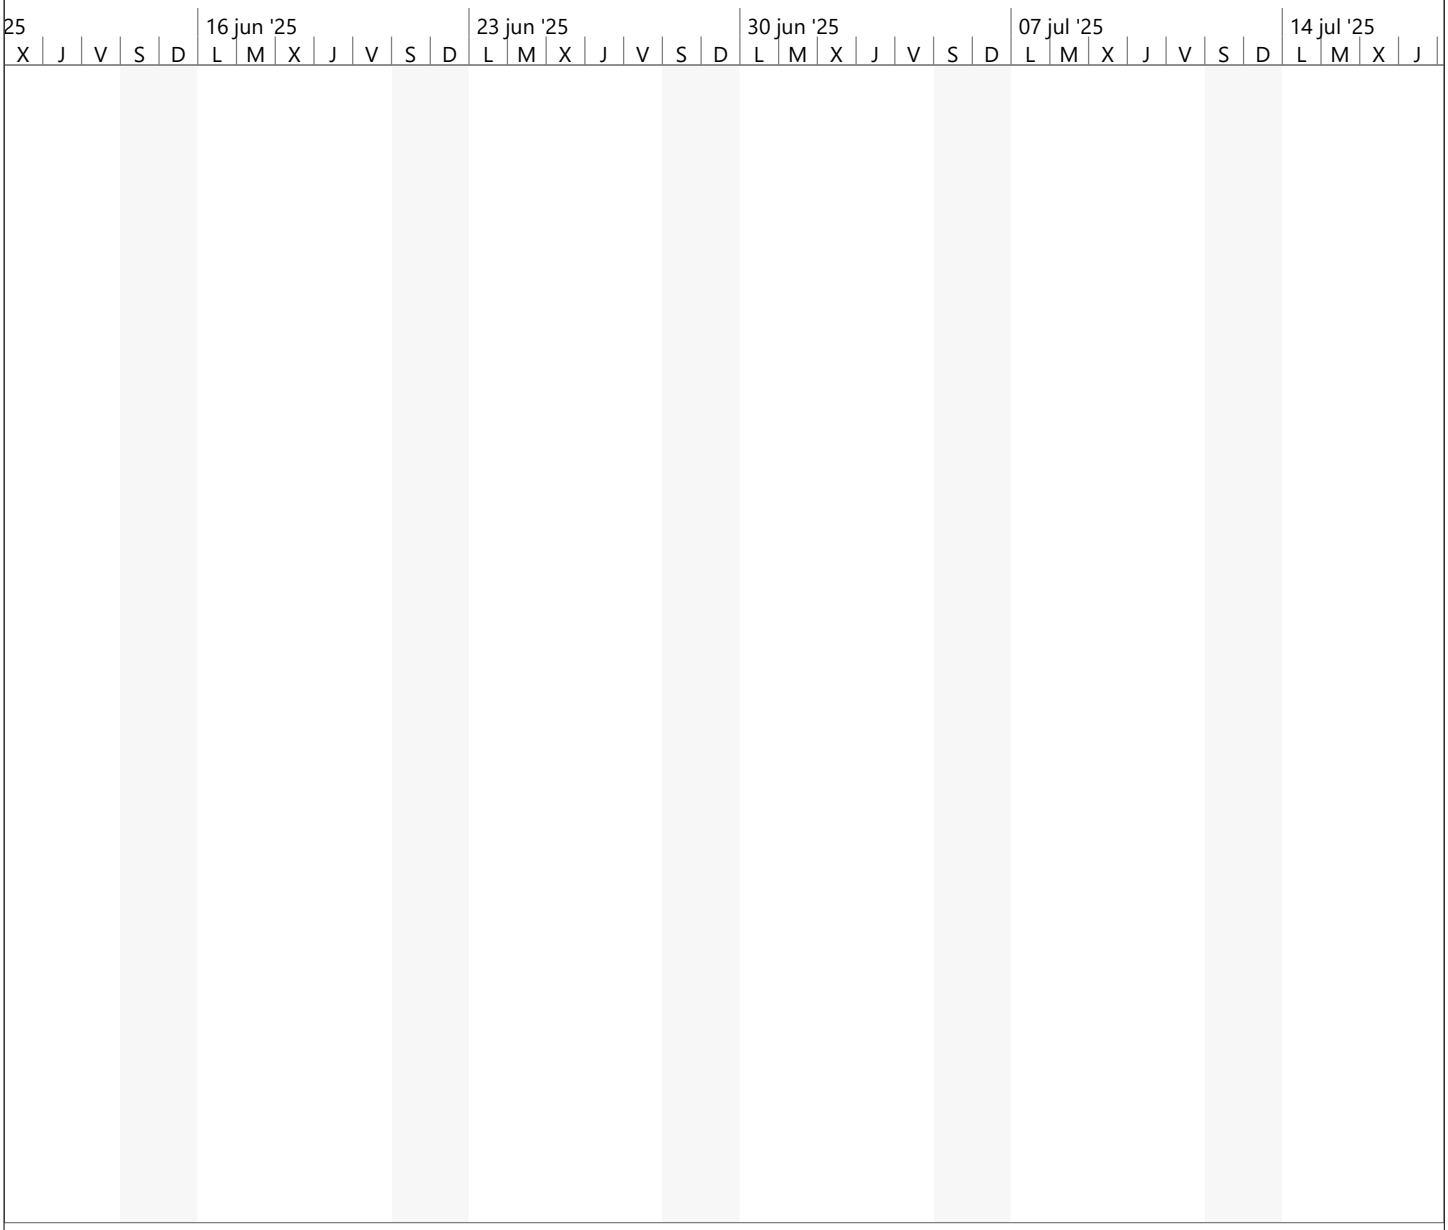


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

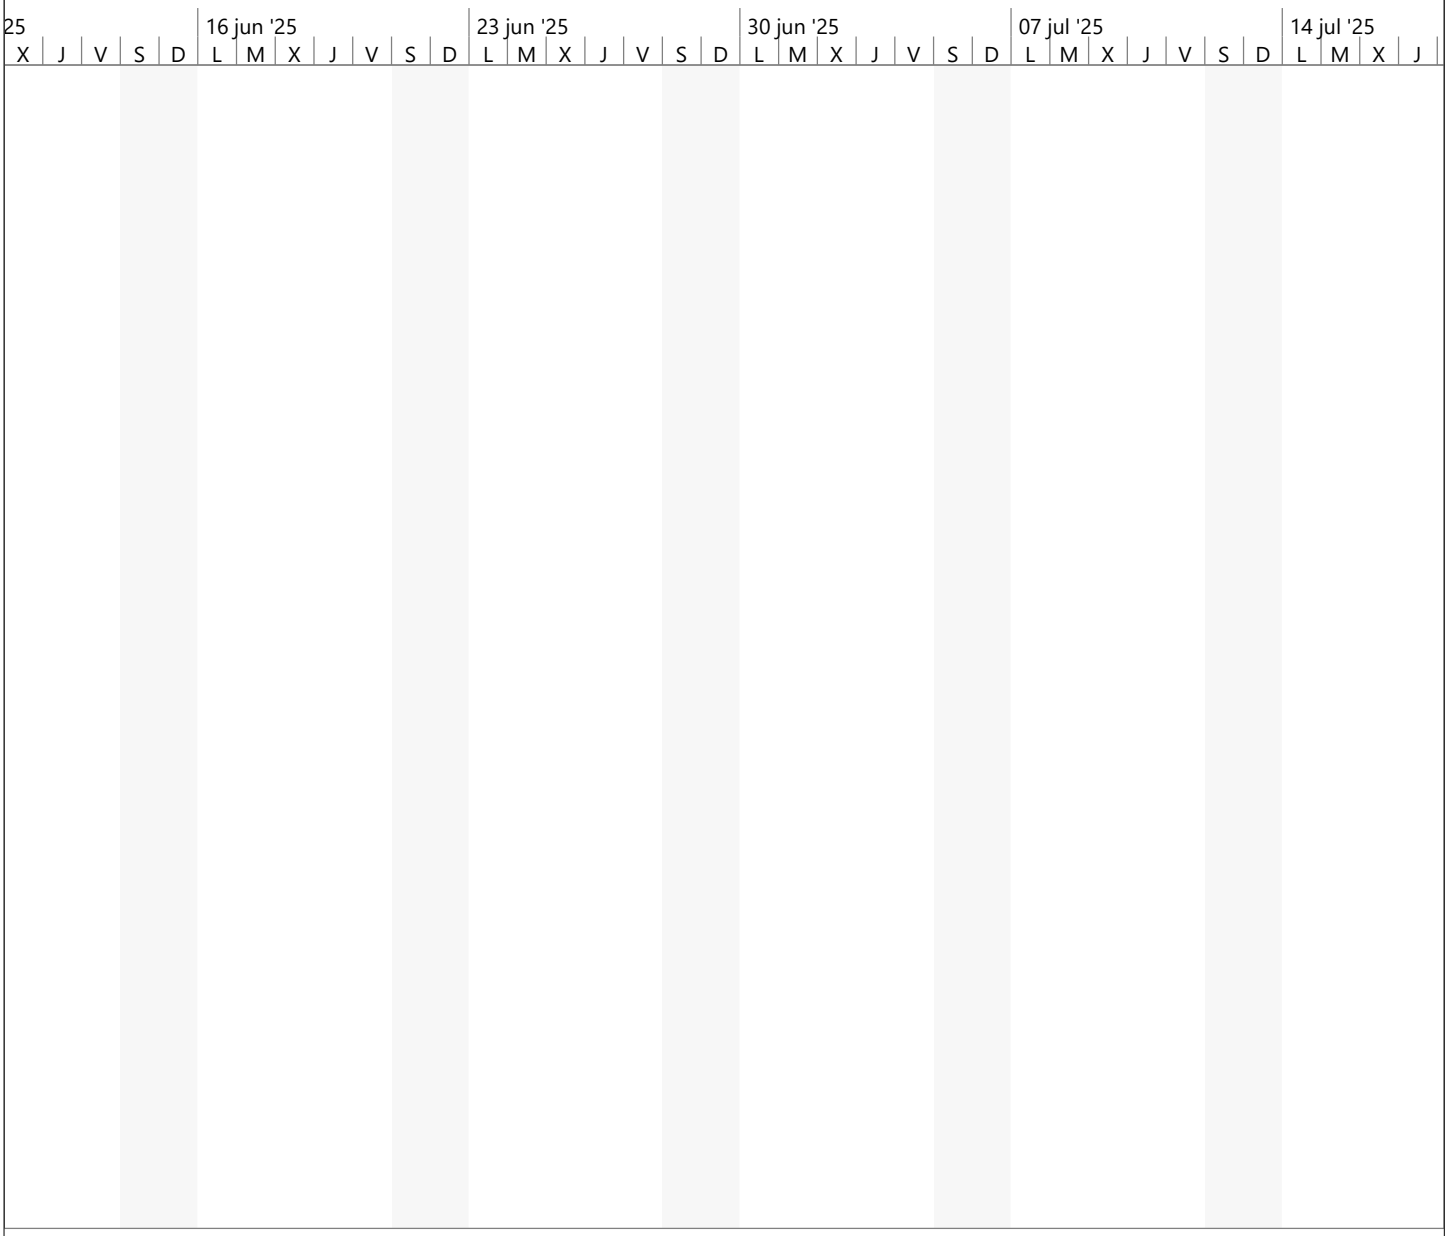


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

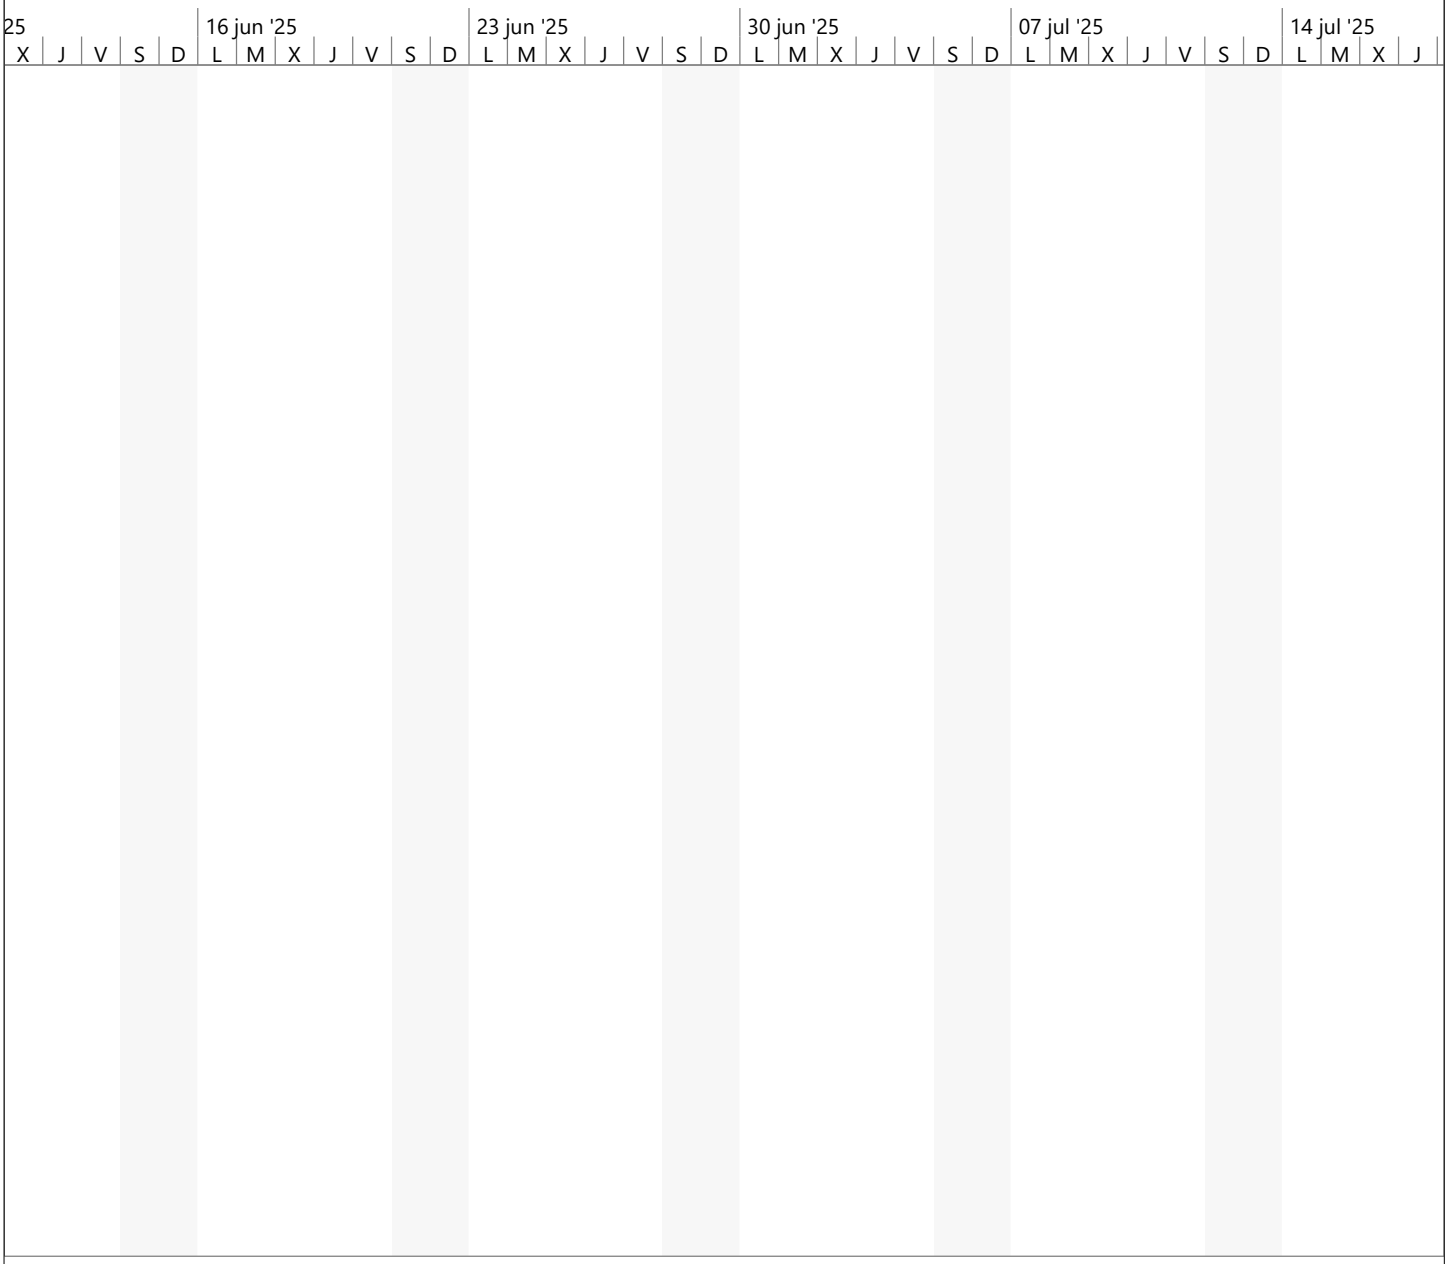


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

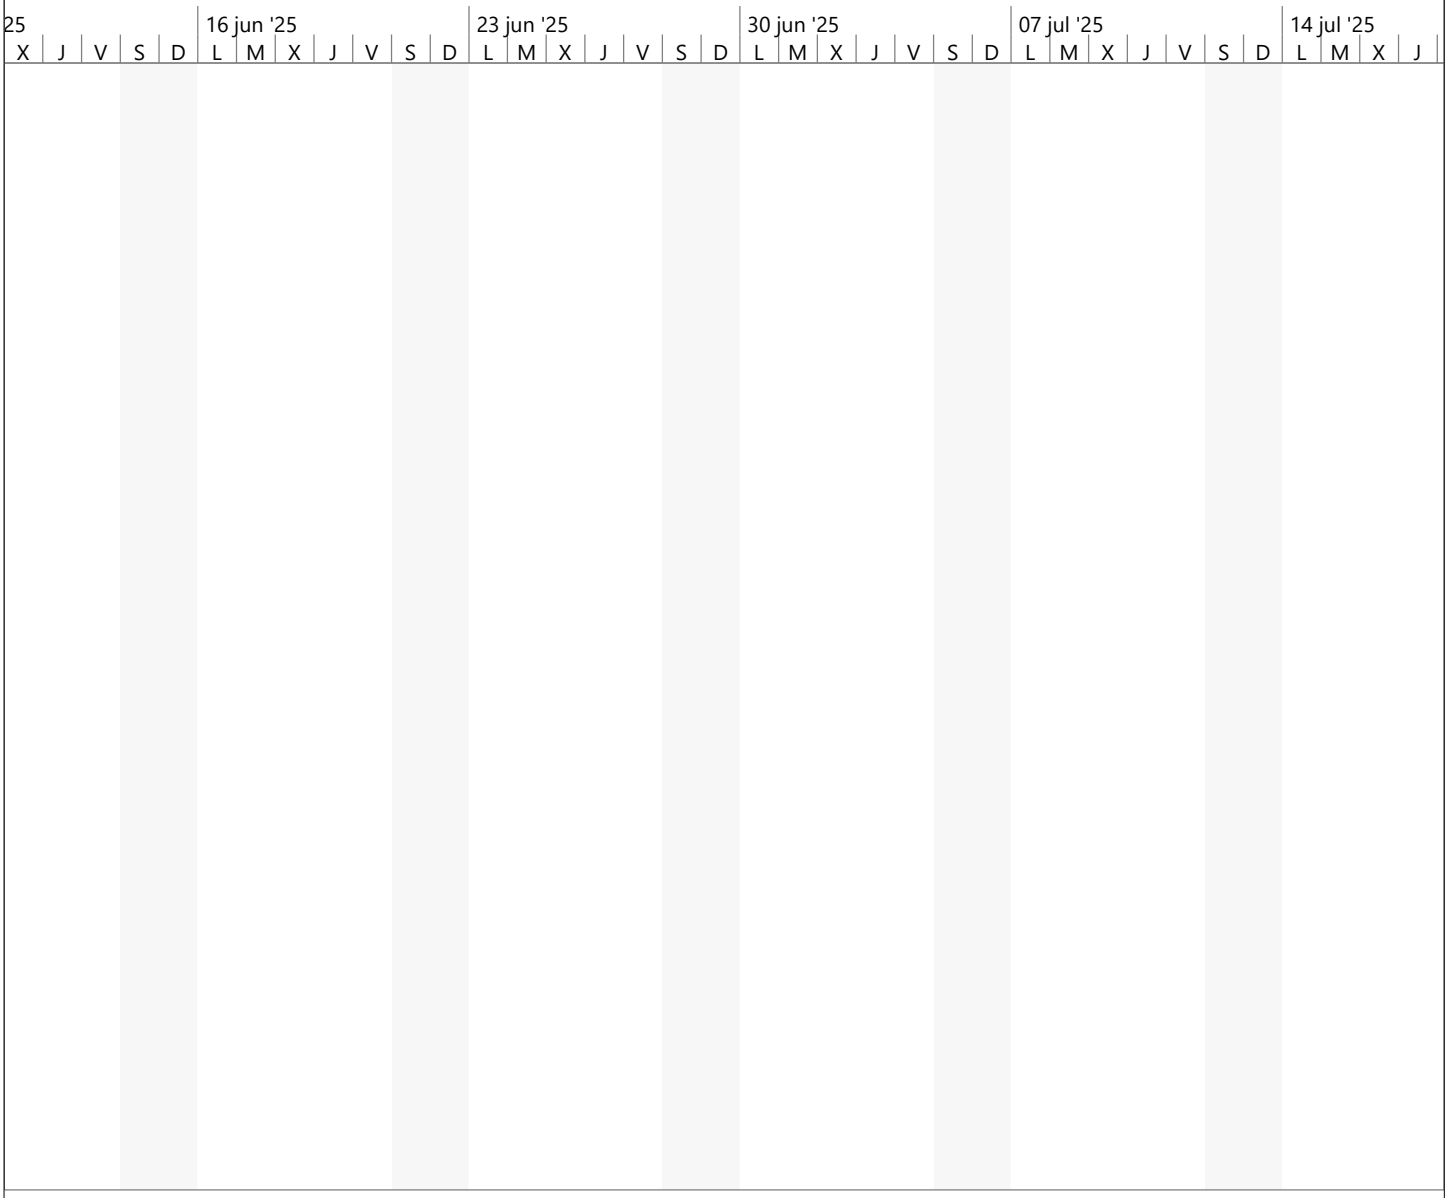


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

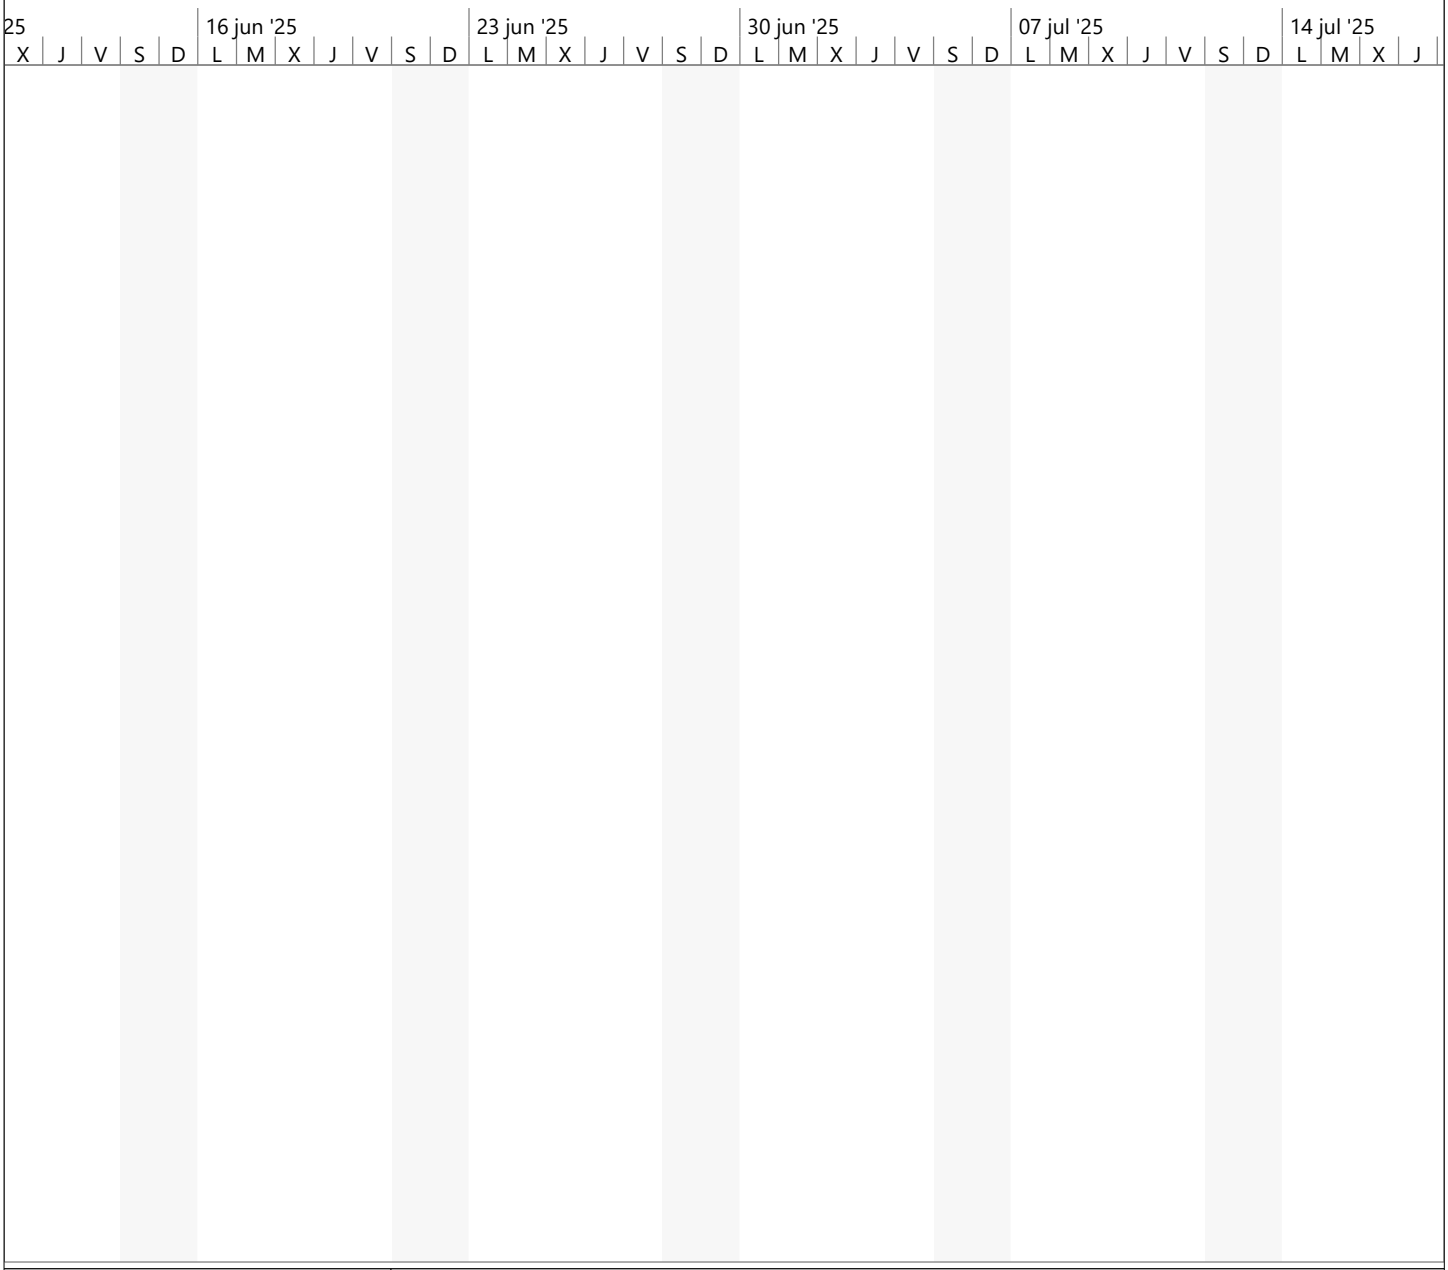


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

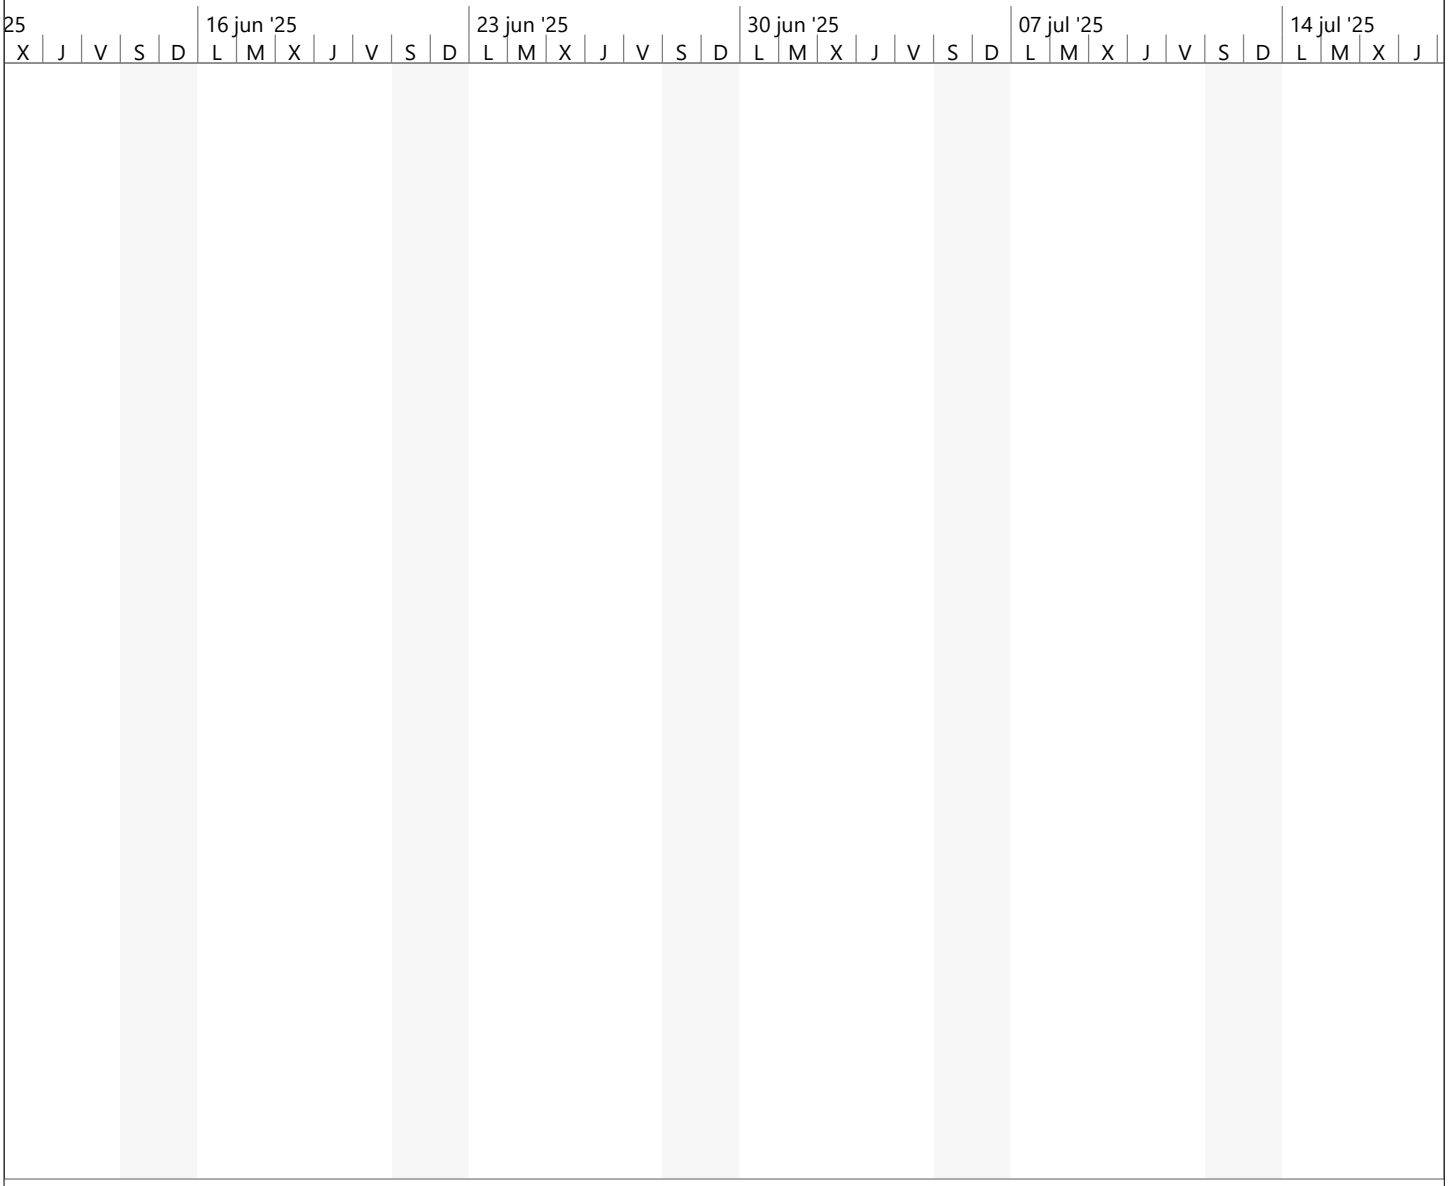


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

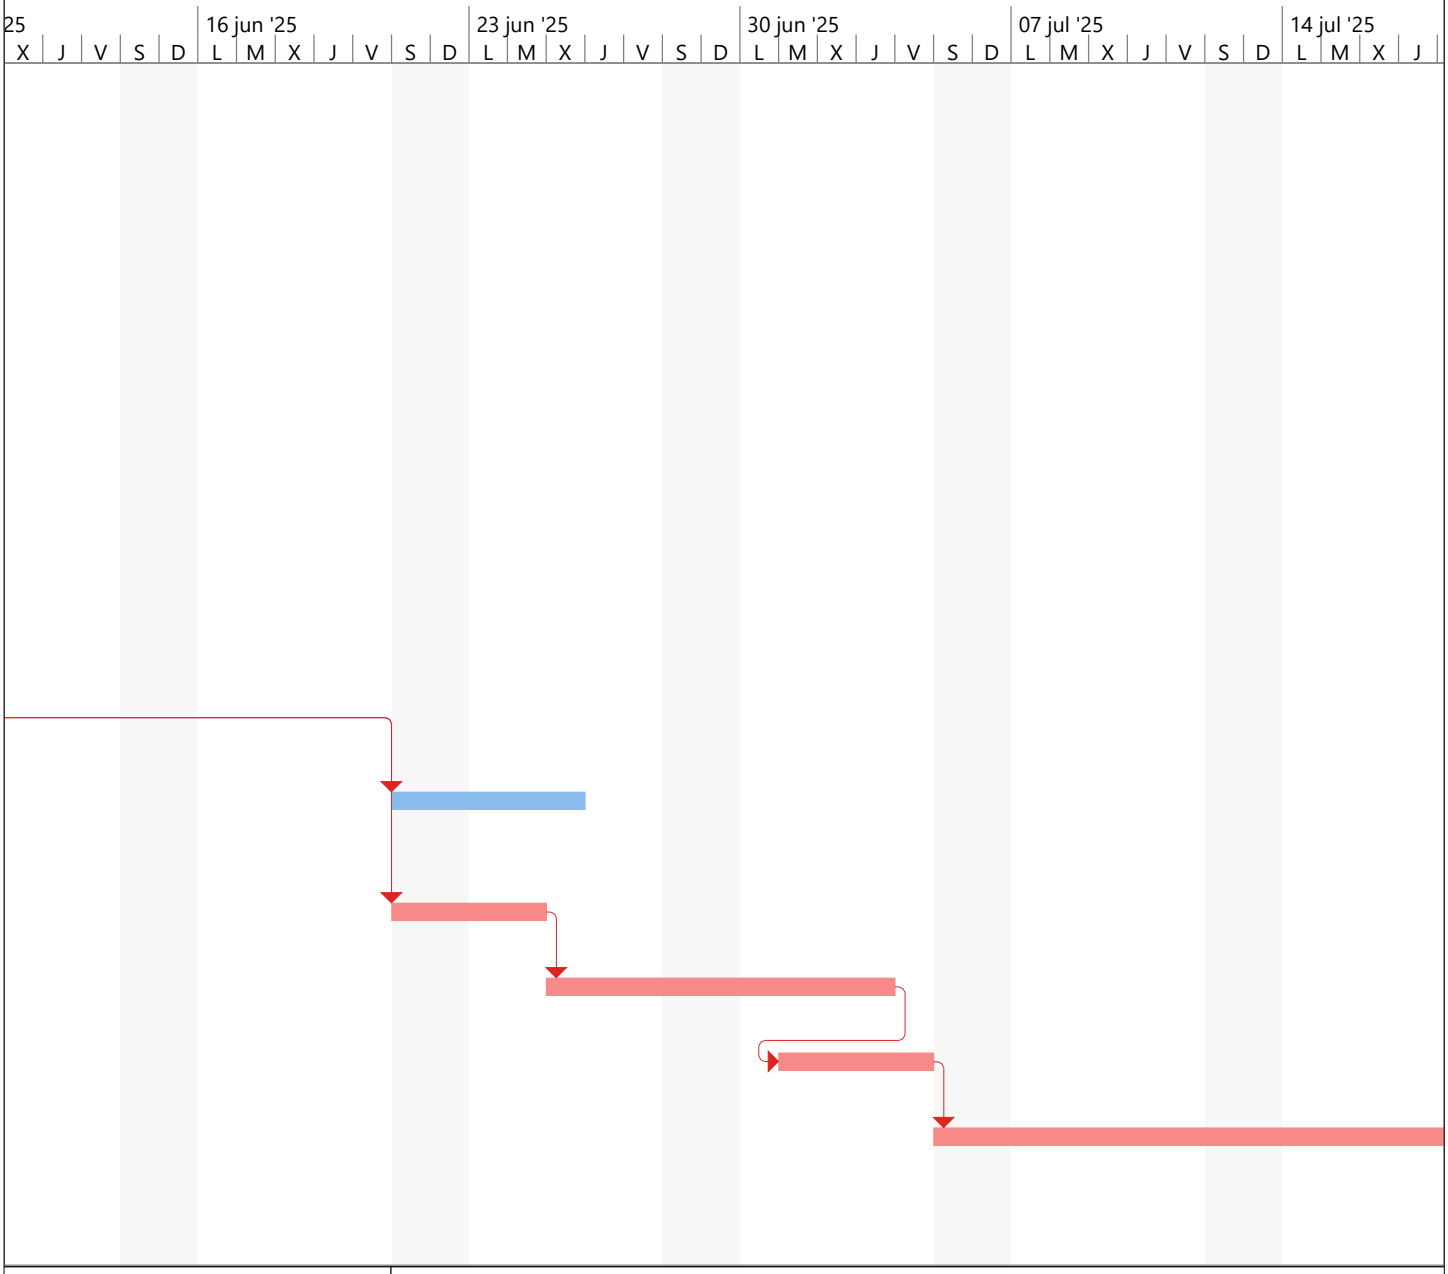


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

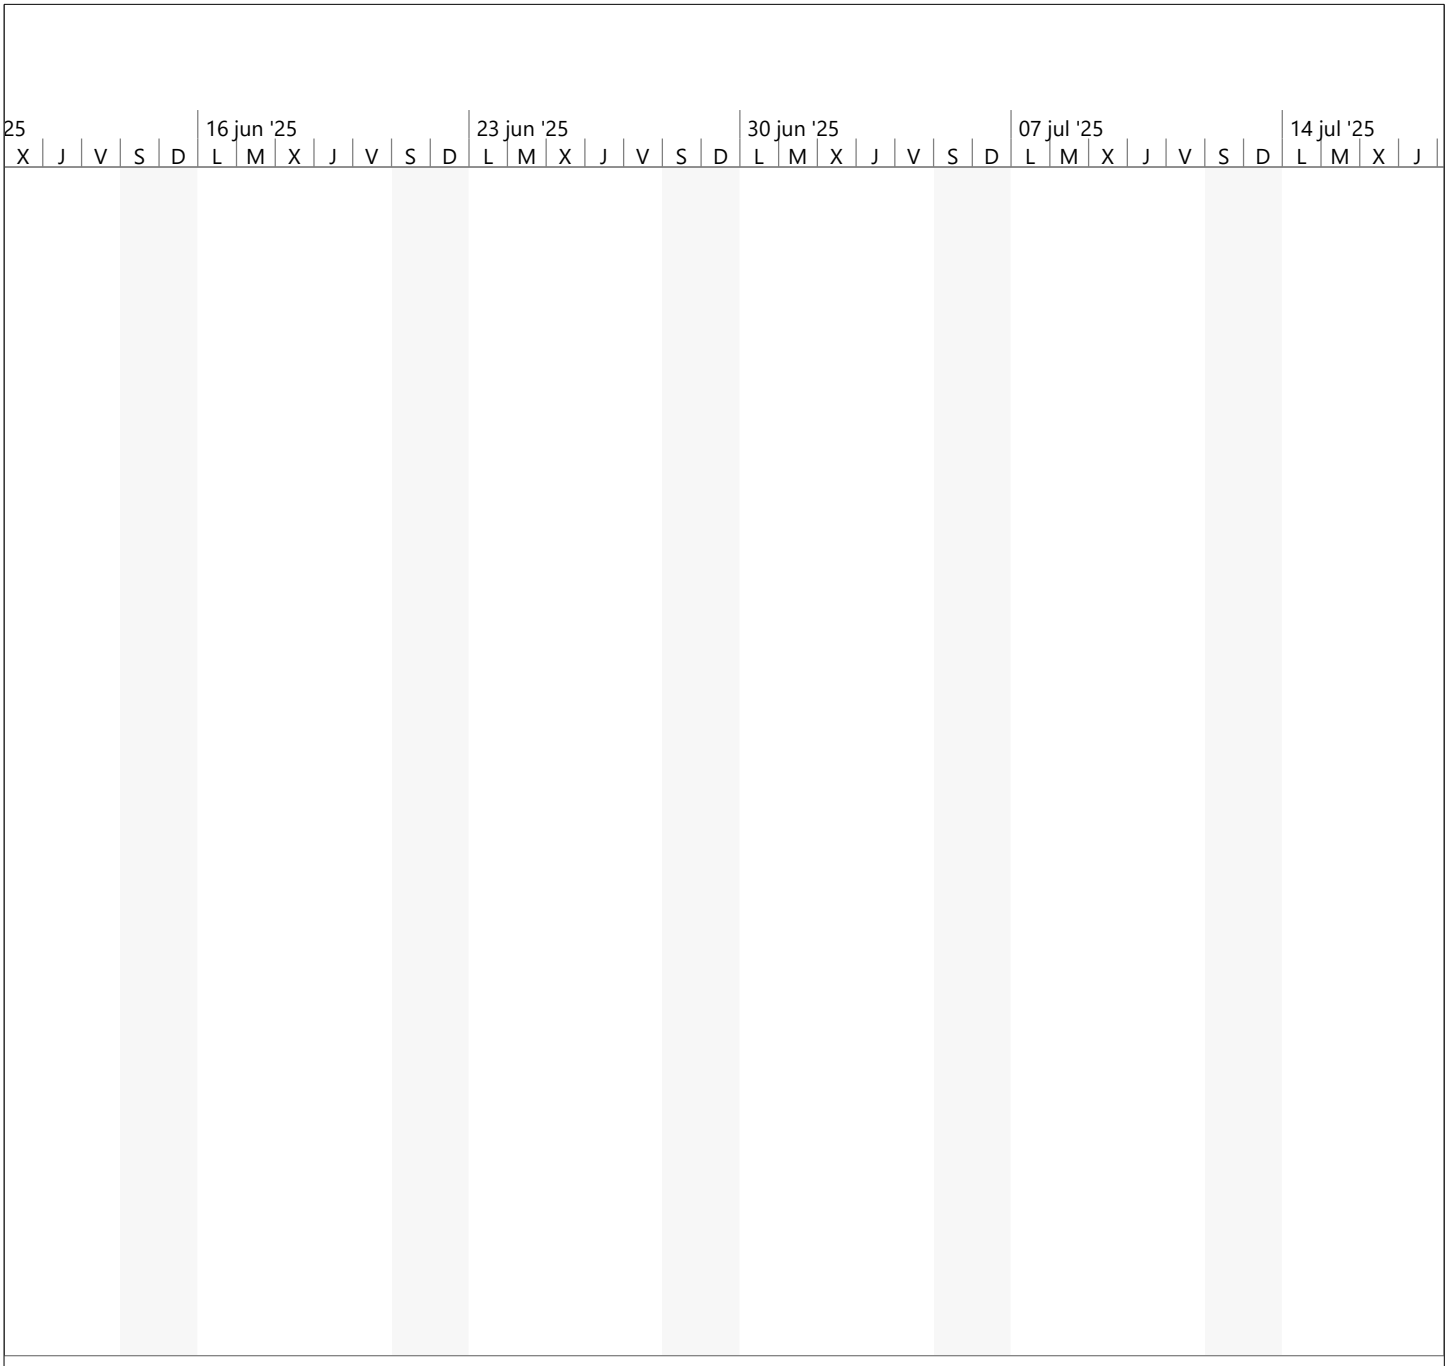


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			




Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

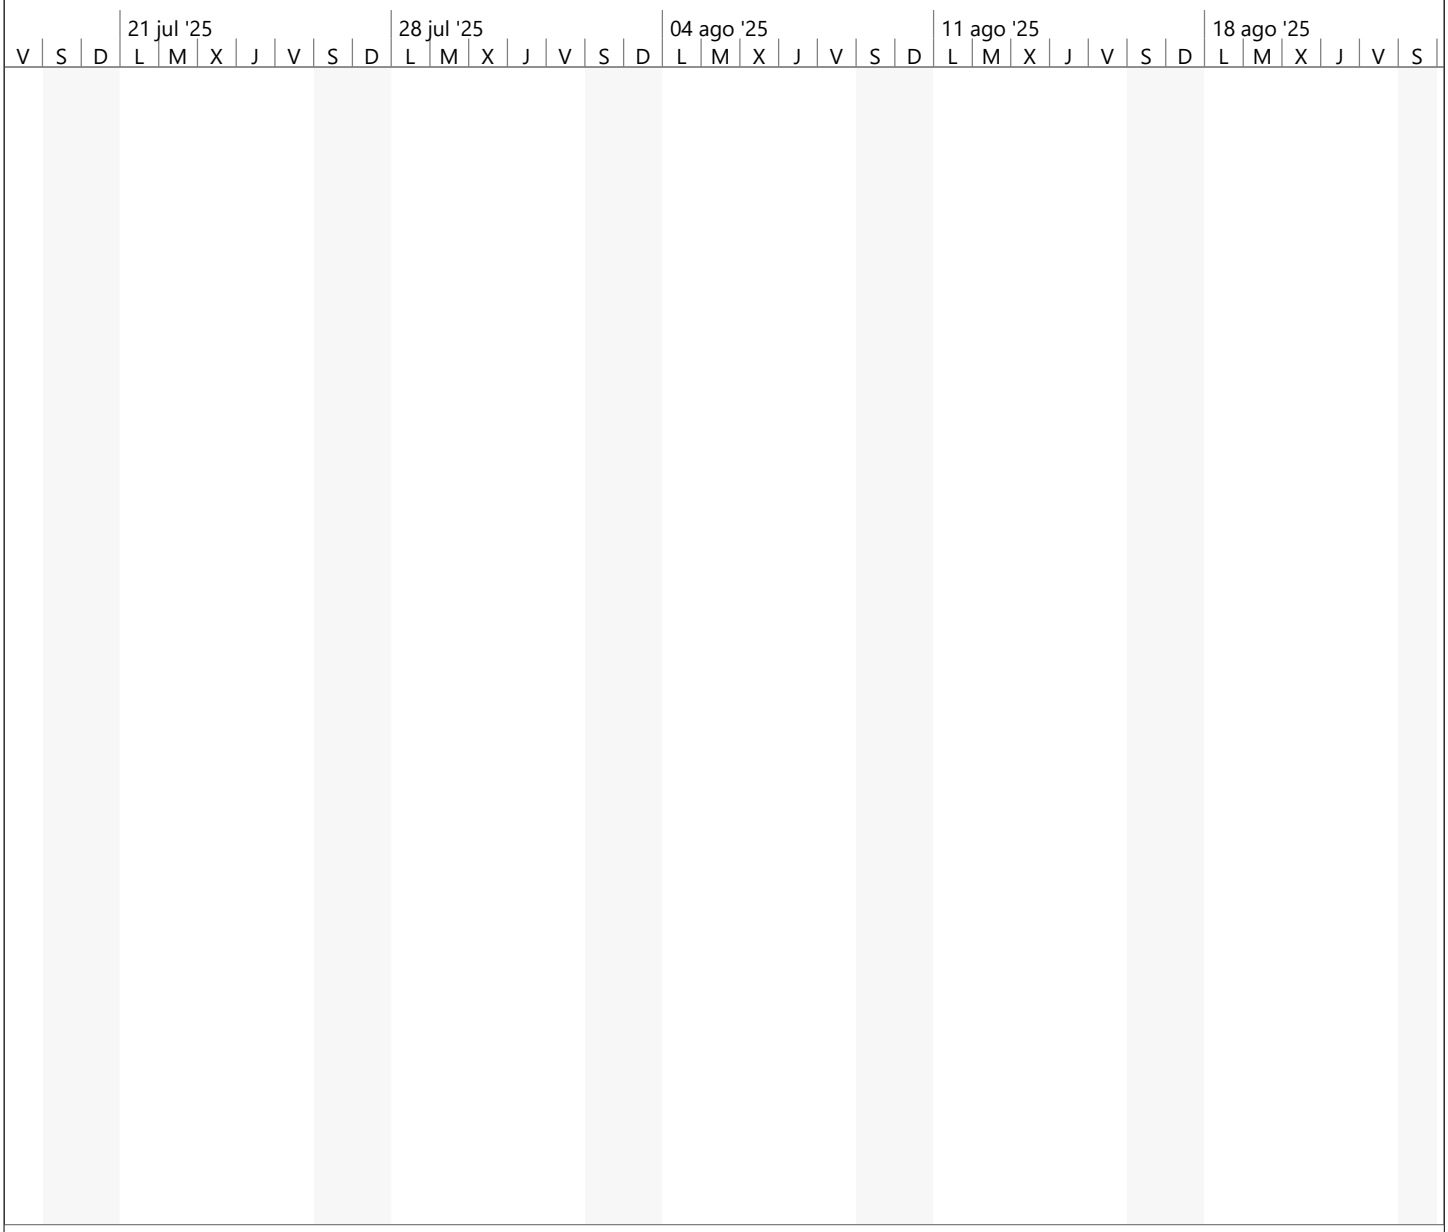


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

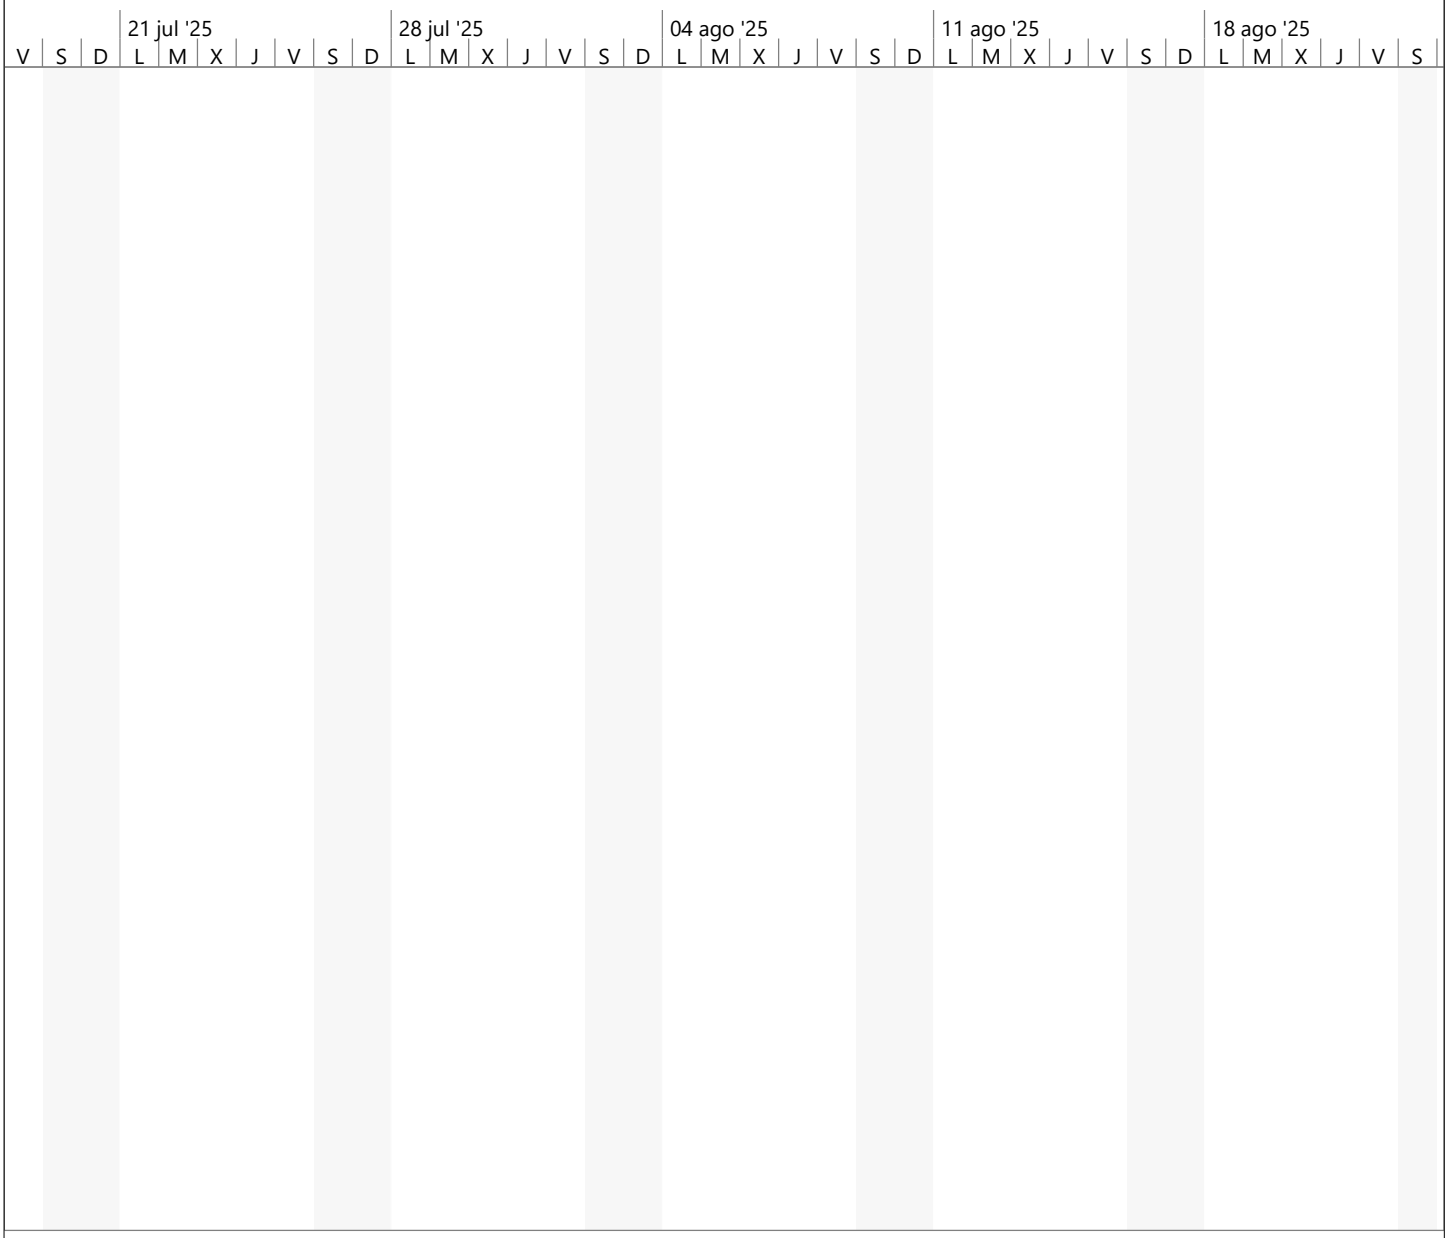


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

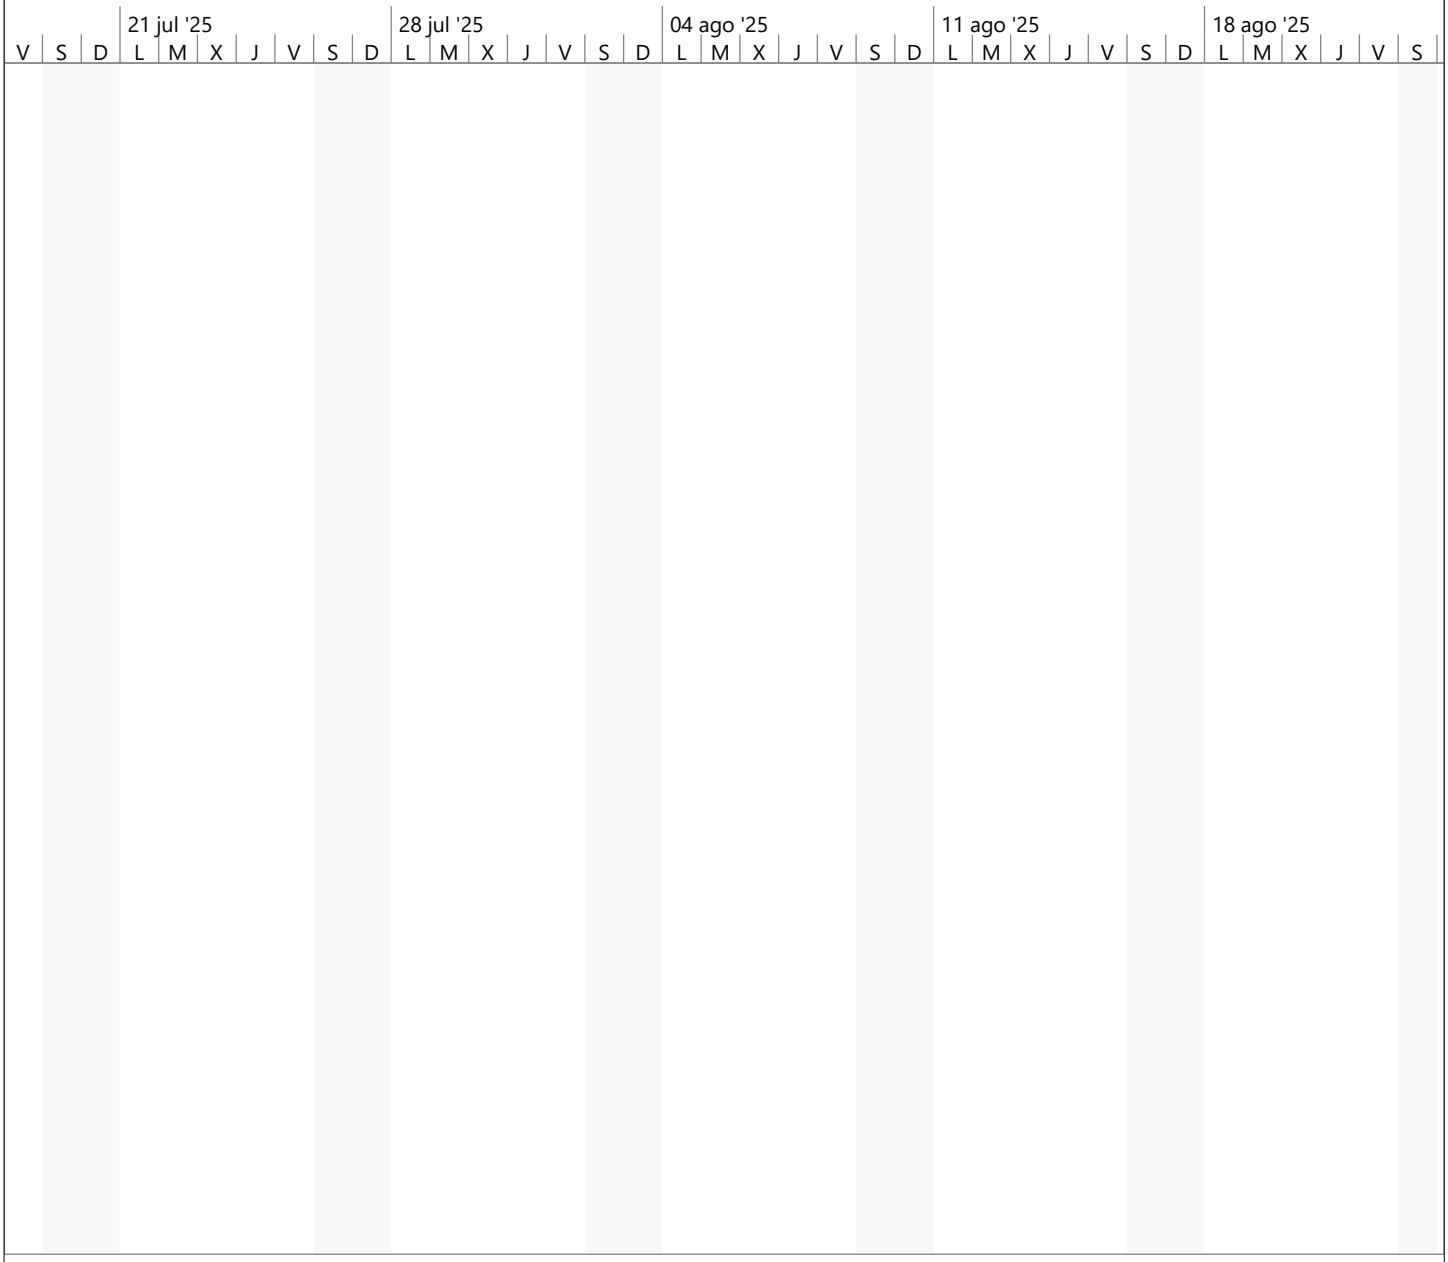


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

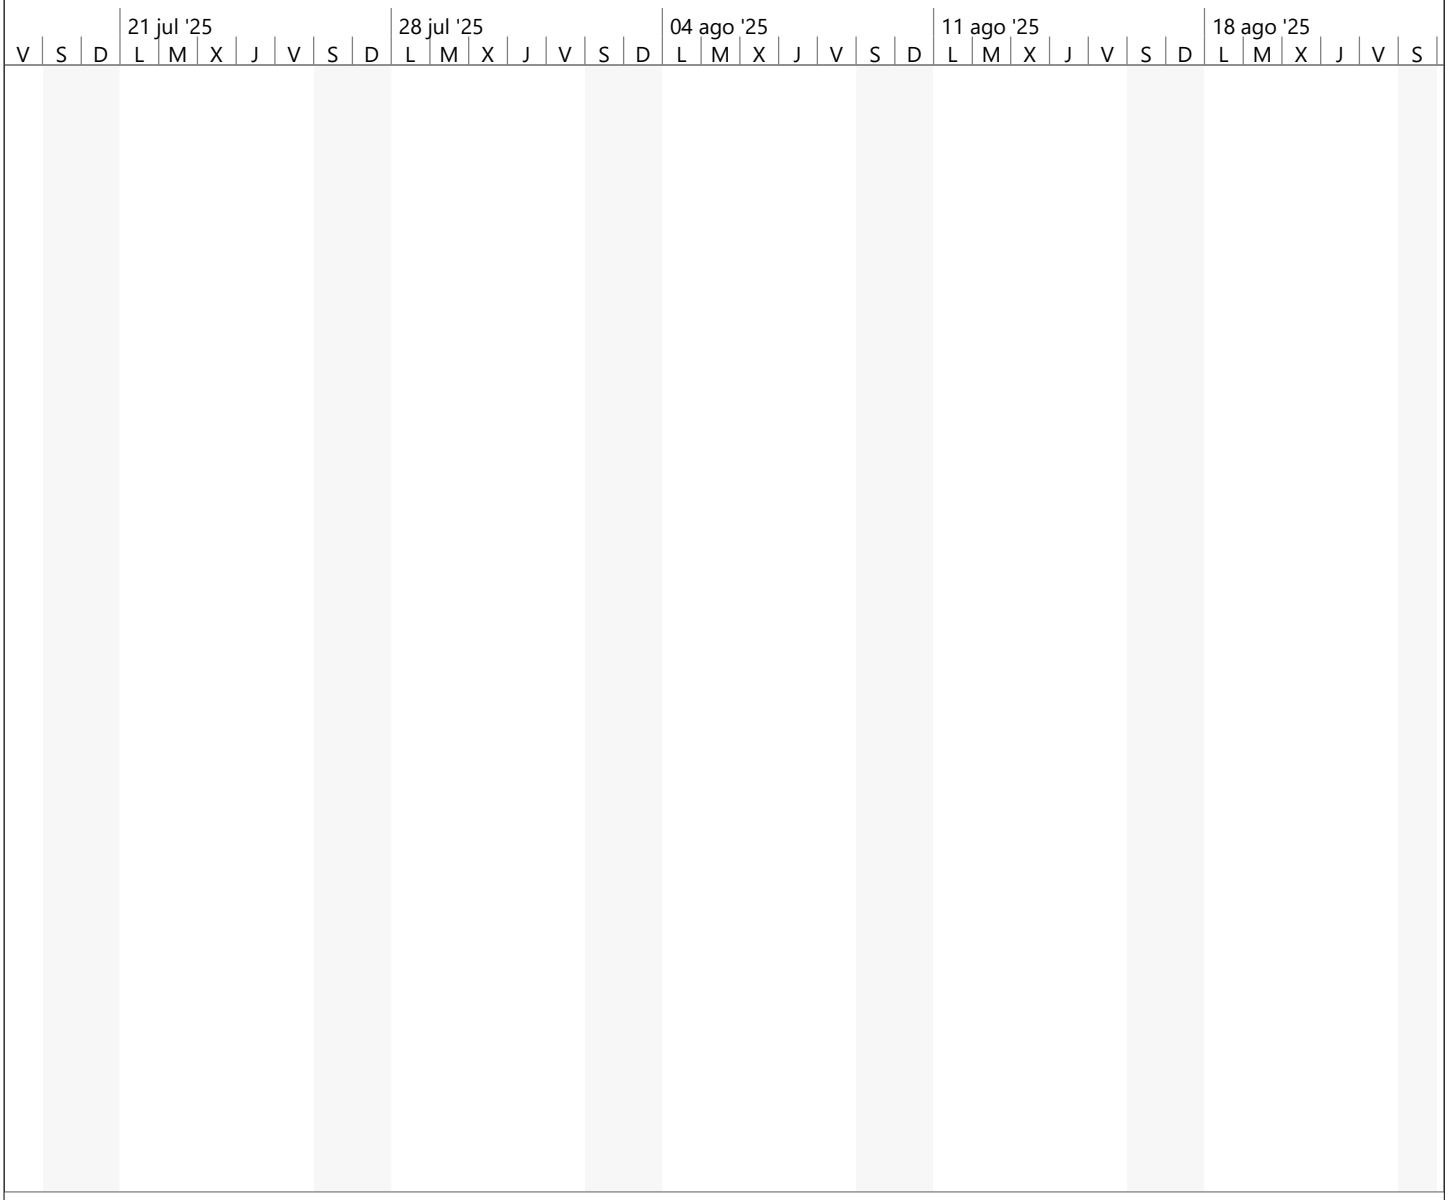


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

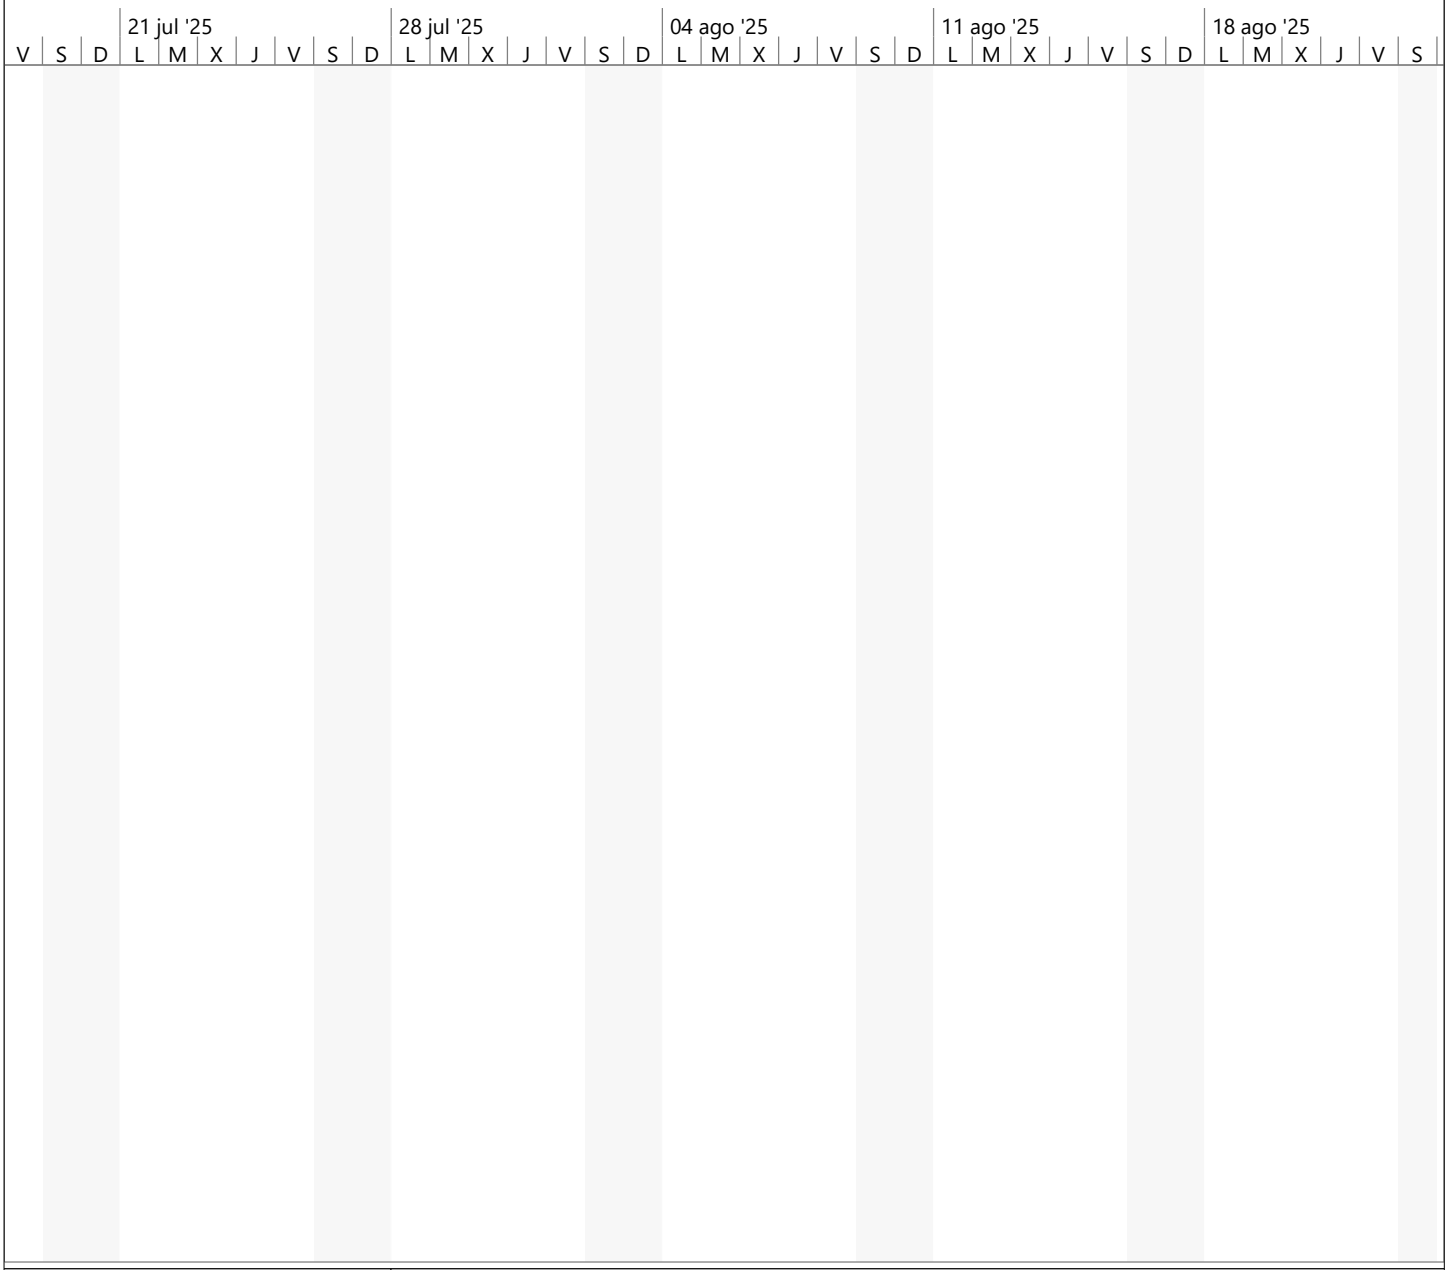


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

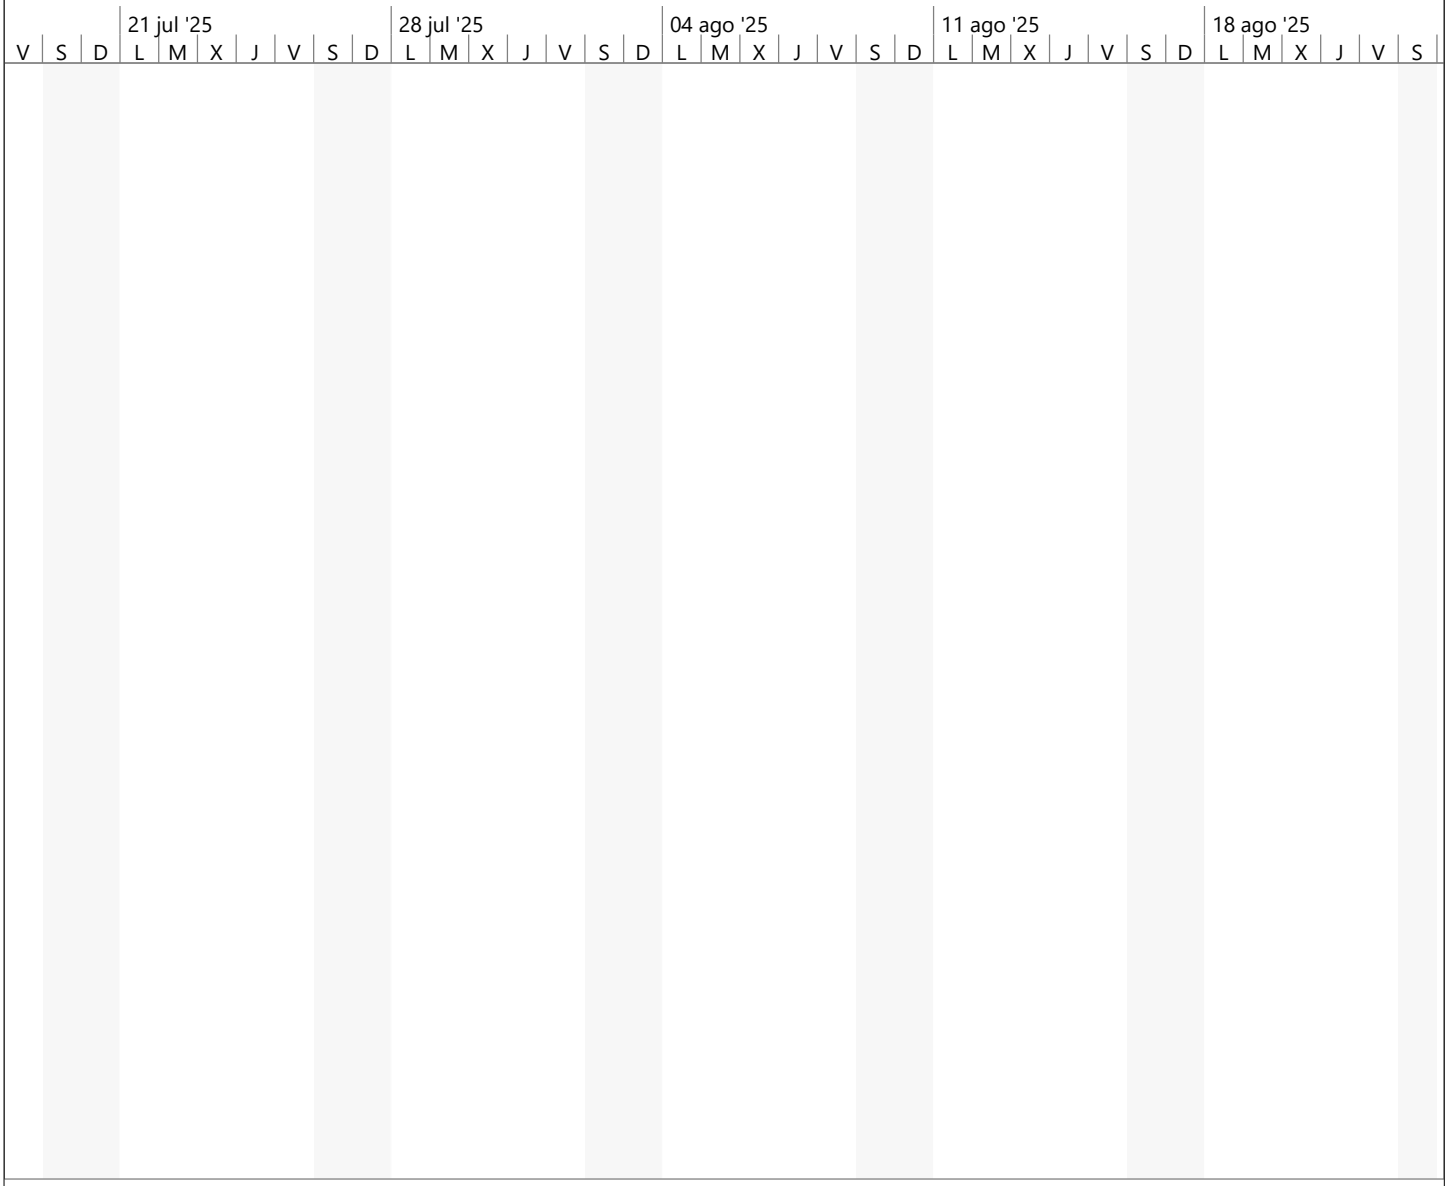


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

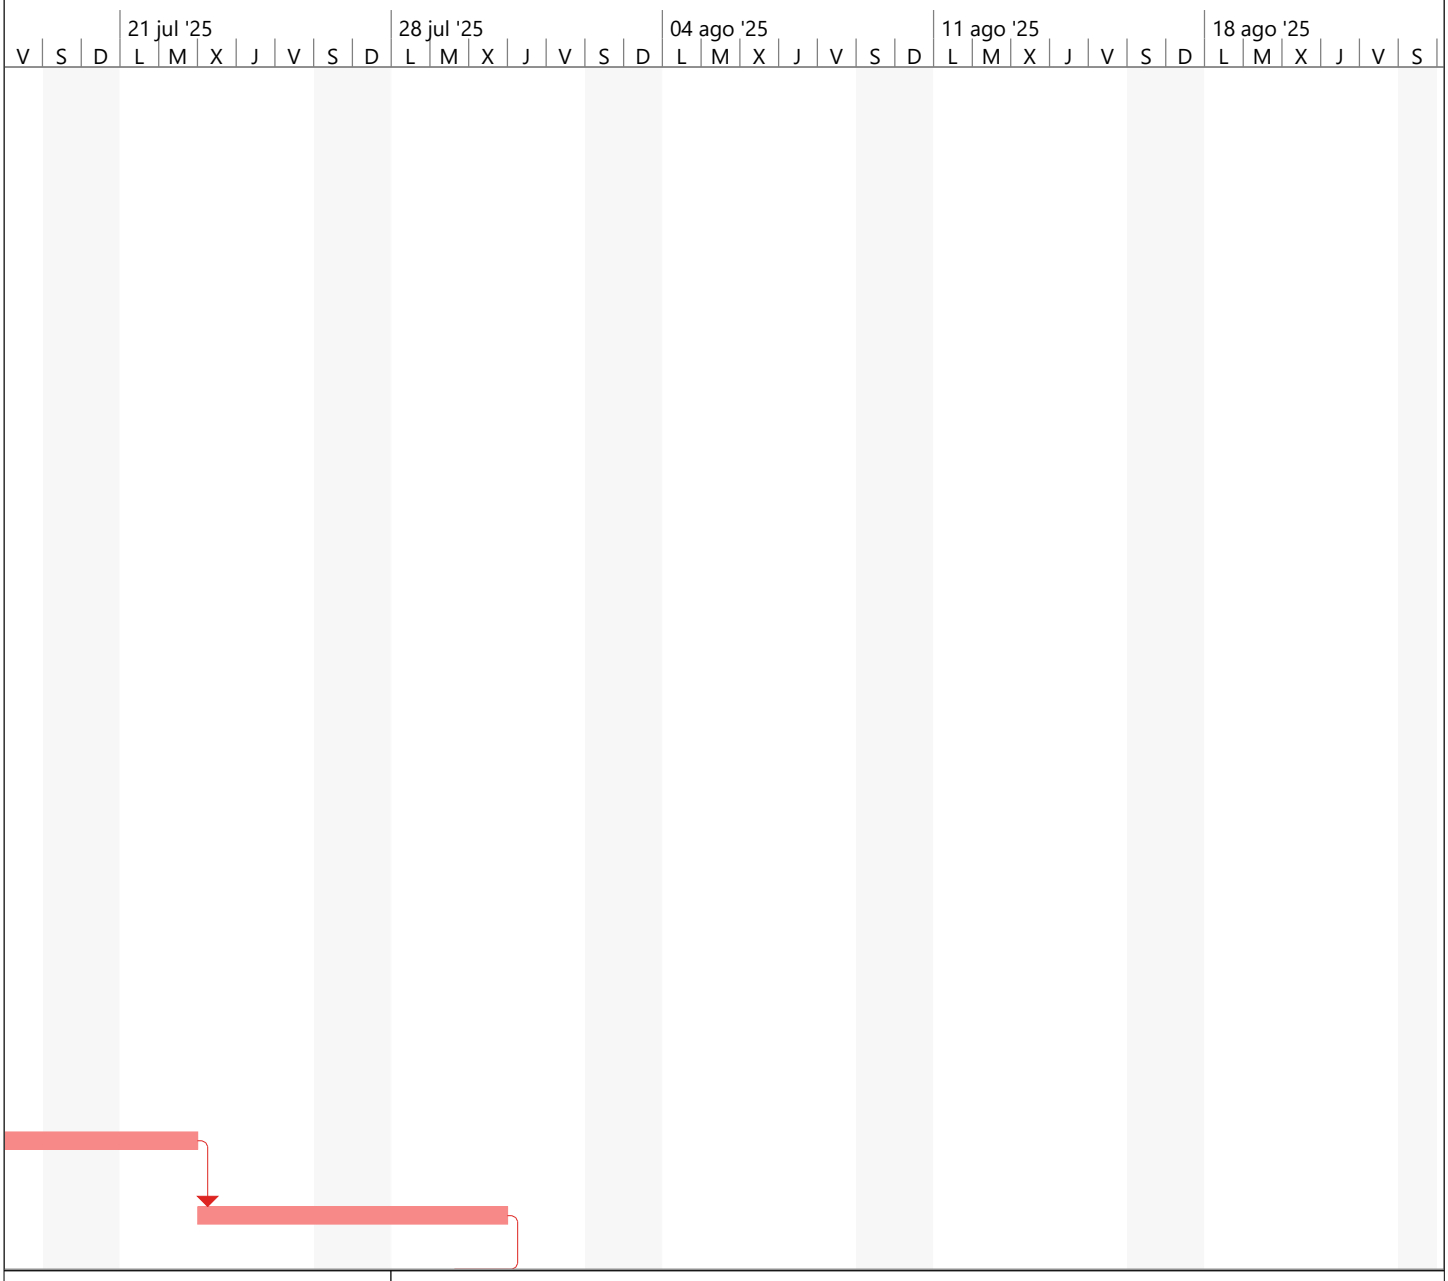


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

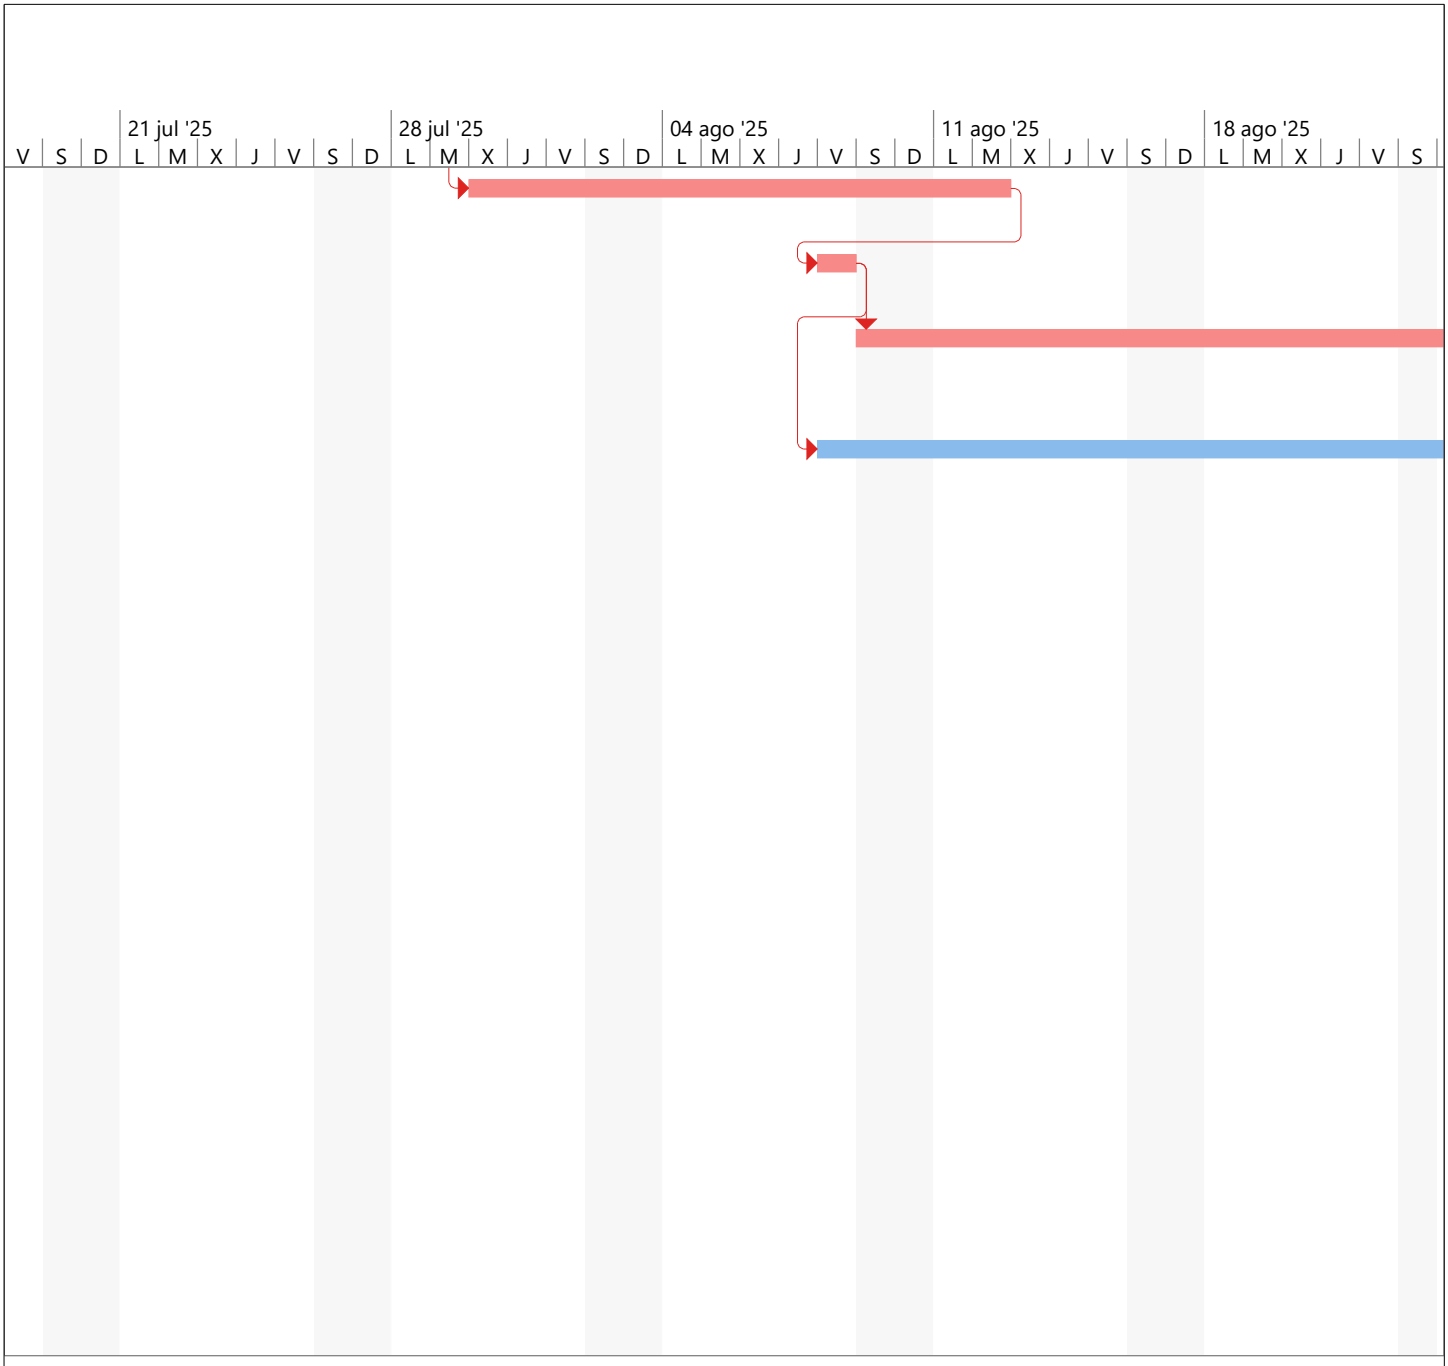


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			




Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

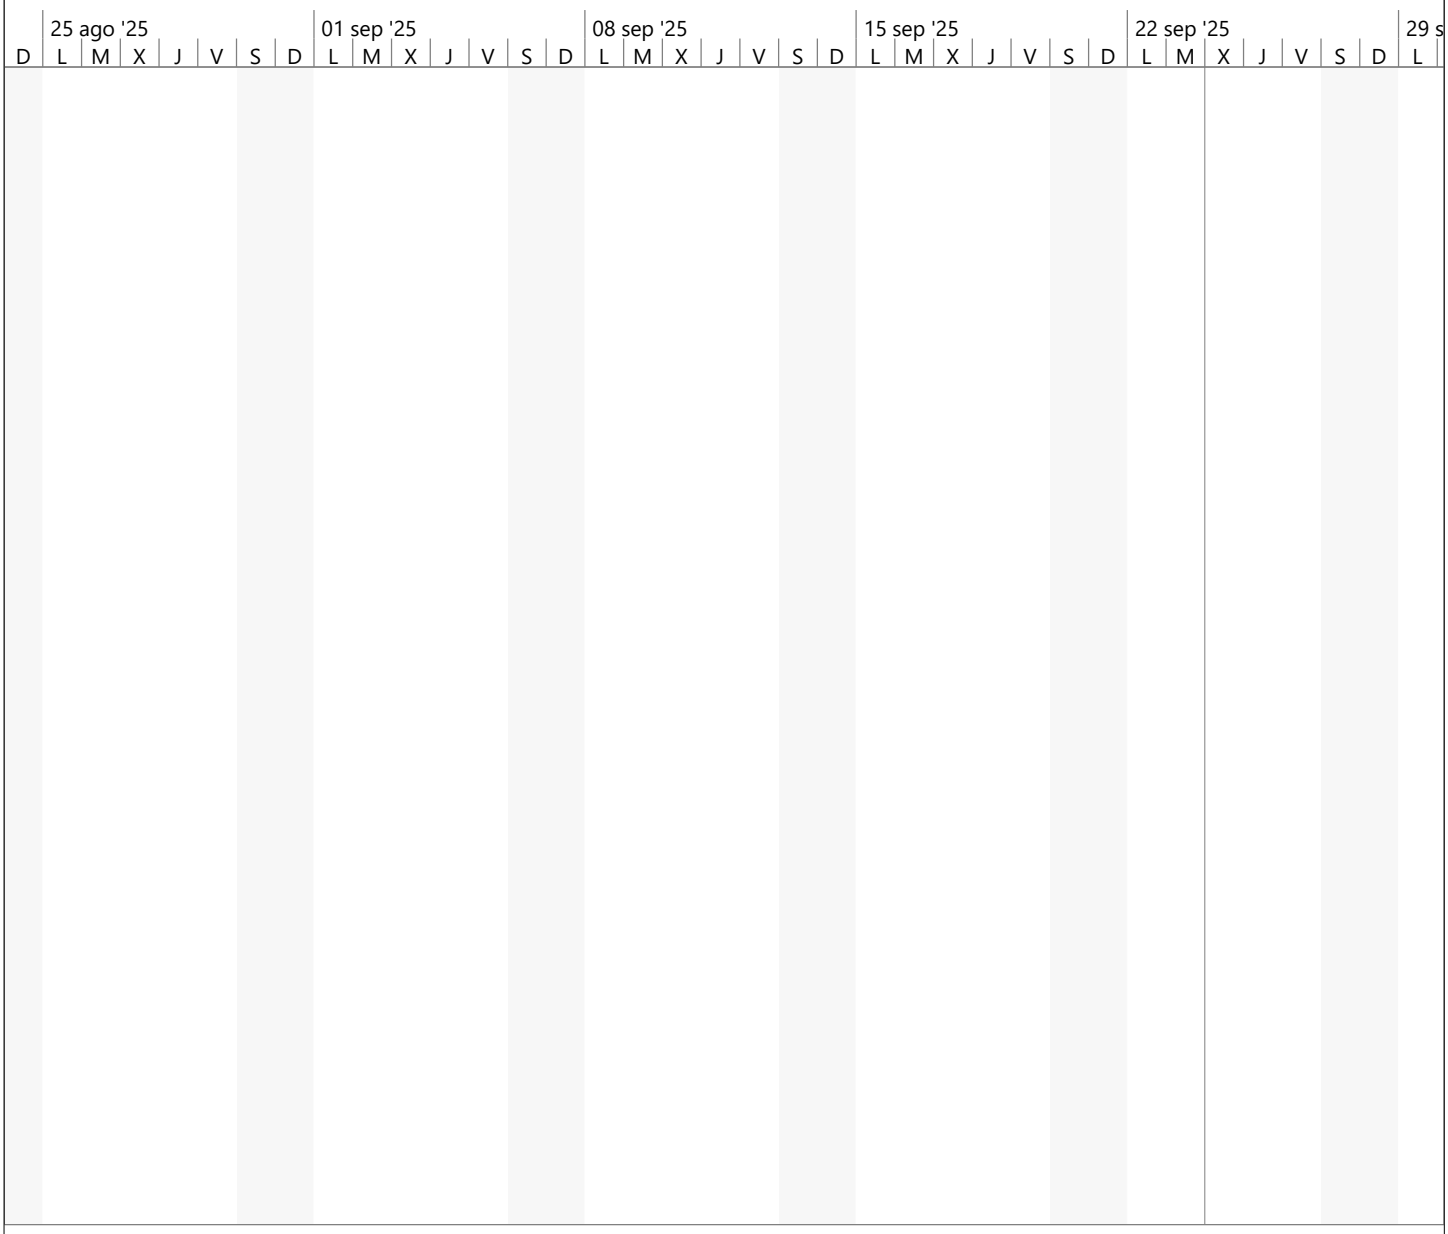


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

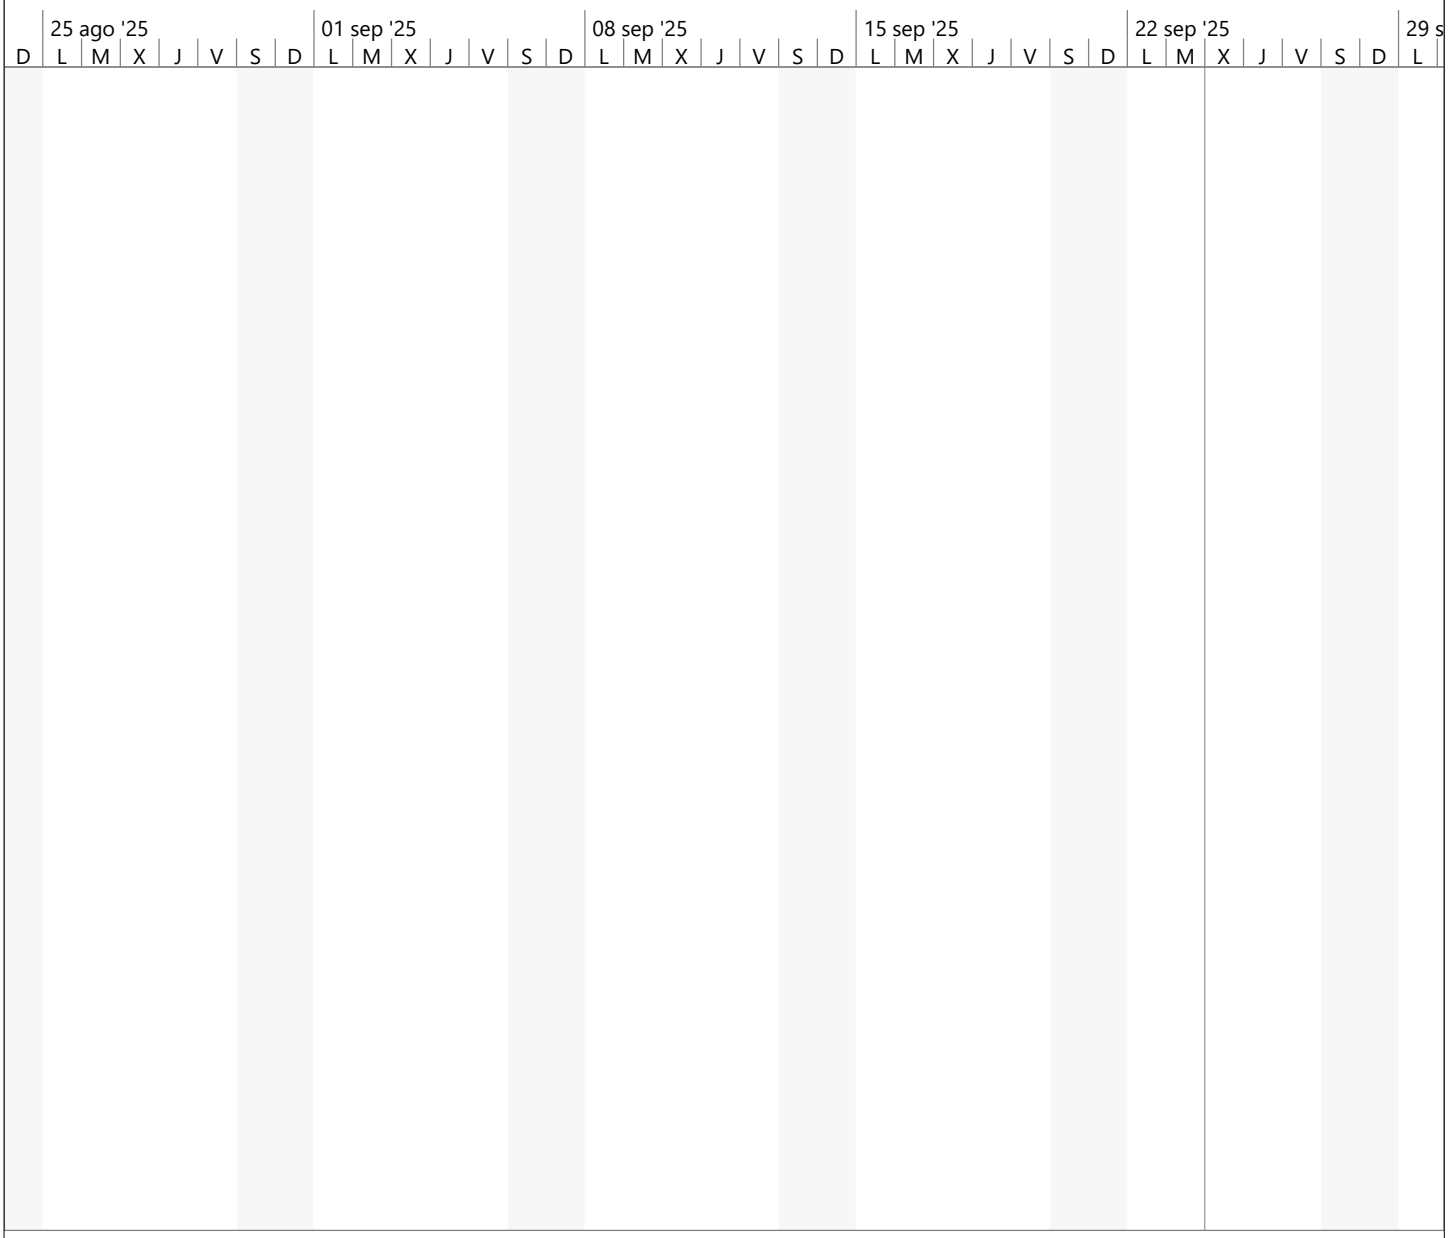


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

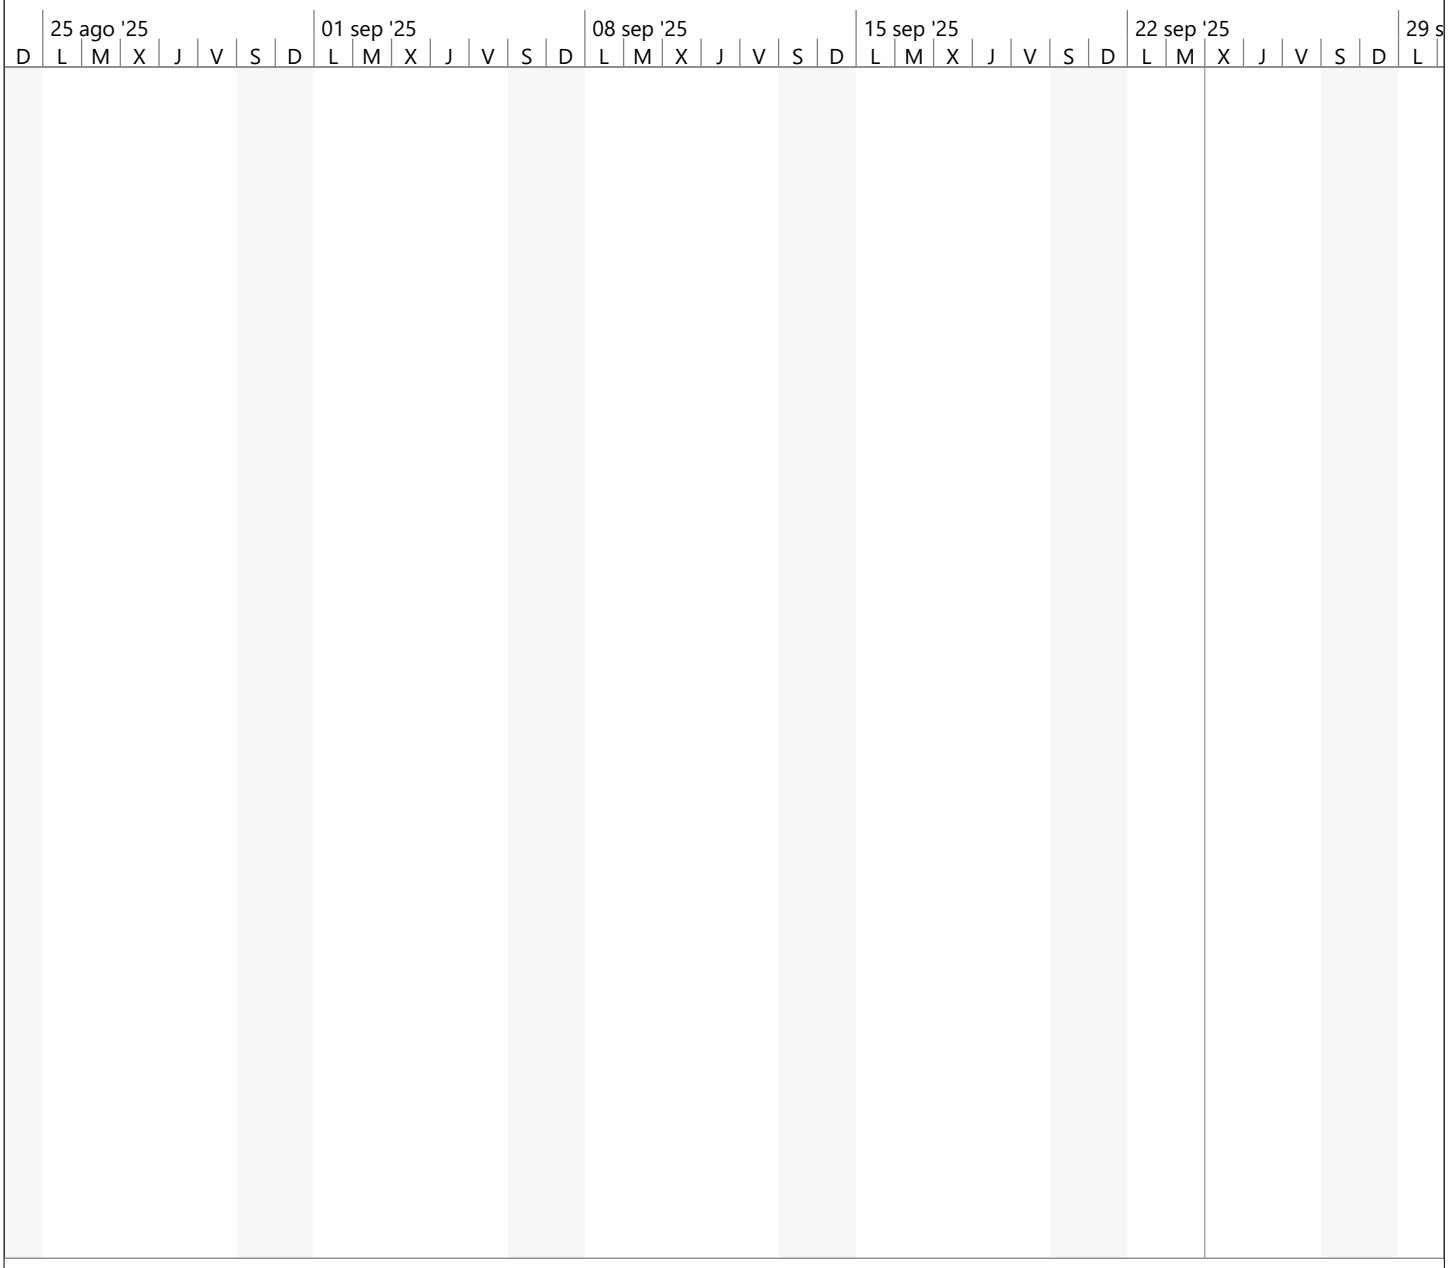


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

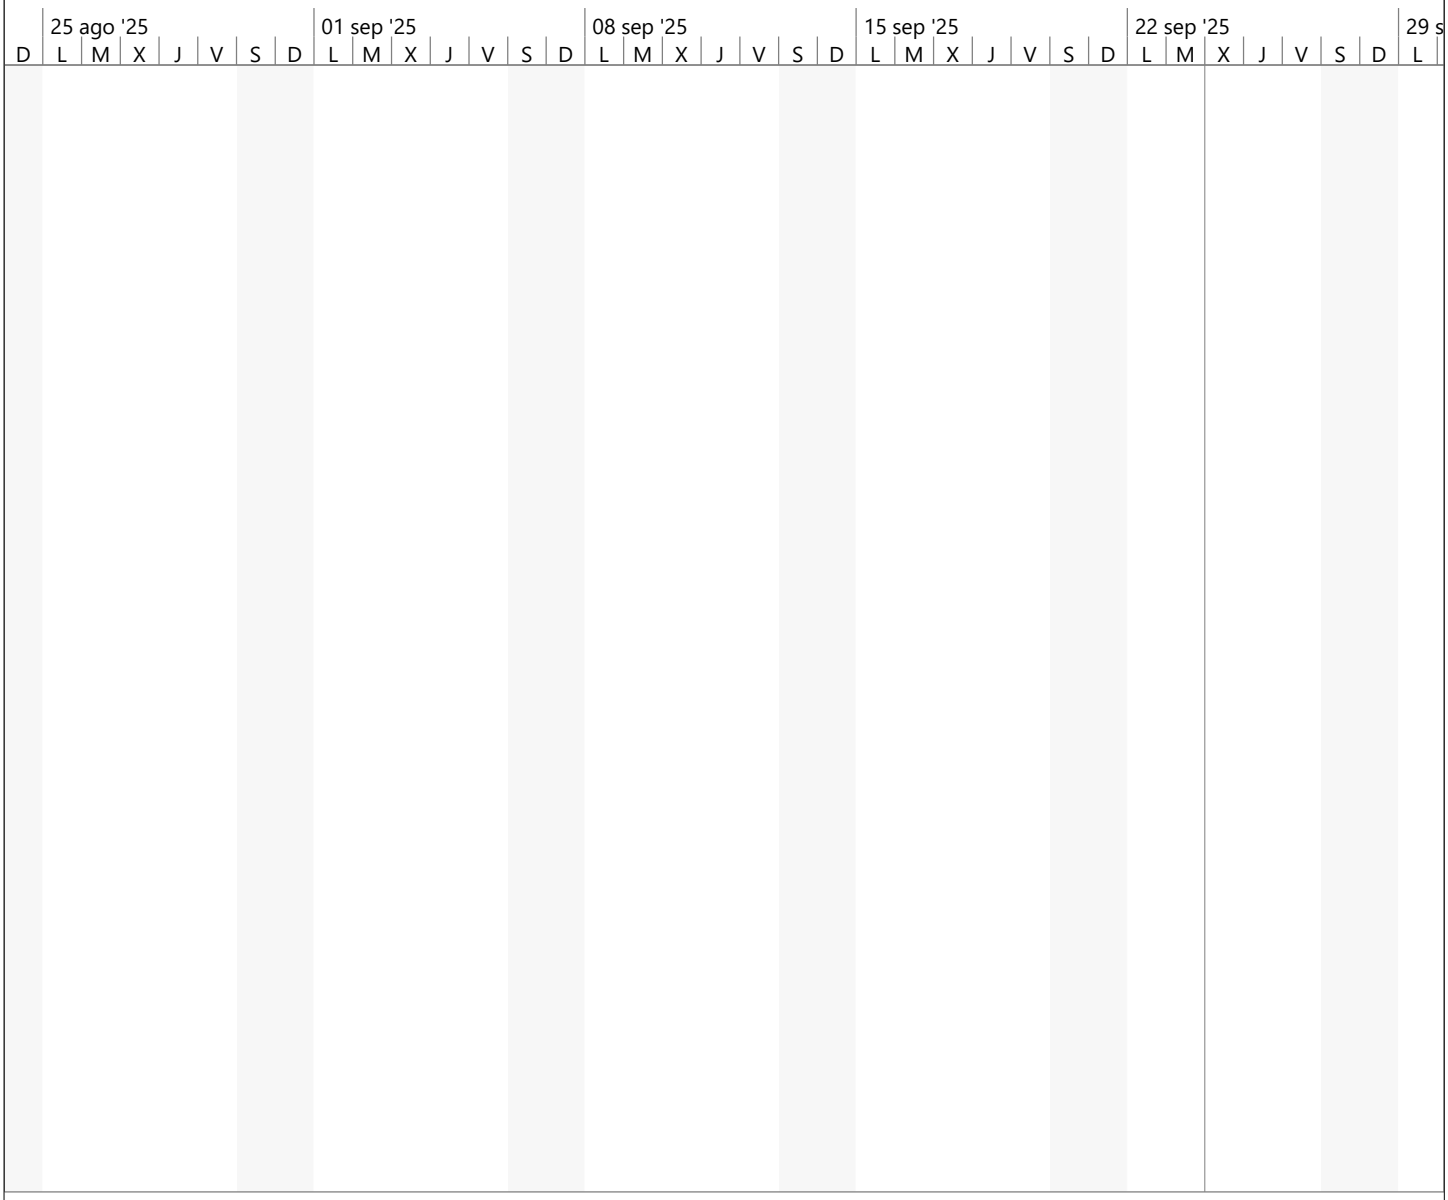


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

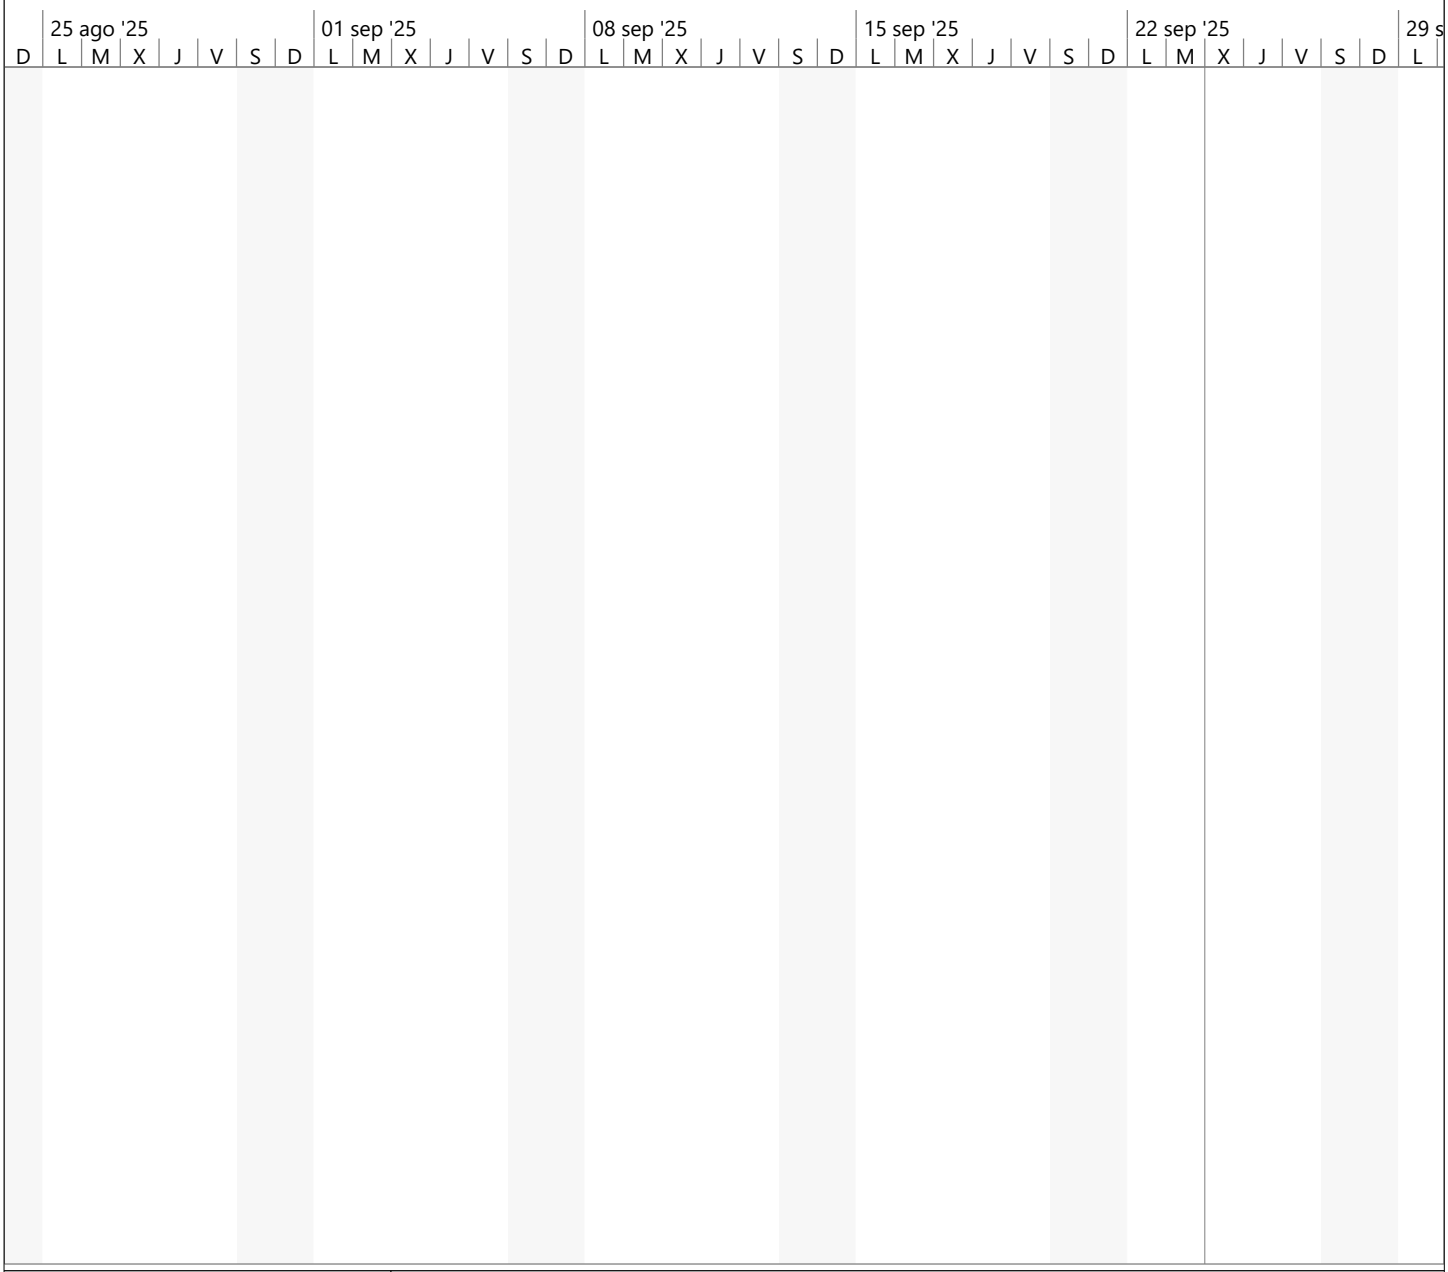

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

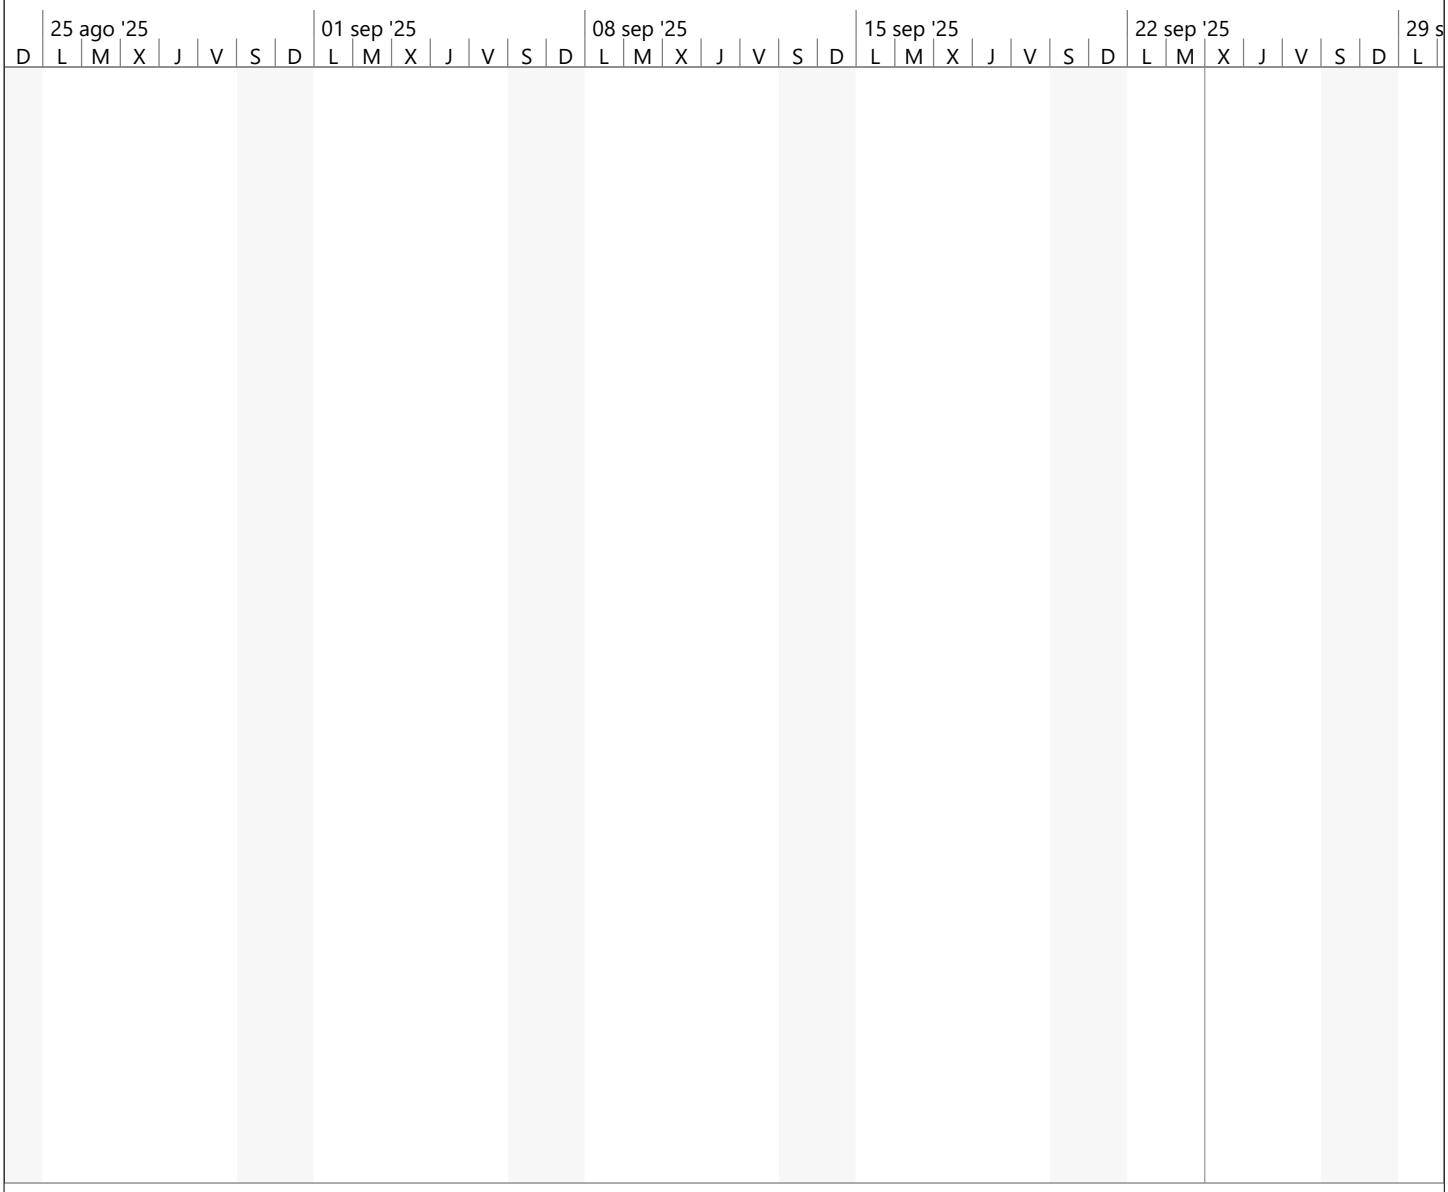


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			




Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

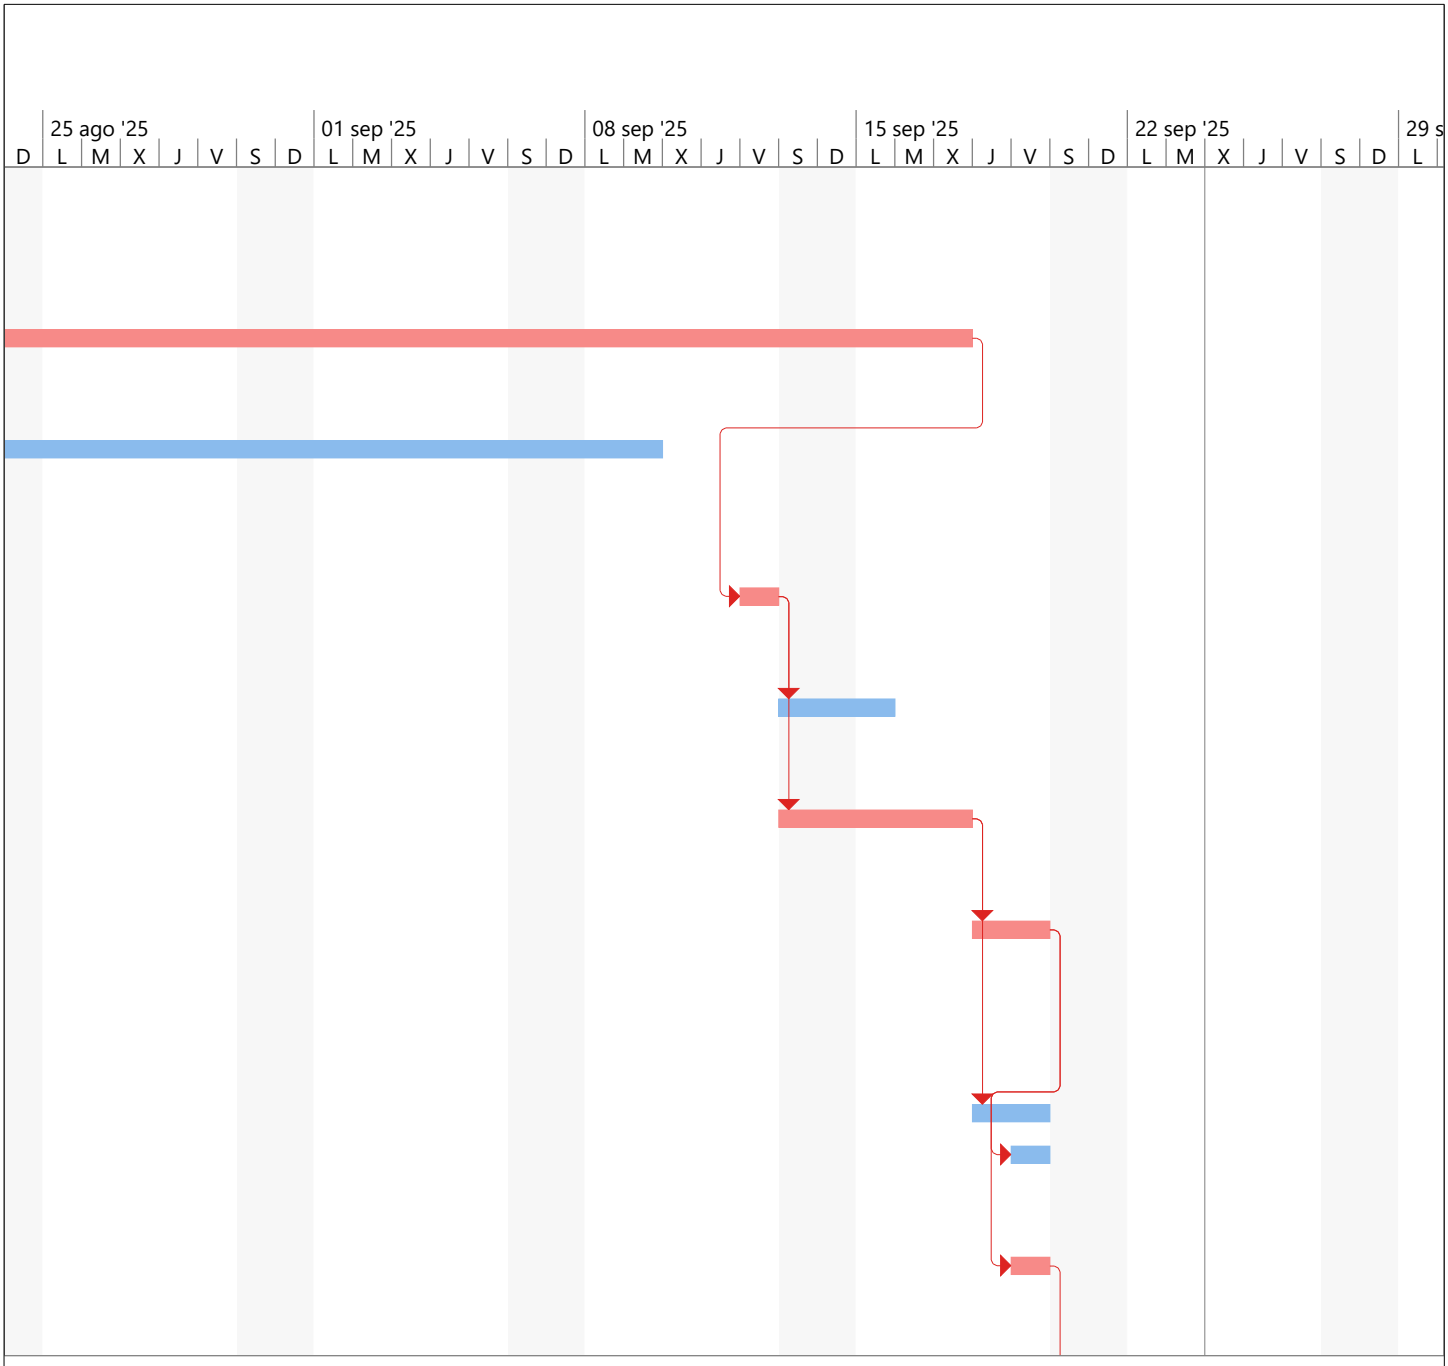

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

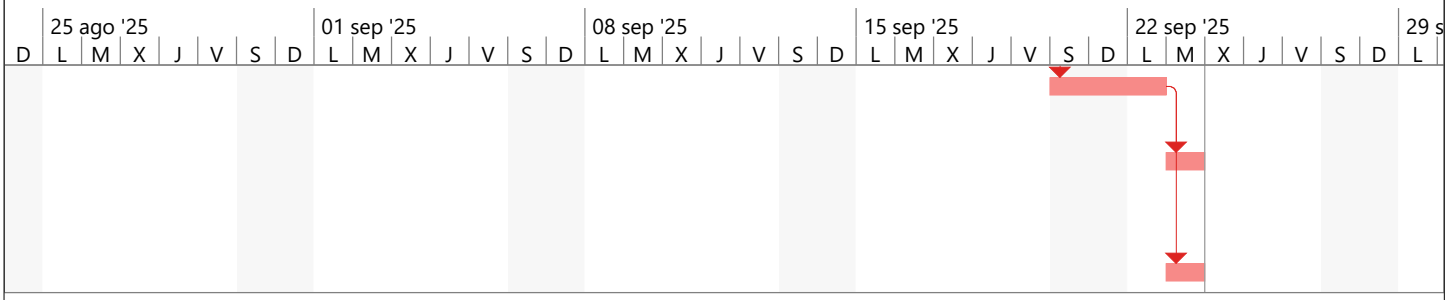

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			
