FAC-E-2024-026691-RE

SOFTWARE Y SISTEMAS ESPECIALIZADOS LTDA.
Transv. 53A No. 20-11 Sur
Tel.: (57-1) 802 7426 – (1) 321 3905735
www.syse.com.co – ventas@syse.com.co
Bogotá, D.C. - COLOMBIA

Bogotá, D.C., noviembre 12 de 2024

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIA
ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ"
Attn.: T.C. CARLOS MAURICIO CALDAS ARISTIZABAL
Subdirector
Ciudad

Ref.: SOLICITUD AMPLIACIÓN PLAZO ENTREGA CONTRATO 041-00-K-ESUFA-CETIA-2024

Respetados Señores:

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar de ustedes muy amablemente, se sirvan autorizar la prórroga de contrato No. **041-00-K-ESUFA-CETIA-2024** el cual tiene como fecha de vencimiento el día 13 de noviembre de 2023.

La razón de la presente solicitud es debido a que, aunque el motor objeto del contrato se encuentra en el país desde el día 30 de octubre de 2024 y con manifiesto aduanero el día 31 de octubre, no se ha podido realizar la respectiva nacionalización debido a que, en los documentos correspondientes a la DIAN para este proceso, el nombre que se utilizó como propietario de la mercancía es el de SySE Ltda., y ante la misma DIAN y Cámara de Comercio nuestra razón social oficial es SOFTWARE Y SISTEMAS ESPECIALIZADOS LTDA., SYSE LTDA., error que hasta el momento se desconoce por quién fue generado, si por parte del personal de la empresa de transporte o por la misma DIAN, pero que nos ha perjudicado en el sentido que, aunque generalmente estos procesos en la normalidad no debería tardar más de 2 días hábiles, solo hasta el día de hoy se nos fue confirmado con claridad al respecto.

En mi carácter de Representante Legal, me dirigí a la DIAN para conocer más del tema y se nos expresa que hay que realizar esta corrección realizando una solicitud a la DIAN para ello, pero que, aún como propietarios de la mercancía, no podemos realizar, sino que debe ser realizado por la empresa transportadora encargada de realizar el manifiesto de dicha mercancía en Colombia.

Como podrá entender, esto es un asunto que se sale de nuestras manos manejarlo pues muy diligentemente se realizo la compra y el despacho del elemento con gran anterioridad y que, aún con las demoras de transporte debido a la temporada de huracanes y fuertes lluvias en Estados Unidos lo que dilató la entrega unos días más, se contaba con el tiempo suficiente para realizar el proceso de cambio e instalación del elemento (motor), pero que por esta situación, repito,

FAC-E-2024-026691-RE

SOFTWARE Y SISTEMAS ESPECIALIZADOS LTDA.
Transv. 53A No. 20-11 Sur
Tel.: (57-1) 802 7426 – (1) 321 3905735
www.syse.com.co – ventas@syse.com.co
Bogotá, D.C. - COLOMBIA

completamente ajeno a nuestro manejo o responsabilidad, se nos hace difícil realizar la entrega en la fecha estipulada.

Es por lo anterior, que solicitamos de ustedes muy comedidamente, se autorice una prórroga hasta el día 5 de diciembre de 2024, estimando que, si el tema se resuelve muy anticipado a esta fecha, podríamos realizar la entrega con anterioridad.

Para comprobación y muestra de lo anterior, adjuntamos pruebas fotográficas de que el elemento (motor) ya se encuentra en el país y solo supeditado a la respectiva corrección de documentos y aval de proceder con la respectiva nacionalización.

Quedaos atentos a sus comentarios y a su muy amable colaboración.

Atentamente,


LUIS FERNANDO VARGAS DIAZ
Representante legal
Software y Sistemas Especializados Ltda., SySE Ltda.
NIT. 830.040.329-1


c.c. T1. EDWIN ALEXANDER CASALLAS

SOFTWARE Y SISTEMAS ESPECIALIZADOS LTDA.
Transv. 53A No. 20-11 Sur
Tel.: (57-1) 802 7426 – (1) 321 3905735
www.syse.com.co – ventas@syse.com.co
Bogotá, D.C. - COLOMBIA





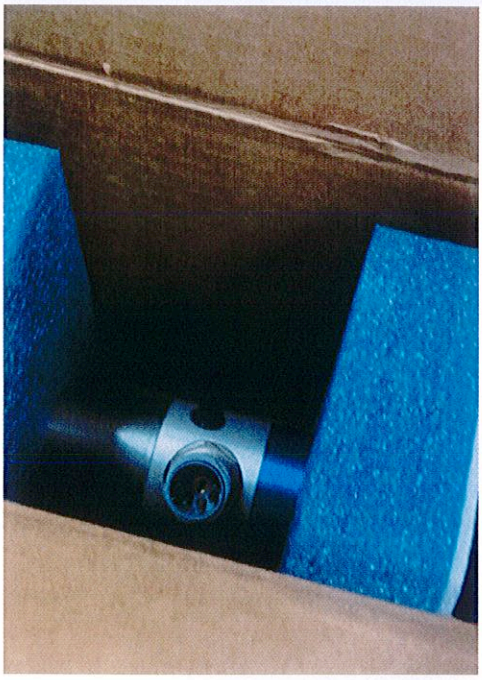

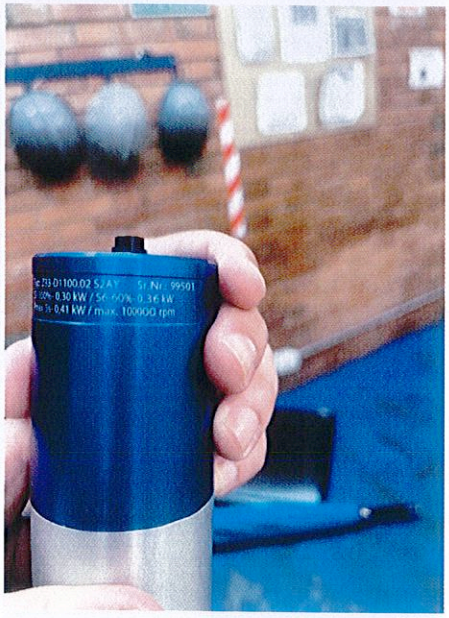

FAC-E-2024-026691-RE

GIT DE TRAFICO POSTAL Y ENVIOS URGENTES

DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTA AEROPUERTO EL DORADO

INVENTARIO N° 2716

HOJA DE INVENTARIO DE MERCANCIAS No. 1 DE 1 FECHA: 04-11-2024

INTERMEDIARO	COURRIER BOX SAS	GUIA DE MENSAJERÍA ESPECIALIZADA: 2131656	
ACTA DE HECHOS DE VERIFICACIÓN DE MERCANCIAS No.		BULTOS: 1	CAJAS: 1
PESO SEGÚN ACTA DE HECHOS: 1.81		TIPO DE ACTUACION:	CAMBIO DE MODALIDAD

ITEM	DESCRIPCION DE LA MERCANCIA	ESTADO	UNIDAD COMER	CANTIDAD
1	husillo de lata frecuencia z33 d1100.02 s2ay	BUENO	UND	1
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

Continua en hoja adicional SI NO X

OBSERVACIONES :

FUNCIONARIO INTERMEDIARIO DE TRAFICO POSTAL
FIRMA
NOMBRE
C.C.

FUNCIONARIO DIAN GIT DE TRÁFICO POSTAL Y ENVÍOS URGENTES
FIRMA
CC

FUNCIONARIO POLFA
FIRMA
NOMBRE
PLACA

FUNCIONARIO DIAN GIT DE TRÁFICO POSTAL Y ENVÍOS URGENTES
FIRMA
NOMBRE
C.C. No.

Nota: En todos los casos el nombre y numero de documento de los intervinientes en la presente diligencia debe ser claro y legible

FAC-E-2024-026691-RE

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

CONSULTA DE INVENTARIO POR DOCUMENTO DE TRANSPORTE

No. Manifiesto: **116575014932158**

No. Documento Transporte: **2131656**

1. TRANSPORTADOR/REPRESENTANTE
KLM CIA. REAL HOLANDESA DE AVIACION.

2. DEPOSITO
CONSIMEX S.A. BOGOTA

3. CONSIGNATARIO
SYSE LTDA

4. FECHA HORA MANIFIESTO	5. FECHA VENCIM TERMINOS	6. INCLUYE PRORROGA
2024/10/31 - 18:35	2024/12/2	NO

7. UBICACION	8. PESO DISPONIBLE (Kgr.)	9. CANTIDAD DISPONIBLE (PK)
DEPOSITO	1.20	1.00

Atrás

FAC-E-2024-026691-RE

CourierBox

Express Document & Package Delivery

Airbill
0046615[illegible]

2131656

Origin	Destination
MIAMI	BOGOTA

1. From (Sender/Remitente)		2. To (Recipient/Destinatario)
Account No.	Airbill 0046615[illegible]	Company name: SYSE LTDA
Shipper's name: NSK AMERICA COR NSK AMERICA COR		Delivery address - C/M cannot deliver to P.O. BOX: CLL S[illegible] 1 UIT 804
Address: 783 NW 21 ST Doral FL, 33122-		City: BOGOTA / Phone / Fax
Signature	Phone	Attention: 110010 C.P.

Services: World Parcel Express

Limited Liability $100. If these do not carry insurance this item, Declared Value give currency. Sender's VAT/GST or EIN/SSN. Harmonized comm. code if applies, Receiver's VAT/GST or EIN/SSN. Full description of contents

International non documents shipments only. Attach original and three copies of a comercial inv.

Declared Value/Valor declarado currency	Sender's VAT/GST or EIN/SSN
FOB	

Pieces: 1	Peso Kgs.: 1.82	Peso Lbs.: 4.00

Posición Arancelaria: 9807200000

COMPONENT / PARTE DE MODALIDAD VOLUNTARIA

1 From (Sender/Remitente)

We agree that standard apply to this shipment and limit liability.

Date: 19 OCT 2024

116575014932158

TOTAL FLETES US$ 22.00

Endosamos este documento con todas sus obligaciones.

Este valor certificado puede variar el momento de la facturación definitiva del flete.

FECHA:

FIRMA:

FAC-S-2024-220193-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-220193-CI del 12 de noviembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODEH-JEAES-DICTI-CETIA

Señor Teniente Coronel
CARLOS MAURICIO CALDAS ARISTIZABAL
Subdirector Escuela De Formación y Jefe De Estado Mayor
Madrid - Cundinamarca

Asunto: Solicitud modificación plazo de ejecución contrato No. 041-00-K-ESUFA-CETIA-2024

En atención a las políticas de gestión contractual y financiera establecidas por el Comando de la Fuerza Aérea Colombiana para la ejecución presupuestal de la presente vigencia, y la solicitud efectuada por la compañía SOFTWARE Y SISTEMAS ESPECIALIZADOS LTDA, mediante comunicación registrada en el sistema documental de la FAC, con Radicado No. FAC-E-2024-026691-RE de fecha 12 de noviembre de 2024, respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel Subdirector y Ordenador del Gasto de la Escuela de Suboficiales FAC, tenga a bien autorizar por su gentil conducto, la modificación del plazo ejecución del Contrato No. 041-00-K-ESUFA-CETIA-2024, que tiene por objeto "*Adquisición e instalación del motor DentaDrive S21 para el equipo de impresión electrónico T-TECH (Quickcircuit QCJ5) – CETIA*", del 13 de noviembre de 2024 al 05 de diciembre de 2024.

Esta solicitud es elevada, considerando lo manifestado por el contratista en cuanto a la existencia de inconvenientes de índole meteorológico que dificultaron la celeridad del despacho y entrega de la pieza requerida (Motor DentaDrive S21) desde los Estados Unidos de América a Colombia y posteriormente, novedades de carácter tributario y aduanero presentados en el trámite de nacionalización de mencionado elemento, factores éstos de fuerza mayor, que impiden la adecuada ejecución contractual dentro de los tiempos inicialmente establecidos.

Adicionalmente me permito indicar a mi Coronel, que una vez valorados los soportes documentales acreditados, especialmente lo indicado por la compañía SOFTWARE Y SISTEMAS ESPECIALIZADOS LTDA, referente a que el motor DentaDrive S21 ya se encuentra en el país y, en aras de garantizar la calidad en la entrega y cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico del contrato, ésta Supervisión Contractual recomienda la formalización de una prórroga a la fecha de ejecución al 5 de diciembre de 2024, permitiendo con ello la pronta resolución de las novedades logísticas reportadas.

Por último, se me permito informar a mi Coronel, que no se requiere modificación en la forma de pago (PAC Diciembre y/o cuentas por pagar) proyectado, manteniéndose como se relaciona a continuación:

Vigencia	PAC	Valor
2024	Diciembre y/o cuentas por pagar	$23.681.000

Cordialmente,



Técnico Primero EDWIN ALEXANDER CASALLAS MORENO
Técnico Especialista Prueba E Implementación De Productos

Supervisor Principal Contrato No. 041-00-K-ESUFA-CETIA-2024

Elaboró: ST. GUERRERO / CETIA Revisó: MY. ZAMORA / CETIA Aprobó:T1. CASALLAS / CETIA



Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

Comentarios FAC-S-2024-220193-CI

#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar				

TC CARLOS MAURICIO CALDAS ARISTIZABAL
SUBDIRECCION ESUFA
autorizado y gestionar

12/11/2024 3:18:57 p. m.
