Reporte Semanal de Actividades

Contrato 490 de 2024

Octubre 2024

Geólogo
CARLOS ALBERTO REY GONZÁLEZ
Supervisor Designado
Contrato 490 de 2024
Bogotá D.C., Colombia

REF: Contrato 490 de 2024 – Reporte Mensual Octubre 2024

Respetado Geólogo Carlos Rey:

A continuación está referenciando el Reporte Actividades Mensual para el mes de octubre de 2024 para el Contrato 490 de 2024, *"Adquirir, procesar, interpretar e integrar datos aerogeofísicos de magnetometría y gamma espectrometría en el norte de la Guajira".*

Reporte Mensual	Octubre 2024	
Contrato	490 de 2024	
Fecha	2024-10-29	
Documentación	Reporte Mensual Actividades Octubre 2024	
Resumen Actividades Operativas	**Semana 1 de octubre a 7 de octubre** La aeronave ingresa a Riohacha. Se realizan tests de FOM, estaciones magnéticas terrestres (paralelaje) y test Cósmico, siendo aceptados los datos. Inconvenientes con el sistema de lectura del radar altímetro, por lo que no son fructíferos los demás tests. **Semana 8 de octubre a 14 de octubre** Se regresó la aeronave HK-5124 a Bogotá para su mantenimiento de rutina de 50 horas. En esta fase se hizo el test de Radar Altímetro, el cual quedó aprobado. El domingo	


13 de octubre se realizó la movilización de regreso a Ríohacha. El lunes 14 de octubre se realizaron los test DCR, Lag y Heading, los cuales están bajo revisión.

Semana 15 de octubre a 21 de octubre

Se iniciaron operaciones de adquisición para el Bloque Guajira el día 17 de octubre de 2024.

Semana 22 de octubre a 28 de octubre

Se continuó con adquisición de datos hasta el día 25 de octubre (incluido) en donde se llevó la aeronave a Guaymaral para realizar mantenimiento preventivo.

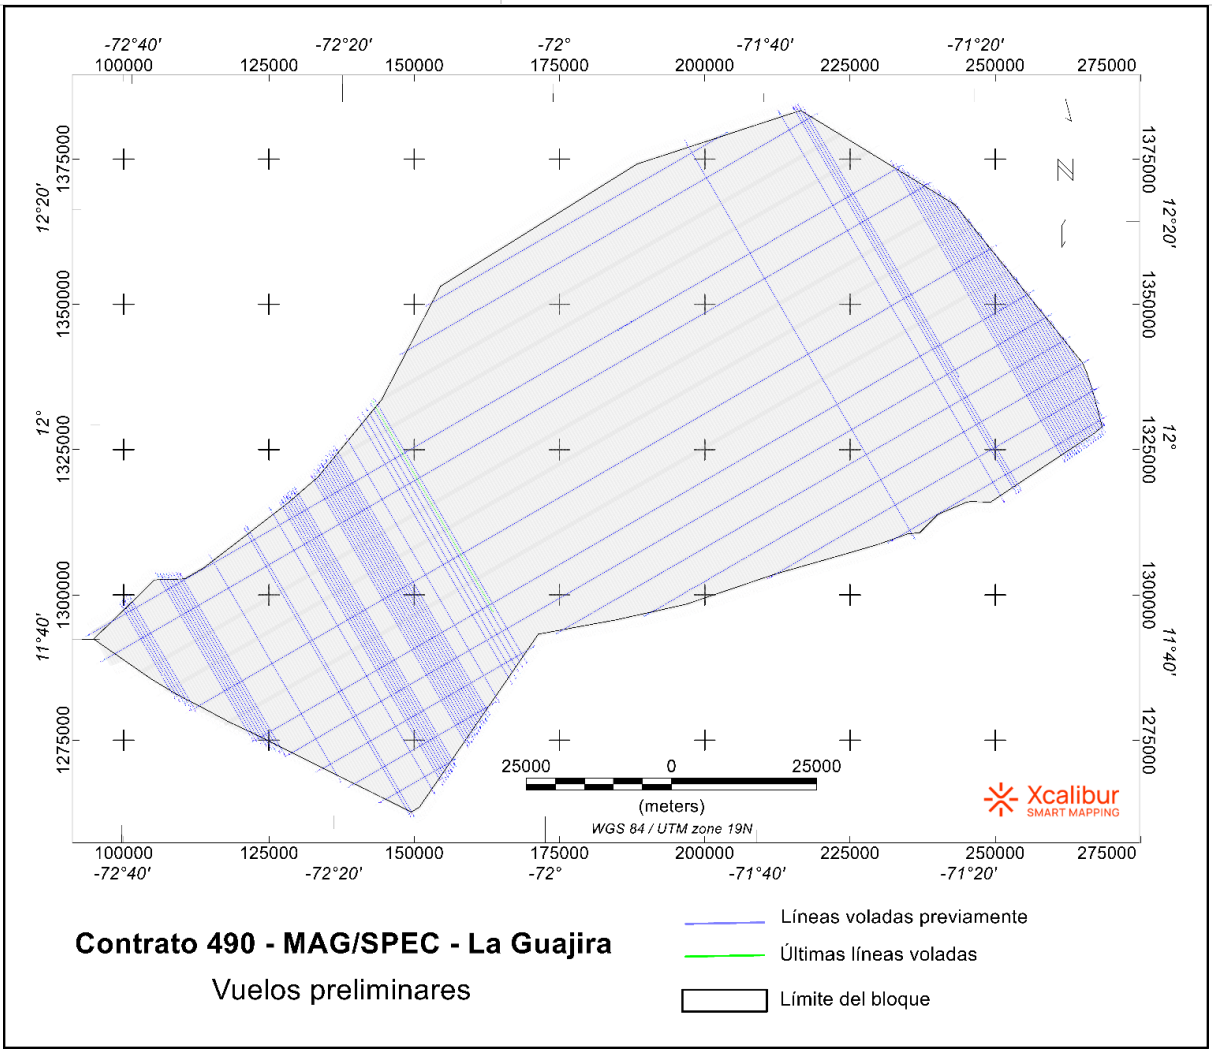

Contrato 490 de 2024. Mapa de avance al 28 de octubre de 2024.

PRODUCCIÓN (en kilómetros lineales)					
Bloque	PLANEADO	VOLADO	ACEPTADO	RESTANTE	% COMPLADO
La Guajira_Traverse	19,534.1	3,680.9	3,290.4	16,243.7	16.8%
La Guajira_Tie	1,966.4	1,625.6	1,291.2	675.2	65.7%
TOTAL	21,500.5	5,306.4	4,581.6	16,918.9	21.3%
STANDBY	0.0	DAYS			

Resumen Actividades Sociales	**Semana 1 de octubre a 7 de octubre** Se realizó la socialización con todos los agentes sociales identificados. Sin embargo, la Fuerza Naval del Caribe no ha dado espacio para la reunión a pesar de haber recibido el oficio desde septiembre 5 de 2024. El profesional social Iván Fitatá regresará a Cartagena a establecer contacto. **Semana 8 de octubre a 14 de octubre** Finalmente se realizó la reunión con la Fuerza Naval del Caribe, con lo cual se finalizó el proceso de socialización a los actores del Contrato 490 de 2024. Las Actividades de Socialización pasan a la Fase de Seguimiento, relacionamiento y comunicación. **Semana 15 de octubre a 21 de octubre** Se continúa con el seguimiento a los actores Ejército Nacional, Fuerza Naval del Caribe y Policía Departamental de La Guajira, informándoles el seguimiento de la aeronave. **Semana 22 de octubre a 28 de octubre** Se continúa con el seguimiento a los actores Ejército Nacional, Fuerza Naval del Caribe y Policía Departamental de La Guajira, informándoles el seguimiento de la aeronave.
Resumen Actividades Administrativas	**Semana 1 de octubre a 7 de octubre** Se finaliza proceso de contratación con proveedores logísticos. **Semana 8 de octubre a 14 de octubre** Se alquiló una habitación en el hotel de Riohacha para tener la oficina en este sector. **Semana 15 de octubre a 21 de octubre** Visita del supervisor del contrato, geólogo Carlos Alberto Rey González, el 16 de octubre a personal en Ríohacha, Guajira. **Semana 22 de octubre a 28 de octubre**

	La aeronave se encuentra en Guaymaral desde el 25 de octubre en el mantenimiento programado.	
Adjunto	Informe de actividades mensual de actividades - octubre de 2024	
	Base de datos a 28 de octubre de 2024	
	Imagen plan de vuelo adquirido a 28 de octubre de 2024	
	Imagen cuentas totales preliminar a 28 de octubre de 2024	
	Imagen intensidad magnética total preliminar	
	Informe de Control de Calidad a 28 de octubre de 2024	
Link de descarga con información adjunta	20241029 - Adquisicion	
Atentamente,		
		
Marco Antonio Nieto Patarroyo **Director de Proyecto** **UT Xcalibur Smart Mapping** **Contrato 490 de 2024**		
CV Version Sep 2024		
