Fecha Inicio Proyecto	2/08/2023
Fecha de Terminación	31/07/2024
Proyecto a cargo de:	UNIVERSIDAD DE LA SABANA

Visualizar cada	1	días

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DE LA TAREA	ASIGNADO A	PREDECESOR	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	DIAS DESTINADOS
*	**Inicio del convenio con la Universidad de La Sabana**	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	14/11/2023	31/07/2024	260
1	**ALISTAMIENTO**					
1.1	**Diseño de convocatoria y apoyo en difusión**	Universidad de la Sabana	Gerencia de Proyecto	16/11/2023	31/01/2024	76
2	**EJECUCIÓN**					
2.1	Curso 1 Conv 4.1	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	25/09/2023	22/10/2023	27
2.2	Curso 2 Conv 4.1	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	28/10/2023	19/11/2023	22
2.3	Curso 1 Conv 4.2 y Lista de Espera	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	28/10/2023	19/11/2023	22
2.4	Curso 3 Conv 4.1	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	25/11/2023	17/12/2023	22
2.5	Curso 2 Conv 4.2 y Lista de Espera	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	25/11/2023	17/12/2023	22
2.6	Curso Conv 3 4.2 y Lista de Espera	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	5/02/2024	2/03/2024	26
2.7	Curso 4 Conv 4.1	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	27/01/2024	28/02/2024	32
2.8	Curso profundización Cursos 2 y 3	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	11/03/2024	22/03/2024	11
2.9	Curso 1 Conv 5	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	6/04/2024	28/04/2024	22
2.10	Curso complementario ruta de formacion 4.1 4.2 y Lista de Espera	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	6/04/2024	28/04/2024	22
2.10	Curso 2 Conv 5	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	4/05/2024	26/05/2024	22
2.11	Curso 3 Conv 5	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	1/06/2024	23/06/2024	22
2.12	Pendiente Curso 4 Conv 5	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	29/06/2024	20/07/2024	21
3	**MONITOREO Y CONTROL**					
3.1	**Estratégias de acompañamiento y permanencia**					
3.1.1	Reunión de preparación para el diseño de estrategias de acompañamiento y prevención de la deserción	Universidad de La Sabana	Coordinaación Equipo de Acompañamiento y Permanencia	16/01/2024	5/02/2024	20
3.1.2	Dieseño de estratégias de acompañamientoy prevención de la deserción: Matriz	Universidad de La Sabana	Coordinaación Equipo de Acompañamiento y Permanencia	16/01/2024	5/02/2024	20
3.1.3	Aplicación de encuestas de caracterización de estudiantes	Universidad de La Sabana	Coordinaación Equipo de Acompañamiento y Permanencia	5/02/2024	29/02/2024	24
3.1.4	Informe mensual: Estadísticas de implementación de estratégias de acompañamiento académico	Universidad de La Sabana	Coordinaación Equipo de Acompañamiento y Permanencia	31/01/2024	18/05/2024	108
3.1.5	Implementación de sesiones de acompañamiento para la prevención y disminución de la deserción: *Centro de Recursos para el Éxito Académico (CREA) *Recurso de Asesoría Psicopedagógica •Asesoría Académica Personalizada	Universidad de La Sabana	Coordinaación Equipo de Acompañamiento y Permanencia	5/02/2024	18/05/2024	103
3.2	**Informes mensuales de seguimiento técnico**					0
3.2.1	Reporte ejecución del proyecto Mes 1.	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/01/2024	31/01/2024	30
3.2.2	Reporte ejecución del proyecto Mes 2.	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/02/2024	29/02/2024	28
3.2.3	Reporte ejecución del proyecto Mes 3.	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/03/2024	31/03/2024	30
3.2.4	Reporte ejecución del proyecto Mes 4.	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/04/2024	30/04/2024	29
3.2.5	Reporte ejecución del proyecto Mes 5.	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/05/2024	31/05/2024	30
3.2.6	Reporte ejecución del proyecto Mes 6.	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/06/2024	30/06/2024	29
3.2.7	Reporte ejecución del proyecto Mes 7.	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/07/2024	31/07/2024	30
3.3	**Informes mensuales de seguimiento financiero**					0
3.3.1	Reporte financiero del proyecto Mes 1.	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/01/2024	31/01/2024	30
3.3.2	Reporte financiero del proyecto Mes 1.	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/02/2024	29/02/2024	28
3.3.3	Reporte financiero del proyecto Mes 1.	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/03/2024	31/03/2024	30
3.3.4	Reporte financiero del proyecto Mes 1.	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/04/2024	30/04/2024	29
3.3.5	Reporte financiero del proyecto Mes 1.	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/05/2024	31/05/2024	30
3.3.6	Reporte financiero del proyecto Mes 1.	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/06/2024	30/06/2024	29
3.3.7	Reporte financiero del proyecto Mes 1.	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/07/2024	31/07/2024	30
3.4	**Levantamiento de evidencias**					0
3.4.1	Videos y grabaciones de clases	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	27/01/2024	28/02/2024	32
4	**CIERRE**					
4.1	**Terminación de la formación**					
4.1.1	Entrega de certificados por la rutas de formación	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	Pendiente	Pendiente	#¡VALOR!
4.1.2	Entrega de informes técnico y financiero finales	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	22/07/2024	31/07/2024	9
4.2	**Acta de cierre Operativo, administrativo, jurídico**					0
4.2.1	Acta de liquidación	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	22/07/2024	31/07/2024	9
4.2.2	Cierre del convenio	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	22/07/2024	31/07/2024	9
4.3	**Reporte Final del Proyecto**	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	22/07/2024	27/07/2024	5
4.4	**Lecciones aprendidas**	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	22/07/2024	27/07/2024	5


CRONOGRAMA " UNIVERSIDAD DE LA SABANA " CONVENIO-ATENEA-348-2023

Cronograma GANTT


Fecha Inicio Proyecto	2/08/2023
Fecha de Terminación	31/07/2024
Proyecto a cargo de:	UNIVERSIDAD DE LA SABANA

Visualizar cada	7	días


IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DE LA TAREA	ASIGNADO A	PREDECESOR	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	DIAS DESTINADOS	% AVANCE	DIAS HABILES DE TRABAJO
*	**Inicio del convenio con la Universidad de la Sabana**	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	**2/08/2023**	2/08/2023	1	100%	1
1	**ALISTAMIENTO**							
1.1	**Diseño de convocatoria y apoyo en difusión**	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	9/08/2023	25/09/2023	47	100%	34
1.1.1	**Campaña de difusión por medios de comunicación**	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	9/08/2023	25/09/2023	47	100%	34
1.1.2	Vallas publicitarias	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	8/08/2023	25/08/2023	17	100%	14
1.1.3	PRENSA ADN ADN - Bogotá 1/2 Pág. - Aviso impreso de 1/2 página par a color. Circulación en la ciudad de Bogotá	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	11/08/2023	~~25/09/2023~~	47	100%	26
1.1.4	Radio Uno - Cuña de 20 segundos - 6 salidas diarias	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	11/08/2023	27/08/2023	47	100%	26
1.1.5	Distribución de Flyers publicitarios	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	14/08/2023	15/09/2023	32	100%	25
1.1.6	Campañas BTL	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	8/08/2023	12/09/2023	47	100%	26
1.1.7	Campañas OTL	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	23/08/2023	23/08/2023	47	100%	34
1.1.8	Emisiones en City TV	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	20/08/2023	17/09/2023	28	100%	20
1.1.9	Diseño de las estatégias de permanencia	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	2/08/2023	18/08/2023	47	100%	14
1.1.10	Preperación plan de trabajo	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	2/08/2023	25/09/2023	54	100%	39
1.1.11	Carro Valla	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	7/09/2023	15/09/2023	8	100%	7
1.1.12	Contratación de Profesores	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	15/08/2023	13/09/2023	47	100%	25
1.1.13	Oficialización de beneficiarios (publicación lista de elegibles)	Agencia ATENEA	Gerencia de Proyecto	27/08/2023	15/09/2023	47	100%	26
1.1.14	Publicación de elegibles	Agencia ATENEA	Gerencia de Proyecto	8/09/2023	8/09/2023	47	100%	34
2	**EJECUCIÓN**							
2.1	Verificación de la Documentación	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	8/09/2023	22/09/2023	14	100%	11
2.2	Inicio de clases Curso 1	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	25/09/2023	22/10/2023	27	100%	20
2.2.1	Perfil 1. Maestro de Obras Ruta 1. Fundamentos de Construcción e Ingeniería Civil	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	25/09/2023	24/10/2023	29	100%	22
2.2.2	Registro en plataformas de notas Fundamentos de Construcción e Ingeniería Civil	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	22/10/2023	30/10/2023	8	100%	6
2.2.3	Materiales, Métodos y Herramientas de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	25/09/2023	24/10/2023	29	100%	22
2.2.4	Registro en plataformas de notas Materiales, Métodos y Herramientas de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	22/10/2023	30/10/2023	8	100%	6
2.2.5	Modelado de Piezas de Concreto	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	25/09/2023	24/10/2023	29	100%	22
2.2.6	Registro en plataformas de notas Modelado de Piezas de Concreto	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	22/10/2023	30/10/2023	8	100%	6
2.2.7	Servicio al Cliente en la Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	25/09/2023	24/10/2023	29	100%	22
2.2.8	Registro en plataformas de notas Servicio al Cliente en la Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	22/10/2023	30/10/2023	8	100%	6
2.2.9	Perfil 2. Albañilería Fundamentos de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	25/09/2023	24/10/2023	29	100%	22
2.2.10	Registro en plataformas de notas Fundamentos de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	22/10/2023	30/10/2023	8	100%	6
2.2.11	Acabados de construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	25/09/2023	24/10/2023	29	100%	22
2.2.12	Registro en plataformas de notas Acabados de construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	22/10/2023	30/10/2023	8	100%	6
2.2.13	Inmpermeabilización de Superficies	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	25/09/2023	24/10/2023	29	100%	22
2.2.14	Registro en plataformas de notas Inmpermeabilización de Superficies	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	22/10/2023	30/10/2023	8	100%	6
2.2.15	Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	25/09/2023	24/10/2023	29	100%	22
2.2.16	Registro en plataformas de notas Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docente de cada Curso	22/10/2023	30/10/2023	8	100%	6
2.2.17	Preparación y Colocación de Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	25/09/2023	24/10/2023	29	100%	22
2.2.18	Registro en plataformas de notas Preparación y Colocación de Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	22/10/2023	30/10/2023	8	100%	6
2.2.19	Revestimiento de Muros y Superficies	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	25/09/2023	24/10/2023	29	100%	22
2.2.20	Registro en plataformas de notas Revestimiento de Muros y Superficies	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	22/10/2023	30/10/2023	8	100%	6
2.3	Inicio de clases Curso 2 4.1 y Curso 1 4.2 y LE	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	28/10/2023	19/11/2023	22	100%	15
2.3.1	Perfil 1. Maestro de Obras Ruta 1. Fundamentos de Construcción e Ingeniería Civil	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	28/10/2023	19/11/2023	22	100%	15
2.3.2	Registro en plataformas de notas Fundamentos de Construcción e Ingeniería Civil	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	28/10/2023	19/11/2023	22	100%	15
2.3.3	Materiales, Métodos y Herramientas de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	28/10/2023	19/11/2023	22	100%	15
2.3.4	Registro en plataformas de notas Materiales, Métodos y Herramientas de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	28/10/2023	19/11/2023	22	100%	15
2.3.5	Modelado de Piezas de Concreto	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	28/10/2023	19/11/2023	22	100%	15
2.3.6	Registro en plataformas de notas Modelado de Piezas de Concreto	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	28/10/2023	19/11/2023	22	100%	15
2.3.7	Servicio al Cliente en la Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	28/10/2023	19/11/2023	22	100%	15
2.3.8	Registro en plataformas de notas Servicio al Cliente en la Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	28/10/2023	19/11/2023	22	100%	15
2.3.9	Perfil 2. Albañilería Fundamentos de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	28/10/2023	19/11/2023	22	100%	15
2.3.10	Registro en plataformas de notas Fundamentos de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	28/10/2023	19/11/2023	22	100%	15
2.3.11	Acabados de construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	28/10/2023	19/11/2023	22	100%	15
2.3.12	Registro en plataformas de notas Acabados de construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	28/10/2023	19/11/2023	22	100%	15
2.3.13	Inmpermeabilización de Superficies	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	28/10/2023	19/11/2023	22	100%	15
2.3.14	Registro en plataformas de notas Inmpermeabilización de Superficies	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	28/10/2023	19/11/2023	22	100%	15
2.3.15	Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	28/10/2023	19/11/2023	22	100%	15
2.3.16	Registro en plataformas de notas Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docente de cada Curso	28/10/2023	19/11/2023	22	100%	15
2.3.17	Preparación y Colocación de Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	28/10/2023	19/11/2023	22	100%	15
2.3.18	Registro en plataformas de notas Preparación y Colocación de Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	28/10/2023	19/11/2023	22	100%	15

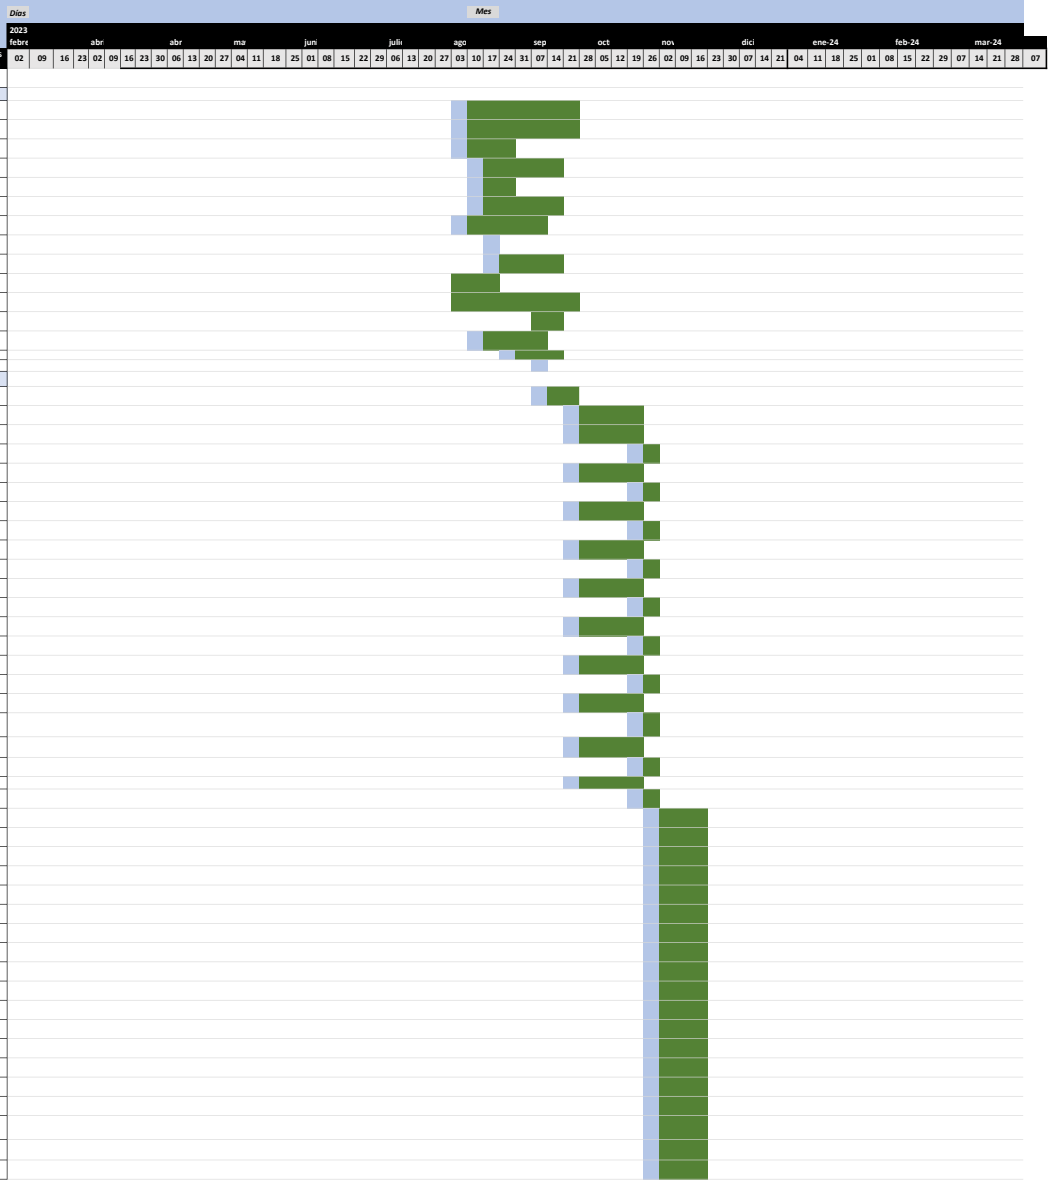

2.3.19	Revestimiento de Muros y Superficies	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	28/10/2023	19/11/2023	22	100%	15
2.3.20	Registro en plataformas de notas Revestimiento de Muros y Superficies	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	28/10/2023	19/11/2023	22	100%	15
2.4	Inicio de clases Curso 3 4.1 y Curso 2 4.2 y LE	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	28/10/2023	19/11/2023	22	100%	15
2.4.1	Perfil 1. Maestro de Obras Ruta 1. Fundamentos de Construcción e Ingeniería Civil	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	28/10/2023	19/11/2023	22	100%	15
2.4.2	Registro en plataformas de notas Fundamentos de Construcción e Ingeniería Civil	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	28/10/2023	19/11/2023	22	100%	15
2.4.3	Materiales, Métodos y Herramientas de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	28/10/2023	19/11/2023	22	100%	15
2.4.4	Registro en plataformas de notas Materiales, Métodos y Herramientas de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	28/10/2023	19/11/2023	22	100%	15
2.4.5	Modelado de Piezas de Concreto	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	28/10/2023	19/11/2023	22	100%	15
2.4.6	Registro en plataformas de notas Modelado de Piezas de Concreto	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	28/10/2023	19/11/2023	22	100%	15
2.4.7	Servicio al Cliente en la Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	28/10/2023	19/11/2023	22	100%	15
2.4.8	Registro en plataformas de notas Servicio al Cliente en la Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	28/10/2023	19/11/2023	22	100%	15
2.4.9	Perfil 2. Albañilería Fundamentos de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	28/10/2023	19/11/2023	22	100%	15
2.4.10	Registro en plataformas de notas Fundamentos de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	28/10/2023	19/11/2023	22	100%	15
2.4.11	Acabados de construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	28/10/2023	19/11/2023	22	100%	15
2.4.12	Registro en plataformas de notas Acabados de construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	28/10/2023	19/11/2023	22	100%	15
2.4.13	Inmpermeabilización de Superficies	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	28/10/2023	19/11/2023	22	100%	15
2.4.14	Registro en plataformas de notas Inmpermeabilización de Superficies	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	28/10/2023	19/11/2023	22	100%	15
2.4.15	Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	28/10/2023	19/11/2023	22	100%	15
2.4.16	Registro en plataformas de notas Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docente de cada Curso	28/10/2023	19/11/2023	22	100%	15
2.4.17	Preparación y Colocación de Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	28/10/2023	19/11/2023	22	100%	15
2.4.18	Registro en plataformas de notas Preparación y Colocación de Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	28/10/2023	19/11/2023	22	100%	15
2.4.19	Revestimiento de Muros y Superficies	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	28/10/2023	19/11/2023	22	100%	15
2.4.20	Registro en plataformas de notas Revestimiento de Muros y Superficies	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	28/10/2023	19/11/2023	22	100%	15
2.5	Inicio de clases Curso 3 4.1 Curso 2 4.2 y LE	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	25/11/2023	17/12/2023	22	100%	15
2.5.1	Perfil 1. Maestro de Obras Ruta 1. Fundamentos de Construcción e Ingeniería Civil	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	25/11/2023	17/12/2023	22	100%	15
2.5.2	Registro en plataformas de aprendizaje	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	25/11/2023	17/12/2023	22	100%	15
2.5.3	Materiales, Métodos y Herramientas de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	25/11/2023	17/12/2023	22	100%	15
2.5.4	Registro en plataformas de notas Materiales, Métodos y Herramientas de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	25/11/2023	17/12/2023	22	100%	15
2.5.5	Modelado de Piezas de Concreto	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	25/11/2023	17/12/2023	22	100%	15
2.5.6	Registro en plataformas de notas Modelado de Piezas de Concreto	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	25/11/2023	17/12/2023	22	100%	15
2.5.7	Servicio al Cliente en la Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	25/11/2023	17/12/2023	22	100%	15
2.5.8	Registro en plataformas de notas Servicio al Cliente en la Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	25/11/2023	17/12/2023	22	100%	15
2.5.9	Perfil 2. Albañilería Fundamentos de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	25/11/2023	17/12/2023	22	100%	15
2.5.10	Registro en plataformas de notas Fundamentos de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	25/11/2023	17/12/2023	22	100%	15
2.5.11	Acabados de construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	25/11/2023	17/12/2023	22	100%	15
2.5.12	Registro en plataformas de notas Acabados de construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	25/11/2023	17/12/2023	22	100%	15
2.5.13	Inmpermeabilización de Superficies	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	25/11/2023	17/12/2023	22	100%	15
2.5.14	Registro en plataformas de notas Inmpermeabilización de Superficies	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	25/11/2023	17/12/2023	22	100%	15
2.5.15	Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	25/11/2023	17/12/2023	22	100%	15
2.5.16	Registro en plataformas de notas Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docente de cada Curso	25/11/2023	17/12/2023	22	100%	15
2.5.17	Preparación y Colocación de Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	25/11/2023	17/12/2023	22	100%	15
2.5.18	Registro en plataformas de notas Preparación y Colocación de Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	25/11/2023	17/12/2023	22	100%	15
2.5.19	Revestimiento de Muros y Superficies	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	25/11/2023	17/12/2023	22	100%	15
2.5.20	Registro en plataformas de notas	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	25/11/2023	17/12/2023	22	100%	15
2.6	Inicio de clases Curso 4 4.1, Curso 3 4.2 y LE	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	27/01/2024	28/02/2024	32	100%	**23**
2.6.1	Perfil 1. Maestro de Obras Ruta 1. Fundamentos de Construcción e Ingeniería Civil	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	27/01/2024	28/02/2024	32	100%	**23**
2.6.2	Registro en plataformas de aprendizaje	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	27/01/2024	28/02/2024	32	100%	**23**
2.6.3	Materiales, Métodos y Herramientas de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	27/01/2024	28/02/2024	32	100%	**23**
2.6.4	Registro en plataformas de notas Materiales, Métodos y Herramientas de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	27/01/2024	28/02/2024	32	100%	**23**
2.6.5	Modelado de Piezas de Concreto	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	27/01/2024	28/02/2024	32	100%	**23**
2.6.6	Registro en plataformas de notas Modelado de Piezas de Concreto	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	27/01/2024	28/02/2024	32	100%	**23**
2.6.7	Servicio al Cliente en la Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	27/01/2024	28/02/2024	32	100%	**23**
2.6.8	Registro en plataformas de notas Servicio al Cliente en la Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	27/01/2024	28/02/2024	32	100%	**23**
2.6.9	Perfil 2. Albañilería Fundamentos de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	27/01/2024	28/02/2024	32	100%	**23**
2.6.10	Registro en plataformas de notas Fundamentos de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	27/01/2024	28/02/2024	32	100%	**23**
2.6.11	Acabados de construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	27/01/2024	28/02/2024	32	100%	**23**
2.6.12	Registro en plataformas de notas Acabados de construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	27/01/2024	28/02/2024	32	100%	**23**
2.6.13	Inmpermeabilización de Superficies	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	27/01/2024	28/02/2024	32	100%	**23**
2.6.14	Registro en plataformas de notas Inmpermeabilización de Superficies	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	27/01/2024	28/02/2024	32	100%	**23**
2.6.15	Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	27/01/2024	28/02/2024	32	100%	**23**
2.6.16	Registro en plataformas de notas Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docente de cada Curso	27/01/2024	28/02/2024	32	100%	**23**
2.6.17	Preparación y Colocación de Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	27/01/2024	28/02/2024	32	100%	**23**
2.6.18	Registro en plataformas de notas Preparación y Colocación de Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	27/01/2024	28/02/2024	32	100%	**23**
2.6.19	Revestimiento de Muros y Superficies	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	27/01/2024	28/02/2024	32	100%	**23**
2.6.20	Registro en plataformas de notas	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	27/01/2024	6/03/2024	39	100%	**28**
2.7	Inicio clases curso profundización Cursos 2 y 3	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	11/03/2024	22/03/2024	11	100%	**10**
2.7.1	Perfil 1. Maestro de Obras Ruta 1. Fundamentos de Construcción e Ingeniería Civil	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	11/03/2024	22/03/2024	11	100%	**10**
2.7.2	Registro en plataformas de aprendizaje	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	11/03/2024	22/03/2024	11	100%	**10**

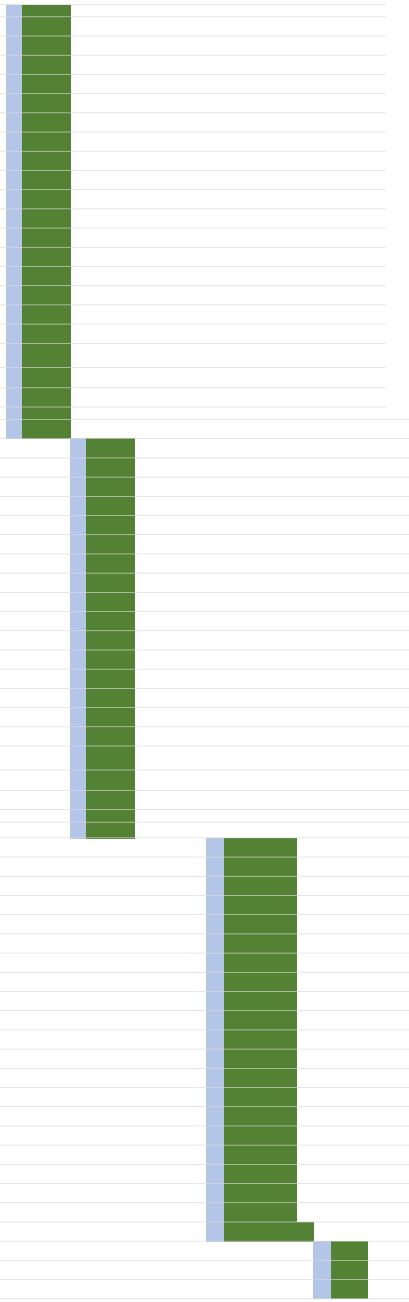

2.7.3	Materiales, Métodos y Herramientas de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	11/03/2024	22/03/2024	11	100%	10
2.7.4	Registro en plataformas de notas Materiales, Métodos y Herramientas de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	11/03/2024	22/03/2024	11	100%	10
2.7.5	Modelado de Piezas de Concreto	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	11/03/2024	22/03/2024	11	100%	10
2.7.6	Registro en plataformas de notas Modelado de Piezas de Concreto	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	11/03/2024	22/03/2024	11	100%	10
2.7.7	Servicio al Cliente en la Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	11/03/2024	22/03/2024	11	100%	10
2.7.8	Registro en plataformas de notas Servicio al Cliente en la Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	11/03/2024	22/03/2024	11	100%	10
2.7.9	Perfil 2. Albañilería Fundamentos de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	11/03/2024	22/03/2024	11	100%	10
2.7.10	Registro en plataformas de notas Fundamentos de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	11/03/2024	22/03/2024	11	100%	10
2.7.11	Acabados de construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	11/03/2024	22/03/2024	11	100%	10
2.7.12	Registro en plataformas de notas Acabados de construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	11/03/2024	22/03/2024	11	100%	10
2.7.13	Inmpermeabilización de Superficies	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	11/03/2024	22/03/2024	11	100%	10
2.7.14	Registro en plataformas de notas Inmpermeabilización de Superficies	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	11/03/2024	22/03/2024	11	100%	10
2.7.15	Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	11/03/2024	22/03/2024	11	100%	10
2.7.16	Registro en plataformas de notas Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docente de cada Curso	11/03/2024	22/03/2024	11	100%	10
2.7.17	Preparación y Colocación de Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	11/03/2024	22/03/2024	11	100%	10
2.7.18	Registro en plataformas de notas Preparación y Colocación de Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	11/03/2024	22/03/2024	11	100%	10
2.7.19	Revestimiento de Muros y Superficies	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	11/03/2024	22/03/2024	11	100%	10
2.7.20	Registro en plataformas de notas	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	11/03/2024	22/03/2024	11	100%	10
2.8	Inicio de clases Curso complementario ruta de formación	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	6/04/2024	28/04/2024	22	100%	15
2.8.1	Perfil 1. Maestro de Obras Ruta 1. Fundamentos de Construcción e Ingeniería Civil	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	6/04/2024	28/04/2024	22	100%	15
2.8.2	Registro en plataformas de aprendizaje	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	6/04/2024	28/04/2024	22	100%	15
2.8.3	Materiales, Métodos y Herramientas de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	6/04/2024	28/04/2024	22	100%	15
2.8.4	Registro en plataformas de notas Materiales, Métodos y Herramientas de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	6/04/2024	28/04/2024	22	100%	15
2.8.5	Modelado de Piezas de Concreto	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	6/04/2024	28/04/2024	22	100%	15
2.8.6	Registro en plataformas de notas Modelado de Piezas de Concreto	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	6/04/2024	28/04/2024	22	100%	15
2.8.7	Servicio al Cliente en la Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	6/04/2024	28/04/2024	22	100%	15
2.8.8	Registro en plataformas de notas Servicio al Cliente en la Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	6/04/2024	28/04/2024	22	100%	15
2.8.9	Perfil 2. Albañilería Fundamentos de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	6/04/2024	28/04/2024	22	100%	15
2.8.10	Registro en plataformas de notas Fundamentos de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	6/04/2024	28/04/2024	22	100%	15
2.8.11	Acabados de construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	6/04/2024	28/04/2024	22	100%	15
2.8.12	Registro en plataformas de notas Acabados de construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	6/04/2024	28/04/2024	22	100%	15
2.8.13	Inmpermeabilización de Superficies	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	6/04/2024	28/04/2024	22	100%	15
2.8.14	Registro en plataformas de notas Inmpermeabilización de Superficies	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	6/04/2024	28/04/2024	22	100%	15
2.8.15	Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	6/04/2024	28/04/2024	22	100%	15
2.8.16	Registro en plataformas de notas Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docente de cada Curso	6/04/2024	28/04/2024	22	100%	15
2.8.17	Preparación y Colocación de Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	6/04/2024	28/04/2024	22	100%	15
2.8.18	Registro en plataformas de notas Preparación y Colocación de Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	6/04/2024	28/04/2024	22	100%	15
2.8.19	Revestimiento de Muros y Superficies	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	6/04/2024	28/04/2024	22	100%	15
2.8.20	Registro en plataformas de notas	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	6/04/2024	28/04/2024	22	100%	15
3	**MONITOREO Y CONTROL**							
3.1	**Estratégias de acompañamiento y permanencia**					0		**0**
3.1.1	Reunión de preparación para el diseño de estreatégias de acompañamiento y prevención de la deserción	Universidad de La Sabana	nto y Permanencia Dirección d	10/08/2023	28/02/2024	202	100%	145
3.1.2	Diseño de estratégias de acompañamientoy prevención de la deserción: Matriz	Universidad de La Sabana	nto y Permanencia Dirección d	14/08/2023	18/08/2023	47	100%	34
3.1.3	Aplicación de encuestas de caracterización de estudiantes	Universidad de La Sabana	Equipo de Acompañamiento	25/09/2023	28/02/2024	156	100%	113
3.1.4	Informe mensual: Estadísticas de implementación de estratégias de acompañamiento académico	Universidad de La Sabana	Equipo de Acompañamiento	25/09/2023	28/02/2024	156	100%	113
3.1.5	Implementación de sesiones de acompañamiento para la prevención y disminución de la deserción: *Centro de Recursos para el Éxito Académico (CREA) *Recurso de Asesoría Psicopedagógica •Asesoría Académica Personalizada	Universidad de La Sabana	Equipo de Acompañamiento	18/09/2023	28/02/2024	163	100%	118
3.2	**Informes mensuales de seguimiento técnico**							
3.2.1	Reporte seguimiento técnico proyecto Mes 1 agosto	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/08/2023	31/08/2023	30	100%	23
3.2.1	Reporte seguimiento técnico proyecto Mes 1 septiembre	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/09/2023	30/09/2023	29	100%	21
3.2.2	Reporte seguimiento técnico proyecto Mes 2 octubre	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/10/2023	31/10/2023	47	100%	26
3.2.3	Reporte seguimiento técnico proyecto Mes 3 noviembre	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/11/2023	30/11/2023	47	100%	34
3.2.4	Reporte seguimiento técnico proyecto Mes 4 diciembre	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/12/2023	31/12/2023	30	100%	21
3.2.5	Reporte seguimiento técnico proyecto Mes 5 enero	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/01/2024	31/01/2024	30	100%	23
3.2.6	Reporte seguimiento técnico proyecto Mes 6 febrero	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/02/2024	29/02/2024	28	100%	21
3.2.7	Reporte seguimiento técnico proyecto Mes 7 marzo	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/03/2024	30/03/2024	29	0%	21
3.3	**Informes mensuales de seguimiento financiero**							0
3.3.1	Reporte seguimiento financiero proyecto Mes 1 agosto	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/08/2023	31/08/2023	30	100%	23
3.3.1	Reporte seguimiento financiero proyecto Mes 1 septiembre	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/09/2023	30/09/2023	29	100%	21
3.3.2	Reporte seguimiento financiero proyecto Mes 2 octubre	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/10/2023	30/10/2023	29	100%	21
3.3.3	Reporte seguimiento financiero proyecto Mes 3 Noviembre	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/11/2023	30/11/2023	29	100%	22
3.3.4	Reporte seguimiento financiero proyecto Mes 4 diciembre	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/12/2023	31/12/2023	30	100%	21
3.3.5	Reporte seguimiento financiero proyecto Mes 5 enero	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/01/2024	31/01/2024	30	100%	23
3.3.6	Reporte seguimiento financiero proyecto Mes 6 febrero	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/02/2024	29/02/2024		100%	
3.3.7	Reporte seguimiento financiero proyecto Mes 7 marzo	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/03/2024	30/03/2024	29	100%	21
3.4	**Levantamiento de evidencias**							
3.4.1	Videos y grabaciones de clases	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	18/09/2023	28/02/2024	163	100%	118
4	**CIERRE**					0		0




4.1	**Terminación de la formación**					0	100%	0
4.1.1	Evento entrega de certificados por la rutas de formación	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	Pendiente	Pendiente	#¡VALOR!	100%	#¡VALOR!
4.1.2	Entrega de informes tecnico y financiero finales	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	22/07/2024	31/07/2024	9	100%	8
4.2	**Acta de cierre Operativo, administrativo, jurídico**					0	100%	0
4.2.1	Acta de liquidación	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	22/07/2024	31/07/2024	9	100%	8
4.2.2	Cierre del convenio	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	22/07/2024	31/07/2024	9	100%	8
4.3	**Reporte Final del Proyecto**	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	22/07/2024	27/07/2024	5	100%	5
4.4	**Lecciones aprendidas**	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	22/07/2024	27/07/2024	5	100%	5

Fecha Inicio Proyecto	2/08/2023
Fecha de Terminación	31/07/2024
Proyecto a cargo de:	UNIVERSIDAD DE LA SABANA


Visualizar cada	7	días

Días *Mes*

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DE LA TAREA	ASIGNADO A	PREDECESOR	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	DIAS DESTINADOS	% AVANCE	DIAS HABILES DE TRABAJO
*	**Inicio del convenio con la Universidad de La Sabana**	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	**2/08/2023**	31/07/2024			
1	**ALISTAMIENTO**							
1.1	**Diseño de convocatoria y apoyo en difusión**	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	16/11/2023	31/01/2024	76	100%	55
1.1.1	**Campaña de difusión por medios de comunicación**	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	16/11/2023	31/01/2024	76	100%	55
1.1.2	Carro Valla	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	16/11/2023	31/01/2024	76	100%	55
1.1.3	Radio	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	16/11/2023	31/01/2024	76	100%	55
1.1.4	El Sol El Sol Bogotá FM - Cuña de 20 segundos	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	16/11/2023	31/01/2024	76	100%	55
1.1.5	Radio Uno - Cuña de 20 segundos	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	16/11/2023	31/01/2024	76	100%	55
1.1.6	ENTREGA DE FLYERS	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	16/11/2023	31/01/2024	76	100%	55
1.1.7	PAGINA WEB	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	23/11/2023	31/01/2024	69	100%	50
1.1.8	REDES SOCIALES	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	16/11/2023	31/01/2024	76	100%	55
1.1.9	CAMPAÑA DIGITAL	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	16/11/2023	31/01/2024	76	100%	55
1.1.10	ENVIO DE SMS	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	16/11/2023	31/01/2024	76	100%	55
1.1.11	City TV	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	20/11/2023	31/01/2024	72	100%	7
1.1.12	Contratación de Profesores	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/03/2024	21/07/2024	142	100%	101
1.1.13	Oficialización de beneficiarios (publicación lista de elegibles)	Agencia ATENEA	Gerencia de Proyecto	23/02/2024	23/02/2024	0	100%	1
1.1.14	Publicación de elegibles	Agencia ATENEA	Gerencia de Proyecto	23/02/2024	23/02/2024	0	100%	1
2	**EJECUCIÓN**							
2.1	Verificación de la Documentación	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	23/02/2024	22/03/2024	28	100%	21
2.2	Inicio de clases Curso 1	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	6/04/2024	28/04/2024	22	100%	15
2.2.1	Perfil 1. Maestro de Obras Ruta 1. Fundamentos de Construcción e Ingenieria Civil	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	6/04/2024	28/04/2024	22	100%	15
2.2.2	Registro en plataformas de aprendizaje	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	6/04/2024	28/04/2024	22	100%	15
2.2.3	Materiales, Métodos y Herramientas de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	6/04/2024	28/04/2024	22	100%	15
2.2.4	Registro en plataformas de notas Materiales, Métodos y Herramientas de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	6/04/2024	28/04/2024	22	100%	15
2.2.5	Modelado de Piezas de Concreto	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	6/04/2024	28/04/2024	22	100%	15
2.2.6	Registro en plataformas de notas Modelado de Piezas de Concreto	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	6/04/2024	28/04/2024	22	100%	15
2.2.7	Servicio al Cliente en la Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	6/04/2024	28/04/2024	22	100%	15
2.2.8	Registro en plataformas de notas Servicio al Cliente en la Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	6/04/2024	28/04/2024	22	100%	15
2.2.9	Perfil 2. Albañileria Fundamentos de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	6/04/2024	28/04/2024	22	100%	15
2.2.10	Registro en plataformas de notas Fundamentos de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	6/04/2024	28/04/2024	22	100%	15
2.2.11	Acabados de construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	6/04/2024	28/04/2024	22	100%	15
2.2.12	Registro en plataformas de notas Acabados de construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	6/04/2024	28/04/2024	22	100%	15
2.2.13	Inmpermeabilización de Superficies	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	6/04/2024	28/04/2024	22	100%	15
2.2.14	Registro en plataformas de notas Inmpermeabilización de Superficies	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	6/04/2024	28/04/2024	22	100%	15
2.2.15	Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	6/04/2024	28/04/2024	22	100%	15
2.2.16	Registro en plataformas de notas Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docente de cada Curso	6/04/2024	28/04/2024	22	100%	15
2.2.17	Preparación y Colocación de Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	6/04/2024	28/04/2024	22	100%	15
2.2.18	Registro en plataformas de notas Preparación y Colocación de Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	6/04/2024	28/04/2024	22	100%	15
2.2.19	Revestimiento de Muros y Superficies	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	6/04/2024	28/04/2024	22	100%	15
2.2.20	Registro en plataformas de notas	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	6/04/2024	28/04/2024	22	100%	15
2.3	Inicio de clases Curso 2	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	4/05/2024	26/05/2024	22	100%	15
2.3.1	Perfil 1. Maestro de Obras Ruta 1. Fundamentos de Construcción e Ingenieria Civil	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	4/05/2024	26/05/2024	22	100%	15
2.3.2	Registro en plataformas de aprendizaje	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	4/05/2024	26/05/2024	22	100%	15
2.3.3	Materiales, Métodos y Herramientas de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	4/05/2024	26/05/2024	22	100%	15
2.3.4	Registro en plataformas de notas Materiales, Métodos y Herramientas de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	4/05/2024	26/05/2024	22	100%	15
2.3.5	Modelado de Piezas de Concreto	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	4/05/2024	26/05/2024	22	100%	15
2.3.6	Registro en plataformas de notas Modelado de Piezas de Concreto	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	4/05/2024	26/05/2024	22	100%	15
2.3.7	Servicio al Cliente en la Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	4/05/2024	26/05/2024	22	100%	15
2.3.8	Registro en plataformas de notas Servicio al Cliente en la Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	4/05/2024	26/05/2024	22	100%	15
2.3.9	Perfil 2. Albañileria Fundamentos de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	4/05/2024	26/05/2024	22	100%	15
2.3.10	Registro en plataformas de notas Fundamentos de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	4/05/2024	26/05/2024	22	100%	15
2.3.11	Acabados de construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	4/05/2024	26/05/2024	22	100%	15
2.3.12	Registro en plataformas de notas Acabados de construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	4/05/2024	26/05/2024	22	100%	15
2.3.13	Inmpermeabilización de Superficies	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	4/05/2024	26/05/2024	22	100%	15

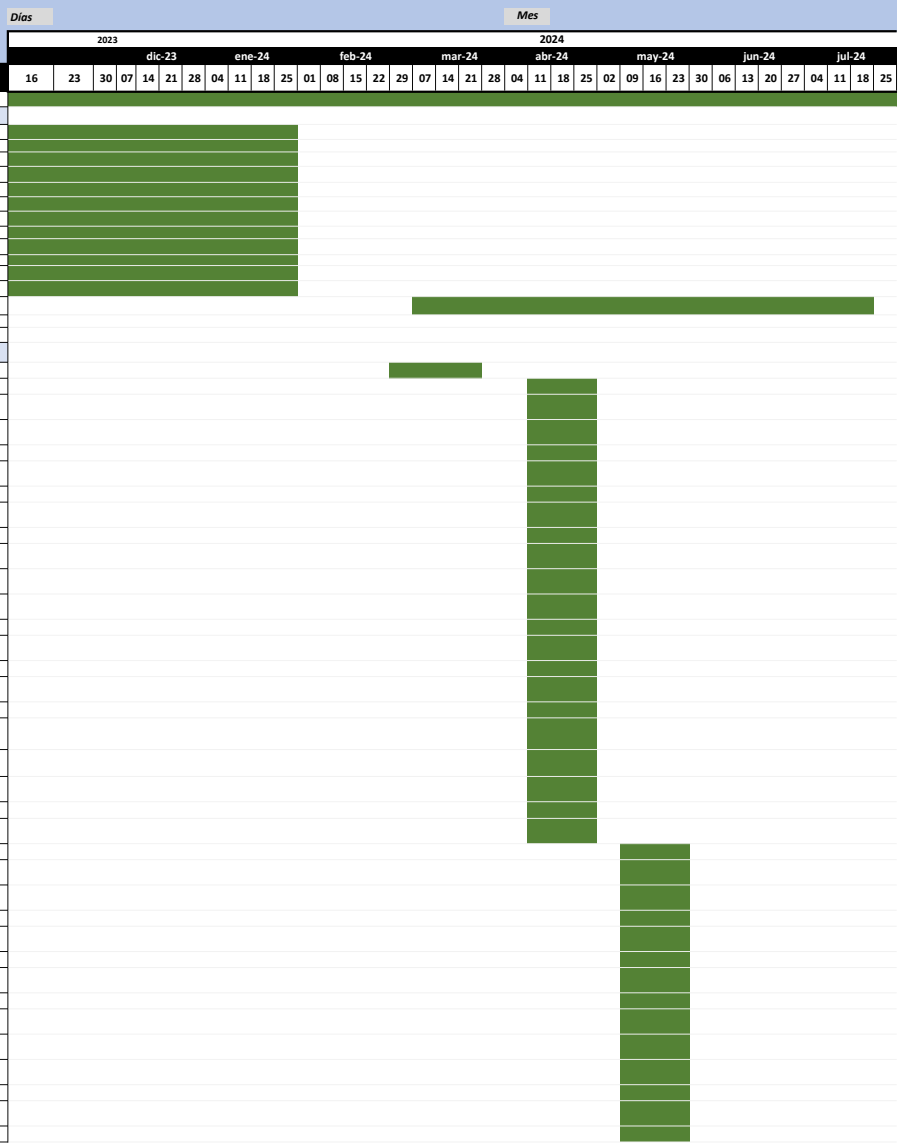

2.3.14	Registro en plataformas de notas Inmpermeabilización de Superficies	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	4/05/2024	26/05/2024	22	100%	15
2.3.15	Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	4/05/2024	26/05/2024	22	100%	15
2.3.16	Registro en plataformas de notas Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docente de cada Curso	4/05/2024	26/05/2024	22	100%	15
2.3.17	Preparación y Colocación de Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	4/05/2024	26/05/2024	22	100%	15
2.3.18	Registro en plataformas de notas Preparación y Colocación de Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	4/05/2024	26/05/2024	22	100%	15
2.3.19	Revestimiento de Muros y Superficies	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	4/05/2024	26/05/2024	22	100%	15
2.3.20	Registro en plataformas de notas	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	4/05/2024	26/05/2024	22	100%	15
2.4	Inicio de clases Curso 3	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/06/2024	23/06/2024	22	100%	15
2.4.1	Perfil 1. Maestro de Obras Ruta 1. Fundamentos de Construcción e Ingenieria Civil	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	1/06/2024	23/06/2024	22	100%	15
2.4.2	Registro en plataformas de aprendizaje	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	1/06/2024	23/06/2024	22	100%	15
2.4.3	Materiales, Métodos y Herramientas de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	1/06/2024	23/06/2024	22	100%	15
2.4.4	Registro en plataformas de notas Materiales, Métodos y Herramientas de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	1/06/2024	23/06/2024	22	100%	15
2.4.5	Modelado de Piezas de Concreto	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	1/06/2024	23/06/2024	22	100%	15
2.4.6	Registro en plataformas de notas Modelado de Piezas de Concreto	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	1/06/2024	23/06/2024	22	100%	15
2.4.7	Servicio al Cliente en la Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	1/06/2024	23/06/2024	22	100%	15
2.4.8	Registro en plataformas de notas Servicio al Cliente en la Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	1/06/2024	23/06/2024	22	100%	15
2.4.9	Perfil 2. Albañileria Fundamentos de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	1/06/2024	23/06/2024	22	100%	15
2.4.10	Registro en plataformas de notas Fundamentos de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	1/06/2024	23/06/2024	22	100%	15
2.4.11	Acabados de construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	1/06/2024	23/06/2024	22	100%	15
2.4.12	Registro en plataformas de notas Acabados de construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	1/06/2024	23/06/2024	22	100%	15
2.4.13	Inmpermeabilización de Superficies	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	1/06/2024	23/06/2024	22	100%	15
2.4.14	Registro en plataformas de notas Inmpermeabilización de Superficies	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	1/06/2024	23/06/2024	22	100%	15
2.4.15	Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	1/06/2024	23/06/2024	22	100%	15
2.4.16	Registro en plataformas de notas Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docente de cada Curso	1/06/2024	23/06/2024	22	100%	15
2.4.17	Preparación y Colocación de Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	1/06/2024	23/06/2024	22	100%	15
2.4.18	Registro en plataformas de notas Preparación y Colocación de Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	1/06/2024	23/06/2024	22	100%	15
2.4.19	Revestimiento de Muros y Superficies	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	1/06/2024	23/06/2024	22	100%	15
2.4.20	Registro en plataformas de notas	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	1/06/2024	23/06/2024	22	100%	15
2.5	Inicio clases curso 4	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	29/06/2024	20/07/2024	21	100%	15
2.5.1	Perfil 1. Maestro de Obras Ruta 1. Fundamentos de Construcción e Ingenieria Civil	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	29/06/2024	20/07/2024	21	100%	15
2.5.2	Registro en plataformas de aprendizaje	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	29/06/2024	20/07/2024	21	100%	15
2.5.3	Materiales, Métodos y Herramientas de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	29/06/2024	20/07/2024	21	100%	15
2.5.4	Registro en plataformas de notas Materiales, Métodos y Herramientas de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	29/06/2024	20/07/2024	21	100%	15
2.5.5	Modelado de Piezas de Concreto	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	29/06/2024	20/07/2024	21	100%	15
2.5.6	Registro en plataformas de notas Modelado de Piezas de Concreto	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	29/06/2024	20/07/2024	21	100%	15
2.5.7	Servicio al Cliente en la Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	29/06/2024	20/07/2024	21	100%	15
2.5.8	Registro en plataformas de notas Servicio al Cliente en la Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	29/06/2024	20/07/2024	21	100%	15
2.5.9	Perfil 2. Albañileria Fundamentos de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	29/06/2024	20/07/2024	21	100%	15
2.5.10	Registro en plataformas de notas Fundamentos de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	29/06/2024	20/07/2024	21	100%	15
2.5.11	Acabados de construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	29/06/2024	20/07/2024	21	100%	15
2.5.12	Registro en plataformas de notas Acabados de construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	29/06/2024	20/07/2024	21	100%	15
2.5.13	Impermeabilización de Superficies	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	29/06/2024	20/07/2024	21	100%	15
2.5.14	Registro en plataformas de notas Inmpermeabilización de Superficies	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	29/06/2024	20/07/2024	21	100%	15
2.5.15	Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	29/06/2024	20/07/2024	21	100%	15
2.5.16	Registro en plataformas de notas Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	29/06/2024	20/07/2024	21	100%	15
2.5.17	Preparación y Colocación de Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	29/06/2024	20/07/2024	21	100%	15
2.5.18	Registro en plataformas de notas Preparación y Colocación de Materiales de Construcción	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	29/06/2024	20/07/2024	21	100%	15
2.5.19	Revestimiento de Muros y Superficies	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	29/06/2024	20/07/2024	21	100%	15
2.5.20	Registro en plataformas de notas	Universidad de La Sabana	Docentes de cada Curso	29/06/2024	20/07/2024	21	100%	15
3	**MONITOREO Y CONTROL**							
3.1	**Estratégias de acompañamiento y permanencia**							
3.1.1	Reunión de preparación para el diseño de estrategias de acompañamiento y prevención de la deserción	Universidad de La Sabana	Coordinaación Equipo de Acompañamiento y Permanencia	6/03/2024	6/03/2024	0	100%	1
3.1.2	Diseño de estratégias de acompañamientoy prevención de la deserción: Matriz	Universidad de La Sabana	Coordinaación Equipo de Acompañamiento y Permanencia	6/04/2024	20/07/2024	105	100%	75
3.1.3	Aplicación de encuestas de caracterización de estudiantes	Universidad de La Sabana	Coordinaación Equipo de Acompañamiento y Permanencia	26/04/2024	23/06/2024	58	100%	
3.1.4	Informe mensual: Estadísticas de implementación de estratégias de acompañamiento académico	Universidad de La Sabana	Coordinaación Equipo de Acompañamiento y Permanencia	6/04/2024	20/07/2024	105	100%	75
3.1.5	Implementación de sesiones de acompañamiento para la prevención y disminución de la deserción: *Centro de Recursos para el Éxito Académico (CREA)	Universidad de La Sabana	Coordinaación Equipo de Acompañamiento y Permanencia	9/04/2024	23/06/2024	75	100%	54
3.2	**Informes mensuales de seguimiento técnico**					0		
3.2.1	Reporte seguimiento técnico proyecto Mes 1 enero	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	16/01/2024	31/01/2024	15	100%	12



3.2.2	Reporte seguimiento técnico proyecto Mes 2 febrero	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/02/2024	29/02/2024	28	100%	21
3.2.3	Reporte seguimiento técnico proyecto Mes 3 marzo	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/03/2024	31/03/2024	30	100%	21
3.2.3	Reporte seguimiento técnico proyecto Mes 4 abril	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/04/2024	30/04/2024	29	100%	22
3.2.3	Reporte seguimiento técnico proyecto Mes 5 mayo	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/05/2024	31/05/2024	30	100%	23
3.2.3	Reporte seguimiento técnico proyecto Mes 6 junio	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/05/2024	31/05/2024	30	100%	23
3.2.3	Reporte seguimiento técnico proyecto Mes 7 julio	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/05/2024	31/05/2024	30	100%	23
3.3	**Informes mensuales de seguimiento y financiero**							
3.3.1	Reporte seguimiento financiero proyecto Mes 1 enero	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/01/2024	31/01/2024	30	100%	23
3.3.2	Reporte seguimiento financiero proyecto Mes 2 feberero	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/02/2024	29/02/2024	28	100%	21
3.3.3	Reporte seguimiento financiero proyecto Mes 3 marzo	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/03/2024	31/03/2024	30	100%	21
3.3.4	Reporte seguimiento financiero proyecto Mes 4 abril	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/04/2024	30/04/2024	29	100%	22
3.3.5	Reporte seguimiento financiero proyecto Mes 5 mayo	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/05/2024	31/05/2024	30	100%	23
3.3.6	Reporte seguimiento financiero proyecto Mes 6 junio	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/06/2024	30/06/2024	29	100%	20
3.3.7	Reporte seguimiento financiero proyecto Mes 7 julio	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	1/07/2024	31/07/2024	30	100%	23
3.3	**Levantamiento de evidencias**					0	100%	
3.3.1	Videos y grabaciones de clases	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	6/04/2024	20/07/2024	105	100%	75
4	**CIERRE**							
4.1	**Terminación de la formación**							
4.1.1	Entrega de certificados por la rutas de formación	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	Pendiente	Pendiente	#¡VALOR!	100%	#¡VALOR!
4.1.2	Entrega de informes tecnico y financiero finales	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	22/07/2024	31/07/2024	9	100%	8
4.2	**Acta de cierre Operativo, administrativo, jurídico**					0	100%	
4.2.1	Acta de liquidación	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	22/07/2024	31/07/2024	9	100%	8
4.2.2	Cierre del convenio	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	22/07/2024	31/07/2024	9	100%	8
4.3	**Reporte Final del Proyecto**	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	22/07/2024	27/07/2024	5	100%	5
4.4	**Lecciones aprendidas**	Universidad de La Sabana	Gerencia de Proyecto	22/07/2024	27/07/2024	5	100%	5

