
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea
1		**CUBIERTAS PLACAS POLIDEPORTIVAS CARMEN DE**
2		**PLACA AGUAS CLARAS**
3		**PRELIMINARES.**
6		**CIMENTACIÓN.**
12		**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICAS.**
20		**INSTALAR LAS REDES HIDROSANITARIAS**
25		**CONSTRUIR LAS CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES**
28		**PINTAR Y DEMARCAR ELEMENTO**
30		**PLACA LA MADERA**
31		**PRELIMINARES.**
33		**CIMENTACIÓN.**
35		**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICAS.**
38		**INSTALAR LAS REDES HIDROSANITARIAS**
43		**CONSTRUIR LAS CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES**
46		**PINTAR Y DEMARCAR ELEMENTO**
48		**PLACA LA FLORIDA**
49		**PRELIMINARES.**
51		**CIMENTACIÓN.**
54		**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICAS.**
58		**INSTALAR LAS REDES HIDROSANITARIAS**
63		**CONSTRUIR LAS CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES**
66		~~INSTALAR REDES ELÉCTRICAS~~
71		**PINTAR Y DEMARCAR ELEMENTO**
73		**PLACA IT MARCO TULIO**
74		**PRELIMINARES.**
79		**CIMENTACIÓN.**
85		**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICAS.**

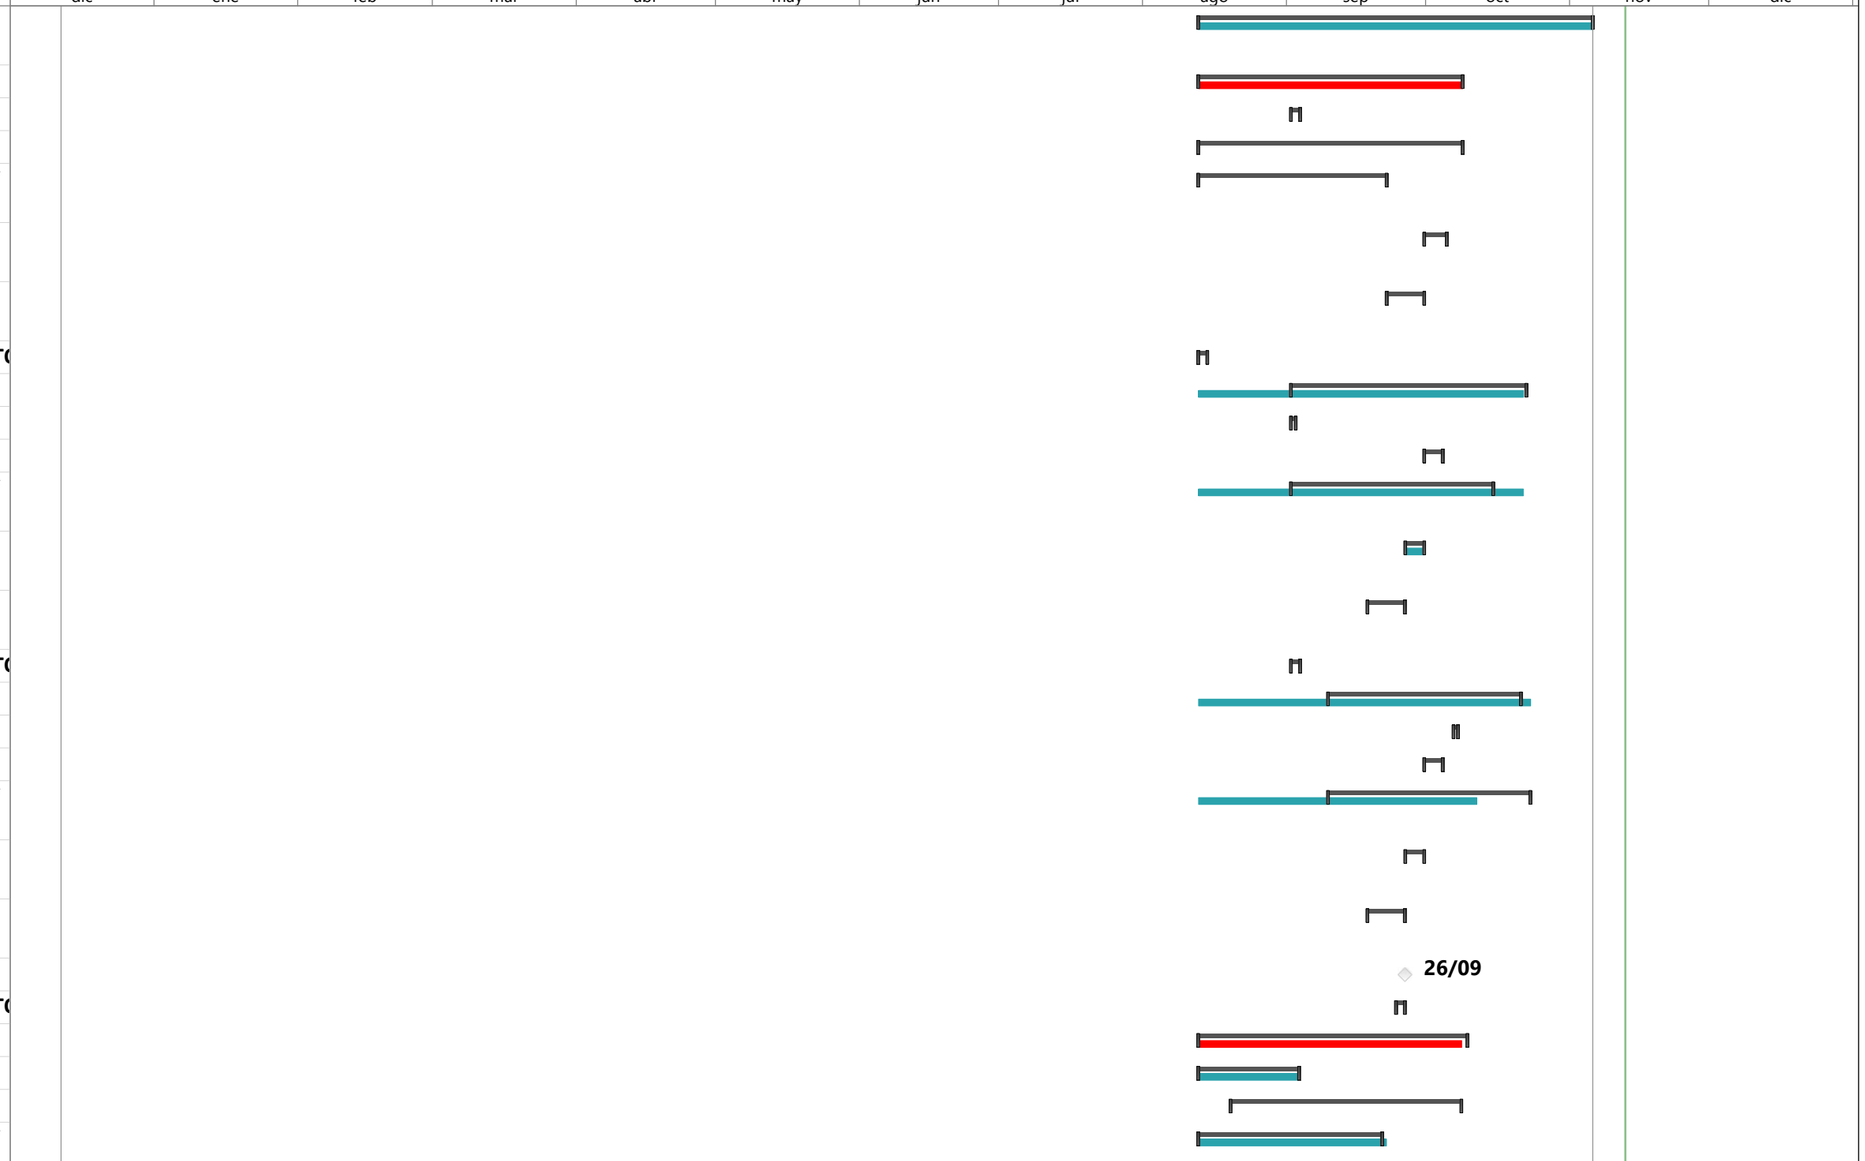


Proyecto: Cubiertas placas carm
Fecha: mié 13/11/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	

Jorge Lopez Elejalde
Director de Obra ICPB

Guillermo León Gómez Rendón
Director de Interventoria Innova Global S.A.S

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea
93		**INSTALAR LAS REDES HIDROSANITARIAS**
98		**CONSTRUIR LAS CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES**
101		**PINTAR Y DEMARCAR ELEMENTO**
103		**PLACA SANTA INES**
104		**PRELIMINARES.**
110		**CIMENTACIÓN.**
117		**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICAS.**
125		**INSTALAR LAS REDES HIDROSANITARIAS**
130		**CONSTRUIR LAS CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES**
133		**PINTAR Y DEMARCAR ELEMENTO**

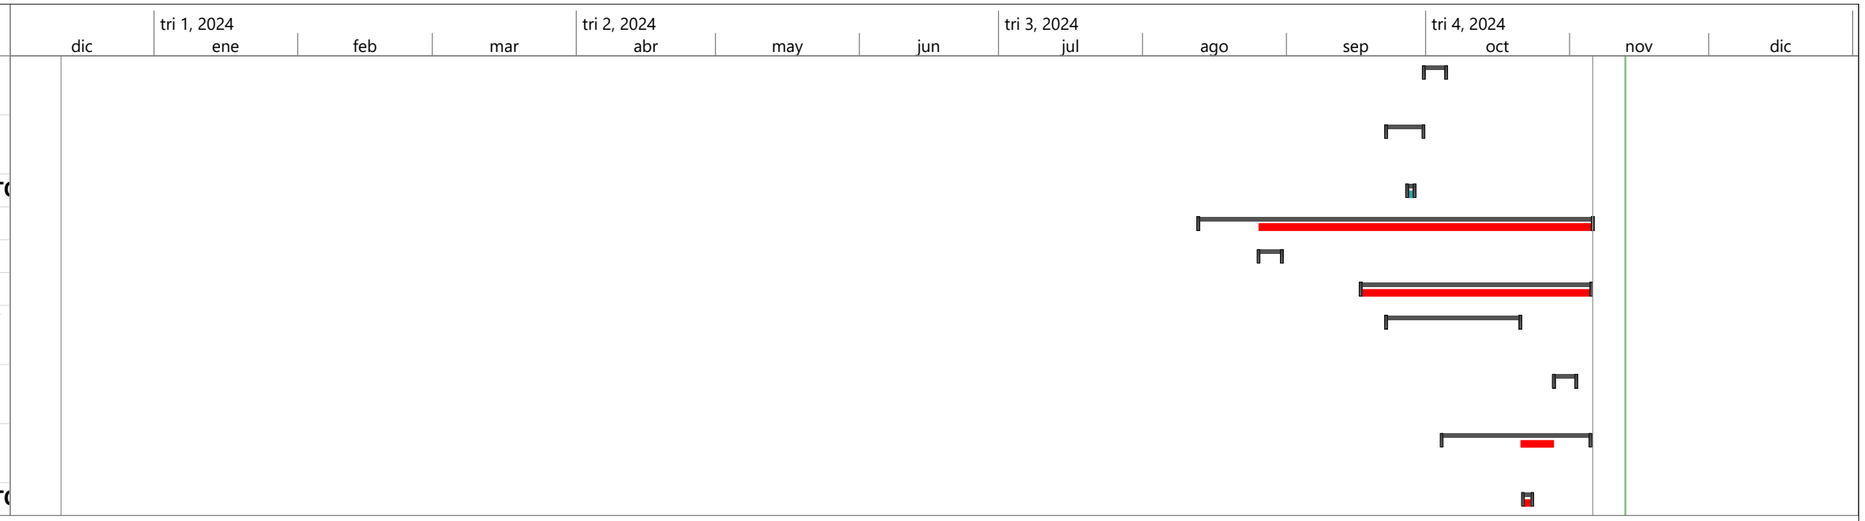

Proyecto: Cubiertas placas carm
Fecha: mié 13/11/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	

Jorge Lopez Elejalde
Director de Obra ICPB

Guillermo León Gómez Rendón
Director de Interventoria Innova Global S.A.S
