
CRONOGRAMA - AV. CIUDAD DE CALI, TRAMO DESDE AV. VILLAVICENCIO HASTA AV. MANUEL CEPEDA VARGAS - GRUPO 3

Id	EDT	ACTIVIDAD	PLAZO
1	1	AV. CIUDAD DE CALI, TRAMO DESDE AV. VILLAVICENCIO HASTA AV. MANUEL CEPEDA VARGAS - GRUPO 3	28 MESES
2	1.1	INICIO DEL PROYECTO	HITO
3	1.2	PRELIMINARES	6 MESES
4	1.3	OBRA	22 MESES
5	1.3.1	INICIO OBRA	Hito
6	1.3.2	TRAMO AV. VILLAVICENCIO - AV. MANUEL CEPEDA VARGAS	21 meses
7	*1.3.2.1*	*INICIO TRAMO AV. VILLAVICENCIO - AV. MANUEL CEPEDA VARGAS*	*Hito*
8	1.3.2.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	2 meses
9	1.3.2.3	CALZADA ORIENTAL	6 meses
10	1.3.2.3.1	CONSTRUCCIÓN REDES HÚMEDAS	2½ meses
11	1.3.2.3.1.1	EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	1 mes
12	1.3.2.3.1.2	RELLENOS	1½ meses
13	1.3.2.3.1.3	RED DE ACUEDUCTO	1 mes
14	1.3.2.3.1.4	RED DE ALCANTARILLADO	1 mes
15	1.3.2.3.2	CONSTRUCCIÓN REDES SECAS	4 meses
16	1.3.2.3.2.1	EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	1 mes
17	1.3.2.3.2.2	RELLENOS	2½ meses
18	1.3.2.3.2.3	REDES ELÉCTRICAS	2 meses
19	1.3.2.3.2.4	REDES DE TELECOMUNICACIONES	1½ meses
20	1.3.2.3.2.5	REDES DE GAS	1½ meses
21	1.3.2.3.3	TAQUILLA Y CICLO-ESTACIONES	2 meses
22	1.3.2.3.4	ESPACIO PÚBLICO (Calzada Oriental)	3 meses
23	1.3.2.3.5	CONSTRUCCIÓN VÍAS	2 meses
24	1.3.2.3.6	SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	2 meses
25	1.3.2.4	CALZADA OCCIDENTAL	6 meses
26	1.3.2.4.1	CONSTRUCCIÓN REDES HÚMEDAS	2½ meses
27	1.3.2.4.1.1	EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	1 mes
28	1.3.2.4.1.2	RELLENOS	1½ meses
29	1.3.2.4.1.3	RED DE ACUEDUCTO	1 mes
30	1.3.2.4.1.4	RED DE ALCANTARILLADO	1 mes
31	1.3.2.4.2	CONSTRUCCIÓN REDES SECAS	4 meses
32	1.3.2.4.2.1	EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	1 mes
33	1.3.2.4.2.2	RELLENOS	2½ meses
34	1.3.2.4.2.3	REDES ELÉCTRICAS	2 meses
35	1.3.2.4.2.4	REDES DE TELECOMUNICACIONES	1½ meses
36	1.3.2.4.2.5	REDES DE GAS	1½ meses
37	1.3.2.4.3	TAQUILLA Y CICLO-ESTACIONES	2 meses
38	1.3.2.4.4	ESPACIO PÚBLICO (Calzada Occidental)	3 meses
39	1.3.2.4.5	CONSTRUCCIÓN VÍAS	2 meses
40	1.3.2.4.6	SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	2 meses
41	1.3.2.4.7	CICLORUTA	1½ meses
42	1.3.2.5	CORREDOR BRT	5 meses
43	1.3.2.5.1	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS	4½ meses
44	1.3.2.5.2	SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	1½ meses
45	1.3.2.6	CONSTRUCCIÓN ESTACIONES	9½ meses
46	1.3.2.6.1	ESTACIÓN BIBLIOTECA PATIO BONITO	6 meses
47	1.3.2.6.1.1	CIMENTACIÓN	2½ meses
48	1.3.2.6.1.2	ESTRUCTURAS	3 meses
49	1.3.2.6.1.3	ACABADOS	2 meses
50	1.3.2.6.2	ESTACIÓN EL TINTAL	6 meses
51	1.3.2.6.2.1	CIMENTACIÓN	2½ meses
52	1.3.2.6.2.2	ESTRUCTURAS	3 meses
53	1.3.2.6.2.3	ACABADOS	2 meses
54	*1.3.2.7*	*FIN TRAMO AV. VILLAVICENCIO - AV. MANUEL CEPEDA VARGAS*	*Hito*
55	1.3.3	FIN OBRA	Hito
56	1.3.4	ETAPA FINAL DE RECIBO DE OBRA	1 MES
57	1.4	ADECUACIÓN DE DESVÍOS	21 meses
58	1.5	FIN PROYECTO	HITO

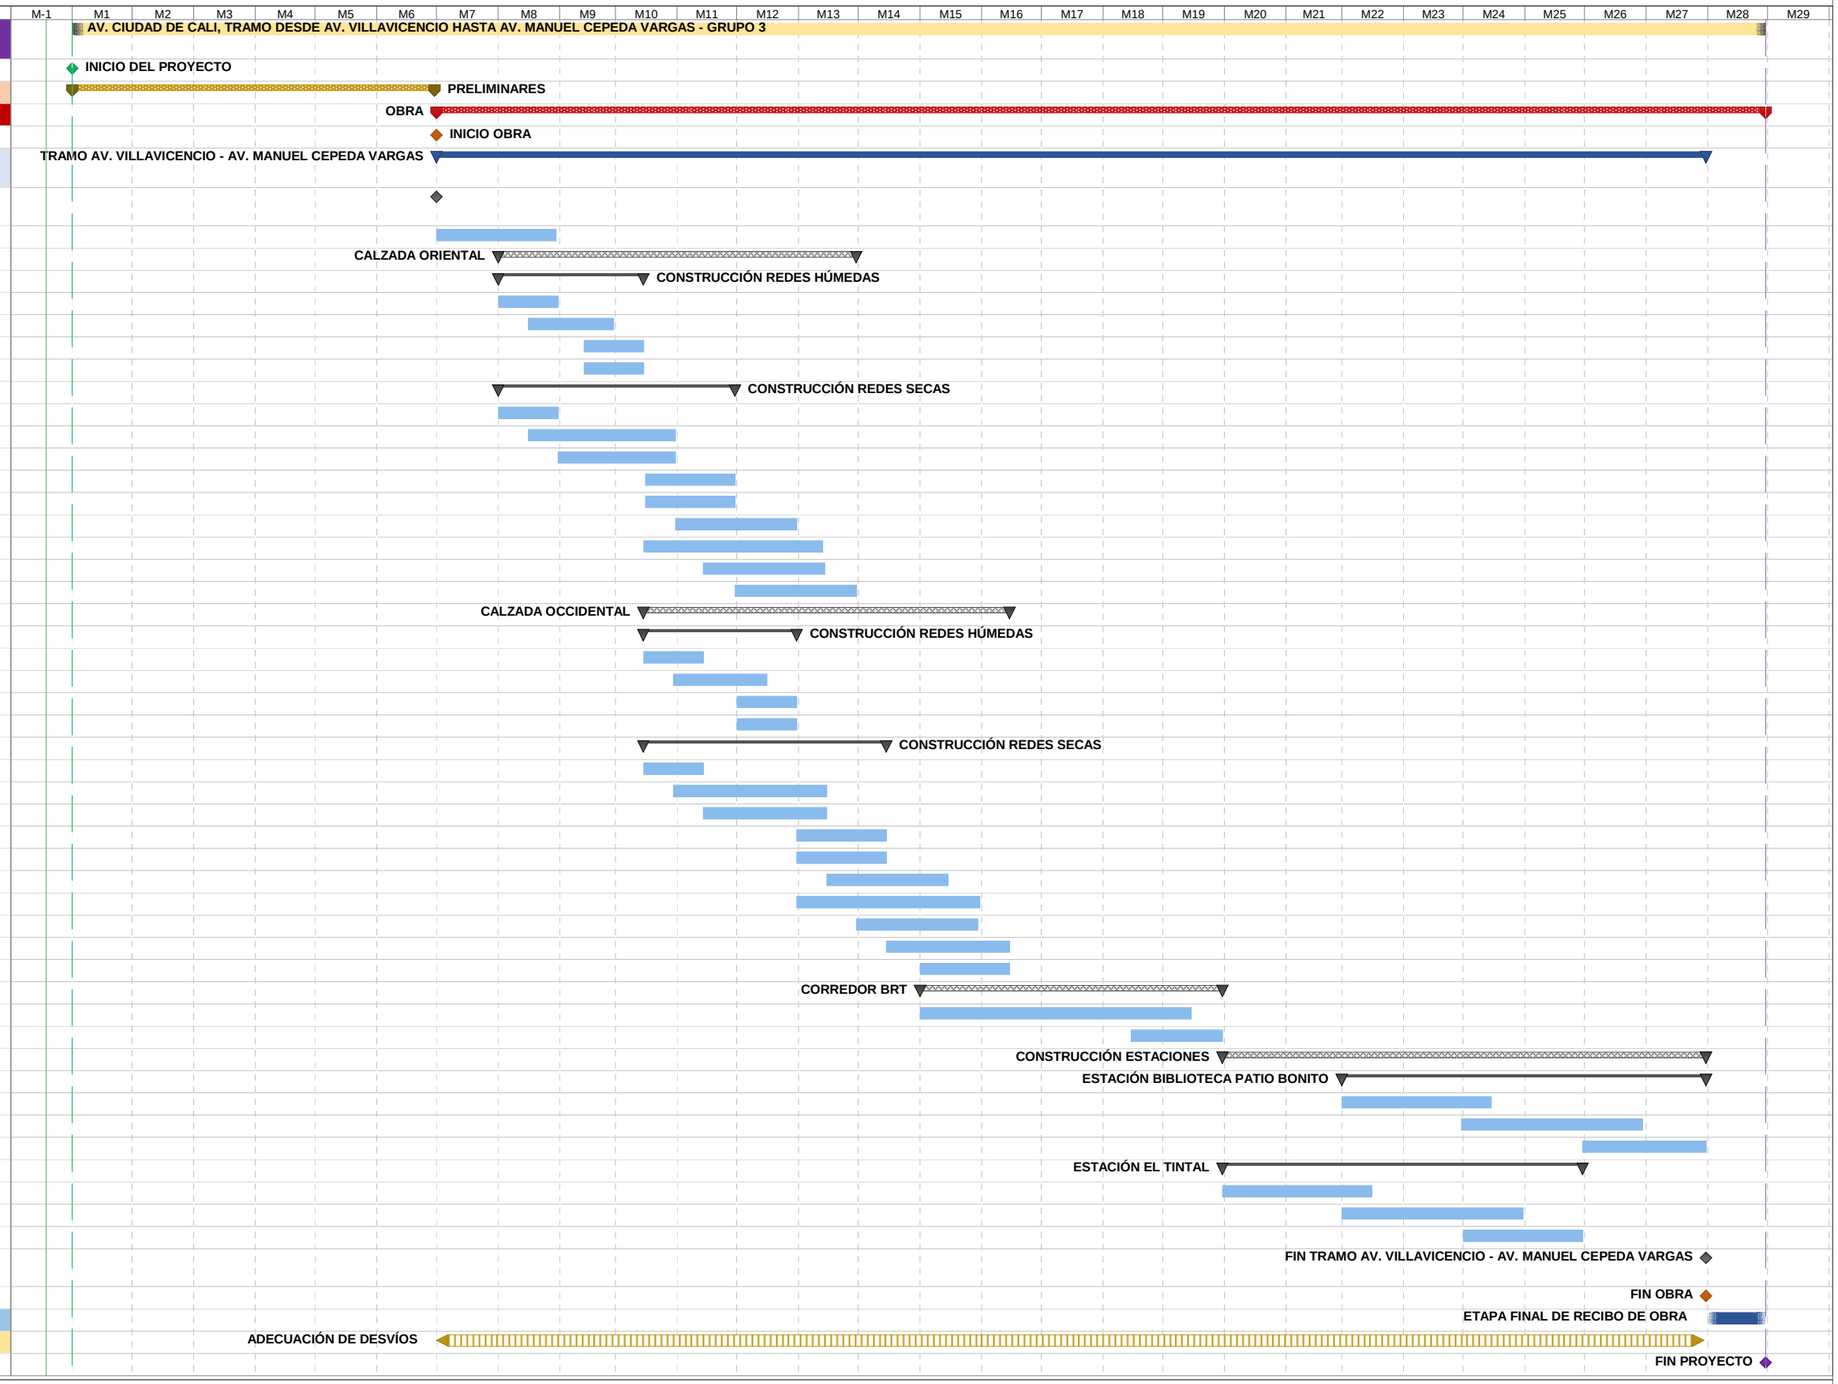

Proyecto: AV. CD. de CALI T1 - Grupo 3
Plazo: 28 MESES

Tarea	Resumen	Hito externo	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	Sólo fin	Progreso manual	
División	Resumen del proyecto	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Tareas externas	Hito inactivo	Sólo duración	Sólo el comienzo	Progreso		

Cronograma Ilustrativo
