Bogotá D.C. 20 de noviembre de 2024.


Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA
CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
Ordenador del Gasto
Bogotá

Ref.: Solicitud de Prorroga contrato 127-00-A-COFAC-CEGOT-2024
Objeto: ADQUISICIÓN REPUESTOS AYUDAS VISUALES PARA LA NAVEGACION AÉREA

Señores Oficiales reciban un cordial saludo.

FIDEL ANDRES MANRIQUE MORALES, identificado con C.C. No. 1.032.406.383 de Bogotá D.C. y en pleno uso de facultades legales como representante legal del **COLDEGRAP SAS** identificado con el R.U.T. No. 901.258.553-8, de manera formal y ajustado a los parámetros normativos establecidos en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 por medio del presente Oficio se solicita la modificación de la CLÁUSULA TRES - PLAZO DE EJECUCIÓN. Suscrito por las Partes, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución contractual en mínimo 62 DIAS en atención al contrato referencia, de acuerdo con la reunión virtual realizada el día 20 de noviembre donde explicamos el avance contractual ítem por ítem y teniendo en cuenta la importancia del proyecto para la FAC, elevamos a la entidad la necesidad de prórroga del Contrato basado en los siguientes hechos:

1. Los repuestos de ayudas visuales que solicito la entidad, son elementos especiales que no son de fabricación nacional, y son elementos de importación, los distribuidores con las que trabajamos a nivel internacional y con las que íbamos a realizar las compras de los elementos del siguiente contrato nos manifestaron que los tiempos de entrega de los elementos se encuentran para el primer trimestre del año 2025 basados en el desplazamiento de la fábrica de Osram de Alemania a México, esto es una situación que no podemos controlar sin embargo lo descrito anteriormente lo ponemos en evidencia mediante los siguientes correos enviados a nuestro distribuidor ESM SOLUTIONS:

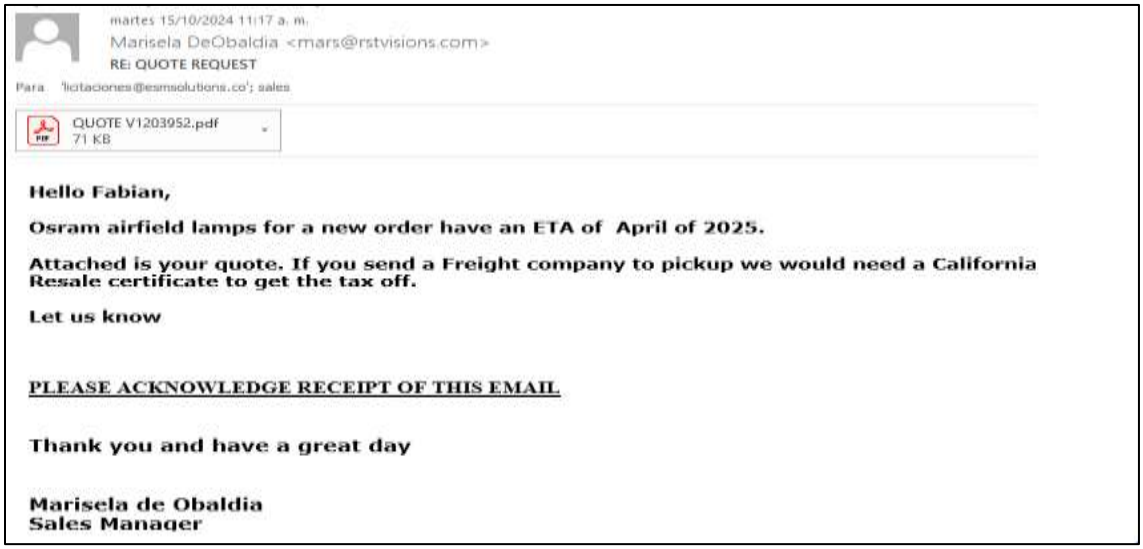

martes 15/10/2024 11:17 a. m.
Marisela DeObaldia <mars@rstvisions.com>
RE: QUOTE REQUEST
Para 'licitaciones@esmsolutions.co'; sales

QUOTE V1203952.pdf
71 KB

Hello Fabian,

Osram airfield lamps for a new order have an ETA of April of 2025.

Attached is your quote. If you send a Freight company to pickup we would need a California Resale certificate to get the tax off.

Let us know

PLEASE ACKNOWLEDGE RECEIPT OF THIS EMAIL

Thank you and have a great day

Marisela de Obaldia
Sales Manager



Responder Responder a todos Reenviar
martes 15/10/2024 11:23 a. m.
Dale Butler <Dale@kennedywebster.com>
RE: QUOTE REQUEST
Para licitaciones@esmsolutions.co
Respondió a este mensaje el 30/10/2024 11:42 p. m..

Hello Mr. Mikan,

Regretfully most of the Osram airfield lamps are on back order and Osram does not expect to have these in house to ship until sometime in January 2025.

Again we can quote the other airfield lamps you requested, but they would not be available until late January 2025.

Thank you,

Dale Butler
Kennedy Webster Electric

Responder Responder a todos Reenviar

martes 15/10/2024 1:43 p. m.

Sales . <support@bulbamerica.com>

Re: QUOTE REQUEST

Para licitaciones@esmsolutions.co

Respondió a este mensaje el 16/10/2024 11:28 a. m..

Hello,

Thank you for your inquiry. We only have item 58953 and the rest are currently available. ETA will be in April of 2025.

Thank you for choosing BulbAmerica!

Best Regards,
Triza
Sales Department
Customer Service Representative
eBulb Inc.

Responder Responder a todos Reenviar

martes 15/10/2024 5:46 a. m.

Proflamps support <support@proflamps.com>

Re: Solicitud de Cotización

Para licitaciones@esmsolutions.co

Mensaje reenviado el 16/10/2024 11:22 a. m..
Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Dear Fabian ,

Thank you for your interest in Proflamps.com!

Due to Osram moving their factory there production has stopped and will resume in the next couple of weeks.

This has resulted in a big load of backorders causing the delivery time to be in Q1 of 2025.

I can offer their competitor Narva who can deliver in 6-8 weeks after an order has been placed.

Please let me know if you are interested in Narva or exclusively in Osram so I can share our quote with you.

Kind regards / Met vriendelijke groet,

Bob Lont

PROFLAMPS
Bob Lont| Sales director| Proflamps.com

En los correos expuestos se puede evidenciar que las fábricas tienen entregas estimadas para el año 2025, sin embargo no dependimos 100% de estos distribuidores y buscamos otros proveedores y que cumplen con lo solicitado y optamos por realizar la gestión por medio de otras compañías para reducir en su gran mayoría la entrega de la totalidad de los elementos buscando el mejor beneficio tanto para nuestra empresa como para la fuerza aérea y no llevar la entrega de todos los elementos hasta el próximo año como lo indicaban.

Dado lo anterior queremos dejar la constancia de que todos los elementos ya fueron comprados como lo pueden evidenciar en la Orden de compra 2412, sin embargo, algunos se encuentran en tránsito, otros en fabricación y otros ya están disponibles para entrega inmediata.

La siguiente lista se detalla el estado actual de los elementos y las fechas probables de entrega

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA MAXIMA ENTREGA
1	BOMBILLO, LAMP, INCANDESCENT 45W	Unidad	600	31 ENERO 2025
2	LAMP HALOGEN 200 W, 6.6 AMP. PK30D	Unidad	40	20 DICIEMBRE 2024
3	LAMP, 150-WATT PULSE-START	Unidad	30	20 DICIEMBRE 2024
4	BOMBILLO HALOGENO 120 W, 6.6 A	Unidad	30	20 DICIEMBRE 2024
5	BOMBILLO PAR-38 LED 17 WATT	Unidad	5	20 DICIEMBRE 2024
6	EMPALME PRIMARIOS PLUG L- 823	Unidad	360	20 DICIEMBRE 2024
7	TUNGSTEN- HALOGEN LAMP 105W	Unidad	30	20 DICIEMBRE 2024
8	TUNGSTEN- HALOGEN LAMP 62W	Unidad	30	20 DICIEMBRE 2024
9	TUNGSTEN- HALOGEN LAMP 48W	Unidad	30	20 DICIEMBRE 2024
10	AIRPORT BEACON MODEL AB-1000F / AB-1000FA (CLEAR LENS)	Unidad	3	20 DICIEMBRE 2024
11	AIRPORT BEACON MODEL AB-1000F / AB-1000FA (GREEN LENS)	Unidad	3	20 DICIEMBRE 2024
12	LAMP BRACKET (QUARTZ LAMP SOCKET)	Unidad	268	20 DICIEMBRE 2024

Por las razones mencionadas y conforme a las diferentes directrices normativas y técnicas que son aplicables en este caso, esperamos la aceptación de la modificación del CONTRATO y como indicamos ya todos los elementos ya se encuentran pagos, solamente estamos esperando que algunos lleguen a Colombia y otros terminen la fabricación.

Sin embargo, el 100% de los elementos son de procedencia extranjera y sometidas a procesos de Importación dichas circunstancias son externas, sin embargo revisando la matriz de riesgos de adquisición del contrato, el riesgo numero 4 esta así:

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	RESTRASOS EN EL TRASNPORTE (EXPORTACION E IMPORTACION) DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR.	AFECTA EL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS.	2	4	4	5	CONTRATISTA	ACTUACION ADMINISTRATIVA COMUNICACIÓN ENTRE EL SUPERVISOR Y EL CONYTRATISTA PARA AVANCES DE IMPORTACION DE ELEMENTOS.	1	4	4	UNICA VEZ	NO	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	LIQUIDACION DEL CONTRATO	INFORMES DE SUPERVISION	UNICA VEZ


De acuerdo a la matriz, se puede evidenciar que los elementos de importación y exportación son elementos de prioridad alta donde claramente podemos realizar tratos especiales por que se depende directamente de un fabricante o sus correspondientes distribuidores.

De acuerdo a lo anterior, y dadas las condiciones de la importación de los elementos del presente contrato, solicitamos a la entidad una prórroga preventiva del contrato por 62 días, hasta el 31 de enero de 2025 para no incurrir en incumplimiento y así poder lograr el cumplimiento contractual y finalidad del contrato, con lo anterior lo ideal es realizar entregas parciales a medida que se realice el debido proceso de aduana y antes de los 62 días para que se pueda hacer la entrega final en un tiempo prudente y preventivo para ejecutar el contrato al 100% y a satisfacción de la entidad y la supervisión del contrato tal como lo mencionamos arriba.

Aclaramos que la solicitud de prórroga solicitada la **hacemos de forma general para todos los ítems, como lo expusimos ya que en el contrato no permite entregas parciales de los elementos**, tal como lo describimos en la tabla anterior, con la aceptación de las entregas parciales podremos hacer entrega de lo que ya está listo.

Como pueden ver en la siguiente imagen, que nos comparte nuestro proveedor ESM SOLUTIONS, los ítems 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9, ya se encuentran en tránsito Bogota por DHL y se iniciara el correspondiente tramite de nacionalización y pago de impuestos lleguen durante la última semana

de noviembre a Colombia, pero su entrega máxima seria 20 de diciembre como lo indicamos en la tabla anterior.

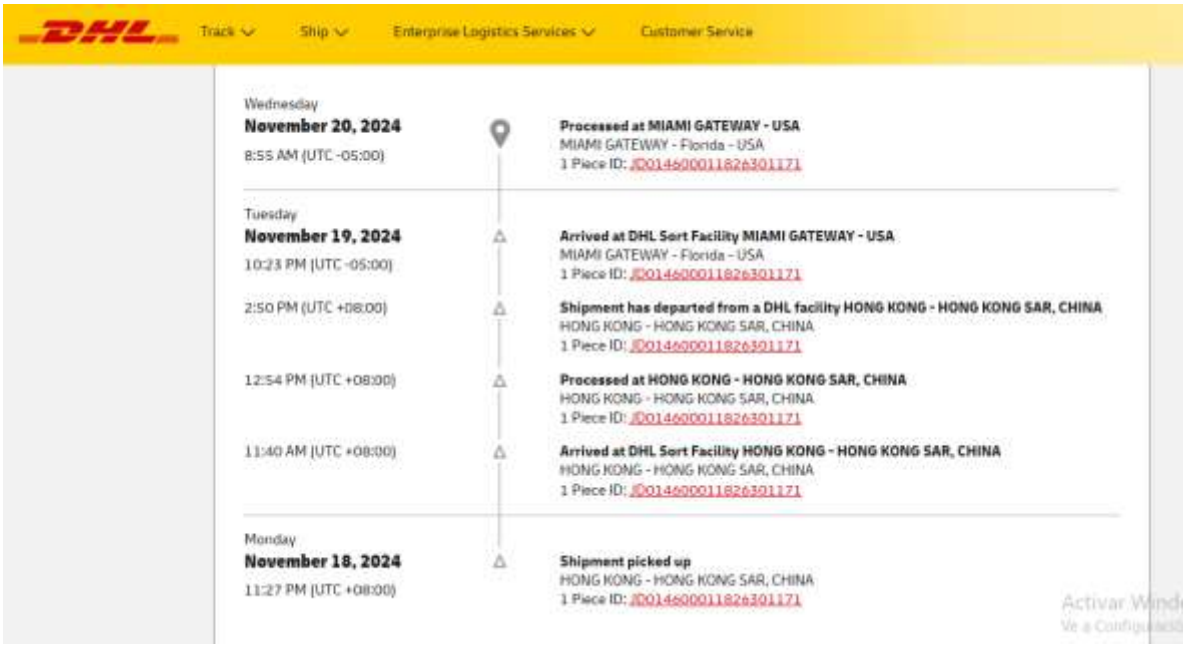

Para el ítem faltante el 1, son los que tienen un tiempo de entrega más largo y por tal razón amerita la sustentación anterior. A mas tardar el 31 de enero del 2025

De acuerdo a lo anterior, y dadas las condiciones de la importación de los elementos del presente contrato, solicitamos a la entidad una prórroga o suspensión preventiva del contrato por 62 días, hasta el 31 de enero de 2025, además de la entrega parcial, para no incurrir en incumplimiento y así poder lograr el cumplimiento contractual y finalidad del contrato.

Agradecemos la atención prestada

Atentamente

Nombre del Proponente	COLDEGRAP S.A.S
Nombre del representante legal	FIDEL ANDRES MANRIQUE MORALES
C. C.	1.032.406.383 de Bogotá D.C
Dirección de correo	Calle 1B No. 53ª-47
Correo electrónico	gerencia@coldegrap.co
Ciudad	BOGOTÁ D.C.

Firma Representante Legal
