
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo
1		**CONTRATO No. 4151.010.26.1.0745-2024 LOTE 3**	**$ 3.306.842.731,00**	**84 días**	**mié 21/08/24**
2		**ETAPA DE PRECONSTRUCCION**	$ 0,00	**14 días**	**mié 21/08/24**
3		**ETAPA DE CONSTRUCCION**	**$ 3.306.842.731,00**	**72 días**	**mié 4/09/24**
4		**TRAMO 68 - CALLE 4 ENTRE CARRERA 5 HASTA CARRERA 10**	**$ 57.005.872,00**	**15 días**	**mié 4/09/24**
15		**TRAMO 71 - CALLE 1 ENTRE CARRERA 4 HASTA CARRERA 10**	**$ 195.679.972,00**	**12 días**	**lun 9/09/24**
31		**TRAMO 67 - CARRERA 4 ENTRE CALLE 1 HASTA CALLE 3**	**$ 293.719.419,00**	**64 días**	**vie 13/09/24**
48		**TRAMO 61 - CARRERA 12 ENTRE CALLE 3 HASTA CALLE 3 OESTE**	**$ 316.439.654,00**	**44 días**	**lun 16/09/24**
63		**TRAMO 62 - CARRERA 10 ENTRE CALLE 1 HASTA CALLE 3 OESTE**	**$ 148.268.722,00**	**24 días**	**mié 9/10/24**
81		**TRAMO 70 - CALLE 3 OESTE ENTRE CARRERA 4 HASTA CARRERA 10**	**$ 6.821.317,00**	**6 días**	**lun 23/09/24**
87		**TRAMO 72 - CALLE 2 ENTRE CARRERA 4 HASTA CARRERA 12**	**$ 158.070.947,00**	**18 días**	**mié 18/09/24**
99		**TRAMO 69 - CALLE 3 ENTRE CARRERA 4 HASTA CARRERA 12**	**$ 56.318.161,00**	**12 días**	**mar 24/09/24**
115		**TRAMO 66 - CARRERA 5 ENTRE CALLE 2 HASTA CALLE 4**	**$ 31.727.289,00**	**14 días**	**mar 1/10/24**
130		**TRAMO 65 - CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 HASTA CALLE 4**	**$ 57.468.932,00**	**12 días**	**mié 9/10/24**
141		**TRAMO 64 - CARRERA 9 ENTRE CALLE 2 HASTA CALLE 4**	**$ 33.421.114,00**	**15 días**	**jue 17/10/24**
156		**TRAMO 63 - CARRERA 10 ENTRE CALLE 3 HASTA CALLE 4**	**$ 10.552.592,00**	**7 días**	**vie 25/10/24**
163		**TRAMO 26 - AV 9 N ENTRE AV 9A N HASTA CALLE 18 N**	**$ 953.691.809,00**	**21 días**	**lun 23/09/24**
178		**TRAMO 39 - AV 8 N ENTRE CALLE 21 N HASTA AV 4 N**	**$ 927.118.665,00**	**20 días**	**mar 15/10/24**
193		**TRAMO 28 - AV 9 N ENTRE CALLE 18 N HASTA CALLE 21 N**	**$ 60.538.266,00**	**8 días**	**jue 17/10/24**
205		**FECHA DE FINALIZACION DE CONTRATO**	**$ 0,00**	**0 días**	**mar 26/11/24**

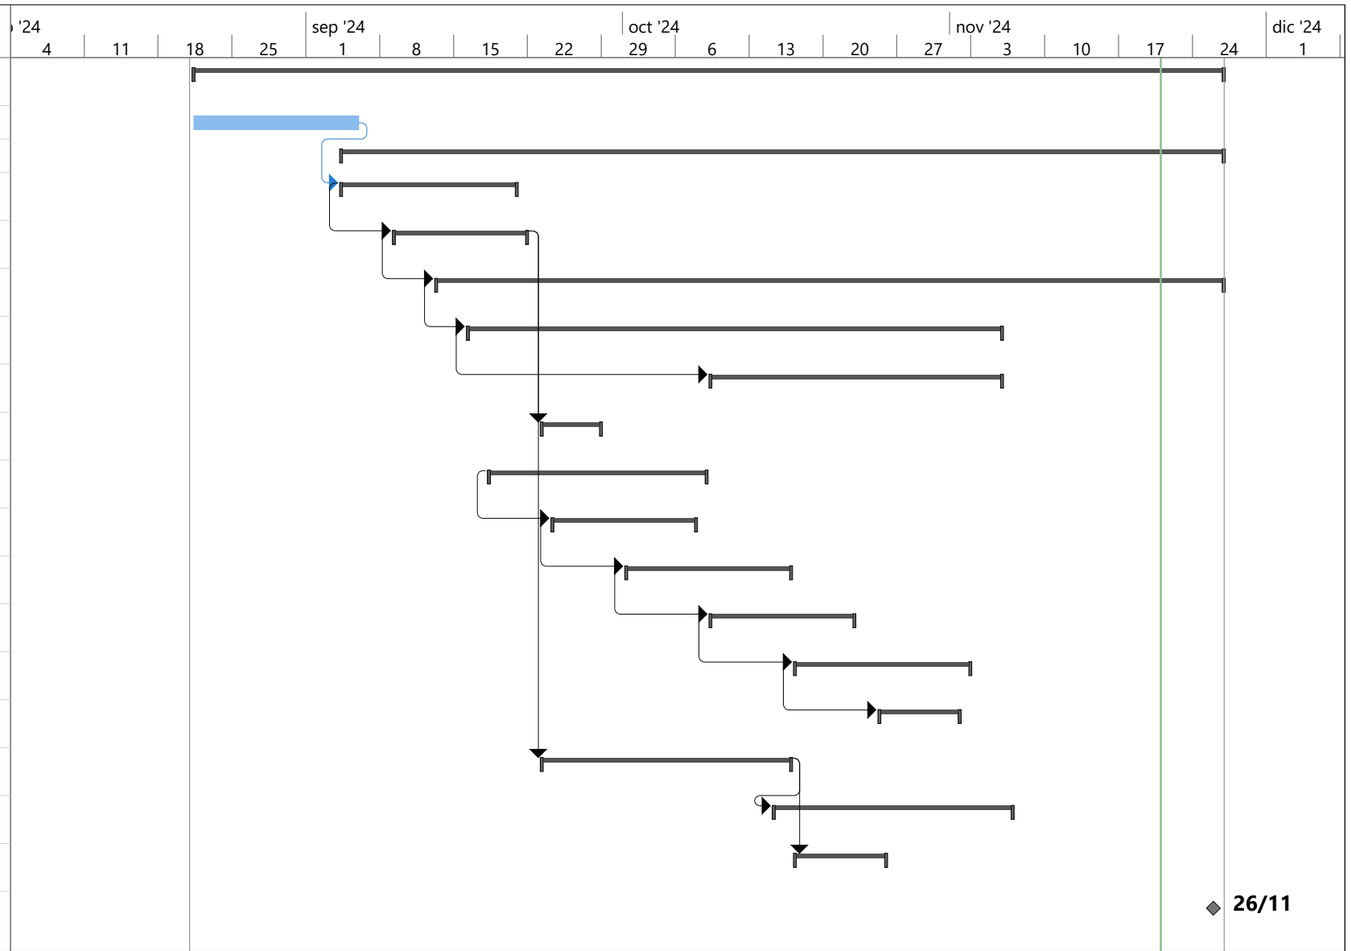

Proyecto: Programacion
Fecha: jue 21/11/24

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	
