AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

HOJA CONTROL DOCUMENTAL

131-GDC-FR-001-V04
09/09/2024

SERIE:	120-10
SUBSERIE:	120-10-05
No. CARPETA:	67
DESCRIPCIÓN CARPETA:	**CONSORCIO HALCON** MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE EL CENTRO EL POBLADO DE VERACRUZCON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 MUNICIPIO DE CUMARAL; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE C. P PIÑALITO CON EL C. P. SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREADA EL TURURUY DESDE EL PUENTE CAÑO CARAMBAS - HASTA EÑ CRUCE CON LA VIA SAN LORENZO- PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA - EN EL DEPARTAMENTO DEL META **CONTRATO N° 775 22 PY 978-21 PARC N°4 C1 C67**

ITEM	DESCRIPCIÓN TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS
488	LISTA DE CHEQUEO	12390-12391
489	ACTA PAGO DE OBRA PARCIAL N°4	12392-12395
490	MEMORIA DE CALCULO OBRA	12396-12443
491	INFORME DE OBRA	12444-12464
492	BITACORA DE OBRA	12465-12481
493	INFORME PLAN DE INVERSION ANTICIPO	12482-12516
494	FACTURA	12517-12518
495	CERTIFICADO CUENTA BANCARIA	12519-12520
496	INFORMACION CONTADOR	12521-12523
497	INFORME INTERVENTORIA	12524-12549
498	ACTA RESUMEN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO OBRA E INTERVENTORIA	12550-12572
499	ACTA CONTROL Y SEGUIMEINTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA	12573-12595
500	RETEICA	12596-12597
501	CARTA AIM PAGO	

Fecha de Elaboración:		Nombre del Archivo en el SIGA	775 22 PY 978-21 PARC N°4 C1 C67

Firma		Firma	
Nombre:	**DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA**	Nombre:	**AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
Cargo:	DIRECTOR DE OBRA	Cargo:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

LISTA DE CHEQUEO CONTRATO DE OBRA
PAGO PARCIAL

112-ECP-FR-173-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

PAGO PARCIAL	CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A
PLAN DE COBROS OBRA (Aplica en el primer pago)	112-ECP-FR-009	N/A
ACTA PAGO DE OBRA	112-ECP-FR-029	SI
MEMORIA DE CALCULO OBRA (Cantidades totales Ejecutadas por cada item contractual)	112-ECP-FR-027	SI
INFORME DE OBRA	112-ECP-FR-013	SI
BITACORA DE OBRA (Copia)	112-ECP-FR-022	SI
INFORME PLAN DE INVERSION ANTICIPO OBRA (Si Aplica)	112-ECP-FR-030	SI
FACTURA	-	SI
CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA (Vigencia 30 Dias)	-	SI
COPIA DE TARJETA PROFESIONAL Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE CONTADORES DE OBRA E INTERVENTORIA	-	SI
INFORME INTERVENTORÍA	112-ECP-FR-017	SI
ACTA RESUMEN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO OBRA	112-ECP-FR-018	SI
ACTA RELACIÓN PERSONAL OBRA.	112-ECP-FR-008	NO
ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA. Del periodo a realizar el cobro, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal.	112-ECP-FR-021	SI
CERTIFICADO DONDE INDIQUE CUAL ES EL PORCENTAJE (%) Y EL VALOR EJECUTADO DEL PROYECTO EN CADA MUNICIPIO. Lo anterior firmado por el Representante Legal de la Interventoria con el fin de calcular la retencion de ICA	-	SI
VERIFICACIÓN EN SIGA: ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA 112-ECP-FR-021. Desde el inicio hasta la fecha de cobro, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal.	-	SI
CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	112-ECP-FR-019	NO
ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL	112-ECP-FR-020	NO
ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO (Elabora el Contratista)	130-GFI-FR-017	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12390

LISTA DE CHEQUEO CONTRATO DE OBRA
PAGO PARCIAL

112-ECP-FR-173-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

PAGO PARCIAL	CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A
VERIFICACIÓN EN SIGA - Cargue de INFORME MENSUAL OBRA (Desde el inicio hasta la fecha de cobro, Acta de vecindad, Plan de manejo de trafico, formato entrega de dotación y elementos de protección personal, implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, informe implementación PMA, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA (Desde el inicio hasta la fecha de cobro, Acta de resumen de ensayos y pruebas de laboratorio, control de seguridad industrial, acta de seguimiento ambiental, acta control y seguimiento de seguridad social y parafiscal obra, bitacora, informe de especialistas) y todos los demas procedimientos o actos administrativos realizados en cumplimiento de la ejecución del proyecto. Todos los documentos de soporte del pago parcial, deben ser digitalizados y cargados a la carpeta del contrato de obra que se encuentra en la plataforma SIGA, en cumplimiento de la Resolución 82 del 6 de Abril de 2017.	Anexar Pantallazo	SI
VERIFICACIÓN EN GESPROY -SGR - De conformidad con la Circular 062 de 2013 del DNP, con el objeto de facilitar la gestión y monitoreo a la ejecución de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR ; el responsable del proyecto debera realizar el registro de la información de ejecución con el detalle definido en cada uno de los componentes de la plataforma y presentar a la AIM el reporte del estado actual del proyecto. (Anexar Pantallazo)	-	SI
ENTREGA DOCUMENTACION AL RESPECTIVO RESPONSABLE DE ARCHIVO		SI

NOTAS

*TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES, IMPRESIÓN CLARA Y A COLOR, SERÁN RADICADOS ÚNICAMENTE POR EL SUPERVISOR A LA GERENCIA DONDE DEBEN ESTAR FOLIADOS 1-200 EN CARPETAS DE CONFORMIDAD A LA LEY DE ARCHIVO Y CARGADOS A LAS PLATAFORMAS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD .

*LA LISTA DE CHEQUEO DEBE IR FIRMADA POR LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROCESO, COMO INDICADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AQUI ESTABLECIDOS.

***ANEXAR PANTALLAZO DEL CARGUE A SECOP Y CARGUE A SIGA**

OBSERVACIONES

Firma
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
DIRECTOR OBRA
M.P. 25202095108

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
DIRECTOR INTERVENTORIA
M.P. 19202-82149

Firma
Nombre: EDWIN LEONARDO GUTIERREZ RODRIGUEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE INTERVENTORIA DEL PROYECTO BPIN 20211301010978
M.P. A25232003 - 86049333

Firma
Nombre: GINA TATIANA ELAICA NIETO
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA DEL PROYECTO BPIN 20211301010978
M.P. 25202-193880 CND

Firma
Nombre: ANGELLY XAMIRA CHEEDIAK
RESPONSABLE DEL ARCHIVO
M.P.

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Nota: Una vez cumplido el proceso de verificación por cada responsable se debe firmar la lista de chequeo.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12391

CONSORCIO HALCÓN

ACTA PAGO DE OBRA

PARCIAL No 4

12392

ACTA PAGO DE OBRA

112-ECP-FR-029-V04
09/09/2024

CONTRATO N°	0775 DE 2022	**PROYECTO N°**	20211301010978
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	4	**PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:**	1/11/2024 a 20/11/2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL", "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	**OBJETO PROYECTO:**	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META"
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 112.964.569.993,00	**VALOR TOTAL DEL PROYECTO:**	$ 58.767.216.954,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCON	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**	0250 de 2023
NIT:	901.666.148-8	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO INTER AIM
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	gerencia@camelinteriberia.com	**CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:**	consorciointeraim@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:	GINA TATIANA ELAICA NIETO	**APOYO A LA SUPERVISION:**	EDWIN LEONARDO GUTIERREZ RODRIGUEZ
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointeraim@gmail.com	**CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°**	263- 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	12/07/2023	**FECHA PRESENTE ACTA:**	22 NOV. 2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 01 de Fecha 19/11/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
1	EXCAVACIONES													
1.1	EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	M3	1.907,00	$ 63.680,00	$ 121.437.760,00	41.382,15	$ 2.635.215.073,00	1.894,00	$ 120.609.920,00	28.928,10	$ 1.842.141.408,00	30.822,10	$ 1.962.751.328,00	74,48%
1.2	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE)	M3	7.034,70	$ 48.697,00	$ 342.568.786,00	7.034,70	$ 342.568.786,00	1.446,43	$ 70.436.801,71	0,00	$ -	1.446,43	$ 70.436.801,71	20,56%
1.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	1.469.121,31	$ 1.879,00	$ 2.760.478.941,00	131.294,11	$ 246.701.628,00	45.505,99	$ 85.505.755,21	5.513,37	$ 10.359.622,23	51.019,36	$ 95.865.377,44	38,86%
	SUBTOTAL				$ 3.224.485.487,00		$ 3.224.485.487,00		$ 276.552.476,92		$ 1.852.501.030,23		$ 2.129.053.507,15	
2	RELLENOS													
2.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECANICA CON EQUIPO PESADO	M3	175.074,00	$ 51.548,00	$ 9.024.714.552,00	222.792,89	$ 11.484.527.846,00	143.491,80	$ 7.396.715.306,40	850,50	$ 43.841.574,00	144.342,30	$ 7.440.556.880,40	64,79%
2.2	GEOTEXTIL T 1700 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	154.000,00	$ 14.868,00	$ 2.289.672.000,00	154.000,00	$ 2.289.672.000,00	20.757,00	$ 308.615.076,00	6.623,00	$ 98.470.764,00	27.380,00	$ 407.085.840,00	17,78%
2.3	SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	32.498,00	$ 167.272,00	$ 5.436.005.456,00	32.498,00	$ 5.436.005.456,00	2.908,80	$ 486.560.793,60	0,00	$ -	2.908,80	$ 486.560.793,60	8,95%
2.4	BASE ESTABILIZADA CON EMULSION ASFLATICA BEE 3B. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR INCLUYE EMULSION.	M3	19.680,00	$ 552.999,00	$ 10.883.020.320,00	19.680,00	$ 10.883.020.320,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	9.891.520,60	$ 1.879,00	$ 18.586.167.207,00	8.533.287,43	$ 16.034.047.075,00	2.833.412,20	$ 5.323.981.523,80	811.428,72	$ 1.524.674.564,88	3.644.840,92	$ 6.848.656.088,68	42,71%
N.P	ITEMS NO PREVISTOS - RELLENOS													
N.P.2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P 6" RDE 21 200 PSI UNION PLATINO	ML	0,00	$ 170.647,00	$ 0,00	1,00	$ 170.647,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P 4" RDE 21 200 PSI UNION PLATINO	ML	0,00	$ 85.232,00	$ 0,00	501,70	$ 42.760.508,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P 3" RDE 21 200 PSI UNION PLATINO	ML	0,00	$ 53.307,00	$ 0,00	1,00	$ 53.307,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2,9	TUBERIA PVC PF + UAD 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	$ 18.706,00	$ 0,00	200,00	$ 3.741.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACIÓN EN PVC 6" UM	UN	0,00	$ 470.342,00	$ 0,00	1,00	$ 470.342,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACIÓN EN PVC 4" UM	UN	0,00	$ 233.529,00	$ 0,00	50,00	$ 11.676.450,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACIÓN EN PVC 3" UM	UN	0,00	$ 153.992,00	$ 0,00	1,00	$ 153.992,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2,13	VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE DE 6" JUNTA HIDRAULICA PVC. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0,00	$ 3.074.424,00	$ 0,00	1,00	$ 3.074.424,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2,14	VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE DE 4" JUNTA HIDRAULICA PVC. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0,00	$ 1.708.374,00	$ 0,00	1,00	$ 1.708.374,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2,15	VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE DE 3" JUNTA HIDRAULICA PVC. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0,00	$ 1.326.696,00	$ 0,00	1,00	$ 1.326.696,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2,16	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 66.071,00	$ 0,00	10,00	$ 660.710,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA PVC 6" X 4" UM	UN	0,00	$ 317.741,00	$ 0,00	1,00	$ 317.741,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCENTRICA PVC 4" X 3" UM	UN	0,00	$ 159.635,00	$ 0,00	1,00	$ 159.635,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC 3" UM	UN	0,00	$ 213.239,00	$ 0,00	1,00	$ 213.239,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC DE 4" UM	UN	0,00	$ 358.279,00	$ 0,00	10,00	$ 3.582.790,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2,21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC DE 6" UM	UN	0,00	$ 957.321,00	$ 0,00	1,00	$ 957.321,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2,22	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0-2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0,00	$ 132.522,00	$ 0,00	120,00	$ 15.902.640,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2,23	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERIAS	M3	0,00	$ 175.961,00	$ 0,00	15,00	$ 2.639.415,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1239

CONTRATO N°	0775 DE 2022				PROYECTO N°										
								20211301010978							
N.P.2.26	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	0,00	$ 89.634,00	$ 0,00	1,00	$ 89.634,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 46.219.579.535,00**		**$ 46.219.579.535,00**	0,00	**$ 13.515.872.699,80**	0,00	**$ 1.666.986.902,88**	0,00	**$ 15.182.859.602,68**	
3	**PAVIMENTO FLEXIBLE**													
3,1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	143.000,00	$ 5.557,00	$ 794.651.000,00	143.000,00	$ 794.651.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3,2	TRATAMIENTO MEDIANTE LECHADA ASFALTICA E=8 MM	M2	143.000,00	$ 14.066,00	$ 2.011.438.000,00	143.000,00	$ 2.011.438.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 2.806.089.000,00**		**$ 2.806.089.000,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
4	**SEÑALIZACION**													
4,1	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRIO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO	ML	66.000,00	$ 5.944,00	$ 392.304.000,00	66.000,00	$ 392.304.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
4,2	DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRIO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR	M2	40,70	$ 39.991,00	$ 1.627.634,00	40,70	$ 1.627.634,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
4,3	ESTOPEROL METALICO 10 X 2.5 CM	UN	2.016,00	$ 27.282,00	$ 55.000.512,00	2.016,00	$ 55.000.512,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
4,4	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	7.894,00	$ 16.061,00	$ 126.785.534,00	7.894,00	$ 126.785.534,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
4,5	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	161,00	$ 442.249,00	$ 71.202.089,00	161,00	$ 71.202.089,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
4,6	SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA (SR) CIRCULO Ø 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	74,00	$ 433.684,00	$ 32.092.616,00	74,00	$ 32.092.616,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
4,7	DEFENSA METALICA PARA CURVAS. SUMINISTRO E INSTALACION	ML	2.224,91	$ 193.934,00	$ 431.485.696,00	2.224,91	$ 431.485.696,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 1.110.498.081,00**		**$ 1.110.498.081,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
5	**ESTRUCTURAS HIDRAULICAS**													
5,1	DEMOLICIÓN CONCRETO REFORZADO (INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL)	M3	803,45	$ 485.270,00	$ 389.890.182,00	803,45	$ 389.890.182,00	160,69	$ 77.978.036,30	0,00	$ -	160,69	$ 77.978.036,30	20,00%
5,2	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL)	M3	44,65	$ 448.201,00	$ 20.012.175,00	44,65	$ 20.012.175,00	8,93	$ 4.002.434,93	0,00	$ -	8,93	$ 4.002.434,93	20,00%
5,3	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI)	M3	72,19	$ 811.099,00	$ 58.553.237,00	72,19	$ 58.553.237,00	21,91	$ 17.771.179,09	0,00	$ -	21,91	$ 17.771.179,09	30,35%
5,4	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2,G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	KG	92.035,08	$ 8.964,00	$ 825.002.457,00	92.035,08	$ 825.002.457,00	44.368,40	$ 397.718.337,60	0,00	$ -	44.368,40	$ 397.718.337,60	48,21%
5,5	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.003,82	$ 1.364.429,00	$ 1.369.641.119,00	1.003,82	$ 1.369.641.119,00	430,65	$ 587.591.348,85	0,00	$ -	430,65	$ 587.591.348,85	42,90%
	SUBTOTAL				**$ 2.663.099.170,00**		**$ 2.663.099.170,00**		**$ 1.085.061.336,77**		**$ -**		**$ 1.085.061.336,77**	
6	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**													
6,1	CUNETA TRIANGULAR L=0.90M E=0.12M EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	2.320,00	$ 265.131,00	$ 615.103.920,00	2.320,00	$ 615.103.920,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
6,2	POCETA EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO.	M3	50,7	$ 1.005.389,00	$ 50.973.222,00	50,70	$ 50.973.222,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
6,3	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 6" AUTOCEBANTE DIESEL	DIA	300	$ 346.339,00	$ 103.901.700,00	300,00	$ 103.901.700,00	17,00	$ 5.887.763,00	0,00	$ -	17,00	$ 5.887.763,00	5,67%
6,4	SIEMBRA CESPEDON GRAMA E=0.05 M	M2	22.500,00	$ 55.627,00	$ 1.251.607.500,00	22.500,00	$ 1.251.607.500,00	13.006,40	$ 723.507.012,80	0,00	$ -	13.006,40	$ 723.507.012,80	57,81%
	SUBTOTAL				**$ 2.021.586.342,00**		**$ 2.021.586.342,00**		**$ 729.394.775,80**		**$ -**		**$ 729.394.775,80**	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1234

CONTRATO N°	0775 DE 2022			PROYECTO N°			20211301010978							
ITEMS NO PREVISTOS														
N.P.1		0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	
N.P.2		0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	
SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS			$ -			$ -		$ -		$ -		$ -		
VALOR COSTOS DIRECTOS				$ 44.309.418.028,72		$ 44.309.418.028,72		$ 11.913.649.839,15		$ 2.686.632.010,01		$ 14.600.281.849,16		
ADMINISTRACIÓN (27%)				$ 11.963.542.867,21		$ 11.963.542.867,21		$ 3.216.685.456,57		$ 725.390.642,70		$ 3.942.076.099,27		
IMPREVISTOS (0%)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		
UTILIDAD (4%)				$ 1.772.376.721,07		$ 1.772.376.721,07		$ 476.545.993,57		$ 107.465.280,40		$ 584.011.273,97		
VALOR COSTOS INDIRECTOS				$ 13.735.919.588,28		$ 13.735.919.588,28		$ 3.693.231.450,14		$ 832.855.923,10		$ 4.526.087.373,24		
PLANES DE IMPLEMENTACIÓN AMBIENTAL Y DE TRANSITO QUE NO CONSTITUYEN OBRA														
7,00	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	UND	1,00	$ 229.756.600,00	$ 229.756.600,00	1,00 $ 229.756.600,00	0,17	$ 39.058.622,00	0,00	$ -	0,17	$ 39.058.622,00	17,00%	
8,00	IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	UND	1,00	$ 492.122.739,00	$ 492.122.739,00	1,00 $ 492.122.739,00	0,17	$ 83.660.865,63	0,00	$ -	0,17	$ 83.660.865,63	17,00%	
SUBTOTAL					$ 721.879.339,00	$ 721.879.339,00		$ 122.719.487,63		$ -		$ 122.719.487,63		
VALOR TOTAL OBRA					$ 58.767.216.954,00	$ 58.767.216.954,00		$ 15.729.600.776,92		$ 3.519.487.933,11		$ 19.249.088.710,03		

CONDICIONES GENERALES			RELACIÓN DE ACTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		
					AMORTIZACIONES	NETO PARCIAL	
VALOR CONDICIONES ORIGINALES	$	58.767.216.954,00					
VALOR ADICIONAL			ACTA 1	$ 6.301.292.867,68	$ 1.600.528.388,39	$ 4.700.764.479,29	
VALOR TOTAL	$	58.767.216.954,00	ACTA 2	$ 5.924.838.815,28	$ 1.504.909.059,08	$ 4.419.929.756,20	
CONDICIONES ACTUALIZADAS	$	58.767.216.954,00	ACTA 3	$ 3.503.469.093,96	$ 889.881.149,87	$ 2.613.587.944,09	
ANTICIPO	$	14.926.873.106,32	PRESENTE ACTA	$ 3.519.487.933,11	$ 893.949.935,01	$ 2.625.537.998,10	
PRESENTE ACTA	$	3.519.487.933,11	TOTALES	$ 19.249.088.710,03	$ 4.889.268.532,35	$ 14.359.820.177,68	
ACUMULADO	$	19.249.088.710,03					

RESUMEN		%
EJECUTADO	$ 19.249.088.710,03	32,75
POR EJECUTAR	$ 39.518.128.243,97	67,25
POR AMORTIZAR	$ 10.037.604.573,97	67,25
TOTALES	$ 58.767.216.954,00	100

RELACION DE PAGOS PROYECTO N° 20211301010978 (Registro Presupuestal No. 1002-2,3,24,02,0600,134,00 AR de 2022)

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
	ANTICIPO	$ 14.926.873.106,32			$ 14.926.873.106,32
1	PAGO PARCIAL N°1	$ 6.301.292.867,68	$ 1.600.528.388,39	$ 4.700.764.479,29	$ 19.627.637.585,61
2	PAGO PARCIAL N°2	$ 5.924.838.815,28	$ 1.504.909.059,08	$ 4.419.929.756,20	$ 24.047.567.341,81
3	PAGO PARCIAL N°3	$ 3.503.469.093,96	$ 889.881.149,87	$ 2.613.587.944,09	$ 26.661.155.285,90
4	PAGO PARCIAL N°4	$ 3.519.487.933,11	$ 893.949.935,01	$ 2.625.537.998,10	$ 29.286.693.284,00
	VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$ 39.518.128.243,97			$ 58.767.216.954,00

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON ONCE CENTAVOS M/CTE

NOTAS

1. El contador del contratista e interventor, Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría.
3. Que la interventoria certifica que el contratista CONSORCIO HALCON identificado con el NIT 901.666.148-8, cumplio con la clausula 8 forma de pago y se encuentra a paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral de los periodos relacionados en la presente acta.

El contrato de obra N° 0775 de 2022 representado legalmente por el Consorcio HALCON, durante su ejecución ha tenido modificaciones en su conformación o cesión de derechos por parte de los consorciados. SI ____ de fecha _____ NO X.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día 22 NOV. 2024

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ ENGATIVA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-095108

Firma:
Nombre: PAOLA ANDREA AMARILLO ALVAREZ
CONTADOR DEL CONTRATISTA
N° Matricula Profesional: 215835-T

Nota: en la presente acta se debera adjuntar el certificado bancario y las respectivas tarjetas y antecedentes de los contadores.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma:
Nombre: BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-92149

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 189521-T

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONSORCIO HALCÓN

MEMORIA DE CALCULO
OBRA

12396

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	28/04/2026
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	Parcial N°04
CAPITULO:	EXCAVACIONES

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.1	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS	K 0+0	K 03+000			28.928,10 ✓
SE ANEXA MEMORIA DE CALCULO EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS					
PASAN:				SUBTOTAL	28.928,10 ✓
				TOTAL	28.928,10 ✓

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-095108

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149

Firma
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-091115

Firma
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-193762

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12397

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUTYE CARGUE)

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 0+0	K 0+20	20	12,06	241,20
K 0+20	K 0+40	20	5,03	100,60
K 0+40	K 0+60	20	10,76	215,20
K 0+60	K 0+80	20	8,62	172,40
K 0+80	K 0+100	20	13,30	266,00
K 0+100	K 0+120	20	23,87	477,40
K 0+120	K 0+140	20	24,77	495,40
K 0+140	K 0+160	20	8,58	171,60
K 0+160	K 0+180	20	20,65	413,00
K 0+180	K 0+200	20	19,53	390,60
K 0+200	K 0+220	20	20,09	401,80
K 0+220	K 0+240	20	19,75	395,00
K 0+240	K 0+260	20	10,51	210,20
K 0+260	K 0+280	20	17,50	350,00
K 0+280	K 0+300	20	3,44	68,80
K 0+300	K 0+320	20	13,20	264,00
K 0+320	K 0+340	20	10,30	206,00
K 0+340	K 0+360	20	2,65	53,00
K 0+360	K 0+380	20	8,20	164,00
K 0+380	K 0+400	20	5,97	119,40
K 0+400	K 0+420	20	6,05	121,00
K 0+420	K 0+440	20	17,61	352,20
K 0+440	K 0+460	20	14,91	298,20
K 0+460	K 0+480	20	11,65	233,00
K 0+480	K 0+500	20	12,12	242,40
K 0+500	K 0+520	20	7,08	141,60
K 0+520	K 0+540	20	7,81	156,20
K 0+540	K 0+560	20	7,38	147,60
K 0+560	K 0+580	20	5,84	116,80
K 0+580	K 0+600	20	11,33	226,60
K 0+600	K 0+620	20	9,86	197,20
K 0+620	K 0+640	20	10,82	216,40
K 0+640	K 0+660	20	7,61	152,20
K 0+660	K 0+680	20	8,85	177,00
K 0+680	K 0+700	20	4,65	93,00
K 0+700	K 0+720	20	7,75	155,00
K 0+720	K 0+740	20	8,40	168,00
K 0+740	K 0+760	20	7,80	156,00
K 0+760	K 0+780	20	6,56	131,20
K 0+780	K 0+800	20	8,60	172,00
K 0+800	K 0+820	20	7,78	155,60
K 0+820	K 0+840	20	11,01	220,20
K 0+840	K 0+860	20	8,53	170,60
K 0+860	K 0+880	20	10,10	202,00
K 0+880	K 0+900	20	6,47	129,40
K 0+900	K 0+920	20	9,19	183,80
K 0+920	K 0+940	20	8,92	178,40
K 0+940	K 0+960	20	10,46	209,20
K 0+960	K 0+980	20	12,41	248,20
K 0+980	K 01+000	20	12,78	255,60
K 01+000	K 01+020	20	13,87	277,40
K 01+020	K 01+040	20	12,12	242,40
K 01+040	K 01+060	20	14,09	281,80
K 01+060	K 01+080	20	9,71	194,20
K 01+080	K 01+100	20	6,84	136,80
K 01+100	K 01+120	20	11,54	230,80
K 01+120	K 01+140	20	8,94	178,80
K 01+140	K 01+160	20	14,75	295,00
K 01+160	K 01+180	20	5,96	119,20
K 01+180	K 01+200	20	10,70	214,00
K 01+200	K 01+220	20	15,50	310,00
K 01+220	K 01+240	20	19,30	386,00
K 01+240	K 01+260	20	16,21	324,20
K 01+260	K 01+280	20	15,03	300,60
K 01+280	K 01+300	20	15,63	312,60
K 01+300	K 01+320	20	13,66	273,20
K 01+320	K 01+340	20	4,91	98,20

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUTYE CARGUE)

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 01+340	K 01+360	20	2,04	40,80
K 01+360	K 01+380	20	10,34	206,80
K 01+380	K 01+400	20	1,56	31,20
K 01+400	K 01+420	20	5,20	104,00
K 01+420	K 01+440	20	17,51	350,20
K 01+440	K 01+460	20	14,47	289,40
K 01+460	K 01+480	20	5,10	102,00
K 01+480	K 01+500	20	9,74	194,80
K 01+500	K 01+520	20	8,03	160,60
K 01+520	K 01+540	20	6,65	133,00
K 01+540	K 01+560	20	7,48	149,60
K 01+560	K 01+580	20	9,17	183,40
K 01+580	K 01+600	20	6,57	131,40
K 01+600	K 01+620	20	10,52	210,40
K 01+620	K 01+640	20	18,31	366,20
K 01+640	K 01+660	20	11,93	238,60
K 01+660	K 01+680	20	11,53	230,60
K 01+680	K 01+700	20	15,28	305,60
K 01+700	K 01+720	20	14,28	285,60
K 01+720	K 01+740	20	13,82	276,40
K 01+740	K 01+760	20	11,68	233,60
K 01+760	K 01+780	20	13,81	276,20
K 01+780	K 01+800	20	12,64	252,80
K 01+800	K 01+820	20	13,96	279,20
K 01+820	K 01+840	20	12,96	259,20
K 01+840	K 01+860	20	16,99	339,80
K 01+860	K 01+880	20	17,59	351,80
K 01+880	K 01+900	20	15,79	315,80
K 01+900	K 01+920	20	17,25	345,00
K 01+920	K 01+940	20	13,33	266,60
K 01+940	K 01+960	20	13,96	279,20
K 01+960	K 01+980	20	12,19	243,80
K 01+980	K 02+000	20	12,55	251,00
K 02+000	K 02+020	20	6,44	128,80
K 02+020	K 02+040	20	5,05	101,00
K 02+040	K 02+060	20	7,04	140,80
K 02+060	K 02+080	20	5,12	102,40
K 02+080	K 02+100	20	3,19	63,80
K 02+100	K 02+120	20	11,61	232,20
K 02+120	K 02+140	20	5,59	111,80
K 02+140	K 02+160	20	7,82	156,40
K 02+160	K 02+180	20	6,16	123,20
K 02+180	K 02+200	20	3,78	75,60
K 02+200	K 02+220	20	1,60	32,00
K 02+220	K 02+240	20	2,08	41,60
K 02+240	K 02+260	20	1,74	34,80
K 02+260	K 02+280	20	2,20	44,00
K 02+280	K 02+300	20	1,68	33,60
K 02+300	K 02+310	10	1,56	15,60
K 02+310	K 02+320	10	9,24	92,40
K 02+320	K 02+330	10	14,17	141,70
K 02+330	K 02+340	10	9,79	97,90
K 02+340	K 02+350	10	7,13	71,30
K 02+350	K 02+360	10	10,38	103,80
K 02+360	K 02+370	10	11,29	112,90
K 02+370	K 02+380	10	11,25	112,50
K 02+380	K 02+390	10	12,90	129,00
K 02+390	K 02+400	10	13,97	139,70
K 02+400	K 02+410	10	8,75	87,50
K 02+410	K 02+420	10	11,71	117,10
K 02+420	K 02+430	10	6,01	60,10
K 02+430	K 02+440	10	4,60	46,00
K 02+440	K 02+450	10	6,41	64,10
K 02+450	K 02+460	10	3,72	37,20
K 02+460	K 02+470	10	4,75	47,50
K 02+470	K 02+480	10	11,20	112,00
K 02+480	K 02+490	10	10,48	104,80
K 02+490	K 02+500	10	10,35	103,50
K 02+500	K 02+510	10	4,92	49,20
K 02+510	K 02+520	10	8,16	81,60
K 02+520	K 02+530	10	9,70	97,00
K 02+530	K 02+540	10	7,16	71,60
K 02+540	K 02+550	10	8,87	88,70
K 02+550	K 02+560	10	8,10	81,00
K 02+560	K 02+570	10	13,91	139,10
K 02+570	K 02+580	10	12,98	129,80
K 02+580	K 02+590	10	8,84	88,40

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUTYE CARGUE)

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 02+590	K 02+600	10	16,53	165,30
K 02+600	K 02+610	10	11,29	112,90
K 02+610	K 02+620	10	7,93	79,30
K 02+620	K 02+630	10	7,58	75,80
K 02+630	K 02+640	10	7,72	77,20
K 02+640	K 02+650	10	14,13	141,30
K 02+650	K 02+660	10	10,52	105,20
K 02+660	K 02+670	10	9,04	90,40
K 02+670	K 02+680	10	8,13	81,30
K 02+680	K 02+690	10	16,38	163,80
K 02+690	K 02+700	10	15,35	153,50
K 02+700	K 02+710	10	14,47	144,70
K 02+710	K 02+720	10	14,07	140,70
K 02+720	K 02+730	10	14,12	141,20
K 02+730	K 02+740	10	10,64	106,40
K 02+740	K 02+750	10	8,43	84,30
K 02+750	K 02+760	10	7,19	71,90
K 02+760	K 02+770	10	8,58	85,80
K 02+770	K 02+780	10	10,58	105,80
K 02+780	K 02+790	10	12,09	120,90
K 02+790	K 02+800	10	7,92	79,20
K 02+800	K 02+810	10	11,73	117,30
K 02+810	K 02+820	10	13,18	131,80
K 02+820	K 02+830	10	9,49	94,90
K 02+830	K 02+840	10	8,68	86,80
K 02+840	K 02+850	10	8,83	88,30
K 02+850	K 02+860	10	11,62	116,20
K 02+860	K 02+870	10	17,94	179,40
K 02+870	K 02+880	10	10,36	103,60
K 02+880	K 02+890	10	9,29	92,90
K 02+890	K 02+900	10	8,37	83,70
K 02+900	K 02+910	10	7,29	72,90
K 02+910	K 02+920	10	5,27	52,70
K 02+920	K 02+930	10	4,27	42,70
K 02+930	K 02+940	10	4,30	43,00
K 02+940	K 02+950	10	8,81	88,10
K 02+950	K 02+960	10	7,68	76,80
K 02+960	K 02+970	10	4,79	47,90
K 02+970	K 02+980	10	9,33	93,30
K 02+980	K 02+990	10	10,38	103,80
K 02+990	K 03+000	10	9,21	92,10
		DESCUENTO PARCIAL No. 1		-1894,00
		TOTAL		28.928,10

230822,0

FIRMA

FERNANDO ROJAS.

LUIS FERNANDO ROJAS MERCHAN
TOPOGRAFO CONTRATISTA
M.P. 01-18966
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

Fredy Acosta

FREDY GONZALO ACOSTA FERRO
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-20180
CONSORCIO INTER AIM

12400

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 20211301010978

CORTE
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL


0+000



KM 0+000.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	12.36	241.2
RELLENO	9.09	161.8
BASE GRANULAR	0.87	17.4
SUBBASE GRANULAR	1.44	28.82

Cota Terreno: 252.54
Cota Subrasante: 252.18


0+020



KM 0+020.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	5.03	100.60
RELLENO	8.43	168.6
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 251.65
Cota Subrasante: 252.05


0+040



KM 0+040.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	10.76	215.20
RELLENO	25.02	500.4
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.38

Cota Terreno: 250.79
Cota Subrasante: 251.92


0+060



KM 0+060.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	8.62	172.4
RELLENO	27.02	540.4
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.37

Cota Terreno: 249.97
Cota Subrasante: 251.79


0+080



KM 0+080.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	13.30	266
RELLENO	33.9	678
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.38

Cota Terreno: 249.70
Cota Subrasante: 251.66


0+100



KM 0+100.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	23.87	477.4
RELLENO	50.39	1007.8
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 249.31
Cota Subrasante: 251.53


0+120



KM 0+120.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	24.77	495.40
RELLENO	52.99	1059.80
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 249.00
Cota Subrasante: 251.40


0+140



KM 0+140.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	8.56	171.20
RELLENO	45.21	904.20
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 248.86
Cota Subrasante: 251.27


0+160



KM 0+160.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	20.66	413.20
RELLENO	45.46	908.20
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 248.83
Cota Subrasante: 251.16

0+180



KM 0+180.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	19.02	380.40
RELLENO	42.93	858.60
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 248.82
Cota Subrasante: 251.07

12401

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 20211301010978

CORTE
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL


0+200



KM 0+200.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	20.09	401.80
RELLENO	43.82	876.40
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 248.78
Cota Subrasante: 251.00


0+220



KM 0+220.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	19.75	395.00
RELLENO	43.18	863.60
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 248.82
Cota Subrasante: 250.93


0+240



KM 0+240.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	10.51	210.20
RELLENO	40.37	807.40
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 248.80
Cota Subrasante: 250.86


0+260



KM 0+260.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	17.50	350.00
RELLENO	39.61	792.20
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 248.84
Cota Subrasante: 250.79


0+280



KM 0+280.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	2.44	48.8
RELLENO	31.27	625.4
BASE GRANULAR	0.84	8.74
SUBBASE GRANULAR	1.47	14.52

Cota Terreno: 248.72
Cota Subrasante: 250.72


0+300



KM 0+300.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	13.20	264.00
RELLENO	43.47	869.40
BASE GRANULAR	0.78	15.70
SUBBASE GRANULAR	1.09	17.42

Cota Terreno: 248.65
Cota Subrasante: 250.68


0+320



KM 0+320.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	10.30	206.00
RELLENO	36.17	723.40
BASE GRANULAR	1.15	11.11
SUBBASE GRANULAR	1.87	18.04

Cota Terreno: 248.89
Cota Subrasante: 250.72


0+340



KM 0+340.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	2.65	53
RELLENO	20.47	409.4
BASE GRANULAR	0.87	9.34
SUBBASE GRANULAR	1.44	13.26

Cota Terreno: 249.13
Cota Subrasante: 250.79


0+360



KM 0+360.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	8.20	164
RELLENO	20.76	415
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.11

Cota Terreno: 249.45
Cota Subrasante: 250.86

0+380



KM 0+380.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	0.87	17.4
RELLENO	27.46	549.2
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 249.03
Cota Subrasante: 250.93

12402

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 20211301010978

CORTE
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL


0+400



KM 0+400.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	8.58	121
RELLENO	32.26	643.2
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	34.42

Cota Terreno: 248.92
Cota Subrasante: 251.00


0+500



KM 0+500.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	7.09	141.80
RELLENO	38.06	763.20
BASE GRANULAR	0.90	8.96
SUBBASE GRANULAR	1.48	14.76

Cota Terreno: 248.34
Cota Subrasante: 250.93


0+420



KM 0+420.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	17.61	352.20
RELLENO	43.56	871.20
BASE GRANULAR	0.90	8.97
SUBBASE GRANULAR	1.46	14.54

Cota Terreno: 248.84
Cota Subrasante: 251.07


0+520



KM 0+520.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	7.61	152.20
RELLENO	41.00	820.00
BASE GRANULAR	0.90	8.96
SUBBASE GRANULAR	1.46	14.78

Cota Terreno: 248.27
Cota Subrasante: 250.86


0+440



KM 0+440.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	14.91	298.20
RELLENO	39.15	783.00
BASE GRANULAR	0.90	8.96
SUBBASE GRANULAR	1.46	14.78

Cota Terreno: 248.98
Cota Subrasante: 251.11


0+540



KM 0+540.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	7.39	147.80
RELLENO	41.18	823.70
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.41	14.11

Cota Terreno: 248.00
Cota Subrasante: 250.79


0+460



KM 0+460.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	11.65	233.00
RELLENO	40.54	810.80
BASE GRANULAR	0.90	8.96
SUBBASE GRANULAR	1.46	14.78

Cota Terreno: 248.63
Cota Subrasante: 251.07


0+560



KM 0+560.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	5.84	116.8
RELLENO	37.6	752.00
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	34.42

Cota Terreno: 248.04
Cota Subrasante: 250.72


0+480



KM 0+480.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	12.12	242.40
RELLENO	40.89	817.80
BASE GRANULAR	0.90	8.96
SUBBASE GRANULAR	1.46	14.78

Cota Terreno: 248.54
Cota Subrasante: 251.00

0+580



KM 0+580.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	11.33	226.60
RELLENO	42.63	852.60
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	34.42

Cota Terreno: 248.05
Cota Subrasante: 250.68

12403

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 20211301010978

CORTE
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL


0+600



KM 0+600.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	9.96	167.20
RELLENO	43.16	852.20
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 248.01
Cota Subrasante: 250.72


0+620



KM 0+620.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	10.62	216.40
RELLENO	45.81	916.20
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 248.03
Cota Subrasante: 250.79


0+640



KM 0+640.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	7.61	152.20
RELLENO	43.65	873.00
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 248.02
Cota Subrasante: 250.86


0+660



KM 0+660.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	8.85	177.00
RELLENO	45.33	826.90
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 248.06
Cota Subrasante: 250.93


0+680



KM 0+680.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	4.65	93.00
RELLENO	43.87	877.4
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 247.99
Cota Subrasante: 251.00


0+700



KM 0+700.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	7.75	155.00
RELLENO	51.23	1024.60
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 247.88
Cota Subrasante: 251.07


0+720



KM 0+720.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	8.40	168.00
RELLENO	53.01	1060.20
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 247.82
Cota Subrasante: 251.10


0+740



KM 0+740.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	7.90	158.00
RELLENO	51.15	1023.00
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 247.84
Cota Subrasante: 251.07


0+760



KM 0+760.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	6.56	131.20
RELLENO	50.47	1009.40
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 247.81
Cota Subrasante: 251.01

0+780



KM 0+780.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	8.60	172.00
RELLENO	50.55	1010.00
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 247.85
Cota Subrasante: 250.94

12404

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 20211301010978

CORTE
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL


0+800



KM 0+800.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	7.19	168.66
RELLENO	93.11	9022.20
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 247.65
Cota Subrasante: 250.87


0+900



KM 0+900.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	9.19	168.66
RELLENO	90.77	9215.40
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 247.58
Cota Subrasante: 250.78


0+820



KM 0+820.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	11.01	202.20
RELLENO	93.66	9361.60
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 247.63
Cota Subrasante: 250.80


0+920



KM 0+920.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	8.92	179.40
RELLENO	91.96	9518.2
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 247.53
Cota Subrasante: 250.85


0+840



KM 0+840.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	8.93	178.66
RELLENO	49.73	964.40
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 247.68
Cota Subrasante: 250.73


0+940



KM 0+940.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	10.46	209.20
RELLENO	55.28	1165.60
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 247.50
Cota Subrasante: 250.91


0+860



KM 0+860.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	10.10	202.00
RELLENO	48.19	963.80
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 247.75
Cota Subrasante: 250.70


0+960



KM 0+960.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	12.41	248.20
RELLENO	53.44	1148.80
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 247.77
Cota Subrasante: 250.97


0+880



KM 0+880.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	6.47	129.40
RELLENO	45.26	907.20
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 247.67
Cota Subrasante: 250.72

0+980



KM 0+980.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	12.78	255.60
RELLENO	55.52	1110.40
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 247.84
Cota Subrasante: 251.03

12405

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 20211301010978

CORTE
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL


1+000



KM 1+000.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	13.87	227.90
RELLENO	59.63	1196.80
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 247.94
Cota Subrasante: 251.10


1+100



KM 1+100.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	11.04	220.80
RELLENO	66.03	1320.60
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 247.31
Cota Subrasante: 251.28


1+020



KM 1+020.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	12.12	242.40
RELLENO	57.18	1143.60
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 247.82
Cota Subrasante: 251.16


1+120



KM 1+120.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	8.84	176.80
RELLENO	69.04	1380.80
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 247.53
Cota Subrasante: 251.22


1+040



KM 1+040.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	14.09	281.80
RELLENO	58.42	1168.40
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 247.93
Cota Subrasante: 251.22


1+140



KM 1+140.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	14.75	295.00
RELLENO	58.29	1165.79
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 247.87
Cota Subrasante: 251.15


1+060



KM 1+060.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	9.71	194.20
RELLENO	59.66	1193.20
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 247.74
Cota Subrasante: 251.28


1+160



KM 1+160.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	5.96	119.20
RELLENO	68.28	1365.60
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 247.88
Cota Subrasante: 251.09


1+080



KM 1+080.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	6.84	136.80
RELLENO	66.15	1323.00
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 247.43
Cota Subrasante: 251.31

1+180



KM 1+180.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	10.70	214.00
RELLENO	63.78	1275.60
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 247.67
Cota Subrasante: 251.03

12406

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 20211301010978

CORTE
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL


1+200



KM 1+200.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	13.90	316.00
RELLENO	98.22	1124.40
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 247.77
Cota Subrasante: 250.96


1+300



KM 1+300.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	12.86	272.20
RELLENO	45.91	900.20
BASE GRANULAR	0.80	8.96
SUBBASE GRANULAR	1.46	14.78

Cota Terreno: 247.97
Cota Subrasante: 250.68


1+220



KM 1+220.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	19.30	386.00
RELLENO	56.27	1160.40
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 247.88
Cota Subrasante: 250.90


1+320



KM 1+320.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	4.61	86.20
RELLENO	44.94	892.80
BASE GRANULAR	0.90	8.96
SUBBASE GRANULAR	1.46	14.78

Cota Terreno: 247.97
Cota Subrasante: 250.72


1+240



KM 1+240.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	16.71	334.2
RELLENO	53.70	1104.00
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 247.76
Cota Subrasante: 250.84


1+340



KM 1+340.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	2.04	40.8
RELLENO	37.51	750.2
BASE GRANULAR	0.90	8.96
SUBBASE GRANULAR	1.46	14.78

Cota Terreno: 248.05
Cota Subrasante: 250.79


1+260



KM 1+260.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	15.03	300.6
RELLENO	55.44	1108.80
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 247.53
Cota Subrasante: 250.77


1+360



KM 1+360.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	10.34	206.80
RELLENO	47.21	944.20
BASE GRANULAR	0.90	8.96
SUBBASE GRANULAR	1.46	14.78

Cota Terreno: 248.05
Cota Subrasante: 250.86


1+280



KM 1+280.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	10.43	312.60
RELLENO	52.91	1048.20
BASE GRANULAR	0.89	8.79
SUBBASE GRANULAR	1.45	14.52

Cota Terreno: 247.84
Cota Subrasante: 250.71

1+380



KM 1+380.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	1.56	31.2
RELLENO	45.65	913.00
BASE GRANULAR	0.90	8.96
SUBBASE GRANULAR	1.46	14.78

Cota Terreno: 248.04
Cota Subrasante: 250.93

12407

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 20211301010978

CORTE
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

1+400




KM 1+400.00

Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	8.22	134.00
RELLENO	47.4895	943.758
BASE GRANULAR	0.87	8.79
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.51

Cota Terreno: 247.85
Cota Subrasante: 251.00

1+500




KM 1+500.00

Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	8.03	160.6
RELLENO	34.02	840.4
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 248.55
Cota Subrasante: 250.93

1+420




KM 1+420.00

Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	17.61	352.20
RELLENO	56.86	1137.20
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 248.09
Cota Subrasante: 251.07

1+520




KM 1+520.00

Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	5.65	113
RELLENO	30.88	617.6
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 248.65
Cota Subrasante: 250.86

1+440




KM 1+440.00

Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	14.67	293.40
RELLENO	51.38	1027.65
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 248.04
Cota Subrasante: 251.11

1+540




KM 1+540.00

Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	7.48	149.6
RELLENO	31.81	636.2
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 248.67
Cota Subrasante: 250.79

1+460




KM 1+460.00

Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	8.10	162.04
RELLENO	41.86	837.26
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 248.29
Cota Subrasante: 251.07

1+560




KM 1+560.00

Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	8.17	163.40
RELLENO	32.64	652.8
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 248.61
Cota Subrasante: 250.72

1+480




KM 1+480.00

Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	9.74	194.80
RELLENO	41.06	821.20
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 248.48
Cota Subrasante: 251.00

1+580



KM 1+580.00

Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	6.57	131.40
RELLENO	28.08	561.60
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 248.77
Cota Subrasante: 250.68

12408

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 20211301010978

CORTE
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

1+600




KM 1+600.00

Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	14.52	250.40
RELLENO	33.50	670.00
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 248.84
Cota Subrasante: 250.72

1+620




KM 1+620.00

Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	16.31	268.30
RELLENO	36.61	772.20
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 248.66
Cota Subrasante: 250.79

1+640




KM 1+640.00

Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	11.93	238.60
RELLENO	35.51	710.20
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 248.69
Cota Subrasante: 250.86

1+660




KM 1+660.00

Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	11.53	230.60
RELLENO	35.71	714.20
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 248.84
Cota Subrasante: 250.93

1+680




KM 1+680.00

Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	14.28	285.60
RELLENO	40.19	803.80
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 248.85
Cota Subrasante: 251.00

1+700




KM 1+700.00

Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	14.28	285.60
RELLENO	38.94	766.86
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 248.83
Cota Subrasante: 251.07

1+720




KM 1+720.00

Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	13.82	276.40
RELLENO	39.35	787.06
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 248.87
Cota Subrasante: 251.11

1+740




KM 1+740.00

Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	11.68	233.60
RELLENO	36.36	727.06
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 248.99
Cota Subrasante: 251.07

1+760




KM 1+760.00

Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	13.81	276.26
RELLENO	33.92	677.26
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 249.12
Cota Subrasante: 251.00

1+780



KM 1+780.00

Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	12.64	252.80
RELLENO	33.23	664.66
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 248.86
Cota Subrasante: 250.93

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 20211301010978

CORTE
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL


1+800



Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	13.96	279.20
RELLENO	35.83	716.60
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 248.68
Cota Subrasante: 250.86


1+900



Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	17.25	345.00
RELLENO	39.85	797.00
BASE GRANULAR	0.90	8.96
SUBBASE GRANULAR	1.46	14.78

Cota Terreno: 248.54
Cota Subrasante: 250.79


1+820



Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	12.96	259.20
RELLENO	34.58	691.60
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 248.73
Cota Subrasante: 250.79

1+920




KM 1+920.00

Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	13.33	266.60
RELLENO	36.84	736.80
BASE GRANULAR	0.90	8.96
SUBBASE GRANULAR	1.46	14.78

Cota Terreno: 248.92
Cota Subrasante: 250.86


1+840



Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	16.86	336.80
RELLENO	37.04	740.80
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 248.66
Cota Subrasante: 250.72

1+940




KM 1+940.00

Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	13.99	279.20
RELLENO	38.41	784.20
BASE GRANULAR	0.90	8.96
SUBBASE GRANULAR	1.46	14.78

Cota Terreno: 248.92
Cota Subrasante: 250.93

1+860




KM 1+860.00

Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	17.94	358.80
RELLENO	38.66	773.60
BASE GRANULAR	0.86	8.73
SUBBASE GRANULAR	1.45	14.68

Cota Terreno: 248.63
Cota Subrasante: 250.68

1+960




KM 1+960.00

Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	12.19	243.80
RELLENO	38.16	763.20
BASE GRANULAR	0.90	8.96
SUBBASE GRANULAR	1.46	14.78

Cota Terreno: 248.89
Cota Subrasante: 251.00

1+880




KM 1+880.00

Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	10.79	215.80
RELLENO	39.36	787.20
BASE GRANULAR	0.90	8.83
SUBBASE GRANULAR	1.45	14.73

Cota Terreno: 248.49
Cota Subrasante: 250.72

1+980



KM 1+980.00

Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	12.03	241.30
RELLENO	37.33	746.60
BASE GRANULAR	0.87	8.81
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.64

Cota Terreno: 249.04
Cota Subrasante: 251.07

12410

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 20211301010978

CORTE
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL


2+000



KM 2+000.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	0.44	128.80
RELLENO	31.12	602.40
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 249.08
Cota Subrasante: 251.11


2+100



KM 2+100.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	11.03	230.20
RELLENO	21.22	525.90
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 249.10
Cota Subrasante: 250.83


2+020



KM 2+020.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	5.05	101.00
RELLENO	23.29	560.80
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 249.10
Cota Subrasante: 251.08


2+120



KM 2+120.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	5.56	111.80
RELLENO	24.08	523.20
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 249.05
Cota Subrasante: 250.76


2+040



KM 2+040.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	7.04	146.8
RELLENO	23.98	547.2
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 249.05
Cota Subrasante: 251.02


2+140



KM 2+140.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	7.82	156.40
RELLENO	26.13	572.80
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 249.10
Cota Subrasante: 250.70


2+060



KM 2+060.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	5.12	102.4
RELLENO	26.56	531.8
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 249.12
Cota Subrasante: 250.95


2+160



KM 2+160.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	6.16	123.20
RELLENO	22.99	479.80
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 249.05
Cota Subrasante: 250.60


2+080



KM 2+080.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	3.19	63.8
RELLENO	25.09	591.9
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 249.13
Cota Subrasante: 250.89

2+180



KM 2+180.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	3.76	7.00
RELLENO	21.54	560.80
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 248.78
Cota Subrasante: 250.47

12411

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 20211301010978

CORTE
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL


2+200



KM 2+200.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	1.60	32.00
RELLENO	19.31	368.2
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 248.71
Cota Subrasante: 250.31


2+300



KM 2+300.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	1.06	21.2
RELLENO	7.86	159
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 248.87
Cota Subrasante: 249.52


2+220



KM 2+220.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	2.09	41.8
RELLENO	15.41	308.2
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 248.79
Cota Subrasante: 250.15


2+240



KM 2+240.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	1.74	34.8
RELLENO	14.04	280.8
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 248.69
Cota Subrasante: 249.99


2+260



KM 2+260.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	2.29	34.8
RELLENO	13.84	276.8
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 248.52
Cota Subrasante: 249.83

2+280



KM 2+280.00		
Material	Área (m²)	Volumen (m³)
CORTE	1.68	33.6
RELLENO	9.56	191.2
BASE GRANULAR	0.87	17.40
SUBBASE GRANULAR	1.44	14.42

Cota Terreno: 248.83
Cota Subrasante: 249.67

12412

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 20211301010978

CORTE
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL


2+310



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	9.24	92.40
Relleno:	36.56	365.60

Cota Terreno: 248.86
Cota Subrasante: 251.15


2+320



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	14.17	141.70
Relleno:	42.19	421.90

Cota Terreno: 248.92
Cota Subrasante: 251.17


2+330



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	9.79	97.90
Relleno:	37.48	374.80

Cota Terreno: 249.00
Cota Subrasante: 251.17


2+340



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	7.13	71.30
Relleno:	34.01	340.10

Cota Terreno: 249.06
Cota Subrasante: 251.16


2+350



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	10.38	103.80
Relleno:	35.53	355.30

Cota Terreno: 249.07
Cota Subrasante: 251.13


2+360



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	11.29	112.90
Relleno:	35.79	357.90

Cota Terreno: 249.12
Cota Subrasante: 251.09


2+370



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	11.25	112.50
Relleno:	33.94	339.40

Cota Terreno: 249.14
Cota Subrasante: 251.06


2+380



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	12.90	129.00
Relleno:	34.80	348.00

Cota Terreno: 249.15
Cota Subrasante: 251.02


2+390



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	13.97	139.70
Relleno:	35.94	359.40

Cota Terreno: 249.17
Cota Subrasante: 250.99

2+400



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	8.75	87.50
Relleno:	30.77	307.70

Cota Terreno: 249.20
Cota Subrasante: 250.96

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 20211301010978

CORTE
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL


2+410



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	11.71	117.10
Relleno:	31.52	315.20

Cota Terreno: 249.32
Cota Subrasante: 250.92


2+420



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	6.01	60.10
Relleno:	23.02	230.20

Cota Terreno: 249.40
Cota Subrasante: 250.89


2+430



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	4.60	46.00
Relleno:	22.79	227.90

Cota Terreno: 249.33
Cota Subrasante: 250.85


2+440



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	6.41	64.10
Relleno:	16.09	160.90

Cota Terreno: 249.60
Cota Subrasante: 250.82


2+450



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	3.72	37.20
Relleno:	15.86	158.60

Cota Terreno: 249.61
Cota Subrasante: 250.79


2+460



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	4.75	47.50
Relleno:	19.20	192.00

Cota Terreno: 249.59
Cota Subrasante: 250.77


2+470



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	11.20	112.00
Relleno:	28.46	284.60

Cota Terreno: 249.53
Cota Subrasante: 250.76


2+480



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	10.48	104.80
Relleno:	29.82	298.20

Cota Terreno: 249.42
Cota Subrasante: 250.77


2+490



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	10.35	103.50
Relleno:	30.56	305.60

Cota Terreno: 249.26
Cota Subrasante: 250.79

2+500



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	4.92	49.20
Relleno:	27.27	272.70

Cota Terreno: 249.05
Cota Subrasante: 250.82

12414

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 20211301010978

CORTE
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL


2+510



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	8.16	81.60
Relleno:	33.21	332.10

Cota Terreno: 248.90
Cota Subrasante: 250.85


2+520



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	9.70	97.00
Relleno:	36.47	364.70

Cota Terreno: 248.83
Cota Subrasante: 250.88


2+530



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	7.16	71.60
Relleno:	34.47	344.70

Cota Terreno: 248.81
Cota Subrasante: 250.92


2+540



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	8.87	88.70
Relleno:	37.02	370.20

Cota Terreno: 248.83
Cota Subrasante: 250.95


2+550



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	8.10	81.00
Relleno:	37.22	372.20

Cota Terreno: 248.82
Cota Subrasante: 250.98


2+560



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	13.91	139.10
Relleno:	39.23	392.30

Cota Terreno: 249.16
Cota Subrasante: 251.01


2+570



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	12.98	129.80
Relleno:	37.10	371.00

Cota Terreno: 249.45
Cota Subrasante: 251.05


2+580



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	8.84	88.40
Relleno:	41.45	414.50

Cota Terreno: 248.66
Cota Subrasante: 251.08


2+590



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	16.53	165.30
Relleno:	50.54	505.40

Cota Terreno: 248.75
Cota Subrasante: 251.11

2+600



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	11.29	112.90
Relleno:	42.56	425.60

Cota Terreno: 248.87
Cota Subrasante: 251.14

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 20211301010978

CORTE
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL


2+610



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	7.93	79.30
Relleno:	34.77	347.70

Cota Terreno: 248.99
Cota Subrasante: 251.17


2+620



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	7.58	75.80
Relleno:	28.72	287.20

Cota Terreno: 249.34
Cota Subrasante: 251.20


2+630



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	7.72	77.20
Relleno:	23.03	230.30

Cota Terreno: 249.82
Cota Subrasante: 251.22


2+640



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	14.13	141.30
Relleno:	35.02	350.20

Cota Terreno: 249.57
Cota Subrasante: 251.23


2+650



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	10.52	105.20
Relleno:	40.51	405.10

Cota Terreno: 248.93
Cota Subrasante: 251.22


2+660



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	9.04	90.40
Relleno:	41.19	411.90

Cota Terreno: 248.67
Cota Subrasante: 251.20


2+670



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	8.13	81.30
Relleno:	37.38	373.80

Cota Terreno: 248.90
Cota Subrasante: 251.16


2+680



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	16.38	163.80
Relleno:	39.54	395.40

Cota Terreno: 248.99
Cota Subrasante: 251.13


2+690



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	15.35	153.50
Relleno:	35.80	358.00

Cota Terreno: 249.13
Cota Subrasante: 251.09

2+700



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	14.47	144.70
Relleno:	42.09	420.90

Cota Terreno: 249.01
Cota Subrasante: 251.06

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 20211301010978

CORTE
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL


2+710



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	14.07	140.70
Relleno:	43.28	432.80

Cota Terreno: 248.68
Cota Subrasante: 251.02


2+720



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	14.12	141.20
Relleno:	45.98	459.80

Cota Terreno: 248.37
Cota Subrasante: 250.99


2+730



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	10.64	106.40
Relleno:	43.03	430.30

Cota Terreno: 248.22
Cota Subrasante: 250.95


2+740



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	8.43	84.30
Relleno:	40.12	401.20

Cota Terreno: 248.24
Cota Subrasante: 250.91


2+750



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	7.19	71.90
Relleno:	38.19	381.90

Cota Terreno: 248.32
Cota Subrasante: 250.88


2+760



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	8.58	85.80
Relleno:	38.38	383.80

Cota Terreno: 248.47
Cota Subrasante: 250.85


2+770



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	10.58	105.80
Relleno:	39.93	399.30

Cota Terreno: 248.63
Cota Subrasante: 250.83


2+780



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	12.09	120.90
Relleno:	34.28	342.80

Cota Terreno: 248.73
Cota Subrasante: 250.81


2+790



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	7.92	79.20
Relleno:	28.23	282.30

Cota Terreno: 248.86
Cota Subrasante: 250.80

2+800



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	11.73	117.30
Relleno:	38.07	380.70

Cota Terreno: 248.79
Cota Subrasante: 250.80

12417

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 20211301010978

CORTE
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL


2+810



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	13.18	131.80
Relleno:	42.48	424.80

Cota Terreno: 248.58
Cota Subrasante: 250.81


2+820



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	9.49	94.90
Relleno:	40.30	403.00

Cota Terreno: 248.48
Cota Subrasante: 250.82


2+830



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	8.68	86.80
Relleno:	39.36	393.60

Cota Terreno: 248.40
Cota Subrasante: 250.84


2+840



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	8.83	88.30
Relleno:	38.84	388.40

Cota Terreno: 248.47
Cota Subrasante: 250.86


2+850



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	11.62	116.20
Relleno:	39.07	390.70

Cota Terreno: 248.80
Cota Subrasante: 250.89


2+860



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	17.94	179.40
Relleno:	47.30	473.00

Cota Terreno: 248.61
Cota Subrasante: 250.92


2+870



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	10.36	103.60
Relleno:	47.32	473.20

Cota Terreno: 248.37
Cota Subrasante: 250.95


2+880



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	9.29	92.90
Relleno:	43.75	437.50

Cota Terreno: 248.52
Cota Subrasante: 250.98


2+890



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	8.37	83.70
Relleno:	44.47	444.70

Cota Terreno: 248.40
Cota Subrasante: 251.01

2+900



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	7.29	72.90
Relleno:	44.01	440.10

Cota Terreno: 247.81
Cota Subrasante: 251.04

12418

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 20211301010978

CORTE
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL


2+910



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	5.27	52.70
Relleno:	40.43	404.30

Cota Terreno: 248.42
Cota Subrasante: 251.07


2+960



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	4.79	47.90
Relleno:	41.15	411.50

Cota Terreno: 248.53
Cota Subrasante: 251.23


2+920



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	4.27	42.70
Relleno:	39.22	392.20

Cota Terreno: 248.29
Cota Subrasante: 251.11


2+970



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	9.33	93.30
Relleno:	48.08	480.80

Cota Terreno: 248.46
Cota Subrasante: 251.26


2+930



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	4.30	43.00
Relleno:	41.31	413.10

Cota Terreno: 247.85
Cota Subrasante: 251.14


2+980



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	10.38	103.80
Relleno:	43.24	432.40

Cota Terreno: 248.98
Cota Subrasante: 251.29


2+940



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	8.81	88.10
Relleno:	48.41	484.10

Cota Terreno: 247.67
Cota Subrasante: 251.17


2+990



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	9.21	92.10
Relleno:	32.31	323.10

Cota Terreno: 249.79
Cota Subrasante: 251.29


2+950



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	7.68	76.80
Relleno:	41.13	411.30

Cota Terreno: 248.40
Cota Subrasante: 251.20

3+000



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	15.71	157.10
Relleno:	44.00	440.00

Cota Terreno: 249.24
Cota Subrasante: 251.28

FIRMA

FERNANDO ROJAS

LUIS FERNANDO ROJAS MERCHAN
TOPOGRAFO CONTRATISTA
M.P. 01-18966
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

Fredy Acosta

FREDY GONZALO ACOSTA FERRO
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-20180
CONSORCIO INTER AIM

12419

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	28/04/2026
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	Parcial N°04
CAPITULO:	EXCAVACIONES

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,3	TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
TRANSPORTE DIPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES					5.513,37 ✓
SE ANEXA MEMORIA DE CALCULO TRANSPORTE DE EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS					
PASAN:				SUBTOTAL	5.513,37 ✓
				TOTAL	5.513,37 ✓

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-095108

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149

Firma
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-091115

Firma
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-193762

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12420

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META	TRANSPORTE EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS

EXCAVACION DESDE	EXCAVACION HASTA	PREDIO FINCA LA GLORIETA	VOLUMEN M3	DISTANCIA KM	TOTAL M3/KM
K 0+0	K 0+20	K 01+890	241,2	1,8900	455,87
K 0+20	K 0+40	K 01+890	100,6	1,8700	188,12
K 0+40	K 0+60	K 01+890	215,2	1,8500	398,12
K 0+60	K 0+80	K 01+890	172,4	1,8300	315,49
K 0+80	K 0+100	K 01+890	266	1,8100	481,46
K 0+100	K 0+120	K 01+890	477,4	1,7900	854,55
K 0+120	K 0+140	K 01+890	495,4	1,7700	876,86
K 0+140	K 0+160	K 01+890	171,6	1,7500	300,30
K 0+160	K 0+180	K 01+890	413	1,7300	714,49
K 0+180	K 0+200	K 01+890	390,6	1,7100	667,93
K 0+200	K 0+220	K 01+890	401,8	1,6900	679,04
K 0+220	K 0+240	K 01+890	395	1,6700	659,65
K 0+240	K 0+260	K 01+890	210,2	1,6500	346,83
K 0+260	K 0+280	K 01+890	350	1,6300	570,50
K 0+280	K 0+300	K 01+890	68,8	1,6100	110,77
K 0+300	K 0+320	K 01+890	264	1,5900	419,76
K 0+320	K 0+340	K 01+890	206	1,5700	323,42
K 0+340	K 0+360	K 01+890	53	1,5500	82,15
K 0+360	K 0+380	K 01+890	164	1,5300	250,92
K 0+380	K 0+400	K 01+890	119,4	1,5100	180,29
K 0+400	K 0+420	K 01+890	121	1,4900	180,29
K 0+420	K 0+440	K 01+890	352,2	1,4700	517,73
K 0+440	K 0+460	K 01+890	298,2	1,4500	432,39
K 0+460	K 0+480	K 01+890	233	1,4300	333,19
K 0+480	K 0+500	K 01+890	242,4	1,4100	341,78
K 0+500	K 0+520	K 01+890	141,6	1,3900	196,82
K 0+520	K 0+540	K 01+890	156,2	1,3700	213,99
K 0+540	K 0+560	K 01+890	147,6	1,3500	199,26
K 0+560	K 0+580	K 01+890	116,8	1,3300	155,34
K 0+580	K 0+600	K 01+890	226,6	1,3100	296,85
K 0+600	K 0+620	K 01+890	197,2	1,2900	254,39
K 0+620	K 0+640	K 01+890	216,4	1,2700	274,83
K 0+640	K 0+660	K 01+890	152,2	1,2500	190,25
K 0+660	K 0+680	K 01+890	177	1,2300	217,71
K 0+680	K 0+700	K 01+890	93	1,2100	112,53
K 0+700	K 0+720	K 01+890	155	1,1900	184,45
K 0+720	K 0+740	K 01+890	168	1,1700	196,56
K 0+740	K 0+760	K 01+890	156	1,1500	179,40
K 0+760	K 0+780	K 01+890	131,2	1,1300	148,26
K 0+780	K 0+800	K 01+890	172	1,1100	190,92
K 0+800	K 0+820	K 01+890	155,6	1,0900	169,60
K 0+820	K 0+840	K 01+890	220,2	1,0700	235,61
K 0+840	K 0+860	K 01+890	170,6	1,0500	179,13
K 0+860	K 0+880	K 01+890	202	1,0300	208,06
K 0+880	K 0+900	K 01+890	129,4	1,0100	130,69
K 0+900	K 0+920	K 01+890	183,8	0,9900	181,96
K 0+920	K 0+940	K 01+890	178,4	0,9700	173,05
K 0+940	K 0+960	K 01+890	209,2	0,9500	198,74
K 0+960	K 0+980	K 01+890	248,2	0,9300	230,83
K 0+980	K 01+000	K 01+890	255,6	0,9100	232,60
K 01+000	K 01+020	K 01+890	277,4	0,8900	246,89
K 01+020	K 01+040	K 01+890	242,4	0,8700	210,89
K 01+040	K 01+060	K 01+890	281,8	0,8500	239,53
K 01+060	K 01+080	K 01+890	194,2	0,8300	161,19
K 01+080	K 01+100	K 01+890	136,8	0,8100	110,81
K 01+100	K 01+120	K 01+890	230,8	0,7900	182,33
K 01+120	K 01+140	K 01+890	178,8	0,7700	137,68
K 01+140	K 01+160	K 01+890	295	0,7500	221,25
K 01+160	K 01+180	K 01+890	119,2	0,7300	87,02
K 01+180	K 01+200	K 01+890	214	0,7100	151,94
K 01+200	K 01+220	K 01+890	310	0,6900	213,90
K 01+220	K 01+240	K 01+890	386	0,6700	258,62
K 01+240	K 01+260	K 01+890	324,2	0,6500	210,73
K 01+260	K 01+280	K 01+890	300,6	0,6300	189,38
K 01+280	K 01+300	K 01+890	312,6	0,6100	190,69
K 01+300	K 01+320	K 01+890	273,2	0,5900	161,19
K 01+320	K 01+340	K 01+890	98,2	0,5700	55,97
K 01+340	K 01+360	K 01+890	40,8	0,5500	22,44
K 01+360	K 01+380	K 01+890	206,8	0,5300	109,60
K 01+380	K 01+400	K 01+890	31,2	0,5100	15,91
K 01+400	K 01+420	K 01+890	104	0,4900	50,96
K 01+420	K 01+440	K 01+890	350,2	0,4700	164,59
K 01+440	K 01+460	K 01+890	289,4	0,4500	130,23
K 01+460	K 01+480	K 01+890	102	0,4300	43,86
K 01+480	K 01+500	K 01+890	194,8	0,4100	79,87
K 01+500	K 01+520	K 01+890	160,6	0,3900	62,63

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META				TRANSPORTE EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS
K 01+520	K 01+540	K 01+890	133	0,3700	49,21
K 01+540	K 01+560	K 01+890	149,6	0,3500	52,36
K 01+560	K 01+580	K 01+890	183,4	0,3300	60,52
K 01+580	K 01+600	K 01+890	131,4	0,3100	40,73
K 01+600	K 01+620	K 01+890	210,4	0,2900	61,02
K 01+620	K 01+640	K 01+890	366,2	0,2700	98,87
K 01+640	K 01+660	K 01+890	238,6	0,2500	59,65
K 01+660	K 01+680	K 01+890	230,6	0,2300	53,04
K 01+680	K 01+700	K 01+890	305,6	0,2100	64,18
K 01+700	K 01+720	K 01+890	285,6	0,1900	54,26
K 01+720	K 01+740	K 01+890	276,4	0,1700	46,99
K 01+740	K 01+760	K 01+890	233,6	0,1500	35,04
K 01+760	K 01+780	K 01+890	276,2	0,1300	35,91
K 01+780	K 01+800	K 01+890	252,8	0,1100	27,81
K 01+800	K 01+820	K 01+890	279,2	0,0900	25,13
K 01+820	K 01+840	K 01+890	259,2	0,0700	18,14
K 01+840	K 01+860	K 01+890	339,8	0,0500	16,99
K 01+860	K 01+880	K 01+890	351,8	0,0300	10,55
K 01+880	K 01+900	K 01+890	315,8	0,0100	3,16
K 01+900	K 01+920	K 01+890	345	0,0100	3,45
K 01+920	K 01+940	K 01+890	266,6	0,0300	8,00
K 01+940	K 01+960	K 01+890	279,2	0,0500	13,96
K 01+960	K 01+980	K 01+890	243,8	0,0700	17,07
K 01+980	K 02+000	K 01+890	251	0,0900	22,59
K 02+000	K 02+020	K 01+890	128,8	0,1100	14,17
K 02+020	K 02+040	K 01+890	101	0,1300	13,13
K 02+040	K 02+060	K 01+890	140,8	0,1500	21,12
K 02+060	K 02+080	K 01+890	102,4	0,1700	17,41
K 02+080	K 02+100	K 01+890	63,8	0,1900	12,12
K 02+100	K 02+120	K 01+890	232,2	0,2100	48,76
K 02+120	K 02+140	K 01+890	111,8	0,2300	25,71
K 02+140	K 02+160	K 01+890	156,4	0,2500	39,10
K 02+160	K 02+180	K 01+890	123,2	0,2700	33,26
K 02+180	K 02+200	K 01+890	75,6	0,2900	21,92
K 02+200	K 02+220	K 01+890	32	0,3100	9,92
K 02+220	K 02+240	K 01+890	41,6	0,3300	13,73
K 02+240	K 02+260	K 01+890	34,8	0,3500	12,18
K 02+260	K 02+280	K 01+890	44	0,3700	16,28
K 02+280	K 02+300	K 01+890	33,6	0,3900	13,10
K 02+300	K 02+310	K 01+890	15,6	0,4100	6,40
K 02+310	K 02+320	K 01+890	92,4	0,4200	38,81
K 02+320	K 02+330	K 01+890	141,7	0,4300	60,93
K 02+330	K 02+340	K 01+890	97,9	0,4400	43,08
K 02+340	K 02+350	K 01+890	71,3	0,4500	32,09
K 02+350	K 02+360	K 01+890	103,8	0,4600	47,75
K 02+360	K 02+370	K 01+890	112,9	0,4700	53,06
K 02+370	K 02+380	K 01+890	112,5	0,4800	54,00
K 02+380	K 02+390	K 01+890	129	0,4900	63,21
K 02+390	K 02+400	K 01+890	139,7	0,5000	69,85
K 02+400	K 02+410	K 01+890	87,5	0,5100	44,63
K 02+410	K 02+420	K 01+890	117,1	0,5200	60,89
K 02+420	K 02+430	K 01+890	60,1	0,5300	31,85
K 02+430	K 02+440	K 01+890	46	0,5400	24,84
K 02+440	K 02+450	K 01+890	64,1	0,5500	35,26
K 02+450	K 02+460	K 01+890	37,2	0,5600	20,83
K 02+460	K 02+470	K 01+890	47,5	0,5700	27,08
K 02+470	K 02+480	K 01+890	112	0,5800	64,96
K 02+480	K 02+490	K 01+890	104,8	0,5900	61,83
K 02+490	K 02+500	K 01+890	103,5	0,6000	62,10
K 02+500	K 02+510	K 01+890	49,2	0,6100	30,01
K 02+510	K 02+520	K 01+890	81,6	0,6200	50,59
K 02+520	K 02+530	K 01+890	97	0,6300	61,11
K 02+530	K 02+540	K 01+890	71,6	0,6400	45,82
K 02+540	K 02+550	K 01+890	88,7	0,6500	57,66
K 02+550	K 02+560	K 01+890	81	0,6600	53,46
K 02+560	K 02+570	K 01+890	139,1	0,6700	93,20
K 02+570	K 02+580	K 01+890	129,8	0,6800	88,26
K 02+580	K 02+590	K 01+890	88,4	0,6900	61,00
K 02+590	K 02+600	K 01+890	165,3	0,7000	115,71
K 02+600	K 02+610	K 01+890	112,9	0,7100	80,16
K 02+610	K 02+620	K 01+890	79,3	0,7200	57,10
K 02+620	K 02+630	K 01+890	75,8	0,7300	55,33
K 02+630	K 02+640	K 01+890	77,2	0,7400	57,13
K 02+640	K 02+650	K 01+890	141,3	0,7500	105,98
K 02+650	K 02+660	K 01+890	105,2	0,7600	79,95
K 02+660	K 02+670	K 01+890	90,4	0,7700	69,61
K 02+670	K 02+680	K 01+890	81,3	0,7800	63,41

12422

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META				TRANSPORTE EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS
K 02+680	K 02+690	K 01+890	163,8	0,7900	129,40
K 02+690	K 02+700	K 01+890	153,5	0,8000	122,80
K 02+700	K 02+710	K 01+890	144,7	0,8100	117,21
K 02+710	K 02+720	K 01+890	140,7	0,8200	115,37
K 02+720	K 02+730	K 01+890	141,2	0,8300	117,20
K 02+730	K 02+740	K 01+890	106,4	0,8400	89,38
K 02+740	K 02+750	K 01+890	84,3	0,8500	71,66
K 02+750	K 02+760	K 01+890	71,9	0,8600	61,83
K 02+760	K 02+770	K 01+890	85,8	0,8700	74,65
K 02+770	K 02+780	K 01+890	105,8	0,8800	93,10
K 02+780	K 02+790	K 01+890	120,9	0,8900	107,60
K 02+790	K 02+800	K 01+890	79,2	0,9000	71,28
K 02+800	K 02+810	K 01+890	117,3	0,9100	106,74
K 02+810	K 02+820	K 01+890	131,8	0,9200	121,26
K 02+820	K 02+830	K 01+890	94,9	0,9300	88,26
K 02+830	K 02+840	K 01+890	86,8	0,9400	81,59
K 02+840	K 02+850	K 01+890	88,3	0,9500	83,89
K 02+850	K 02+860	K 01+890	116,2	0,9600	111,55
K 02+860	K 02+870	K 01+890	179,4	0,9700	174,02
K 02+870	K 02+880	K 01+890	103,6	0,9800	101,53
K 02+880	K 02+890	K 01+890	92,9	0,9900	91,97
K 02+890	K 02+900	K 01+890	83,7	1,0000	83,70
K 02+900	K 02+910	K 01+890	72,9	1,0100	73,63
K 02+910	K 02+920	K 01+890	52,7	1,0200	53,75
K 02+920	K 02+930	K 01+890	42,7	1,0300	43,98
K 02+930	K 02+940	K 01+890	43	1,0400	44,72
K 02+940	K 02+950	K 01+890	88,1	1,0500	92,51
K 02+950	K 02+960	K 01+890	76,8	1,0600	81,41
K 02+960	K 02+970	K 01+890	47,9	1,0700	51,25
K 02+970	K 02+980	K 01+890	93,3	1,0800	100,76
K 02+980	K 02+990	K 01+890	103,8	1,0900	113,14
K 02+990	K 03+000	K 01+890	92,1	1,1000	101,31
DESCUENTO PARCIAL No. 1					-20122,37
			TOTAL		5.513,37

- $ 20 685.74

FIRMA

FERNANDO ROJAS

LUIS FERNANDO ROJAS MERCHAN
TOPOGRAFO CONTRATISTA
M.P. 01-18966
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

Fredy Acosta.

FREDY GONZALO ACOSTA FERRO
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-20180
CONSORCIO INTER AIM

12423

CONSORCIO INTER AIM

CERTIFICACIÓN

Nosotros, los abajo firmantes y representantes legales del **CONSORCIO INTER AIM,** en virtud del contrato No. **0250 de 2023** como interventores y del **CONSORCIO HALCÓN** bajo el contrato No. **0775 de 2022** como contratistas de obra, procedemos a certificar lo concerniente al proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA", con código BPIN 20211301010978.

Que el lugar donde se lleva a cabo la disposición final de los residuos provenientes de excavación es el **Predio Finca La Glorieta**, el cual posee la debida autorización por Secretaría Planeación de Vista Hermosa mediante el oficio **AMVH-0662**, donde se expresa "*Nos permitimos autorizar los sitios de disposición final de sobrantes como material de relleno biodegradable generados en el proceso del proyecto vial*", este predio se encuentra ubicado en el K1+890 desde el punto inicial del proyecto.

Se anexa al presente documento un plano que indica la distancia a la fuente de material y oficio AMVH-0662 en dos folios.

Este certificado se emite en la ciudad de Villavicencio, a los veinte (20) días del mes de noviembre del año 2024.

Ing. **BORIS GAITAN CUERVO**
Representante Legal
CONSORCIO INTER AIM
C. de Interventoría 0250 DE 2023

Ing. **DANIEL ENGATIVA RODRIGUEZ**
Representante Legal
CONSORCIO HALCÓN
C. obra 0775 de 2022

12424

CONSORCIO INTER AIM



Calle 18 No. 40A – 39 41, Barrio Villa María – Villavicencio - Meta
consorciointeraim@gmail.com

Nit. 892.099.173-8

AMVH-0662, Vista Hermosa (Meta), 18 de diciembre de 2023

SEÑORES
CONSORCIO HALCÓN
NIT. 901.666.148-8

Asunto: Autorización de sitios de disposición final de sobrantes.

Reciban un cordial saludo de la administración municipal, deseándoles éxitos en sus labores diarias, en relación con el asunto nos permitimos autorizar los sitios de disposición final de sobrantes como material de relleno biodegradable generados en los procesos del proyecto vial "Mejoramiento de la vía que comunica el Centro Poblado Piñalito con el Centro Poblado Santo Domingo en el municipio de Vista Hermosa, Meta", proyecto BPIN 20211301010978, Contrato N. 0775 de 2022.

Los predios autorizados son los siguientes:

1. Predio La Betulia, localizado en la Vereda La Balastrera, del señor Oscar Padilla; coordenadas del predio: 3°05'14.2"N 73°44'10.2"W

2. Predio Finca La Glorieta, localizado en la Vereda La Argentina, del señor Antonio Gómez León; coordenadas del predio: 2°57'50.6"N 73°41'03.0"W

Para constancia de lo anterior, se firma en el despacho de Planeación municipal a los (18) días del mes de diciembre de 2023.

Paola Alvarado Rojas
PAOLA ANDREA ALVARADO ROJAS
Secretaría Planeación Municipal

ELABORÓ
PAOLA ALVARADO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN

REVISÓ
PAOLA ALVARADO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN

APROBÓ
PAOLA ALVARADO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN

Powered by CamScanner

12426

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	20211301010978
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	28/04/2026
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N°04		
CAPITULO:	**RELLENOS**		
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**UNIDAD**
2.1	**RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO**		**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K5+450	K5+650			850,50
SE ANEXA CARTERA DEL RELLENO MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"					
PASAN:				**SUBTOTAL**	850,50
				TOTAL	850,50

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-095108

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149

Firma
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-091115

Firma
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-193762

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12427

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 05+450	K 05+460	10	2,58	25,80
K 05+460	K 05+470	10	2,58	25,80
K 05+470	K 05+480	10	2,08	20,80
K 05+480	K 05+490	10	1,87	18,70
K 05+490	K 05+500	10	1,79	17,90
K 05+500	K 05+510	10	1,79	17,90
K 05+510	K 05+520	10	1,79	17,90
K 05+520	K 05+530	10	1,79	17,90
K 05+530	K 05+540	10	1,79	17,90
K 05+540	K 05+550	10	1,79	17,90
K 05+550	K 05+560	10	1,79	17,90
K 05+560	K 05+570	10	1,79	17,90
K 05+570	K 05+580	10	1,79	17,90
K 05+580	K 05+590	10	1,79	17,90
K 05+590	K 05+600	10	2,68	26,80
K 05+600	K 05+610	10	4,94	49,40
K 05+610	K 05+620	10	6,66	66,60
K 05+620	K 05+630	10	8,4	84,00
K 05+630	K 05+640	10	10,41	104,10
K 05+640	K 05+650	10	11,91	119,10
K 05+650	K 05+660	10	13,04	130,40
	TOTAL			850,50

FIRMA

FERNANDO ROJAS

LUIS FERNANDO ROJAS MERCHAN
TOPOGRAFO CONTRATISTA
M.P. 01-18966
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

Fredy Acosta.

FREDY GONZALO ACOSTA FERRO
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-20180
CONSORCIO INTER AIM

1242

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO 0775 DE 2022

PROYECTO BPIN 20211301010978

CORTE
RELLENO
SUB-BASE
BASE ESTABILIZADA
TERRENO NATURAL


5+450



Cota Terreno: 256.28
Cota Subrasante: 255.20

Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	12.23	122.30
Relleno:	2.58	25.80
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40


5+460



Cota Terreno: 257.00
Cota Subrasante: 255.36

Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	17.81	178.10
Relleno:	2.58	25.80
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40


5+470



Cota Terreno: 257.28
Cota Subrasante: 255.46

Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	18.40	184.00
Relleno:	2.08	20.80
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40


5+480



Cota Terreno: 257.07
Cota Subrasante: 255.50

Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	15.85	158.50
Relleno:	1.87	18.70
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40


5+490



Cota Terreno: 256.67
Cota Subrasante: 255.49

Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	11.44	114.40
Relleno:	1.79	17.90
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40


5+500



Cota Terreno: 256.42
Cota Subrasante: 255.42

Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	9.98	99.80
Relleno:	1.79	17.90
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40


5+510



Cota Terreno: 256.25
Cota Subrasante: 255.32

Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	9.51	95.10
Relleno:	1.79	17.90
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40


5+520



Cota Terreno: 256.11
Cota Subrasante: 255.22

Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	9.46	94.60
Relleno:	1.79	17.90
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

5+530



Cota Terreno: 256.03
Cota Subrasante: 255.11

Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	9.40	94.00
Relleno:	1.79	17.90
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

12429

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO 0775 DE 2022

PROYECTO BPIN 20211301010978

CORTE
RELLENO
SUB–BASE
BASE ESTABILIZADA
TERRENO NATURAL


5+540



Cota Terreno: 256.17
Cota Subrasante: 255.01

Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	11.17	111.70
Relleno:	1.79	17.90
Sub–Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40


5+550



Cota Terreno: 256.10
Cota Subrasante: 254.91

Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	11.82	118.20
Relleno:	1.79	17.90
Sub–Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40


5+560



Cota Terreno: 255.84
Cota Subrasante: 254.80

Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	10.04	100.40
Relleno:	1.79	17.90
Sub–Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40


5+570



Cota Terreno: 255.39
Cota Subrasante: 254.70

Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	7.20	72.00
Relleno:	1.79	17.90
Sub–Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40


5+580



Cota Terreno: 254.75
Cota Subrasante: 254.60

Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	3.29	32.90
Relleno:	1.79	17.90
Sub–Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40


5+590



Cota Terreno: 254.24
Cota Subrasante: 254.49

Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	0.78	7.80
Relleno:	2.88	28.80
Sub–Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40


5+600



Cota Terreno: 253.95
Cota Subrasante: 254.39

Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	1.29	12.90
Relleno:	4.94	49.40
Sub–Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40


5+610



Cota Terreno: 253.69
Cota Subrasante: 254.31

Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	1.43	14.30
Relleno:	8.68	86.80
Sub–Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40


5+620



Cota Terreno: 253.52
Cota Subrasante: 254.29

Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	1.88	18.80
Relleno:	8.40	84.00
Sub–Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

5+630



Cota Terreno: 253.41
Cota Subrasante: 254.31

Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	2.23	22.30
Relleno:	10.41	104.10
Sub–Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

12430

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO 0775 DE 2022

PROYECTO BPIN 20211301010978

CORTE
RELLENO
SUB-BASE
BASE ESTABILIZADA
TERRENO NATURAL


5+640

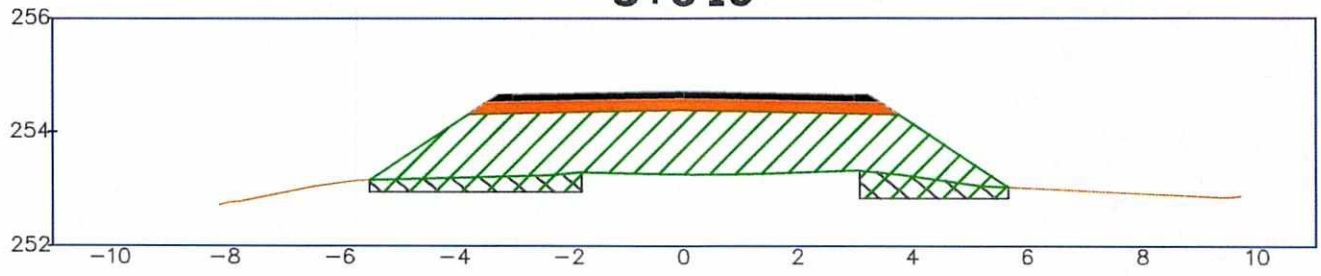

Cota Terreno: 253.27
Cota Subrasante: 254.39

Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	1.81	18.10
Relleno:	11.91	119.10
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

5+650

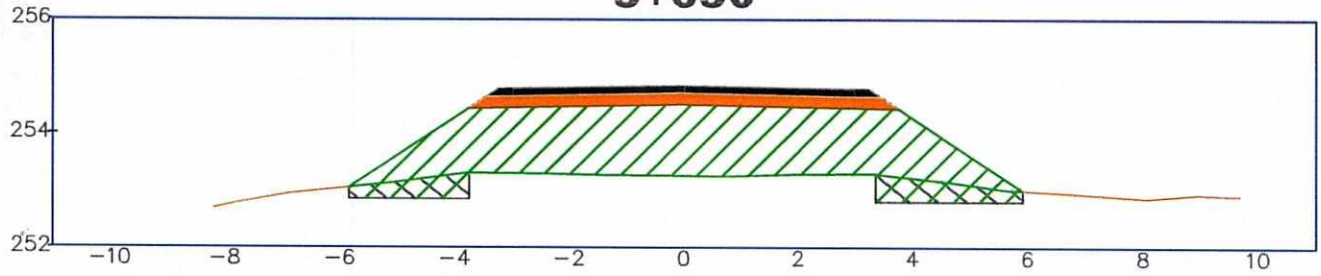

Cota Terreno: 253.26
Cota Subrasante: 254.52

Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	1.55	15.50
Relleno:	13.04	130.40
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

FIRMA

FERNANDO ROJAS

LUIS FERNANDO ROJAS MERCHAN
TOPOGRAFO CONTRATISTA
M.P. 01-18966
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

Fredy Acosta

FREDY GONZALO ACOSTA FERRO
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-20180
CONSORCIO INTER AIM

12431

CONSORCIO INTER AIM

CERTIFICACIÓN

Nosotros, los abajo firmantes y representantes legales del **CONSORCIO INTER AIM,** en virtud del contrato No. **0250 de 2023** como interventores y del **CONSORCIO HALCÓN** bajo el contrato No. **0775 de 2022** como contratistas de obra, procedemos a certificar lo concerniente al proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA", con código BPIN 20211301010978.

Que la fuente de material utilizada en las actividades de **relleno** corresponde al **Rio Guejar,** específicamente de la vereda La Balastrera, situada en el municipio de Vista Hermosa. Esta fuente de material es la más cercana al proyecto mencionado, a una distancia de 17,6 km hasta el punto inicial del proyecto K0+000 y fue la aprobada inicialmente, así como certificada en los estudios y diseños realizados por la consultoría, los cuales fueron entregados por la **Agencia para la Infraestructura del Meta.**


Se anexa al presente documento un plano que indica la distancia a la fuente de material en un folio.

Este certificado se emite en la ciudad de Villavicencio, a los veinte (20) días del mes de noviembre del año 2024.

Ing. **BORIS GAITAN CUERVO**
Representante Legal
CONSORCIO INTER AIM
C. de Interventoría 0250 DE 2023

Ing. **DANIEL ENGATIVA RODRIGUEZ**
Representante Legal
CONSORCIO HALCÓN
C. obra 0775 de 2022

CONSORCIO INTER AIM

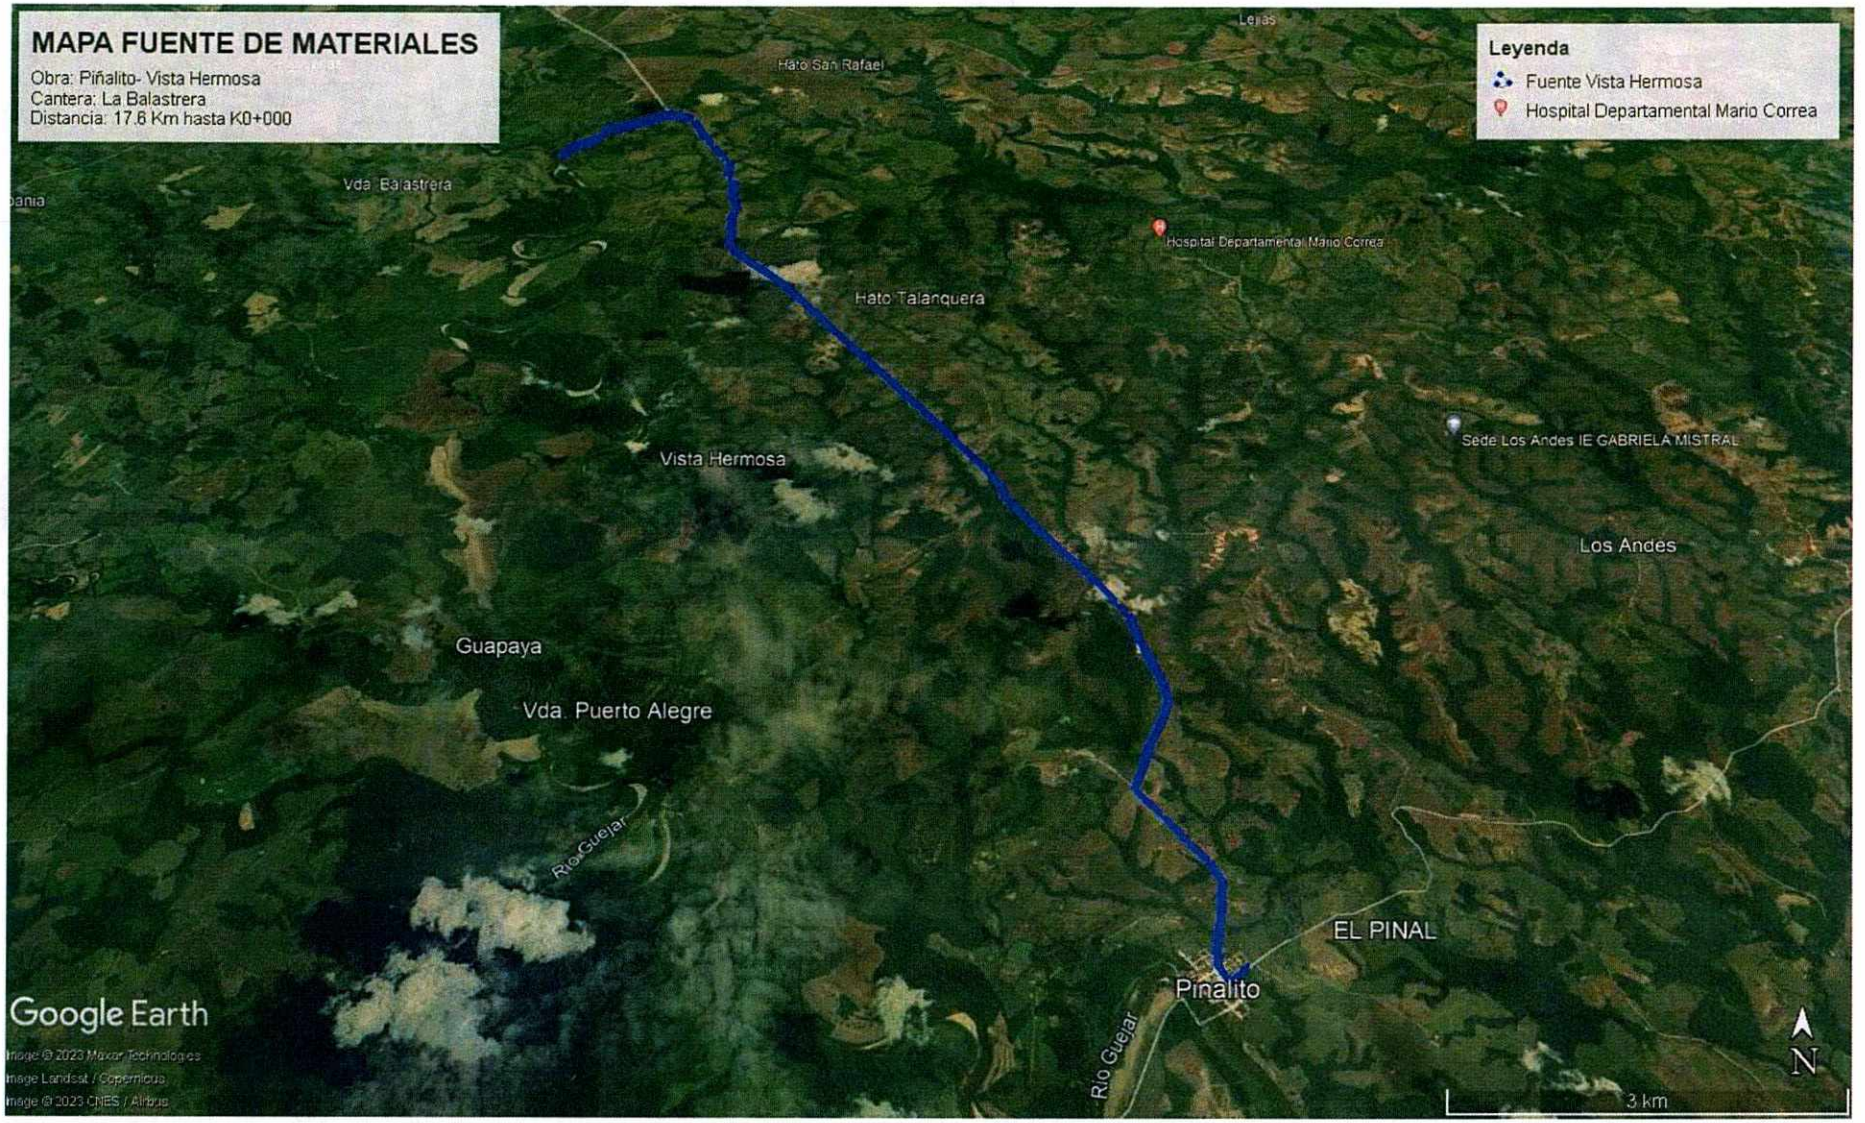

Calle 18 No. 40A – 39 41, Barrio Villa María – Villavicencio - Meta
consorciointeraim@gmail.com

12433

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	28/04/2026
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N°04		
CAPITULO:	RELLENOS		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
2.2	GEOTEXTIL T 1700 SUMINISTRO E INSTALACION		M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	ANCHO	TOTAL
GEOTEXTIL T 1700 SUMINISTRO E INSTALACION MARGEN DERECHA	K2+990	K3+500	510,00	3,70	1887,00
GEOTEXTIL T 1700 SUMINISTRO E INSTALACION MARGEN DERECHA	K5+450	K5+650	200,00	3,70	740,00
GEOTEXTIL T 1700 SUMINISTRO E INSTALACION MARGEN IZQUIERDA	K2+620	K3+500	880,00	3,70	3256,00
GEOTEXTIL T 1700 SUMINISTRO E INSTALACION MARGEN IZQUIERDA	K5+450	K5+650	200,00	3,70	740,00
PASAN:				SUBTOTAL	6.623,00
				TOTAL	6.623,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-095108

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149

Firma
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-091115

Firma
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-193762

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12434

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	28/04/2026
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N°04		
CAPITULO:	RELLENOS		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
2,5	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR		M3/KM

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	K0+000	K3+100			2.950.832,73
DESCUENTO PARCIALES ANTERIORES					-2164069,67
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	K5+450	K5+650			24665,66
SE ANEXA MEMORIA DE CALCULO TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR					
PASAN:				SUBTOTAL	811.428,72
				TOTAL	811.428,72

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA






Firma
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-095108

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149

Firma
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-091115

Firma
Nombre: JOHAT HANJANDRES GAVIRIA CONTRERAS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-193762

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.	TRANSPORTE DE RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"

DESDE	VOLUMEN	VOLUMEN CON FACTOR DE EXPANSION	DISTANCIA	TOTAL
K 0+0	181,80	227,25	17,61	4001,87
K 0+20	168,60	210,75	17,63	3715,52
K 0+40	501,00	626,25	17,65	11053,31
K 0+60	540,40	675,50	17,67	11936,09
K 0+80	678,00	847,50	17,69	14992,28
K 0+100	1007,80	1259,75	17,71	22310,17
K 0+120	1059,80	1324,75	17,73	23487,82
K 0+140	904,20	1130,25	17,75	20061,94
K 0+160	908,00	1135,00	17,77	20168,95
K 0+180	858,60	1073,25	17,79	19093,12
K 0+200	876,40	1095,50	17,81	19510,86
K 0+220	863,60	1079,50	17,83	19247,49
K 0+240	807,40	1009,25	17,85	18015,11
K 0+260	798,20	997,75	17,87	17829,79
K 0+280	625,40	781,75	17,89	13985,51
K 0+300	869,40	1086,75	17,91	19463,69
K 0+320	723,40	904,25	17,93	16213,20
K 0+340	409,40	511,75	17,95	9185,91
K 0+360	514,00	642,50	17,97	11545,73
K 0+380	559,20	699,00	17,99	12575,01
K 0+400	645,20	806,50	18,01	14525,07
K 0+420	871,20	1089,00	18,03	19634,67
K 0+440	789,00	986,25	18,05	17801,81
K 0+460	810,80	1013,50	18,07	18313,95
K 0+480	817,60	1022,00	18,09	18487,98
K 0+500	793,20	991,50	18,11	17956,07
K 0+520	820,00	1025,00	18,13	18583,25
K 0+540	823,20	1029,00	18,15	18676,35
K 0+560	752,00	940,00	18,17	17079,80
K 0+580	852,60	1065,75	18,19	19385,99
K 0+600	863,20	1079,00	18,21	19648,59
K 0+620	916,20	1145,25	18,23	20877,91
K 0+640	873,00	1091,25	18,25	19915,31
K 0+660	926,60	1158,25	18,27	21161,23
K 0+680	877,40	1096,75	18,29	20059,56
K 0+700	1024,60	1280,75	18,31	23450,53
K 0+720	1060,20	1325,25	18,33	24291,83
K 0+740	1023,00	1278,75	18,35	23465,06
K 0+760	1009,40	1261,75	18,37	23178,35
K 0+780	1010,00	1262,50	18,39	23217,38
K 0+800	1022,20	1277,75	18,41	23523,38
K 0+820	1061,60	1327,00	18,43	24456,61
K 0+840	994,40	1243,00	18,45	22933,35
K 0+860	963,80	1204,75	18,47	22251,73
K 0+880	967,20	1209,00	18,49	22354,41
K 0+900	1015,40	1269,25	18,51	23493,82
K 0+920	1039,20	1299,00	18,53	24070,47
K 0+940	1105,60	1382,00	18,55	25636,10
K 0+960	1108,80	1386,00	18,57	25738,02
K 0+980	1110,40	1388,00	18,59	25802,92
K 01+000	1196,60	1495,75	18,61	27835,91
K 01+020	1143,60	1429,50	18,63	26631,59
K 01+040	1168,40	1460,50	18,65	27238,33
K 01+060	1193,20	1491,50	18,67	27846,31
K 01+080	1203,00	1503,75	18,69	28105,09
K 01+100	1320,60	1650,75	18,71	30885,53
K 01+120	1190,80	1488,50	18,73	27879,61
K 01+140	1165,20	1456,50	18,75	27309,38
K 01+160	965,80	1207,25	18,77	22660,08
K 01+180	1075,60	1344,50	18,79	25263,16
K 01+200	1124,40	1405,50	18,81	26437,46
K 01+220	1105,40	1381,75	18,83	26018,35

DESDE	VOLUMEN	VOLUMEN CON FACTOR DE EXPANSION	DISTANCIA	TOTAL
K 01+240	1104,00	1380,00	18,85	26013,00
K 01+260	1108,80	1386,00	18,87	26153,82
K 01+280	1048,20	1310,25	18,89	24750,62
K 01+300	900,20	1125,25	18,91	21278,48
K 01+320	898,80	1123,50	18,93	21267,86
K 01+340	750,20	937,75	18,95	17770,36
K 01+360	944,20	1180,25	18,97	22389,34
K 01+380	913,00	1141,25	18,99	21672,34
K 01+400	895,20	1119,00	19,01	21272,19
K 01+420	1137,20	1421,50	19,03	27051,15
K 01+440	1027,80	1284,75	19,05	24474,49
K 01+460	837,20	1046,50	19,07	19956,76
K 01+480	821,20	1026,50	19,09	19595,89
K 01+500	680,40	850,50	19,11	16253,06
K 01+520	617,80	772,25	19,13	14773,14
K 01+540	636,20	795,25	19,15	15229,04
K 01+560	612,80	766,00	19,17	14684,22
K 01+580	561,60	702,00	19,19	13471,38
K 01+600	670,00	837,50	19,21	16088,38
K 01+620	772,20	965,25	19,23	18561,76
K 01+640	710,20	887,75	19,25	17089,19
K 01+660	714,20	892,75	19,27	17203,29
K 01+680	803,80	1004,75	19,29	19381,63
K 01+700	786,80	983,50	19,31	18991,39
K 01+720	787,00	983,75	19,33	19015,89
K 01+740	727,60	909,50	19,35	17598,83
K 01+760	671,20	839,00	19,37	16251,43
K 01+780	664,60	830,75	19,39	16108,24
K 01+800	716,60	895,75	19,41	17386,51
K 01+820	691,80	864,75	19,43	16802,09
K 01+840	740,80	926,00	19,45	18010,70
K 01+860	773,60	967,00	19,47	18827,49
K 01+880	787,20	984,00	19,49	19178,16
K 01+900	792,00	990,00	19,51	19314,90
K 01+920	798,80	998,50	19,53	19500,71
K 01+940	764,20	955,25	19,55	18675,14
K 01+960	783,20	979,00	19,57	19159,03
K 01+980	746,60	933,25	19,59	18282,37
K 02+000	602,40	753,00	19,61	14766,33
K 02+020	585,80	732,25	19,63	14374,07
K 02+040	597,20	746,50	19,65	14668,73
K 02+060	531,60	664,50	19,67	13070,72
K 02+080	501,80	627,25	19,69	12350,55
K 02+100	626,40	783,00	19,71	15432,93
K 02+120	521,20	651,50	19,73	12854,10
K 02+140	522,60	653,25	19,75	12901,69
K 02+160	479,80	599,75	19,77	11857,06
K 02+180	430,80	538,50	19,79	10656,92
K 02+200	366,20	457,75	19,81	9068,03
K 02+220	308,20	385,25	19,83	7639,51
K 02+240	293,80	367,25	19,85	7289,91
K 02+260	276,80	346,00	19,87	6875,02
K 02+280	191,20	239,00	19,89	4753,71
K 02+300	149,00	186,25	19,91	3708,24
K 02+310	365,60	457,00	19,92	9103,44
K 02+320	421,90	527,38	19,93	10510,58
K 02+330	374,80	468,50	19,94	9341,89
K 02+340	340,10	425,13	19,95	8481,24
K 02+350	355,30	444,13	19,96	8864,74
K 02+360	357,90	447,38	19,97	8934,08
K 02+370	339,40	424,25	19,98	8476,52
K 02+380	348,00	435,00	19,99	8695,65
K 02+390	359,40	449,25	20	8985,00
K 02+400	307,70	384,63	20,01	7696,35
K 02+410	315,20	394,00	20,02	7887,88

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.	TRANSPORTE DE RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"

DESDE	VOLUMEN	VOLUMEN CON FACTOR DE EXPANSION	DISTANCIA	TOTAL
K 02+420	230,20	287,75	20,03	5763,63
K 02+430	227,90	284,88	20,04	5708,90
K 02+440	160,90	201,13	20,05	4032,56
K 02+450	158,60	198,25	20,06	3976,90
K 02+460	192,00	240,00	20,07	4816,80
K 02+470	284,60	355,75	20,08	7143,46
K 02+480	298,20	372,75	20,09	7488,55
K 02+490	305,60	382,00	20,1	7678,20
K 02+500	272,70	340,88	20,11	6855,00
K 02+510	332,10	415,13	20,12	8352,32
K 02+520	364,70	455,88	20,13	9176,76
K 02+530	344,70	430,88	20,14	8677,82
K 02+540	370,20	462,75	20,15	9324,41
K 02+550	372,20	465,25	20,16	9379,44
K 02+560	392,30	490,38	20,17	9890,86
K 02+570	371,00	463,75	20,18	9358,48
K 02+580	414,50	518,13	20,19	10460,94
K 02+590	505,40	631,75	20,2	12761,35
K 02+600	425,60	532,00	20,21	10751,72
K 02+610	347,70	434,63	20,22	8788,12
K 02+620	287,20	359,00	20,23	7262,57
K 02+630	230,30	287,88	20,24	5826,59
K 02+640	350,20	437,75	20,25	8864,44
K 02+650	405,10	506,38	20,26	10259,16
K 02+660	411,90	514,88	20,27	10436,52
K 02+670	373,80	467,25	20,28	9475,83
K 02+680	395,40	494,25	20,29	10028,33
K 02+690	358,00	447,50	20,3	9084,25
K 02+700	420,90	526,13	20,31	10685,60
K 02+710	432,80	541,00	20,32	10993,12
K 02+720	459,80	574,75	20,33	11684,67
K 02+730	430,30	537,88	20,34	10940,38
K 02+740	401,20	501,50	20,35	10205,53
K 02+750	381,90	477,38	20,36	9719,36
K 02+760	383,80	479,75	20,37	9772,51
K 02+770	399,30	499,13	20,38	10172,17
K 02+780	342,80	428,50	20,39	8737,12
K 02+790	282,30	352,88	20,4	7198,65
K 02+800	380,70	475,88	20,41	9712,61
K 02+810	424,80	531,00	20,42	10843,02
K 02+820	403,00	503,75	20,43	10291,61
K 02+830	393,60	492,00	20,44	10056,48
K 02+840	388,40	485,50	20,45	9928,48
K 02+850	390,70	488,38	20,46	9992,15
K 02+860	473,00	591,25	20,47	12102,89
K 02+870	473,20	591,50	20,48	12113,92
K 02+880	437,50	546,88	20,49	11205,47
K 02+890	444,70	555,88	20,5	11395,44
K 02+900	440,10	550,13	20,51	11283,06
K 02+910	404,30	505,38	20,52	10370,30
K 02+920	392,20	490,25	20,53	10064,83
K 02+930	413,10	516,38	20,54	10606,34
K 02+940	484,10	605,13	20,55	12435,32
K 02+950	411,30	514,13	20,56	10570,41
K 02+960	411,50	514,38	20,57	10580,69
K 02+970	480,80	601,00	20,58	12368,58
K 02+980	432,40	540,50	20,59	11128,90
K 02+990	323,10	403,88	20,6	8319,83
K 03+000	440,00	550,00	20,61	11335,50
K 03+010	482,80	603,50	20,62	12444,17
K 03+020	491,30	614,13	20,63	12669,40
K 03+030	541,20	676,50	20,64	13962,96
K 03+040	466,00	582,50	20,65	12028,63
K 03+050	492,80	616,00	20,66	12726,56
K 03+060	475,80	594,75	20,67	12293,48

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.	TRANSPORTE DE RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"

DESDE	VOLUMEN	VOLUMEN CON FACTOR DE EXPANSION	DISTANCIA	TOTAL
K 03+070	401,70	502,13	20,68	10383,95
K 03+080	436,60	545,75	20,69	11291,57
K 03+090	478,40	598,00	20,7	12378,60
K 03+100	425,30	531,63	20,71	11009,95
K 03+110				
DESCUENTO TRANSPORTE DE RELLENO COBRADO				-2164069,67
K 05+450	25,80	32,25	23,06	743,69
K 05+460	25,80	32,25	23,07	744,01
K 05+470	20,80	26,00	23,08	600,08
K 05+480	18,70	23,38	23,09	539,73
K 05+490	17,90	22,38	23,1	516,86
K 05+500	17,90	22,38	23,11	517,09
K 05+510	17,90	22,38	23,12	517,31
K 05+520	17,90	22,38	23,13	517,53
K 05+530	17,90	22,38	23,14	517,76
K 05+540	17,90	22,38	23,15	517,98
K 05+550	17,90	22,38	23,16	518,21
K 05+560	17,90	22,38	23,17	518,43
K 05+570	17,90	22,38	23,18	518,65
K 05+580	17,90	22,38	23,19	518,88
K 05+590	26,80	33,50	23,2	777,20
K 05+600	49,40	61,75	23,21	1433,22
K 05+610	66,60	83,25	23,22	1933,07
K 05+620	84,00	105,00	23,23	2439,15
K 05+630	104,10	130,13	23,24	3024,11
K 05+640	119,10	148,88	23,25	3461,34
K 05+650	130,40	163,00	23,26	3791,38
K 05+660				
	TOTAL			811.428,72

Σ 2.975.832,33

Σ 24.655,66

FIRMA

FERNANDO ROJAS

LUIS FERNANDO ROJAS MERCHAN
TOPOGRAFO CONTRATISTA
M.P. 01-18966
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

Fredy Acosta.

FREDY GONZALO ACOSTA FERRO
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-20180
CONSORCIO INTER AIM


12439

obra

HOJA DE VIDA

LUIS FERNANDO ROJAS MERCHAN



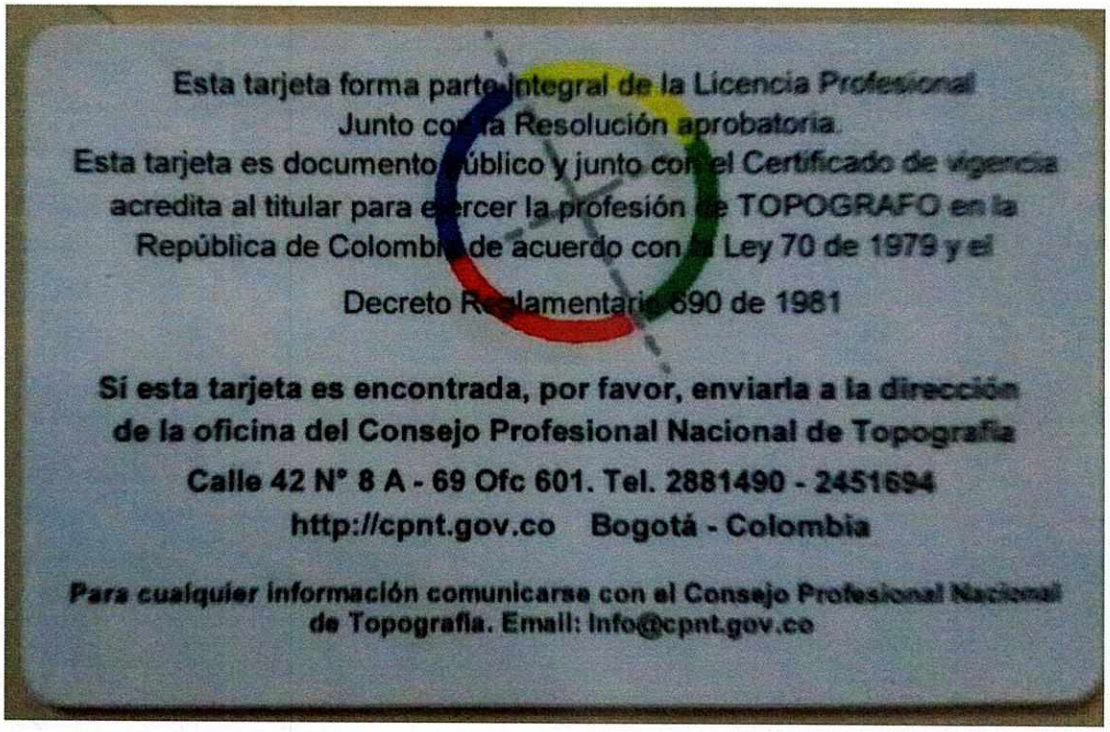

Calle 26 Nº 25-36 Barrio San Jorge, San Jose del Guaviare. Celular 313 790 6296
luisfernandorojasmerchan@gmail.com

12440

República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

Ley 70 / 79

CERTIFICADO DE VIGENCIA No: 503524/2024

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

HACE CONSTAR

Que el(la) Señor(a) **LUIS FERNANDO ROJAS MERCHAN** , identificado(a) con cédula de ciudadanía **No. 18257041** , se encuentra inscrito(a) en el Registro Único de Topógrafos RUTOPO del CPNT como **TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA** de la Institución de Educación Superior **SENA** , bajo la Licencia Profesional **No. 01-18966** con fecha de expedición del **27 de Febrero de 2019.**

Que el(la) Señor(a) **LUIS FERNANDO ROJAS MERCHAN**, tiene vigente su Licencia Profesional No. **01-18966** y a la fecha **NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** , que lo (la) inhabiliten en el ejercicio de su profesión.

Dada en Bogotá, D.C. a los **18 días del mes de Noviembre de 2024.**

LUIS ALEJANDRO ZAFRA JARAMILLO
Director Ejecutivo

FERNANDO ROJAS

***Firma del profesional**

*La firma del profesional es requerida para comprobar la anuencia de su participación en procesos contractuales. La falta de la firma del profesional NO invalida el certificado.

Notas 1- El anterior certificado no suple la Licencia Profesional para ejercer un cargo.
2- La validez del documento se puede verificar en la página web www.cpnt.gov.co a través del número de certificado de Vigencia.
3- Este certificado digital tiene plena validez de conformidad con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 527 de 1999, decreto 1747 de 2000 y Art. 6 Parágrafo 3 de la Ley 962 de 2005.

12441

1573
Interventoria



República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFIA

Nombre FREDY GONZALO ACOSTA FERRO

Cedula 1.121.818.555

Licencia Profesional No 01-20180

De fecha 08/05/2020

TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA

SENA

R 02-1018

Presidente

Esta tarjeta forma parte integral de la Licencia Profesional
Junto con la Resolución aprobatoria.
Esta tarjeta es documento público y junto con el Certificado de vigencia acredita al titular para ejercer la profesión de TOPOGRAFO en la República de Colombia de acuerdo con la Ley 70 de 1979 y el Decreto Reglamentario 690 de 1981

Si esta tarjeta es encontrada, por favor, enviarla a la dirección de la oficina del Consejo Profesional Nacional de Topografía
Calle 42 N° 8 A - 69 Ofc 601. Tel. 2881490 - 2451694
http://cpnt.gov.co Bogotá - Colombia

Para cualquier información comunicarse con el Consejo Profesional Nacional de Topografía. Email: Info@cpnt.gov.co

12442

República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

Ley 70 / 79

CERTIFICADO DE VIGENCIA No: 447164/2024

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

HACE CONSTAR

Que el(la) Señor(a) **FREDY GONZALO ACOSTA FERRO** , identificado(a) con cédula de ciudadanía **No. 1121818555** , se encuentra inscrito(a) en el Registro Único de Topógrafos RUTOPO del CPNT como **TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA** de la Institución de Educación Superior **SENA** , bajo la Licencia Profesional **No. 01-20180** con fecha de expedición del **8 de Mayo de 2020.**

Que el(la) Señor(a) **FREDY GONZALO ACOSTA FERRO**, tiene vigente su Licencia Profesional No. **01-20180** y a la fecha **NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** , que lo (la) inhabiliten en el ejercicio de su profesión.

Dada en Bogotá, D.C. a los **15 días del mes de Noviembre de 2024.**

LUIS ALEJANDRO ZAFRA JARAMILLO
Director Ejecutivo

Fredy Acosta.

***Firma del profesional**

*La firma del profesional es requerida para comprobar la anuencia de su participación en procesos contractuales. La falta de la firma del profesional NO invalida el certificado.

Notas 1- El anterior certificado no suple la Licencia Profesional para ejercer un cargo.
2- La validez del documento se puede verificar en la página web www.cpnt.gov.co a través del número de certificado de Vigencia.
3- Este certificado digital tiene plena validez de conformidad con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 527 de 1999, decreto 1747 de 2000 y Art. 6 Parágrafo 3 de la Ley 962 de 2005.

CONSORCIO HALCÓN

INFORME DE OBRA

12444

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 04

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

INFORME PARCIAL No. 04
Periodo de 01/11/2024 a 20/11/2024
Fecha de Presentación: 22 NOV. 2024

INFORMACIÓN BÁSICA	
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"; "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR DEL CONTRATO:	$ 112.964.569.993
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA
VALOR DEL PROYECTO:	$58.767.216.954
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	$58.767.216.954
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
CORREO ELECTRÓNICO:	gerencia@camelingenieria.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM
CORREO ELECTRÓNICO:	Consorciointeraim@gmail.com

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	
FECHA DE INICIACIÓN:	12/07/2023
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN No 1: (14/06/2024)	14 de junio 2024 al 13 de septiembre 2024
TIEMPO:	3 MESES
AMPLIACION 1 DE LA SUSPENSION No 1 : (13/09/2024)	14 de septiembre 2024 al 13 de noviembre 2024
TIEMPO:	2 MESES
REINICIO No 1:	01 noviembre 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	28/04/2026

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12445

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 04

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

MUNICIPIO:	Vista Hermosa		VEREDA:	N/A
CORREGIMIENTO:	Piñalito – Santo Domingo		BARRIO:	N/A
COMUNA:	N/A		N/A	N/A
COORDENADAS:	PUNTO	DESCRIPCIÓN	COORD. ESTE	COORD. NORTE
	1	Centro Poblado Piñalito	647140,78	328662,55
	2	Centra Poblado Santo Domingo	632984,56	316548,42

MAPA DE LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

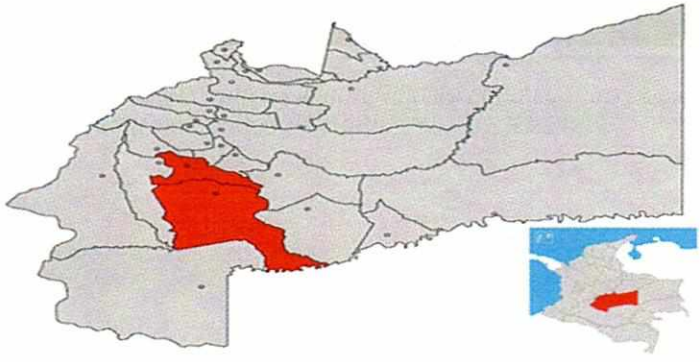


Ilustración 1 Localización departamento del Meta, Municipio Vista Hermosa (Adamisacson, 2011)



Ilustración 2 Vía que comunica el centro poblado Piñalito con el centro poblado Santo Domingo municipio de Vista Hermosa (Fuente Google Earth)

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12446

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 04

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

A. INFORME TÉCNICO

1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA

Avance físico

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 01 de fecha 19/11/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
1	**EXCAVACIONES**													
1,1	EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	M3	1.907,00	$ 63.680,00	$ 121.437.760,00	41.382,15	$ 2.635.215.073,00	1.894,00	$ 120.609.920,00	28.928,10	$ 1.842.141.408,00	30.822,10	$ 1.962.751.328,00	74,48%
1,2	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE)	M3	7.034,70	$ 48.697,00	$ 342.568.786,00	7.034,70	$ 342.568.786,00	1.446,43	$ 70.436.801,71	0,00	$ -	1.446,43	$ 70.436.801,71	20,56%
1,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	1.469.121,31	$ 1.879,00	$ 2.760.478.941,00	131.294,11	$ 246.701.628,00	45.505,99	$ 85.505.755,21	5.513,37	$ 10.359.622,23	51.019,36	$ 95.865.377,44	38,86%
	SUBTOTAL				**$ 3.224.485.487,00**		**$ 3.224.485.487,00**		**$ 276.552.476,92**		**$ 1.852.501.030,23**		**$ 2.129.053.507,15**	
2	**RELLENOS**													
2,1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	M3	175.074,00	$ 51.548,00	$ 9.024.714.552,00	222.792,89	$ 11.484.527.846,00	143.491,80	$ 7.396.715.306,40	850,50	$ 43.841.574,00	144.342,30	$ 7.440.556.880,40	64,79%

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12444

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 04

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

2,2	GEOTEXTIL T 1700 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	154.000,00	$ 14.868,00	$ 2.289.672.000,00	154.000,00	$ 2.289.672.000,00	20.757,00	$ 308.615.076,00	6.623,00	$ 98.470.764,00	27.380,00	$ 407.085.840,00	17,78%
2,3	SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	32.498,00	$ 167.272,00	$ 5.436.005.456,00	32.498,00	$ 5.436.005.456,00	2.908,80	$ 486.560.793,60	0,00	$ -	2.908,80	$ 486.560.793,60	8,95%
2,4	BASE ESTABILIZADA CON EMULSION ASFLATICA BEE 38. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR INCLUYE EMULSION.	M3	19.680,00	$ 552.999,00	$ 10.883.020.320,00	19.680,00	$ 10.883.020.320,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
2,5	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	9.891.520,60	$ 1.879,00	$ 18.586.167.207,00	8.533.287,43	$ 16.034.047.075,00	2.833.412,20	$ 5.323.981.523,80	811.428,72	$ 1.524.674.564,88	3.644.840,92	$ 6.848.656.088,68	42,71%
N.P	ÍTEMS NO PREVISTOS - RELLENOS													
N.P.2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 6" RDE 21 200 PSI UNION PLATINO	ML	0,00	$ 170.647,00	$ 0,00	1,00	$ 170.647,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 4" RDE 21 200 PSI UNION PLATINO	ML	0,00	$ 85.232,00	$ 0,00	501,70	$ 42.760.508,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 3" RDE 21 200 PSI UNION PLATINO	ML	0,00	$ 53.307,00	$ 0,00	1,00	$ 53.307,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2,9	TUBERIA PVC PF + UAD 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	$ 18.706,00	$ 0,00	200,00	$ 3.741.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACIÓN EN PVC 6" UM	UN	0,00	$ 470.342,00	$ 0,00	1,00	$ 470.342,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACIÓN EN PVC 4" UM	UN	0,00	$ 233.529,00	$ 0,00	50,00	$ 11.676.450,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACIÓN EN PVC 3" UM	UN	0,00	$ 153.992,00	$ 0,00	1,00	$ 153.992,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 04

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

N.P.2,13	VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE DE 6" JUNTA HIDRAULICA PVC. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0,00	$ 3.074.424,00	$ 0,00	1,00	$ 3.074.424,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2,14	VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE DE 4" JUNTA HIDRAULICA PVC. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0,00	$ 1.708.374,00	$ 0,00	1,00	$ 1.708.374,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2,15	VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE DE 3" JUNTA HIDRAULICA PVC. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0,00	$ 1.326.696,00	$ 0,00	1,00	$ 1.326.696,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2,16	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 66.071,00	$ 0,00	10,00	$ 660.710,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCENTRICA PVC 6" X 4" UM	UN	0,00	$ 317.741,00	$ 0,00	1,00	$ 317.741,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCENTRICA PVC 4" X 3" UM	UN	0,00	$ 159.635,00	$ 0,00	1,00	$ 159.635,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC 3" UM	UN	0,00	$ 213.239,00	$ 0,00	1,00	$ 213.239,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC DE 4" UM	UN	0,00	$ 358.279,00	$ 0,00	10,00	$ 3.582.790,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2,21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC DE 6" UM	UN	0,00	$ 957.321,00	$ 0,00	1,00	$ 957.321,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2,22	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0-2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0,00	$ 132.522,00	$ 0,00	120,00	$ 15.902.640,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2,23	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERIAS	M3	0,00	$ 175.961,00	$ 0,00	15,00	$ 2.639.415,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2,24	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA VENTOSA CAMARA SENCILLA EXTREMO ROSCADO 2"	UN	0,00	$ 978.132,00	$ 0,00	1,00	$ 978.132,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2,25	VALVULA DE PURGA 2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0,00	$ 1.669.641,00	$ 0,00	1,00	$ 1.669.641,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 04

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

N.P.2.26	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	0,00	$ 89.634,00	$ 0,00	1,00	$ 89.634,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 46.219.579.535,00**		**$ 46.219.579.535,00**	0,00	**$ 13.515.872.699,80**	0,00	**$ 1.666.986.902,88**	0,00	**$ 15.182.859.602,68**	
3	**PAVIMENTO FLEXIBLE**													
3,1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	143.000,00	$ 5.557,00	$ 794.651.000,00	143.000,00	$ 794.651.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3,2	TRATAMIENTO MEDIANTE LECHADA ASFALTICA E=8 MM	M2	143.000,00	$ 14.066,00	$ 2.011.438.000,00	143.000,00	$ 2.011.438.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 2.806.089.000,00**		**$ 2.806.089.000,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
4	**SEÑALIZACIÓN**													
4,1	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	ML	66.000,00	$ 5.944,00	$ 392.304.000,00	66.000,00	$ 392.304.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
4,2	DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR.	M2	40,70	$ 39.991,00	$ 1.627.634,00	40,70	$ 1.627.634,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
4,3	ESTOPEROL METALICO 10 X 2.5 CM	UN	2.016,00	$ 27.282,00	$ 55.000.512,00	2.016,00	$ 55.000.512,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
4,4	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	7.894,00	$ 16.061,00	$ 126.785.534,00	7.894,00	$ 126.785.534,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 04

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

4,5	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	161,00	$ 442.249,00	$ 71.202.089,00	161,00	$ 71.202.089,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
4,6	SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA (SR) CIRCULO Ø 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	74,00	$ 433.684,00	$ 32.092.616,00	74,00	$ 32.092.616,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
4,7	DEFENSA METALICA PARA CURVAS. SUMINISTRO E INSTALACION	ML	2.224,91	$ 193.934,00	$ 431.485.696,00	2.224,91	$ 431.485.696,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 1.110.498.081,00**		**$ 1.110.498.081,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
5	**ESTRUCTURAS HIDRAULICAS**													
5,1	DEMOLICIÓN CONCRETO REFORZADO (INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL)	M3	803,45	$ 485.270,00	$ 389.890.182,00	803,45	$ 389.890.182,00	160,69	$ 77.978.036,30	0,00	$ -	160,69	$ 77.978.036,30	20,00%
5,2	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL)	M3	44,65	$ 448.201,00	$ 20.012.175,00	44,65	$ 20.012.175,00	8,93	$ 4.002.434,93	0,00	$ -	8,93	$ 4.002.434,93	20,00%
5,3	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI)	M3	72,19	$ 811.099,00	$ 58.553.237,00	72,19	$ 58.553.237,00	21,91	$ 17.771.179,09	0,00	$ -	21,91	$ 17.771.179,09	30,35%
5,4	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2,G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	KG	92.035,08	$ 8.964,00	$ 825.002.457,00	92.035,08	$ 825.002.457,00	44.368,40	$ 397.718.337,60	0,00	$ -	44.368,40	$ 397.718.337,60	48,21%
5,5	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.003,82	$ 1.364.429,00	$ 1.369.641.119,00	1.003,82	$ 1.369.641.119,00	430,65	$ 587.591.348,85	0,00	$ -	430,65	$ 587.591.348,85	42,90%
	SUBTOTAL				**$ 2.663.099.170,00**		**$ 2.663.099.170,00**		**$ 1.085.061.336,77**		**$ -**		**$ 1.085.061.336,77**	
6	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**													

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 04

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

6,1	CUNETA TRIANGULAR L=0.90M E=0.12M EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	2.320,00	$ 265.131,00	$ 615.103.920,00	2.320,00	$ 615.103.920,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
6,2	POCETA EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO.	M3	50,7	$ 1.005.389,00	$ 50.973.222,00	50,70	$ 50.973.222,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
6,3	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 6" AUTOCEBANTE DIESEL	DIA	300	$ 346.339,00	$ 103.901.700,00	300,00	$ 103.901.700,00	17,00	$ 5.887.763,00	0,00	$ -	17,00	$ 5.887.763,00	5,67%
6,4	SIEMBRA CESPEDON GRAMA E=0.05 M	M2	22.500,00	$ 55.627,00	$ 1.251.607.500,00	22.500,00	$ 1.251.607.500,00	13.006,40	$ 723.507.012,80	0,00	$ -	13.006,40	$ 723.507.012,80	57,81%
	SUBTOTAL				**$ 2.021.586.342,00**		**$ 2.021.586.342,00**		**$ 729.394.775,80**		**$ -**		**$ 729.394.775,80**	
	ÍTEMS NO PREVISTOS													
N.P.1			0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2			0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
	SUBTOTAL ÍTEMS NO PREVISTOS						**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 44.309.418.026,72**		**$ 44.309.418.026,72**		**$ 11.913.649.839,15**		**$ 2.686.632.010,01**		**$ 14.600.281.849,16**	
	ADMINISTRACIÓN (27%)				**$ 11.963.542.867,21**		**$ 11.963.542.867,21**		**$ 3.216.685.456,57**		**$ 725.390.642,70**		**$ 3.942.076.099,27**	
	IMPREVISTOS (0%)				**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
	UTILIDAD (4%)				**$ 1.772.376.721,07**		**$ 1.772.376.721,07**		**$ 476.545.993,57**		**$ 107.465.280,40**		**$ 584.011.273,97**	
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				**$ 13.735.919.588,28**		**$ 13.735.919.588,28**		**$ 3.693.231.450,14**		**$ 832.855.923,10**		**$ 4.526.087.373,24**	
	PLANES DE IMPLEMENTACIÓN AMBIENTAL Y DE TRANSITO QUE NO CONSTITUYEN OBRA													
7,00	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	UND	1,00	$ 229.756.600,00	$ 229.756.600,00	1,00	$ 229.756.600,00	0,17	$ 39.058.622,00	0,00	$ -	0,17	$ 39.058.622,00	17,00%
8,00	IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	UND	1,00	$ 492.122.739,00	$ 492.122.739,00	1,00	$ 492.122.739,00	0,17	$ 83.660.865,63	0,00	$ -	0,17	$ 83.660.865,63	17,00%
	SUBTOTAL				**$ 721.879.339,00**		**$ 721.879.339,00**		**$ 122.719.487,63**		**$ -**		**$ 122.719.487,63**	
	VALOR TOTAL OBRA				**$ 58.767.216.954,00**		**$ 58.767.216.954,00**		**$ 15.729.600.776,92**		**$ 3.519.487.933,11**		**$ 19.249.088.710,03**	32,75%


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1252

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 04

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

Grafica Avance Físico

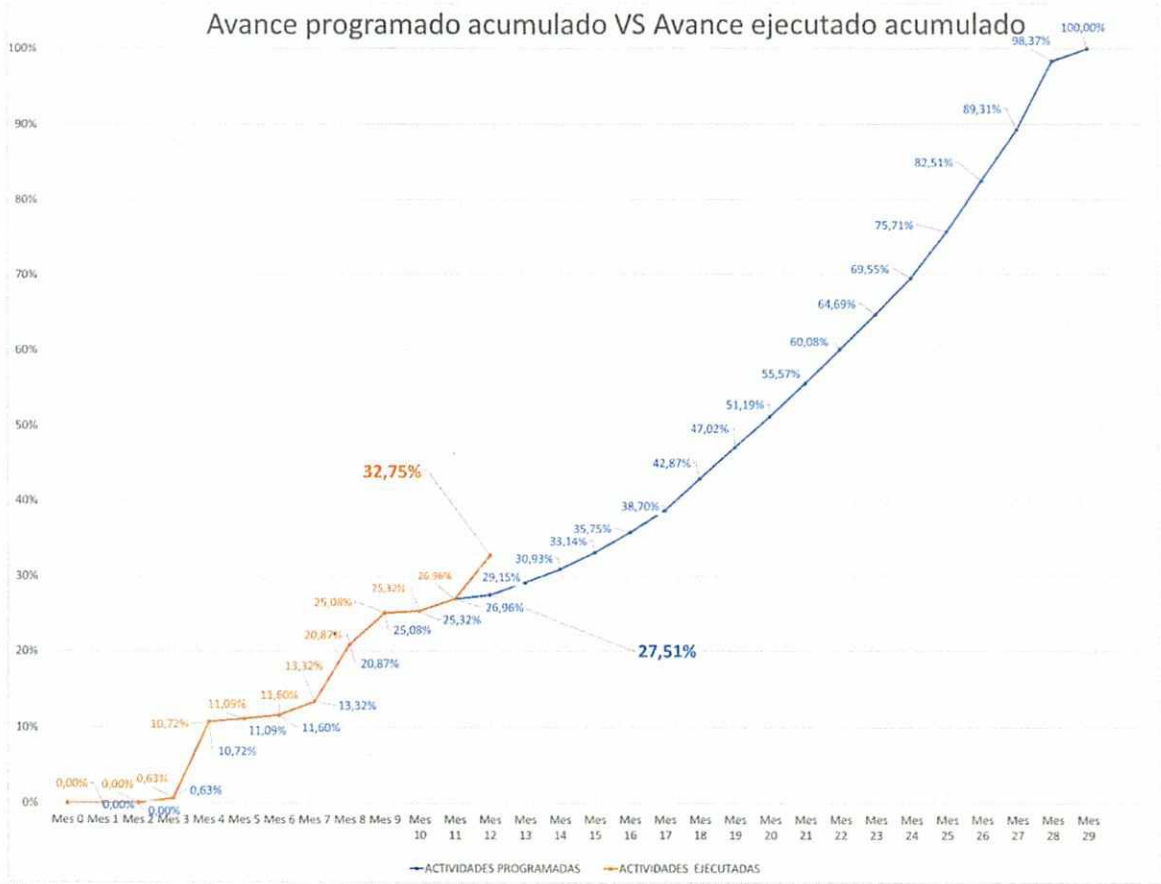

NOTA: La presente gráfica corresponde al ajuste de la programación de actividades, de acuerdo con el acta de Modificación No. 1 al proyecto BPIN 20211301010978 con fecha de aprobación del 19 de noviembre de 2024.

2. GESTIÓN TÉCNICA Y DOCUMENTAL

N/A – La gestión técnica y documental se encuentra anexa en los informes de obra mensuales correspondiente a cada periodo con cierre a fin de mes.

3. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN PROPUESTOS

N/A – Se encuentran anexos en los informes de obra mensuales correspondiente a cada periodo con cierre a fin de mes.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12453

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 04

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

4. ESTADO DEL TIEMPO

Frecuencia.
4.1 Durante el 01/11/2024 al 20/11/2024

ESTADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
DIA	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X
NUBLADO																				
TORMENTA																				
LLUVIOSO								7												
SOLEADO	9	5			9	9	9	2	10	9		9	9	9	9	5		9	9	9

OBSERVACIONES:

Se presentan días lluviosos y soleados durante el mes. Predomina día soleado.

B. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

1. PROCESO CONSTRUCTIVO

1. EXCAVACIONES

1.2 Excavación mecánica para cajas vías (incluye cargue)

Las excavaciones son los trabajos que dan lugar a la explanada bajo la rasante inicial del terreno. Se realiza un replanteo de la zona a excavar, se realiza la materialización mediante estaciones de los ejes de la obra cada 20 m con estacas de madera, en la estaca se indica la estación, cota a excavar y inclinación de los taludes. Se procede a retirar el material con una excavadora, se transporta en una volqueta hasta el campamento para acopiar y luego ser retirado por la empresa Bioagricola del llano, dando cumplimiento al PAGA.

1.3 Transporte disposición final de escombros y sobrantes

El material sobrante extraído de la excavación es retirado y transportado al predio autorizado para disposición final. El transporte de este material sobrante es realizado en volquetas previamente cargadas por una excavadora.

1. RELLENOS

2.1 Relleno con material mixto de rio sin procesar tamaño Max. 3" suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación mecánica con equipo pesado.

Luego del descapote, limpieza y excavación de cajas, Se realiza el relleno para sobre anchos de vía con material mixto de río sin procesar tamaño máximo de 3", instalando capas de un

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12454

espesor uniforme con un espesor no mayor a 20 cm para luego ser compactado, se instala la siguiente capa si la anterior es aprobada por compactación y nivelación. Al ser un terraplén nuevo las capas deberán garantizar adherencia y homogeneidad. Para el desarrollo de la actividad se utiliza una excavadora, vibro compactador, volquetas doble troque y volquetas dumper. Se emplea el PMT y PMA autorizado.

2.2 Geotextil T1700 Suministro e instalación

Se debe realiza la limpieza de los sobreanchos donde se instalará el geotextil, garantizando que quede libre de piedras, escombros, raíces, material vegetal y demás, se verifica la adecuada compactación del terreno a instalar, se procede a instalar el geotextil realizando amarres cada 5 metros, esto para evitar que se mueva obteniendo un buen contacto con la superficie. Seguido a esto se inicia a realizar el relleno y compactación de material sobre el geotextil.

2.5 Transporte de Material granular

Para esta actividad se emplean volquetas Dumper y Doble troque. El transporte se realiza en volquetas Dumper desde el sitio de explotación de material hasta un acopio en el campamento de obra del cual se carga, transporta y deposita hasta el punto de intervención en volquetas doble troque efectuando el vaciado del material granular por el extremo posterior de la caja al ser levantada.

2. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

a. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MÁXIMO 3"- RIO GUEJAR

En el laboratorio GEOLAB RL, se realizaron pruebas con el objetivo de evaluar la calidad de los materiales procedentes del río Guejar en comparación con las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). El propósito fundamental de estos ensayos fue verificar si cumplen con los requisitos mínimos especificados para su aplicación en la construcción de la capa de relleno.

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Granulometría	8/11/2024	INV E-123
Contenido de sales solubles	8/11/2024	INV E-158
Contenido de materia orgánica	8/11/2024	INV E-121

12455

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 04

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

Índice de colapso	12/11/2024	INV E-157
Proctor modificado	8/11/2024	INV E-141 INV E-142
Expansión en prueba CBR	12/11/2024	INV E-148
Resistencia del material, CBR	12/11/2024	INV E-148

3. SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

N/A - El sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo se encuentra anexo dentro de los respectivos informes mensuales de cada periodo con cierre a fin de mes.

4. MANEJO AMBIENTAL

N/A - El manejo ambiental se encuentran anexo en los respectivos informes mensuales de cada periodo con cierre a fin de mes.

C. INFORME ADMINISTRATIVO

1. PERSONAL ACTUAL PROFESIONAL VIGENTE

N/A - El personal actual profesional vigente se encuentran anexo en los respectivos informes mensuales de cada periodo con cierre a fin de mes.

2. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

2.1 Durante el 01/06/2024 al 14/06/2024

9469823292, 9469883373, 9469882779, 9469079446, 9469330874, 9469884566, 9469882346, 9469276040, 9469883589, 9469882165

3. GESTIÓN SOCIAL

N/A - La gestión social se encuentra anexa dentro de los respectivos informes mensuales de cada periodo con cierre a fin de mes.

4. CLASIFICACIÓN DEMOGRÁFICA DE LOS EMPLEOS GENERADOS

N/A - La clasificación demográfica de los empleos generados se encuentran anexas dentro de los respectivos informes mensuales de cada periodo con cierre a fin de mes.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12456

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 04

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

D. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	**TIEMPO (MESES / DÍAS)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
Suspensión No.1 - 14/06/2024	3 meses 0 días	Debido al cierre del paso vehicular por el colapso de una sección del tablero del puente sobre el río Güejar desde el 03 de mayo de 2024, impide continuar con la ejecución de la obra debido a que este mismo es el paso para el K0+000 del proyecto, lo cual impide el transporte de material granular y demás insumos que necesita el proyecto para su desarrollo. Razón por la cual el consorcio Halcón solicitó la suspensión No. 1 para el proyecto BPIN 20211301010978.	3271-3349
Ampliación No. 1 suspensión No. 1	2 meses 0 días	El contrato de 'rehabilitación del puente sobre el río Güejar en la vía que comunica el centro poblado de Piñalito con el centro poblado de Santo Domingo', adjudicado a la empresa ICMO SAS, tiene como fecha de terminación el 14 de octubre de 2024. Esta información no era conocida por el consorcio Halcón al momento de solicitar la suspensión. Según los avances observados en campo y los tiempos estimados de entrega de la rehabilitación por parte de ICMO, se prevé una extensión del plazo. Debido a que el cierre del paso vehicular persiste, lo cual impide la continuación de la obra por caso fortuito, el consorcio Halcón solicitó la ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 para el proyecto BPIN 20211301010978.	3350-3514
Prorroga No.1 al contrato 0775 de 2022 (Reinicio) / 01/11/2024	4 meses 18 días	El puente sobre el río Güejar fue habilitado al tráfico, por ende, el consorcio Halcón tramitó la solicitud de reinicio al proyecto BPIN 20211301010978.	-

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12457

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 04

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	**VALOR ($)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	**VALOR ACTUALIZADO ($)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
Modificación No. 1 19/11/2024	$ 58.767.216.954,00	Se realiza la modificación No. 1, balance de cantidades e items nuevos acorde con la realidad actual, necesarias para la ejecución de la obra para el proyecto 20211301010978.	-

2. GARANTÍAS:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	NB- 100241770
ANEXO N°	0
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	NB 100057150
ANEXO N°	0
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	31/05/2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Buen Manejo de anticipo	26/12/2022	26/11/2025	$ 22.592.913.998,60
Prestaciones sociales	26/12/2022	26/05/2028	$ 5.648.228.500,00
Cumplimiento	26/12/2022	26/11/2025	$ 11.296.457.000,00
Estabilidad de la obra	26/05/2025	26/05/2030	$ 11.296.457.000,00
Responsabilidad Civil - Extracontractual	26/12/2022	26/05/2025	$ 5.648.228.500,00

PÓLIZAS ACTUALIZADAS A ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	NB- 100241770
ANEXO N°	2
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	NB 100057150
ANEXO N°	1
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	18/07/2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Buen Manejo de anticipo	12/07/2023	11/06/2026	$ 22.592.913.998,60

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12458

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 04

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

Prestaciones sociales	12/07/2023	11/12/2028	$ 5.648.228.500,00
Cumplimiento	12/07/2023	11/06/2026	$ 11.296.457.000,00
Estabilidad de la obra	11/12/2025	11/12/2030	$ 11.296.457.000,00
Responsabilidad Civil - Extracontractual	26/12/2022	11/12/2025	$ 5.648.228.500,00

E. INFORME FINANCIERO

1. PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
ANT.	143486023	04/08/2023		$14.926.873.106,32			$14.926.873.106,32
1	2442	22/12/2023	10.72%	$6.301.292.867,68	$1.600.528.388,39	$ 4.700.764.479,29	$19.627.637.585,61
2	5124	24/04/2024	10.08%	$5.924.838.815,28	$1.504.909.059,08	$4.419.929.756,20	$24.047.567.341,81
3	17424	12/08/2024	5,97%	$3.395.513.288,50	$862.460.375,28	$2.533.052.913,22	$26.580.620.255,03
	17324			$107.955.805,46	$27.420.774,59	$80.535.030,87	$26.661.155.285,90
TOTALES			26.77%				**$26.661.155.285,90**

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: *12/07/2023 AL 20/11/2024*

Avance físico ejecutado 32,75% y avance financiero ejecutado 26,77%

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12459

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 04

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1 1.1	**EXCAVACIONES**	**EJECUTADO**	**%**
	EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	28.928,10 M3	69,90
			
	OBSERVACIONES: Excavación mecánica para sobreanchos		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1 1.3	**EXCAVACIONES**	**EJECUTADO**	**%**
	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	5.513,37 M3/KM	4,20
			
	OBSERVACIONES: Transporte de material sobrante de excavación en volqueta doble troque.		

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12460

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 04

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2 2.1	**RELLENOS**	**EJECUTADO**	**%**
	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" - SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	850,50 M3	0,38
			
	OBSERVACIONES: Instalación de relleno de material mixto de río sin procesar tamaño max. 3"		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2 2.2	**RELLENOS**	**EJECUTADO**	**%**
	GEOTEXTIL T 1700 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	6.623,00 M2	4,30
			
	OBSERVACIONES: Instalación de geotextil 1700 en sobreanchos de vía		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12461

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 04

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2 2.5	**RELLENOS**	**EJECUTADO**	**%**
	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	811.428,72 M3/KM	9,51
	 		
	OBSERVACIONES: Transporte de material granular mixto de río tamaño max. 3".		

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12462

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 04

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**20211301010978**

G. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

El presente informe de obra para pago de Acta Parcial No 4 justifica las actividades realizadas por el consorcio Halcón, para el proyecto identificado con el BPIN No. 20211301010978 durante el periodo del 01 de noviembre de 2024 al 20 de noviembre de 2024, Para un pago parcial de obra correspondiente al 5,99% equivalente a $ 3.519.487.933,11 (tres mil quinientos diecinueve millones cuatrocientos ochenta y siete mil novecientos treinta y tres pesos con once centavos m/cte)

Se valoran las actividades correspondientes al 5,99% de las obras ejecutadas las cuales son:

- 1.1 Excavación mecánica para cajas vías (incluye cargue), de la cual se ejecutaron 28.928,10 m3

- 1.3Transporte y disposición final de escombros y sobrantes, se realizaron 5.513,37 m3/km

- 2.1 Relleno con material mixto de rio sin procesar tamaño Max. 3" suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación mecánica con equipo pesado. Se instalaron 850,50 m3

- 2.2 Geotextil T1700 Suministro e instalación. Se instalaron 6.623,00 m2

- 2.5 transporte de material granular. Se realizaron 811.428,72 m3/km

Se están realizando las actividades conforme al diseño entregado, optimizando los procesos productivos de materiales que requiere la ejecución del proyecto para cumplir con todas las especificaciones.

Se relacionan planillas de seguridad social de obra correspondientes al periodo del 01 al 14 de junio de 2024. Toda vez que los pagos de seguridad social se realizan mes vencido.

El consorcio Halcón informa que los anexos correspondientes a los resultados de los ensayos de laboratorio se entregan mes a mes en los informes mensuales. Sin embargo, en la parcial de obra se encuentran los soportes de los ensayos de laboratorio de interventoría correspondientes a las actividades ejecutadas entre el 01 de noviembre de 2024 al 20 de noviembre de 2024. Es importante mencionar que los informes se presentan con cierre al último día del mes. Esto asegura que todos los resultados de los ensayos estén debidamente documentados y disponibles para su revisión

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12463

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 04

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**20211301010978**

H. ANEXOS

El informe debe contener como mínimo los siguientes soportes documentales:

- Bitácora de obra del 01 al 20 de noviembre 2024

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 22 NOV. 2024

Firma

Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVÁ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202095108

Firma

Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-091115

Nota: El informe y sus anexos, deben ser cargados a la plataforma para la gestión de archivos SIGA, una vez sea presentado a la entidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12464

CONSORCIO HALCÓN

BITACORA DE OBRA

12465

CONSORCIO HALCÓN

BITACORA DE OBRA

01 AL 20 DE NOVIEMBRE 2024

12466

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	01	11	2024	7:00	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se presenta dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	07:00	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Dumper	4	
OFICIAL	1	Si		Retroexcavadora	1	
OPERARIO	3	Si		Cargador	1	
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR	2	Si				
TOPÓGRAFO	/	/				
CADENERO	/	/				
CONTROLADOR VIAL	3	Si				
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavación	m^3	Material subrasante		Si	Si
Instalación Geotextil	m^2	Geotextil Tejido 1700		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12467

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	01	11	2024	7:00	16:00

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se inician actividades de excavación
- Se realiza instalación de geotextil T1700.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 091115	
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	02	11	2024	7:00	12:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Sepresenta dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	12:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Dumper	4	
OFICIAL	1	Si		Cargador	1	
OPERARIO	3	Si		Retroexcavadora	1	
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR	2	Si				
TOPÓGRAFO	/	/				
CADENERO	/	/				
CONTROLADOR VIAL	3	Si				
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavación material.	m^3	Material en lavra		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

121468

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	02	11	2024	07:00	12:00

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Excavación de material.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 091115	
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	5	11	2024	7:00	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se presenta dia soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Dumper	4	
OFICIAL	1	Si		Cargador	1	
OPERARIO	3	Si		Retroexcavadora	1	
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR	2	Si				
TOPÓGRAFO	1	/				
CADENERO	1	/				
CONTROLADOR VIAL	3	Si				
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavación mecánica para cajas uas	m^3	Para sobreanchos		Si	Si
Relleno mixto 3"	m^3	Para la estructura		Si	Si
Transporte material granular	m^3/km	Transporte de relleno mixto 3"		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12469

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	5	11	2024	7:00	16:00

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza Excavación mecánica para cajas vías en sobreanchos
- Se realiza instalación de material granular relleno mixto de río sin procesar tamaño max. 3".
- Transporte de material granular al punto de instalación

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 091115	
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	6	11	2024	7:00	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	6:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Dumper	4	
OFICIAL	1	Si		Cargador	1	
OPERARIO	3	Si		Retroexcav.	1	
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR	2	Si				
TOPÓGRAFO	1	1				
CADENERO	1	1				
CONTROLADOR VIAL	3	Si				
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion mecanica para cajas viales	m3	Para Sobreanchos		Si	Si
Relleno mixto 3"	m3	Para la estructura		Si	Si
Transporte material granular	m3/Km	Transporte relleno mixto		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12470

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	6	11	2024	7:00	15:00

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza ~~excavación~~ mecánica para sobreancho
- Se instala material granular mixto de río sin procesar tamaño max 3".
- Se transporta material granular

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 091115	
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	7	11	2024	7:00	16:00 .

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:00 .		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Motoniveladora	1	
OFICIAL	1	Si		Vibrocompactador	1	
OPERARIO	3	Si		Retroexcavadora	1	
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR	/	/				
TOPÓGRAFO	1	Si				
CADENERO	1	Si				
CONTROLADOR VIAL	/	/				
OTRO	/	/				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con material mixto de rio	m3	Instalación de material		Si	Si
Transporte de material granular	m3/km	Transporte de material		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12471

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	7	11	2024	7:00	16:00

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- instalación de material de relleno.
- Replanteo de ejes
- Conformación de material

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 091115	
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	08	11	2024	7:00	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO		14:00	16:00	Se presentan lluvias fuertes desde la mañana hasta las 2:00 pm
TORMENTA				
LLUVIOSO	7:00	14:00		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Retroexcavadora	2	
OFICIAL	1	SI		Motoniveladora	1	
OPERARIO	8	SI		Vibrocompactador	1	
AYUDANTE	5	SI		Volquetas 8T	4	
CELADOR	/	/		Volquetas sencillas	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Camioneta	1	
CADENERO	1	SI		Turbo	1	
CONTROLADOR VIAL	/	/				
OTRO	3	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con material mixto de rio 3"	m^3	Instalación de material		SI	SI
instalación de geotextil	m^2	instalación geotextil T 1600		SI	SI
Transporte de material granular	m^3/km	Transporte de material		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12472

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	8	11	2024	7:00	16:00 .

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Instalación de material de relleno mixto.
- Transporte de material granular
- Instalación de geotextil.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 091115	
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	09	11	2024	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	17:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Retroexcavadora	2	
OFICIAL	1	SI		Motoniveladora	1	
OPERARIO	8	SI		Vibrocompactador	1	
AYUDANTE	5	SI		Volquetas DT	4	
CELADOR	/	/		Volqueta Sencilla	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Camioneta	1	
CADENERO	1	SI		Camion turbo	1	
CONTROLADOR VIAL	/	/		Carrotanque	1	
OTRO	3	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con material mixto	m^3	Aproximación Subrasante		SI	SI
Transporte material	m^3/km	Acarreo de cuda de río		SI	SI
Excavación mecanica para cajas viaS	m^3	Para sobreanchos		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12473

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	09	11	2024	7:00	17:00.

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza aproximación de material granular relleno mixto de no tamaño max 3".
- Se realiza el transporte del material granular.
- Excavación mecánica para sobreanchos.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 091115	
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	10	11	2024	7:00	15:00.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Retroexcavadora	2	
OFICIAL	1	Si		Motoniveladora	1	
OPERARIO	5	Si		Vibrocompactador	1	
AYUDANTE	5	Si		Volquetas DT	4	
CELADOR	/	/		Volquetas Señalas	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Camioneta	1	
CADENERO	1	Si		Tubo	1	
CONTROLADOR VIAL	/	/				
OTRO	2	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con material mixto 3"	m^3	Instalacion de material		Si	Si
Transporte de material granular	m^3/Km	Acarreo de relleno		Si	Si
Geotextil T 1700	m^2	Instalacion material		Si	Si
Excavacion mecanica para cajas vias	m^3	Para Sobreanchos		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12474

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	10	11	2024	7:00	16:00.

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Instalación de material de cruda de rio – aproximación
- Transporte de material de relleno.
- Instalación de geotextil tejido T1700.
- Excavación mecánica para sobreanchos

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 091115	
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	13	11	2024	7:00	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Retroexcavadora	2	
OFICIAL	1	Si		Motoniveladora	1	
OPERARIO	5	Si		Volqueta OT	4	
AYUDANTE	5	Si		Volqueta Sencilla	4	
CELADOR	/	/		Camioneta	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Carro tanque	1	
CADENERO	1	Si		Vibrocompactadora	1	
CONTROLADOR VIAL	/	/				
OTRO	2	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno Con material mejo	m^3	Instalación de material		Si	Si
Transporte de material	m^3/km	Acarreo de material relleno		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12475

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	13	11	2024	7:00	16:00

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Instalación crudo de río
- Transporte de material de relleno.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 091115	
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	14	11	2024	7:00	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Retroexcavadora	2	
OFICIAL	1	Si		Motoniveladora	1	
OPERARIO	5	Si		Vibrocompactador	1	
AYUDANTE	5	Si		Volquetas DT	4	
CELADOR	/	/		Volquetas Sencilla	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Cargador	1	
CADENERO	1	Si		Turbo	1	
CONTROLADOR VIAL	/	/				
OTRO	2	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con material mixto de rio	m^3	instalacion de material		Si	Si
Transporte de material	M^3/Km	Acarreo de material		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12476

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	14	11	2024	7:00	16:00 .

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- instalación de crudo de río
- transporte de material de relleno.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 091115	
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	15	11	2024	7:00	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Retroexcavadora	2	
OFICIAL	1	Si		Motoniveladora	1	
OPERARIO	5	Si		Vibrocompactador	1	
AYUDANTE	5	Si		Volqueta 8t	4	
CELADOR	1	1		Volqueta sencilla	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Camioneta	1	
CADENERO	1	Si		Tubo	1	
CONTROLADOR VIAL	1	1				
OTRO	2	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con material mixto de río	m³	Instalación de material		Si	Si
Transporte material granular	m³/Km	Acarreo de material de relleno		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12477

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	15	11	2024	7:00	16:00

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Instalación cruce de rio.
- Transporte de material cruce de rio.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 091115	
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	16	11	2024	7:00	12:00 m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	12:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Retroexcavadora	2	
OFICIAL	1	Si		Motoniveladora	1	
OPERARIO	5	Si		Vibrocompactador	1	
AYUDANTE	5	Si		Vibro pt	4	
CELADOR	/	/		Vibro tapada	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Camioneta	1	
CADENERO	1	Si		Turbo	1	
CONTROLADOR VIAL	/	/				
OTRO	2	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con material mixto de río	m^3	Instalación de material		Si	Si
Transporte de material granular	m^3/km	Acarreo de material de relleno.		Si	Si
Excavación mecanica para cajas Vias	m^3	Para sobreanchos		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

121178

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	16	11	2024	7:00	12:00

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- instalación de material de relleno mixto de 3"
- Transporte de material granular.
- Excavación para sobreanchos

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 091115	
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	18	11	2024	7:00	16:00.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Retro excavadora	2	
OFICIAL	1	SI		Motoniveladora	1	
OPERARIO	5	SI		Vibrocompactador	1	
AYUDANTE	5	SI		Volqueta DT	4	
CELADOR	/	/		Volqueta sencilla	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Camioneta	1	
CADENERO	1	SI		Turbo	1	
CONTROLADOR VIAL	/					
OTRO	2	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con material mixto de rio	m^3	Instalacion de material		SI	SI
Transporte de material granular	m^3/km	Transporte de relleno		SI	SI
Geotextil	m^2	Instalacion en la via		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12479

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	18	11	2024	7:00	16:00

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Paro.	Se presenta paro de volqueteros

OBSERVACIONES GENERALES

- instalación de material mixto de rio tamaño max 3"
- Transporte de material mixto de rio.
- instalacion de geotextil no tejido en la via.
-

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 091115	
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	19	11	2024	7:00	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Retroexcavadora	2	
OFICIAL	1	Si		Motoniveladora	1	
OPERARIO	5	Si		Vibrocompactador	1	
AYUDANTE	5	Si		Volquetas DT	4	
CELADOR	/	/		Volquetas Sencillas	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Camioneta	1	
CADENERO	1	Si		Turbo	1	
CONTROLADOR VIAL	/	/				
OTRO	2	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con material mixto de rio 3"	m^3	Instalación de material		Si	Si
Transporte de material granular	m^3/km	Transporte de relleno		Si	Si
Excavación mecánica para cajas viaS	m^3	Excavación sobreanchos		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12480

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	29	11	2024	7:00	16:00

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Paro Volqueteros	Se presenta paro volqueteros.

OBSERVACIONES GENERALES

- instalación de material mixto de rio tamaño max 3".
- Transporte de material relleno mixto de rio 3"
- Excavación mecánica para sobreanchos.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 091115	
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	20	11	2024	7:00	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se presenta dia Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Retroexcavadora	2	
OFICIAL	1	Si		Motoniveladora	1	
OPERARIO	5	Si		Vibrocompactador	1	
AYUDANTE	5	Si		Volqueta DT	4	
CELADOR	/	/		Volqueta Señalla	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Camioneta	1	
CADENERO	1	Si		Tubo	1	
CONTROLADOR VIAL	/	/				
OTRO	2	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con material mixto de rio 3"	m^3	instalación de material		Si	Si
Transporte de material granular	m^3/km	Transporte de relleno		Si	Si
Geotextil	M^2	Instalación en la via		Si	Si
Excavación mecanica para cajas via	M^3	Instalación Para Sobreanchos		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12481

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	20	11	2024	7:00	16:00.

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- instalación de material mixto de rio tamaño mixto de rio 3".
- Transporte de material mixto de rio 3"
- Instalación de geotextil no tejido.
- Excavación mecánica para sobreanchos

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 091115	
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONSORCIO HALCÓN

INFORME PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO OBRA

12482

CONTRATO N°	0775-2022		PROYECTO N°	20211301010978	
INFORME N°	4	PERIODO INFORME:	01/11/2024	a	28/04/2026
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL" "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICAEL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUYDESDE ELPUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE DE LA VIA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA ENEL DEPARTAMENTO DEL META."				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$			112.964.569.993	
VALOR ADICIONAL:	$			-	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$			112.964.569.993	
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCON				
NIT:	901666148-8				
CORREO ELECTRONICO:	gerencia@camelingenieria.com				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 de 2023				
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM				
CORREO ELECTRONICO:	consorciointeraim@gmail.com				
SUPERVISOR:	OSCAR FERNANDO BERMUDEZ SALCEDO				
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	EDWIN LEONARDO GUTIERREZ RODRIGUEZ				
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	263-2023				

VIGENCIA INICIAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	29	Meses	0 Días	
FECHA DE INICIACIÓN:				12/07/2023
FECHA DE TERMINACIÓN				11/12/2025

VIGENCIA ACTUAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	29	Meses	0 Días	12/07/2023
FECHA DE TERMINACIÓN				28/04/2026

VALOR DEL PROYECTO				
N°	PROYECTO N°	VALOR ($) INICIAL	VALOR ($) ADICIONAL	VALOR ($) ACTUAL
1	20211301010978	$ 58.767.216.954,00		$ 58.767.216.954
2				$ -
		VALOR ACTUAL DEL PROYECTO		$ 58.767.216.954,00

INFORMACIÓN DE ANTICIPO			
VALOR ANTICIPO 1:			14.926.873.106,32
FECHA PAGO ANTICIPO	11/08/2023	No. COMPROBANTE:	CC-867-2
VALOR ANTICIPO 2:	$		-
FECHA PAGO ANTICIPO		No. COMPROBANTE:	
FIDUCIA (SI APLICA):			Acción fiduciaria
BANCO :			
CUENTA DE AHORROS :			

INFORME DE INVERSIÓN

ÍTEM	CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
INFORME DE INVERSIÓN- PARCIAL 1						
PAGO No 1						
1	CC-969-1	31/08/2023	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 74.041.800,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
2	CC-969-2	31/08/2023	DIAMANTE SAS	$ 2.053.527.682,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
3	CC-969-3	5/09/2023	CONSORCIO HALCON	$ 165.875.694,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
PAGO No 2						
4	CC-969-4	26/09/2023	SIDERURGICO REINA	$ 135.115.228,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
5	CC-969-5	26/09/2023	MEXICHEM COLOMBIA SAS PAVCO	$ 140.083.944,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
6	CC-969-6	26/09/203	JM PROYECTOS E INGENIERIA SAS	$ 107.621.275,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
7	CC-969-7	26/09/2023	EDGAR MUÑOZ	$ 500.056.169,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
8	CC-969-8	29/09/2023	CASS CONSTRUCTORES SAS	$ 600.000.000,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
9	CC-969-9	29/09/2023	CASS CONSTRUCTORES SAS	$ 542.298.232,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
10	CC-969-10	29/09/2023	CSS CONTRUCTORES SA	$ 950.000.000,00	4	Transporte de materiales
11	CC-969-11	29/09/2023	CSS CONTRUCTORES SA	$ 797.516.680,00	4	Transporte de materiales
12	CC-969-12	29/09/2023	CASS CONSTRUCTORES SAS	$ 700.000.000,00	4	Transporte de materiales
13	CC-969-13	29/09/2023	CASS CONSTRUCTORES SAS	$ 415.076.768,00	4	Transporte de materiales
14	CC-969-14	29/09/2023	CSS CONTRUCTORES SA	$ 328.108.320,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
PAGO No 3						
15	FA-6096	19/10/2023	CONSORCIO HALCON	$ 97.489.215,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
PAGO No 4						
16	CC-969-16	7/11/2023	CALOS GAONA	$ 36.840.067,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12483

CONTRATO N°		0776-2022		PROYECTO N°		20211301010978	
17	CC-969-17	7/11/2023	CONSORCIO HALCON	$ 12.660.066,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
18	CC-969-18	7/11/2023	AVIZOR SEGURIDAD LTDA	$ 45.002.679,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
19		7/11/2023	CONSORCIO HALCON	$ 77.110.991,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
PAGO No 5						
20	FA-6096	10/11/2023	CONSORCIO HALCON	$ 32.640.500,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
21	FA-6096	10/11/2023	CONSORCIO HALCON	$ 121.642.037,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
22	FA-6096	11/11/2023	CONSORCIO HALCON	$ 3.110.562,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
23	FA-6095	10/11/2023	CONSORCIO HALCON	$ 49.202.750,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
PAGO No 6						
24		27/11/2023	CONSORCIO HALCON	$ 221.945.918,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
25	CC-969-25	27/11/2023	INTACMA SAS	$ 23.683.200,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
26	CC-969-26	27/11/2023	INVERSIONES COLDIND SAS	$ 22.806.110,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
27	CC-969-27	27/11/2023	CARLOS GAONA	$ 35.239.010,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
INFORME DE INVERSIÓN- PARCIAL 2						
PAGO No 7						
28	CC-969-29	6/12/2023	CARLOS GAONA	$ 34.963.474,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
29	CC-969-28	6/12/2023	LLANO SALUD IPS	$ 837.640,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
30	FA-6096	6/12/2023	CONSORCIO HALCON	$ 7.736.388,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
PAGO No 8						
31	CC-969-32	13/12/2023	YASMANIT LONDOÑO	$ 48.429.675,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
32	FC 237	13/12/2023	JM PROYECTOS	$ 34.674.748,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
33		13/12/2023	SERVIPETROLEOS SAS	$ 132.000.000,00	4	Transporte de materiales
34	FC 236	13/12/2023	JM PROYECTOS	$ 34.888.830,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
PAGO No 9						
35	FA-6096	22/12/2023	CONSORCIO HALCON	$ 47.391.904,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
36	FC 260	22/12/2023	CARLOS JULIO GAONA	$ 39.568.851,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
37	DSEH 189	22/12/2023	FRANCHELYS LIZ PEREZ	$ 9.268.581,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
38	FC 300	22/12/2023	WILSON BENJUMEA	$ 1.187.731,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
39		22/12/2023	CONSORCIO HALCON	$ 232.744.155,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
40	FC 258	22/12/2023	GEOLAB RL SAS	$ 9.781.200,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
41	FC 279	22/12/2023	CARLOS JULIO GAONA	$ 81.407.426,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
42	FA-6096	22/12/2023	CONSORCIO HALCON	$ 322.250.000,00	4	Transporte de materiales
43	FC 244	22/12/2023	GEOLAB RL SAS	$ 9.781.200,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
44	FC 298	22/12/2023	DIAMANTE SAS	$ 305.060.548,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
PAGO No 10						
45	FA-6096	2/02/2024	CONSORCIO HALCON	$ 81.822.210,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
46	FA-6096	2/02/2024	CONSORCIO HALCON	$ 271.316.085,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
47	FA-6096	2/02/2024	CONSORCIO HALCON	$ 31.635.347,00	4	Transporte de materiales

12484

CONTRATO N°		0776-2022		PROYECTO N°		20211301010978
PAGO No 11						
48	FA-6096	22/02/2024	CONSORCIO HALCON	$ 303.420.000,00	4	Transporte de materiales
49	CC 969-44	22/02/2024	GRUPO ARGOS	$ 93.380.490,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
50	FA-6096	22/02/2024	CONSORCIO HALCON	$ 8.040.215,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
51	FA-6096	22/02/2024	CONSORCIO HALCÓN	$ 85.809.523,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
INFORME DE INVERSIÓN- PARCIAL 3						
PAGO No 12						
52		8/03/2024	CONSORCIO HALCON	$ 70.982.582,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
53		8/03/2024	BRIGGITHE DANIELA ALONSO MOYA	$ 7.425.206,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
54		8/03/2024	OSCAR BOCANEGRA RODA	$ 2.209.320,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
55		8/03/2024	FRANCHELYS LIZ PEREZ	$ 9.547.037,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
56		8/03/2024	CONSORCIO HALCON	$ 129.657.136,63	1	Pago de honorarios salarios y jornales
57		8/03/2024	PUMA ENERGY	$ 132.315.963,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
58		8/03/2024	GRUPO SIDERURGICO REYNA	$ 149.326.858,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
59		8/03/2024	REEMBOLSABLE	$ 2.935.800,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
60		8/03/2024	CONSORCIO HALCON	$ 5.724.000,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
PAGO No 13						
61		19/03/2024	CARLOS JULIO GAONA	$ 64.499.477,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
62		19/03/2024	CONSORCIO HALCON	$ 10.034.664,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
63		19/03/2024	CONSORCIO HALCON	$ 7.281.601,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
64		19/03/2024	MURCIA CONSTRUCCIONES SA	$ 826.163.136,89	4	Transporte de materiales
65		19/03/2024	MURCIA CONSTRUCCIONES SA	$ 794.122.879,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
PAGO No 14						
66		21/03/2024	CARLOS JULIO GAONA	$ 77.776.693,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
67		21/03/2024	DIAMAN7E SAS	$ 800.000.000	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
68		21/03/2024	DIAMAN7E SAS	$ 510.000.000,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
PAGO No 15						
69		24/04/2023	DIAMAN7E SAS	$ 29.331.168,91	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
70		24/04/2023	CONSORCIO HALCON	$ 17.253.512,89	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
71		24/04/2023	SERVIARIARI INGENIERIA SAS	$ 10.952.550,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
72		24/04/2023	CONSORCIO HALCON	$ 6.898.748,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
IMPUESTO DE GUERRA						
73		20/12/2023	IMPUESTO DE GUERRA	$ 746.343.654,98	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
TOTAL				**$ 14.926.873.106,30**		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12485

CONTRATO N°	0775-2022	PROYECTO N°	20211301010978

Anexar: Respectivos Soportes y Extracto Cuenta Bancaria Registrada

RESUMEN DE CUMARAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ANTICIPO INICIAL	ANTICIPO ADICIONAL	TOTAL ANTICIPO	VALOR EJECUTADO	SALDO ANTICIPO
1	Pago de honorarios salarios y jornales	1.492.687.310,63		1.492.687.310,63	1.492.687.310,63	-
2	Compra de materiales, insumos y accesorios	4.478.061.931,89		4.478.061.931,89	4.478.061.931,89	-
3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos	4.478.061.931,89		4.478.061.931,89	4.478.061.931,89	-
4	Transporte de materiales	4.478.061.931,89		4.478.061.931,89	4.478.061.931,89	-
	TOTALES	14.926.873.106,30		14.926.873.106,30	14.926.873.106,30	-

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia

Firma
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENCATIVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre: BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Firma
Nombre: PAOLA ANDREA AMARILLO ALVAREZ
CONTADOR DE CONTRATISTA
N° Matricula Profesional: 215835-T

Firma
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 185521-T

Nota: Anexar copia de Tarjeta profesional y Vigencia de la tarjeta Profesional de los contadores respectivamente
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12486

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000056
Ciudad:		**Fecha:**	01-AGO-2023 a 31-AGO-2023
Extracto:	9929164	**Mes:**	agosto 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525 es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 11.816,72 **Remuneración de la sociedad administradora:** 1,25%

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 0,00
Total adiciones	$ 14.180.529.451,32
Total egresos	$ 2.136.088.759,93
Rendimientos	$ 122.646.452,30
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 12.167.087.143,69

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 118.194.526,97	
11 AGO 23	ADICION	$ 14.180.529.451,32	1.210.317,9057058
11 AGO 23	ADICION DE RENDIMIENTOS(+)	$ 4.451.925,33	379,9748775

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
31 AGO 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0607780
31 AGO 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 296.167,20	25,0702491
31 AGO 23	RETIRO BENEFIC. CEMENTOS ARGOS S.A	$ 74.041.800,00	6.267,5622738
31 AGO 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3201424
31 AGO 23	RETIRO BENEFIC. DIAMAN7E SAS	$ 2.053.527.682,00	173.829,0077760
31 AGO 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3201424
31 AGO 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0607780
31 AGO 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 8.214.110,73	695,3160313
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	13.37%	**Último año**	13.82%
Semestral	12.51%	**Últimos 2 años**	8.66%
Año Corrido	15.15%	**Últimos 3 años**	N/A

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud
Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

12487

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000056
Ciudad:		**Fecha:**	01-SEP-2023 a 30-SEP-2023
Extracto:	10056532	**Mes:**	septiembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525 es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 11.957,81 **Remuneración de la sociedad administradora:** 1,25%

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 12.167.087.143,69
Total adiciones	$ 11.358.851.277,93
Total egresos	$ 20.876.842.857,36
Rendimientos	$ 75.848.736,25
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 2.724.944.300,50

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 75.839.059,46	
22 SEP 23	ADICION	$ 8.519.277,93	713,5408955
22 SEP 23	ADICION DE RENDIMIENTOS(+)	$ 9.676,79	0,8104894
26 SEP 23	ADICION	$ 7.000.000.000,00	585.768,5365847
27 SEP 23	ADICION	$ 600.000.000,00	50.201,1937033
27 SEP 23	AJUSTE DE GRAVAMEN FINANCIERO	$ 2.400.000,00	200,8047748
27 SEP 23	ADICION	$ 700.000.000,00	58.568,0593205
27 SEP 23	AJUSTE DE GRAVAMEN FINANCIERO	$ 2.800.000,00	234,2722373
27 SEP 23	ADICION	$ 542.298.232,00	45.373,3643160
27 SEP 23	AJUSTE DE GRAVAMEN FINANCIERO	$ 2.169.192,93	181,4934574
27 SEP 23	ADICION	$ 950.000.000,00	79.485,2233636
27 SEP 23	AJUSTE DE GRAVAMEN FINANCIERO	$ 3.800.000,00	317,9408935
27 SEP 23	ADICION	$ 415.076.768,00	34.728,9153868
27 SEP 23	AJUSTE DE GRAVAMEN FINANCIERO	$ 1.660.307,07	138,9156614
27 SEP 23	ADICION	$ 797.516.680,00	66.727,1488905
27 SEP 23	AJUSTE DE GRAVAMEN FINANCIERO	$ 3.190.066,72	266,9085956
28 SEP 23	ADICION	$ 328.108.320,00	27.454,9959638
28 SEP 23	AJUSTE DE GRAVAMEN FINANCIERO	$ 1.312.433,28	109,8199839

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
05 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3193953
05 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 663.502,78	56,0337508

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

12488

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000056
Ciudad:		**Fecha:**	01-SEP-2023 a 30-SEP-2023
Extracto:	10056532	**Mes:**	septiembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

05 SEP 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 165.875.694,00	14.008,4376238
05 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0606361
05 SEP 23	RETIRO BENEFIC. SISTEMA GENERAL DE REGAL	$ 122.646.452,30	10.357,6668491
05 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3193953
05 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 490.585,81	41,4306675
05 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0606361
07 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0604908
07 SEP 23	RETIRO BENEFIC. PATRIMONIOS AUTONOMOS	$ 11.000.000.000,00	926.739,9533259
07 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3186300
26 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600831
26 SEP 23	RETIRO BENEFIC. CSS CONSTRUCTORES S.A	$ 328.108.320,00	27.456,5043497
26 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 1.312.433,28	109,8260174
26 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3164824
26 SEP 23	RETIRO BENEFIC. CASS CONSTRUCTORES SAS	$ 600.000.000,00	50.208,7317073
26 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 2.400.000,00	200,8349268
26 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3164824
26 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600831
26 SEP 23	RETIRO BENEFIC. GRUPO SIDERURGICO REYNA	$ 135.115.228,00	11.306,6070537
26 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 540.460,91	45,2264280
26 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3164824
26 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600831
26 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 2.800.000,00	234,3074146
26 SEP 23	RETIRO BENEFIC. CASS CONSTRUCTORES SAS	$ 700.000.000,00	58.576,8536585
26 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600831
26 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3164824
26 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600831
26 SEP 23	RETIRO BENEFIC. CASS CONSTRUCTORES SAS	$ 542.298.232,00	45.380,1773930
26 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 2.169.192,93	181,5207097
26 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3164824
26 SEP 23	RETIRO BENEFIC. CSS CONSTRUCTORES S.A	$ 950.000.000,00	79.497,1585365
26 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600831
26 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 3.800.000,00	317,9886341
26 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3164824
26 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600831
26 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3164824
26 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 560.335,78	46,8895814
26 SEP 23	RETIRO BENEFIC. MEXICHEM COLOMBIA SAS	$ 140.083.944,00	11.722,3952680
26 SEP 23	RETIRO BENEFIC. CASS CONSTRUCTORES SAS	$ 415.076.768,00	34.734,1301374

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

12489

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000056
Ciudad:		**Fecha:**	01-SEP-2023 a 30-SEP-2023
Extracto:	10056532	**Mes:**	septiembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

26 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600831
26 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3164824
26 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 1.660.307,07	138,9365204
26 SEP 23	RETIRO BENEFIC. EDGAR ENRIQUE MUNOZ C	$ 500.056.169,00	41.845,3100465
26 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3164824
26 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600831
26 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 2.000.224,68	167,3812405
26 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600831
26 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 430.485,10	36,0235181
26 SEP 23	RETIRO BENEFIC. JM PROYECTOS DE INGENIER	$ 107.621.275,00	9.005,8795374
26 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3164824
26 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600831
26 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 3.190.066,72	266,9486735
26 SEP 23	RETIRO BENEFIC. CSS CONSTRUCTORES S.A	$ 797.516.680,00	66.737,1683636
26 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3164824
29 SEP 23	RETIRO BENEFIC. FONDO DE INVERSION COLEC	$ 328.108.320,00	27.461,8854707
29 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 1.312.433,28	109,8475419
29 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3165444
29 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600949
29 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600949
29 SEP 23	RETIRO BENEFIC. FONDO DE INVERSION COLEC	$ 950.000.000,00	79.512,7389551
29 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 3.800.000,00	318,0509558
29 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3165444
29 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3165444
29 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 1.660.307,07	138,9637501
29 SEP 23	RETIRO BENEFIC. FONDO DE INVERSION COLEC	$ 415.076.768,00	34.740,9375793
29 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600949
29 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3165444
29 SEP 23	RETIRO BENEFIC. FONDO DE INVERSION COLEC	$ 700.000.000,00	58.588,3339669
29 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 2.800.000,00	234,3533359
29 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600949
29 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 2.169.192,93	181,5562855
29 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600949
29 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3165444
29 SEP 23	RETIRO BENEFIC. FONDO DE INVERSION COLEC	$ 542.298.232,00	45.389,0713230
29 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3165444
29 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 2.400.000,00	200,8742879
29 SEP 23	RETIRO BENEFIC. FONDO DE INVERSION COLEC	$ 600.000.000,00	50.218,5719716

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

12490

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000056
Ciudad:		**Fecha:**	01-SEP-2023 a 30-SEP-2023
Extracto:	10056532	**Mes:**	septiembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

29 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600949
29 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600949
29 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3165444
29 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 3.190.066,72	267,0009920
29 SEP 23	RETIRO BENEFIC. FONDO DE INVERSION COLEC	$ 797.516.680,00	66.750,2479886
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	15.54%	**Último año**	14.07%
Semestral	10.60%	**Últimos 2 años**	9.26%
Año Corrido	15.19%	**Últimos 3 años**	N/A

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO

NIT 800.193.848-8

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	1700023956
Ciudad:		**Fecha:**	01-SEP-2023 a 30-SEP-2023
Extracto:	10052177	**Mes:**	septiembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION UNO es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION UNO, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 232.751,75 **Remuneración de la sociedad administradora:** 4,08 %

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 0,00
Total adiciones	$ 10.955.000.000,00
Total egresos	$ 10.929.518.000,00
Rendimientos	-$ 24.975.591,21
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 506.408,79

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
14 SEP 23	ADICION	$ 10.955.000.000,00	46.970,7268339

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 24.975.591,21	0,0000000
26 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,0162381
26 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0030828
26 SEP 23	RETIRO BENEFIC. PATRIMONIOS AUTONOMOS	$ 7.000.000.000,00	30.054,7180945
27 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,0162406
27 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0030832
27 SEP 23	RETIRO BENEFIC. PATRIMONIOS AUTONOMOS	$ 2.000.000.000,00	8.588,3864812
28 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,0162512
28 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0030852
28 SEP 23	RETIRO BENEFIC. PATRIMONIOS AUTONOMOS	$ 1.900.000.000,00	8.164,2672355
29 SEP 23	RETIRO BENEFIC. PATRIMONIOS AUTONOMOS	$ 29.500.000,00	126,8774295
29 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,0162661
29 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0030881
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	13.12%	**Último año**	13.10%
Semestral	7.83%	**Últimos 2 años**	7.49%
Año Corrido	14.58%	**Últimos 3 años**	5.04%

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud
Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

12492

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA DE AHORROS

4828 0003 2393

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2023

Apreciado Cliente

ACCI?N FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUT?NOMOS FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO V?A META

MAURICIO.RODRIGUEZ@ACCION.CO

Saldo Anterior	$0.00
Más Créditos	$14,929,750,165.35
Menos Débitos	$10,955,005,355.00
Nuevo Saldo	$3,974,744,810.35
Saldo Promedio	$3,050,796,965.50

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
07 09	$ 11,000,000,000.00+	8193	Abono Transferencia 0560482869984294 9014766666 TRANSFERENCIA TERCEROS 00000000000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL
14 09	$ 4,500.00-	0083	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL-EMPRESARIAL
14 09	$ 10,955,000,000.00-	0082	Dcto por Transferencia de Fondos 0550470100411870 8050129210 TRANSFERENCIA TERCEROS 00000000000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL
27 09	$ 2,000,000,000.00+	9471	Abono Transferencia 0550470100411870 8001938488 TRANSFERENCIA TERCEROS 00000000000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL
28 09	$ 1,900,000,000.00+	0090	Abono Transferencia 0550470100411870 8001938488 TRANSFERENCIA TERCEROS 00000000000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL
29 09	$ 29,500,000.00+	6307	Abono Transferencia 0550470100411870 8001938488 TRANSFERENCIA TERCEROS 00000000000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL
30 09	$ 250,165.35+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30 09	$ 855.00-	0000	IVA por Servicios	0000

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE **LAS TARIFAS DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES SERÁN ACTUALIZADAS A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023,** LO INVITAMOS A CONSULTARLAS EN **WWW.DAVIVIENDA.COM,** OPCIÓN **"TASAS Y TARIFAS".**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

12493

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000056
Ciudad:		**Fecha:**	01-OCT-2023 a 31-OCT-2023
Extracto:	10170915	**Mes:**	octubre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525 es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 12.057,59 **Remuneración de la sociedad administradora:** 1,25%

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 2.724.944.300,50
Total adiciones	$ 0,00
Total egresos	$ 149.215.975,49
Rendimientos	$ 21.729.238,93
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 2.597.457.563,95

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 21.729.238,93	

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
06 OCT 23	RETIRO BENEFIC. SISTEMA GENERAL DE REGAL	$ 51.123.310,39	4.277,6392288
06 OCT 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 204.493,24	17,1105568
06 OCT 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3164512
06 OCT 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600772
20 OCT 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 97.489.215,00	8.130,6720164
20 OCT 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 389.956,86	32,5226881
20 OCT 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3154216
20 OCT 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0598817
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	10.28%	**Último año**	14.37%
Semestral	10.72%	**Últimos 2 años**	9.75%
Año Corrido	14.68%	**Últimos 3 años**	N/A

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud
Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

12494

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO

NIT 800.193.848-8

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	1700023956
Ciudad:		**Fecha:**	01-OCT-2023 a 31-OCT-2023
Extracto:	10170917	**Mes:**	octubre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION UNO es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION UNO, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 233.816,54 **Remuneración de la sociedad administradora:** 3,23 %

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 506.408,79
Total adiciones	$ 0,00
Total egresos	$ 0,00
Rendimientos	$ 2.323,53
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 508.732,33

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 2.323,53	

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A

Mensual	5.52%	**Último año**	13.22%
Semestral	7.76%	**Últimos 2 años**	7.99%
Año Corrido	13.62%	**Últimos 3 años**	5.16%

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud
Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

12495

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu ahorro | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA DE AHORROS
4828 0003 2393

INFORME DEL MES: OCTUBRE /2023

Apreciado Cliente
ACCI?N FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUT?NOMOS FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO V?A META
MAURICIO.RODRIGUEZ@ACCION.CO

Saldo Anterior	$3,974,744,810.35
Más Créditos	$337,853.30
Menos Débitos	$0.00
Nuevo Saldo	$3,975,082,663.65
Saldo Promedio	$3,974,744,810.35

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 10	$ 337,853.30+	0000	Rendimientos Financieros.	0000



¿QUIERE AHORRAR Y NO SABE CÓMO?

FÁCIL, ABRA UN **BOLSILLO EN DAVIVIENDA**, EL CUAL LE PERMITE SEPARAR EL DINERO QUE QUIERE AHORRAR DEL QUE QUIERE GASTAR MES A MES Y ASÍ ALCANZAR SU OBJETIVO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

12496

www.accion.com.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000056
Ciudad:		**Fecha:**	01-NOV-2023 a 30-NOV-2023
Extracto:	10275008	**Mes:**	noviembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525 es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 12.218,72 **Remuneración de la sociedad administradora:** 1,25%

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 2.597.457.563,95
Total adiciones	$ 0,00
Total egresos	$ 706.818.618,98
Rendimientos	$ 32.163.221,85
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 1.922.802.166,82

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 32.163.221,85	

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
07 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3123039
07 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0592899
07 NOV 23	RETIRO BENEFIC. CARLOS JULIO GAONA	$ 36.840.067,00	3.042,1199997
07 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 147.360,27	12,1684802
07 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3123039
07 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0592899
07 NOV 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 12.660.066,00	1.045,4226366
07 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 50.640,26	4,1816902
07 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 180.010,72	14,8646367
07 NOV 23	RETIRO BENEFIC. AVIZOR SEGURIDAD LTDA	$ 45.002.679,00	3.716,1590891
07 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3123039
07 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0592899
07 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0592899
07 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 308.443,96	25,4701909
07 NOV 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 77.110.991,00	6.367,5478092
07 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3123039
10 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3116098

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoria Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

ACCION FIDUCIARIA

12497

www.accion.com.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre: FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA
Dirección:
Ciudad:
Extracto: 10275008
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA

Cédula o NIT 114601
No. de encargo fiduciario: 18700000056
Fecha: 01-NOV-2023 a 30-NOV-2023
Mes: noviembre 2023
Perfil de riesgo: CONSERVADOR

10 NOV 23	RETIRO BENEFIC. SISTEMA GENERAL DE REGAL	$ 22.069.415,76	1.818,3625639
10 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 88.277,66	7,2734500
10 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0591581
15 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0590678
15 NOV 23	RETIRO BENEFIC. CARLOS JULIO GAONA	$ 49.202.750,00	4.047,7664530
15 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 196.811,00	16,1910658
15 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3111341
15 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0590678
15 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3111341
15 NOV 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 157.393.099,00	12.948,2702910
15 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 629.572,40	51,7930815
30 NOV 23	RETIRO BENEFIC. INTACMA SAS	$ 23.683.200,00	1.939,0767684
30 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3096536
30 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0587867
30 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 94.732,80	7,7563071
30 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0587867
30 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3096536
30 NOV 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 221.945.918,00	18.171,9604373
30 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 887.783,67	72,6878416
30 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3096536
30 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 91.224,44	7,4690579
30 NOV 23	RETIRO BENEFIC. INVERSIONES COLDIND S.A.	$ 22.806.110,00	1.867,2644777
30 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0587867
30 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0587867
30 NOV 23	RETIRO BENEFIC. CARLOS JULIO GAONA	$ 35.239.010,00	2.885,2159181
30 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 140.956,04	11,5408637
30 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3096536
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	17.53%	**Último año**	15.01%
Semestral	12.20%	**Últimos 2 años**	10.45%
Año Corrido	14.93%	**Últimos 3 años**	N/A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud
Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

ACCION FIDUCIARIA

12498

www.accion.com.co

EXTRACTO

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO

NIT 800.193.848-8

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	1700023956
Ciudad:		**Fecha:**	01-NOV-2023 a 30-NOV-2023
Extracto:	10275000	**Mes:**	noviembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION UNO es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION UNO, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 237.230,39 **Remuneración de la sociedad administradora:** 4,06 %

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 508.732,33
Total adiciones	$ 0,00
Total egresos	$ 0,00
Rendimientos	$ 7.428,21
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 516.160,54

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 7.428,21	

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	19.29%	**Último año**	14.21%
Semestral	10.35%	**Últimos 2 años**	9.02%
Año Corrido	14.12%	**Últimos 3 años**	5.62%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud
Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

ACCION FIDUCIARIA

12499

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

H.42

CUENTA DE AHORROS

4828 0003 2393

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2023

Apreciado Cliente

ACCI?N FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUT?NOMOS FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO V?A META

MAURICIO.RODRIGUEZ@ACCION.CO

Saldo Anterior	$3,975,082,663.65
Más Créditos	$325,956.77
Menos Débitos	$0.00
Nuevo Saldo	$3,975,408,620.42
Saldo Promedio	$3,975,082,663.65

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
30 11	$ 325,956.77+	0000	Rendimientos Financieros.	0000



¿QUIERE AHORRAR Y NO SABE CÓMO?

FÁCIL, ABRA UN **BOLSILLO EN DAVIVIENDA**, EL CUAL LE PERMITE SEPARAR EL DINERO QUE QUIERE AHORRAR DEL QUE QUIERE GASTAR MES A MES Y ASÍ ALCANZAR SU OBJETIVO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

12500

www.accion.com.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000056
Ciudad:		**Fecha:**	01-DIC-2023 a 31-DIC-2023
Extracto:	1645	**Mes:**	diciembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525 es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 12.431,82 **Remuneración de la sociedad administradora:** 1,25%

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 1.922.802.166,82
Total adiciones	$ 25.604.213,37
Total egresos	$ 1.390.087.833,65
Rendimientos	$ 25.107.124,86
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 583.425.671,40

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 25.107.124,86	
29 DIC 23	ADICION	$ 603.450,10	48,5787091
29 DIC 23	ADICION	$ 2.865.313,22	230,6623488
29 DIC 23	ADICION	$ 22.135.450,05	1.781,9395327

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
06 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3089928
06 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 139.853,90	11,4261876
06 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 34.963.474,00	2.856,5468249
06 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0586612
06 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3089928
06 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 3.350,56	0,2737437
06 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 837.640,00	68,4359307
06 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0586612
06 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 7.736.388,00	632,0697588
06 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 30.945,55	2,5282789
06 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3089928
06 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0586612
13 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3082990
13 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 193.718,70	15,7914538

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

ACCION FIDUCIARIA

12501

www.accion.com.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000056
Ciudad:		**Fecha:**	01-DIC-2023 a 31-DIC-2023
Extracto:	1645	**Mes:**	diciembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

13 DIC 23	RETIRO BENEFIC. YASMANIT LONDONO PANTOJA	$ 48.429.675,00	3.947,8634479
13 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0585295
13 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0585295
13 DIC 23	RETIRO BENEFIC. JM PROYECTOS DE INGENIER	$ 34.674.748,00	2.826,5969201
13 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 138.698,99	11,3063875
13 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3082990
13 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 528.000,00	43,0412118
13 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0585295
13 DIC 23	RETIRO BENEFIC. SERVIPETROLEOS SAS	$ 132.000.000,00	10.760,3029573
13 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3082990
13 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 139.555,32	11,3761934
13 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0585295
13 DIC 23	RETIRO BENEFIC. JM PROYECTOS DE INGENIER	$ 34.888.830,00	2.844,0483381
13 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3082990
15 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0583818
15 DIC 23	RETIRO BENEFIC. SISTEMA GENERAL DE REGAL	$ 32.496.606,83	2.642,3532118
15 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 129.986,43	10,5694131
15 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3075207
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 47.391.904,00	3.830,5187288
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 189.567,62	15,3220752
22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CARLOS JULIO GAONA	$ 39.568.851,00	3.198,2092307
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 158.275,40	12,7928366
22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 37.074,32	2,9965852
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. FRANCHELYS LIZ PEREZ	$ 9.268.581,00	749,1463755
22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. WILSON JAVIER BENJUMEA G	$ 1.187.731,00	96,0000645
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 4.750,92	0,3839999
22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 232.744.155,00	18.811,8807117
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 930.976,62	75,2475228
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

ACCION FIDUCIARIA

12502

www.accion.com.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000056
Ciudad:		**Fecha:**	01-DIC-2023 a 31-DIC-2023
Extracto:	1645	**Mes:**	diciembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 39.124,80	3,1623182
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. GEOLAB RL SAS	$ 9.781.200,00	790,5795427
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CARLOS JULIO GAONA	$ 81.407.426,00	6.579,8721646
22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 325.629,70	26,3194883
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 322.250.000,00	26.046,3192270
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 1.289.000,00	104,1852769
22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334
22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. GEOLAB RL SAS	$ 9.781.200,00	790,5795427
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 39.124,80	3,1623182
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334
22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 1.220.242,19	98,6278281
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. DIAMAN7E SAS	$ 305.060.548,00	24.656,9570730
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	22.58%	**Último año**	15.56%
Semestral	14.68%	**Últimos 2 años**	11.34%
Año Corrido	15.56%	**Últimos 3 años**	N/A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud
Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

ACCION FIDUCIARIA

12503

DAVIVIENDA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos

CUENTA DE AHORROS
4828 0003 2393

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2023

Apreciado Cliente
ACCI?N FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUT?NOMOS FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO V?A META
MAURICIO.RODRIGUEZ@ACCION.CO

Saldo Anterior	$3,975,408,620.42
Más Créditos	$337,909.73
Menos Débitos	$0.00
Nuevo Saldo	$3,975,746,530.15
Saldo Promedio	$3,975,408,620.42

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 12	$ 337,909.73+	0000	Rendimientos Financieros.	0000



¿QUIERE AHORRAR Y NO SABE CÓMO?

FÁCIL, ABRA UN **BOLSILLO EN DAVIVIENDA**, EL CUAL LE PERMITE SEPARAR EL DINERO QUE QUIERE AHORRAR DEL QUE QUIERE GASTAR MES A MES Y ASÍ ALCANZAR SU OBJETIVO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

12504

www.accion.com.co

EXTRACTO

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO

NIT 800.193.848-8

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	1700023956
Ciudad:		**Fecha:**	01-DIC-2023 a 31-DIC-2023
Extracto:	10361167	**Mes:**	diciembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION UNO es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION UNO, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 241.331,05 **Remuneración de la sociedad administradora:** 4,41 %

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 516.160,54
Total adiciones	$ 0,00
Total egresos	$ 0,00
Rendimientos	$ 8.922,65
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 525.083,18

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 8.922,65	

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	22.36%	**Último año**	14.80%
Semestral	13.07%	**Últimos 2 años**	9.80%
Año Corrido	14.80%	**Últimos 3 años**	6.18%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud
Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideas Soluciones

ACCION FIDUCIARIA

12505

www.accion.com.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000056
Ciudad:		**Fecha:**	01-ENE-2024 a 31-ENE-2024
Extracto:	1766	**Mes:**	enero 2024
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 12.551,71 **Remuneración de la sociedad administradora:** 1,25%

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 583.425.671,40
Total adiciones	$ 5.618.875,82
Total egresos	$ 25.560.273,07
Rendimientos	$ 5.544.862,20
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 569.029.136,34

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 5.540.978,46	
29 ENE 24	ADICION	$ 5.618.875,82	448,1014708
29 ENE 24	ADICION DE RENDIMIENTOS(+)	$ 3.883,73	0,3097251

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
16 ENE 24	RETIRO BENEFIC. SISTEMA GENERAL DE REGAL	$ 25.453.957,24	2.035,8362844
16 ENE 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 101.815,83	8,1433452
16 ENE 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3024886
16 ENE 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0574265
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	11.96%	**Último año**	15.00%
Semestral	15.12%	**Últimos 2 años**	11.66%
Año Corrido	11.96%	**Últimos 3 años**	N/A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

www.accion.com.co

EXTRACTO

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO

NIT 800.193.848-8

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	1700023956
Ciudad:		**Fecha:**	01-ENE-2024 a 31-ENE-2024
Extracto:	160985	**Mes:**	enero 2024
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 243.642,98 **Remuneración de la sociedad administradora:** 3,17 %

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 525.083,18
Total adiciones	$ 0,00
Total egresos	$ 0,00
Rendimientos	$ 5.030,51
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 530.113,70

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 5.030,51	

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	11.88%	**Último año**	14.26%
Semestral	14.16%	**Últimos 2 años**	10.15%
Año Corrido	11.88%	**Últimos 3 años**	6.44%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para su dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

H.42

CUENTA DE AHORROS

4828 0003 2393

INFORME DEL MES: ENERO /2024

Apreciado Cliente

ACCI?N FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUT?NOMOS FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO V?A META

MAURICIO.RODRIGUEZ@ACCION.CO

Saldo Anterior	$3,975,746,530.15
Más Créditos	$337,938.45
Menos Débitos	$0.00
Nuevo Saldo	$3,976,084,468.60
Saldo Promedio	$3,975,746,530.15

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 01	$ 337,938.45+	0000	Rendimientos Financieros.	0000



¿QUIERE AHORRAR Y NO SABE CÓMO?

FÁCIL, ABRA UN **BOLSILLO EN DAVIVIENDA**, EL CUAL LE PERMITE SEPARAR EL DINERO QUE QUIERE AHORRAR DEL QUE QUIERE GASTAR MES A MES Y ASÍ ALCANZAR SU OBJETIVO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

125508

www.accion.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000056
Ciudad:		**Fecha:**	01-FEB-2024 a 29-FEB-2024
Extracto:	1855	**Mes:**	febrero 2024
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525 es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 12.648,56 **Remuneración de la sociedad administradora:** 1,25%

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 569.029.136,34
Total adiciones	$ 1.000.000.000,00
Total egresos	$ 884.872.947,96
Rendimientos	$ 2.432.016,49
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 686.588.204,88

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 2.432.016,49	
22 FEB 24	ADICION	$ 1.000.000.000,00	79.168,1706855

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
02 FEB 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0571819
02 FEB 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3012006
02 FEB 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 81.822.210,00	6.516,3669466
02 FEB 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 327.288,84	26,0654678
02 FEB 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 1.085.264,34	86,4310641
02 FEB 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 271.316.085,00	21.607,7660134
02 FEB 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0571819
02 FEB 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3012006
02 FEB 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0571819
02 FEB 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 31.635.347,00	2.519,4568753
02 FEB 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3012006
02 FEB 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 126.541,39	10,0778277
09 FEB 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0570970
09 FEB 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3007530
09 FEB 24	RETIRO BENEFIC. SISTEMA GENERAL DE REGAL	$ 5.887.831,16	468,2133871
09 FEB 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 23.551,32	1,8728532

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

ACCION FIDUCIARIA

12509

www.accion.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre: FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA
Dirección:
Ciudad:
Extracto: 1855
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA

Cédula o NIT 114601
No. de encargo fiduciario: 18700000056
Fecha: 01-FEB-2024 a 29-FEB-2024
Mes: febrero 2024
Perfil de riesgo: CONSERVADOR

22 FEB 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0568427
22 FEB 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2994140
22 FEB 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 1.213.680,00	96,0848254
22 FEB 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 303.420.000,00	24.021,2063494
22 FEB 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2994140
22 FEB 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 93.380.490,00	7.392,7625710
22 FEB 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0568427
22 FEB 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 373.521,96	29,5710503
22 FEB 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0568427
22 FEB 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 8.040.215,00	636,5291135
22 FEB 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2994140
22 FEB 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 32.160,86	2,5461165
22 FEB 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 343.238,09	27,1735317
22 FEB 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 85.809.523,00	6.793,3829633
22 FEB 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2994140
22 FEB 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0568427
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	10.16%	**Último año**	13.55%
Semestral	14.62%	**Últimos 2 años**	11.89%
Año Corrido	11.09%	**Últimos 3 años**	N/A

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3.1.1.9.3 del Decreto 2555 de 2010, las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras- FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud
Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACCION FIDUCIARIA

12510

www.accion.co

EXTRACTO

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO

NIT 800.193.848-8

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	1700023956
Ciudad:		**Fecha:**	01-FEB-2024 a 29-FEB-2024
Extracto:	162239	**Mes:**	febrero 2024
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION UNO es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION UNO, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 245.380,56 **Remuneración de la sociedad administradora:** 2,98 %

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 530.113,70
Total adiciones	$ 0,00
Total egresos	$ 0,00
Rendimientos	$ 3.780,73
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 533.894,43

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 3.780,73	

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	9.36%	**Último año**	12.41%
Semestral	13.46%	**Últimos 2 años**	10.56%
Año Corrido	10.65%	**Últimos 3 años**	6.74%

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3.1.1.9.3 del Decreto 2555 de 2010, las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras- FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud
Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACCION FIDUCIARIA

12511

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para su dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA DE AHORROS

4828 0003 2393

INFORME DEL MES: FEBRERO /2024

Apreciado Cliente

ACCI?N FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUT?NOMOS FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO V?A META

MAURICIO.RODRIGUEZ@ACCION.CO

Saldo Anterior	$3,976,084,468.60
Más Créditos	$292,317.44
Menos Débitos	$1,000,005,902.00
Nuevo Saldo	$2,976,370,884.04
Saldo Promedio	$3,700,220,771.49

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
22 02	$ 4,960.00-	1203	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL-EMPRESARIAL
22 02	$ 1,000,000,000.00-	1202	Dcto por Transferencia de Fondos 0550482800019291 8050129210 TRASL PATRIM 18700056	PORTAL-EMPRESARIAL
29 02	$ 292,317.44+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
29 02	$ 942.00-	0000	IVA por Servicios	0000



¿QUIERE AHORRAR Y NO SABE CÓMO?

FÁCIL, ABRA UN **BOLSILLO EN DAVIVIENDA**, EL CUAL LE PERMITE SEPARAR EL DINERO QUE QUIERE AHORRAR DEL QUE QUIERE GASTAR MES A MES Y ASÍ ALCANZAR SU OBJETIVO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

12512

CONSORCIO HALCÓN

FACTURA

12517

CONSORCIO HALCÓN

CONSORCIO HALCON
NIT 901.666.148-8
CR 5 24 50
Tel: (608) 3106965106
Yopal - Colombia
consorciohalcon@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVEH 23

Señores	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM		
NIT	900.220.547-5	**Teléfono**	(310) 3120362 - Ext. 000
Dirección	CLL 15 40 01	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/11/2024, 16:24
Expedición	22/11/2024, 16:30
Vencimiento	22/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	VALOR OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA PARCIAL N° 04 DEL CONTRATO N° 0775-2022 DEL PROYECTO No. 20211301010978, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	1.00	2,686,632,010.01
2	ADMINISTRACIÓN 27%	1.00	725,390,642.70
3	UTILIDAD 4%	1.00	107,465,280.40

Total items: 3

Total Bruto	3,519,487,933.11
Total a Pagar	3,519,487,933.11

Valor en Letras:
Tres mil quinientos diecinueve millones cuatrocientos ochenta y siete mil novecientos treinta y tres pesos m/cte con once cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-22 por $ 3,519,487,933.11

Observaciones:
IMPREVISTOS 0%

VENCIMIENTO 30 DIAS

VALOR DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO: $ 893.949.935,01

FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO DE OCCIDENTE N° 710857467 A NOMBRE DE CONSORCIO HALCON

Porcentaje de participación de los miembros:

CAMEL INGENIERIA & SERVICIOS LIMITADA - NIT 844.002.568 - 10%
DIAMANTE SAS - NIT 900.303.143 - 65%
CASS CONSTRUCTORES SAS - NIT 900.018.975 - 10%
CSS CONSTRUCTORES SA - NIT 832.006.599 - 10%
MURCIA MURCIA SAS - NIT 860.071.684 - 5%

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070217438 aprobado en 20240505 prefijo FVEH desde el número 8 al 50 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 3b624f9acf79e18b5299c888b2fe19489ee74ac1181150abf863533fc97ae3836035eae541faa6eea91ecaacacf7526e

12518

12519

CONSORCIO HALCÓN

COPIA DE TARJETA PROFESIONAL Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE CONTADORES DE OBRA E INTERVENTORIA

12521

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FCCBFDC07C97C9ED

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PAOLA ANDREA AMARILLO ALVAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1115859117 de PAZ DE ARIPORO (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 215835-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 2 F 8 E 3 6 B 5 5 9 A 8 9 B 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121884207 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 189521-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA [illegible] BARRIOS PULIDO
DIRECTORA GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y EL ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

VALIDO PARA CONSORCIO INTERAMI





12523

CONSORCIO HALCÓN

INFORME DE INTERVENTORIA

12524

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 4

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

Periodo de 01/11/2024 a 20/11/2024
Fecha de Presentación: 22 NOV. 2024

INFORMACIÓN BASICA CONTRATO DE OBRA	
OBJETO CONTRATO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"; "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"
VALOR DEL CONTRATO:	$ 112.964.569.993,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 112.964.569.993,00
OBJETO PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"
VALOR DEL PROYECTO:	$ 58.767.216.954,00
VALOR ADICIONAL:	$ 00,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 58.767.216.954,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCON
CORREO ELECTRONICO:	gerencia@camelingenieria.com

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO			
FECHA DE INICIACIÓN:			12/07/2023
PRORROGA No. 1 POR REINICIO 1 BPIN 20211301010978 (11 diciembre 2025 al 28 abril 2026):			4 meses 18 días
SUSPENSIÓN			N/A
TIEMPO:			N/A
REINICIO:			N/A
FECHA DE TERMINACIÓN			28/04/2026
33	Meses	18	Días
TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO			
FECHA DE INICIACIÓN:			12/07/2023

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12525

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 4

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

PRORROGA:			N/A
SUSPENSIÓN No 1: (14/06/2024)			14 junio 2024 al 13 de septiembre 2024
TIEMPO:			3 MESES
AMPLIACION No. 1 DE LA SUSPENSION No.1 (13/09/2024)			14 de septiembre 2024 al 13 de noviembre de 2024
TIEMPO:			2 MESES
REINICIO No 1:			1/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA			28/04/2026
29	Meses	0	Días

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	**0250 DE 2023**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO INTER AIM**
OBJETO CONTRATO:	"CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 MUNICIPIO DE CUMARAL; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO – PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META."
OBJETO PROYECTO:	"CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META."
CORREO ELECTRONICO:	consorciointeraim@gmail.com

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE SUPERVISOR	GINA TATIANA ELAICA NIETO
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	263-2023
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN	EDWIN LEONARDO GUTIERREZ RODRIGUEZ

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12526

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 4

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

MUNICIPIO:	VISTA HERMOSA	**VEREDA:**	
CORREGIMIENTO:	PIÑALITO – SANTO DOMINGO	**BARRIO:**	
COMUNA:			
COORDENADAS:	Latitud: 2:25; 20.57054N Longitud: 73:40; 35,40601 W Piñalito Latitud: 2:51; 48.77586N Longitud: 73:48; 08,78699 W Santo Domingo		

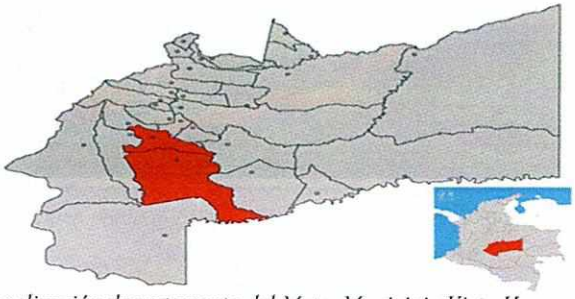


Ilustración 1 Localización departamento del Meta, Municipio Vista Hermosa (Adamisacson, 2011)



Ilustración 2 Vía que comunica el centro poblado Piñalito con el centro poblado Santo Domingo municipio de Vista Hermosa (Fuente, Google Earth)

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12527

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 4

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

A. INFORME TECNICO

1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE FISICO DE OBRA

Avance físico

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 01 de fecha 19/11/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
1	EXCAVACIONES													
1,1	EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	M3	1.907,00	$ 63.680,00	$ 121.437.760,00	41.382,15	$ 2.635.215.073,00	1.894,00	$ 120.609.920,00	28.928,10	$ 1.842.141.408,00	30.822,10	$ 1.962.751.328,00	74,48%
1,2	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE)	M3	7.034,70	$ 48.697,00	$ 342.568.786,00	7.034,70	$ 342.568.786,00	1.446,43	$ 70.436.801,71	0,00	$ 0,00	1.446,43	$ 70.436.801,71	20,56%
1,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	1.469.121,31	$ 1.879,00	$ 2.760.478.941,00	131.294,11	$ 246.701.628,00	45.505,99	$ 85.505.755,21	5.513,37	$ 10.359.622,23	51.019,36	$ 95.865.377,44	38,86%
	SUBTOTAL				**$ 3.224.485.487,00**		**$ 3.224.485.487,00**		**$ 276.552.476,92**		**$ 1.852.501.030,23**		**$ 2.129.053.507,15**	
2	RELLENOS													
2,1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	M3	175.074,00	$ 51.548,00	$ 9.024.714.552,00	222.792,89	$ 11.484.527.846,00	143.491,80	$ 7.396.715.306,40	850,50	$ 43.841.574,00	144.342,30	$ 7.440.556.880,40	64,79%
2,2	GEOTEXTIL T 1700 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	154.000,00	$ 14.868,00	$ 2.289.672.000,00	154.000,00	$ 2.289.672.000,00	20.757,00	$ 308.615.076,00	6.623,00	$ 98.470.764,00	27.380,00	$ 407.085.840,00	17,78%
2,3	SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	32.498,00	$ 167.272,00	$ 5.436.005.456,00	32.498,00	$ 5.436.005.456,00	2.908,80	$ 486.560.793,60	0,00	$ 0,00	2.908,80	$ 486.560.793,60	8,95%
2,4	BASE ESTABILIZADA CON EMULSION ASFLATICA BEE 38. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR INCLUYE EMULSION.	M3	19.680,00	$ 552.999,00	$ 10.883.020.320,00	19.680,00	$ 10.883.020.320,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
2,5	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	9.891.520,60	$ 1.879,00	$ 18.586.167.207,00	8.533.287,43	$ 16.034.047.075,00	2.833.412,20	$ 5.323.981.523,80	811.428,72	$ 1.524.674.564,88	3.644.840,92	$ 6.848.656.088,68	42,71%
N.P	ITEMS NO PREVISTOS - RELLENOS													
N.P. 2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 6" RDE 21 200 PSI UNION PLATINO	ML	0,00	$ 170.647,00	$ 0,00	1,00	$ 170.647,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
N.P. 2,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 4" RDE 21 200 PSI UNION PLATINO	ML	0,00	$ 85.232,00	$ 0,00	501,70	$ 42.760.508,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
N.P. 2,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 3" RDE 21 200 PSI UNION PLATINO	ML	0,00	$ 53.307,00	$ 0,00	1,00	$ 53.307,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
N.P. 2,9	TUBERIA PVC PF + UAD 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	$ 18.706,00	$ 0,00	200,00	$ 3.741.200,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
N.P. 2,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACIÓN EN PVC 6" UM	UN	0,00	$ 470.342,00	$ 0,00	1,00	$ 470.342,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
N.P. 2,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACIÓN EN PVC 4" UM	UN	0,00	$ 233.529,00	$ 0,00	50,00	$ 11.676.450,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
N.P. 2,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACIÓN EN PVC 3" UM	UN	0,00	$ 153.992,00	$ 0,00	1,00	$ 153.992,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
N.P. 2,13	VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE DE 6" JUNTA HIDRAULICA PVC. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0,00	$ 3.074.424,00	$ 0,00	1,00	$ 3.074.424,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12522

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 4

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

N.P. 2,14	VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE DE 4" JUNTA HIDRAULICA PVC. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0,00	$ 1.708.374,00	$ 0,00	1,00	$ 1.708.374,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
N.P. 2,15	VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE DE 3" JUNTA HIDRAULICA PVC. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0,00	$ 1.326.696,00	$ 0,00	1,00	$ 1.326.696,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
N.P. 2,16	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 66.071,00	$ 0,00	10,00	$ 660.710,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
N.P. 2,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCENTRICA PVC 6" X 4" UM	UN	0,00	$ 317.741,00	$ 0,00	1,00	$ 317.741,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
N.P. 2,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCENTRICA PVC 4" X 3" UM	UN	0,00	$ 159.635,00	$ 0,00	1,00	$ 159.635,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
N.P. 2,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC 3" UM	UN	0,00	$ 213.239,00	$ 0,00	1,00	$ 213.239,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
N.P. 2,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC DE 4" UM	UN	0,00	$ 358.279,00	$ 0,00	10,00	$ 3.582.790,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
N.P. 2,21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC DE 6" UM	UN	0,00	$ 957.321,00	$ 0,00	1,00	$ 957.321,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
N.P. 2,22	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0-2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0,00	$ 132.522,00	$ 0,00	120,00	$ 15.902.640,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
N.P. 2,23	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERIAS	M3	0,00	$ 175.961,00	$ 0,00	15,00	$ 2.639.415,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
N.P. 2,24	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA VENTOSA CAMARA SENCILLA EXTREMO ROSCADO 2"	UN	0,00	$ 978.132,00	$ 0,00	1,00	$ 978.132,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
N.P. 2,25	VALVULA DE PURGA 2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0,00	$ 1.669.641,00	$ 0,00	1,00	$ 1.669.641,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
N.P. 2,26	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	0,00	$ 89.634,00	$ 0,00	1,00	$ 89.634,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 46.219.579.535,00**		**$ 46.219.579.535,00**	0,00	**$ 13.515.872.699,80**	0,00	**$ 1.666.986.902,88**	0,00	**$ 15.182.859.602,68**	
3	**PAVIMENTO FLEXIBLE**													
3,1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	143.000,00	$ 5.557,00	$ 794.651.000,00	143.000,00	$ 794.651.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
3,2	TRATAMIENTO MEDIANTE LECHADA ASFALTICA E=8 MM	M2	143.000,00	$ 14.066,00	$ 2.011.438.000,00	143.000,00	$ 2.011.438.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 2.806.089.000,00**		**$ 2.806.089.000,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
4	**SEÑALIZACIÓN**													
4,1	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	ML	66.000,00	$ 5.944,00	$ 392.304.000,00	66.000,00	$ 392.304.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4,2	DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR.	M2	40,70	$ 39.991,00	$ 1.627.634,00	40,70	$ 1.627.634,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4,3	ESTOPEROL METALICO 10 X 2.5 CM	UN	2.016,00	$ 27.282,00	$ 55.000.512,00	2.016,00	$ 55.000.512,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4,4	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	7.894,00	$ 16.061,00	$ 126.785.534,00	7.894,00	$ 126.785.534,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4,5	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	161,00	$ 442.249,00	$ 71.202.089,00	161,00	$ 71.202.089,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4,6	SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA (SR) CIRCULO Ø 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	74,00	$ 433.684,00	$ 32.092.616,00	74,00	$ 32.092.616,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4,7	DEFENSA METALICA PARA CURVAS. SUMINISTRO E INSTALACION	ML	2.224,91	$ 193.934,00	$ 431.485.696,00	2.224,91	$ 431.485.696,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 1.110.498.081,00**		**$ 1.110.498.081,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
5	**ESTRUCTURAS HIDRAULICAS**													
5,1	DEMOLICIÓN CONCRETO REFORZADO (INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL)	M3	803,45	$ 485.270,00	$ 389.890.182,00	803,45	$ 389.890.182,00	160,69	$ 77.978.036,30	0,00	$ 0,00	160,69	$ 77.978.036,30	20,00%
5,2	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL)	M3	44,65	$ 448.201,00	$ 20.012.175,00	44,65	$ 20.012.175,00	8,93	$ 4.002.434,93	0,00	$ 0,00	8,93	$ 4.002.434,93	20,00%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 4

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

5,3	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI)	M3	72,19	$ 811.099,00	$ 58.553.237,00	72,19	$ 58.553.237,00	21,91	$ 17.771.179,09	0,00	$ 0,00	21,91	$ 17.771.179,09	30,35%
5,4	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2,G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	KG	92.035,08	$ 8.964,00	$ 825.002.457,00	92.035,08	$ 825.002.457,00	44.368,40	$ 397.718.337,60	0,00	$ 0,00	44.368,40	$ 397.718.337,60	48,21%
5,5	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.003,82	$ 1.364.429,00	$ 1.369.641.119,00	1.003,82	$ 1.369.641.119,00	430,65	$ 587.591.348,85	0,00	$ 0,00	430,65	$ 587.591.348,85	42,90%
	SUBTOTAL				**$ 2.663.099.170,00**		**$ 2.663.099.170,00**		**$ 1.085.061.336,77**		**$ 0,00**		**$ 1.085.061.336,77**	
6	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**													
6,1	CUNETA TRIANGULAR L=0.90M E=0.12M EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	2.320,00	$ 265.131,00	$ 615.103.920,00	2.320,00	$ 615.103.920,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
6,2	POCETA EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO.	M3	50,7	$ 1.005.389,00	$ 50.973.222,00	50,70	$ 50.973.222,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
6,3	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 6" AUTOCEBANTE DIESEL	DIA	300	$ 346.339,00	$ 103.901.700,00	300,00	$ 103.901.700,00	17,00	$ 5.887.763,00	0,00	$ 0,00	17,00	$ 5.887.763,00	5,67%
6,4	SIEMBRA CESPEDON GRAMA E=0.05 M	M2	22.500,00	$ 55.627,00	$ 1.251.607.500,00	22.500,00	$ 1.251.607.500,00	13.006,40	$ 723.507.012,80	0,00	$ 0,00	13.006,40	$ 723.507.012,80	57,81%
	SUBTOTAL				**$ 2.021.586.342,00**		**$ 2.021.586.342,00**		**$ 729.394.775,80**		**$ 0,00**		**$ 729.394.775,80**	
	ÍTEMS NO PREVISTOS													
N.P. 1			0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
N.P. 2			0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL ÍTEMS NO PREVISTOS							**0,00**	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 44.309.418.026,72**		**$ 44.309.418.026,72**		**$ 11.913.649.839,15**		**$ 2.686.632.010,01**		**$ 14.600.281.849,16**	
	ADMINISTRACIÓN (27%)				**$ 11.963.542.867,21**		**$ 11.963.542.867,21**		**$ 3.216.685.456,57**		**$ 725.390.642,70**		**$ 3.942.076.099,27**	
	IMPREVISTOS (0%)				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	UTILIDAD (4%)				**$ 1.772.376.721,07**		**$ 1.772.376.721,07**		**$ 476.545.993,57**		**$ 107.465.280,40**		**$ 584.011.273,97**	
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				**$ 13.735.919.588,28**		**$ 13.735.919.588,28**		**$ 3.693.231.450,14**		**$ 832.855.923,10**		**$ 4.526.087.373,24**	
7,00	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	UND	1,00	$ 229.756.600,00	$ 229.756.600,00	1,00	$ 229.756.600,00	0,17	$ 39.058.622,00	0,00	$ 0,00	0,17	$ 39.058.622,00	17,00%
8,00	IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	UND	1,00	$ 492.122.739,00	$ 492.122.739,00	1,00	$ 492.122.739,00	0,17	$ 83.660.865,63	0,00	$ 0,00	0,17	$ 83.660.865,63	17,00%
	SUBTOTAL				**$ 721.879.339,00**		**$ 721.879.339,00**		**$ 122.719.487,63**		**$ 0,00**		**$ 122.719.487,63**	
	VALOR TOTAL OBRA				**$ 58.767.216.954,00**		**$ 58.767.216.954,00**		**$ 15.729.600.776,92**		**$ 3.519.487.933,11**		**$ 19.249.088.710,03**	


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1530

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 4

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

Grafica Avance Físico

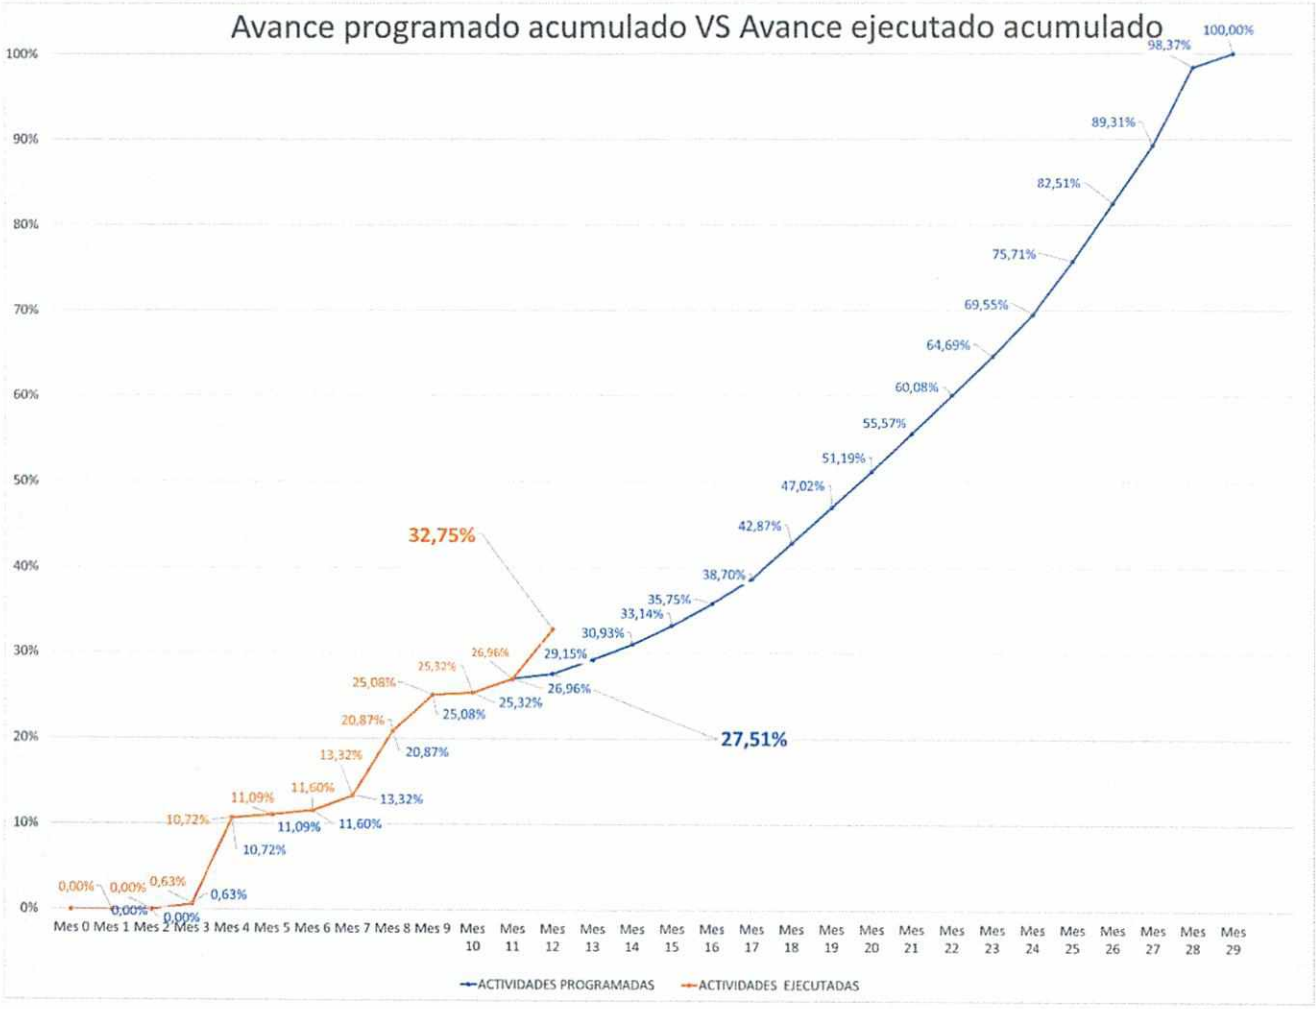

12531

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 4

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

2. GESTIÓN TECNICA Y DOCUMENTAL

N/A - La respectiva gestión de correspondencia y comités se anexo en los respectivos periodos de los informes mensuales

3. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN PROPUESTOS

N/A - La relación de los problemas presentados durante cada periodo se encuentran relacionados en los correspondientes informes mensuales.

4. GESTIÓN TECNICA DE LA INTERVENTORIA

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
Director de Interventoría	Se encarga de dirigir, coordinar y verificar la ejecución de la obra contenido en el objeto contractual, desde su iniciación hasta el recibo a satisfacción de las mismas, además se encarga de aprobar o rechazar procedimientos o esquemas de construcción, dar recomendaciones e impartir instrucciones sobre cómo se deben acometer los trabajos para el cumplimiento de programas de ejecución de obra.
Residente de Interventoría	Coordinar, supervisar y verificar la ejecución de las acciones impartidas por la Dirección de la Interventoría y acordadas con la entidad, ha preparado informes periódicos y se ha encargado de firmar y aprobar el contenido de la bitácora y coordinar registro fotográfico diario de cada una de las actividades de obra, ha asistido a las reuniones semanales y/o comités técnicos, en conjunto con el contratista.
Especialista en estructuras	Revisión, verificación y aprobación de diseños presentados, proyectar y dirigir conceptos necesarios en campo, junto con la supervisión del recurso humano, en los componentes estructurales del proyecto tales como estructuras de obra de arte y todas aquellas estructuras que requieran de su concepto de acuerdo con la NSR-10.
Especialista en vías	Verificación, seguimiento y control al cumplimiento de la normatividad vigente respecto a la norma INVIAS para las estructuras viales construidas, participando en la emisión de informes y conceptos que den a lugar las actividades ejecutadas.
Especialista en pavimentos	Verificación, seguimiento y control al cumplimiento de la normatividad vigente respecto a la norma AASHTO-93 para las estructuras de pavimentos, participando en la emisión

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12532

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 4

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

	de informes y conceptos que den a lugar las actividades ejecutadas.
Especialista en geotecnia y suelos	Verificación, seguimiento y control al cumplimiento de la normatividad vigente respecto a la norma NSR-10 para la estabilización de taludes y los suelos de cimentación de las estructuras propuestas, participando en la emisión de informes y conceptos que den a lugar las actividades ejecutadas.
Especialista en hidráulica e hidrología	Verificación, seguimiento, control, análisis y definición de la capacidad hidráulica de cada una de las estructuras propuestas respecto al manual de drenaje del Invias.
Profesional siso	Verificación, seguimiento y control al cumplimiento de la normatividad vigente respecto al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Asesor ambiental	Revisión y seguimiento al cumplimiento de actividades ambientales contractuales y pertenecientes a los permisos ambientales.
PERFIL TECNICO	**GESTIÓN /OBSERVACIÓN**
Topógrafo Inspector	Revisión y seguimiento de niveles y lineamientos, chequeos de espesores, carteras topográficas, de acuerdo a los diseños aprobados.

La gestión realizada por cada especialista se documenta en los informes mensuales correspondientes a cada periodo. Cada informe está debidamente firmado por el profesional respectivo de esta interventoría

5. ESTADO DEL TIEMPO

Frecuencia.

Durante el 01/11/2024 al 20/11/2024

ESTADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
DIA	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X
NUBLADO																				
TORMENTA																				
LLUVIOSO								7												
SOLEADO	9	5			9	9	9	2	10	9		9	9	9	9	5		9	9	9

OBSERVACIONES: Se presentan días lluviosos y soleados durante el mes. Predomina día soleado.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12583

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 4

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

B. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

1. NORMAS TÉCNICAS CITADAS EN EL PROCESO

NORMA	APLICACIÓN	RESULTADO
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS INVIAS 2022	ARTICULO 320 -22 SUB BASE GRANULAR	SEGUIMIENTO AL PROCESO CONSTRUCTIVO
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS INVIAS 2022	ARTICULO 320 -22 BASE GRANULAR	SEGUIMIENTO AL PROCESO CONSTRUCTIVO
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS INVIAS 2022	ARTICULO 420-22 RIEGO IMPRIMACION	SEGUIMIENTO AL PROCESO CONSTRUCTIVO
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS INVIAS 2022	ARTICULO 420-22 RIEGO IMPRIMACION	SEGUIMIENTO AL PROCESO CONSTRUCTIVO
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS INVIAS 2022	ARTICULO 450-22 MEZCLAS ASFALTICAS	SEGUIMIENTO AL PROCESO CONSTRUCTIVO
MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL	INSPECCION A LA INSTALACION DE SEÑALIZACION	SEGUIMIENTO AL PROCESO CONSTRUCTIVO

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La interventoría realizó una verificación exhaustiva de las especificaciones técnicas de las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido en el presente informe. Este proceso de revisión riguroso ha confirmado que todas las actividades físicas de la obra realizadas en el periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2024 al 20 de noviembre de 2024, se llevaron a cabo de manera satisfactoria.

Es importante destacar que estas actividades no sólo cumplieron con las especificaciones técnicas ingenieriles, sino que también se adhirieron a todas las normativas legales vigentes. Este cumplimiento integral asegura que la obra se está desarrollando de acuerdo con los más altos estándares de calidad y legalidad.

La interventoría ha constatado que el contratista ha demostrado un compromiso ejemplar con la excelencia técnica y la conformidad legal en la ejecución de las actividades de la obra durante el periodo comprendido entre del 01 de noviembre de 2024 al 20 de noviembre de 2024.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12534

3. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.

CAPITULO 1: EXCAVACIONES

ITEM 1.1: EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)

El contratista de obra llevó a cabo la excavación de las cajas destinadas a los sobreanchos de vía a lo largo de ambas márgenes. Esta tarea se ejecutó en colaboración con la comisión topográfica, asegurando la conformidad con el diseño geométrico suministrado por la AIM a través de la consultoría. Mediante el uso de una retroexcavadora, el equipo de topografía procedió a delinear el trazado conforme al diseño, utilizando estacas para marcar la banca y los puntos de referencia necesarios para iniciar la excavación. Durante este proceso, se eliminó todo el material orgánico presente en el suelo natural.

Se consideraron aspectos clave como el ancho de la calzada, la profundidad y la longitud de la caja para garantizar la precisión de la excavación. El equipo necesario para llevar a cabo esta actividad incluyó una excavadora, un vibrocompactador y volquetas de doble troque. Además, se implementaron el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) y el Plan de Manejo Ambiental (PMA) autorizados, con el fin de asegurar la seguridad y minimizar el impacto ambiental durante la realización de los trabajos.

ITEM 1.3: TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES

Durante las operaciones de excavación, se efectuó una cuidadosa selección del material extraído, separando aquellos componentes útiles para posteriormente ser utilizado en el borde del terraplén. Este procedimiento el contratista de obra lo realizó con el objetivo de reutilizar dicho material en etapas posteriores para la estabilización y protección de los taludes. Así mismo, el material orgánico no aprovechable, resultante de la excavación de las cajas, fue extraído y almacenado en las instalaciones del campamento de obra.

El traslado de estos sobrantes se llevó a cabo mediante volquetas de doble troque, las cuales fueron previamente cargadas por una excavadora. Este proceso se desarrolló siguiendo estrictos protocolos de seguridad y eficiencia.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12535

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 4

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

CAPITULO 2: RELLENOS

ITEM 2.1: RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.

A continuación, se detalla el procedimiento constructivo paso a paso que se sigue para esta actividad:

Una vez realizado el descapote y limpieza se realizó la excavación de cajas y se retiró la capa vegetal y todo material inadecuado según el artículo 210 norma INV 2013 encontrado en el tramo, seguidamente se realizó la excavación de la explanación y el contratista de obra implemento la medida de drenajes definitivos indicadas en los documentos del proyecto y de drenaje provisional contempladas por el constructor en el método constructivo.
Una vez que el terreno base estuvo limpio y drenado de manera satisfactoria, lo cual fue verificado por la interventoría, se procedió a escarificar, conformar y compactar el terreno. Este proceso se realizó de acuerdo con las exigencias de compactación, utilizando capas de espesor uniforme compuestas por material mixto de río sin procesar, con un tamaño máximo de 3 pulgadas.

Cada capa fue verificada en el campo en términos de compactación y nivelación por parte del equipo interventor.

ITEM 2.2: GEOTEXTIL T 1700 SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

Durante el seguimiento de la interventoría, se ha observado que es fundamental realizar una limpieza exhaustiva de los sobreanchos destinados a la instalación del geotextil. Esto implica garantizar que el área esté completamente libre de piedras, escombros, raíces, material vegetal y cualquier otro elemento que pueda interferir con la correcta colocación del material. Una vez completada la limpieza, se verifica minuciosamente la compactación adecuada del terreno donde se instalará el geotextil. Es esencial asegurar una base sólida y uniforme para optimizar el rendimiento del geotextil.

Posteriormente, se procede con la instalación del geotextil, asegurando amarres cada 5 metros para evitar movimientos y garantizar un contacto óptimo con la superficie. Este paso es crucial para maximizar la eficacia y durabilidad del geotextil en su función de refuerzo y estabilización del terreno. Una vez instalado el geotextil, se da inicio al proceso de relleno y compactación del material sobre el mismo. Este procedimiento se lleva a cabo de manera cuidadosa y progresiva, asegurando que el geotextil quede completamente cubierto y que se logre una compactación adecuada en cada capa de relleno.

ITEM 2.5: TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR.

El contratista de obra realiza transporte de material para relleno del del Rio Güejar, de la cantera La Balastrera luego de que la interventoría certifico el día 12 de octubre de 2023 *"... Certificó que la fuente de material que está siendo utilizada en las actividades de relleno proviene del Rio Güejar, de la cantera La Balastrera ubicada en el municipio de Vista Hermosa. Siendo esta la*

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12536

fuente más cercana al proyecto en mención. Esta fuente de material fue la inicialmente aprobada y certificada en los estudios y diseños realizados por la consultoría, entregados por la Agencia Para la Infraestructura del Meta. …". Adicionalmente se desarrollan actividades de transporte de sub-base Granular, para lo que el contratista de obra realiza transporte desde el Rio Güejar, de la ubicado en La Balastrera luego de que la interventoría certificó "*…Que la fuente de material utilizada en las actividades de Sub-base granular clase A norma INVIAS, proviene del Rio Guejar, específicamente de la vereda La Balastrera, situada en el municipio de Vista Hermosa. Esta fuente de material resulta ser más cercana al proyecto que la inicialmente aprobada y certificada en los estudios y diseños realizados por la consultoría, los cuales fueron entregados por la Agencia para la Infraestructura del Meta. La fuente inicialmente fue la mina Carbol SAS ubicada en Granada – Meta, situada a 88,4 km del centroide del proyecto, mientras que la fuente actual y certificada en este documento se encuentra a tan solo 17,6 km al inicio del proyecto en el punto abs K0+00*".

4. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

Tamaño max. 3"

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	NORMA
Granulometria	INV E 122/123/125/126
Pasa Tamiz No 10	INV E 123
Pasa Tamiz No 200	INV E 123
Limite Liquido	INV E 125
Indice de Plasticidad	INV E 125/126
Contenido Mat Organica	INV E 212
CBR Diseño	INV E 148
Sales solubles	INV E 158
Sales solubles	INV E 157
Proctor	INV E 142

Anexo: Formato 112-ECP-FR-018-ACTA RESUMEN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO.

5. SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Anexo: N/A
No se incluyen anexos en esta sección. Los Formatos 112-ECP-FR-019 de Control de Seguridad Industrial en Obra, correspondientes al período de la presente acta parcial, se encuentran adjuntos y relacionados en los informes mensuales correspondientes a cada período, ya que la información se compila y analiza al cierre de cada mes.

Se anexa 112-ECP-FR-021-ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA; correspondiente al periodo junio, toda vez que la seguridad se paga mes vencido, teniendo en cuenta que los trabajadores dependientes e independientes vinculados cotizan mes vencido al sistema de seguridad social integral.

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 4

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

PERIODO DE JUNIO 2024

Se presenta planilla de pago N°: 9469823292, 9469883373, 9469882779, 9469079446, 9469330874, 9469884566, 9469882346, 9469276040, 9469883589, 9469882165

6. GESTIÓN SOCIAL

Se encuentra relacionada en los informes mensuales correspondientes a cada período, ya que la información se compila y analiza al cierre de cada mes.

Actores por ámbito contextual – Local

Características demográficas de la población objetivo según la MGA.

CLASIFICACION	DETALLE	NUMERO DE PERSONAS	FUENTE DE LA INFORMACION
Género	Masculino	9.267	Proyecciones DANE 2022, censo poblacional 2018.
	Femenino	7.583	Proyecciones DANE 2022, censo poblacional 2018.
Etaria (edad)	0 a 14 años	4.550	Proyecciones DANE 2022, censo poblacional 2018.
	15 a 19 años	2.190	Proyecciones DANE 2022, censo poblacional 2018.
	20 a 59 años	8.425	Proyecciones DANE 2022, censo poblacional 2018.
	Mayor de 60 años	1.685	Proyecciones DANE 2022, censo poblacional 2018.
Poblacion Vulnerable	Víctimas de otros hechos diferentes al desplazamiento	8.619	Registro Unico de Victimas (RUV, 2022)

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

112538

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 4

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

7. MANEJO AMBIENTAL

Anexo: N/A

No se incluyen anexos en esta sección. Los Formatos 112-ECP-FR-020-ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL. correspondientes al período de la presente acta parcial, se encuentran adjuntos y relacionados en los informes mensuales correspondientes a cada período, ya que la información se compila y analiza al cierre de cada mes.

C. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO DE OBRA

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	**TIEMPO (MESES / DIAS)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
SUSPENSION No.1 (14 DE JUNIO 2024)	**3 MESES** 14 de junio 2024 al 13 de septiembre de 2024	COLAPSO DEL PUENTE VEHICULAR PIÑALITO	3271-3349
AMPLIACION No. 1 DE LA SUSPENSION No.1 (13 DE SEPTIEMBRE 2024)	**2 MESES** 14 de septiembre 2024 al 13 de noviembre de 2024	CONTINÚA INHABILITADO EL PUENTE VEHICULAR PIÑALITO	3350-3397
PRORROGA No.1 al contrato 0775 de 2022 y **REINICIO No. 1** del proyecto 20211301010978	**Prorroga** 4 meses 18 días **Reinicio 1 nov 2024**	REHABILITACION DEL PUENTE	-

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	**VALOR ($)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
N/A			

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	**VALOR ACTUALIZADO ($)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**

12539

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 4

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

ACTA DE MODIFICACIÓN N° 1 PROYECTO 20211301010978 **19 noviembre 2024**	$ 58.767.216.954,00	Se requirió realizar la modificación de cantidades acorde con la realidad actual y de esta manera optimizar los recursos garantizando la ejecución de todas las actividades necesarias para la óptima ejecución de la obra para el proyecto 2021005500215. Se realiza un balance de mayores y menores cantidades de obra e Items nuevos.	-

2. GARANTIAS:

POLIZAS DE PERFECCIONAMIENTO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	NB- 100241770
ANEXO N°	0
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	NB 100057150
ANEXO N°	0
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	31/05/2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Buen Manejo de anticipo	26/12/2022	26/11/2025	$ 22.592.913.998,60
Prestaciones sociales	26/12/2022	26/05/2028	$ 5.648.228.500,00
Cumplimiento	26/12/2022	26/11/2025	$ 11.296.457.000,00
Estabilidad de la obra	26/05/2025	26/05/2030	$ 11.296.457.000,00
Responsabilidad Civil - Extracontractual	26/12/2022	26/05/2025	$ 5.648.228.500,00

PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGUN ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	NB-100241770
ANEXO N°	02
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	NB-100057150
ANEXO N°	01
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	18/07/2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12540

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 4

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	12/07/2023	11/06/2026	$22.592.913.999,00
PRESTACIONES SOCIALES	12/07/2023	11/12/2028	$ 5.648.228.500,00
CUMPLIMIENTO	12/07/2023	11/06/2026	$ 11.296.457.000,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	11/12/2025	11/12/2030	$ 11.296.457.000,00
AMPAROS BASICOS – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	26/12/2022	11/12/2025	$ 5.648.228.500,00
PATRONAL	26/12/2022	11/12/2025	$ 2.824.114.249,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	26/12/2022	11/12/2025	$ 2.824.114.249,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	26/12/2022	11/12/2025	$ 2.824.114.249,00

D. INFORME FINANCIERO

1. PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
ANT.	143486023	2023/08/04					$14.926.873.106,32
1	13723	2023/12/22	10,72%	$6.301.292.867,68	$1.600.528.388,39	$4.700.764.479,29	$19.627.637.585,61
2	5824	2024/04/30	10,08%	$ 5.924.838.815,28	$1.504.909.059,08	$ 4.419.929.756,20	$ 24.047.567.341,81
3	17424	12/08/2024	5,97%	$3.395.513.288,50	$ 862.460.375,28	$2.533.052.913,22	$26.580.620.255,03
	17324	12/08/2024		$107.955.805,46	$ 27.420.774,59	$80.535.030,87	$26.661.155.285,90
		TOTALES	26,77%	$ 15.729.600.776,92			$26.661.155.285,90

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: 12/07/2023 AL 20/11/2024.

Avance físico ejecutado 32,75% y avance financiero ejecutado 26,77%.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co


1254


INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 4

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

E. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1	EXCAVACIONES	EJECUTADO	%
1.1	EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	28.928,10 M3	69,90

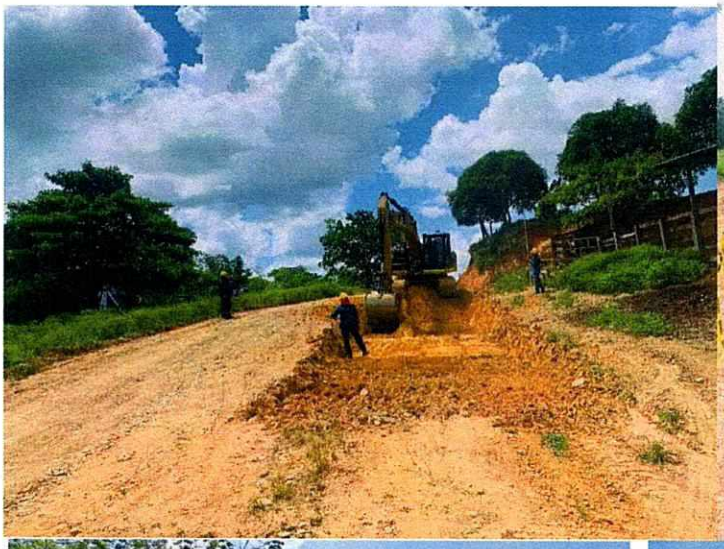

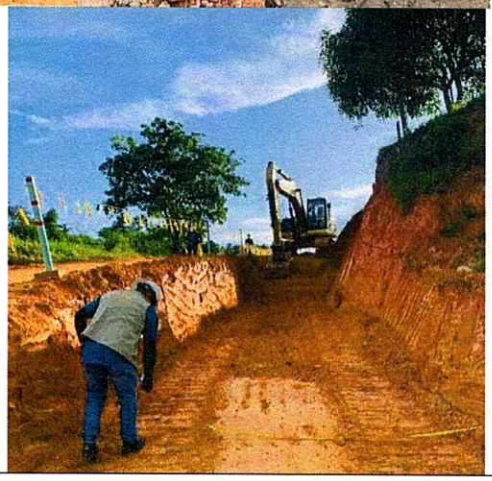OBSERVACIONES:
La interventoría realiza seguimiento y verificación de la actividad de excavación mecánica para cajas de vías.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12542

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 4

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1	**EXCAVACIONES**	**EJECUTADO**	**%**
1.3	**TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES**	5.513,37 M3/KM	4,20





OBSERVACIONES:

Después de que se realizaran las excavaciones mecánicas se genera un acarreo de este material que posteriormente fue depositado en las zonas más críticas para proteger el terraplén de la vía, esto autorizado por el equipo interventor en la obra.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12543

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 4

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2	**RELLENOS**	**EJECUTADO**	**%**
2.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	850,50 M3	0,38





OBSERVACIONES:

Relleno con material mixto de río sin procesar, cuyo tamaño máximo es de 3 pulgadas.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12544

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 4

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2	**RELLENOS**	**EJECUTADO**	**%**
2.2	GEOTEXTIL T 1700 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	6.623,00 M2	4,30







OBSERVACIONES:

Luego de realizar el respectivo cajeo para alcanzar el ancho de diseño establecido, el contratista procedió a instalar el geotextil garantizando así la estabilización del talud.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12545

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 4

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2	**RELLENOS**	**EJECUTADO**	**%**
2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	811.428,72 M3/KM	9,51







OBSERVACIONES:

El contratista de obra transporta el material desde el Rio Güejar, específicamente en el punto ubicado en la vereda La Balastrera hasta cada uno de los frentes de trabajo.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12546

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 4

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

G. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

- El presente informe refleja un avance ejecutado acumulado de obra del 32,75%, los datos correspondientes a las actividades detalladas en el presente informe para **ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA NO. 4**, se obtienen directamente en terreno. Se ha asegurado el cumplimiento de las directrices sugeridas por la interventoría. Así mismo, se ha implementado el rigor de la aplicación de los procesos de calidad requeridos, garantizando así la conformidad con los estándares establecidos y la integridad estructural del proyecto. Estas acciones demuestran el compromiso del equipo de trabajo con las normativas establecidas y con la entrega de resultados que satisfacen los estándares de calidad y seguridad pertinentes.

Avance de obra certificado por la interventoría del proyecto 20211301010978

CONTRATO DE OBRA No. 0775-2022 CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA"					
CONTRATO	PROYECTO	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	% PROGRAMADO
0775 DE 2022	20211301010978	$ 58.767.216.954	$19.249.088.710,0	32,75%	27,51%

- Durante el periodo comprendido entre el **01 de noviembre de 2024 al 20 de noviembre de 2024,** el contratista de obra llevó a cabo diversas actividades contractuales esenciales para el avance éxitos del proyecto. Estas incluyen:
  1. **Preliminares**: En este capítulo se presenta para cobro las actividades ejecutadas de los ítems **1.1** excavación mecánica para cajas vias (incluye cargue) y **1.3** transporte disposición final de escombros y sobrantes.
  2. **Rellenos**: En este capítulo se presenta para cobro las actividades ejecutadas de los ítems **2.1** relleno con material mixto de rio sin procesar tamaño max. 3" suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactacion mecánica con equipo pesado **2.2** geotextil T1700 suministro e instalación y **2.5** transporte de material granular

Estas actividades son fundamentales para el desarrollo exitoso del proyecto y la interventoría verifica que se lleven a cabo siguiendo los parámetros y normativas aplicables para cada una de estas actividades.

- La interventoría realizó la verificación y el seguimiento del acta de control y seguimiento social y parafiscal de la obra (112-ECP-FR-021) correspondiente al período de junio de 2024. Dado que la seguridad social se paga a mes vencido, no se adjunta el período de noviembre, ya que aún está en curso. La interventoría se aseguró de que el contratista de obra cumpliera con estas obligaciones de manera adecuada.

- La interventoría verificó y dio seguimiento durante el periodo comprendido entre el **01 de noviembre de 2024 al 20 de noviembre de 2024** al cumplimiento de la CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, numeral 1 "*Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez (10%)*

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12547

de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el diez por ciento (10%) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres", así como lo contenido en CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA litera a) "1. *Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad] de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5 %), sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, que no podrá superar el treinta por ciento (30 %) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres*". Toda vez que el contratista de obra ha proporcionado un certificado emitido por su representante legal, que incluye una lista del personal regional y de mujeres de la región. Este certificado está respaldado por un certificado de residencia emitido por la junta de acción comunal o de la alcaldia, lo cual facilita la verificación de la mano de obra no calificada de la región.

- La interventoría verificó y dio seguimiento al cumplimiento del FORMATO 9 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL por apoyo a la Industria Nacional por la prestación de servicios nacionales o con trato nacional correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2024 al 20 de noviembre de 2024. La interventoría constató que el Consorcio Halcón da cumplimiento a lo acordado.

- La resolución de dificultades con argumentos técnicos, legales, administrativos, financieros y ambientales por parte de la interventoría en conjunto con el contratista de obra, permiten conformar un equipo de profesionales idóneos para cumplir con el objeto del contrato.

- En virtud de lo anteriormente expuesto, esta interventoría certifica y avala Técnica, Legal, Administrativa, Financiera y Ambiental el pago correspondiente a las actividades ejecutadas por el contratista de obra durante el periodo comprendido entre el **01 de noviembre de 2024 al 20 de noviembre de 2024** Dicho pago es equivalente al **5,99%** del total acordado, lo que representa el valor de **TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON ONCE CENTAVOS M/CTE ($ 3.519.487.933,11).**

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 4

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

G. ANEXOS

El informe debe contener como mínimo los siguientes soportes documentales:

- Copia de la bitácora de la obra o de las actividades desarrolladas.
- Actas y ensayos de laboratorios
- Control y seguimiento de seguridad social y parafiscal obra.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, el 22 NOV. 2024

Firma

Nombre: ING. AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

N° Matrícula Profesional: 19202 82149 CAU

Firma

Nombre: ING. JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

N° Matrícula Profesional:25202 193762 CND

Firma V°B°

Nombre: ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO

SUPERVISORA DE INTERVENTORÍA PROYECTO BPIN 20211301010978.

N° Matrícula Profesional: 25202-193880CND

Firma V°B°

Nombre: ARQ. EDWIN LEONARDO GUTIERREZ RODRIGUEZ

APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 0250 DE 2023 PROYECTO BPIN 20211301010978

N° Matrícula Profesional: V A25232003-86049333

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.
Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, así mismo las casillas de N° de matrícula profesional deben ser diligenciadas en su totalidad.
Nota: El informe y sus anexos, deben ser cargados a la plataforma para la gestión de archivos SIGA, una vez sea presentado a la entidad.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12549

CONSORCIO HALCÓN

ACTA RESUMEN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO OBRA E INTERVENTORIA

13550

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA RESUMEN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO OBRA

112-ECP-FR-018-V04
09/09/2024

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"; "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"		
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCON		
NIT:	901.666.148-8		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Fecha	Ensayo realizado por C / I*	Material	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Resultados		Análisis de Resultados	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
							Rango Cumplimiento	Porcentaje Obtenido %	Cumple S/N	
8/11/2024	C	Relleno (Terraplen)	Granulometría	Río Guejar	GEOLAB RL	INV E-123	Tamaño máximo (mm): 100 % pasa tamiz #10, máximo: 80 % pasa tamiz #40, máximo: 75 % pasa tamiz #200, máximo: 25	Tamaño máximo (mm): 38,1 % pasa tamiz #10: 36,27 % pasa tamiz #40: 20,99 % pasa tamiz #200: 3,30	SI	Los valores obtenidos se encuentran dentro de los límites establecidos
8/11/2024	C	Relleno (Terraplen)	Contenido de sales solubles	Río Guejar	GEOLAB RL	INV E-158	≤0.2%	0,14%	SI	El valor obtenido se encuentra dentro del límite establecido
8/11/2024	C	Relleno (Terraplen)	Contenido de materia orgánica	Río Guejar	GEOLAB RL	INV E-121	≤0.2%	0,84%	SI	El valor obtenido se encuentra dentro del límite establecido
12/11/2024	C	Relleno (Terraplen)	índice de colapso	Río Guejar	GEOLAB RL	INV E-157	No colapsable	No colapsable	SI	El valor obtenido se encuentra dentro del límite establecido
8/11/2024	C	Relleno (Terraplen)	Proctor modificado	Río Guejar	GEOLAB RL	INV E -141 INV E-142	N/A	Densidad máxima : 2,230 g/cm^3 Humedad óptima corregida : 4,64%	N/A	N/A
12/11/2024	C	Relleno (Terraplen)	Expansión en prueba CBR	Río Guejar	GEOLAB RL	INV E-148	-	0%	SI	El valor obtenido se encuentra dentro del límite establecido
12/11/2024	C	Relleno (Terraplen)	Resistencia del material, CBR	Río Guejar	GEOLAB RL	INV E-148	≥3%	57,9%	SI	El valor obtenido se encuentra dentro del límite establecido

* Contratista / Interventor
Se anexan los soportes de las diferentes pruebas y ensayos de laboratorio

COMENTARIOS DEL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA AL RESULTADO DE LOS ENSAYOS:
El material es adecuado para el uso en la conformación del material de relleno

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia 20/11/2024

Firma
Nombre: Daniel Alejandro Engativá
**DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202095108

Firma
Nombre: Axel Mauricio Carreal Rodriguez
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Firma Sandra V. Celis
Nombre: Sandra Viviana Celis Murillo
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
N° Matrícula Profesional: 68202-294806 STD

** Nota: En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoría: Director de Consultoría. En Otros : Representante Legal o Apoderado
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

12551

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

GEOLAB RL	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO I.N.V. E – 123 DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO DE LOS SUELOS I.N.V. E – 125 LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS I.N.V. E – 126	CODIGO	RL-F-01-220MT
		VERSIÓN	01
		FECHA	12-may.-2016
		PAGINA	1 DE 1

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA — **CLIENTE:** CONSORCIO HALCÓN

PROCEDENCIA : RIO GUEJAR — **PR INICIAL:** N/A — **PR FINAL:** N/A — **LADO:** N/A

DESCRIPCIÓN: Grava mal graduada y arena GP — **LOTE:** 0 — **REGISTRO :** 007

FECHA: 8-nov.-2024 — **ESTUDIO:** Suelos Adecuados — **(MATERIAL PARA TERRAPLEN)**

LIMITES DE CONSISTENCIA

Límite Líquido de los Suelos I.N.V E-125

ENSAYO	1	2	3
N° Golpes	0	0	0
Tara N°	---	---	---
Tara+Suelo Humedo (gr.)	---	---	---
Tara + Suelo Seco (gr.)	---	---	---
Peso Tara (gr.)	---	---	---
% Humedad	NP	NP	NP

mite Plástico e Indice Plastico de Suelos I.N.V.E-126

ENSAYO	1	2	HUMEDAD NATURAL
Tara N°	0	0	0
Tara+Suelo Humedo (gr.)	---	---	0
Tara + Suelo Seco (gr.)	---	---	0
Peso Tara (gr.)	---	---	0
% Humedad	NP	NP	0

GRADACION


Peso Muestra total seca antes de lavar retiene tamiz No. 10 (gr)	9024,0	Peso Muestra seca antes de lavar pasa tamiz N° 10 (gr)	0,0
Muestra total seca despues de lavar retenido tamiz N° 10 (gr)	7129,60	Peso Muestra seca despues de lavar pasa tamiz N° 10 (gr)	0,0

TAMIZ		PESO	PORCENTAJE			ESPECIFICACIÓN ARTICULO:	
PULGADA	mm	RETENIDO	RETENIDO	RET. ACUM.	PASA		
3"	76,1	0,0	0,00	0,00	100,00		
2 ½"	64,00	0,0	0,00	0,00	100,00		
2"	50,80	0,0	0,00	0,00	100,00		
1 ½"	38,10	2386,2	26,44	26,44	73,56		
1"	25,40	1376,7	15,26	41,70	58,30		
¾"	19,00	838,3	9,29	50,99	49,01		
½"	12,70	464,2	5,14	56,13	43,87		
3/8"	9,51	318,9	3,53	59,67	40,33		
No. 4	4,76	197,3	2,19	61,85	38,15		
No.10	2,00	169,1	1,87	63,73	36,27		
No. 40	0,42	1378,9	15,28	79,01	20,99		
No. 200	0,074	1596,7	17,69	96,70	3,30		
P/200	P/0,074	297,70	10,51	107,2	0,0		

RESULTADOS

Humedad Natural	0	Gravas	61,9	%	Indice de Grupo	0	Cu 130,78
Límite Líquido	0	Arenas	27,6	%	A.A.S.H.T.O.	A-1-a	Cc 0,33
Límite Plástico	0	Finos	10,5	%	U.S.C.S.	GP	D60 26,81
Indice de Plasticidad	0						D30 1,35
							D10 0,21

CLASIFICACION

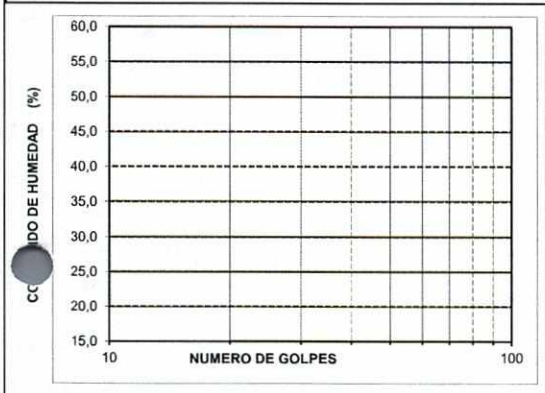

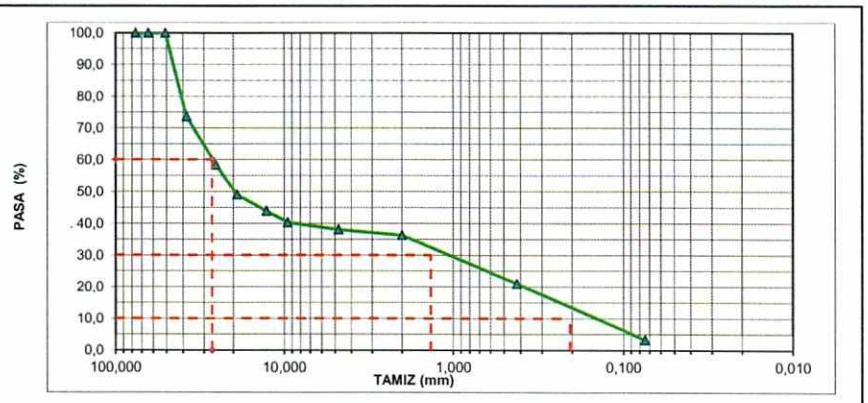


TABLA 220.1 REQUISITOS DE LOS MATERIALES PARA TERRAPLENES

CARACTERISTICA	UNIDAD	NORMA INVE	REQUSITO	RESULTADO	CUMPLE / NO CUMPLE
TAMAÑO MAXIMO	mm	123	MAX	38,1	CUMPLE
% PASA TAMIZ 2mm(N°10)	%	123	MAX 80%	36,3%	CUMPLE
% PASA TAMIZ 75µm(N°200)	%	123	MAX 35%	10,5%	CUMPLE
LIMITE LIQUIDO	%	125	MAX 40%	0,0%	CUMPLE
INDICE DE PLASTICIDAD	%	126	MAX 15%	0,0%	CUMPLE
					ACEPTADO

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: MATERIAL EN ESTUDIO (PARA TERRAPLEN)

REALIZÓ: ALEJANDRO MARTINEZ
LABORATORISTA

REVISÓ: JUAN CARLOS RAMÍREZ
DIRECTOR LABORATORIO

APROBÓ: ÁNGELA GARZÓN RODRÍGUEZ
COODINADOR SIG

12552

GEOLAB RL	DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE SALES SOLUBLES EN LOS SUELOS INV E-158	GLAB-FT-14-220MT Versión 02/ Mar2022 Gestión Operativa

Proyecto:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA		
Descripción:	MATERIAL PARA TERRAPLEN	PROCEDENCIA	FECHA DE MUESTRA
Muestra: No	7	RIO GUEJAR	08/11/2024

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE SALES SOLUBLES EN LOS SUELOS

CONTENIDO DE SALES SOLUBLES		
No. De Ensayo	1	2
A = VOLUMEN INCIAL DE AGUA DESTILADA EN EL FRASCO (cm^3)	500	500
B = MASA DEL RESIDUO DE LA CAPSULA (g)	0,0144	0,0137
C = VOLUMEN DEL EXTRACTO ACUOSO SITUADO EN LA CAPSULA (cm^3)	100	100
D = MASA INCIAL DEL SUELO SECO (g)	50	50

% DE SALES SOLUBLES x ENSAYO =	0,14%	0,14%
% DE SALES SOLUBLES PROMEDIO =	0,14%	

OBSERVACIONES:	ESPECIFICACIÓN Criterio de aceptación
	≤ 0.20
	CUMPLE

ELABORADO POR:			REVISADO POR:			APROBADO POR:		
NOMBRE	Alejandro Martínez		NOMBRE	Angela Garzón Rodríguez		NOMBRE	Juan C. Ramírez	
CARGO	Laboratorista		CARGO	Coordinadora SGI y Calidad		CARGO	Director de laboratorio	

12553

GEOLAB RL	DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO ORGÁNICO EN SUELOS MEDIANTE PÉRDIDA POR IGNICIÓN I.N.V. E – 121 – 13	GSIG-FP-02-220MT VERSIÓN: 01 08-09-2017

PROYECTO :	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA	**CLIENTE :**	CONSORCIO HALCÓN				
PROCEDENCIA:	RIO GUEJAR	**PR INICIAL:**	N/A	**PR FINAL:**	N/A	**LADO:**	N/A
POLIGONAL :	N/A	**APIQUE :**	N/A	**PROF (m):**	N/A	**REGISTRO :**	007
DESCRIPCIÓN:	Suelos Adecuados	**ESTUDIO**	Corona	**FECHA:**	08-nov-24		

CONTENIDO ORGANICO MEDIANTE PERDIDA POR IGNICION				
DATOS		1	2	PROMEDIO
A	PESO DEL CRISOL + SUELO SECO AL HORNO ANTES DE LA IGNICION	41,06	37,42	**39,24**
B	PESO DEL CRISOL + SUELO SECO DESPUES DE LA IGNICION	40,92	37,32	**39,12**
C	PESO DEL CRISOL	25,51	24,54	**25,03**
% DE MATERIA ORGANICA =	$\frac{A - B}{A - C}$ X 100	**0,90%**	**0,78%**	**0,84%**

ESPECIFICACION					RESULTADO	CUMPLE / NO CUMPLE
ARTICULO 220, TABLA 220,1	**DETERMINACION DEL CONTENIDO ORGANICO MEDIANTE PERDIDA POR IGNICION**	**Suelos Adecuados**	≤	1%	0,84%	CUMPLE

OBSERVACIONES: _____

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	ALEJANDRO MARTINEZ	LABORATORISTA	
REVISÓ	ANGELA GARZÓN R.	COODINADOR SIG	

12554

GEOLAB RL

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE COLAPSO DE UN SUELO PARCIALMENTE SATURADO
I.N.V. E – 157 – 13

FT-LAB-125
VERSIÓN: 01
FECHA: 10/08/2017

PROYECTO :	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA	FUENTE :	RIO GUEJAR
PROCEDENCIA:	RIO GUEJAR	F.TOMA:	08/11/2024
MUESTRA:	7	F. ENSAYO:	12/11/2024

DATOS DE LA MUESTRA ANTES DE ENSAYO

Peso material de ensayo [gr]	83,41
Peso agua de ensayo [gr]	4,08
Húmedad de ensayo [%]	4,90
Densidad seca [ton/m3]	2086,2
Densidad humeda [ton/m3]	2188,3
Peso especifico [ton/m3]	2,623
Altura de los solidos [mm]	15907

DATOS DEL MOLDE


Peso del anillo [gr]	59,3
Diametro del anillo [mm]	50,5
Altura del anillo [mm]	20,0
Area del anillo [mm2]	1999
Volumen del anillo [mm3]	39980

Carga de ajuste [Kpa]	5
Lec. de carga [1=0,002mm]	1

DATOS MUESTRA DES. DE ENSAYO

Peso muestra + molde [gr]	145,6
Húmedad [%]	3,51
Densidad humeda [ton/m3]	2,159

	DATOS DE CARGA SIN INUNDAR LA MUESTRA					CARGA CON MUESTRA INUNDADA		
Carga [Kpa]	25	50	100	200	400	400	800	1600
Tiempo (Min)	Lectura (1=0,002 mm)	Lectura (1=0,002 mm)	Lectura (1=0,002 mm)	Lectura (1=0,002 mm)	Lectura (1=0,002 mm)	Lectura (1=0,002 mm)	Lectura (1=0,002 mm)	Lectura (1=0,002 mm)
0,00	1,0	9,0	16,0	25,0	29,0	35,0		
0,10	2,0	10,0	17,0	26,0	30,0	36,0		
0,25	2,0	10,0	17,0	26,0	31,0	37,0		
0,50	2,0	10,0	17,0	27,0	32,0	37,0		
1	5,0	12,0	22,0	27,0	33,0	37,0		
2	5,0	12,0	22,0	27,0	34,0	37,0		
4	5,0	12,0	22,0	27,0	34,0	38,0		
8	5,0	12,0	22,0	28,0	35,0	38,0		
15	7,0	15,0	23,0	28,0	35,0	38,0		
30	7,0	16,0	24,0	28,0	35,0	39,0		
60	9,0	16,0	25,0	29,0	35,0	40,0		
120	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	41,0		
180	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	41,0		
480	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	41,0		
1440	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	41,0		

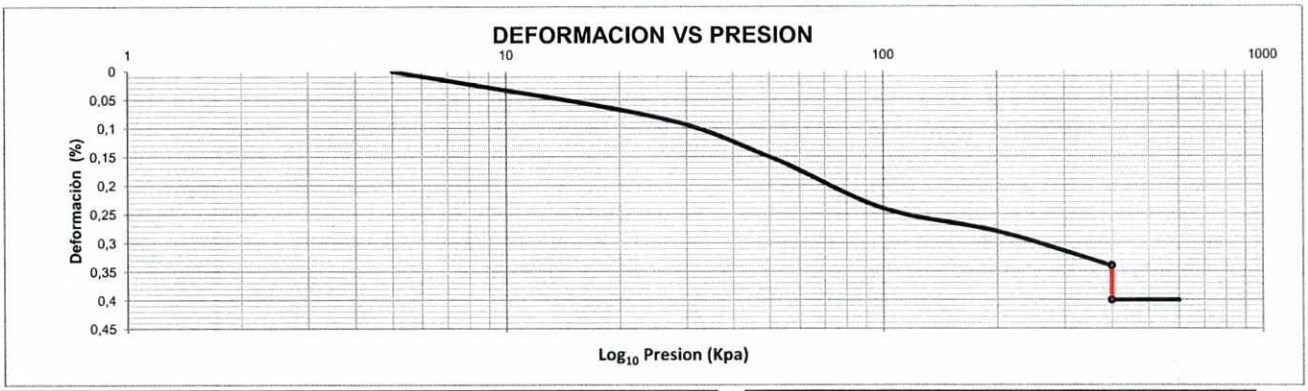

CLASIFICACIÒN DE INDICE DE COLAPSO SEGÚN TABLA 157-1 I.N.V. E-157-13	GRADO DE COLAPSO	INDICE DE COLAPSO (%)
	NINGUNO	0,0
	LIGERO	0,1 A 2,0
	MODERADO	2,1 A 6,0
	MODERADAMENTE SEVERO	6,1 A 10
	SEVERO	>10,0

RESULTADOS DEL ENSAYO	
Cambio de altura por inundación (mm)	0,012
Altura inicial del espécimen (mm)	19,998
INDICE DE COLAPSO (%)	0,060
GRADO DE COLAPSO DE LA MUESTRA	NINGUNO

Observaciones:

REALIZÓ: ALEJANDRO MARTÍNEZ
LABORATORISTA

REVISÓ: ÁNGELA GARZÓN RODRÍGUEZ
COORDINADOR SIG

APROBÓ: JUAN CARLOS RAMÍREZ L.
DIRECTOR DE LABORATORIO

12555


GEOLAB RL	RELACIONES DE HUMEDAD – MASA UNITARIA SECA EN LOS SUELOS (ENSAYO NORMAL Y MODIFICADO DE COMPACTACIÓN) I.N.V. E – 141 - I.N.V. E – 142	CODIGO	GSIG-FP-02-220PT
		VERSIÓN	01
		FECHA	12-may.-2016
		PÁGINA	1 DE 1

CLIENTE : CONSORCIO HALCÓN **PROYECTO :** MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA

PROCEDENCIA: RIO GUEJAR **PR INICIAL:** N/A **PR FINAL:** N/A **LADO:** N/A

FECHA 08-nov-24 **ACTIVIDAD:** TERRAPLEN **REGISTRO :** 007

Numero de molde	0	0	0	0
No. de Golpes	56	56	56	56
Peso de la muestra húmeda y molde, g	9768,0	9915,0	9995,0	9968,0
Peso del molde, g	5028	5028	5028	5028
Peso de la muestra húmeda, g	4740	4887	4967	4940
Volumen del molde, cm^3	2115	2115	2115	2115
Densidad muestra húmeda, g/cm^3	2,241	2,311	2,349	2,336
% de humedad	2,86	3,93	5,93	7,43
Densidad de la muestra seca, g/cm^3.	2,179	2,223	2,217	2,174
% de humedad de saturación	10,92	10,00	10,12	11,02

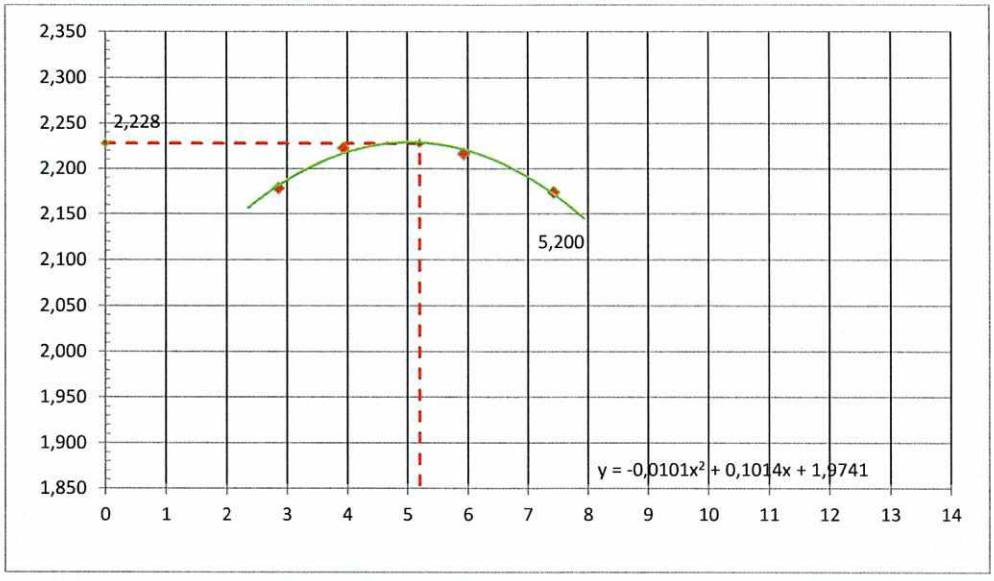

Tara N°	R4	F9	W3	19B
Peso del suelo húmedo (g)	876,6	838,6	867,2	1148,0
Peso del suelo seco (g)	853,9	809,0	821,8	1072,8
Peso tara	60,0	56,7	56,1	61,0
Peso de agua (g)	22,7	29,6	45,4	75,2
Contenido de humedad (%)	2,86	3,93	5,93	7,43

PESO U. MAXIMO (kN/m^3) = **21,850**	% GRUESOS =	**18%**	DENSIDAD MAX. CORREGIDA (Kg/m3)	**2230**
DENSIDAD MAXIMA (g/cm^3) = **2,228**	% FINOS =	**82%**		
HUMEDAD OPTIMA (%) = **5,20**	% W. FINOS=	**5,20**	HUMEDAD OPTIMA CORREGIDA (%) =	**4,64**
GRAVEDAD ESPECIFI. (GM)= **2,507**	% W GRUESO=	**2,10**		

OBSERVACIONES: **CONTROL MENSUAL**

REALIZÓ: ALEJANDRO MARTINEZ
LABORATORISTA

REVISÓ: JUAN CARLOS RAMÍREZ
DIRECTOR DE LABORATORIO

APROBÓ: ANGELA GARZÓN RODRÍGUEZ
COORDINADOR SIG

12556


GEOLAB RL	**RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO EN LABORATORIO** ***INV. E-148***	GLAB-FT-57-320MT VERSIÓN: 01 FECHA: 01/09/2016 Versión 01/ Jun2020 Gestion Operativa


Proyecto:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA				
Descripcion	MATERIAL PARA TERRAPLEN	**Fuente**	RIO GUEJAR	**F de toma**	08/11/2024
Muestra No.:	7			**F. Ensayo:**	12/11/2024


ENSAYO	**COMPACTACIÓN PROCTOR INV. E-141, 142-13**				**COMPACTACION CBR INV. E-148-13**		
DETERMINACIÓN	1	2	3	4	1	2	3
No. de Golpes	56	56	56	56	56	25	10
Molde No.	2	2	2	2	3	6	5
No. de Capas	5	5	5	5	5	5	5
Peso muestra húmeda + molde, (g).	9768	9915	9995	9968	12187	12159	11919
Peso molde, (g)..	5028	5028	5028	5028	7182	7228	7183
Peso muestra húmeda, (g).	4740	4887	4967	4940	5005	4931	4736
Volumen molde, cm3.	2114,9	2114,9	2114,9	2114,9	2135,0	2130,0	2139,6
Densidad muestra húmeda, gr/cm³	2,241	2,311	2,349	2,336	2,344	2,315	2,213
Densidad muestra seca, gr/cm³	2,179	2,223	2,217	2,174	2,227	2,201	2,100

HUMEDAD	**COMPACTACION PROCTOR**				**COMPACTACION CBR**		
Recipiente No.	R4	F9	W3	19B	4B	R18	C3
Peso rec. + Muestra Hum. (g).	876,6	838,6	867,2	1148	587,6	821,6	705,6
Peso rec. + Muestra Seca (g).	853,9	809	821,8	1072,8	561,3	784,3	672,5
Peso Recipiente (g).	60	56,7	56,1	61	60,0	61,0	61,3
Contenido de Humedad (%)	2,9	3,9	5,9	7,4	5,2	5,2	5,4

No. DE GOLPES		56		25		10	
Molde No.		3		6		5	
Días de inmersión		4		4		4	
Expansión (%)		0,0		0,0		0,0	
PENETRACIÓN		**17,00**	**ESFUERZO**	**CARGA**	**ESFUERZO**	**26,00**	**ESFUERZO**
0,0 mm	*0,0 mm*		0,0		0,0		0,0
0,127 mm	*0,005 pulg*	1,063 kN	0,52 MPa	0,119 kN	0,06 MPa	0,101 kN	0,05 MPa
0,635 mm	*0,025 pulg*	3,091 kN	1,51 MPa	1,598 kN	0,78 MPa	0,820 kN	0,40 MPa
1,270 mm	*0,050 pulg*	6,337 kN	3,10 MPa	3,770 kN	1,84 MPa	1,986 kN	0,97 MPa
1,905 mm	*0,075 pulg*	11,444 kN	5,59 MPa	6,525 kN	3,19 MPa	3,727 kN	1,82 MPa
2,540 mm	*0,10 pulg*	13,948 kN	6,82 MPa	9,444 kN	4,62 MPa	5,393 kN	2,64 MPa
3,810 mm	*0,15 pulg*	19,342 kN	9,45 MPa	16,197 kN	7,92 MPa	7,690 kN	3,76 MPa
5,080 mm	*0,20 pulg*	27,616 kN	13,50 MPa	22,957 kN	11,22 MPa	10,119 kN	4,95 MPa
6,350 mm	*0,25 pulg*	33,151 kN	16,20 MPa	27,442 kN	13,41 MPa	12,005 kN	5,87 MPa
7,620 mm	*0,30 pulg*			30,201 kN	14,76 MPa	14,380 kN	7,03 MPa
10,160 mm	*0,40 pulg*			33,905 kN	16,57 MPa	17,252 kN	8,43 MPa
12,700 mm	*0,50 pulg*			36,155 kN	17,67 MPa	19,686 kN	9,62 MPa
Humedad de penetración		5,8		6,4		7,0	

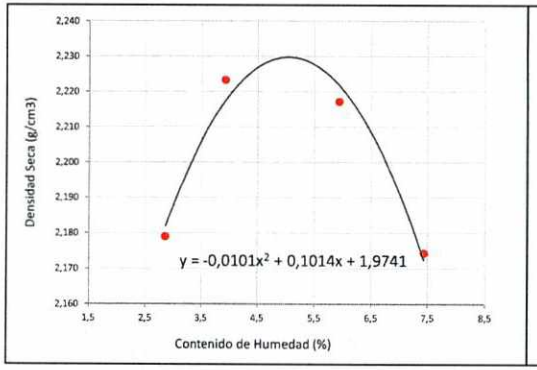

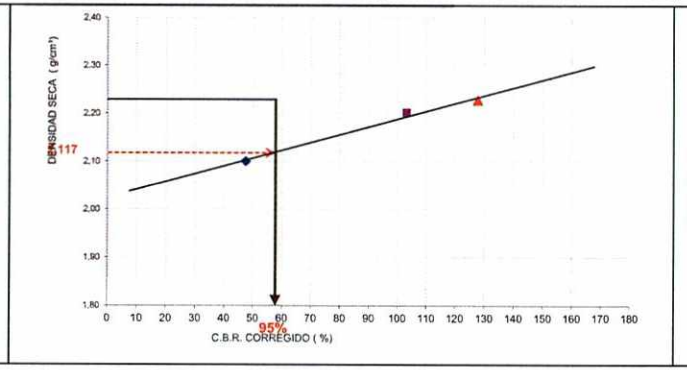

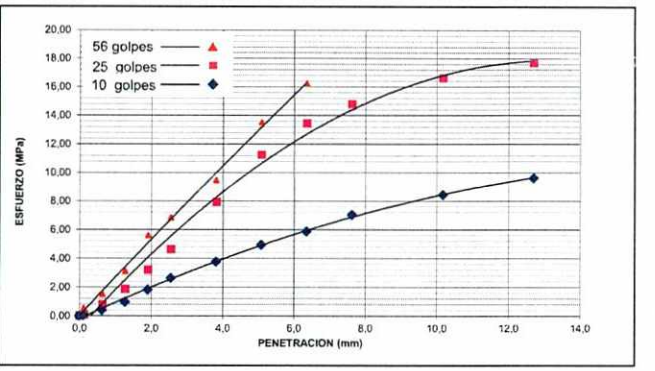

RESULTADOS DEL ENSAYO					
PROCTOR		**No. DE GOLPES**	**56**	**25**	**10**
DENSIDAD MAXIMA, g/cm³	2,229	**CBR CORREGIDO A 0,1"**	97,4	80,2	36,9
HUMEDAD OPTIMA, %	5,0	**CBR CORREGIDO A 0,2"**	127,8	103,2	47,6
% RETENIDO EN EL TAMIZ 3/4", %	18,0	**SOPORTE AL 98%**	57,9	**AL 95%**	57,9

ESPECIFICACIÓN	**CBR ≥ 3%**		
ELABORADO POR:	**REVISADO POR:**		**APROBADO POR:**
Alejandro Martinez	**Juan Carlos Ramirez**		**Angela Garzón R.**
Laboratorista	**Director laboratorio**		**Coordinador SIG**
12/11/2024	**12/11/2024**		**12/11/2024**

1253

ACTA RESUMEN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO OBRA

112-ECP-FR-018-V04
09/09/2024

CONTRATO N°	0250 de 2023	PROYECTO N°	20211301010978
OBJETO DEL CONTRATO	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 MUNICIPIO DE CUMARAL; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO – PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.		
OBJETO DEL PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER AIM		
NIT:	901705260-3		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	N/A		

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Fecha	Ensayo realizado por	Material	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Resultados		Análisis de Resultados	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
	C / I*						Rango Cumplimiento	Porcentaje Obtenido %	Cumple S/N	
4/11/2024	I	Tam Max 3"	Granulometria	mat rio Guejar	Ingegar SAS	122/123/125/126	75-25	73-10	S	clasificado U:S.C
4/11/2024	I	Tam Max 3"	Pasa Tamiz No 10	mat rio Guejar	Ingegar SAS	INV E 123	80	31,64	S	
4/11/2024	I	Tam Max 3"	Pasa Tamiz No 200	mat rio Guejar	Ingegar SAS	INV E 123	25	1,11	S	
4/11/2024	I	Tam Max 3"	Limite Liquido	mat rio Guejar	Ingegar SAS	INV E 125	30%	0,00	S	
4/11/2024	I	Tam Max 3"	Indice de Plasticidad	mat rio Guejar	Ingegar SAS	INV E 125/126	10%	0,00	S	
4/11/2024	I	Tam Max 3"	Contenido Mat Organica	mat rio Guejar	Ingegar SAS	INV E 212	1,00	0,35	S	
4/11/2024	I	Tam Max 3"	CBR Diseño	mat rio Guejar	Ingegar SAS	INV E 148	10	28	S	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

ACTA RESUMEN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO OBRA

112-ECP-FR-018-V04
09/09/2024

CONTRATO N°			0250 de 2023			PROYECTO N°			20211301010978	
4/11/2024	I	Tam Max 3"	Sales solubles	mat rio Guejar	Ingegar SAS	INV E 158	0,2	0,115	S	
4/11/2024	I	Tam Max 3"	Sales solubles	mat rio Guejar	Ingegar SAS	INV E 157	2	0,00	S	
4/11/2024	I	Tam Max 3"	Proctor	mat rio Guejar	Ingegar SAS	INV E 142	N/A	2,090 y 5,0%		

* Contratista / Interventor

Se anexan los soportes de las diferentes pruebas y ensayos de laboratorio

COMENTARIOS DEL ESPECIALISTA EN XXX AL RESULTADO DE LOS ENSAYOS: Material del rio Guejar utilizado como relleno Tam Max 3" cumple con las especificaciones

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia 04 de Noviembre de 2024

Firma
Nombre: N/A
**DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional:

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Firma
Nombre: PEDRO PABLO FONSECA CASTRO
ESPECIALISTA GEOTECNIA
N° Matrícula Profesional: 01198-0480

** Nota: En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoría: Director de Consultoría. En Otros : Representante Legal o Apoderado
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

12559

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

Gmail

Consorcio Inter AIM <consorciointeraim@gmail.com>

OF 10973 -CONSORCIO INTER AIM - C-042-10-2024

INGEGAR INGENIERIA S.A.S. <ingegar_ingenieria@yahoo.com> 04 de noviembre de 2024, 15:22
Responder a: "INGEGAR INGENIERIA S.A.S." <ingegar_ingenieria@yahoo.com>
Para: "consorciointeraim@gmail.com" <consorciointeraim@gmail.com>

Buen día, cordial saludo.

Adjunto envío informe de resultados de laboratorio correspondientes a la solicitud **C-042-10-2024.**

De la manera más atenta le solicitamos sea diligenciada la **ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE** que remitimos en el siguiente enlace, para conocer el grado de satisfacción, sugerencias o recomendaciones del servicio prestado.

https://forms.gle/zURcMDzYkMjc6cGH9

Atentamente,

INGEGAR INGENIERIA S.A.S.
Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos
Carrera 32 No 5B - 03 Brr. La Vega
Tel. +57 8 660 15 64 - 321 238 7413 - 315 894 6163
www.ingegaringenieria.com.co
Villavicencio - Meta

https://m.facebook.com/Ingegar-ingenier%C3%ADa-SAS-160121967368360/

Por favor Confirmar el recibido del correo.

INGEGAR INGENIERIA SAS. los quiere vincular a la campaña de CUIDAR NUESTROS ARBOLES... Si no lo requieres, no imprimas este Email.

INGEGAR INGENIERIA S.A.S se permite recordarle que de conformidad con los procedimientos contenidos en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, respecto a la **PROTECCION DE DATOS PERSONALES**, usted podrá ejercer sus derechos de conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales enviando una solicitud a **ingegar_ingenieria@yahoo.com, contactándonos al celular 321 238 7413 o en las instalaciones de la oficina.**

OF 10973 -CONSORCIO INTER AIM - C-042-10-2024.pdf
655K

12360

INGEGAR INGENIERIA S.A.S
Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

Villavicencio, 04 de Noviembre de 2024

OFICIO: 10973

SEÑORES
CONSORCIO INTER AIM
AXEL MAURICIO CORREAL R
Cel. 3132944098 – 3108688762
consorciointeraim@gmail.com
Cumaral - Meta

SOLICITUD: 042/10/2024
OBJETO: CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA
ASUNTO: ENTREGA RESULTADOS ENSAYOS DE LABORATORIO.

Respetados señores:

Cumpliendo al compromiso adquirido con ustedes, en el plan de calidad de la obra en referencia, les estamos adjuntando resultados de una caracterización de terraplén **MIXTO TAMAÑO MAX 3" RIO GUEJAR**

- Tamaño máximo, mm
- Material que pasa el tamiz #10, máximo (%)
- Material que pasa el tamiz #200, máximo (%)
- Contenido de materia orgánica, máximo (%)
- Limite líquido, máximo (%)
- Índice de plasticidad, máximo (%)
- CBR de laboratorio, mínimo (%)
- Expansión en prueba CBR, máximo (%)
- Índice de colapso, máximo (%)
- Contenido de sales solubles, máximo (%)
- ensayo de peso específico y absorción de agregados gruesos

Los resultados de los ensayos realizados corresponden a las características presentadas por las muestras del material en mención.

En espera de sus comentarios, y dispuestos en aclarar cualquier duda se suscribe de ustedes,

Atentamente,

HÉCTOR FERNANDO GARCÍA SARAY
Ingeniero Civil
Especialista en ingeniería de fundaciones E.C.I.

1250-1

REQUISITOS DE MATERIALES PARA TERRAPLENES					
CARACTERISTICA	NORMA DE ENSAYO INV	SUELOS SELECCIONADOS	SUELOS ADECUADOS	SUELOS TOLERABLES	RESULTADO ENSAYO
TAMAÑO MAXIMO, MM	E-123-13	75	100	150	73,40
MATERIAL QUE PASA EL TAMIZ #10, MAXIMO (%)	E-123-13	80	80	-	31,64
MATERIAL QUE PASA EL TAMIZ #200, MAXIMO (%)	E-123-13	25	35	35	1,11
CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA, MAXIMO (%)	E-121-13	0	1	1	0,35%
LIMITE LIQUIDO, MAXIMO(%)	E-125-13	30	40	40	0,00
INDICE DE PLASTICIDAD, MAXIMO (%)	E-125-13 E-126-13	10	15	-	0,00
CBR DE LABORATORIO, MINIMO (%)	E-148-13	10	5	3	28,00
EXPANSION EN PRUEBA CBR, MAXIMO (%)	E-148-13	0	2	2	0,00
INDICE DE COLAPSO, MAXIMO (%)	E-157-13	2	2	2	0,00
CONTENIDO DE SALES SOLUBLES, MAXIMO (%)	E-158-13	0,2	0,2	-	0,115

ENSAYO DE CLASIFICACIÓN

Versión: 006	IG-F-022	Mayo de 2017

INGEGAR INGENIERIA S.A.S
Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

Solicitud No. 042/10/2024

PROYECTO	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA	**LUGAR**	Vista Herm-META	TIPO DE ENSAYO	
CLIENTE	CONSORCIO INTER AIM	**FECHA**	18/09/2024	**Granulometría**	X
FUENTE	MATERIAL MIXTO DE TAMAÑO MAX 3" RIO GUEJAR			**Límites**	X
DESCRIPCION	GRAVA MAL GRADADA CON ARENA COLOR BEIGE CLARO			**Humedad, Wn**	X

MUESTRA	1	**PROFUNDIDAD :**	N/A	**NORMA**	INV-E-122-13/INV-E-123-13/INV-E-125-13/INV-E-126-13

DATOS DEL ENSAYO DE GRADACION

TAMIZ mm	TAMIZ pulg	MASA RETENIDA	PORCENAJE RETENIDO	% RETENIDO ACUMULADO	PORCENTAJE PASA	% PASA UNIFICADO
76,1	3"	942,00	14,46	14,46	85,54	85,54
50,8	2"	358,0	5,50	19,95	80,05	80,05
38,1	1 1/2"	666,0	10,22	30,18	69,82	69,82
25,4	1"	925,0	14,20	44,37	55,63	55,63
19	3/4"	688,0	10,56	54,93	45,07	45,07
9,51	3/8"	796,0	12,22	67,15	32,85	32,85
4,78	No. 4	186,0	2,85	70,01	29,99	29,99
2,0	No. 10	134,0	2,06	72,06	27,94	27,94
0,42	No. 40	1217,0	18,68	90,74	9,26	9,26
0,075	No. 200	531,0	8,15	98,89	1,11	1,11
	Fondo	72,0	1,11	100,00	0,00	0,00
	TOTAL ENSAYO	6515,0				0,00
W seco antes de lavar		6515,0	% Error	0,00	% Error Permitdo	0,1
W seco después de lavar		6443,0	Muestra			

PORCENTAJE MATERIAL		HUMEDAD NATURAL	
GRAVA	70,01	P1	6675
ARENA	28,89	P2	6515
FINOS	1,11	% Wn	2,46

LIMITE LIQUIDO			
Nº Golpes			
Wmh+Wr			
Wms+Wr		N.L.L	
Wr			
W %			
HUMEDAD			


CLASIFICACION	
U.S.C	GP
A.S.T.H.O	A-1-a

LIMTE PLASTICO			
Wmh+Wr			
Wms+Wr		N.L.P	
Wr			
W %			
HUMEDAD			

NIVEL FREATICO N.P

INDICE DE PLASTICIDAD	
INDICE DE TENACIDAD	
INDICE DE COMPRESIBILIDAD	
INDICE DE FLUIDEZ	



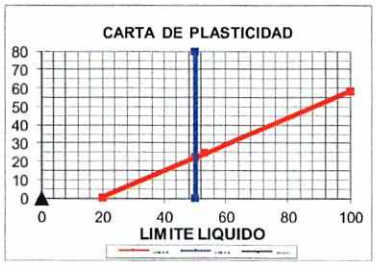

YEISON HERNANDEZ MORENO
Laboratorista

GINA MARCELA FONTECHA GUTIERREZ
Analista de laboratorio II

12583

CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA POR IGNICIÓN

Versión: 004	I G - F - 035	Mayo de 2017

Solicitud No.: 042/10/2024

OBRA:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA	NORMA:	INV-E-121-13
CLIENTE:	CONSORCIO INTER AIM	N° DE MUESTRA :	1
LOCALIZACION:	VISTA HERMOSA - META	FECHA	18/09/2024
DESCRIPCION:	GRAVA MAL GRADADA CON ARENA COLOR BEIGE CLARO		
OBSERVACIONES:	MATERIAL PARA TERRAPLEN		

DESCRIPCION	PESO ENSAYO
Peso del suelo húmedo, P1	94,83
Peso del suelo seco, P2	86,00
Contenido de humedad antes de ignición, %Wn	9,31
Peso del crisol y suelo seco antes de ignición, A	86,00
Peso del crisol y suelo seco después de ignición, B	85,70
Peso del crisol, C	1,40

CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA, (%)	**0,35%**

OBSERVACIONES: Tiempo aproximado en la mufla 5 horas 30 minutos

YEISON HERNANDEZ MORENO
Laboratorista

GINA MARCELA FONTECHA GUTIERREZ
Analista de laboratorio II

ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACION "PRÓCTOR"

Versión: 004	I G - F - 036	Mayo de 2017

Material Normal:	X	Material Estabilizado		Solicitud No.	042/10/2024

PROYECTO	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA	LUGAR	Vista Hermosa - META
CLIENTE	CONSORCIO INTER AIM	FECHA	18/09/2024
FUENTE	MATERIAL MIXTO DE TAMAÑO MAX 3" RIO GUEJAR	MUESTRA	1
DESCRIPCION	GRAVA MAL GRADADA CON ARENA COLOR BEIGE CLARO	NORMA	INV-E-142-13 METODO C
OBSERVACION	N/A		


Peso del Martillo	10	Lb	Altura de caida	18	pulg	Diametro molde	6,00	pulg
No. De Capas	5		Golpes x capa	56		Altura muestra	4,584	pulg

DENSIDAD

Molde No.		1	2	3	4		
Peso molde + suelo compac	(gr)	8825	9038	9128	9055		
Peso del molde	(gr)	4433	4433	4433	4433		
Peso suelo compactado	(gr)	4392	4605	4695	4622		
Volumen suelo compactado	(cm^3)	2124	2124	2124	2124		
Densidad suelo humedo	(gr/cm^3)	2,068	2,168	2,21	2,176		
Contenido de humedad	(%)	2,09	4,13	6,12	8,03		
Densidad suelo seco	(gr/cm^3)	2,026	2,082	2,083	2,014		

CONTENIDO DE HUMEDAD

Recipiente No.		XX	D1	E	P		
Peso recip. + suelo húmedo	(P1)	600	595	585	595		
Peso recip. + suelo seco	(P2)	589	574	555	555		
Peso del recipiente	(P3)	63	65	65	57		
Humedad	(%)	2,09	4,13	6,12	8,03		

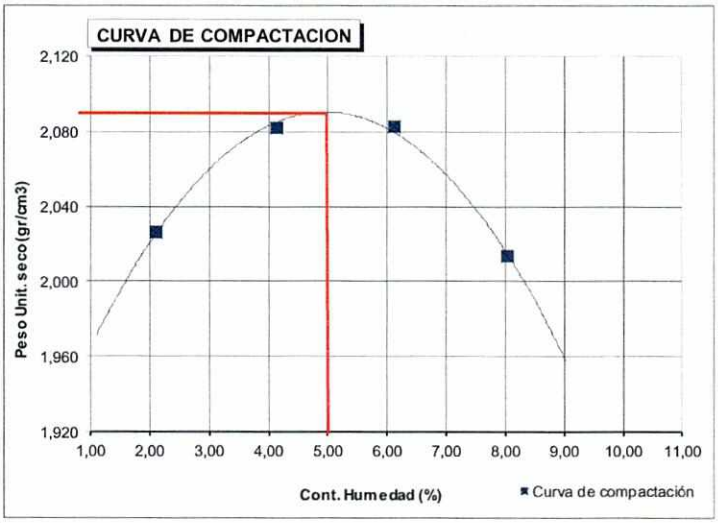

Densidad Máx.	2,090	(gr/cm^3)
H. Optima	5,00	(%)

YEISON HERNANDEZ MORENO
Laboratorista

GINA MARCELA FONTECHA GUTIERREZ
Analista de laboratorio II

12585

ENSAYO CBR METODO I. MATERIAL GRANULAR

Versión: 005	I G - F - 073	Octubre de 2019

Solicitud No.: 042/10/2024

PROYECTO	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA	NORMA:	INV-E -148-13
CLIENTE:	CONSORCIO INTER AIM	MUESTRA Nº :	1
LOCALIZACION:	VISTA HERMOSA - META	FECHA ENSAYO:	18/01/2024
DESCRIPCION:	GRAVA MAL GRADADA CON ARENA COLOR BEIGE CLARO		
OBSERVACIONES:	N/A		

COMPACTACION

PESO DEL MARTILLO	10	Lbs	DIAMETRO DE LA MUESTRA	5.98 Pulg
ALTURA DE CAIDA	18	Pulg	ALTURA DE LA MUESTRA	5.00Pulg
No. DE CAPAS	5		VOLUMEN DE LA MUESTRA	140.43Pulg
No. DE GOLPES X CAPA	10			

PENETRACION

CONSTANTE DEL ANILLO	2,21	AREA MUESTRA	3,142

TIEMPO DE PRUEBA	PENETRACION (pulg) * 10^{-3}	ESFUERZO ESTANDAR	LECT. DIAL DE CARGA	CARGA (lbs)	ESFUERZO (lbs/pulg2)
6 seg	0,005		28	61,9	19,7
30 seg	0,025		81	179,0	57,0
1 min	0,050		155	342,6	109,0
1 min 30 seg	0,075		225	497,3	158,3
2 min	0,100	1000	310	685,1	218,1
2 min 30 seg	0,125		375	828,8	263,8
3 min	0,150		419	926,0	294,8
4 min	0,200	1500	560	1237,6	393,9
6 min	0,300		735	1624,4	517,0
8 min	0,400		859	1898,4	604,3
10 min	0,500		1010	2232,1	710,5

VALOR CORREGIDO DEL C.B.R.	
A 0.1 "	21,0
A 0.2"	25,4
Valor escogido	**21,0**

HUMEDAD PENETRACION	
P1 (grs)	500,0
P2 (grs)	474,0
P3 (grs)	72,0
W Pen.(%)	**6,5**

HUMEDAD Y PESO UNITARIO.

No. del Molde	H5
Peso muestra húmeda + molde (grs)	13060
Peso del Molde (grs).	8547
Peso de la muestra húmeda (grs).	4513
Peso de la muestra seca (grs).	4238,8
Peso de la muestra seca (lbs).	9,3
Volumen del molde (cm^3)	2304,5
Densidad muestra seca (gr/cm3)	1,839
Contenido de humedad (%)	0,065

Recipiente No.	5
Peso de la muestra húmeda + Recip (grs).	500
Peso de la muestra seca + Recip (grs).	474
Peso del recipiente	72
Porcentaje de humedad (%)	0,065

EXPANSION TOTAL (%)


ALTURA DEL MOLDE (mm) 134

Tiempo (Hora)	Lectura Deformimetro
0,0	0
0,0	0
0,0	0,00000
24,0	0,00000
48,0	0,00000
72,0	0,00000
96,0	0,00000
EXPANSION TOTAL (%)	**0,000**

OBSERVACIONES

El ensayo de CBR se realizo, despues de haber dejada la muestra sumergida durante 96 horas cuando se midio el % de expansion de la misma.

Grafico para el cálculo del C.B.R.

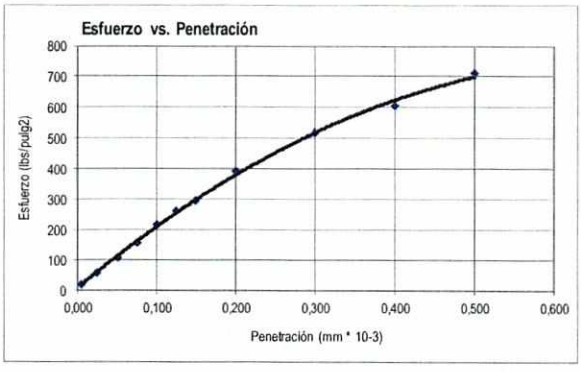

YEISON HERNANDEZ MORENO
Laboratorista

GINA MARCELA FONTECHA GUTIERREZ
Analista de laboratorio II

6
12586

ENSAYO CBR METODO I. MATERIAL GRANULAR

Versión: 005	I G - F - 073	Octubre de 2019

Solicitud No.: 042/10/2024

PROYECTO	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA	NORMA:	INV-E -148-13
CLIENTE:	CONSORCIO INTER AIM	MUESTRA Nº :	1
LOCALIZACION:	VISTA HERMOSA - META	FECHA ENSAYO:	18/09/2024
DESCRIPCION:	GRAVA MAL GRADADA CON ARENA COLOR BEIGE CLARO		
OBSERVACIONES:	N/A		

COMPACTACION

PESO DEL MARTILLO	10	Lbs	DIAMETRO DE LA MUESTRA	5.98 Pulg
ALTURA DE CAIDA	18	Pulg	ALTURA DE LA MUESTRA	5.00Pulg
No. DE CAPAS	5		VOLUMEN DE LA MUESTRA	140.43Pulg
No. DE GOLPES X CAPA	25			

PENETRACION

CONSTANTE DEL ANILLO		2,21	AREA MUESTRA		3,142
TIEMPO DE PRUEBA	PENETRACION (pulg) * 10^{-3}	ESFUERZO ESTANDAR	LECT. DIAL DE CARGA	CARGA (lbs)	ESFUERZO (lbs/pulg2)
6 seg	0,005		22	48,6	15,5
30 seg	0,025		131	289,5	92,2
1 min	0,050		200	442,0	140,7
1 min 30 seg	0,075		345	762,5	242,7
2 min	0,100	1000	496	1096,2	348,9
2 min 30 seg	0,125		603	1332,6	424,2
3 min	0,150		710	1569,1	499,5
4 min	0,200	1500	1093	2415,5	768,9
6 min	0,300		1450	3204,5	1020,0
8 min	0,400		1666	3681,9	1172,0
10 min	0,500		1901	4201,2	1337,3

VALOR CORREGIDO DEL C.B.R.	
A 0.1 "	36,3
A 0.2"	47,0
Valor escogido	**36,3**

HUMEDAD PENETRACION	
P1 (grs)	512,0
P2 (grs)	485,0
P3 (grs)	69,0
W Pen.(%)	**6,5**

HUMEDAD Y PESO UNITARIO.

No. del Molde	8
Peso muestra húmeda + molde (grs)	13428
Peso del Molde (grs).	8297
Peso de la muestra húmeda (grs).	5131
Peso de la muestra seca (grs).	4818,28
Peso de la muestra seca (lbs).	10,61
Volumen del molde (cm^3)	2316,56
Densidad muestra seca (gr/cm3)	2,080
Contenido de humedad (%)	0,06

Recipiente No.	C41
Peso de la muestra húmeda + Recip (grs).	512
Peso de la muestra seca + Recip (grs).	485
Peso del recipiente	69
Porcentaje de humedad (%)	0,065


EXPANSION TOTAL (%)

ALTURA DEL MOLDE (mm)	134
Tiempo (Hora)	Lectura Deformimetro
0,0	0
0,0	0
0,0	0,00000
24,0	0,00000
48,0	0,00000
72,0	0,00000
96,0	0,00000
EXPANSION TOTAL (%)	**0,000**

OBSERVACIONES

El ensayo de CBR se realizo, despues de haber dejada la muestra sumergida durante 96 horas cuando se midio el % de expansion de la misma.

Grafico para el cálculo del C.B.R.

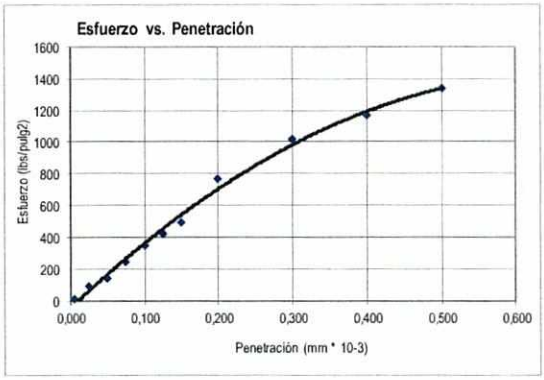

YEISON HERNANDEZ MORENO
Laboratorista

GINA MARCELA FONTECHA GUTIERREZ
Analista de laboratorio II

ENSAYO CBR METODO I. MATERIAL GRANULAR

Versión: 005	I G - F - 073	Octubre de 2019

Solicitud No.: 042/10/2024

PROYECTO	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA	NORMA:	INV-E -148-13
CLIENTE:	CONSORCIO INTER AIM	MUESTRA Nº :	1
LOCALIZACION:	VISTA HERMOSA - META	FECHA ENSAYO:	18/09/2024
DESCRIPCION:	GRAVA MAL GRADADA CON ARENA COLOR BEIGE CLARO		
OBSERVACIONES:	N/A		

COMPACTACION

PESO DEL MARTILLO	10	Lbs	DIAMETRO DE LA MUESTRA	5.98 Pulg
ALTURA DE CAIDA	18	Pulg	ALTURA DE LA MUESTRA	5.00Pulg
No. DE CAPAS	5		VOLUMEN DE LA MUESTRA	140.43Pulg
No. DE GOLPES X CAPA	56			

PENETRACION

CONSTANTE DEL ANILLO		2,21	AREA MUESTRA		3,142
TIEMPO DE PRUEBA	PENETRACION (pulg) * 10^{-3}	ESFUERZO ESTANDAR	LECT. DIAL DE CARGA	CARGA (lbs)	ESFUERZO (lbs/pulg2)
6 seg	0,005		26	57,5	18,3
30 seg	0,025		145	320,5	102,0
1 min	0,050		378	835,4	265,9
1 min 30 seg	0,075		550	1215,5	386,9
2 min	0,100	1000	725	1602,3	510,0
2 min 30 seg	0,125		1098	2426,6	772,4
3 min	0,150		1558	3443,2	1096,0
4 min	0,200	1500	1599	3533,8	1124,8
6 min	0,300		2168	4791,3	1525,1
8 min	0,400		2587	5717,3	1819,9
10 min	0,500		3096	6842,2	2177,9

VALOR CORREGIDO DEL C.B.R.	
A 0.1 "	59,8
A 0.2"	75,8
Valor escogido	**59,8**

HUMEDAD PENETRACION	
P1 (grs)	520,0
P2 (grs)	498,0
P3 (grs)	70,0
W Pen.(%)	**5,1**

HUMEDAD Y PESO UNITARIO.	
No. del Molde	18
Peso muestra húmeda + molde (grs)	13600
Peso del Molde (grs).	8120
Peso de la muestra húmeda (grs).	5480
Peso de la muestra seca (grs).	5212,09
Peso de la muestra seca (lbs).	11,48
Volumen del molde (cm^3)	2304,52
Densidad muestra seca (gr/cm3)	2,262
Contenido de humedad (%)	0,05


Recipiente No.	A
Peso de la muestra húmeda + Recip (grs).	520
Peso de la muestra seca + Recip (grs).	498
Peso del recipiente	70
Porcentaje de humedad (%)	0,051

EXPANSION TOTAL (%)	
ALTURA DEL MOLDE (mm)	134
Tiempo (Hora)	Lectura Deformimetro
0,0	0
0,0	0
0,0	0,00000
24,0	0,00000
48,0	0,00000
72,0	0,00000
96,0	0,00000
EXPANSION TOTAL (%)	**0,000**

OBSERVACIONES

El ensayo de CBR se realizo, despues de haber dejada la muestra sumergida durante 96 horas cuando se midio el % de expansion de la misma.

Grafico para el cálculo del C.B.R.

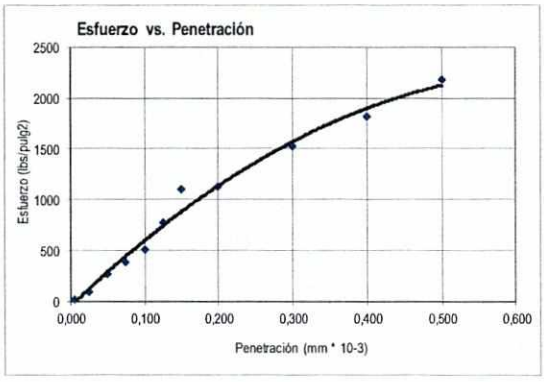

YEISON HERNANDEZ MORENO
Laboratorista

GINA MARCELA FONTECHA GUTIERREZ
Analista de laboratorio II

8
12567


CALCULO DEL CBR DE DISEÑO METODO DE LOS TRES PUNTOS

Versión: 004	IG-F-074	Mayo de 2017

Solicitud No.: 042/10/2024

	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA	NORMA:	INV-E-148-13	
CLIENTE:	CONSORCIO INTER AIM	MUESTRA Nº :		1
LOCALIZACION:	VISTA HERMOSA - META	FECHA ENSAYO:		18/09/2024
DESCRIPCION:	GRAVA MAL GRADADA CON ARENA COLOR BEIGE CLARO			
OBSERVACIONES:	N/A			



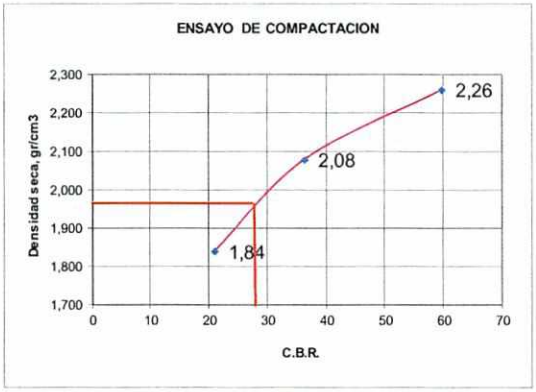

DATOS PARA EL CALCULO DEL CBR DE DISEÑO				
PROCTOR MODIFICADO		MOLDES CBR METODO I		
Densidad muestra seca (gr/cm3)	Humedad moldeo (%)	Densidad muestra seca (gr/cm3)	Humedad moldeo (%)	C.B.R
2,026	2,09	1,839	6,47	21,04
2,082	4,13	2,080	6,49	36,35
2,083	6,12	2,262	5,14	59,75
2,014	**8,03**			

DATOS PARA EL CALCULO DEL CBR DE DISEÑO	
Densidad Máx. (gr/cm^3)	2,090
Humedad Optima (%)	5,00
95% del Proctor (gr/cm^3)	1,986
C.B.R de Diseño (%)	**28,0**

YEISON HERNANDEZ MORENO
Laboratorista

GINA MARCELA FONTECHA GUTIERREZ
Analista de laboratorio II

POTENCIAL DE COLAPSO DE UN SUELO PARCIALMENTE SATURADO

Versión: 002	IG-F-187	Mayo de 2017

Solicitud No.: 042/10/2024


PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA	**FECHA:**	18/09/2024
CLIENTE:	CONSORCIO INTER AIM	**NORMA:**	INV E - 157- 13
UBICACIÓN:	VISTA HERMOSA - META		
DESCRIPCIÓN:	GRAVA MAL GRADADA CON ARENA COLOR BEIGE CLARO		

CARECTERISTICAS DEL SUELO		INICIAL	FINAL
Peso Probeta	(g)	74,05	74,20
Altura	(cm)	2,00	2,00
Diametro	(cm)	5,00	5,00
Area	(cm^2)	19,635	19,635
Volumen	(cm^3)	39,27	33,78
P. unitario total g_t	(g/cm^3)	1,886	2,197
P. unitario seco g_d	(g/cm^3)	1,760	2,041

HUMEDAD NATURAL		
Humedad	Inicial	Final
Recipiente No	1	2
P_1 (g)	44,00	44,20
P_2 (g)	41,50	41,50
P_3 (g)	6,41	6,23
Wn (%)	7,12	7,66

CALCULO INDICE DE COLPASO	
df = Lectura a nivel de esfuerzo despues de inundar=	2,798
di = Lectura a nivel de esfuerzo antes de inundar=	2,798
Ic = Potencial de colapso	**0,00**
GRADO DE COLAPSO	**NINGUNO**

RELACION BRAZO DE CARGA		5	
MASA APLICADA (g)	CARGA APLICADA (Kg/cm2)	CARGA APLICADA (Kpa)	DEFORMACION (mm)
0,200	0,051	7	1,076
0,488	0,124	12	1,295
1,000	0,255	30	1,636
2,000	0,509	60	2,115
6,000	1,528	155	2,347
8,000	2,037	206	2,798
8,000	2,037	206	2,798
13,000	3,310	332	2,815
16,000	4,074	400	2,897

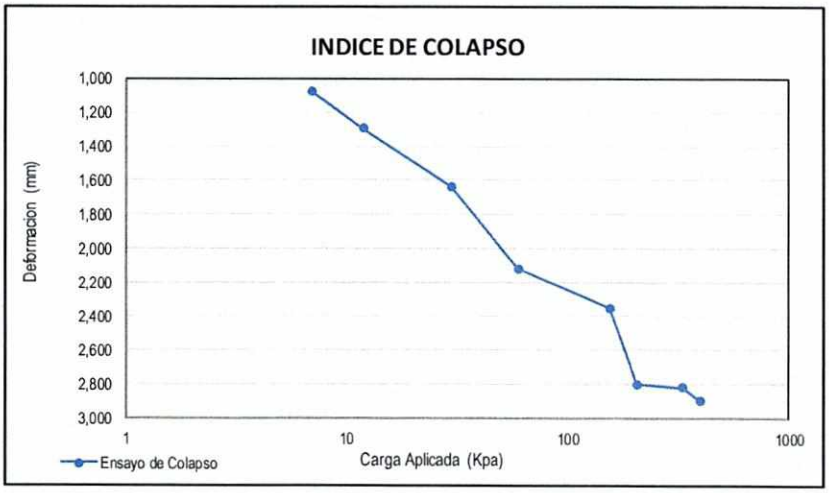

YEISON HERNANDEZ MORENO
Laboratorista

GINA MARCELA FONTECHA GUTIERREZ
Analista de laboratorio II

12570

CONTENIDO DE SALES SOLUBLES

Versión: 001 | IG-F-281 | Junio de 2023

INGEGAR INGENIERIA S.A.S
Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

Solicitud No.: 042/10/2024

OBRA:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA	NORMA:	INV-E-158-13
CLIENTE:	CONSORCIO INTER AIM	No. DE MUESTRA:	1
LOCALIZACION:	VISTA HERMOSA - META	FECHA TOMA MUESTRA:	18/09/2024
DESCRIPCION:	GRAVA MAL GRADADA CON ARENA COLOR BEIGE CLARO		

MUESTRA No. 1

	Agregado Fino	Agregado Fino
Relacion mezcla de suelo - Agua destilada	1 : 3	
Numero de la capsula de porcelana	1	2
Peso inicial de la muestra	50	50
Peso de la capsula de porcelana	100,564	106,455
Peso de la capsula de porcelana + Residuos de Sales	100,579	106,463
Peso de Residuos de Sales	0,015	0,008
Volumen inicial de agua destilada	500	500
Volumen de Solucion Tomada	100	100
Contenido de Sales Solubles acuoso	150	80
Contenido de Sales Solubles en peso Seco	0,150	0,080
Contenido de Sales Solubles en peso Seco	**0,115**	

OBSERVACIONES: NP

YEISON HERNANDEZ MORENO
Laboratorista

GINA MARCELA FONTECHA GUTIERREZ
Analista de laboratorio II

PESO ESPECÍFICO Y ABSORCIÓN DE AGREGADOS GRUESOS

Versión:005 | IG-F-040 | Enero de 2021

INGEGAR INGENIERIA S.A.S
Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

Solicitud No.: 042/10/2024

CLIENTE:	CONSORCIO INTER AIM	**FECHA:**	19-oct
PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA	**NORMA:**	INV-E-223
DESCRIPCIÓN:	GRAVA MAL GRADADA CON ARENA COLOR BEIGE CLARO		

1. DATOS DEL ENSAYO	Punto No. 1
Peso material seco (gr)	5155,0
Peso material saturado (gr)	5210,0
Peso material sumergido + canastilla (gr)	4780,0
Peso del recipiente (gr)	200,0
Peso de la canastilla sumergida (gr)	1600,0
Peso del material seco (gr)	5155,0
Peso del material saturado (gr)	5210,0
Peso del mateiral sumergido (gr)	3180,0
Peso seco - sumergido (gr)	1975,0
Peso saturado - sumergido (gr)	2030,0
Peso especifico aparente seco	**2,539**
Peso especifico saturado superficialmente seco	**2,567**
Peso especifico	**2,610**
Absorción (%)	1,1

YEISON HERNANDEZ MORENO
Laboratorista

GINA MARCELA FONTECHA GUTIERREZ
Analista de Laboratorio II

CONSORCIO HALCÓN

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

12573

CONSORCIO HALCÓN

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

01 AL 14 DE JUNIO 2024

12574

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA
112-ECP-FR-021-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	20211301010978

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA:	9469823292						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:		1 de junio de 2024 a 14 de junio de 2024				
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Valor	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR	Riesgos profesionales				
ENGATIVA RODRIGUEZ DANIEL ALEJANDRO	DIRECTOR DE OBRA	74814388	$ 1.300.000	14	SANITAS	$ 75.833	PORVENIR	$ 97.067	$ 42.233	$ -	$ -	$ -	$ 215.133
									Total				$ 215.133

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 20 JUL. 2024

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R.
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R.
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202095108

Firma: Yudy Elizabeth Alape R.
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre: BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 1920282149

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES: La fecha de retro indicada en la presente acta se establece conforme al Acta del Comité de Suspensión No. 1 del proyecto BPIN 20211301010978.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATOS OPS	CR 5 24 50	YOPAL-CASANARE	3203210978	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	770214545	9469823292	Y	2024/07/11	2024/07/11	BANCO DE OCCIDENTE		$476,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONTRATOS OPS (2 Afiliados)							$1,343,334	$215,000			$1,343,334	$168,000			$0	$0			$1,343,334		$93,600		$0	$0		$476,600
Centro de Trabajo: 4.35 (1 Afiliados)							$43,334	$7,000			$43,334	$5,500			$0	$0			$43,334		$3,100		$0	$0		$15,600
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)							$43,334	$7,000			$43,334	$5,500			$0	$0			$43,334		$3,100		$0	$0		$15,600
1	CC	74381373	BARRAGAN CASTRO RAFAEL ALBERTO	X	230301	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$5,500		0	$0	$0	14-25	1	$43,334	6.960%	$3,100	0	$0	$0	No	$15,600
Centro de Trabajo: 6.96 (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000
2	CC	74814388	ENGATIVA RODRIGUEZ DANIEL ALEJANDRO		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$461,000
Total Afiliados(2)							$1,343,334	$215,000			$1,343,334	$168,000			$0	$0			$1,343,334		$93,600		$0	$0		$476,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$215,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$215,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$93,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	2	$93,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$168,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$168,000
TOTAL				2	$476,600

2024/07/12 07:46 AM

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA
112-ECP-FR-021-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	20211301010978

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA:	9469883373						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:		1 de junio de 2024 a 14 de junio de 2024				
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Valor Riesgos profesionales	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR					
PEREZ JAQUE RAMON LEONARDO	RESIDENTE DE OBRA	74857232	$ 6.500.000	14	SANITAS	$ 121.333	COLPENSIONES	$ 515.667	$ 211.120	$ -	$ -	$ 121.333	$ 969.453
												Total	$ 969.453

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 20 JUL. 2024

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R.
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R.
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202095108

Firma:
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matrícula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre:BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre:AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 1920282149

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES: La fecha de retiro indicada en la presente acta se establece conforme al Acta del Comité de Suspensión No. 1 del proyecto BPIN 20211301010978.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

12577

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROFESIONALES 1	CR 05 24 50	VILLAVICENCIO-META	3203787718	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	770222297	9469883373	E	2024/07/11	2024/07/11	BANCO DE OCCIDENTE		$9,532,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PROFESIONALES 1 (1 Afiliados)						$11,830,000	$2,011,200			$11,830,000	$1,478,800			$11,830,000	$473,200			$11,830,000		$823,400		$11,830,000	$591,500		$5,378,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (1 Afiliados)						$11,830,000	$2,011,200			$11,830,000	$1,478,800			$11,830,000	$473,200			$11,830,000		$823,400		$11,830,000	$591,500		$5,378,100
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$11,830,000	$2,011,200			$11,830,000	$1,478,800			$11,830,000	$473,200			$11,830,000		$823,400		$11,830,000	$591,500		$5,378,100
1	CC	98388452	VASQUEZ PANTOJA OSCAR MAURICIO	230301	30	$11,830,000	$2,011,200	EPS037	30	$11,830,000	$1,478,800	CCF34	30	$11,830,000	$473,200	14-25	30	$11,830,000	6.960%	$823,400	30	$11,830,000	$591,500	No	$5,378,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PROFESIONAL (2 Afiliados)						$13,000,000	$2,210,000			$13,000,000	$520,000			$13,000,000	$520,000			$13,000,000		$904,800		$0	$0		$4,154,800
Centro de Trabajo: COMFA (2 Afiliados)						$13,000,000	$2,210,000			$13,000,000	$520,000			$13,000,000	$520,000			$13,000,000		$904,800		$0	$0		$4,154,800
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$13,000,000	$2,210,000			$13,000,000	$520,000			$13,000,000	$520,000			$13,000,000		$904,800		$0	$0		$4,154,800
2	CC	79853352	PARRA MAHECHA JOSE ALEXIS	230301	30	$6,500,000	$1,105,000	EPS005	30	$6,500,000	$260,000	CCF69	30	$6,500,000	$260,000	14-25	30	$6,500,000	6.960%	$452,400	30	$0	$0	SI	$2,077,400
3	CC	74857232	PEREZ JAQUE RAMON LEONARDO	25-14	30	$6,500,000	$1,105,000	EPS005	30	$6,500,000	$260,000	CCF69	30	$6,500,000	$260,000	14-25	30	$6,500,000	6.960%	$452,400	30	$0	$0	SI	$2,077,400
Total		**Afiliados(3)**				$24,830,000	$4,221,200			$24,830,000	$1,998,800			$24,830,000	$993,200			$24,830,000		$1,728,200		$11,830,000	$591,500		$9,532,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$4,221,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,105,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$3,116,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,728,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	3	$1,728,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$993,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$473,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$520,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$1,998,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$1,478,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$520,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$354,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$354,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$236,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$236,600
TOTAL				3	$9,532,900

12548

2024/07/12 08:30 AM

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA
112-ECP-FR-021-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	20211301010978

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA:	9469882779						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			1 de junio de 2024	a		14 de junio de 2024
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Valor	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR	Riesgos profesionales				
DIAZ SANABRIA HECTOR ENRIQUE	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	93377495	$ 1.300.000	14	SANITAS	$ 75.833	COLPENSIONES	$ 97.067	$ 42.233	$ -	$ -	$ -	$ 215.133
CELIS MURILLO SANDRA VIVIANA	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y SUELOS	1005198507	$ 1.300.000	14	SANITAS	$ 75.833	PROTECCION	$ 97.067	$ 42.233	$ -	$ -	$ -	$ 215.133
HERRERA TORRES HECTOR HUGO	ESPECIALISTA HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA	79865133	$ 1.300.000	14	SANITAS	$ 75.833	PROTECCION	$ 97.067	$ 42.233	$ -	$ -	$ -	$ 215.133
ZAFRA PARDO WILLIAM ERNESTO	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	79918963	$ 606.667	14	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	$ 75.900	COLPENSIONES	$ 97.100	$ 42.300	$ -	$ -	$ -	$ 215.300
												Total	$ 860.700

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 20 JUL. 2024

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R.
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJNDRO ENGATIVA R
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202095108

Firma: Yudy Elizabeth A.
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre: BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 1920282149

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES: La fecha de retiro indicada en la presente acta se establece conforme al Acta del Comité de Suspensión No. 1 del proyecto BPIN 20211301010978.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

1 de 2

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATOS OPS	CR 5 24 50	YOPAL-CASANARE	3203210978	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	770204249	9469882779	Y	2024/07/11	2024/07/11	BANCO DE OCCIDENTE		$3,903,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONTRATOS OPS (9 Afiliados)																						$11,006,667	$1,761,100			$11,006,667	$1,375,900			$0	$0			$11,006,667		$766,300		$0	$0		$3,903,300
Centro de Trabajo: 4.35 (6 Afiliados)																						$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$975,000			$0	$0			$7,800,000		$543,000		$0	$0		$2,766,000
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (6 Afiliados)																						$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$975,000			$0	$0			$7,800,000		$543,000		$0	$0		$2,766,000
1	CC	7165705	ALBA GONZALEZ ROQUE ELIECER																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$461,000
2	CC	19499531	BOLAÑOS AGUILAR RUBEN DARIO																		23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$461,000
3	CC	93377495	DIAZ SANABRIA HECTOR ENRIQUE																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$461,000
4	CC	1234788805	FALLA TORRES LUISA FERNANDA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$461,000
5	CC	1118541314	LEAL CAVARGO YESENIA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$461,000
6	CC	1118539218	PERILLA SEGURA LUZ AYDA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$461,000
Centro de Trabajo: 6.96 (3 Afiliados)																						$3,206,667	$513,100			$3,206,667	$400,900			$0	$0			$3,206,667		$223,300		$0	$0		$1,137,300
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)																						$3,206,667	$513,100			$3,206,667	$400,900			$0	$0			$3,206,667		$223,300		$0	$0		$1,137,300
7	CC	1005198507	CELIS MURILLO SANDRA VIVIANA																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$461,000
8	CC	79865133	HERRERA TORRES HECTOR HUGO																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$461,000
9	CC	79918963	ZAFRA PARDO WILLIAM ERNESTO	X																	25-14	14	$606,667	$97,100	EPS010	14	$606,667	$75,900		0	$0	$0	14-25	14	$606,667	6.960%	$42,300	0	$0	$0	No	$215,300
Total Afiliados(9)																						$11,006,667	$1,761,100			$11,006,667	$1,375,900			$0	$0			$11,006,667		$766,300		$0	$0		$3,903,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$1,761,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$513,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$624,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$766,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	9	$766,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$1,375,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$75,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$1,137,500
TOTAL				9	$3,903,300

2024/07/12 07:43 AM

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA
112-ECP-FR-021-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	20211301010978

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA:	9469079446						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			1 de junio de 2024		a	14 de junio de 2024
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSION		Valor Riesgos profesionales	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR					
TORRES DIAZ FEIDIMIR ALEXANDER	ESPECIALISTA EN VIAS	74770447	$1.300.000	14	SANITAS	$75.833	PROTECCION	$97.067	$42.233	$ -	$ -	$ -	$ 215.133,33
												TOTAL	$ 215.133,33

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 20 JUL. 2024

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R.
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R.
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202095108

Firma:
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre:BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre:AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 1920282149

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES: La fecha de retiro indicada en la presente acta se establece conforme al Acta del Comité de Suspensión No. 1 del proyecto BPIN 20211301010978.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74770447		TORRES DIAZ FEIDIMIR ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 7 No. 47-13	VILLAVICENCIO-META	6657575	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	753278454	9469079446	I	2024/07/11	2024/07/04	BANCO DE BOGOTA	0	$461,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000
1	CC	74770447	TORRES DIAZ FEIDIMIR ALEXANDER	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$461,000
Total Afiliados(1)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74770447		TORRES DIAZ FEIDIMIR ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 7 No. 47-13	VILLAVICENCIO-META	6657575	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	753278454	9469079446	I	2024/07/11	2024/07/04	BANCO DE BOGOTA	0	$461,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$0	$0	$90,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$90,500	$0	$0	$90,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$461,000	$0	$0	$461,000

12582

2024/07/04 04:30 PM

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA
112-ECP-FR-021-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	20211301010978

OBJETO DEL PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA"
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA:	9469330874						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			1 de junio de 2024	a	14 de junio de 2024	
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Valor	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR	Riesgos profesionales				
LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ SANTANA	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	79397840	$11.830.000	14	SANITAS	$690.107	COLPENSIONES	$ 883.353	$ 384.253	$165.620	$110.413	$ 220.827	$ 2.454.573
												Total	$ 2.454.573

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 20 JUL. 2024

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R.
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202095108

Firma: Yudy Elizabeth A.
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 251297-T

Firma:
Nombre:BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre:AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 1920282149

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES: La fecha de retiro indicada en la presente acta se establece conforme al Acta del Comité de Suspensión No. 1 del proyecto BPIN 20211301010978.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

1283

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CASS CONSTRUCTORES SAS identificado(a) con NI 900018975 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUIS ENRIQUE SANTANA MARTINEZ identificado(a) con CC 79397840.

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9469330874	766743067	E	2024-07-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																		$11,830,000	12.5%	$1,478,800
9469330874	766743067	E	2024-07-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-06	30																		$11,830,000	16%	$1,892,800
9469330874	766743067	E	2024-07-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-06	30																		$11,830,000		$59,200
9469330874	766743067	E	2024-07-10	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-06	30																		$11,830,000		$59,200
9469330874	766743067	E	2024-07-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-06	30																		$0	0%	$0
9469330874	766743067	E	2024-07-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-06	30																		$0	0%	$0
9469330874	766743067	E	2024-07-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-06	30																		$11,830,000	6.96%	$823,400
9469330874	766743067	E	2024-07-10	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-06	30																		$11,830,000	4%	$473,200
9469330874	766743067	E	2024-07-10	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-06	30																		$11,830,000	2%	$236,600
9469330874	766743067	E	2024-07-10	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-06	30																		$11,830,000	3%	$354,900

Este certificado se expide el día 2024-07-15 a las 11:06.

12584

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA
112-ECP-FR-021-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	20211301010978

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA:	9469884566						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			1 de junio de 2024		a	14 de junio de 2024
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Valor	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR	Riesgos profesionales				
ARCE FREDDY	CADENERO 2	10171224	$ 1.300.000	14	NUEVA E.P.S.	$ 75.900	PORVENIR	$ 97.100	$ 42.300	$ -	$ -	$ -	$ 215.300
PEREZ GARCIA JHON HARRISON	CADENERO 1	1121873235	$ 1.300.000	14	SANITAS	$ 75.900	PROTECCION	$ 97.100	$ 42.300	$ -	$ -	$ -	$ 215.300
ROJAS MERCHAN LUIS FERNANDO	TOPOGRAFO	18257041	$ 1.300.000	14	NUEVA E.P.S.	$ 75.900	PORVENIR	$ 97.100	$ 42.300	$ -	$ -	$ -	$ 215.300
												Total	$ 645.900

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 20 JUL. 2024

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R.
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJNDRO ENGATIVA R.
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202095108

Firma: Yudy Elizabeth A.
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matrícula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre: BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 1920282149

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES: La fecha de retiro indicada en la presente acta se establece conforme al Acta del Comité de Suspensión No. 1 del proyecto BPIN 20211301010978.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

1585

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATOS OPS	CR 5 24 50	YOPAL-CASANARE	3203210978	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	770271894	9469884566	Y	2024/07/11	2024/07/11	BANCO DE OCCIDENTE		$645,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	stn	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONTRATOS OPS (3 Afiliados)																						$1,820,001	$291,300			$1,820,001	$227,700			$0	$0			$1,820,001		$126,900		$0	$0		$645,900
Centro de Trabajo: 4.35 (3 Afiliados)																						$1,820,001	$291,300			$1,820,001	$227,700			$0	$0			$1,820,001		$126,900		$0	$0		$645,900
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)																						$1,820,001	$291,300			$1,820,001	$227,700			$0	$0			$1,820,001		$126,900		$0	$0		$645,900
1	CC	10171224	ARCE FREDDY		X																23030 1	14	$606,667	$97,100	EPS037	14	$606,667	$75,900		0	$0	$0	14-25	14	$606,667	6.960%	$42,300	0	$0	$0	No	$215,300
2	CC	1121873235	PEREZ GARCIA JHON HARRISON		X																23020 1	14	$606,667	$97,100	EPS005	14	$606,667	$75,900		0	$0	$0	14-25	14	$606,667	6.960%	$42,300	0	$0	$0	No	$215,300
3	CC	18257041	ROJAS MERCHAN LUIS FERNANDO		X																23030 1	14	$606,667	$97,100	EPS037	14	$606,667	$75,900		0	$0	$0	14-25	14	$606,667	6.960%	$42,300	0	$0	$0	No	$215,300
Total Afiliados(3)																						$1,820,001	$291,300			$1,820,001	$227,700			$0	$0			$1,820,001		$126,900		$0	$0		$645,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$291,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$194,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$97,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$126,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	3	$126,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$227,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$151,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$75,900
TOTAL				3	$645,900

2024/07/12 07:53 AM

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA
112-ECP-FR-021-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	20211301010978

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA:	9469882346						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			1 de junio de 2024		a 14 de junio de 2024	
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Valor	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR	Riesgos profesionales				
AMARILLO ALVAREZ PAOLA ANDREA	ANALISTA CONTABLE	1115859117	$ 2.000.000	14	SANITAS	$ 37.333	PORVENIR	$ 149.333	$ 4.900	$ -	$ -	$ 37.333	$ 228.900
VERANO TELLEZ YEINNY ANDREA	RESIDENTE RECURSOS HUMANOS	40434588	$ 1.934.043	14	SALUD TOTAL	$ 36.120	PORVENIR	$ 144.433	$ 62.860	$ -	$ -	$ 36.120	$ 279.533
ACOSTA CARRILLO CRISTIAN DANILO	AUXILIAR SST	1121897658	$ 2.500.000	14	SANITAS	$ 46.667	COLPENSIONES	$ 186.667	$ 81.200	$ -	$ -	$ 46.667	$ 361.200
MORALES PEREZ CLAUDIA ANDREA	AUXILIAR CONTABLE	1116549008	$ 1.300.000	14	SANITAS	$ 24.267	PORVENIR	$ 97.067	$ 3.173	$ -	$ -	$ 24.267	$ 148.773
DIAZ VANEGAS LINA MARIA	INSPECTOR SST	1121889325	$ 2.000.000	14	SANITAS	$ 37.333	PORVENIR	$ 149.333	$ 64.960	$ -	$ -	$ 37.333	$ 288.960
FUENTES HURTADO VALERIA ALEXANDRA	INGENIERA AUXILIAR DE CALIDAD	1057607599	$ 2.000.000	14	COMPENSAR	$ 37.333	PORVENIR	$ 149.333	$ 64.960	$ -	$ -	$ 37.333	$ 288.960
REYES LOPEZ ANA MARIA	ASESOR AMBIENTAL	1121921072	$ 3.500.000	14	SANITAS	$ 65.333	PORVENIR	$ 261.333	$ 113.680	$ -	$ -	$ 65.333	$ 505.680
												Total	$ 2.102.007

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 20 JUL. 2024

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R.
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJNDRO ENGATIVA R
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202095108

Firma:
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matrícula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre: BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 1920282149

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 160821-T

OBSERVACIONES: La fecha de retiro indicada en la presente acta se establece conforme al Acta del Comité de Suspensión No. 1 del proyecto BPIN 20211301010978.
VERANO TELLEZ YEINNY ANDREA, se realiza traslado de centro de trabajo de castilla la nueva a vista hermosa, en reemplazo de MONTES VALBUENA SANTIAGO

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

1258 +

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	CR 05 24 50	VILLAVICENCIO-META	3203787718	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	770186952	9469882346	E	2024/07/11	2024/07/11	BANCO DE OCCIDENTE		$6,621,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVOS (7 Afiliados)							$16,634,043	$2,661,500			$16,634,043	$665,400			$16,634,043	$665,400			$16,634,043		$1,157,900		$0	$0		$5,150,200
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (7 Afiliados)							$16,634,043	$2,661,500			$16,634,043	$665,400			$16,634,043	$665,400			$16,634,043		$1,157,900		$0	$0		$5,150,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)							$16,634,043	$2,661,500			$16,634,043	$665,400			$16,634,043	$665,400			$16,634,043		$1,157,900		$0	$0		$5,150,200
1	CC	1121897658	ACOSTA CARRILLO CRISTIAN DANILO		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF34	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
2	CC	1121889325	DIAZ VANEGAS LINA MARIA		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
3	CC	1057607599	FUENTES HURTADO VALERIA ALEXANDRA		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
4	CC	1121921072	REYES LOPEZ ANA MARIA		230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF34	30	$3,500,000	$140,000	14-25	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	SI	$1,083,600
5	CC	1121947677	RIOS AVILA ASTRID CAROLINA		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
6	CC	39704747	VALBUENA MELO MARIA CLAUDIA		230301	30	$2,700,000	$432,000	EPS008	30	$2,700,000	$108,000	CCF34	30	$2,700,000	$108,000	14-25	30	$2,700,000	6.960%	$188,000	30	$0	$0	SI	$836,000
7	CC	40434588	VERANO TELLEZ YEINNY ANDREA	X	230301	30	$1,934,043	$309,500	EPS002	30	$1,934,043	$77,400	CCF34	30	$1,934,043	$77,400	14-25	30	$1,934,043	6.960%	$134,700	30	$0	$0	SI	$599,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFA (3 Afiliados)							$6,000,000	$960,000			$6,000,000	$240,000			$6,000,000	$240,000			$6,000,000		$31,400		$0	$0		$1,471,400
Centro de Trabajo: COMFA (3 Afiliados)							$6,000,000	$960,000			$6,000,000	$240,000			$6,000,000	$240,000			$6,000,000		$31,400		$0	$0		$1,471,400
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)							$6,000,000	$960,000			$6,000,000	$240,000			$6,000,000	$240,000			$6,000,000		$31,400		$0	$0		$1,471,400
8	CC	1115859117	AMARILLO ALVAREZ PAOLA ANDREA	X	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF69	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	SI	$490,500
9	CC	1116549008	MORALES PEREZ CLAUDIA ANDREA		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
10	CC	80038188	RAMIREZ SANCHEZ JAIR GONZALO		230301	30	$2,700,000	$432,000	EPS037	30	$2,700,000	$108,000	CCF69	30	$2,700,000	$108,000	14-25	30	$2,700,000	0.522%	$14,100	30	$0	$0	SI	$662,100
Total			**Afiliados(10)**				$22,634,043	$3,621,500			$22,634,043	$905,400			$22,634,043	$905,400			$22,634,043		$1,189,300		$0	$0		$6,621,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$3,621,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$400,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$3,221,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,189,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	10	$1,189,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$905,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	7	$665,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	3	$240,000

2885 21

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$905,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$188,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$108,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$157,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$452,000
TOTAL				10	$6,621,600

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA
112-ECP-FR-021-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	20211301010978

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA:	9469276040						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			1 de junio de 2024		a	14 de junio de 2024
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Valor	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR	Riesgos profesionales				
AGUIRRE CRUZ LUZ MARINA	CONTROLADOR VIAL	1123566399	$ 1.300.000	14	NUEVA EPS MOVILIDAD	$ 24.267	PORVENIR	$/ 97.067	$ 42.233	$ -	$ -	$ 32.589	$ 196.156
CALDERON CASAGUA JULIO CESAR	CONDUCTOR DE CAMIONETA	1121897721	$ 1.450.000	14	NUEVA E.P.S.	$ 39.356	PORVENIR	$ 157.422	$ 68.522	$ -	$ -	$ 50.789	$ 316.089
CALLEJAS PRADO OMAR DE JESUS	OPERADOR RETROEXCAVADORA	1032249681	$ 2.000.000	8	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	$ 21.400	COLFONDOS	$ 85.400	$ 37.200	$ -	$ -	$ 37.700	$ 181.700
CHILITO MAGE ALIRIO HENRY	SUPERVISOR DE OBRA	4633251	$ 3.500.000	14	SANITAS	$ 65.333	COLPENSIONES	$/ 261.333	$ 113.711	$ -	$ -	$ 116.200	$ 556.578
GOMEZ CARMONA JOSE MANUEL	AYUDANTE DE OBRA	1006865726	$ 1.300.000	14	CAPITAL SALUD	$ 28.078	PORVENIR	$/ 112.233	$ 48.844	$ -	$ -	$ 34.611	$ 223.767
GOMEZ CARMONA JOSE JAIR	AYUDANTE DE OBRA	1123563510	$ 1.300.000	14	CAPITAL SALUD	$ 24.267	PORVENIR	$/ 97.067	$ 42.233	$ -	$ -	$ 30.800	$ 194.367
MERCHAN VALBUENA JOHN WALTER	AYUDANTE DE OBRA	86087820	$ 1.300.000	14	CAPITAL SALUD	$ 24.267	PORVENIR	$ 97.067	$ 42.233	$ -	$ -	$ 34.144	$ 197.711
RAMIREZ POLANIA DEIVER	CONDUCTOR DE VOLQUETA DOBLE TROQUE	1075540429	$ 1.609.000	14	NUEVA E.P.S.	$ 30.100	PORVENIR	$ 120.167	$ 52.267	$ -	$ -	$ 38.578	$ 241.111
RINCON SANCHEZ GEISON FABIAN	CONDUCTOR DE VOLQUETA SENCILLA	1123564115	$ 1.550.000	14	NUEVA E.P.S.	$ 28.933	PORVENIR	$ 115.733	$ 50.400	$ -	$ -	$ 35.233	$ 230.300
												Total	$ 2.337.778

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 20 JUL. 2024

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R.
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202095108

Firma:
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre: BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 1920282149

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 189571-T

OBSERVACIONES: La fecha de retiro indicada en la presente acta se establece conforme al Acta del Comité de Suspensión No. 1 del proyecto BPIN 20211301010978

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

12590

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VISTA HERMOSA	CR 05 24 50	VILLAVICENCIO-META	3184732061	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	735811666	9469276040	E	2024/07/11	2024/06/28	BANCO DE OCCIDENTE		$2,953,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VISTA HERMOSA (9 Afiliados)																								$9,035,330	$1,445,800			$9,035,330	$361,600			$12,916,754	$517,200			$9,035,330		$629,200		$0	$0		$2,953,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (9 Afiliados)																								$9,035,330	$1,445,800			$9,035,330	$361,600			$12,916,754	$517,200			$9,035,330		$629,200		$0	$0		$2,953,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (9 Afiliados)																								$9,035,330	$1,445,800			$9,035,330	$361,600			$12,916,754	$517,200			$9,035,330		$629,200		$0	$0		$2,953,800
1	CC	1123566399	AGUIRRE CRUZ LUZ MARINA	X																X		23030 1	18	$780,000	$124,800	EPS041	18	$780,000	$31,200	CCF34	18	$1,045,633	$41,900	14-25	18	$780,000	6.960%	$54,300	18	$0	$0	SI	$252,200
2	CC	1121897721	CALDERON CASAGUA JULIO CESAR	X								X								X		23030 1	18	$1,264,894	$202,400	EPS037	18	$1,264,894	$50,600	CCF34	18	$1,631,261	$65,300	14-25	18	$1,264,894	6.960%	$88,100	18	$0	$0	SI	$406,400
3	CC	1032249681	CALLEJAS PRADO OMAR DE JESUS	X																X		23100 1	8	$533,334	$85,400	EPS010	8	$533,334	$21,400	CCF34	8	$942,001	$37,700	14-25	8	$533,334	6.960%	$37,200	8	$0	$0	SI	$181,700
4	CC	4633251	CHILITO MAGE ALIRIO HENRY	X																X		25-14	18	$2,100,000	$336,000	EPS005	18	$2,100,000	$84,000	CCF34	18	$3,733,333	$149,400	14-25	18	$2,100,000	6.960%	$146,200	18	$0	$0	SI	$715,600
5	CC	1006865726	GOMEZ CARMONA JOSE MANUEL	X								X								X		23030 1	18	$901,702	$144,300	EPSC34	18	$901,702	$36,100	CCF34	18	$1,111,002	$44,500	14-25	18	$901,702	6.960%	$62,800	18	$0	$0	SI	$287,700
6	CC	1123563510	GOMEZ CARMONA JOSE JAIR	X																X		23030 1	18	$780,000	$124,800	EPSC34	18	$780,000	$31,200	CCF34	18	$989,300	$39,600	14-25	18	$780,000	6.960%	$54,300	18	$0	$0	SI	$249,900
7	CC	86087820	MERCHAN VALBUENA JOHN WALTER	X																X		23030 1	18	$780,000	$124,800	EPSC34	18	$780,000	$31,200	CCF34	18	$1,095,900	$43,900	14-25	18	$780,000	6.960%	$54,300	18	$0	$0	SI	$254,200
8	CC	1075540429	RAMIREZ POLANIA DEIVER	X																X		23030 1	18	$965,400	$154,500	EPS037	18	$965,400	$38,700	CCF34	18	$1,237,857	$49,600	14-25	18	$965,400	6.960%	$67,200	18	$0	$0	SI	$310,000
9	CC	1123564115	RINCON SANCHEZ GEISON FABIAN	X																X		23030 1	18	$930,000	$148,800	EPS037	18	$930,000	$37,200	CCF34	18	$1,130,467	$45,200	14-25	18	$930,000	6.960%	$64,800	18	$0	$0	SI	$296,100
Total			Afiliados(9)																					$9,035,330	$1,445,800			$9,035,330	$361,600			$12,916,754	$517,200			$9,035,330		$629,200		$0	$0		$2,953,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$1,445,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$85,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$336,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,024,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$629,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	9	$629,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$517,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	9	$517,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	$361,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	$98,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$21,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$126,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$31,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$84,000
TOTAL				9	$2,953,800

1259

2024/07/16 08:11 AM

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA
112-ECP-FR-021-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	20211301010978

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA:	9469883589						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			1 de junio de 2024		a	14 de junio de 2024
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSION		Valor	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR	Riesgos profesionales				
DIAZ AGUDELO JOSE NELSON	ALMACENISTA	7545671	$ 2.500.000	14	NUEVA E.P.S.	$ 46.667	PORVENIR	$ 186.667	$ 174.000	$ -	$ -	$ 46.667	$ 454.000
ESCOBAR TATAMUEZ EDISON RAUL	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	1085937993	$ 2.000.000	14	MALLAMAS	$ 37.333	PORVENIR	$ 149.333	$ 139.200	$ -	$ -	$ 37.333	$ 363.200
MURILLO LIS JULIAN DAVID	AYUDANTE DE OBRA	1007599987	$ 1.300.000	14	CAPITAL SALUD	$ 24.267	PORVENIR	$ 97.067	$ 90.500	$ -	$ -	$ 24.267	$ 236.100
QUICENO MOSCOTE FABIAN DE JESUS	AYUDANTE DE OBRA	93341835	$ 1.300.000	14	CAPITAL SALUD	$ 24.267	PORVENIR	$ 97.067	$ 90.500	$ -	$ -	$ 24.267	$ 236.100
URREA GARZON ALBEIRO	OFICIAL DE CONSTRUCCION	80523184	$ 1.500.000	14	CAJACOPI	$ 28.000	COLFONDOS	$ 112.000	$ 104.400	$ -	$ -	$ 28.000	$ 272.400
												Total	$ 1.561.800

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 20 JUL. 2024

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R.
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJNDRO ENGATIVA R
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202095108

Firma:
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre:BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre:AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 1920282149

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES: La fecha de retiro indicada en la presente acta se establece conforme al Acta del Comité de Suspensión No. 1 del proyecto BPIN 20211301010978.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

1592

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VISTA HERMOSA	CR 05 24 50	VILLAVICENCIO-META	3184732061	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	770231405	9469883589	E	2024/07/11	2024/07/11	BANCO DE OCCIDENTE		$2,662,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VISTA HERMOSA (5 Afiliados)																						$8,600,000	$1,376,000			$8,600,000	$344,000			$8,600,000	$344,000			$8,600,000		$598,600		$0	$0		$2,662,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (5 Afiliados)																						$8,600,000	$1,376,000			$8,600,000	$344,000			$8,600,000	$344,000			$8,600,000		$598,600		$0	$0		$2,662,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (5 Afiliados)																						$8,600,000	$1,376,000			$8,600,000	$344,000			$8,600,000	$344,000			$8,600,000		$598,600		$0	$0		$2,662,600
1	CC	7545674	DIAZ AGUDELO JOSE NELSON																		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF34	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
2	CC	1085937993	ESCOBAR TATAMUEZ EDISON RAUL																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPSIC5	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
3	CC	1007599987	MURILLO LIS JULIAN DAVID																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
4	CC	93341835	QUICENO MOSCOTE FABIAN DE JESUS																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
5	CC	80523184	URREA GARZON ALBEIRO																		23100 1	30	$1,500,000	$240,000	CCFC55	30	$1,500,000	$60,000	CCF34	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
Total			Afiliados(5)																			$8,600,000	$1,376,000			$8,600,000	$344,000			$8,600,000	$344,000			$8,600,000		$598,600		$0	$0		$2,662,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,376,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$240,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,136,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$598,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	5	$598,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$344,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	5	$344,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$344,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$60,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$104,000
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$80,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$100,000
TOTAL				5	$2,662,600

12593

2024/07/12 07:54 AM

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA
112-ECP-FR-021-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	20211301010978

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA:	9469882165						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			1 de junio de 2024	a	14 de junio de 2024	
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Valor	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR	Riesgos profesionales				
MONTES VALBUENA SANTIAGO	RESIDENTE RECURSOS HUMANOS	1019128167	$ 1.300.000	7	COMPENSAR	$ 12.200	PROTECCION	$ 48.600	$ 1.600	$ -	$ -	$ 21.220	$ 83.620
AREVALO GARZON ROYMAN EBHANDRO	DIBUJANTE	1006810236	$ 1.500.000	12	NUEVA E.P.S.	$ 24.000	PORVENIR	$ 96.000	$ 41.800	$ -	$ -	$ 35.400	$ 197.200
												Total	$ 280.820

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 20 JUL. 2024

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R.
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJNDRO ENGATIVA R
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202095108

Firma: Yudy Elizabeth A.
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matrícula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre:BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre:AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 1920282149

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES: La fecha de retiro indicada en la presente acta se establece conforme al Acta del Comité de Suspensión No. 1 del proyecto BPIN 20211301010978.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

1284

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	CR 05 24 50	VILLAVICENCIO-META	3203787718	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	770239587	9469882165	E	2024/07/11	2024/07/11	BANCO DE OCCIDENTE		$1,109,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVOS (2 Afiliados)																						$903,334	$144,600			$903,334	$36,200			$1,412,601	$56,600			$903,334		$43,400		$0	$0		$280,800
Centro de Trabajo: AD (1 Afiliados)																						$303,334	$48,600			$303,334	$12,200			$529,101	$21,200			$303,334		$1,600		$0	$0		$83,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																						$303,334	$48,600			$303,334	$12,200			$529,101	$21,200			$303,334		$1,600		$0	$0		$83,600
1	CC	1019128167	WONTES VALBUENA SANTIAGO						X										X	23020 1	7	$303,334	$48,600	EPS008	7	$303,334	$12,200	CCF34	7	$529,101	$21,200	14-25	7	$303,334	0.522%	$1,600	7	$0	$0	SI	$83,600
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (1 Afiliados)																						$600,000	$96,000			$600,000	$24,000			$883,500	$35,400			$600,000		$41,800		$0	$0		$197,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																						$600,000	$96,000			$600,000	$24,000			$883,500	$35,400			$600,000		$41,800		$0	$0		$197,200
2	CC	1006810236	AREVALO GARZON ROYMAN EBHANDRO						X										X	23030 1	12	$600,000	$96,000	EPS037	12	$600,000	$24,000	CCF34	12	$883,500	$35,400	14-25	12	$600,000	6.960%	$41,800	12	$0	$0	SI	$197,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMF OPE (1 Afiliados)																						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$3,854,167	$154,200			$2,500,000		$174,000		$0	$0		$828,200
Centro de Trabajo: COMF OPE (1 Afiliados)																						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$3,854,167	$154,200			$2,500,000		$174,000		$0	$0		$828,200
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$3,854,167	$154,200			$2,500,000		$174,000		$0	$0		$828,200
3	CC	98555029	ARANGO SANCHEZ HENRY ANTONIO						X										X	23030 1	30	$2,500,000	$400,000	MIN002	30	$2,500,000	$100,000	CCF69	30	$3,854,167	$154,200	14-25	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$828,200
Total	**Afiliados(3)**																					$3,403,334	$544,600			$3,403,334	$136,200			$5,266,768	$210,800			$3,403,334		$217,400		$0	$0		$1,109,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$544,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$496,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$48,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$217,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	3	$217,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$210,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$56,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$154,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$136,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$12,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$100,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$24,000
TOTAL				3	$1,109,000

2024/07/12 08:33 AM

CONSORCIO HALCÓN

CERTIFICADO DONDE INDIQUE CUAL ES EL PORCENTAJE (%) Y EL VALOR EJECUTADO DEL PROYECTO EN CADA MUNICIPIO

12596

EL CONSORCIO INTER AIM
NIT. 901.705.260-3

CERTIFICA QUE:

La ejecución del proyecto identificado con **BPIN No. 20211301010978** cuyo objeto es " **MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA**" el cual hace parte del contrato de obra **No. 0775 de 2022** cuyo objeto es " MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"; "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA" Y "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META" del Consorcio Halcón con NIT. 901.666.148-8 fue ejecutado en un porcentaje del 100%, por un valor de $ 3.519.487.933,11 dentro del municipio de Vista Hermosa, Meta, durante el periodo comprendido del 01 noviembre de 2024 al 20 de noviembre 2024.

Dada en Villavicencio, a los veinte (20) días del mes de noviembre del año 2024.

BORIS JOSE GAITÁN CUERVO
R.L Interventoría

HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
Contador Público Interventoría
T.P. 189521-T

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900220647-5

Villavicencio, 22 de NOVIEMBRE de 2024

112.07.01- 952 DE 2024

Ingeniero
SERGIO IVAN MUÑOZ YAÑEZ
Gerente AIM
Ciudad.

Asunto. Pago Parcial No. 04 – Contrato de obra 0775 de 2022 – Proyecto 20211301010978

Reciba un cordial Saludo.

En atención a la solicitud de pago de **CONSORCIO HALCON relacionado** en el asunto, certifico que cumple con los requisitos del formato "Lista de chequeo Contrato de OBRA **"112-ECP-FR-173-V05"** para el pago Parcial No. 04

Cordialmente.

GINA TATIANA ELAICA NIETO
Dirección Operativa de Ejecución, Seguimiento y Control de proyectos.

Elaboro: LILIANA CADENA

A.I.M.
SUBGECORP.
RAD N° 1271
FECHA: 22 NOV 2024
05:32pm
