# INFORME DE INTERVENTORIA

# CONTRATO DE CONSULTORÍA 207 DE 2023

# CONTRATO DE INTERVENTORIA 215 DE 2023

# INFORME NO. 4

## CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 215 DE 2023

## INFORME PARCIAL CONSOLIDADO DE INTERVENTORIA

PERIODO DEL INFORME: 09 de mayo de 2024 al 24 de mayo de 2024 y del 24 de julio de 2024 al 07 de agosto de 2024

## INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

| **Contrato de Interventoría No.** | **215 de 2023** |
|---|---|
| Objeto | "INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA VEREDA BARNIZA DEPARTAMENTO DEL HUILA. INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: ACTUALIZACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA" |
| Valor Inicial | $66.453.646,00 |
| Plazo | La interventoría deberá ejecutarse durante el plazo de vigencia del contrato de consultoría respecto del cual se ejerza interventoría, incluido el plazo de liquidación del contrato de consultoría y seis (06) meses más. El proponente deberá tener en cuenta que este plazo podrá ser prorrogado. El plazo del contrato de consultoría a realizar interventoría es de doscientos cuarenta (240) dias contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa legalización del mismo, más el tiempo de liquidación de la consultoría más 6 meses más. |
| Anticipo | $ 26.581.458,00 |
| Contratista | CONSORCIO INTER ESTUDIOS |
| Representante Legal | Ing. JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ |
| Supervisor | JAIME AUGUSTO MUÑOZ ORDOÑEZ |
| Contratante | Aguas del Huila S.A E.S.P |
| Fecha de Inicio | 09 de febrero de 2024 |
| Fecha de Suspensión 01 | 24 de mayo de 2024 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Prorroga de Suspensión 01 | 22 de junio de 2024 |
| Fecha de Reinicio | 24 de julio de 2024 |
| Fecha de Terminación | 7 de Diciembre de 2024 |
| Aseguradora | Compañía Mundial de Seguros S.A. |

## RELACIÓN DE PÓLIZAS DE INTERVENTORÍA

## Pólizas iniciales:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

| Amparo | No. Póliza | Desde | Hasta | Vlr. Asegurado |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | CHU-100013475 – Anexo 1 | 29/12/2023 | 29/12/2025 | $ 19.936.093,80 |
| Buen Manejo de Anticipo | CHU-100013475 – Anexo 1 | 29/12/2023 | 29/12/2025 | $ 26.581.458,40 |
| Prestaciones Sociales | CHU-100013475 – Anexo 1 | 29/12/2023 | 29/06/2028 | $ 13.290.729,20 |
| Calidad del servicio | CHU-100013475 – Anexo 1 | 29/12/2023 | 29/06/2030 | $ 19.936.093,80 |

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

| Amparo | No. Póliza | Límite por evento | Límite por vigencia | Suma asegurada |
|---|---|---|---|---|
| Amparo Básico – Predios, labores y operaciones | CHU-10002808 – Anexo 1 | $130.000.000,00 | $260.000.000,00 | $260.000.000,00 |
| Patronal | CHU-10002808 – Anexo 1 | $78.000.00,00 | $78.000.00,00 | $78.000.00,00 |
| Contratistas y subcontratistas | CHU-10002808 – Anexo 1 | $78.000.00,00 | $78.000.00,00 | $78.000.00,00 |
| Vehículos propios y no propios | CHU-10002808 – Anexo 1 | $78.000.00,00 | $78.000.00,00 | $78.000.00,00 |

## Pólizas Acta de Inicio:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

| Amparo | No. Póliza | Desde | Hasta | Vlr. Asegurado |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | CHU-100013475 – Anexo 2 | 09/02/2024 | 09/02/2026 | $ 19.936.093,80 |
| Buen Manejo de Anticipo | CHU-100013475 – Anexo 2 | 09/02/2024 | 09/02/2026 | $ 26.581.458,40 |
| Prestaciones Sociales | CHU-100013475 – Anexo 2 | 09/02/2024 | 10/08/2028 | $ 13.290.729,20 |
| Calidad del servicio | CHU-100013475 – Anexo 2 | 10/08/2025 | 10/08/2030 | $ 19.936.093,80 |

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

| Amparo | No. Póliza | Límite por evento | Límite por vigencia | Suma asegurada |
|---|---|---|---|---|
| Amparo Básico – Predios, labores y operaciones | CHU-10002808 -– Anexo 2 | $130.000.000,00 | $260.000.000,00 | $260.000.000,00 |
| Patronal | CHU-10002808 – Anexo 2 | $78.000.00,00 | $78.000.00,00 | $78.000.00,00 |
| Contratistas y subcontratistas | CHU-10002808 – Anexo 2 | $78.000.00,00 | $78.000.00,00 | $78.000.00,00 |
| Vehículos propios y no propios | CHU-10002808 – Anexo 2 | $78.000.00,00 | $78.000.00,00 | $78.000.00,00 |

## Pólizas Acta de Reinicio:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

| Amparo | No. Póliza | Desde | Hasta | Vlr. Asegurado |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | CHU-100013475 – Anexo 3 | 21/07/2024 | 09/04/2026 | $ 19.936.093,80 |
| Buen Manejo de Anticipo | CHU-100013475 – Anexo 3 | 21/07/2024 | 09/04/2026 | $ 26.581.458,40 |
| Prestaciones Sociales | CHU-100013475 – Anexo 3 | 21/07/2024 | 10/10/2028 | $ 13.290.729,20 |
| Calidad del servicio | CHU-100013475 – Anexo 3 | 10/10/2025 | 10/10/2030 | $ 19.936.093,80 |

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

| Amparo | No. Póliza | Límite por evento | Límite por vigencia | Suma asegurada |
|---|---|---|---|---|
| Amparo Básico – Predios, labores y operaciones | CHU-10002808 -– Anexo 3 | $130.000.000,00 | $260.000.000,00 | $260.000.000,00 |
| Patronal | CHU-10002808 – Anexo 3 | $78.000.00,00 | $78.000.00,00 | $78.000.00,00 |
| Contratistas y subcontratistas | CHU-10002808 – Anexo 3 | $78.000.00,00 | $78.000.00,00 | $78.000.00,00 |
| Vehículos propios y no propios | CHU-10002808 – Anexo 3 | $78.000.00,00 | $78.000.00,00 | $78.000.00,00 |

## INFORMACION DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

| **Contrato de Obra No.** | **207 de 2023** |
|---|---|
| Objeto | "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE LA VEREDA BARNIZA DEPARTAMENTO DEL HUILA Y ACTUALIZACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA" |
| Valor Inicial | $ 396.480.297,00 |
| Plazo | El plazo previsto para la ejecución del contrato es de ocho (08) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa legalización del contrato. El contrato mantendrá vigencia por el plazo de ejecución y cuatro (04) meses mas. |
| Anticipo | $ 158.592.118,00 |
| Consultor | CONSORCIO INGEFIP 2024 |
| Representante Legal | Ing. FERNANDO IVAN PEÑA PEREZ |
| Interventor | Consorcio Inter Estudios |
| Fecha de Inicio | 09 de febrero de 2024 |
| Fecha de Suspensión 01 | 24 de mayo de 2024 |
| Fecha de prorroga suspensión 01 | 22 de junio de 2024 |
| Fecha de reinicio 01 | 24 de julio de 2024 |
| Fecha de Terminación | 7 de Diciembre de 2024 |
| Aseguradora | Seguros del Estado S.A. |
| Estado del Contrato | En Ejecución |

## 1. RESUMEN EJECUTIVO

### 1.1 Información sobre estado y avance de los estudios y diseños (Describir)

En el periodo de informado el avance en la ejecución del Contrato 207 de 2023, se fundamentó y se centró en los siguientes aspectos:

**PROYECTO 1: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA VEREDA BARNIZA DEPARTAMENTO DEL HUILA**

- Se avanzó em la Formulación y priorización de proyectos con resolución 0661 del 23 de septiembre de 2019
- Se definió el alcance de la intervención: Análisis de la capacidad limitante y necesidad de obras y acciones
- Se avanzó en el Diseño hidráulico con software de dominio público
- Se realizó la recolección, organización y análisis de la información
- Se encuentra en pre-Diseño estructural, en cumplimiento de la NSR 2010
- Se realzó la formulación y análisis de alternativas
- Se realizo la comparación de alternativas y selección de alternativa viable
- Se realizaron los diseños conceptuales correspondientes a la alternativa de solución recomendada.

Dentro de los requisitos técnicos se avanzo en los siguientes aspectos:

- Se realizó la definición y localización de cada uno de los componentes a diseñar.
- Se realizaron el Levantamiento Topográficos definitivo
- Se realizaron los estudios de suelos y geotecnia.
- Se determinaron los parámetros de diseño
- Se avanzó en el diseño geométrico y de interferencias
- Se avanzó en los diseños hidráulicos.

Los avances anteriormente mencionados se encuentran disponibles con la entrega del presente informe de forma digital.

**PROYECTO 2: ACTUALIZACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA**

Dentro de los requisitos técnicos se avanzó en los siguientes aspectos:

- Se realizó la definición y localización de cada uno de los componentes a diseñar.
- Se realizaron el Levantamiento Topográficos definitivos
- Se realizaron los estudios de suelos y geotecnia.
- Se determinaron los parámetros de diseños
- Se avanzó en el diseño geométrico y de interferencias
- Se avanzó en los diseños hidráulicos.

Los avances anteriormente mencionados se encuentran disponibles con la entrega del presente informe de forma digital.

### 1.1.1 Estado de las pólizas del contrato de Consultoría – ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO

**Póliza de cumplimiento estatal**

**Fecha de expedición: 28/12/2023** **Fecha de Aprobación: 29/12/2023**

| No. póliza | Amparos | Valor asegurado | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| 11-44-101215230 | Cumplimiento del contrato | $118.944.089,10 | 28/12/2023 | 28/04/2025 |
| 11-44-101215230 | Buen manejo y correcta inversión del anticipo | $158.592.118,80 | 28/12/2023 | 28/04/2025 |
| 11-44-101215230 | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | $79.296.059,40 | 28/12/2023 | 28/12/2027 |
| 11-44-101215230 | Calidad del servicio | $118.944.089,10 | 28/12/2023 | 28/08/2029 |

**Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual**

**Fecha de expedición: 28/12/2023** **Fecha de Aprobación: 29/12/2023**

| No. póliza | Amparos | Vigencia desde | Vigencia hasta | Suma Asegurada |
|---|---|---|---|---|
| 11-40-101058941 | Predios, labores y operaciones | 28/12/2023 | 28/08/2024 | $ 232.000.000,00 |
| 11-40-101058941 | Contratistas y subcontratistas | 28/12/2023 | 28/08/2024 | $ 232.000.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11-40-101058941 | Vehículos propios y no propios | 28/12/2023 | 28/08/2024 | $ 232.000.000,00 |
| 11-40-101058941 | Responsabilidad civil patronal | 28/12/2023 | 28/08/2024 | $ 232.000.000,00 |
| 11-40-101058941 | Daño emergente y lucro cesante | 28/12/2023 | 28/08/2024 | $ 232.000.000,00 |
| 11-40-101058941 | Prejuicios extracontractuales | 28/12/2023 | 28/08/2024 | $ 232.000.000,00 |

**1.2. Estado y Avance Físico de los estudios y diseños**

**Historial Cronológico del contrato de *CONSULTORIA 207 DE 2023***

| ACTIVIDAD | FECHA | DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS | DÍAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDOS | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| **Iniciación** | 09/02/2024 | 120 | | |
| **Suspensión 01** | 24/05/2024 | | | |
| **Prorroga Suspensión 01** | 22/06/2024 | | | |
| **Reinicio 01** | 24/07/2024 | | | 07/12/2024 |

**Historial Cronológico del contrato de *INTERVENTORIA 215 DE 2023***

| ACTIVIDAD | FECHA | DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS | DÍAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDOS | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| **Iniciación** | 09/02/2024 | 120 | | |
| **Suspensión 01** | 24/05/2024 | | | |
| **Prorroga Suspensión 01** | 22/06/2024 | | | |
| **Reinicio 01** | 24/07/2024 | | | 07/12/2024 |

**ACTAS** (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.**) DE CONSULTORIA**

| Tipo de Acta | No | Fecha |
|---|---|---|
| Acta de Inicio | 1 | 02 de febrero de 2024 |
| Acta de suspensión | 1 | 24 de mayo de 2024 |
| Prorroga Acta de Suspensión | 1 | 22 de junio de 2024 |
| Acta de Reinicio | 1 | 24 de julio de 2024 |

**ACTAS** (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.**) DE INTERVENTORIA**

| Tipo de Acta | No | Fecha |
|---|---|---|
| Acta de Inicio | 1 | 02 de febrero de 2024 |

| | | |
|---|---|---|
| Acta de suspensión | 1 | 24 de mayo de 2024 |
| Prorroga Acta de Suspensión | 1 | 22 de junio de 2024 |
| Acta de Reinicio | 1 | 24 de julio de 2024 |

**1.3. Estado y Avance Presupuestal del Proyecto (Describir) CONSULTORIA *207 DE 2023***

VALOR INICIAL DEL CONTRATO.....$ 396.480.297.00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO.....00.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO.....$ 396.480.297.00
VALOR DEL ANTICIPO.....$ 158.592.118,00
PORCENTAJE DE ANTICIPO.....40%

**PROYECTO 1: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA VEREDA BARNIZA DEPARTAMENTO DEL HUILA**

VALOR DEL PROYECTO.....$ 170.993.004

**AVANCE FISICO REAL**

Avance Físico Acumulado Anterior.....27,68%

Avance Físico Mensual.....7,61%

Avance Físico Acumulado.....35,30%

**AVANCE FISICO GENERAL PROYECTADO SEGÚN CRONOGRAMA**

De acuerdo con la programación inicialmente presentada, el avance físico a la fecha debería ser del 50%

| AVANCE FISICO (%) | | | |
|---|---|---|---|
| CONCEPTO | ACUM. ANTERIOR | AVANCE MENSUAL | TOTAL ACUMULADO |
| % Programado | 41,88% | 8,13% | 50,01% |
| % Ejecutado | 27,68% | 7,61% | 35,29% |
| Diferencia | -14,20% | -0,52% | -14,72% |

**PORCENTAJE GENERAL DE AVANCE O RETRASO SEGÚN CRONOGRAMA**


Se presenta un retraso del 14,72%, con respecto al programado.

AVANCE EN TIEMPO
Tiempo Total Transcurrido .....120 días
Avance Porcentual según plazo inicial.....50,0%

AVANCE FINANCIERO
Inversión contratada del proyecto 1.....$ 170.993.004,00
Inversión Ejecutada del proyecto 1 en el Periodo.....$ 19.664.195
Inversión Programada del proyecto 1 en el Periodo.....$ 17.048.002

| AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | ACUM. ANTERIOR | AVANCE MENSUAL | TOTAL ACUMULADO | % |
| % Programado | 71.611.870 | 13.901.731 | 85.513.601 | 50.01% |
| % Ejecutado | 47.330.864 | 13.012.568 | 60.343.432 | 35.29% |
| Diferencia | 24.281.006 | (889.164) | 25.170.170 | 14.72% |

Porcentaje Acumulado Programado..... 50%
Inversión Acumulada Programada.....$ 85.513.601
Inversión Acumulada Ejecutada..... $ 60.343.432
Porcentaje Acumulado Ejecutado.....35.30%

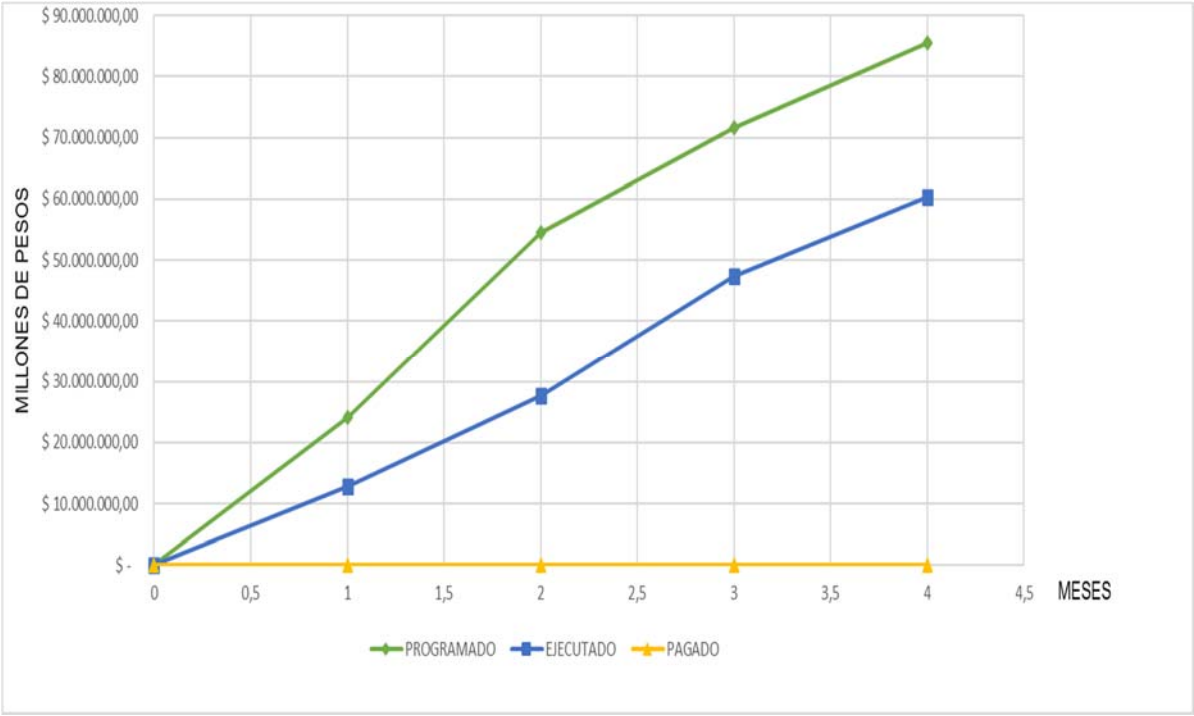

**PROYECTO 2: ACTUALIZACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA**

VALOR DEL PROYECTO.....$ 225.487.293

**AVANCE FISICO REAL**

Avance Físico Acumulado Anterior.....3,07%

Avance Físico Mensual .....13,79%

Avance Físico Acumulado.....16,86%

**AVANCE FISICO PROYECTADO SEGÚN CRONOGRAMA**

De acuerdo con la programación inicialmente presentada, el avance físico a la fecha debería ser del 47,23%

| AVANCE FISICO (%) | | | |
|---|---|---|---|
| CONCEPTO | ACUM. ANTERIOR | AVANCE MENSUAL | TOTAL ACUMULADO |
| % Programado | 36,83% | 10,40% | 47,23% |
| % Ejecutado | 3,07% | 13,79% | 16,86% |
| Diferencia | -33.76% | -3,39% | -30.37% |

**PORCENTAJE DE AVANCE O RETRASO SEGÚN CRONOGRAMA**


Se presenta un retraso del 30.37%, con respecto al programado.

AVANCE EN TIEMPO
Tiempo Total Transcurrido .....120 días
Avance Porcentual según plazo inicial.....50%

AVANCE FINANCIERO
Inversión contratada del proyecto 2.....$ 225.487.293,00
Inversión Ejecutada del proyecto 2 en el Periodo.....$ 2.705.848,00
Inversión Programada del proyecto 2 en el Periodo.....$ 38.242.645,00

| AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | ACUM. ANTERIOR | AVANCE MENSUAL | TOTAL ACUMULADO | % |
| % Programado | 83.246.970 | 23.450.678 | 106.497.648 | 47,23% |
| % Ejecutado | 6.922.460 | 31.094698 | 38.017.158 | 16,86% |
| Diferencia | 15.288.038 | 7.694.019 | 83.768.529 | -30.37% |

Porcentaje Acumulado Programado..... 47,23%
Inversión Acumulada Programada.....$ 106.497.648
Inversión Acumulada Ejecutada..... $ 38.017.158
Porcentaje Acumulado Ejecutado.....16,86%

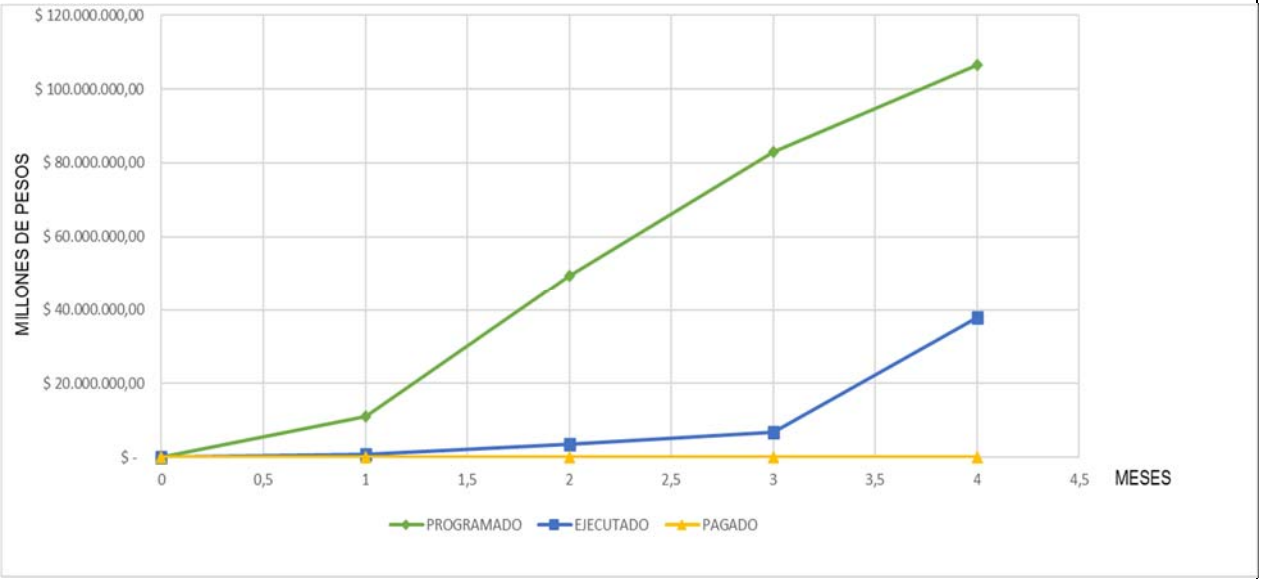


**1.3.1 Estado y Avance Presupuestal del Proyecto (Describir) *INTERVENTORIA 215 DE 2023***

VALOR INICIAL DEL CONTRATO..... $ 66.453.646,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO.....$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO.....$ 66.453.646,00
VALOR DEL ANTICIPO.....$ 26.581.458,00
PORCENTAJE DE ANTICIPO..... ..40%

AVANCE FISICO REAL

Avance Físico Acumulado Anterior..... 37,5%
Avance Físico Mensual..... 12,5%
Avance Físico Acumulado..... 50%

## AVANCE FISICO PROYECTADO SEGÚN CRONOGRAMA

De acuerdo con la programación inicialmente presentada, el avance físico a la fecha debería ser del 50%

| AVANCE FISICO (%) | | | |
|---|---|---|---|
| CONCEPTO | ACUM. ANTERIOR | AVANCE MENSUAL | TOTAL ACUMULADO |
| % Programado | 37,5% | 12,50% | 50% |
| % Ejecutado | 37,5% | 12,50% | 50% |
| Diferencia | 0,00% | 0,00% | 0,00% |


## PORCENTAJE DE AVANCE O RETRASO SEGÚN CRONOGRAMA

La ejecución del contrato se encuentra acorde con el avance programado.

AVANCE EN TIEMPO
Tiempo Total Transcurrido .....120 días
Avance Porcentual según plazo inicial.....50%

AVANCE FINANCIERO
Inversión contratada.....$ 66.453.646,00
Inversión Ejecutada en el Periodo..... $ 8.306.706
Porcentaje Ejecutado en el Periodo..... 12.5%
Inversión Acumulada Ejecutada..... $ 33.226.824
Porcentaje Acumulado Ejecutado.....50%

| AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | ACUM. ANTERIOR | AVANCE MENSUAL | TOTAL ACUMULADO | % |
| % Programado | 24.920.118 | 8.306.706 | 33.226.824 | 50% |
| % Ejecutado | 24.920.118 | 8.306.706 | 33.226.824 | 50% |
| Diferencia | - | - | - | 50% |

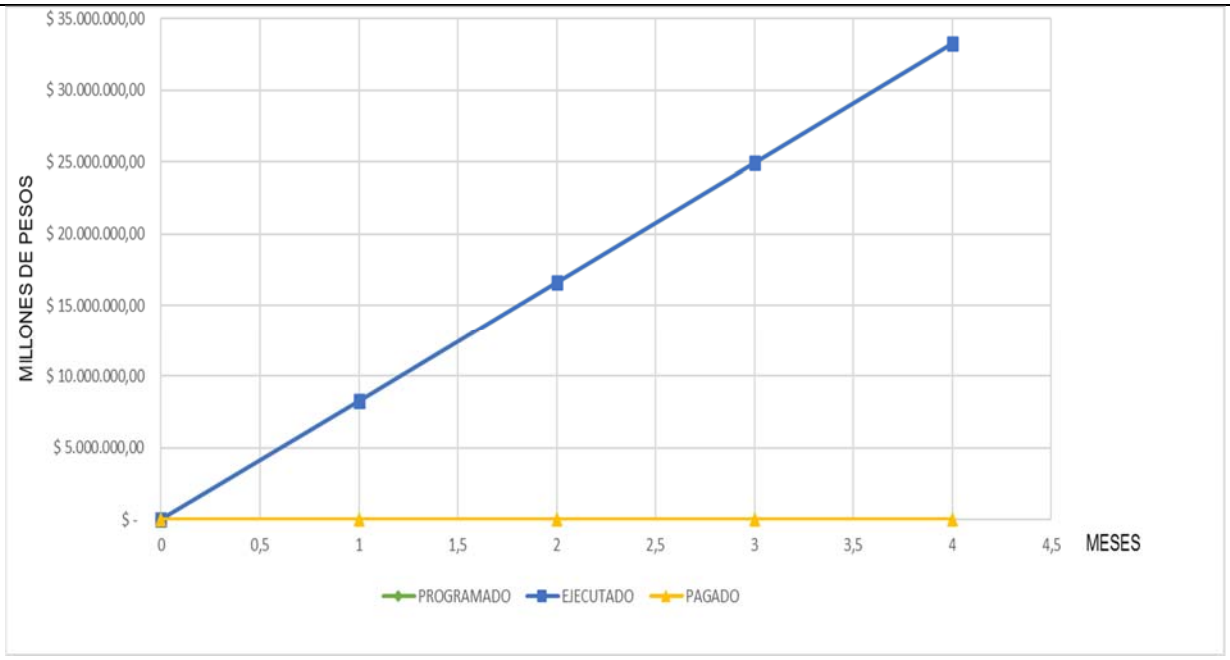


## 2. INFORME BÁSICO

### 2.1.1 Estado Financiero del Contrato ***DE CONSULTORIA***

| Relación de Pago ( Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada) | Fecha | Valor Acta | Amortización | Valor pagado |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo (40%) | - | - | - | $ 0 |
| **TOTALES** | | | | |
| **Valor Contrato Inicial** | **Valor Adicional** | **Valor Total Contratado** | **Valor Ejecutado** | **Valor no Ejecutado** |
| $ 396.480.297,00 | $ 0 | $ 396.480.297,00 | $ 0 | $ 396.480.297,00 |
| | | | | |

### 2.1.2 Estado Financiero del Contrato ***DE INTERVENTORIA***

| Relación de Pago ( Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada) | Fecha | Valor Acta | Amortización | Valor pagado |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo (40%) | - | - | - | $ 0 |
| **TOTALES** | | | | |
| **Valor Contrato Inicial** | **Valor Adicional** | **Valor Total Contratado** | **Valor Ejecutado** | **Valor no Ejecutado** |
| $66.453.646,00 | $0 | $66.453.646,00 | $0 | $66.453.646,00 |
| | | | | |

## 2.2. Personal y Equipo Empleado por el Contratista de la Consultoría

En el siguiente cuadro se relacionan los equipos los profesionales que intervinieron en la ejecución del contrato de consultoría para el periodo informado, de acuerdo con el cronograma de ejecución:

| NOMBRE | PROFESIÓN | IDENTIFICACIÓN | MATRICULA PROFESIONAL | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| MANUEL RICARDO SANCHEZ | INGENIERO CIVIL | | | DIRECTOR DE CONSULTORIA |
| FERNANDO IVAN PEÑA PEREZ | INGENIERO CIVIL | | | INGENIERO DE APOYO |
| GUSTAVO PEÑA PEREZ | INGENIERO CIVIL | | | TOPOGRAFO |
| OSCAR FERNANDO OTERO | INGENIERO CIVIL | | | INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA |
| ROBERTO CASTAÑEDA PARDO | INGENIERO CIVIL | | | ENGENIERO ESPECIALISTA HIDRAULICO |

Los siguientes corresponden a los equipos utilizados por el contratista consultor durante el periodo del presente informe:

- ✓ Estación total marca TOPCON modelo GPT3105W número 8R013
  Accesorios marca GEOSURVEY
- ✓ GPS CHC-NAV IBASE doble frecuencia
  El certificado de los equipos se encuentra anexo en el informe entregado por el consultor

## 2.3. Personal y Equipo Empleado por el Interventor

En el siguiente cuadro se relacionan los equipos y recurso humano que estuvieron a disposición de la interventoría durante el periodo del informe para el cumplimiento de sus obligaciones.

| Proyecto | Nombre / Dirección | Teléfono | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **EQUIPOS** | | | |
| Equipo | Portátil HP Procesador Corel i7, 4GB de Memoria | | |
| Equipo | Portátil Assus Procesador Corel i7, 8GB de Memoria | | |
| Camioneta | Chevrolet tracker 1.8 | | |
| **RECURSO HUMANO** | | | |
| Director de Interventoría | JOHAN JAVIER OÑATE | 3204961847 | Dedicación 15% |
| Especialista hidráulico | ALBERTO VALDERRAMA RIVERA | | Dedicación 20% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Especialista Estructural | JOSE DAVID DONOSO TOVAR | | Dedicación 20% |
| | Geotecnista | JAIME MAURICIO SOTO ANDRADE | | Dedicación 12% |
| | Ingeniero de Apoyo | ERIKA JOHANNA FERNANDEZ FIGUEROA | 3204258440 | Dedicación 88% |
| | **SEDES** | | | |
| | Sede Principal | Calle 24 No. 5 bis 37 Sevilla | 3204961847 | |

## 3. ASPECTOS TÉCNICOS

### 3.1. Modificaciones Realizadas en consultoría

No aplica hasta el momento.

### 3.2. Problemas y Soluciones Adoptadas

Se presentan lluvias intensas en la zona directa de ejecución de los dos proyectos en el municipio de Acevedo y el municipio de Palestina, lo que dificultaba los trabajos de topografía, motivo por el cual se suscribió Acta de suspensión 01 el 24/05/2024 y una prorroga a la suspensión 01 el día 22/06/2024. Una vez superados los motivos que dieron origen a la suspensión se suscribió el Acta de Reinicio 01 con fecha del 24/07/2024.

### 3.3. Cumplimiento de las condiciones del pliego de condiciones

Se evidencia las actividades desarrolladas cumplen con las especificaciones y obligaciones estipuladas en el contrato y sus anexos.

Los trabajos a campo se llevan a cabo con el personal idóneo y calificado para la ejecución de los trabajos. El personal presente en zona de estudio contaba con su dotación y su respectiva afiliación a salud, pensión y riesgos profesionales.

## 4. CONTROL DE CALIDAD

### 4.1. Cuadro Resumen de Pruebas de Laboratorio

Se realizó toma de muestras muestras in-situ de agua para evaluar los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, los cuales fueron enviados al laboratorio certificado con las ISO correspondientes, las normas y resoluciones vigentes para las Buenas Prácticas de Laboratorio Res. 3610 de 2013 y las que corresponden; el laboratorio que emite los resultados es LABORATORIO AGUALIMSU S.A.S.
Los resultados de laboratorio se encuentran anexos en los productos entregados por el consultor y de manera digital en el presente informe de interventoría.

**4.2. Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio**

El resultado obtenido de la toma de muestras para la evaluación de calidad de agua cumple en su mayoría con los parámetros definidos para su evaluación con la diferencia que se obtiene agentes microbiológicos como NMP COLIFORMES TOTALES y NMP ESCHRICHIA COLI.

Es importante resaltar que todos los parámetros fueron evaluados y comparados directamente con la normativa actual vigente lo cual debe cumplir el agua para consumo humano en la Res. 2115 de 2007.

Se concluye que el agua es apta para consumo humano, pero se debe realizar un tratamiento previo de desinfección para cumplir con lo dispuesto en la Res. 2115 de 2007 y el Dec. 1575 de 2007 para eliminar los agentes resultantes como NMP COLIFORMES TOTALES y NMP ESCHRICHIA COLI.

Los resultados de laboratorio se encuentran anexos en los productos entregados por el consultor y de manera digital en el presente informe de interventoría.

**4.3. Conclusiones y recomendaciones**

De acuerdo con lo anteriormente revelado en el informe nos permitimos concluir lo siguiente:

a. El desempeño y avance de las actividades programadas en el Cronograma y Plan de Trabajo propuesto por el Contratista Consorcio INGEFIP 2024, para el proyecto **ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA VEREDA BARNIZA DEPARTAMENTO DEL HUILA** arroja un valor general de ejecución física acumulada del 35.30%, mientras la ejecución física acumulada programada es de 50%. Lo anterior denota retraso en las actividades por parte del Contratista, de acuerdo al cronograma inicial presentado y avalado por la interventoría.

b. El desempeño y avance de las actividades programadas en el Cronograma y Plan de Trabajo propuesto por el Contratista Consorcio INGEFIP 2024, para el proyecto **ACTUALIZACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA** arroja un valor general de ejecución física acumulada del 16.86%, mientras la ejecución física programada es de 47.23%. Lo anterior denota retraso de algunas de las actividades por parte del Contratista.

c. El estado financiero del Contrato de Consultoría 207 de 2023, establecido por la Interventoría, no es coincidente al plan de inversiones aprobado por la interventoría para el periodo informado, debido a los retrasos presentados en el plan de trabajo. De igual forma no se presentan soportes de pagos, gastos u otros, que permitan confirmar la ejecución financiera del Contrato, a excepción de los aportes al sistema de Seguridad Social.

d. Se recibieron y revisaron los productos entregados por el consultor, los cuales se encuentran disponibles de manera digital dentro de la entrega del presente informe.

De acuerdo con lo anteriormente revelado en el informe nos permitimos realizar las siguientes recomendaciones:

- Acelerar los estudios hidráulicos y estructurales, que a la fecha no se han presentado a la interventoría.
- Continuar con las actividades de ejecución de la consultoría, de acuerdo con el cronograma establecido y aprobado por interventoría.

**4.4. Reuniones realizadas**

| Fecha de Realización | Lugar | Resultado del Comité (Describir) |
|---|---|---|
| 24-05-2024 | Oficina contratista de Interventoría | Se realizó reunión entre interventoría y consultoría para presentar los avances realizados por la consultoría. Se suscribe Acta de Suspensión 01 entre Consultoría e Interventoria. |

## 5. INFORME AMBIENTAL

**5.1 Identificación de situaciones Ambientales**

Se cumplió con todas las normas ambientales, sin presentar perjuicio alguno.

**5.2 Evaluación de Daños y Perjuicios a Terceros**

No se presentan ningún tipo de daño y/o perjuicio a terceros al cierre del presente informe.

**5.3 Descripción de Actividades Desarrolladas en el Periodo**

En el periodo de informado el avance en la ejecución del Contrato 207 de 2023, se fundamentó y se centró en los siguientes aspectos:

**PROYECTO 1: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA VEREDA BARNIZA DEPARTAMENTO DEL HUILA**

- Se avanzó em la Formulación y priorización de proyectos con resolución 0661 del 23 de septiembre de 2019
- Se definió el alcance de la intervención: Análisis de la capacidad limitante y necesidad de obras y acciones
- Se avanzó en el Diseño hidráulico con software de dominio público
- Se realizó la recolección, organización y análisis de la información
- Se encuentra en pre-Diseño estructural, en cumplimiento de la NSR 2010
- Se realzó la formulación y análisis de alternativas
- Se realizo la comparación de alternativas y selección de alternativa viable

- Se realizaron los diseños conceptuales correspondientes a la alternativa de solución recomendada.

Dentro de los requisitos técnicos se avanzó en los siguientes aspectos:

- Se realizó la definición y localización de cada uno de los componentes a diseñar.
- Se realizaron el Levantamiento Topográficos definitivo
- Se realizaron los estudios de suelos y geotecnia.
- Se determinaron los parámetros de diseño
- Se avanzó en el diseño geométrico y de interferencias
- Se avanzó en los diseños hidráulicos.

**PROYECTO 2: ACTUALIZACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA**

Dentro de los requisitos técnicos se avanzó en los siguientes aspectos:

- Se realizó la definición y localización de cada uno de los componentes a diseñar.
- Se realizaron el Levantamiento Topográficos definitivos
- Se realizaron los estudios de suelos y geotecnia.
- Se determinaron los parámetros de diseños
- Se avanzó en el diseño geométrico y de interferencias
- Se avanzó en los diseños hidráulicos.

Los avances anteriormente mencionados se encuentran disponibles con la entrega del presente informe de forma digital.

## 6. PAGOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

### 6.1. Cumplimiento de las normas de seguridad Industrial

Una vez iniciadas las labores físicas en sitio de la zona de estudio, se verifica que el personal cuenta con los elementos de protección personal necesarios para las actividades que se vienen desarrollando.
Se verifica que todo el personal presente en sitio de obra se encuentra afiliado al sistema de aportes de salud, pensiones y ARP.

## 6.2. Pagos de la seguridad integral y otros

Cumpliendo con los requerimientos dados por la interventoría, el personal empleado por el contratista cumplió con los requisitos de la ley 100, (Afiliación a ARP, EPS y Pensión).En el Anexo A del Informe Técnico Mensual No 4, se presentan las planillas de aportes al sistema de seguridad social del mes de mayo, junio y julio de 2024, relacionando los profesionales que intervinieron en la ejecución del Contrato 207 de 2024, conforme la propuesta del respectivo contrato, la cual fue objeto de verificación por parte de la Interventoría, como se presenta en los Anexos.

## 6.3. Registro Fotográfico


**Trabajos de campo – Quebrada la Barniza, Municipio de Acevedo**









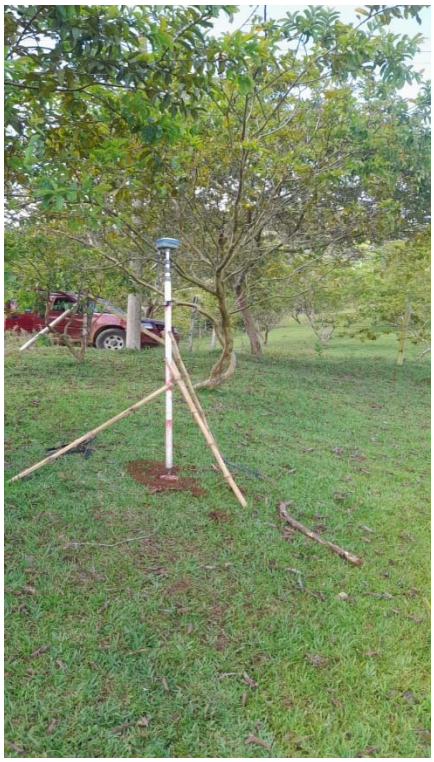







**CONSORCIO INTER ESTUDIOS**
R.L. ING. JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ
INTERVENTOR

A continuación, se relacionan y anexa los documentos indicados en el cuerpo de este informe:


A. Planillas de Seguridad Social del Personal de la Consultoría 207 de 2023.
B. Planillas de Seguridad Social del Personal de Interventoría 215 de 2023.
C. Matriz de seguimiento de los proyectos.
D. Informe Técnico mensual No. 4 contratista de Consultoría 207 de 2023.

# MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE AVANCE FÍSICO CONTRATO DE CONSULTORÍA No: 207 DE 2023
# ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA VEREDA BARNIZA DEPARTAMENTO DEL HUILA

| PROYECTO | COMPONENTE | PRODUCTOS | ACTIVIDADES | Fuente de Verificación | Ponderacion productos municipio | Ponderación Actividades municipio | SEGUIMIENTO | | | AVANCE (FECHA) | Σ | TIEMPO DE EJECUCION | CRONOGRAMA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Actividades | Producto | Avance por producto municipio | | | | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 |
| ACUEDUCTO REGIONAL LA VEREDA BARNIZA DEPARTAMENTO DEL HUILA | Elaboración de Estudios Básicos del sistema de Acueducto y documento Diagnóstico preliminar | Censo o cuantificación de los usuarios del sistema de acueducto. | Elaborar y/o Cuantificar el número de usuarios | Documental | 30,00% | 5,00% | 5,00% | 22,00% | 73,3% | Programado | 5,00% | 2 | 2,50% | 2,50% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 5,00% | | 1,50% | 1,50% | 2,00% | | | | | |
| | | Elaborar Diagnostico Base | Elaborar y realizar el estudio de Topografía | Informe de topografia Planos | | 5,00% | 3,50% | | | Programado | 5,00% | 2 | 2,50% | 2,50% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 3,50% | | 0,50% | 1,50% | 1,50% | | | | | |
| | | | Elaboración de los Estudios de Suelos o de Geotecnia | Informe Estudio de Suelos | | 5,00% | 1,50% | | | Programado | 5,00% | 2 | 2,50% | 2,50% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 1,50% | | 0,50% | 0,50% | 0,50% | | | | | |
| | | | Caracterización y trazabilidad del Agua cruda | Informe de Laboratorio | | 5,00% | 3,34% | | | Programado | 5,00% | 3 | 1,67% | 1,67% | 1,67% | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 3,34% | | 1,67% | 1,67% | | | | | | |
| | | Compilación de la información Básica en un informe Diagnóstico Preliminar | Recolección, organización y análisis de la información | Documental | | 0,53% | 0,53% | | | Programado | 0,53% | 2 | 0,26% | 0,26% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,53% | | 0,26% | 0,20% | 0,07% | | | | | |
| | | | Investigaciones de campo sobre la situación actual del abastecimiento de agua potable. | Documental | | 0,53% | 0,53% | | | Programado | 0,53% | 2 | 0,26% | 0,26% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,53% | | 0,20% | 0,15% | 0,18% | | | | | |
| | | | Diagnóstico detallado de la situación del sistema de abastecimiento actual de agua | Documental | | 0,53% | 0,53% | | | Programado | 0,53% | 3 | 0,18% | 0,18% | 0,18% | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,53% | | 0,05% | 0,10% | 0,38% | | | | | |
| | | | Determinación de la población afectada. | Documental | | 0,53% | 0,53% | | | Programado | 0,53% | 2 | 0,26% | 0,26% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,53% | | 0,20% | 0,20% | 0,13% | | | | | |
| | | | Proyecciones de la población con el censo al año 2022 y demanda de agua | Documental | | 0,53% | 0,52% | | | Programado | 0,53% | 2 | 0,26% | 0,26% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,52% | | 0,26% | 0,26% | | | | | | |
| | | | Características socio-culturales de la población y participación comunitaria | Documental | | 0,53% | 0,53% | | | Programado | 0,53% | 2 | 0,26% | 0,26% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,53% | | 0,20% | 0,26% | 0,07% | | | | | |
| | | | Cuantificación de la demanda y/o necesidades | Documental | | 0,53% | 0,53% | | | Programado | 0,53% | 2 | 0,26% | 0,26% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,53% | | 0,20% | 0,20% | 0,13% | | | | | |
| | | | Estudios básicos | Documental | | 0,53% | 0,53% | | | Programado | 0,53% | 2 | 0,26% | 0,26% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,53% | | 0,20% | 0,20% | 0,13% | | | | | |
| | | | Condiciones generales | Documental | | 0,53% | 0,53% | | | Programado | 0,53% | 2 | 0,26% | 0,26% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,53% | | 0,15% | 0,20% | 0,18% | | | | | |
| | | | Disponibilidad de agua y balance hídrico: Estudios hidrológicos y/o hidrogeológicos, estudio hidrometeoro lógico. análisis de calidad de agua y tratabilidad, etc. | Documental | | 0,53% | 0,53% | | | Programado | 0,53% | 2 | 0,26% | 0,26% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,53% | | 0,15% | 0,20% | 0,18% | | | | | |
| | | | Geología, geomorfología, suelos y geotécnica: Estudio geológico, estudio de suelos y geotecnia | Documental | | 0,53% | 0,40% | | | Programado | 0,53% | 2 | 0,26% | 0,26% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,40% | | 0,15% | 0,15% | 0,10% | | | | | |
| | | | Estudios fotogramétricos, topográficos y trabajos de campo | Documental | | 0,53% | 0,40% | | | Programado | 0,53% | 2 | 0,26% | 0,26% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,40% | | 0,15% | 0,15% | 0,10% | | | | | |
| | | | Estudios ambientales | Documental | | 0,53% | 0,40% | | | Programado | 0,53% | 2 | 0,26% | 0,26% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,40% | | 0,15% | 0,15% | 0,10% | | | | | |
| | | | Estudio de Análisis de vulnerabilidad y gestión del riesgo. Debe contener como mínimo: identificación y evaluación de amenazas, identificación de componentes del sistema, estimación del potencial de daños, categorización de la severidad de los daños potenciales estimados, procedimientos generales de atención de emergencias y procedimientos específicos para cada escenario de riesgo identificado | Documental | | 0,53% | 0,40% | | | Programado | 0,53% | 2 | 0,26% | 0,26% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,40% | | 0,15% | 0,15% | 0,10% | | | | | |
| | | | Infraestructura existente de otros servicios | Documental | | 0,53% | 0,40% | | | Programado | 0,53% | 2 | 0,26% | 0,26% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,40% | | 0,20% | 0,20% | | | | | | |
| | | | Disponibilidad de energía eléctrica y de comunicaciones | Documental | | 0,53% | 0,40% | | | Programado | 0,53% | 2 | 0,26% | 0,26% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,40% | | 0,20% | 0,20% | | | | | | |
| | | | Vías de acceso | Documental | | 0,53% | 0,40% | | | Programado | 0,53% | 2 | 0,26% | 0,26% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,40% | | 0,20% | 0,20% | | | | | | |
| | | | Disponibilidad de mano de obra y de materiales de construcción | Documental | | 0,53% | 0,25% | | | Programado | 0,53% | 2 | 0,26% | 0,26% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,25% | | 0,15% | 0,10% | | | | | | |

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Estudios socioeconómicos | Documental | | 0,53% | 0,35% | | | Programado | 0,53% | 2 | 0,26% | 0,26% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ejecutado | 0,35% | | 0,15% | 0,20% | | | | | | | | |
| Elaboración de los Diseños hidráulicos y estructurales y Análisis de alternativas | Elaboración de los Diseños hidráulicos y estructurales y Análisis de alternativas | Formulación y priorización de proyectos con resolución 0661 del 23 de septiembre de 2019 | Documental | 30,00% | 1,88% | 0,63% | 13,3% | 44,3% | Programado | 1,88% | 6 | | | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% |
| | | | | | | | | | Ejecutado | 0,63% | | | | | 0,63% | | | | | | |
| | | Definición del alcance de la intervención: Análisis de la capacidad limitante y necesidad de obras y acciones | Documental | | 1,88% | 0,63% | | | Programado | 1,88% | 6 | | | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% |
| | | | | | | | | | Ejecutado | 0,63% | | | | | 0,63% | | | | | | |
| | | Diseño hidráulico con software de dominio público | Memorias de calculo Planos | | 1,88% | 0,63% | | | Programado | 1,88% | 6 | | | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% |
| | | | | | | | | | Ejecutado | 0,63% | | | | | 0,63% | | | | | | |
| | | Diseño estructural, anexando archivos con sus respectivas memorias y en cumplimiento de la NSR 2010 | Memorias de calculo Planos | | 1,88% | 0,63% | | | Programado | 1,88% | 6 | | | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% |
| | | | | | | | | | Ejecutado | 0,63% | | | | | 0,63% | | | | | | |
| | | Formulación y análisis de alternativas | Documental | | 1,88% | 1,88% | | | Programado | 1,88% | 1 | | 1,88% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ejecutado | 1,88% | | | | 1,88% | | | | | | | |
| | | Comparación de alternativas y selección de alternativa viable | Documental | | 1,88% | 1,88% | | | Programado | 1,88% | 1 | | 1,88% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ejecutado | 1,88% | | | | 1,88% | | | | | | | |
| | | Diseños conceptuales correspondientes a la alternativa de solución recomendada | Documental | | 1,88% | 0,94% | | | Programado | 1,88% | 2 | | | 0,94% | 0,94% | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ejecutado | 0,94% | | | | 0,94% | | | | | | | |
| | | Investigación predial: Propiedades, derechos, predios, servidumbres y/o autorizaciones de paso requeridas | Documental | | 1,88% | 0,40% | | | Programado | 1,88% | 3 | | | 0,63% | 0,63% | 0,63% | | | | | |
| | | | | | | | | | Ejecutado | 0,40% | | | | 0,40% | | | | | | | |
| | | Aspectos ambientales requeridos | Documental | | 1,88% | 0,20% | | | Programado | 1,88% | 4 | | | 0,47% | 0,47% | 0,47% | 0,47% | | | | |
| | | | | | | | | | Ejecutado | 0,20% | | | | 0,20% | | | | | | | |
| | | Identificación permisos ambientales, autorizaciones o licencias requeridos | Documental | | 1,88% | 0,94% | | | Programado | 1,88% | 4 | | | 0,47% | 0,47% | 0,47% | 0,47% | | | | |
| | | | | | | | | | Ejecutado | 0,94% | | | | 0,20% | 0,74% | | | | | | |
| | | Elaboración del plan de obras | Documental | | 1,88% | 0,41% | | | Programado | 1,88% | 6 | | | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% |
| | | | | | | | | | Ejecutado | 0,41% | | | | 0,10% | 0,31% | | | | | | |
| | | Valoración (presupuesto) de las obras e inversiones estimadas requeridas | Documental | | 1,88% | 0,41% | | | Programado | 1,88% | 6 | | | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% |
| | | | | | | | | | Ejecutado | 0,41% | | | | 0,10% | 0,31% | | | | | | |
| | | Formulación del cronograma de implementación del proyecto | Documental | | 1,88% | 0,94% | | | Programado | 1,88% | 2 | | | 0,94% | 0,94% | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ejecutado | 0,94% | | | | 0,00% | 0,94% | | | | | | |
| | | Presentación, socialización y aprobación | Documental | | 1,88% | 0,94% | | | Programado | 1,88% | 2 | | | 0,94% | 0,94% | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ejecutado | 0,94% | | | | 0,00% | 0,94% | | | | | | |
| | | Diagnóstico organizacional de la empresa y/o junta administradora prestadora de servicios públicos | Documental | | 1,88% | 0,94% | | | Programado | 1,88% | 2 | | | 0,94% | 0,94% | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ejecutado | 0,94% | | | | 0,00% | 0,94% | | | | | | |
| | | Presentar informe y socializar con el supervisor y el representante del ente territorial, para la escogencia de la alternativa más viable técnica y económica | Documental | | 1,88% | 0,94% | | | Programado | 1,88% | 2 | | | 0,94% | 0,94% | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ejecutado | 0,94% | | | | 0,00% | 0,94% | | | | | | |
| Elaboración, Estructuración y radicación al MINITERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO de los diseños definitivos del sistema de acueducto | Elaboración, Estructuración y radicación al MINITERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO de los diseños definitivos del sistema de acueducto | Requisitos Técnicos | Documental | 30% | 6,00% | 0,00% | 0,0% | 0,0% | Programado | 6,00% | 4 | | | | | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| | | | | | | | | | Ejecutado | 0,00% | | | | | | | | | | | |
| | | Requisitos documentales para la presentación del proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Documental | | 6,00% | 0,00% | | | Programado | 6,00% | 4 | | | | | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| | | | | | | | | | Ejecutado | 0,00% | | | | | | | | | | | |
| | | Requisitos institucionales | Documental | | 6,00% | 0,00% | | | Programado | 6,00% | 4 | | | | | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| | | | | | | | | | Ejecutado | 0,00% | | | | | | | | | | | |
| | | Requisitos Financieros | Documental | | 6,00% | 0,00% | | | Programado | 6,00% | 4 | | | | | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| | | | | | | | | | Ejecutado | 0,00% | | | | | | | | | | | |
| | | Requisitos Ambientales | Documental | | 6,00% | 0,00% | | | Programado | 6,00% | 4 | | | | | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| | | | | | | | | | Ejecutado | 0,00% | | | | | | | | | | | |
| Proyecto Viabilizado y/o concepto técnico favorable por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Proyecto Viabilizado y/o concepto técnico favorable por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Documento de viabilización y/o concepto técnico favorable del proyecto por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Entrega de una copia del proyecto viabilizado a la entidad contratante en medio físico y magnético. | Concepto técnico favorable | 10,00% | 10,00% | 0,00% | 0,0% | 0,0% | Programado | 10,00% | 1 | | | | | | | | | | 10,00% |
| | | | | | | | | | Ejecutado | 0,00% | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | 100,0% | 100,0% | 35,30% | 35,30% | | Ejecutado Mensual | | | 7,54% | 8,64% | 11,50% | 7,61% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | | | | | | Programado Mesnual | | | 14,08% | 17,83% | 9,97% | 8,13% | 10,94% | 10,31% | 9,38% | 19,38% | | |

| | |
|---|---|
| FIRMA: |  |
| NOMBRE | JOHAN JAVIER OÑATE NUNEZ |
| CARGO: | REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTER ESTUDIOS |

| MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE AVANCE FÍSICO CONTRATO DE CONSULTORÍA No: 207 DE 2023<br>ACTUALIZACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | | | | | | | | | | CRONOGRAMA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO | COMPONENTE | PRODUCTOS | ACTIVIDADES | Fuente de Verificación | Ponderacion productos | Ponderación Actividades | SEGUIMIENTO | | | AVANCE (FECHA) | Σ | TIEMPO DE EJECUCION | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 |
| | | | | | | | Actividades | Producto | Avance por producto | | | | | | | | | | | |
| PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA. | Elaboración de Estudios Básicos del sistema de Acueducto y documento Diagnóstico preliminar | Censo o cuantificación de los usuarios del sistema de acueducto. | Elaborar y/o Cuantificar el número de usuarios | Documental | 30,00% | | N/A | 3,1% | 10,2% | Programado | 0,00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,00% | | | | | | | | | |
| | | Elaborar Diagnostico Base | Elaborar y realizar el estudio de Topografía | Informe de topografia Planos | | 10,00% | 0,0% | | | Programado | 10,00% | 2 | | 5,00% | 5,00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,00% | | | | | | | | | |
| | | | Elaboración de los Estudios de Suelos o de Geotecnia | Informe Estudio de Suelos | | 10,00% | 0,0% | | | Programado | 10,00% | 2 | | 5,00% | 5,00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,00% | | | | | | | | | |
| | | | Caracterización y trazabilidad del Agua cruda | Informe de Laboratorio | | | N/A | | | Programado | 0,00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,00% | | | | | | | | | |
| | | Compilación de la información Básica en un informe Diagnóstico Preliminar | Recolección, organización y análisis de la información | Documental | | 0,56% | 0,3% | | | Programado | 0,56% | 2 | 0,28% | 0,28% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,25% | | 0,10% | 0,15% | | | | | | |
| | | | Investigaciones de campo sobre la situación actual | Documental | | 0,56% | 0,3% | | | Programado | 0,56% | 2 | 0,28% | 0,28% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,25% | | 0,10% | 0,15% | | | | | | |
| | | | Diagnóstico detallado de la situación del sistema actual | Documental | | 0,56% | 0,4% | | | Programado | 0,56% | 3 | 0,19% | 0,19% | 0,19% | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,35% | | 0,00% | 0,15% | 0,20% | | | | | |
| | | | Determinación de la población afectada. | Documental | | 0,56% | 0,6% | | | Programado | 0,56% | 2 | 0,28% | 0,28% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,56% | | 0,00% | 0,15% | 0,41% | | | | | |
| | | | Proyecciones de la población con el censo al año 2022 y demanda de agua | Documental | | | N/A | | | Programado | 0,00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,00% | | | | | | | | | |
| | | | Características socio-culturales de la población y participación comunitaria | Documental | | 0,56% | 0,6% | | | Programado | 0,56% | 2 | 0,28% | 0,28% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,56% | | 0,10% | 0,15% | 0,31% | | | | | |
| | | | Cuantificación de la demanda y/o necesidades | Documental | | 0,56% | 0,3% | | | Programado | 0,56% | 2 | 0,28% | 0,28% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,25% | | 0,00% | 0,15% | 0,10% | | | | | |
| | | | Estudios básicos | Documental | | 0,56% | 0,3% | | | Programado | 0,56% | 2 | 0,28% | 0,28% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,30% | | 0,00% | 0,15% | 0,15% | | | | | |
| | | | Condiciones generales | Documental | | 0,56% | 0,6% | | | Programado | 0,56% | 2 | 0,28% | 0,28% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,56% | | 0,10% | 0,15% | 0,31% | | | | | |
| | | | Disponibilidad de agua y balance hídrico: Estudios hidrológicos y/o hidrogeológicos, estudio hidrometeoro lógico. análisis de calidad de agua y tratabilidad, etc. | Documental | | 0,56% | 0,0% | | | Programado | 0,56% | 2 | 0,28% | 0,28% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,00% | | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | | Geología, geomorfología, suelos y geotécnica: Estudio geológico, estudio de suelos y geotecnia | Documental | | 0,56% | 0,0% | | | Programado | 0,56% | 2 | 0,28% | 0,28% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,00% | | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | | Estudios fotogramétricos, topográficos y trabajos de campo | Documental | | 0,56% | 0,0% | | | Programado | 0,56% | 2 | 0,28% | 0,28% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,00% | | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | | Estudios ambientales | Documental | | 0,56% | 0,0% | | | Programado | 0,56% | 2 | 0,28% | 0,28% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,00% | | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | | Estudio de Análisis de vulnerabilidad y gestión del riesgo. Debe contener como mínimo: identificación y evaluación de amenazas, identificación de componentes del sistema, estimación del potencial de daños, categorización de la severidad de los daños potenciales estimados, procedimientos generales de atención de emergencias y procedimientos específicos para cada escenario de riesgo identificado | Documental | | 0,56% | 0,0% | | | Programado | 0,56% | 2 | 0,28% | 0,28% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,00% | | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | | Infraestructura existente de otros servicios | Documental | | 0,56% | 0,0% | | | Programado | 0,56% | 2 | 0,28% | 0,28% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,00% | | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | | Disponibilidad de energía eléctrica y de comunicaciones | Documental | | 0,56% | 0,0% | | | Programado | 0,56% | 2 | 0,28% | 0,28% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,00% | | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | | Vías de acceso | Documental | | 0,56% | 0,0% | | | Programado | 0,56% | 2 | 0,28% | 0,28% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,00% | | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | | Disponibilidad de mano de obra y de materiales de construcción | Documental | | 0,56% | 0,0% | | | Programado | 0,56% | 2 | 0,28% | 0,28% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,00% | | 0,00% | 0,00% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTUALIZACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO | | | Estudios socioeconómicos | Documental | | 0,56% | 0,0% | | | Programado | 0,56% | 2 | 0,28% | 0,28% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,00% | | 0,00% | 0,00% | | | | | | | |
| | Elaboración de los Diseños hidráulicos y estructurales y Análisis de alternativas | Elaboración de los Diseños hidráulicos y estructurales y Análisis de alternativas | Formulación y priorización de proyectos con resolución 0661 del 23 de septiembre de 2019 | Documental | 30,00% | 1,88% | 0,3% | 13,8% | 46,0% | Programado | 1,88% | 6 | | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,31% | | | | | 0,31% | | | | |
| | | | Definición del alcance de la intervención: Análisis de la capacidad limitante y necesidad de obras y acciones | Documental | | 1,88% | 0,3% | | | Programado | 1,88% | 6 | | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,31% | | | | | 0,31% | | | | |
| | | | Diseño hidráulico con software de dominio público | Memorias de calculo Planos | | 1,88% | 0,3% | | | Programado | 1,88% | 6 | | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,31% | | | | | 0,31% | | | | |
| | | | Diseño estructural, anexando archivos con sus respectivas memorias y en cumplimiento de la NSR 2010 | Memorias de calculo Planos | | 1,88% | 0,3% | | | Programado | 1,88% | 6 | | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,31% | | | | | 0,31% | | | | |
| | | | Formulación y análisis de alternativas | Documental | | 1,88% | 0,9% | | | Programado | 1,88% | 2 | | | 0,94% | 0,94% | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,94% | | | | | 0,94% | | | | |
| | | | Comparación de alternativas y selección de alternativa viable | Documental | | 1,88% | 1,9% | | | Programado | 1,88% | 1 | | | | 1,88% | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 1,88% | | | | | 1,88% | | | | |
| | | | Diseños conceptuales correspondientes a la alternativa de solución recomendada | Documental | | 1,88% | 1,9% | | | Programado | 1,88% | 2 | | | 0,94% | 0,94% | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 1,88% | | | | | 1,88% | | | | |
| | | | Investigación predial: Propiedades, derechos, predios, servidumbres y/o autorizaciones de paso requeridas | Documental | | 1,88% | 0,9% | | | Programado | 1,88% | 4 | | | 0,47% | 0,47% | 0,47% | 0,47% | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,94% | | | | | 0,94% | | | | |
| | | | Aspectos ambientales requeridos | Documental | | 1,88% | 0,8% | | | Programado | 1,88% | 5 | | | 0,38% | 0,38% | 0,38% | 0,38% | 0,38% | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,75% | | | | | 0,75% | | | | |
| | | | Identificación permisos ambientales, autorizaciones o licencias requeridos | Documental | | 1,88% | 0,8% | | | Programado | 1,88% | 7 | | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,80% | | | | | 0,80% | | | | |
| | | | Elaboración del plan de obras | Documental | | 1,88% | 0,8% | | | Programado | 1,88% | 7 | | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,80% | | | | | 0,80% | | | | |
| | | | Valoración (presupuesto) de las obras e inversiones estimadas requeridas | Documental | | 1,88% | 0,8% | | | Programado | 1,88% | 7 | | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,80% | | | | | 0,80% | | | | |
| | | | Formulación del cronograma de implementación del proyecto | Documental | | 1,88% | 0,9% | | | Programado | 1,88% | 2 | | | | 0,94% | 0,94% | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,94% | | | | | 0,94% | | | | |
| | | | Presentación, socialización y aprobación | Documental | | 1,88% | 0,9% | | | Programado | 1,88% | 2 | | | | 0,94% | 0,94% | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,94% | | | | | 0,94% | | | | |
| | | | Diagnóstico organizacional de la empresa y/o junta administradora prestadora de servicios públicos | Documental | | 1,88% | 0,9% | | | Programado | 1,88% | 2 | | | | 0,94% | 0,94% | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,94% | | | | | 0,94% | | | | |
| | | | Presentar informe y socializar con el supervisor y el representante del ente territorial, para la escogencia de la alternativa más viable técnica y económica | Documental | | 1,88% | 0,9% | | | Programado | 1,88% | 2 | | | | 0,94% | 0,94% | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,94% | | | | | 0,94% | | | | |
| | Elaboración, Estructuración y radicación al MINITERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO de los diseños definitivos del sistema de acueducto | Elaboración, Estructuración y radicación al MINITERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO de los diseños definitivos del sistema de acueducto | Requisitos Técnicos | Documental | 30% | 6,00% | 0,00% | 0,0% | 0,0% | Programado | 6,00% | 4 | | | | | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,00% | | | | | | | | | |
| | | | Requisitos documentales para la presentación del proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Documental | | 6,00% | 0,00% | | | Programado | 6,00% | 4 | | | | | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,00% | | | | | | | | | |
| | | | Requisitos institucionales | Documental | | 6,00% | 0,00% | | | Programado | 6,00% | 4 | | | | | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,00% | | | | | | | | | |
| | | | Requisitos Financieros | Documental | | 6,00% | 0,00% | | | Programado | 6,00% | 4 | | | | | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,00% | | | | | | | | | |
| | | | Requisitos Ambientales | Documental | | 6,00% | 0,00% | | | Programado | 6,00% | 4 | | | | | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,00% | | | | | | | | | |
| | Proyecto Viabilizado y/o concepto técnico favorable por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Proyecto Viabilizado y/o concepto técnico favorable por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Documento de viabilización y/o concepto técnico favorable del proyecto por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Entrega de una copia del proyecto viabilizado a la entidad contratante en medio físico y magnético. | Concepto técnico favorable | 10,00% | 10,00% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | Programado | 10,00% | 1 | | | | | | | | 10,00% |
| | | | | | | | | | | Ejecutado | 0,00% | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | 100,0% | 100,0% | 16,86% | 16,86% | | Ejecutado Mensual | | | 0,40% | 1,20% | 1,47% | 13,79% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | | | | | | Programado Mesnual | | | 4,91% | 16,96% | 14,96% | 10,40% | 14,15% | 10,40% | 9,93% | 18,30% |

| | |
|---|---|
| FIRMA: |  |
| NOMBRE | JOHAN JAVIER OÑATE NUNEZ |
| CARGO: | REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTER ESTUDIOS |

# SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA No 207 DE 2023

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 901783166 | 1 | CONSORCIO INGEFIP 2024 | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CONSORCIOINGEFIP | CALLE 44 N 18 C 03 | NEIVA-HUILA | 8716535 | Si |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-08 | 2024-09 | 9473139765 | 9473139765 | E | 2024/09/16 | 2024/09/12 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $812,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 1031140905 | GARAVITO JESUS | 25-14 | 6 | $260,000 | $41,600 | EPS037 | 6 | $260,000 | $10,400 | CCF32 | 6 | $260,000 | $10,400 | 14-11 | 6 | $260,000 | $1,400 | 6 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 12113195 | ORTIZ GUILLERMO | | 0 | $0 | $0 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF32 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 80222461 | OTERO DIEGO | 230201 | 12 | $520,000 | $83,200 | EPS001 | 12 | $520,000 | $20,800 | CCF32 | 12 | $520,000 | $20,800 | 14-11 | 12 | $520,000 | $2,800 | 12 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 7697850 | PEÑA FERNANDO | 25-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF32 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 7715701 | SANCHEZ MANUEL | 25-14 | 18 | $780,000 | $124,800 | EPS017 | 18 | $780,000 | $31,200 | CCF32 | 18 | $780,000 | $31,200 | 14-11 | 18 | $780,000 | $4,100 | 18 | $0 | $0 |
| **Total** | | | **Afiliados( 5)** | | | $2,860,000 | $457,600 | | | $4,160,000 | $166,400 | | | $4,160,000 | $166,400 | | | $4,160,000 | $21,900 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 4 | $457,600 | $0 | $0 | $457,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $374,400 | $0 | $0 | $374,400 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $83,200 | $0 | $0 | $83,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $21,900 | $0 | $0 | $21,900 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 5 | $21,900 | $0 | $0 | $21,900 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $166,400 | $0 | $0 | $166,400 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 5 | $166,400 | $0 | $0 | $166,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 5 | $166,400 | $0 | $0 | $166,400 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | $20,800 | $0 | $0 | $20,800 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $31,200 | $0 | $0 | $31,200 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $62,400 | $0 | $0 | $62,400 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $52,000 | $0 | $0 | $52,000 |
| TOTAL | | | | 5 | $812,300 | $0 | $0 | $812,300 |



2024/09/12 03:08 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901783166 | 1 | CONSORCIO INGEFIP 2024 | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CONSORCIOINGEFIP | CALLE 44 N 18 C 03 | NEIVA-HUILA | 8716535 | SI |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-07 | 2024-08 | 1000000939 | 9471341646 | E | 2024/08/16 | 2024/08/21 | BANCO DE BOGOTA | 5 | $815,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 1031140905 | GARAVITO JESUS | 25-14 | 6 | $260,000 | $41,600 | EPS037 | 6 | $260,000 | $10,400 | CCF32 | 6 | $260,000 | $10,400 | 14-11 | 6 | $260,000 | $1,400 | 6 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 12113195 | ORTIZ GUILLERMO | | 0 | $0 | $0 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF32 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 80222461 | OTERO DIEGO | 230201 | 12 | $520,000 | $83,200 | EPS001 | 12 | $520,000 | $20,800 | CCF32 | 12 | $520,000 | $20,800 | 14-11 | 12 | $520,000 | $2,800 | 12 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 7697850 | PEÑA FERNANDO | 25-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF32 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 7715701 | SANCHEZ MANUEL | 25-14 | 18 | $780,000 | $124,800 | EPS017 | 18 | $780,000 | $31,200 | CCF32 | 18 | $780,000 | $31,200 | 14-11 | 18 | $780,000 | $4,100 | 18 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 5)** | | | | | $2,860,000 | $457,600 | | | $4,160,000 | $166,400 | | | $4,160,000 | $166,400 | | | $4,160,000 | $21,900 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 4 | $457,600 | $1,800 | $0 | $459,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $374,400 | $1,400 | $0 | $375,800 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $83,200 | $400 | $0 | $83,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $21,900 | $100 | $0 | $22,000 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 5 | $21,900 | $100 | $0 | $22,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $166,400 | $700 | $0 | $167,100 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 5 | $166,400 | $700 | $0 | $167,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 5 | $166,400 | $800 | $0 | $167,200 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | $20,800 | $100 | $0 | $20,900 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $31,200 | $200 | $0 | $31,400 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $62,400 | $300 | $0 | $62,700 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $52,000 | $200 | $0 | $52,200 |
| TOTAL | | | | 5 | $812,300 | $3,400 | $0 | $815,700 |

aportes en línea

# Resumen Gene de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901783166 | 1 | CONSORCIO INGEFIP 2024 | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CONSORCIOINGEFIP | CALLE 44 N 18 C 03 | NEIVA-HUILA | 8716535 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-06 | 2024-07 | 9470008527 | 9470008527 | E | 2024/07/16 | 2024/07/22 | BANCO DE BOGOTA | 6 | $816,200 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 1031140905 | GARAVITO JESUS | 25-14 | 6 | $260,000 | $41,600 | EPS037 | 6 | $260,000 | $10,400 | CCF32 | 6 | $260,000 | $10,400 | 14-11 | 6 | $260,000 | $1,400 | 6 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 12113195 | ORTIZ GUILLERMO | | 0 | $0 | $0 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF32 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 80222461 | OTERO DIEGO | 230201 | 12 | $520,000 | $83,200 | EPS001 | 12 | $520,000 | $20,800 | CCF32 | 12 | $520,000 | $20,800 | 14-11 | 12 | $520,000 | $2,800 | 12 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 7697850 | PEÑA FERNANDO | 25-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF32 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 7715701 | SANCHEZ MANUEL | 25-14 | 18 | $780,000 | $124,800 | EPS017 | 18 | $780,000 | $31,200 | CCF32 | 18 | $780,000 | $31,200 | 14-11 | 18 | $780,000 | $4,100 | 18 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 5)** | | | | | $2,860,000 | $457,600 | | | $4,160,000 | $166,400 | | | $4,160,000 | $166,400 | | | $4,160,000 | $21,900 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 4 | $457,600 | $2,100 | $0 | $459,700 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $374,400 | $1,700 | $0 | $376,100 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $83,200 | $400 | $0 | $83,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $21,900 | $100 | $0 | $22,000 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 5 | $21,900 | $100 | $0 | $22,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $166,400 | $800 | $0 | $167,200 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 5 | $166,400 | $800 | $0 | $167,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 5 | $166,400 | $900 | $0 | $167,300 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | $20,800 | $100 | $0 | $20,900 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $31,200 | $200 | $0 | $31,400 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $62,400 | $300 | $0 | $62,700 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $52,000 | $300 | $0 | $52,300 |
| TOTAL | | | | 5 | $812,300 | $3,900 | $0 | $816,200 |



2024/07/22 05:08 PM

aportes en línea

# Resumen Gene de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901783166 | 1 | CONSORCIO INGEFIP 2024 | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CONSORCIOINGEFIP | CALLE 44 N 18 C 03 | NEIVA-HUILA | 8716535 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-05 | 2024-06 | 9470008410 | 9470008410 | E | 2024/06/19 | 2024/07/22 | BANCO DE BOGOTA | 33 | $833,100 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 1031140905 | GARAVITO JESUS | 25-14 | 6 | $260,000 | $41,600 | EPS037 | 6 | $260,000 | $10,400 | CCF32 | 6 | $260,000 | $10,400 | 14-11 | 6 | $260,000 | $1,400 | 6 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 12113195 | ORTIZ GUILLERMO | | 0 | $0 | $0 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF32 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 80222461 | OTERO DIEGO | 230201 | 12 | $520,000 | $83,200 | EPS001 | 12 | $520,000 | $20,800 | CCF32 | 12 | $520,000 | $20,800 | 14-11 | 12 | $520,000 | $2,800 | 12 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 7697850 | PEÑA FERNANDO | 25-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF32 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 7715701 | SANCHEZ MANUEL | 25-14 | 18 | $780,000 | $124,800 | EPS017 | 18 | $780,000 | $31,200 | CCF32 | 18 | $780,000 | $31,200 | 14-11 | 18 | $780,000 | $4,100 | 18 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 5)** | | | | | $2,860,000 | $457,600 | | | $4,160,000 | $166,400 | | | $4,160,000 | $166,400 | | | $4,160,000 | $21,900 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 4 | $457,600 | $11,600 | $0 | $469,200 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $374,400 | $9,500 | $0 | $383,900 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $83,200 | $2,100 | $0 | $85,300 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $21,900 | $600 | $0 | $22,500 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 5 | $21,900 | $600 | $0 | $22,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $166,400 | $4,200 | $0 | $170,600 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 5 | $166,400 | $4,200 | $0 | $170,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 5 | $166,400 | $4,400 | $0 | $170,800 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | $20,800 | $600 | $0 | $21,400 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $31,200 | $800 | $0 | $32,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $62,400 | $1,600 | $0 | $64,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $52,000 | $1,400 | $0 | $53,400 |
| TOTAL | | | | 5 | $812,300 | $20,800 | $0 | $833,100 |



2024/07/22 05:08 PM

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901533692 |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL: | | | SOLUCIONES DE INGENIERIA GENERAL SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | NEIVA | DEPARTAMENTO: | HUILA |
| DIRECCIÓN: | CALLE 17C #49--06 | TELÉFONO: | 8529216 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Construcción de otras obras de ingeniería civil. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA). | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 4581280650 | TIPO DE PLANILLA: | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACION OTROS | MES | junio AÑO | 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES julio AÑO 2024 |
| DÍAS DE MORA: | | | 3 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2024/07/26 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 9099447157 |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 104.000 | $ 0 | $ 300 | $ 0 | $ 104.000 | $ 300 | $ 0 | $ 104.300 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 104.000 | $ 300 | $ 0 | $ 104.300 |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 2 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 13.600 | $ 13.600 | $ 100 | $ 0 | $ 13.700 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 13.600 | $ 100 | $ 0 | $ 13.700 |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF32 | CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA | 2 | $ 104.000 | $ 300 | $ 104.300 |
| SUBTOTALES: | | | $ 104.000 | $ 300 | $ 104.300 |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1075247872 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | ROBERTO CASTAÑEDA PARDO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | NEIVA | DEPARTAMENTO: | HUILA |
| DIRECCIÓN: | CALLE 5 NO. 11-08 | TELÉFONO: | 1111111 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONÓMICA: | Actividades reguladoras y facilitadores de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | ND |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | 79379255 35 | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES agosto AÑO 2024 | | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES agosto AÑO | 2024 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2024/08/27 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 669890361 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230201 | 230201-PROTECCION | 1 | $ 208,000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 208,000 | $ 0 | $ 208,000 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | $ 208,000 | $ 0 | $ 208,000 |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 162,500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 162,500 | $ 0 | $ 0 | $ 162,500 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 162,500 | $ 0 | $ 0 | $ 162,500 |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 6,800 | $ 6,800 | $ 0 | $ 0 | $ 6,800 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 6,800 | $ 0 | $ 0 | $ 6,800 |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | CCF | | SENA | | ICBF | | ESAP | | MINEDU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMIN | DÍAS COT. | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT. | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT. | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT. | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1075247872 | CASTAÑEDA PARDO RUBENIO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1,300,000 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 1,300,000 | $ 208,000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208,000 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1,300,000 | $ 162,500 | $ 0 | $ 162,500 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1,300,000 | 1075247872 | $ 6,800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 377,300 |
|---|---|

Planilla Pagada

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1075247872 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | ROBERTO CASTAÑEDA PARDO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | NEIVA | DEPARTAMENTO: | HUILA |
| DIRECCIÓN: | CALLE 5 NO. 11-08 | TELEFONO: | 1111111 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 7934516653 | TIPO DE PLANILLA: | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | Julio AÑO | 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES Julio AÑO 2024 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2024/08/12 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 839681516 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 1 | $ 206.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 206.000 | $ 0 | $ 206.000 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | $ 206.000 | $ 0 | $ 206.000 |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 162.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 162.500 | $ 0 | $ 0 | $ 162.500 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 162.500 | $ 0 | $ 0 | $ 162.500 |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | $ 8.800 | $ 8.800 | $ 0 | $ 0 | $ 8.800 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | $ 8.800 | $ 0 | $ 0 | $ 8.800 |

### LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | IDENTIFICACION | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | RESIDENTA FISCAL | SLN | IGE | LMA | VAC | VSP | VST | SLN | COM | PRE | LMA | VAC | AVP | VCT | UPC | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | | | | | ARP | | | | | | | CCF | | SENA | | ICBF | | ESAP | | MINEDU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACION | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1075247872 | CASTAÑEDA PARDO ROBERTO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.300.000 | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | 1.300.000 | $ 206.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 206.000 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | 1.300.000 | $ 162.500 | $ 0 | $ 162.500 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | 1.300.000 | 1075247872 | $ 8.800 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 377,300 |
|---|---|

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACION: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1075247572 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | ROBERTO CASTANEDA PARDO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | NEIVA | DEPARTAMENTO: | HUILA |
| DIRECCIÓN: | CALLE 5 NO. 11-08 | TELÉFONO: | 1111111 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 7931435341 | TIPO DE PLANILLA: | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | Junio AÑO | 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES Junio AÑO 2024 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2024/07/16 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 780144886 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 1 | $ 206,000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 206,000 | $ 0 | $ 206,000 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | $ 206,000 | $ 0 | $ 206,000 |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 162,500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 162,500 | $ 0 | $ 0 | $ 162,500 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 162,500 | $ 0 | $ 0 | $ 162,500 |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 6,800 | $ 6,800 | $ 0 | $ 0 | $ 6,800 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 6,800 | $ 0 | $ 0 | $ 6,800 |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | |
| N° | IDENTIFICACION | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1075247572 | CASTANEDA PARDO ROBERTO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS | | $ 1,300,000 | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | 1,300,000 | $ 206,000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 206,000 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1,300,000 | $ 162,500 | $ 0 | $ 162,500 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1,300,000 | 107624787 | $ 6,800 | 5 | $ 1,300,000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 377,300 |
|---|---|

Planilla Pagada

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1075247872 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | ROBERTO CASTANEDA PARDO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | NEIVA | DEPARTAMENTO: | HUILA |
| DIRECCIÓN: | CALLE 5 NO. 11-06 | TELÉFONO: | 1111111 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 79271746007 | TIPO DE PLANILLA: | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES mayo AÑO 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES mayo AÑO 2024 |
| DÍAS DE MORA: | 1 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2024/06/21 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 72101 0245 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230201 | 230201-PROTECCION | 1 | $ 208,000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 200 | $ 0 | $ 208,000 | $ 200 | $ 208,200 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | $ 208,000 | $ 200 | $ 208,200 |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 162,500 | $ 0 | $ 200 | $ 0 | $ 162,500 | $ 200 | $ 0 | $ 162,700 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 162,500 | $ 200 | $ 0 | $ 162,700 |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 6,800 | $ 6,800 | $ 100 | $ 0 | $ 6,900 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 6,800 | $ 100 | $ 0 | $ 6,900 |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | | | ARP | | | | | | | | | | CCF | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU | |
| Nº | IDENTIFICACION | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | IGE | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | FP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1075247872 | CASTANEDA PARDO ROBERTO | DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1,300,000 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 1,300,000 | $ 208,000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Norma | $ 208,000 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1,300,000 | $ 162,500 | $ 0 | $ 162,500 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 30 | $ 1,300,000 | 1075247872 | $ 6,800 | 30 | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 377,600 |
|---|---|

Planilla pagada

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901784824 | 4 | CONSORCIO INTER ESTUDIOS | A - 200 O MAS COTIZANTES | 01 | CL 24 No 5Bis 37 | NEIVA-HUILA | 8645033 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-08 | 2024-09 | 9473139935 | 9473139935 | E | 2024/09/06 | 2024/09/12 | BANCO DE BOGOTA | 6 | $386,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 1077860558 | DONOSO JOSE | 231001 | 6 | $400,000 | $64,000 | EPS002 | 6 | $400,000 | $16,000 | CCF32 | 6 | $400,000 | $16,000 | 14-11 | 6 | $400,000 | $2,100 | 6 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 7720885 | SOTO JAIME | 25-14 | 5 | $466,667 | $74,700 | EPS005 | 5 | $466,667 | $18,700 | CCF32 | 5 | $466,667 | $18,700 | 14-11 | 5 | $466,667 | $2,500 | 5 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 7713864 | VALDERRAMA ALBERTO | 25-14 | 6 | $700,000 | $112,000 | EPS005 | 6 | $700,000 | $28,000 | CCF32 | 6 | $700,000 | $28,000 | 14-11 | 6 | $700,000 | $3,700 | 6 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 3)** | | | | | $1,566,667 | $250,700 | | | $1,566,667 | $62,700 | | | $1,566,667 | $62,700 | | | $1,566,667 | $8,300 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $250,700 | $1,200 | $0 | $251,900 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $64,000 | $300 | $0 | $64,300 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | $186,700 | $900 | $0 | $187,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $8,300 | $100 | $0 | $8,400 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 3 | $8,300 | $100 | $0 | $8,400 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $62,700 | $300 | $0 | $63,000 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 3 | $62,700 | $300 | $0 | $63,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $62,700 | $400 | $0 | $63,100 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $16,000 | $100 | $0 | $16,100 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $46,700 | $300 | $0 | $47,000 |
| TOTAL | | | | 3 | $384,400 | $2,000 | $0 | $386,400 |



2024/09/12 03:04 PM

# SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 215 DE 2023

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901784824 | 4 | CONSORCIO INTER ESTUDIOS | A - 200 O MAS COTIZANTES | 01 | CL 24 No 5Bis 37 | NEIVA-HUILA | 8645033 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-05 | 2024-06 | 20240709104630428084 | 9469655964 | E | 2024/06/11 | 2024/07/09 | BANCO AV VILLAS | 28 | $369,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 1077860558 | DONOSO JOSE | 231001 | 6 | $400,000 | $64,000 | EPS002 | 6 | $400,000 | $16,000 | CCF32 | 6 | $400,000 | $16,000 | 14-11 | 6 | $400,000 | $2,100 | 6 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 7720885 | SOTO JAIME | 25-14 | 4 | $373,334 | $59,800 | EPS005 | 4 | $373,334 | $15,000 | CCF32 | 4 | $373,334 | $15,000 | 14-11 | 4 | $373,334 | $2,000 | 4 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 7713864 | VALDERRAMA ALBERTO | 25-14 | 6 | $700,000 | $112,000 | EPS005 | 6 | $700,000 | $28,000 | CCF32 | 6 | $700,000 | $28,000 | 14-11 | 6 | $700,000 | $3,700 | 6 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 3)** | | | | | **$1,473,334** | **$235,800** | | | **$1,473,334** | **$59,000** | | | **$1,473,334** | **$59,000** | | | **$1,473,334** | **$7,800** | | **$0** | **$0** |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $235,800 | $5,200 | $0 | $241,000 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $64,000 | $1,400 | $0 | $65,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | $171,800 | $3,800 | $0 | $175,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $7,800 | $200 | $0 | $8,000 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 3 | $7,800 | $200 | $0 | $8,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $59,000 | $1,300 | $0 | $60,300 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 3 | $59,000 | $1,300 | $0 | $60,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $59,000 | $1,400 | $0 | $60,400 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $16,000 | $400 | $0 | $16,400 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $43,000 | $1,000 | $0 | $44,000 |
| **TOTAL** | | | | **3** | **$361,600** | **$8,100** | **$0** | **$369,700** |



2024/07/16 03:43 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 7722019 | | OÑATE NUÑEZ JOHAN JAVIER | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CAlle 25 # 46 - 94 | NEIVA-HUILA | 8772855 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-05 | 2024-05 | 685255562 | 9467418329 | I | 2024/06/07 | 2024/06/05 | BANCOLOMBIA | 0 | $749,200 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | $2,000,000 | $320,000 | | | $2,000,000 | $250,000 | | | $2,000,000 | $40,000 | | | $2,000,000 | $139,200 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: RIESGO 6 ( 1 Afiliados)** | | | | | $2,000,000 | $320,000 | | | $2,000,000 | $250,000 | | | $2,000,000 | $40,000 | | | $2,000,000 | $139,200 | | $0 | $0 |
| Ciudad: NEIVA Depto: HUILA ( 1 Afiliados) | | | | | $2,000,000 | $320,000 | | | $2,000,000 | $250,000 | | | $2,000,000 | $40,000 | | | $2,000,000 | $139,200 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 7722019 | OÑATE JOHAN | 231001 | 30 | $2,000,000 | $320,000 | EPS005 | 30 | $2,000,000 | $250,000 | CCF32 | 30 | $2,000,000 | $40,000 | 14-23 | 30 | $2,000,000 | $139,200 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | | $2,000,000 | $320,000 | | | $2,000,000 | $250,000 | | | $2,000,000 | $40,000 | | | $2,000,000 | $139,200 | | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 7722019 | | OÑATE NUÑEZ JOHAN JAVIER | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Calle 25 # 46 - 94 | NEIVA-HUILA | 8772855 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-05 | 2024-05 | 685255562 | 9467418329 | I | 2024/06/07 | 2024/06/05 | BANCOLOMBIA | 0 | $749,200 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $320,000 | $0 | $0 | $320,000 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $320,000 | $0 | $0 | $320,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $139,200 | $0 | $0 | $139,200 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $139,200 | $0 | $0 | $139,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $40,000 | $0 | $0 | $40,000 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 1 | $40,000 | $0 | $0 | $40,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $250,000 | $0 | $0 | $250,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $250,000 | $0 | $0 | $250,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $749,200 | $0 | $0 | $749,200 |

# PLANILLA NRO. 30183675 Tipo E 2024 05

ASOPAGOS

## DATOS GENERALES

| TIPO | NÚMERO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | TIPO PRESENTACIÓN | SUCURSAL / DEPENDENCIA | CÓDIGO | PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | NÚMERO PLANILLA | REFERENCIA DE PAGO (PIN) | TIPO EMPRESA | CLASE APORTANTE | CÓDIGO ARL | CÓDIGO OPERADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI | 900300791 | EGATEC SAS | ÚNICO | 0 | 0 | 2024-05 | 2024-06 | 30183675 | | PRIVADA | B | 14-11 | 86 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD / MUNICIPIO | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CÓDIGO | TELÉFONO | FAX | CORREO ELECTRÓNICO | ACTIVIDAD ECONÓMICA | VALOR NÓMINA | TOTAL EMPLEADOS | FECHA DE PAGO | FECHA LIMITE DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRERA 42 NO 18 A 08 T A 503 | NEIVA | 1 | HUILA | 41 | 0770803 | 8775686 | EGATEC.SAS@HOTMAIL.COM | 4290 | 10675440 | 8 | 2024-06-17 | 2024-06-25 |

## TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

| CÓD / NOMBRE EPS | NIT EPS | COT OBLIGATORIA | UPC ADICIONAL | # AUT INC | VALOR INC | # AUT LIC | VALOR LIC | NETO COT | DÍAS MORA | INTERESES | INTERESES UPC | SUBTOTAL COT | SUBTOTAL UPC | NÚM RAD ANTERIOR | SALDO A FAVOR | SALDO A FAVOR UPC | TOTAL PAGAR | NÚM AFILIADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS037 | 900156264 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216000 | 4 |
| EPS005 | 800251440 | 211100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211100 | 0 | 0 | 0 | 211100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211100 | 4 |

## TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

| CÓD / NOMBRE AFP | NIT AFP | COT OBLIGATORIA | COT VOL AF | COT VOL AP | FONDO SOL | DÍAS MORA | INTERESES | INTERESES FONDO SOL | TOTAL PAGAR | NÚM AFILIADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | 800224808 | 624000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624000 | 3 |
| 25-14 | 900336004 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 1 |
| 230201 | 800229739 | 428100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428100 | 2 |
| SINAFP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 231001 | 800227940 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208000 | 1 |

## TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

| CÓD / NOMBRE ARL | NIT ARL | COT OBLIGATORIA | # AUT INC | VALOR INC | OTROS RIESGOS | NETO COT | DÍAS MORA | INTERESES | SUBTOTAL APORTES | NÚM RAD ANTERIOR | SALDO FAVOR | FONDO SOL | TOTAL PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-11 | 890903790 | 395600 | 0 | 0 | 0 | 395600 | 0 | 0 | 395600 | 0 | 0 | 0 | 395600 |

## TOTAL APORTES A ESAP

| VALOR | DÍAS MORA | INTERESES | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

## TOTAL APORTES A MINISTERIO

| VALOR | DÍAS MORA | INTERESES | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

## TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

| CÓD / NOMBRE CCF | NIT CCF | VALOR APORTE | DÍAS MORA | INTERESES | TOTAL PAGAR | NÚM AFILIADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF32 | 891180008 | 427100 | 0 | 0 | 427100 | 8 |

## TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

### ICBF

| VALOR | DÍAS MORA | INTERESES | TOTAL PAGAR | NÚM AFILIADOS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### SENA

| VALOR | DÍAS MORA | INTERESES | TOTAL PAGAR | NÚM AFILIADOS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## NÚMERO ADMINISTRADORAS

| | |
|---|---|
| PENSIONES | 4 |
| SALUD | 2 |
| RIESGOS LABORALES | 1 |
| CAJAS COMPENSACIÓN | 1 |

## TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA

| | |
|---|---|
| PENSIONES | 1500100 |
| SALUD | 427100 |
| RIESGOS LABORALES | 395600 |
| CAJAS COMPENSACIÓN | 427100 |
| SENA | 0 |
| ICBF | 0 |
| ESAP | 0 |
| MINISTERIO | 0 |
| GRAN TOTAL | 2749900 |

PAGADO

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 33750448 | | FERNANDEZ FIGUEROA ERIKA JOHANNA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Carrera 23 A # 19 A - 03 | NEIVA-HUILA | 8706308 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-05 | 2024-05 | 713200901 | 9467707627 | I | 2024/06/14 | 2024/06/18 | BANCOLOMBIA | 4 | $378,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 33750448 | FERNANDEZ ERIKA | 231001 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $162,500 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | $6,800 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $208,000 | $700 | $0 | $208,700 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $208,000 | $700 | $0 | $208,700 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $6,800 | $100 | $0 | $6,900 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $6,800 | $100 | $0 | $6,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $162,500 | $600 | $0 | $163,100 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $162,500 | $600 | $0 | $163,100 |
| TOTAL | | | | 1 | $377,300 | $1,400 | $0 | $378,700 |



2024/06/18 10:21 AM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901784824 | 4 | CONSORCIO INTER ESTUDIOS | A - 200 O MAS COTIZANTES | 01 | CL 24 No 5Bis 37 | NEIVA-HUILA | 8645033 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-07 | 2024-08 | 20240816163647428291 | 9471341457 | E | 2024/08/08 | 2024/08/20 | BANCO AV VILLAS | 12 | $365,100 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 1077860558 | DONOSO JOSE | 231001 | 6 | $400,000 | $64,000 | EPS002 | 6 | $400,000 | $16,000 | CCF32 | 6 | $400,000 | $16,000 | 14-11 | 6 | $400,000 | $2,100 | 6 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 7720885 | SOTO JAIME | 25-14 | 4 | $373,334 | $59,800 | EPS005 | 4 | $373,334 | $15,000 | CCF32 | 4 | $373,334 | $15,000 | 14-11 | 4 | $373,334 | $2,000 | 4 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 7713864 | VALDERRAMA ALBERTO | 25-14 | 6 | $700,000 | $112,000 | EPS005 | 6 | $700,000 | $28,000 | CCF32 | 6 | $700,000 | $28,000 | 14-11 | 6 | $700,000 | $3,700 | 6 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 3)** | | | | | $1,473,334 | $235,800 | | | $1,473,334 | $59,000 | | | $1,473,334 | $59,000 | | | $1,473,334 | $7,800 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $235,800 | $2,200 | $0 | $238,000 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $64,000 | $600 | $0 | $64,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | $171,800 | $1,600 | $0 | $173,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $7,800 | $100 | $0 | $7,900 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 3 | $7,800 | $100 | $0 | $7,900 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $59,000 | $600 | $0 | $59,600 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 3 | $59,000 | $600 | $0 | $59,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $59,000 | $600 | $0 | $59,600 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $16,000 | $200 | $0 | $16,200 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $43,000 | $400 | $0 | $43,400 |
| TOTAL | | | | 3 | $361,600 | $3,500 | $0 | $365,100 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 7722019 | | OÑATE NUÑEZ JOHAN JAVIER | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CAlle 25 # 46 - 94 | NEIVA-HUILA | 8772855 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-07 | 2024-07 | 825173992 | 9470177674 | I | 2024/08/06 | 2024/08/05 | BANCOLOMBIA | 0 | $749,200 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | $2,000,000 | $320,000 | | | $2,000,000 | $250,000 | | | $2,000,000 | $40,000 | | | $2,000,000 | $139,200 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: RIESGO 6 ( 1 Afiliados)** | | | | | $2,000,000 | $320,000 | | | $2,000,000 | $250,000 | | | $2,000,000 | $40,000 | | | $2,000,000 | $139,200 | | $0 | $0 |
| Ciudad: NEIVA Depto: HUILA ( 1 Afiliados) | | | | | $2,000,000 | $320,000 | | | $2,000,000 | $250,000 | | | $2,000,000 | $40,000 | | | $2,000,000 | $139,200 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 7722019 | OÑATE JOHAN | 231001 | 30 | $2,000,000 | $320,000 | EPS005 | 30 | $2,000,000 | $250,000 | CCF32 | 30 | $2,000,000 | $40,000 | 14-23 | 30 | $2,000,000 | $139,200 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | $2,000,000 | $320,000 | | | $2,000,000 | $250,000 | | | $2,000,000 | $40,000 | | | $2,000,000 | $139,200 | | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 7722019 | | OÑATE NUÑEZ JOHAN JAVIER | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Calle 25 # 46 - 94 | NEIVA-HUILA | 8772855 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-07 | 2024-07 | 825173992 | 9470177674 | I | 2024/08/06 | 2024/08/05 | BANCOLOMBIA | 0 | $749,200 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $320,000 | $0 | $0 | $320,000 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $320,000 | $0 | $0 | $320,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $139,200 | $0 | $0 | $139,200 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $139,200 | $0 | $0 | $139,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $40,000 | $0 | $0 | $40,000 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 1 | $40,000 | $0 | $0 | $40,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $250,000 | $0 | $0 | $250,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $250,000 | $0 | $0 | $250,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $749,200 | $0 | $0 | $749,200 |

# PLANILLA NRO. 30760855 Tipo E 2024 07

ASOPAGOS

## DATOS GENERALES

| TIPO | NÚMERO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | TIPO PRESENTACIÓN | SUCURSAL / DEPENDENCIA | CÓDIGO | PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | NÚMERO PLANILLA | REFERENCIA DE PAGO (PIN) | TIPO EMPRESA | CLASE APORTANTE | CÓDIGO ARL | CÓDIGO OPERADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI | 900300791 | EGATEC SAS | ÚNICO | 0 | 0 | 2024-07 | 2024-08 | 30760855 | | PRIVADA | B | 14-11 | 86 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD / MUNICIPIO | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CÓDIGO | TELÉFONO | FAX | CORREO ELECTRÓNICO | ACTIVIDAD ECONÓMICA | VALOR NÓMINA | TOTAL EMPLEADOS | FECHA DE PAGO | FECHA LIMITE DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRERA 42 NO 18 A 08 T A 503 | NEIVA | 1 | HUILA | 41 | 0770803 | 8775686 | EGATEC.SAS@HOTMAIL.COM | 4290 | 10675440 | 8 | 2024-08-21 | 2024-08-23 |

## TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

| CÓD / NOMBRE EPS | NIT EPS | COT OBLIGATORIA | UPC ADICIONAL | # AUT INC | VALOR INC | # AUT LIC | VALOR LIC | NETO COT | DÍAS MORA | INTERESES | INTERESES UPC | SUBTOTAL COT | SUBTOTAL UPC | NÚM RAD ANTERIOR | SALDO A FAVOR | SALDO A FAVOR UPC | TOTAL PAGAR | NÚM AFILIADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS037 | 900156264 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216000 | 4 |
| EPS005 | 800251440 | 211100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211100 | 0 | 0 | 0 | 211100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211100 | 4 |

## TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

| CÓD / NOMBRE AFP | NIT AFP | COT OBLIGATORIA | COT VOL AF | COT VOL AP | FONDO SOL | DÍAS MORA | INTERESES | INTERESES FONDO SOL | TOTAL PAGAR | NÚM AFILIADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | 900336004 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 1 |
| 230301 | 800224808 | 624000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624000 | 3 |
| 231001 | 800227940 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208000 | 1 |
| SINAFP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 230201 | 800229739 | 428100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428100 | 2 |

## TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

| CÓD / NOMBRE ARL | NIT ARL | COT OBLIGATORIA | # AUT INC | VALOR INC | OTROS RIESGOS | NETO COT | DÍAS MORA | INTERESES | SUBTOTAL APORTES | NÚM RAD ANTERIOR | SALDO FAVOR | FONDO SOL | TOTAL PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-11 | 890903790 | 395600 | 0 | 0 | 0 | 395600 | 0 | 0 | 395600 | 0 | 0 | 0 | 395600 |

## TOTAL APORTES A ESAP

| VALOR | DÍAS MORA | INTERESES | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

## TOTAL APORTES A MINISTERIO

| VALOR | DÍAS MORA | INTERESES | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

## TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

| CÓD / NOMBRE CCF | NIT CCF | VALOR APORTE | DÍAS MORA | INTERESES | TOTAL PAGAR | NÚM AFILIADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF32 | 891180008 | 427100 | 0 | 0 | 427100 | 8 |

## TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

### ICBF

| VALOR | DÍAS MORA | INTERESES | TOTAL PAGAR | NÚM AFILIADOS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### SENA

| VALOR | DÍAS MORA | INTERESES | TOTAL PAGAR | NÚM AFILIADOS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## NÚMERO ADMINISTRADORAS

| | |
|---|---|
| PENSIONES | 4 |
| SALUD | 2 |
| RIESGOS LABORALES | 1 |
| CAJAS COMPENSACIÓN | 1 |

## TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA

| | |
|---|---|
| PENSIONES | 1500100 |
| SALUD | 427100 |
| RIESGOS LABORALES | 395600 |
| CAJAS COMPENSACIÓN | 427100 |
| SENA | 0 |
| ICBF | 0 |
| ESAP | 0 |
| MINISTERIO | 0 |
| GRAN TOTAL | 2749900 |

PAGADO

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 33750448 | | FERNANDEZ FIGUEROA ERIKA JOHANNA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Carrera 23 A # 19 A - 03 | NEIVA-HUILA | 8706308 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-07 | 2024-07 | 838531033 | 9470221522 | I | 2024/08/13 | 2024/08/12 | BANCOLOMBIA | 0 | $377,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 33750448 | FERNANDEZ ERIKA | 231001 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $162,500 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | $6,800 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $6,800 | $0 | $0 | $6,800 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $6,800 | $0 | $0 | $6,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $162,500 | $0 | $0 | $162,500 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $162,500 | $0 | $0 | $162,500 |
| TOTAL | | | | 1 | $377,300 | $0 | $0 | $377,300 |



2024/08/14 10:38 AM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901784824 | 4 | CONSORCIO INTER ESTUDIOS | A - 200 O MAS COTIZANTES | 01 | CL 24 No 5Bis 37 | NEIVA-HUILA | 8645033 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-08 | 2024-09 | 9473139935 | 9473139935 | E | 2024/09/06 | 2024/09/12 | BANCO DE BOGOTA | 6 | $386,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 1077860558 | DONOSO JOSE | 231001 | 6 | $400,000 | $64,000 | EPS002 | 6 | $400,000 | $16,000 | CCF32 | 6 | $400,000 | $16,000 | 14-11 | 6 | $400,000 | $2,100 | 6 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 7720885 | SOTO JAIME | 25-14 | 5 | $466,667 | $74,700 | EPS005 | 5 | $466,667 | $18,700 | CCF32 | 5 | $466,667 | $18,700 | 14-11 | 5 | $466,667 | $2,500 | 5 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 7713864 | VALDERRAMA ALBERTO | 25-14 | 6 | $700,000 | $112,000 | EPS005 | 6 | $700,000 | $28,000 | CCF32 | 6 | $700,000 | $28,000 | 14-11 | 6 | $700,000 | $3,700 | 6 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 3)** | | | | | $1,566,667 | $250,700 | | | $1,566,667 | $62,700 | | | $1,566,667 | $62,700 | | | $1,566,667 | $8,300 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $250,700 | $1,200 | $0 | $251,900 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $64,000 | $300 | $0 | $64,300 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | $186,700 | $900 | $0 | $187,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $8,300 | $100 | $0 | $8,400 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 3 | $8,300 | $100 | $0 | $8,400 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $62,700 | $300 | $0 | $63,000 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 3 | $62,700 | $300 | $0 | $63,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $62,700 | $400 | $0 | $63,100 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $16,000 | $100 | $0 | $16,100 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $46,700 | $300 | $0 | $47,000 |
| TOTAL | | | | 3 | $384,400 | $2,000 | $0 | $386,400 |



2024/09/12 03:04 PM

# Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 7722019 | | OÑATE NUÑEZ JOHAN JAVIER | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CAlle 25 # 46 - 94 | NEIVA-HUILA | 8772855 | No |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-08 | 2024-08 | 893184093 | 9471561583 | I | 2024/09/05 | 2024/09/05 | BANCOLOMBIA | 0 | $749,200 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | $2,000,000 | $320,000 | | | $2,000,000 | $250,000 | | | $2,000,000 | $40,000 | | | $2,000,000 | $139,200 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: RIESGO 6 ( 1 Afiliados)** | | | | | $2,000,000 | $320,000 | | | $2,000,000 | $250,000 | | | $2,000,000 | $40,000 | | | $2,000,000 | $139,200 | | $0 | $0 |
| Ciudad: NEIVA Depto: HUILA ( 1 Afiliados) | | | | | $2,000,000 | $320,000 | | | $2,000,000 | $250,000 | | | $2,000,000 | $40,000 | | | $2,000,000 | $139,200 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 7722019 | OÑATE JOHAN | 231001 | 30 | $2,000,000 | $320,000 | EPS005 | 30 | $2,000,000 | $250,000 | CCF32 | 30 | $2,000,000 | $40,000 | 14-23 | 30 | $2,000,000 | $139,200 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | | $2,000,000 | $320,000 | | | $2,000,000 | $250,000 | | | $2,000,000 | $40,000 | | | $2,000,000 | $139,200 | | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 7722019 | | OÑATE NUÑEZ JOHAN JAVIER | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Calle 25 # 46 - 94 | NEIVA-HUILA | 8772855 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-08 | 2024-08 | 893184093 | 9471561583 | I | 2024/09/05 | 2024/09/05 | BANCOLOMBIA | 0 | $749,200 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $320,000 | $0 | $0 | $320,000 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $320,000 | $0 | $0 | $320,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $139,200 | $0 | $0 | $139,200 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $139,200 | $0 | $0 | $139,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $40,000 | $0 | $0 | $40,000 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 1 | $40,000 | $0 | $0 | $40,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $250,000 | $0 | $0 | $250,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $250,000 | $0 | $0 | $250,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $749,200 | $0 | $0 | $749,200 |

# PLANILLA NRO. 31070502 Tipo E 2024 08

ASOPAGOS

## DATOS GENERALES

| TIPO | NÚMERO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | TIPO PRESENTACIÓN | SUCURSAL / DEPENDENCIA | CÓDIGO | PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | NÚMERO PLANILLA | REFERENCIA DE PAGO (PIN) | TIPO EMPRESA | CLASE APORTANTE | CÓDIGO ARL | CÓDIGO OPERADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI | 900300791 | EGATEC SAS | ÚNICO | 0 | 0 | 2024-08 | 2024-09 | 31070502 | | PRIVADA | B | 14-11 | 86 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD / MUNICIPIO | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CÓDIGO | TELÉFONO | FAX | CORREO ELECTRÓNICO | ACTIVIDAD ECONÓMICA | VALOR NÓMINA | TOTAL EMPLEADOS | FECHA DE PAGO | FECHA LIMITE DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRERA 42 NO 18 A 08 T A 503 | NEIVA | 1 | HUILA | 41 | 0770803 | 8775686 | EGATEC.SAS@HOTMAIL.COM | 4290 | 10675440 | 8 | 2024-09-23 | 2024-09-20 |

## TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

| CÓD / NOMBRE EPS | NIT EPS | COT OBLIGATORIA | UPC ADICIONAL | # AUT INC | VALOR INC | # AUT LIC | VALOR LIC | NETO COT | DÍAS MORA | INTERESES | INTERESES UPC | SUBTOTAL COT | SUBTOTAL UPC | NÚM RAD ANTERIOR | SALDO A FAVOR | SALDO A FAVOR UPC | TOTAL PAGAR | NÚM AFILIADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS037 | 900156264 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216000 | 3 | 500 | 0 | 216500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216500 | 4 |
| EPS005 | 800251440 | 211100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211100 | 3 | 500 | 0 | 211600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211600 | 4 |

## TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

| CÓD / NOMBRE AFP | NIT AFP | COT OBLIGATORIA | COT VOL AF | COT VOL AP | FONDO SOL | DÍAS MORA | INTERESES | INTERESES FONDO SOL | TOTAL PAGAR | NÚM AFILIADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINAFP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 230201 | 800229739 | 428100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000 | 0 | 429100 | 2 |
| 230301 | 800224808 | 624000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1400 | 0 | 625400 | 3 |
| 231001 | 800227940 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 500 | 0 | 208500 | 1 |
| 25-14 | 900336004 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 600 | 0 | 240600 | 1 |

## TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

| CÓD / NOMBRE ARL | NIT ARL | COT OBLIGATORIA | # AUT INC | VALOR INC | OTROS RIESGOS | NETO COT | DÍAS MORA | INTERESES | SUBTOTAL APORTES | NÚM RAD ANTERIOR | SALDO FAVOR | FONDO SOL | TOTAL PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-11 | 890903790 | 395600 | 0 | 0 | 0 | 395600 | 3 | 900 | 396500 | 0 | 0 | 0 | 396500 |

## TOTAL APORTES A ESAP

| VALOR | DÍAS MORA | INTERESES | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 0 |

## TOTAL APORTES A MINISTERIO

| VALOR | DÍAS MORA | INTERESES | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 0 |

## TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

| CÓD / NOMBRE CCF | NIT CCF | VALOR APORTE | DÍAS MORA | INTERESES | TOTAL PAGAR | NÚM AFILIADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF32 | 891180008 | 427100 | 3 | 1000 | 428100 | 8 |

## TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

### ICBF

| VALOR | DÍAS MORA | INTERESES | TOTAL PAGAR | NÚM AFILIADOS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |

### SENA

| VALOR | DÍAS MORA | INTERESES | TOTAL PAGAR | NÚM AFILIADOS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |

## NÚMERO ADMINISTRADORAS

| | |
|---|---|
| PENSIONES | 4 |
| SALUD | 2 |
| RIESGOS LABORALES | 1 |
| CAJAS COMPENSACIÓN | 1 |

## TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA

| | |
|---|---|
| PENSIONES | 1503600 |
| SALUD | 428100 |
| RIESGOS LABORALES | 396500 |
| CAJAS COMPENSACIÓN | 428100 |
| SENA | 0 |
| ICBF | 0 |
| ESAP | 0 |
| MINISTERIO | 0 |
| GRAN TOTAL | 2756300 |

PAGADO

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 33750448 | | FERNANDEZ FIGUEROA ERIKA JOHANNA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Carrera 23 A # 19 A - 03 | NEIVA-HUILA | 8706308 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-08 | 2024-08 | 908322194 | 9471854024 | I | 2024/09/11 | 2024/09/12 | BANCOLOMBIA | 1 | $377,800 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 33750448 | FERNANDEZ FIGUEROA ERIKA JOHANNA | 231001 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $162,500 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | $6,800 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $208,000 | $200 | $0 | $208,200 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $208,000 | $200 | $0 | $208,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $6,800 | $100 | $0 | $6,900 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $6,800 | $100 | $0 | $6,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $162,500 | $200 | $0 | $162,700 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $162,500 | $200 | $0 | $162,700 |
| TOTAL | | | | 1 | $377,300 | $500 | $0 | $377,800 |



2024/09/16 04:00 PM

# INFORME TECNICO CONTRATO DE CONSULTORIA.

**CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2 0 7 - 2 0 2 3**

# INFORME DE CONSULTORIA

**FINAL** [ ] **PARCIAL** [ 4 ]

MES No 4 DEL 10 DE MAYO DE 2024 AL 06 DE AGOSTO DE 2024

| | |
|---|---|
| **Nombre del Contratista:** CONSORCIO INGEFIP 2024<br>R.L. FERNANDO IVAN PEÑA PEREZ | **Contrato No:** 207 - 23<br>**No de Convenio** PDA FIA – MUNICIPIO S.G.P. |
| **Objeto:** ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA VEREDA BARNIZA DEPARTAMENTO DEL HUILA Y ACTUALIZACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA | **Valor:** TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($396.480.297,00)<br>**Valor Anticipo:** CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CENTO DIECIOCHO PESOS ($158.592.118,00) CUARENTA POR CIENTO (40%)<br>**Fecha Aprobación Póliza:** 05/01/2024<br>**FVCP:** 09/10/2024 |
| **Duración:** OCHO (08) MESES | **Municipio:** ACEVEDO - PALESTINA |
| **Nombre del Interventor:** CONSORCIO INTER ESTUDIOS<br>R.L. JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ | **Contrato No:** 215 DE 2023 |

## 1. RESUMEN EJECUTIVO

### 1.1 Información sobre estado y avance de los estudios y diseños (Describir )

Se realiza el estudio preliminar, análisis del sector a beneficiar, estudio socioeconómico, ubicación geográfica, censo poblacional, evaluación de las infraestructuras nuevas a diseñar, el sistema de acueducto regional barniza del Mpio de Acevedo por gravedad, estudios de suelos (geotecnia) y toma de muestra de agua para análisis fisicoquímicos y microbiológicos del agua a explotar teniendo en cuenta el sistema de captación hidráulico (cuencas hidrográficas, ríos y quebradas), la legalidad vigente y recopilando la información y datos de los proyectos anteriores del año 2013 y 2021 del acueducto regional Barniza, Acevedo y la actualización de la PTAR del Municipio de Palestina - Departamento del Huila, el secretario de planeación del Municipio de Palestina, me entrego los dos proyectos que se radicaron en el año 2016 y 2021, se empezaron los trabajos de campo como es el estudio y levantamiento topográfico del lote de la PTAR y dos tramos del colector o emisario final de aproximadamente 200 ml, los estudios del suelo o geotecnia, comprendido en tres sondeos de 6 ml cada uno, el análisis de agua residual, Res. 0631 de 2015 Art. 8 vertimiento con carga menor o igual a 625 kg/día DBO5.

## 1.2. Estado y Avance Físico de los estudios y diseños

**Historial Cronológico del Proyecto**

| ACTIVIDAD | FECHA | DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS | DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS | NUEVA FECHA DE TERMINACION |
|---|---|---|---|---|
| **Iniciación** | 09/02/2024 | 105 | | 09/10/2024 |
| **Suspensión No. 1** | 24/05/2024 | | | |
| **Reiniciación No.1** | 24/07/2024 | | 61 | 07/12/2024 |
| | | | | |

**ACTAS** (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.**)**

| Tipo de Acta | No | Fecha |
|---|---|---|
| ACTA DE INICIO | | 09/02/2024 |
| REUNION DE SOCIALIZACION I.E. BARNIZA | | 07/03/2024 |
| ACTA DE SUSPENSION 1 | | 24/05/2024 |
| ACTA DE PRORROGA 1 | | 22/06/2024 |
| ACTA DE REINICIO 1 | | 24/07/2024 |

## 1.3. Estado y Avance Presupuestal del Proyecto (Describir)

Pago anticipo correspondiente al valor de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CENTO DIECIOCHO PESOS ($158.592.118,00) CUARENTA POR CIENTO (40%) y se proyecta corte en la primera acta parcial según este informe de corte y avance correspondiente al Treinta por ciento (30%) por un valor de ($118.944.089,10), a la entrega del informe parcial físico y digital consolidado perteneciente al producto uno (1) (ELABORACIÓN DE ESTUDIOS BASICOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL BARNIZA Y DOCUMENTO O INFORME DE DIAGNOSTICO Y DISEÑO PRELIMINAR DE LA ALTERNATIVA ESCOGIDA COMO LA MAS VIABLE, TECNICA, AMBIENTAL Y ECONOMICAMENTE) Y LA PREFACTIBILIDAD O EVALUACION PREELIMINAR ETAPA I, DE LA ACTUALIZACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA. El avance real de los Estudios y Diseños de la Consultoría del acueducto regional Barniza del Municipio de Acevedo esta ejecutado en el Cuarenta por ciento (40%), que corresponde a los trabajos de campo (censo poblacional, estudios topográficos, estudios de suelos o geotecnia, estudios hidrológicos, caracterización y trazabilidad del análisis fisicoquímico y microbiológico del agua cruda, Compilación información básica informe diagnostico preliminar y visitas técnicas de campo) y el avance real de la actualización a los estudios y diseños para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del casco urbano del Municipio de Palestina, Departamento del Huila esta ejecutado en el Cuarenta por ciento (40%), que corresponde a los trabajos de campo (Censo poblacional, estudios topográficos, estudios de suelos o geotecnia, geología, caracterización y trazabilidad análisis de agua residual, Compilación información básica informe diagnostico preliminar y visitas técnicas de campo)

## 1.4. Recomendaciones y Conclusiones

Se realiza el estudio y levantamiento topográfico del acueducto regional Barniza del Municipio de Acevedo relacionado con el censo poblacional de las 144 familias y el estudio socioeconómico del sector en aras de iniciar los cálculos hidráulicos para obtener la dotación poblacional, la proyección de crecimiento poblacional (25 años) y acumulaciones hidráulicas correspondientes al sistema de acueducto por gravedad y sus obras complementarias que serán parte integral del informe parcial número 2 que se entregara posterior a esté.

De acuerdo con las proyecciones de población y demanda, el caudal máximo diario actual de 1.92 L/s y el proyectado al año 2050 es de 2.99 L/s, meta que se conseguirá mediante campañas educativas dirigidas a los usuarios sobre el uso eficiente del agua y la implementación de la macro-medición y la micro-medición.

La falta de planeación y el desconocimiento de las consecuencias de un mal aprovechamiento de los recursos naturales trajeron consigo la contaminación del ambiente natural. El recurso hídrico, ha sido cada vez más afectado por sustancias agresivas y difíciles de tratar, debido a la naturaleza química de las sustancias presentes en los desperdicios que caen de las corrientes.

La Consultoría no dispuso de datos reales de caudales demandados en el sistema ni registrados en los medidores de los suscriptores del servicio, dado que actualmente no se tienen macromedidores funcionando en la red, y la cobertura efectiva de micro-medición es muy baja.

La opción más económica y viable tanto para la comunidad como para los entes gubernamentales o cofinanciadores, es la construcción del acueducto regional Barniza del Municipio de Acevedo – Huila que será diseñado con la capacidad necesaria para abastecer a la población actual y a la población de la proyección futura. El proyecto cuenta con el diseño completo bajo las normas técnicas del RAS-2000 y la normatividad vigente del MVCT, será radicado en el banco de proyectos de la entidad.

El Estudio y diseño del acueducto regional Barniza del Municipio de Acevedo – Huila, el material de la tubería a diseñar será en el PVC tiene vida útil establecida de 50 años aplicada en la construcción de acueducto (normativas técnicas y manual de buenas prácticas de la ingeniería) y Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico –RAS Res. 0330 de 2017)

Realizando estas recomendaciones se puede contar tanto con la infraestructura de construcción como el caudal existente y real de la captación, siendo datos necesarios para la proyección del sistema de acueducto en ejecución de los estudios y diseños del acueducto regional Barniza o caso contrario y como resultado final la recomendación de una nueva fuente de captación se cumpla con el caudal de proyección según el horizonte de diseño y su material constructivo.

Según el concepto técnico existe la posibilidad de mejorar, instalar micromedidores, macromedidores, redes hidráulicas y las estructuras especiales (bocatoma, desarenador, PTAP, Tanque de almacenamiento, domiciliarias) del sistema del acueducto a diseñar, para mejorar la calidad de vida y la eficiencia en el servicio.

La Comunidad de las veredas Barniza y Nuevo Horizonte del Municipio de Acevedo – Departamento del Huila, requiere de las instalaciones de micro-medidores y macro-medidores y la instalación de redes (Aducción, Conducción, Redes de distribución principal y ramales, domiciliarias) que proporcione agua potable para que cumpla con los parámetros de continuidad, calidad y eficiencia.

El tratamiento de aguas residuales tiene como propósito eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en el agua provenientes de uso doméstico (cocina, baños, lavado de ropa), urbano (hospitales, colegios, mercados, aguas lluvias, sistema de drenaje de calles) y procesos industriales (producción, transformación o manipulación de productos), estos desechos líquidos deben ser tratados previamente, de manera que puedan ser adecuadas para su ubicación en las respectivas redes de vertido, tales como lagos, ríos, quebradas, campos de infiltración o para su reutilización en los procesos industriales.

Según la normatividad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Resolución 0631 de marzo 17 de 2015), las aguas residuales ya sean para uso doméstico, industrial, o de diferente índole deben ser tratadas antes de arrojarlas al río de tal forma que el impacto ambiental sea mínimo.

La elección de la alternativa adecuada requiere un conocimiento conceptual de las metodologías de tratamiento y su aplicación como alternativa, técnico, ambiental, sostenible. Teniendo en cuenta la eficiencia, efectividad y bajos costos. Algunas de estas alternativas son: Tratamiento Anaeróbico y Tratamiento Aeróbico.

Para la evaluación de alternativas se tomará como factores de análisis los siguientes tres campos: el factor ambiental como primer elemento de valoración, el factor técnico como segundo elemento de valoración y en última instancia el factor económico.

La sostenibilidad ambiental de un proyecto se constituye en el primer elemento de juicio, no dejando de lado las características técnicas y económicas y siguiendo el patrón de implementación de sistemas completos con soluciones integrales. Este esquema permite la implementación por etapas, pero condiciona la solución técnica a desarrollos sostenibles a largo plazo (períodos mínimos de vida útil de 25 años), y que cumplan con la normatividad ambiental existente sobre descargas de residuos líquidos.

También se Empezó con los trabajos de visitas de campo, estudio y levantamiento topográfico, estudios de suelos o geotecnia del proyecto de la PTAR del casco urbano del Municipio de Palestina, El tratamiento de aguas residuales tiene como propósito eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en el agua provenientes de uso doméstico (cocina, baños, lavado de ropa), urbano (hospitales, colegios, mercados, aguas lluvias, sistema de drenaje de calles) y procesos industriales (producción, transformación o manipulación de productos), estos desechos líquidos deben ser tratados previamente, de manera que puedan ser adecuadas para su ubicación en las respectivas redes de vertido, tales como lagos, ríos, quebradas, campos de infiltración o para su reutilización en los procesos industriales.

Es importante resaltar que la gran mayoría de sistemas de tratamiento de aguas residuales convencionales cumplen la normatividad sobre descargas de aguas residuales, sin embargo, el criterio de selección por sostenibilidad (que no está reglamentado) lo cumplen sólo sistemas con clara diferenciación de sus etapas.

## 2. INFORME BASICO

### 2.1. Estado Financiero del Contrato

| Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada) | Fecha | Valor Acta | Amortización | Valor pagado |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Pago Anticipo | 14-03-2024 | $158.592.118,00 | | |
| | | | | |
| **Valor Contrato Inicial** | **Valor Adicional** | **Valor Total Contratado** | **Valor Ejecutado** | **Valor no Ejecutado** |
| $396.480.297,00 | $0 | $396.480.297,00 | $0 | $0 |

### 2.2. Personal y Equipo Empleado por el Contratista

Manuel Ricardo Sánchez M. Ing. Director de Consultoría
Guillermo Ortiz Cuenca Ing. de Apoyo
Fernando Iván Peña Pérez Ing. de Apoyo
Roberto Castañeda Pardo Ing. Esp. Hidráulico
Oscar Fernando Otero T. Ing. Esp. Geotecnia
Gustavo Peña Suarez Topógrafo

EQUIPOS UTILIZADOS:
Estación total marca TOPCON modelo GPT3105W número 8R013
Accesorios marca GEOSURVEY
GPS CHC-NAV IBASE doble frecuencia
Ver certificado de calibración en el informe parcial consolidado.

### 2.3. Personal y Equipo Empleado por el Supervisor

No aplica hasta el momento

## 3. ASPECTOS TECNICOS

### 3.1. Modificaciones Realizadas en consultoría

No aplica hasta el momento

### 3.2. Problemas y Soluciones Adoptadas

No aplica hasta el momento

## 4. CONTROL DE CALIDAD

### 4.1. Cuadro Resumen de Pruebas de Laboratorio

Si ha hecho las muestras o tomas para la evaluación de calidad de agua, está en los análisis matemáticos o trabajos en el laboratorio.

### 4.2. Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio

Si aplica hasta el momento, y se están analizando los datos en los laboratorios de suelos y aguas cruda y residual, según las especificaciones técnicas.

Se tomó muestras in-situ de agua para evaluar los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, los cuales fueron enviados al laboratorio certificado con las ISO correspondientes, las normas y resoluciones vigentes para las Buenas Prácticas de Laboratorio Res. 3610 de 2013 y las que corresponden; dicho laboratorio que emite los resultados lleva como nombre LABORATORIO DIAGNOSTICAMOS LÍNEA AMBIENTAL y SUELOS, ANALISIS, MATERIALES S.A.S.
El resultado obtenido de la toma de muestras para la evaluación de calidad de agua cumple en su mayoría con los parámetros definidos para su evaluación con la diferencia que se obtiene agentes microbiológicos como NMP COLIFORMES TOTALES y NMP ESCHRICHIA COLI.

Es importante resaltar que todos los parámetros fueron evaluados y comparados directamente con la normativa actual vigente lo cual debe cumplir el agua para consumo humano en la Res. 2115 de 2007.

### 4.3. Comentarios y Conclusiones

Se concluye que el agua es apta para consumo humano, pero se debe realizar un tratamiento previo de desinfección para cumplir con lo dispuesto en la Res. 2115 de 2007 y el Dec. 1575 de 2007 para eliminar los agentes resultantes como NMP COLIFORMES TOTALES y NMP ESCHRICHIA COLI.

### 4.4. Comité técnico

| Fecha de Realización | Lugar | Resultado del Comité (Describir) |
|---|---|---|
| 07-03-2024 | Escuela Vereda Barniza, Acevedo | inicialmente tomo la palabra el señor Gilberto Claros, presidente de la Junta Administradora de Servicios Públicos, quien presentó los agradecimientos a los participantes a la reunión y especialmente la Gobernación, Aguas del huila y al Municipio de Acevedo, por las gestiones para el desarrollo de este proyecto, ya que presenta un gran beneficio para esta comunidad la cual podrá contar con Agua potable.<br>Se efectuó la Socialización del Proyecto, con los usuarios o beneficiarios del proyecto del acueducto. Además, estuvo presente el Sr. Alcalde Municipal de Acevedo Edgar Prada Sterling, el Secretario de Planeación, un asesor del Municipio de Acevedo, la Interventoría y el Contratista de la Consultoría. Se dio a conocer a los participantes el alcance del contrato y la comunidad quedo comprometida a colaborar para el buen desarrollo del Proyecto. |

## 5. INFORME AMBIENTAL

### 1. Identificación de situaciones Ambientales

La importancia de reconocer, evaluar y diagnosticar una zona determinada y/o proyecto a ejecutar se extienden a el aprovechamiento de los recursos naturales con los que se cuenta y la necesidad de proteger estos mismos; dado a que todo recurso que se toma de la naturaleza está destinado a expirar su existencia si no se toma de la forma correcta cambiando el comportamiento natural de todos los ecosistemas (agua, suelo y aire - atmosfera), por ende, se crean parámetros normativos para los distintos procesos de desarrollo como se presenta en la vereda Bamiza y Nuevo Horizonte del Municipio de Acevedo, con la actividad económica como la agricultura.

Se evidencian situaciones ambientales, tales como:
Consumo de recursos naturales:

- La población realiza aprovechamiento del recurso suelo mediante la siembra y cosecha de cultivos de café, plátano, pastos y/o forrajes, entre otros. Aprovechamiento de recursos vivos como es la extensión de predios para finalidades de sostenimiento de bovinos y quinos.

- Contaminación atmosférica por quemas de residuos orgánicos, ocasionando la producción e incremento de CO2.

- Producción de contaminantes orgánicos como órganos halogenados u órganos fosforados, compuestos cancerígenos, biocidas, etc. Generados en tiempos de siembra y cosecha con la aplicación de pesticidas.

- Es importante destacar que esta metodología de implementación analiza de forma individual cada característica, tal y como lo recomienda la metodología general de análisis de proyectos sostenibles recomendada por el Ministerio del Medio Ambiente.

- La sostenibilidad ambiental de un proyecto se constituye en el primer elemento de juicio, no dejando de lado las características técnicas y económicas y siguiendo el patrón de implementación de sistemas completos con soluciones integrales. Este esquema permite la implementación por etapas, pero condiciona la solución técnica a desarrollos sostenibles a largo plazo (períodos mínimos de vida útil de 25 años), y que cumplan con la normatividad ambiental existente sobre descargas de residuos líquidos.

- Es importante resaltar que la gran mayoría de sistemas de tratamiento de aguas residuales convencionales cumplen la normatividad sobre descargas de aguas residuales, sin embargo, el criterio de selección por sostenibilidad (que no está reglamentado) lo cumplen sólo sistemas con clara diferenciación de sus etapas.

Se debe conocer la afectación ambiental que generará la ejecución del proyecto, se deben identificar los impactos en el medio ambiente antes de llevar a cabo el mismo, de esta manera el impacto en el medio ambiente sin la construcción del proyecto se presenta a continuación, y posteriormente se realizará el mismo procedimiento para los impactos generados una vez ejecutado el proyecto.

**Impacto ambiental:** Uso inadecuado de agua (desperdicio) y contaminación de aguas.

Causas:
- Falta de sitios o estructuras para almacenar el agua.
- Cobertura inadecuada de acueductos y alcantarillados.
- Red de distribución en mal estado.
- Falta de mantenimiento regular de las estructuras del sistema de acueducto.

Efectos:
- Déficit hídrico.
- Reducción de los sistemas de producción.
- Deterioro de red vial por fugas en tuberías.
- Disminución en producción de cultivos.
- Suspensiones en el servicio de acueducto.

**Impactos con proyecto:** Con la ejecución del proyecto se generarán impactos positivos y negativos en diversos componentes ambientales que se nombran a continuación:

*Impacto-Componente Aire:* Emisión de partículas
Causas:
- Operación de maquinaria y equipo en excavación para llevar a cabo la construcción de tubería de la red de distribución del sistema de acueducto en la cabecera municipal.
- Cargue y descargue de materiales de construcción y escombros.
- Transporte de materiales de construcción y escombros.
- Disposición de material escombros.

Efectos:
- Emisión de material particulado a la atmósfera.
- Contaminación del aire en el lugar donde se desarrolle la ejecución de las obras.
- Contaminación auditiva por el ruido producido por la maquinaria y equipo de construcción.

*Impacto-Componente Agua:*
Causas:
- Recuperación del recurso.

Efectos:
- Disminución del recurso hídrico.
- Abastecimiento continúo de agua para la población.

*Impacto-Componente Suelo:*
Causas:
- Remoción de suelo (excavación)
- Construcción tubería de conducción y red de distribución.

Efectos:
- Afectación de drenajes subterráneos.

*Impacto-Componente Vegetación:*
Causas:
- Remoción de vegetación (descapote) para la construcción de la tubería de conducción.

Efectos:
- Incremento de procesos erosivos.

*Impacto-Alteración de comunidad:*
Causas:
- Construcción de red de distribución.

Efectos:
- Alteración a actividades normales de la cabecera del municipio.
- Alteración en zonas comerciales cuando se esté ejecutando la obra en las mismas.
- Cerramiento vial para la construcción de la red de distribución.
- Congestión vehicular en las zonas donde se ejecute la construcción de la red de distribución.

Impacto-Alteración de entorno y contraste visual:
Causas:
- Construcción de red de distribución.

Efectos:
- Deterioro del paisaje natural

*Impacto-Calidad de vida:*
Causas:
- Ejecución y operación del proyecto.

Efectos:
- Generación de empleo.
- Mejoramiento de la calidad de vida.
- Suministro continuo del servicio de acueducto regional en las veredas Barniza y Nuevo Horizonte y suministro parcial de la población rural.

**2. Evaluación de Daños y Perjuicios a Terceros**

No aplica hasta el momento

**3. Descripción de Actividades Desarrollada en el Periodo**

Durante este primer periodo de la ejecución del presente contrato se desarrollaron distintas actividades como el reconocimiento de la zona del proyecto como se especifica en nombre las veredas Barniza y Nuevo Horizonte del municipio de Acevedo, lo cual se realiza un censo poblacional para definir la cantidad de usuarios y familias a las que a futuro se les prestara el servicio de acueducto conforme se indica en el objeto, a su vez se toma evidencia topográfica del predio a estudio, así mismo evaluando el recurso que se espera explotar para brindar el determinado servicio y varias tomas de muestras in-situ para analizar la calidad de agua de emite la captación de la Quebrada Barniza, donde se tomará el recurso; esta prueba abarca evaluando todos los parámetros requeridos en la normativa actual vigente Dect. 1575 de 2007 y Res. 2115 de 2007 observando los comportamientos fisicoquímicos y microbiológicos del agua.
Se efectuó la Socialización del Proyecto, con los usuarios o beneficiarios del proyecto del acueducto. Barniza, además estuvo presente el Sr. Alcalde Municipal de Acevedo Edgar Prada Esterling, el Secretario de Planeación, un asesor del Municipio de Acevedo, la Interventoría, y el Contratista de la Consultoría. Se dio a conocer a los participantes el alcance del contrato de consultoría y la comunidad quedo comprometida a colaborar para el buen desarrollo del Proyecto. El Sr Gilberto Claros, presidente de la Junta Administradora de Servicios Públicos, quien presentó los agradecimientos a los participantes a la reunión y especialmente la Gobernación, Aguas del huila y al Municipio de Acevedo, por las gestiones para el desarrollo de este proyecto, ya que presenta un gran beneficio para esta comunidad la cual podrá contar con Agua potable.
También se Empezó con los trabajos de visitas de campo, estudio y levantamiento topográfico, estudios de suelos o geotecnia del proyecto de la PTAR del casco urbano del Municipio de Palestina Considerando las posibilidades de ubicación del sistema de tratamiento y las posibilidades de tratamiento y partiendo del principio del bajo costo del terreno (el claro menor valor del terreno en la zona) se descartan las opciones de tratamiento de lodos activados convencionales, aireación extendida y lagunas aireadas. De igual forma y conforme a los cuadros generales presentados ofrecen los mayores costos de implementación y la mayor tecnología.

**4. Registro Fotográfico**

Ilustración 1. SOCIALIZACIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORIA CON LA COMUNIDAD VEREDA BARNIZA Y NUEVO HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA.





Ilustración 2. SOCIALIZACIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORIA CON LA COMUNIDAD, I.E. BARNIZA – ACEVEDO (H)



Ilustración 3. ESTACIÓN TOPOGRAFICA SATELITAL Y CONSTRUCCIÓN DE MOJÓN 1.



Ilustración 4. ESTACIÓN TOPOGRAFICA SATELITAL Y CONSTRUCCIÓN DE MOJÓN 2.



Ilustración 5. CONSTRUCCIÓN DE MOJÓN 2 – SISTEMA DE GEOREFERENCIACIÓN MAGNA- SRIGAS



Ilustración 6. INSTITUTO EDUCATIVA BARNIZA, SAN MARCOS, MPIO ACEVEDO - HUILA

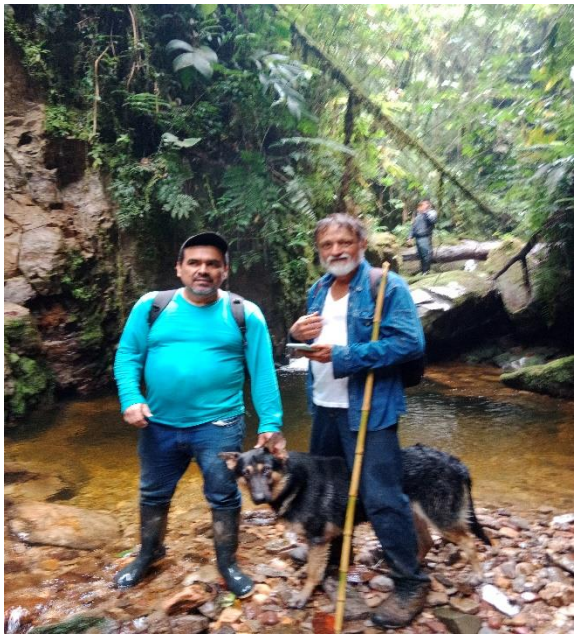


Ilustración 7. LOCALIZACION DE LA BOCATOMA QUEBRADA BARNIZA, MPIO ACEVEDO – HUILA



Ilustración 8. LOCALIZACION DEL DESARENADOR QUEBRADA BARNIZA, MPIO ACEVEDO – HUILA



Ilustración 9. LOCALIZACION DEL PTAP Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO BARNIZA, MPIO ACEVEDO – HUILA



Ilustración 10. LOCALIZACION DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DE LA QUEBRADA BARNIZA, MPIO ACEVEDO – HUILA



Ilustración 11. LOCALIZACION DEL MOJON SISTEMA DE GEOREFERENCIACIÓN MAGNA- SRIGAS BOCATOMA QUEBRADA BARNIZA, MPIO ACEVEDO – HUILA



Ilustración 12. LOCALIZACION DEL MOJON SISTEMA DE GEOREFERENCIACIÓN MAGNA- SRIGAS DESARENADOR QUEBRADA BARNIZA, MPIO ACEVEDO – HUILA



Ilustración 13. ESTACIÓN TOPOGRAFICA SATELITAL Y CONSTRUCCIÓN DE MOJÓN 2 LA ESCUELA BARNIZA, ACEVEDO – HUILA



Ilustración 14. POZOS DE INSPECCION DEL COLECTOR FINAL SUR CEMENTERIO, A LA LLEGADA DEL LOTE DE LA PTAR, PALESTINA – HUILA



Ilustración 15. POZOS DE INSPECCION DEL COLECTOR FINAL DEL LOTE DE LA PTAR, PALESTINA – HUILA



Ilustración 16. VISITA DE CAMPO CON EL GEOLOGO CAMILO TOVAR Y LA COMISION TOPOGRAFICA - CABEZOTE DEL EMISARIO FINAL HACIA LA QUEBRADA LOS CHORROS DENTRO DEL LOTE DE LA PTAR, PALESTINA – HUILA



Ilustración 16. VISITA DE CAMPO CON EL GEOLOGO CAMILO TOVAR Y LA COMISION TOPOGRAFICA - CABEZOTE DEL EMISARIO FINAL HACIA LA QUEBRADA LOS CHORROS DENTRO DEL LOTE DE LA PTAR, PALESTINA – HUILA



Ilustración 17. TRABAJO DE CAMPO DE LA COMISION TOPOGRAFICA EN LA LINEA DE CONDUCCION EN EPOCA DE INVIERNO – GRAN INTESIDAD DE PRECIPITACION LLUVIAS, ACUEDUCTO REGIONAL BARNIZA, ACEVEDO – HUILA



Ilustración 18. TRABAJO DE CAMPO DE LA COMISION TOPOGRAFICA EN LA LINEA DE CONDUCCION EN EPOCA DE INVIERNO – SE APRECIA LA GRAN INTESIDAD DE PRECIPITACION LLUVIAS, ACUEDUCTO REGIONAL BARNIZA, ACEVEDO – HUILA



Ilustración 19. TRABAJO DE CAMPO DE LA COMISION TOPOGRAFICA EN LA LINEA DE CONDUCCION EN EPOCA DE INVIERNO – SE APRECIA LA GRAN INTESIDAD DE PRECIPITACION LLUVIAS, ACUEDUCTO REGIONAL BARNIZA, ACEVEDO – HUILA



Ilustración 20. TRABAJO DE CAMPO DE LA COMISION TOPOGRAFICA EN LA LINEA DE CONDUCCION EN EPOCA DE INVIERNO – SE APRECIA LA GRAN INTESIDAD DE PRECIPITACION LLUVIAS, DENTRO DE LA SELVA DE LA BOCATOMA DEL ACUEDUCTO REGIONAL BARNIZA, ACEVEDO – HUILA



Ilustración 21. TRABAJO DE CAMPO DE LA COMISION GEOTECNICA EN LA BOCATOMA Y LINEA DE CONDUCCION EN EPOCA DE INVIERNO – DENTRO DE LA SELVA DE LA BOCATOMA DEL ACUEDUCTO REGIONAL BARNIZA, ACEVEDO – HUILA



Ilustración 22. TRABAJO DE CAMPO DE LA COMISION GEOTECNICA EN LA LINEA DE CONDUCCION DENTRO DE LA SELVA DE LA BOCATOMA DEL ACUEDUCTO REGIONAL BARNIZA, ACEVEDO – HUILA



Ilustración 23. TRABAJO DE CAMPO DE LA COMISION TOPOGRAFICA MOJON DE LA PLACA DE LA PTAR DEL CASCO URBANO DEL MPIO DE PALESTINA – HUILA



Ilustración 24. TRABAJO DE CAMPO DE LA COMISION TOPOGRAFICA MOJON DE LA PLACA GPS 2 DE LA PTAR DEL CASCO URBANO DEL MPIO DE PALESTINA – HUILA



Ilustración 25. TRABAJO DE CAMPO DE LA COMISION TOPOGRAFICA CON EQUIPO RECEPTOR SATELITAL DE LA PTAR DEL CASCO URBANO DEL MPIO DE PALESTINA – HUILA




Ilustración 26. TRABAJO DE CAMPO DE LA COMISION TOPOGRAFICA MOJON DE LA PLACA GPS 1 DE LA PTAR DEL CASCO URBANO DEL MPIO DE PALESTINA – HUILA

**CONSORCIO INTER ESTUDIOS**
R.L. ING. JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ
INTERVENTOR

**CONSORCIO INGEFIP 2024**
R.L. ING. FERNANDO IVAN PEÑA PEREZ
CONTRATISTA DE CONSULTORIA
