| FECHA DE ELABORACIÓN | 17/ SEPTIEMBRE /2024 | | INFORME No. | 06 |
|---|---|---|---|---|
| TIPO DE INFORME | DE SEGUIMIENTO | X | FINAL | |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No. | 2753 - 2023 | | | |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | 2830 - 2023 | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 09/10/2023 | | FECHA ACTA DE INICIO | 18/10/2023 |
| OBJETO | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS EN EL CORREGIMIENTO DE LA BALSA, MUNICIPIO DE BUENOS AIRES DEPARTAMENTO DEL CAUCA" | | | |
| CONTRATANTE | DEPARTAMENTO DEL CAUCA | | DEPENDENCIA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VIAS LA BALSA | | NIT. No. | 901.757.030-9 |
| REPRESENTANTE LEGAL | MARIA JULIANA LOZANO SEPULVEDA | | C.C. No. | 31.269.448 de Cali |
| INTERVENTOR | ZAFRA INGENIERIA S. A. S. | | NIT. No. | 901.085.127-1 |
| REPRESENTANTE LEGAL | RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY | | C.C. No. | 13.840.816 de Bucaramanga |
| SUPERVISOR | ANDRÉS ARTURO MEJÍA MADROÑERO | | CARGO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |
| VALOR | INICIAL | | $578.449.661 | |
| | ADICIONES | No. | VALOR ADICIONADO | % DE ADICIÓN |
| | | N/A | N/A | N/A |
| | MODIFICATORIO No. 01 | | N/A | |
| PLAZO | INICIAL | | DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023 | |
| | PRÓRROGAS | No. | TIEMPO PRORROGADO | FECHA |
| | | 01 | TRES (3) MESES | 27 DE MARZO DE 2024 |
| | | 02 | TRES (3) MESES | 27 DE JUNIO DE 2024 |
| HISTORICO DE SUSPENSIONES | | No. | FECHA DE SUSPENSION | FECHA DE REANUDACIÓN |
| | | 01 | 26 DE DICIEMBRE DE 2023 | 27 DE MARZO DE 2024 |

| PÓLIZAS CONTRATO 2830-2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GARANTÍAS** | **NOMBRE DE ASEGURADORA** | **VIGENCIA** | | **VALOR AMPARADO** |
| | | **FECHA INICIAL** | **FECHA VENCIMIENTO** | |
| **PÓLIZAS CONTRATO PRINCIPAL No. 2830 DE 2023** | | | | |
| **Póliza de cumplimiento No: B-100041518 de 11 de octubre de 2023. Ampara el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones y estabilidad y calidad de la obra en virtud del Contrato Principal No. 2830 de 2023 – Anexo No. 0** | | | | |
| Cumplimiento | Compañía Mundial de Seguros NIT. 860.037.013-6 | 09-10-2023 | 30-04-2024 | $ 115.689.932,20 |
| Prestaciones Sociales | | 09-10-2023 | 31-12-2026 | $ 28.922.483,05 |
| Calidad del Servicio | | 31-12-2023 | 31-12-2028 | $ 57.844.966,10 |
| **PÓLIZAS ACTA DE INICIO** | | | | |
| **GARANTIAS** | **NOMBRE DE ASEGURADORA** | **VIGENCIA** | | **VALOR AMPARADO** |
| | | **FECHA INICIAL** | **FECHA VENCIMIENTO** | |
| **Póliza de cumplimiento No: B-100041518 del 20 de octubre 2023. Ampara el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones y estabilidad y calidad de la obra en virtud del Contrato Principal No. 2830 de 2023 – Anexo No. 2** | | | | |
| Cumplimiento | Compañía Mundial de Seguros NIT. 860.037.013-6 | 18-10-2023 | 09-05-2024 | $ 115.689.932,20 |
| Prestaciones sociales | | 18-10-2023 | 09-01-2027 | $ 28.922.483,05 |
| Calidad del servicio | | 09-01-2024 | 09-01-2029 | $ 57.844.966,10 |
| **PÓLIZAS REINICIO No 1 Y OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | | | |
| **GARANTÍAS** | **NOMBRE DE ASEGURADORA** | **VIGENCIA** | | **VALOR AMPARADO** |
| | | **FECHA INICIAL** | **FECHA INICIAL** | |
| **Póliza de cumplimiento No: B-100041518 del 22 de abril 2024. Ampara el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones y estabilidad y calidad de la obra en virtud del Contrato Principal No. 2830 de 2023 – Anexo No. 4** | | | | |
| Cumplimiento | Compañía Mundial de Seguros NIT. 860.037.013-6 | 27-03-2024 | 31-10-2024 | $ 115.689.932,20 |
| Prestaciones Sociales | | 27-03-2024 | 30-06-2027 | $ 28.922.483,05 |
| Calidad del Servicio | | 30-06-2024 | 30-06-2029 | $ 57.844.966,10 |
| **Nota:** | | | | |

| GARANTÍAS | NOMBRE DE ASEGURADORA | VIGENCIA | | |
|---|---|---|---|---|
| | | FECHA INICIAL | FECHA VENCIMIENTO | VALOR AMPARADO |
| **Póliza de cumplimiento No: B-100041518 del 26 de abril 2024. Ampara el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones y estabilidad y calidad de la obra en virtud del Contrato Principal No. 2830 de 2023 – Anexo No. 5** | | | | |
| Cumplimiento | Compañía Mundial de Seguros NIT. 860.037.013-6 | 27-03-2024 | 31-10-2024 | $ 115.689.932,20 |
| Prestaciones Sociales | | 27-03-2024 | 30-06-2027 | $ 28.922.483,05 |
| Calidad del Servicio | | 30-06-2024 | 30-06-2029 | $ 57.844.966,10 |
| **Nota:** En este anexo se aclara la vigencia de los amparos de la presente póliza. | | | | |

| PÓLIZAS OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GARANTÍAS | NOMBRE DE ASEGURADORA | VIGENCIA | | |
| | | FECHA INICIAL | FECHA VENCIMIENTO | VALOR AMPARADO |
| **Póliza de cumplimiento No: B-100041518 del 03 de julio 2024. Ampara el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones y estabilidad y calidad de la obra en virtud del Contrato Principal No. 2830 de 2023 – Anexo No. 6** | | | | |
| Cumplimiento | Compañía Mundial de Seguros NIT. 860.037.013-6 | 30-06-2024 | 30-01-2025 | $ 115.689.932,20 |
| Prestaciones Sociales | | 30-06-2024 | 30-09-2027 | $ 28.922.483,05 |
| Calidad del Servicio | | 30-09-2024 | 30-09-2029 | $ 57.844.966,10 |

**Nota:**

| REGISTRO PRESUPUESTAL | No. | FECHA | VALOR | VALOR EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|
| | 10073 | 10/10/2023 | $578.449.661 | $ 438.782.988,00 |

De conformidad con el incio 4 del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e interventoría.

Según las labores desarrolladas por el suscrito Supervisor y los documentos y actas entregados por el apoyo a la supervisión de la Gobernación del Cauca se presenta la siguiente información:

## 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

### 2.1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO (Reuniones, socializaciones, comités y/o visitas realizadas)

| FECHA | ACTIVIDADES DESARROLLADAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| 27 DE AGOSTO DE 2024 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024. | **EJE 2: PASO POBLADO LA MARIANA: LONGITUD 243 M**<br>**SECCIÓN Y TIPO DE PAVIMENTO PROYECTADO: PLACA HUELLA, ANCHO 5M, CON CUNETA Y ALCANTARILLA.**<br><br>Se realiza seguimineto y acompañamiento a las labores de vaciado de concreto para pavimento en placa huella, vaciado de concreto ciclópeo, seguidamente de excavaciones e instalación de acero de refuerzo, fundición de huellas, vigas riostras y cunetas de forma monolítica.<br><br>Se ejecuta el tramo que va desde las abscisas K0+000 hasta K0+093. Con este subtramo construido se logra materilizar todo el tramo referente a la construccion de la placa huella.<br><br>Se verifica construcción de rampa de acceso y empalme con placa huella existente sobre el inicio del tramo.<br><br>**EJE 4: ENTRADA VEREDA RICAURTE: LONGITUD 88M**<br>**SECCIÓN Y TIPO DE PAVIMENTO PROYECTADO: PLACA HUELLA, ANCHO 5M, CON CUNETA.**<br><br>Se verificica levantamiento topográfico realizado en conjunto contratista e interventoría y se realiza ajuste de diseño geométrico de la vía.<br><br>Acompañamiento en las actividades de demilicion de placa huella existente.<br><br>Seguimiento a las actividades de excavación mecánica correspondiente para la explanación, ampliación y cajeo de la calzada a lo largo del tramo intervenido, así como también las excavaciones a que hubo lugar para reposición y mejoramiento de suelo de subrasante.<br><br>Seguimiento a las actividades de instalación de material granular "pedraplén" para mejoramiento de subrasante, debidamente compactado y nivelado a nivel de subrasante según diseños de vía. | Se viene realizando un seguimiento continuo al contrato de obra, apoyados del contratista de interventoría se realiza comunicación semanal indicando avance físico financiero y resaltando situaciones de obra a mejorar para contrarrestar percances de obra.<br><br>Se realiza comité técnico de obra conjuntamente contratista de obra, interventoría y supervisión para analizar situación de obra, evaluar situaciones adversar y resaltar compromisos a cumplir dentro del marco del contrato de obra en referencia.<br><br>Se solicita adelantar trámite del acta de suspensión No. 2 al contrato de obra teniendo en cuenta las distintas situaciones de orden público que han venido afectando el normal desarrollo de las obras y que se viene presentando constantemente en la zona de influencia al proyecto. |

| | | |
|---|---|---|
| | Seguimiento a las actividades de instalación manto de geotextil para protección y mejoramiento de subrasante.<br><br>Se realiza acompañamiento a la actividad de instalación, nivelación, humectación y compactación de capa de subbase granular la cual va desde las abscisas K0+000 y K0+088, sobre manto de geotextil.<br><br>Seguimineto y acompañamiento a las labores de vaciado de concreto para pavimento en placa huella, vaciado de concreto ciclópeo, seguidamente de excavaciones e instalación de acero de refuerzo, fundición de huellas, vigas riostras y cunetas de forma monolítica. Placa huella construida desde abscisas K0+000 hasta K0+088<br><br>Se verifica la remoción y traslado de material proveniente de la actividad de excavación y la explanación se ha llevado hasta sitio de disposición final.<br><br>**EJE 5: LOS MANDARINOS: LONGITUD 96 M**<br>**SECCIÓN Y TIPO DE PAVIMENTO PROYECTADO: PAVIEMENTO FLEXIBLE, ANCHO 4, INCLUIDO BORDILLOS.**<br><br>Se realiiza el aacompañamiento en las actividades de renivelación, humectación y compactación de capa de subbase granular la cual va desde las abscisas K0+000 y K0+096.<br><br>Se verifica conformación y vaciado de concreto para bordillos sobre ambos bordes de vía, culminando actividad en el presente corte completando subtramo desde las abscisas K0+000 hasta K0+096.<br><br>Se verifica la remoción y traslado de material proveniente de la actividad de excavación y la explanación se ha llevado hasta sitio de disposición final.<br><br>**EJE 6: EMPALME A LOS MANDARINOS: LONGITUD 115 M**<br>**SECCIÓN Y TIPO DE PAVIMENTO PROYECTADO: PAVIEMENTO FLEXIBLE, ANCHO 4, INCLUIDO BORDILLOS.**<br><br>Seguimiento actividades de topografia, replanteos y nivelacion de tramo para actividades de pavimento asfaltico. | |

| | | |
|---|---|---|
| | Segimiento actividad de instalación, nivelación, humectación y compactación de capa de subbase granular la cual va desde las abscisas K0+000 y K0+115, sobre zona pendiente lista para posterior instalación de base granular.<br><br>Se verifica conformación y vaciado de concreto para bordillos sobre ambos bordes de vía.<br><br>Se verifica la remoción y traslado de material proveniente de la actividad de excavación y la explanación se ha llevado hasta sitio de disposición final.<br><br>**EJE 7: SAN MIGUEL: LONGITUD 687 M**<br>**SECCIÓN Y TIPO DE PAVIMENTO PROYECTADO: PAVIMENTO FLEXIBLE, ANCHO 6M INCLUIDO BORDILLO, CON ANDEN Y ALCANTARILLAS.**<br><br>Se realiza acompañamiento en las actividades de topografia, replanteo de ejes, nivleacion de capas granular, alineamientos de la via. Se mantiene construyen las carteras para memeorias de cantiddades.<br><br>Se verifica actividad de instalacion de capa de base granular debidamente nivelada, humectada y compactada a lo largo del tramo iniciando desde abscisa final del tramo y en sentido contrario al abscisado para posterior actividades de paviemnto. Se verifica ensayos de calidad para cada capa granular instalada y se libera tramo para instalacion de carpeta asfaltica.<br><br>Se verifica actividades de excavación en material común para construccion de obras de contención (gaviones).<br><br>Se verifica la actividad de terraplen con material selleccionado para conformar superfici de apoyo para posterior construcción de andenes.<br><br>Se realiza acompañamiento y verificacion de los trabajos de limpieza y barrio superficie capa base granular y posterior riego de liga con emulcion asfáltica, actividad realizada en toda el area que cubre la calzada desde abscisas K0+150 hasta K0+500.<br><br>Verificación de la aplicación de la carpeta de asfalto con mezcla de tipo MDC- 19 sobre el subtramo que se comprende desde las abscisas K0+150 hasta K0+500. | |

| | | |
|---|---|---|
| | Se verifica la actividad de transporte de mezcla asfáltica desde planta de produccion hasta sitio de aplicación en obra.<br><br>Se verifica conformación y vaciado de concreto para bordillos sobre ambos bordes de vía, (bordillos pendientes sobre empalme), Se finaliza actividad en al tramo K0+000 hasta K0+690.<br><br>De igual manera se verifica actividad de conformación en superficie de apoyo y posterior vaciado de concreto en anden desde K0+048 hasta abscisa K0+690 sobre margen izquierdo.<br><br>Se verifica la remoción y traslado de material proveniente de la actividad de excavación y la explanación se ha llevado hasta sitio de disposición final.<br><br>**EJE 10: RANCHO CAÍDO: LONGITUD 180 M SECCIÓN Y TIPO DE PAVIMENTO PROYECTADO: PLACA HUELLA, ANCHO 5 INCLUIDO CUNETA Y BORDILLO, CON REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO.**<br><br>Se verificica levantamiento topográfico realizado en conjunto contratista e interventoría y se realiza ajuste de diseño geométrico de la vía.<br><br>Se realiza acompañamiento en las actividades de topografia, replanteo de ejes, nivleacion de capas granular, alineamientos de la via. Se mantiene construyen las carteras para memeorias de cantiddades.<br><br>Acompañamiento en las actividades de demilicion de placa huella existente.<br><br>Acompañamiento en las actividades de excavación varias sin clasificar para la instalación y reposición de la red de alcantarillado sanitario.<br><br>Se realiza acompañamiento en la instalación de tubería Novafort de diámetro 10" sobre colector principal del tramo.<br><br>Se realiza verificación en las actividades de instalación de sillas "Y" y tubería sanitaria de diámetro 6" para las redes domiciliarias.<br><br>Seguimiento y acompañamiento en las actividades de relleno y compactación sobre las tuberías existentes con material de sitio seleccionado. | |

| | | |
|---|---|---|
| | De igual manera se realiza seguimiento a las actividades de excavación mecánica correspondiente para la explanación, ampliación y cajeo de la calzada a lo largo del tramo intervenido, así como también las excavaciones a que hubo lugar para reposición y mejoramiento de suelo de subrasante. Desde abscisas K0+000 hasta K0+180.<br><br>Seguimiento a las actividades de instalación de material granular "pedraplén" para mejoramiento de subrasante, debidamente compactado y nivelado a nivel de subrasante según diseños de vía.<br><br>Se realiza acompañamiento a la actividad de instalación, nivelación, humectación y compactación de capa de subbase granular.<br><br>Se verifica la remoción y traslado de material proveniente de la actividad de excavación y la explanación se ha llevado hasta sitio de disposición final. | |

## 2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

### 2.2.1. RECURSOS COMPROMETIDOS

| ENTIDAD | NACIÓN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIOS | OTROS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Recursos iniciales** | | $578.449.661 | | | $578.449.661 |
| **Recursos adicionales** | | | | | |
| **Total, recursos comprometidos** | | | | | $578.449.661 |

### 2.2.2. MANEJO DEL ANTICIPO

| ENTIDAD | NACIÓN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIOS | OTROS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Anticipo entregado** | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Anticipo amortizado** | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Anticipo sin amortizar** | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

**2.2.3. BALANCE DE PAGOS**

| ACTA DE PAGO No. | FECHA | VALOR ACTA / DESEMBOLSO |
|---|---|---|
| 1 | | $ 70´975.773,33 |
| 2 | | $130´237.942,31 |
| 3 | | $ 70.194.863,20 |
| 4 | | $ 31.713.502,38 |
| 5 | | $ 68.849.970,42 |
| 6 | | $ 66.810.936,36 |
| **TOTALES** | | $ 438.782.988,00 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | | $578.449.661,00 |

**2.3. ANOTACIONES ADICIONALES**

N/A

**3. ANEXOS Y OBSERVACIONES**

Para el presente periodo de ejecución, que va hasta el 27 de agosto de 2024 y hasta el 17 de septiembre de 2024, que dentro de las condiciones contractuales actualmente se encuentra dentro de los plazos legalmente establecidos y con una fecha de terminación que va hasta el 30 de septiembre de 2024. Se muestra un avance físico financiero para el contrato de obra del 81.14% a corte de la presente acta, que corresponde a $4.449.256.052,07, este avance comparado con el programa de inversión vigente y flujo de caja muestra una diferencia negativa ya que a la fecha se debe tener un avance físico financiero de 85%.

**REGISTRO FOTOGRAFICO:**

**EJE 2: PASO POBLADO LA MARIANA: LONGITUD 243 M**
**SECCIÓN Y TIPO DE PAVIMENTO PROYECTADO: PLACA HUELLA, ANCHO 5M, CON CUNETA Y ALCANTARILLA.**


















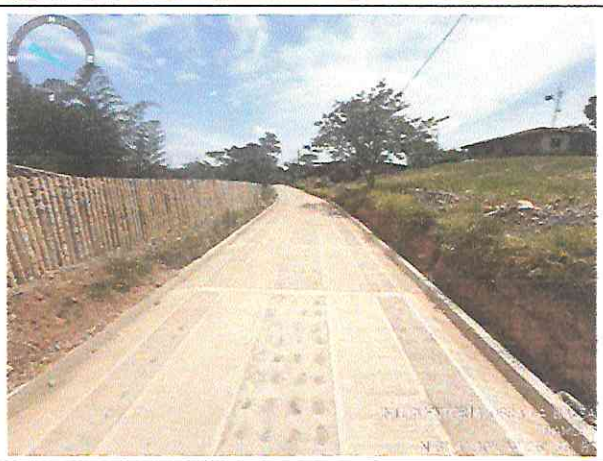

**EJE 4: ENTRADA VEREDA RICAURTE: LONGITUD 88M SECCIÓN Y TIPO DE PAVIMENTO PROYECTADO: PLACA HUELLA ANCHO 5M INCLUIDO CUNETA Y BORDILLO.**


27 ago 2024 13:24:33.02
Santander De Quilichao-Buenos Aires
Buenos Aires
Cauca
INTERVENTORIA
OBRA LA BALSA T4


27 ago 2024 13:25:48.57
199° S
Santander De Quilichao-Buenos Aires
Buenos Aires
Cauca
INTERVENTORIA
OBRA LA BALSA T4
DEMOLICION


30 ago 2024 16:08:36.39
10° N
Santander De Quilichao-Buenos Aires
Buenos Aires
Cauca
INTERVENTORIA
OBRA LA BALSA T4
CAJEO KO+000





















**EJE 5: LOS MANDARINOS: LONGITUD 96 M SECCIÓN Y TIPO DE PAVIMENTO PROYECTADO: PAVIMENTO FLEXIBLE, ANCHO 4M INCLUIDO BORDILLO.**






**EJE 6: EMPALME A LOS MANDARINOS: LONGITUD 115 M SECCIÓN Y TIPO DE PAVIMENTO PROYECTADO: PAVIMENTO FLEXIBLE, ANCHO 4M INCLUIDO BORDILLO.**

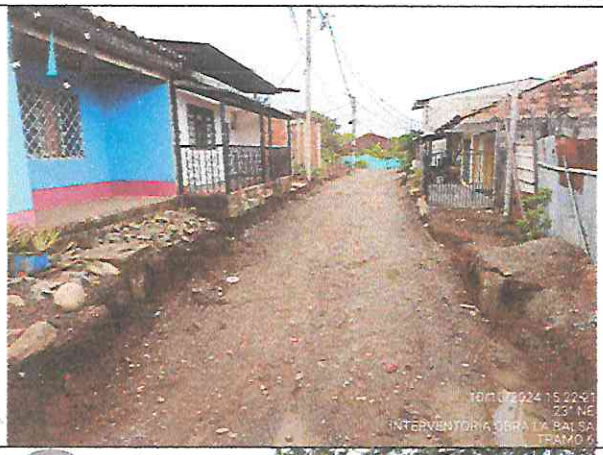

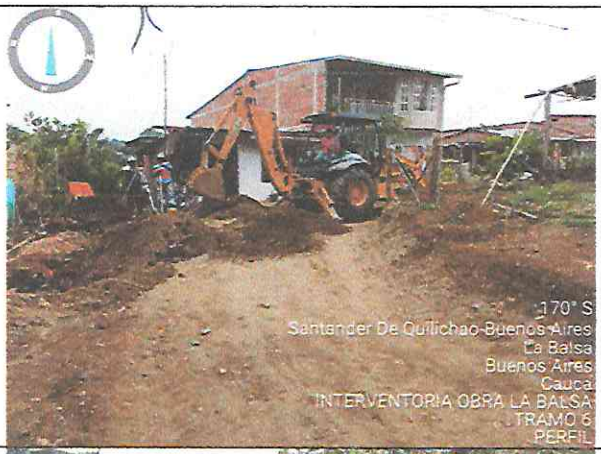









**EJE 7: SAN MIGUEL: LONGITUD 687 M SECCIÓN Y TIPO DE PAVIMENTO PROYECTADO: PAVIMENTO FLEXIBLE, ANCHO 6M INCLUIDO BORDILLO, CON ANDEN Y ALCANTARILLAS.**

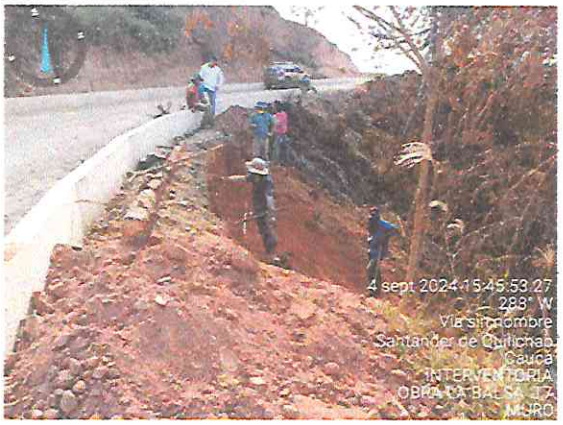






283° W
Municipio De Quilichao-Buenos Aires
Buenos Aires
Cauca
INTERVENTORIA OBRA LA BALSA
TRAMO 7
GAVIONES



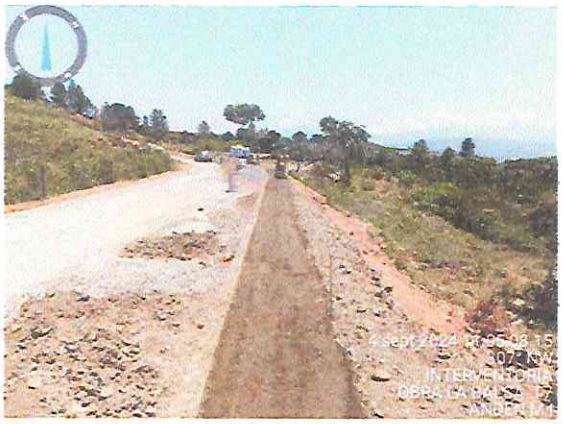



26 ago 2024 15:43:20.41
289° W
INTERVENTORIA
OBRA LA BALSA T7
ANDEN M I


DYN IPAC




INTERVENTORIA OBRA LA BALSA
TRAMO 7
RIEGO DE IMPRIMACIÓN


INTERVENTORIA OBRA LA BALSA
TRAMO 7
CARPETA ASFALTICA
IMPRIMACION

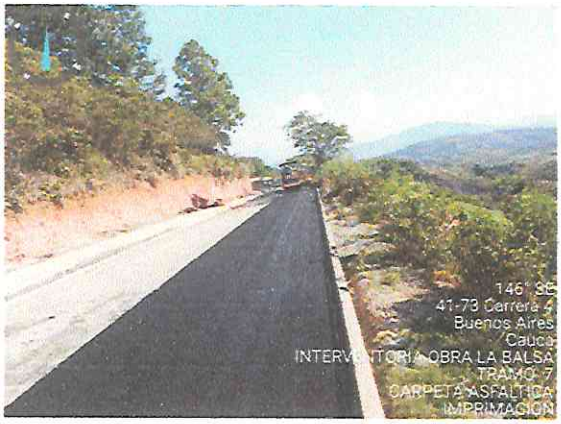
41-73 Carrera 4
Buenos Aires
Cauca
INTERVENTORIA OBRA LA BALSA
TRAMO 7
CARPETA ASFALTICA
IMPRIMACION













**EJE 10: RANCHO CAÍDO: LONGITUD 179M SECCIÓN Y TIPO DE PAVIMENTO PROYECTADO: PLACA HUELLA ANCHO 5M INCLUIDO CUNETA Y BORDILLO, CON REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO.**













128 SE
Buenos Aires
Cauca
INTERVENTORIA OBRA LA BALSA
TRAMO 10
PLACA HUELLA
DOMICILIARIAS


140 SE
Buenos Aires
Cauca
INTERVENTORIA OBRA LA BALSA
TRAMO 10
PLACA HUELLA
DOMICILIARIAS


166 S
Buenos Aires
Cauca
INTERVENTORIA OBRA LA BALSA
TRAMO 10
PLACA HUELLA
DOMICILIARIAS


149 SE
Buenos Aires
Cauca
INTERVENTORIA OBRA LA BALSA
TRAMO 10
PLACA HUELLA
DOMICILIARIAS
















**ANDRÉS ARTURO MEJÍA MADROÑERO**
**Supervisor**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

# DEPARTAMENTO DEL CAUCA
# SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
# CONTRATO DE INTERVENTORIA
# ACTA DE RECIBO Nº 06

## 1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO PRINCIPAL | CONTRATO N° 2830 - 2023 | |
| CONTRATANTE | DEPARTAMENTO DEL CAUCA | |
| CONTRATISTA INTERVENTOR | ZAFRA INGENIERIA SAS - R/L Ing. RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY | |
| SUPERVISOR | ING. ANDRES ARTURO MEJIA MADROÑERO | |
| OBJETO | "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS EN EL CORREGIMIENTO DE LA BALSA, MUNICIPIO DE BUENOS AIRES DEPARTAMENTO DEL CAUCA" | |
| *VALOR INICIAL DEL CONTRATO* | *$578,449,661* | *Incluido el IVA (19%)* |
| VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $578,449,661 | Incluido el IVA (19%) |
| PLAZO TOTAL | DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | |

## 2. PARTES QUE INTERVIENEN

En Popayán a los **DIECISIETE (17)** días del mes de **SEPTIEMBRE DE 2024**, se reunieron los Ingenieros: **ANDRÉS ARTURO MEJIA MADROÑERO** en su calidad de Supervisor por parte de la Secretaría de Infraestructura del Departamento del Cauca y **RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY** en su calidad de representante legal del **ZAFRA INGENIERIA S.A.S** en su calidad de Interventor, con el fin de elaborar la presenta **ACTA DE RECIBO Nº 06** del contrato mencionado anteriormente.

## 3. CRONOLOGIA

| | |
|---|---|
| FIRMA DEL CONTRATO PRINCIPAL | 09 DE OCTUBRE DE 2023 |
| PLAZO CONTRACTUAL | DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| INICIACION DEL CONTRATO PRINCIPAL | 18 DE OCTUBRE DE 2023 |
| VENCIMIENTO DEL CONTRATO | 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 |

## 4. VALOR CONSULTORIA CONTRATADA

| | |
|---|---|
| VALOR CONTRATO Nº 2830-2023 | $578,449,661.00 |
| VALOR CONTRATO ADICIONAL | |
| VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA CONTRATADA | $578,449,661.00 |

## 5. VALOR INTERVENTORIA EJECUTADA Y RECIBIDA PRESENTE ACTA

| CANT | DESCRIPCION | FORMA DE PAGO | PRESENTE ACTA | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS EN EL CORREGIMIENTO DE LA BALSA, MUNICIPIO DE BUENOS AIRES DEPARTAMENTO DEL CAUCA" | POR CUOTA FIJA 15% VR. CTO INTERVENTORIA (3 CUOTAS MENSUALES) | # CUOTA | # CUOTAS ACUMULADA |
| | | | 0.00 | 3.00 |
| | | POR PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA 75% VR. CONTRATO INTERVENTORIA | % AVANCE OBRA MES | % AVANCE OBRA ACUMULADO |
| | | | 15.40% | 81.14% |
| | | PROVISION LIQUIDACIÓN 10% VR. CONTRATO INTERVENTORIA | PAGO ACTA. LIQ | PAGO ACTA. LIQ |
| | | | 0.00% | 0.00% |

Para constancia se firma por los que intervienen.

**ING. RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY**
R.L. ZAFRA INGENIERIA SAS
Contratista de Interventoria

**ING. ANDRES ARTURO MEJIA MADROÑERO**
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DPTO DEL CAUCA
Supervisor del Contrato

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS EN EL CORREGIMIENTO DE LA BALSA, MUNICIPIO DE BUENOS AIRES DEPARTAMENTO DEL CAUCA" | PLAZO | DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | VR. CONTRATO | $ 578,449,661 | | CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 2830-2023 |
| | INICIO | 18-oct-2023 | | | | ACTA DE PAGO No. 06 |
| | TERMINACIÓN INICIAL | 31-dic-2023 | | | | |
| | SUSPENSION No. 1 | 26-dic-2023 | | | | 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| | REINICIO No. 1 | 27-mar-2024 | | | | |
| | OTRO SI No. 1 | 3 MESES | | | | PERIODO DE PAGO: 27 DE AGOSTO DE 2024 - 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| | OTRO SI No. 2 | 3 MESES | | | | |
| | TERMINACIÓN FINAL | 30-sep-2024 | VALOR TOTAL | $ 578,449,661 | | |

SUPERVISOR: ING. ANDRES ARTURO MEJIA MADROÑERO
CONTRATISTA: ZAFRA INGENIERIA SAS - REPRESENTANTE LEGAL Ing. RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY

## CONDICIONES CONTRACTUALES DE LA INTERVENTORIA

| ITEM | DESCRIPCION DE LA INTERVENTORIA | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS EN EL CORREGIMIENTO DE LA BALSA, MUNICIPIO DE BUENOS AIRES DEPARTAMENTO DEL CAUCA" | GLOBAL | 1.00 | $ 578,449,661 | $ 578,449,661 |

## INTERVENTORIA EJECUTADA

| FORMA DE PAGO - CONTRATO INICIAL | PORCENTAJE | VALOR TOTAL | VALOR POR MES o POR ACTA | PRESENTE ACTA | | | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MESES | % AVANCE OBRA | VALOR | MESES | % AVANCE OBRA | VALOR |
| MEDIANTE PAGOS FIJOS MENSUALES | 15.0% | $ 72,913,821.00 | $ 24,304,607.00 | | | $ - | 3.00 | | $ 72,913,821.00 |
| AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA | 75.0% | $ 364,569,114.29 | | | 15.40% | $ 56,143,644.00 | | 81.14% | $ 295,811,379.00 |
| AL RECIBO FINAL Y LIQUIDACION | 10.0% | $ 48,609,216.00 | | | | | | | |
| SUBTOTAL COSTO BÁSICO: | 100.0% | $ 486,092,151.29 | | | Vr. Básico Acta de Costos | $ 56,143,644.00 | | Vr Total Básico Costos | $ 368,725,200.00 |
| VALOR IVA: | 19.0% | $ 92,357,509.00 | | | Vr. IVA 19% | $ 10,667,292.36 | | Vr. Total IVA 19% | $ 70,057,788.00 |
| AJUSTE POR APROXIMACIONES | | $ 0.71 | | | | $ - | | | $ - |
| VALOR TOTAL: | | $ 578,449,661.00 | | | Vr. Presente Acta | $ 66,810,936.36 | | Vr. Total Ejecutado | $ 438,782,988.00 |

## RESUMEN CONTRATO DE INTERVENTORIA

| ESTADO DEL ANTICIPO : | | ESTADO DEL CONTRATO : | |
|---|---|---|---|
| VALOR ANTICIPO RECIBIDO DEL CONTRATO INICIAL | N.A. | VALOR CONTRATO PRINCIPAL $ | 578,449,661.00 |
| VALOR ACUMULADO AMORTIZADO ACTA ANTERIOR | N.A. | VALOR CONTRATO ADICIONAL: $ | - |
| VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA | N.A. | VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA $ | 66,810,936.36 |
| VALOR AMORTIZADO A LA FECHA | N.A. | VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA $ | 438,782,988.00 |
| SALDO POR AMORTIZAR | N.A. | SALDO POR EJECUTAR $ | 139,666,673.00 |

NOTAS: EL VALOR DE LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A: AVANCE DE OBRA: 15.40% (AVANCE DE OBRA REPORTADO PERIODO 27 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024, PARA UN AVANCE TOTAL EJECUTADO DE 81.14%)

La presente acta no exime al contratista e interventor de la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables.

| VALOR TOTAL PRESENTE ACTA DE PAGO | $66,810,936.36 | SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE |
|---|---|---|

REGIMEN: COMUN
CONSIGNAR : CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA No. 046269997352 A NOMBRE DE: ZAFRA INGENIERIA S.A.S NIT: 901.085.127-1
Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y del supervisor conforme al acta de recibo correspondiente.
La presente acta no exime al contratista de la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables.
El Supervisor del Departamento únicamente certifica que revisó matemáticamente el contenido de este documento

Aprobado para pago:

Ing. RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY
R.L. ZAZFRA INGENIERIA SAS
Contratista INTERVENTOR

ING. ANDRES ARTURO MEJÍA M.
P.U. SUPERVISOR DEL CONTRATO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

# ZAFRA INGENIERIA SAS

**CERTIFICACIÓN PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**

**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

**RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY,** identificado con cedula de ciudadanía **No. 13.840.816 de Bucaramanga** en mi condición de representante legal y **AMANDA LESMES VANEGAS** con cedula de ciudadanía **No. 63.513.254 de Bucaramanga y TP. 114118-T** como contador público de **ZAFRA INGENIERIA SAS** identificada con **NIT. 901.085.127-1,** certifico que durante los últimos seis (6) meses, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema social y parafiscales exigidos por la Ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes, para el personal vinculado que labora en las actividades del ***Contrato de Interventoría No. 2830 de 2023***, cuyo objeto es ***"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS EN EL CORREGIMIENTO DE LA BALSA, MUNICIPIO DE BUENOS AIRES DEPARTAMENTO DEL CAUCA"*** correspondiente al periodo del ACTA DE RECIBO Nº 06 comprendido del 27 de agosto de 2024 al 17 de septiembre de 2024.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia, se firma en Bucaramanga, a los diez (10) días del mes de septiembre de 2024.

**RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY**
C.C. 13.840.816 de Bucaramanga
REPRESENTANTE LEGAL
ZAFRA INGENIERIA SAS
NIT. 901.085.127-1

**AMANDA LESMES VANEGAS**
C.C. 63.513.254 de Bucaramanga
CONTADOR PÚBLICO TP: 114118-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C8CD7DAAC175A7E4

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**


**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **AMANDA LESMES VANEGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63513254 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 114118-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
114118-T
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FECHA 2005/10/18
LUZ MYRIAM DIAZ MUNOZ

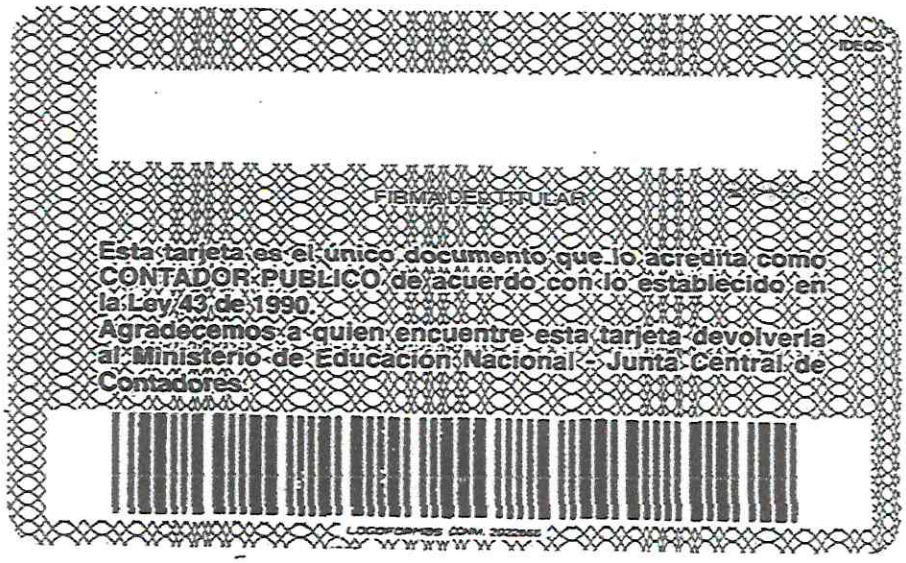
IDECO
FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.513.254
LESMES VANEGAS

APELLIDOS
AMANDA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-AGO-1976
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

31-OCT-1994 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00241740-F-0063513254-20100617 0022328636A 1 6860858364

# ZAFRA INGENIERIA SAS

**CERTIFICACIÓN PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**

**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

**RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY,** identificado con cedula de ciudadanía **No. 13.840.816 de Bucaramanga** en mi condición de representante legal y **AMANDA LESMES VANEGAS** con cedula de ciudadanía **No. 63.513.254 de Bucaramanga y TP. 114118-T** como contador público de **ZAFRA INGENIERIA SAS** identificada con **NIT. 901.085.127-1,** bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bucaramanga, a los diez (10) días del mes de septiembre de 2024.

**RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY**
C.C. 13.840.816 de Bucaramanga
REPRESENTANTE LEGAL
ZAFRA INGENIERIA SAS
NIT. 901.085.127-1

**AMANDA LESMES VANEGAS**
C.C. 63.513.254 de Bucaramanga
CONTADOR PÚBLICO TP: 114118-T

Carrera 40 No. 48-33 Apto 1804 Edificio Casa 40
Bucaramanga –Santander
3176606181
razafra@hotmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO SUB 134181
RADICADO No. 2020_5446509 24 JUN 2020

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN TRAMITE DE PRESTACIONES ECONOMICAS EN EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACION DEFINIDA (VEJEZ - ORDINARIA)

EL SUBDIRECTOR DE DETERMINACION DE LA DIRECCION DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, en uso de las atribuciones inherentes al cargo y,

**CONSIDERANDO**

Que el (la) señor(a) **ZAFRA DULCEY RAFAEL AUGUSTO,** identificado(a) con CC No. 13,840,816, solicita el 4 de junio de 2020 el reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de VEJEZ, radicada bajo el No 2020_5446509.

**CONSIDERACIONES**

Que el (la) señor(a) **ZAFRA DULCEY RAFAEL AUGUSTO** ha prestado los siguientes servicios:

| ENTIDAD LABORO | DESDE | HASTA | NOVEDAD | DIAS |
|---|---|---|---|---|
| SERV Y ASESORIAS SDER LTDA | 19820701 | 19830114 | TIEMPO SERVICIO | 198 |
| SERV Y ASESORIAS SDER LTDA | 19830201 | 19830531 | TIEMPO SERVICIO | 120 |
| SERV Y ASESORIAS SDER LTDA | 19830601 | 19840301 | TIEMPO SERVICIO | 275 |
| CONSTRUCTORA ARCO LTDA | 19910313 | 19910605 | TIEMPO SERVICIO | 85 |
| ALVARO VASQUEZ Y CIA LTDA | 19911112 | 19920104 | TIEMPO SERVICIO | 54 |
| 1 BELTRAN PINZON LTD ING CIV | 19920330 | 19921231 | TIEMPO SERVICIO | 277 |
| 1 BELTRAN PINZON LTD ING CIV | 19930101 | 19930131 | TIEMPO SERVICIO | 31 |
| 1 BELTRAN PINZON LTD ING CIV | 19930201 | 19930802 | TIEMPO SERVICIO | 183 |
| JAIMES JAIMES MIGUEL F. | 19940419 | 19941231 | TIEMPO SERVICIO | 257 |
| MIGUEL FERNANDO JAIMES JAIMES | 19950101 | 19951231 | TIEMPO SERVICIO | 360 |
| MIGUEL FERNANDO JAIMES JAIMES | 19960101 | 19960630 | TIEMPO SERVICIO | 180 |
| MIGUEL FERNANDO JAIMES JAIMES | 19960701 | 19960723 | TIEMPO SERVICIO | 23 |
| ZAFRA DULCEY RAFAEL AUGUSTO | 19960701 | 19960707 | TIEMPO SERVICIO | 7 |
| ZAFRA DULCEY RAFAEL AUGUSTO | 19960801 | 19960831 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY | 19960901 | 19961231 | TIEMPO SERVICIO | 120 |
| ZAFRA DULCEY RAFAEL AUGUSTO | 19970101 | 19970731 | TIEMPO SERVICIO | 210 |
| ZAFRA DULCEY RAFAEL | 19970901 | 19971231 | TIEMPO SERVICIO | 120 |

SUB 134181
24 JUN 2020

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AUGUSTO | | | | |
| RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY | 19980101 | 19980131 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| ZAFRA DULCEY RAFAEL AUGUSTO | 19980201 | 19980531 | TIEMPO SERVICIO | 120 |
| ZAFRA DULCEY RAFAEL AUGUSTO | 19980601 | 19980630 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| ZAFRA DULCEY RAFAEL AUGUSTO | 19980701 | 19981231 | TIEMPO SERVICIO | 180 |
| ZAFRA DULCEY RAFAEL AUGUSTO | 19990101 | 19990131 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| ZAFRA DULCEY RAFAEL AUGUSTO | 19990201 | 19990429 | TIEMPO SERVICIO | 89 |
| ZAFRA DULCEY RAFAEL AUGUSTO | 19990501 | 19991231 | TIEMPO SERVICIO | 240 |
| ZAFRA DULCEY RAFAEL AUGUSTO | 20000101 | 20000131 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY | 20000201 | 20000229 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| ZAFRA DULCEY RAFAEL AUGUSTO | 20000301 | 20001231 | TIEMPO SERVICIO | 300 |
| ZAFRA DULCEY RAFAEL AUGUSTO | 20010101 | 20010131 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY | 20010201 | 20011231 | TIEMPO SERVICIO | 330 |
| RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY | 20020101 | 20020131 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY | 20020201 | 20020831 | TIEMPO SERVICIO | 210 |
| RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY | 20020901 | 20020929 | TIEMPO SERVICIO | 29 |
| RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY | 20021001 | 20021029 | TIEMPO SERVICIO | 29 |
| RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY | 20021101 | 20021231 | TIEMPO SERVICIO | 60 |
| RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY | 20030101 | 20030131 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY | 20030201 | 20031130 | TIEMPO SERVICIO | 300 |
| RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY | 20031201 | 20031231 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY | 20040101 | 20040128 | TIEMPO SERVICIO | 28 |
| RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY | 20040201 | 20040630 | TIEMPO SERVICIO | 150 |
| RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY | 20040701 | 20041231 | TIEMPO SERVICIO | 180 |
| RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY | 20050101 | 20050129 | TIEMPO SERVICIO | 29 |
| RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY | 20050201 | 20050228 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| UNI SANTANDER | 20050201 | 20050228 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY | 20050301 | 20050331 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| UNI SANTANDER | 20050301 | 20050430 | TIEMPO SERVICIO | 60 |
| RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY | 20050401 | 20050429 | TIEMPO SERVICIO | 29 |
| RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY | 20050501 | 20050529 | TIEMPO SERVICIO | 29 |
| UNI SANTANDER | 20050501 | 20050531 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY | 20050601 | 20050629 | TIEMPO SERVICIO | 29 |
| ZAFRA DULCEY RAFAEL AUGUSTO | 20050701 | 20051231 | TIEMPO SERVICIO | 180 |
| ZAFRA DULCEY RAFAEL AUGUSTO | 20060101 | 20060129 | TIEMPO SERVICIO | 29 |
| ZAFRA DULCEY RAFAEL AUGUSTO | 20060201 | 20060430 | TIEMPO SERVICIO | 90 |

SUB 134181
24 JUN 2020

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZAFRA DULCEY RAFAEL AUGUSTO | 20060501 | 20060731 | TIEMPO SERVICIO | 90 |
| ZAFRA DULCEY RAFAEL AUGUSTO | 20060801 | 20061031 | TIEMPO SERVICIO | 90 |
| RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY | 20061101 | 20061231 | TIEMPO SERVICIO | 60 |
| RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY | 20070101 | 20070630 | TIEMPO SERVICIO | 180 |
| ZAFRA DULCEY RAFAEL AUGUSTO | 20070701 | 20070731 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| ZAFRA DULCEY RAFAEL AUGUSTO | 20070801 | 20071031 | TIEMPO SERVICIO | 90 |
| ZAFRA DULCEY RAFAEL AUGUSTO | 20071101 | 20071130 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| ZAFRA DULCEY RAFAEL AUGUSTO | 20071201 | 20071229 | TIEMPO SERVICIO | 29 |
| ZAFRA DULCEY RAFAEL AUGUSTO | 20080101 | 20080129 | TIEMPO SERVICIO | 29 |
| ZAFRA DULCEY RAFAEL AUGUSTO | 20080201 | 20080229 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| ZAFRA DULCEY RAFAEL AUGUSTO | 20080301 | 20080328 | TIEMPO SERVICIO | 28 |
| ZAFRA DULCEY RAFAEL AUGUSTO | 20080401 | 20080429 | TIEMPO SERVICIO | 29 |
| ZAFRA DULCEY RAFAEL AUGUSTO | 20080501 | 20080529 | TIEMPO SERVICIO | 29 |
| ZAFRA DULCEY RAFAEL AUGUSTO | 20080701 | 20080731 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY | 20080801 | 20080930 | TIEMPO SERVICIO | 60 |
| ZAFRA DULCEY RAFAEL AUGUSTO | 20081001 | 20081031 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY | 20081101 | 20081231 | TIEMPO SERVICIO | 60 |
| RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY | 20090101 | 20091231 | TIEMPO SERVICIO | 360 |
| RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY | 20100101 | 20100930 | TIEMPO SERVICIO | 270 |
| RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY | 20101001 | 20101231 | TIEMPO SERVICIO | 90 |
| RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY | 20110101 | 20111231 | TIEMPO SERVICIO | 360 |
| MESA BARRERA RAMIRO | 20110301 | 20111231 | TIEMPO SERVICIO | 300 |
| MESA BARRERA RAMIRO | 20120101 | 20120229 | TIEMPO SERVICIO | 60 |
| RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY | 20120101 | 20121231 | TIEMPO SERVICIO | 360 |
| MESA BARRERA RAMIRO | 20120301 | 20120314 | TIEMPO SERVICIO | 14 |
| RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY | 20130101 | 20130430 | TIEMPO SERVICIO | 120 |
| RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY | 20130501 | 20130731 | TIEMPO SERVICIO | 90 |
| ZAFRA DULCEY RAFAEL AUGUSTO | 20130901 | 20131231 | TIEMPO SERVICIO | 120 |
| UNION TEMPORAL ARCA | 20140101 | 20140124 | TIEMPO SERVICIO | 24 |
| ZAFRA DULCEY RAFAEL AUGUSTO | 20140101 | 20140831 | TIEMPO SERVICIO | 240 |
| UNION TEMPORAL ARCA | 20140201 | 20140228 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| UNION TEMPORAL ARCA | 20140301 | 20140315 | TIEMPO SERVICIO | 15 |
| RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY | 20140901 | 20141231 | TIEMPO SERVICIO | 120 |
| LAB DE SUELOS PAVIMENTOS Y CON | 20150101 | 20150123 | TIEMPO SERVICIO | 23 |
| RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY | 20150101 | 20150331 | TIEMPO SERVICIO | 90 |
| LAB DE SUELOS PAVIMENTOS Y CON | 20150201 | 20150531 | TIEMPO SERVICIO | 120 |
| CONSORCIO CARRETERAS OPTIMAS D | 20150301 | 20150331 | TIEMPO SERVICIO | 30 |

SUB 134181
24 JUN 2020

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY | 20150401 | 20151231 | TIEMPO SERVICIO | 270 |
| LAB DE SUELOS PAVIMENTOS Y CON | 20150601 | 20150604 | TIEMPO SERVICIO | 4 |
| LAB DE SUELOS PAVIMENTOS Y CON | 20150701 | 20150703 | TIEMPO SERVICIO | 3 |
| RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY | 20160101 | 20161231 | TIEMPO SERVICIO | 360 |
| RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY | 20170101 | 20170831 | TIEMPO SERVICIO | 240 |
| PEDRAZA RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE | 20170901 | 20170914 | TIEMPO SERVICIO | 14 |
| ZAFRA DULCEY RAFAEL AUGUSTO | 20170901 | 20170930 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| PEDRAZA RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE | 20171001 | 20171130 | TIEMPO SERVICIO | 60 |
| ZAFRA DULCEY RAFAEL AUGUSTO | 20171001 | 20171231 | TIEMPO SERVICIO | 90 |
| PEDRAZA RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE | 20171201 | 20171201 | TIEMPO SERVICIO | 1 |
| ZAFRA DULCEY RAFAEL AUGUSTO | 20171201 | 20171231 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| ZAFRA INGENIERIA SAS | 20180101 | 20180129 | TIEMPO SERVICIO | 29 |
| ZAFRA INGENIERIA SAS | 20180201 | 20181231 | TIEMPO SERVICIO | 330 |
| UNION TEMPORAL INTERVIAL TOTUM | 20180501 | 20180731 | TIEMPO SERVICIO | 90 |
| UNION TEMPORAL INTERVIAL TOTUM | 20180801 | 20180819 | TIEMPO SERVICIO | 19 |
| FERNANDO SERRANO CORDERO | 20181001 | 20181231 | TIEMPO SERVICIO | 90 |
| CONSORCIO QUINDIO S Y G | 20181101 | 20181112 | TIEMPO SERVICIO | 12 |
| CONSORCIO INTER SAN ALBERTO | 20190101 | 20190109 | TIEMPO SERVICIO | 9 |
| FERNANDO SERRANO CORDERO | 20190101 | 20190930 | TIEMPO SERVICIO | 270 |
| ZAFRA INGENIERIA SAS | 20190101 | 20190131 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| CONSORCIO INTER SAN ALBERTO | 20190201 | 20190831 | TIEMPO SERVICIO | 210 |
| ZAFRA INGENIERIA SAS | 20190201 | 20191231 | TIEMPO SERVICIO | 330 |
| COMPANIA EJECUTORA DE PROYECTO | 20190801 | 20190801 | TIEMPO SERVICIO | 1 |
| UNION TEMPORAL CONSTRUSANGIL 2 | 20190801 | 20191231 | TIEMPO SERVICIO | 150 |
| CONSORCIO INTER SAN ALBERTO | 20190901 | 20190921 | TIEMPO SERVICIO | 21 |
| FERNANDO SERRANO CORDERO | 20191001 | 20191007 | TIEMPO SERVICIO | 7 |
| UNION TEMPORAL CONSTRUSANGIL 2 | 20200101 | 20200131 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| ZAFRA INGENIERIA SAS | 20200101 | 20200531 | TIEMPO SERVICIO | 150 |

Que conforme lo anterior, el (la) señor(a) **ZAFRA DULCEY RAFAEL AUGUSTO** acredita un total de 10,518 días laborados, correspondientes a 1,502 semanas.

Que el (la) señor(a) **ZAFRA DULCEY RAFAEL AUGUSTO** nació el 1 de junio de 1958 y actualmente cuenta con 62 años de edad.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, los requisitos para obtener la pensión de vejez, son los siguientes: haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre. A partir del 1 de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.

SUB 134181
24 JUN 2020

A partir del 1 de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará, así:

| AÑO | SEMANAS | EDAD HOMBRE | EDAD MUJER |
|---|---|---|---|
| 2005 | 1050 | 60 | 55 |
| 2006 | 1075 | 60 | 55 |
| 2007 | 1100 | 60 | 55 |
| 2008 | 1125 | 60 | 55 |
| 2009 | 1150 | 60 | 55 |
| 2010 | 1175 | 60 | 55 |
| 2011 | 1200 | 60 | 55 |
| 2012 | 1225 | 60 | 55 |
| 2013 | 1250 | 60 | 55 |
| 2014 | 1275 | 62 | 57 |
| 2015 | 1300 | 62 | 57 |

Que para obtener el ingreso base de liquidación de la presente prestación, se dará aplicación a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993; el cual establece: *"Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.*

*Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo".*

Que igualmente el monto de la presente prestación, se define de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 797 de 2003, por el cual se modifica el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, en los siguientes términos: *"... A partir del 1 de enero del año 2004 se aplicarán las siguientes reglas:*

*El monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas mínimas de cotización requeridas, será del equivalente al 65%, del ingreso base de liquidación de los afiliados. Dicho porcentaje se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:*

*r = 65.50 - 0.50 s, donde:*
*r =porcentaje del ingreso de liquidación.*
*s = número de salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

*A partir del 2005, por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo.*

SUB 134181
24 JUN 2020

*El valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima".*

Que para obtener el ingreso base de cotización de la presente prestación, se toman los factores salariales establecidos en los artículos 18 y 19 de la Ley 100 de 1993 y artículo 1 del Decreto 1158 del 3 de junio de 1994, según el caso.

Que los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, establecen que la pensión se reconocerá reunidos los requisitos mínimos y será necesaria su desafiliación al régimen para que se pueda disfrutar de la misma; para su liquidación se tendrá en cuenta hasta la última semana efectivamente cotizada.

Que de conformidad con la Circular Interna 24 de 2018 por medio de la cual se modifica el numeral 1.6.5 de la 01 del 01 de octubre de 2012, emitida por la Oficina Asesora de Asuntos Legales de la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, en el sentido de establecer el disfrute de la pensión de vejez bajo las siguientes reglas de efectividad:

> *c. Para que haya lugar al pago del retroactivo pensional, el trabajador dependiente deberá acreditar que ha cumplido los requisitos para obtener el derecho a la pensión y, además,, el retiro con el último empleador.*
>
> ***Si no aparece registrada la desafiliación con el último empleador, la prestación se reconocerá a corte de nómina.***
>
> *Cuando se advierta la existencia de cotización de dos o más empleadores privados simultáneamente, en el último ciclo de la historia aboral, únicamente se exigirá el retiro con uno de ellos. para conceder el pago de las mesadas retroactivas a las que pudiere haber lugar.*

Que a partir de lo anteriormente enunciado se procedió a realizar la liquidación de la prestación reconocida, la cual se resume de la siguiente manera:

IBL: $8,421,031 x 66.70% = $5,616,828

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE.

Para el análisis de la pensión reconocida, se tomó en cuenta que el (la) peticionario (a) cumple los requisitos para los siguientes tipos de pensión, siendo aplicada por favorabilidad el indicado en la columna "Aceptada Sistema":

| Nombre | Fecha Status | Fecha Efectividad | VALOR IBL 1 | VALOR IBL 2 | Mejor IBL | % IBL | Valor Pensión Mensual | Aceptada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 semanas progresivas, 55 o 60 años de edad Ley 797 del 2003- Legal | 1 de junio de 2020 | 1 de julio de 2020 | 8,421,031.00 | 3,807,484.00 | 1 | 66.70 | 5,616,828.00 | SI |

SUB 134181
24 JUN 2020

Que es pertinente indicar, al momento de determinar el Ingreso Base de Liquidación se procedió a aplicar el tope máximo a los valores reportados como Ingreso Base de Cotización y demás factores, teniendo en cuenta que estos no pueden superar el monto máximo, de acuerdo a lo establecido por el régimen legal y para los periodos correspondientes.

El disfrute de la presente pensión será a corte de nómina, es decir, a partir de 01 de julio de 2020, toda vez que revisada la historia laboral del(la) señor(a) **ZAFRA DULCEY RAFAEL AUGUSTO** NO se evidencia la novedad de Retiro para el ciclo 202005 con el empleador ZAFRA INGENIERIA SAS Nit 901085127.

Esta pensión estará a cargo de:

| ENTIDAD | DÍAS |
|---|---|
| ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES | 10518 |

Son disposiciones aplicables: Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003 y C.P.A.C.A.

En mérito de lo expuesto,

**R E S U E L V E**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Reconocer el pago de una PENSIÓN DE VEJEZ a favor del (la) señor(a) **ZAFRA DULCEY RAFAEL AUGUSTO**, ya identificado(a), en los siguientes términos y cuantías:

Valor mesada a 1 de julio de 2020 = $5,616,828

**ARTÍCULO SEGUNDO:** La presente prestación será ingresada en la nómina del periodo 202007 que se paga en el periodo 202008 en la central de pagos del banco BBVA C. P. 1ERA QUINCENA de PIEDECUESTA CR 15 10N 65 LC 6 7 8 9 PIEDECUESTA.

**ARTÍCULO TERCERO:** A partir de la inclusión en nómina de la presente prestación, se harán los respectivos descuentos en salud conforme a la ley 100 de 1993 en SALUD MIA EPS.

**ARTÍCULO CUARTO:** Esta pensión estará a cargo de:

| ENTIDAD | DÍAS |
|---|---|
| COLPENSIONES | 10518 |

**ARTÍCULO QUINTO:** Notifíquese al (la) Señor (a) **ZAFRA DULCEY RAFAEL AUGUSTO** haciéndole saber que contra el presente acto administrativo puede interponer por escrito los recursos de Reposición y/o Apelación. De estos recursos podrá hacerse uso dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, manifestando por escrito las razones de inconformidad, según el C.P.A.C.A.

SUB 134181
24 JUN 2020

Dada en Bogotá, D.C. a:

COMUNIQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DALIA TERESA GAMBOA NARANJO
SUBDIRECTORA DE DETERMINACIÓN VI
COLPENSIONES

JORGE LUIS CUETO BELTRAN

JUAN ALBERTO JARAMILLO VALENCIA
ANALISTA COLPENSIONES

COL-VEJ-03-501,2

# ZAFRA INGENIERIA SAS

# AGOSTO 2024

Carrera 40 No. 48-33 Apto 1804 Edificio Casa 40
Bucaramanga – Santander
3176606181
razafra@hotmail.com

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

## SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 13840816

Bancolombia

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre ó Razón Social | ZAFRA INGENIERIA SAS | | |
| Tipo Identificación | NIT | Número de Identificación | 901085127 |
| Ciudad/Municipio | FLORIDABLANCA | Departamento | SANTANDER |
| Dirección | CALLE 30 22 200 APTO 103 | Teléfono | 6398008 |
| Tipo Empresa | PRIVADA | Actividad Económica | Actividades de arquitectura e |
| Tipo Aportante | 01-EMPLEADOR | Clase Aportante | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| Forma Presentación | SUCURSAL | Sucursal/Dependencia | 002 - ADMINISTRACION |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | 7940185011 | Tipo de Planilla | E-EMPLEADOS |
| Periodo Cotización Otros | agosto / 2024 | Periodo Cotización Salud | septiembre / 2024 |
| Dias de Mora | 3 | Fecha Pago | 2024/09/09 |
| Número Autorización | 898092112 | | |

| INFORMACIÓN BÁSICA | | | |
|---|---|---|---|
| Nombres | RAFAEL AUGUSTO | Apellidos | ZAFRA DULCEY |
| Tipo de Identificación | CC | Número de Identificación | 13840816 |
| Tipo cotizante | DEPEND | Subtipo Cotizante | REQ CUMP PENS |
| Colombiano Temporalmente en el Exterior | NO | Extranjero no obligado a cotizar Pensión | NO |
| COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) : | | | SI |
| Departamento | SANTANDER | Municipio | BUCARAMANGA |
| Salario Básico | $ 5.580.000 | Tipo de Salario | FIJO |

**NOVEDADES**

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 01-30 | | | | | | | | | |

| APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL | | | |
|---|---|---|---|
| **SALUD** | | Administradora | EPS005-SANITAS S.A. |
| Dias | 30 | IBC | $ 6.500.000 |
| Tarifa | 4,000 % | Cotización Obligatoria | $ 260.000 |
| Nro Incapacidad por Enf. General | | Valor | $ 0 |
| Nro Licencia de Maternidad | | Valor | $ 0 |
| Valor ADRES | $ 0 | **Total Aporte** | **$ 260.000** |

| RIESGOS PROFESIONALES | | | |
|---|---|---|---|
| Días | 30 | Administradora | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE |
| Clase de Riesgo | V | IBC | $ 6.500.000 |
| Centro de Trabajo | | Tarifa | 6,960 % |
| | | **Total Aporte** | **$ 452.400** |

**APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES**

| Administradora | Dias Cotizados | Tarifa | IBC | Total Aporte |
|---|---|---|---|---|
| CCF40-COMFENALCO SANTANDER | 30 | 4,000 % | $ 6.500.000 | $ 260.000 |

| **TOTAL PAGADO:** | **$ 972.400** |
|---|---|

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

## SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 10537854

Bancolombia

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre ó Razón Social | ZAFRA INGENIERIA SAS | | |
| Tipo Identificación | NIT | Número de Identificación | 901085127 |
| Ciudad/Municipio | FLORIDABLANCA | Departamento | SANTANDER |
| Dirección | CALLE 30 22 200 APTO 103 | Teléfono | 6398008 |
| Tipo Empresa | PRIVADA | Actividad Económica | Actividades de arquitectura e |
| Tipo Aportante | 01-EMPLEADOR | Clase Aportante | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| Forma Presentación | SUCURSAL | Sucursal/Dependencia | 001 - PERSONAL OBRA |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | 1744973014 | Tipo de Planilla | E-EMPLEADOS |
| Periodo Cotización Otros | agosto / 2024 | Periodo Cotización Salud | septiembre / 2024 |
| Dias de Mora | 3 | Fecha Pago | 2024/09/09 |
| Número Autorización | 461134 | | |

| INFORMACIÓN BÁSICA | | | |
|---|---|---|---|
| Nombres | VICTOR ELADIO | Apellidos | MANZANO BRAVO |
| Tipo de Identificación | CC | Número de Identificación | 10537854 |
| Tipo cotizante | DEPEND | Subtipo Cotizante | |
| Colombiano Temporalmente en el Exterior | NO | Extranjero no obligado a cotizar Pensión | NO |
| COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) : | | | SI |
| Departamento | CAUCA | Municipio | POPAYAN |
| Salario Básico | $ 5.570.000 | Tipo de Salario | FIJO |

**NOVEDADES**

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

**APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL**

| PENSIÓN | | Administradora | 25-14 COLPENSIONES |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | IBC | $ 5.570.000 |
| Tarifa | 16,000 % | Cotización Obligatoria | $ 891.200 |
| FSP - Solidaridad | $ 27.900 | FSP - Subsistencia | $ 27.900 |
| Aportes Voluntarios Empleador | $ 0 | Aportes Voluntarios Cotizante | $ 0 |
| Indicadador tarifa especial | Normal | **Total Aporte** | **$ 947.000** |

| SALUD | | Administradora | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | IBC | $ 5.570.000 |
| Tarifa | 4,000 % | Cotización Obligatoria | $ 222.800 |
| Nro Incapacidad por Enf. General | | Valor | $ 0 |
| Nro Licencia de Maternidad | | Valor | $ 0 |
| Valor ADRES | $ 0 | **Total Aporte** | **$ 222.800** |

| RIESGOS PROFESIONALES | | Administradora | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | IBC | $ 5.570.000 |
| Clase de Riesgo | V | Tarifa | 6,960 % |
| Centro de Trabajo | | **Total Aporte** | **$ 387.700** |

**APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES**

| Administradora | Dias Cotizados | Tarifa | IBC | Total Aporte |
|---|---|---|---|---|
| CCF14-COMFACAUCA | 30 | 4,000 % | $ 5.570.000 | $ 222.800 |

| **TOTAL PAGADO:** | **$ 1.780.300** |
|---|---|

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

## SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1088974605

Bancolombia

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre ó Razón Social | ZAFRA INGENIERIA SAS | | |
| Tipo Identificación | NIT | Número de Identificación | 901085127 |
| Ciudad/Municipio | FLORIDABLANCA | Departamento | SANTANDER |
| Dirección | CALLE 30 22 200 APTO 103 | Teléfono | 6398008 |
| Tipo Empresa | PRIVADA | Actividad Económica | Actividades de arquitectura e |
| Tipo Aportante | 01-EMPLEADOR | Clase Aportante | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| Forma Presentación | SUCURSAL | Sucursal/Dependencia | 001 - PERSONAL OBRA |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | **1744973014** | Tipo de Planilla | E-EMPLEADOS |
| Periodo Cotización Otros | agosto / 2024 | Periodo Cotización Salud | septiembre / 2024 |
| Dias de Mora | 3 | Fecha Pago | 2024/09/09 |
| Número Autorización | 461134 | | |

| INFORMACIÓN BÁSICA | | | |
|---|---|---|---|
| Nombres | EDIXON JAVIER | Apellidos | ZULUAGA NANEZ |
| Tipo de Identificación | CC | Número de Identificación | 1088974605 |
| Tipo cotizante | DEPEND | Subtipo Cotizante | |
| Colombiano Temporalmente en el Exterior | NO | Extranjero no obligado a cotizar Pensión | NO |
| COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) : | | | SI |
| Departamento | CAUCA | Municipio | POPAYAN |
| Salario Básico | $ 5.000.000 | Tipo de Salario | FIJO |

**NOVEDADES**

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

**APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL**

| PENSIÓN | | Administradora | 230201- PROTECCION |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | IBC | $ 5.000.000 |
| Tarifa | 16,000 % | Cotización Obligatoria | $ 800.000 |
| FSP - Solidaridad | $ 0 | FSP - Subsistencia | $ 0 |
| Aportes Voluntarios Empleador | $ 0 | Aportes Voluntarios Cotizante | $ 0 |
| Indicadador tarifa especial | Normal | **Total Aporte** | **$ 800.000** |

| SALUD | | Administradora | EPS037-NUEVA EPS |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | IBC | $ 5.000.000 |
| Tarifa | 4,000 % | Cotización Obligatoria | $ 200.000 |
| Nro Incapacidad por Enf. General | | Valor | $ 0 |
| Nro Licencia de Maternidad | | Valor | $ 0 |
| Valor ADRES | $ 0 | **Total Aporte** | **$ 200.000** |

| RIESGOS PROFESIONALES | | Administradora | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | IBC | $ 5.000.000 |
| Clase de Riesgo | V | Tarifa | 6,960 % |
| Centro de Trabajo | | **Total Aporte** | **$ 348.000** |

**APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES**

| Administradora | Dias Cotizados | Tarifa | IBC | Total Aporte |
|---|---|---|---|---|
| CCF14-COMFACAUCA | 30 | 4,000 % | $ 5.000.000 | $ 200.000 |

| **TOTAL PAGADO:** | **$ 1.548.000** |
|---|---|

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

## SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 10302831

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre ó Razón Social | ZAFRA INGENIERIA SAS | | |
| Tipo Identificación | NIT | Número de Identificación | 901085127 |
| Ciudad/Municipio | FLORIDABLANCA | Departamento | SANTANDER |
| Dirección | CALLE 30 22 200 APTO 103 | Teléfono | 6398008 |
| Tipo Empresa | PRIVADA | Actividad Económica | Actividades de arquitectura e |
| Tipo Aportante | 01-EMPLEADOR | Clase Aportante | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| Forma Presentación | SUCURSAL | Sucursal/Dependencia | 001 - PERSONAL OBRA |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | 1744973014 | Tipo de Planilla | E-EMPLEADOS |
| Periodo Cotización Otros | agosto / 2024 | Periodo Cotización Salud | septiembre / 2024 |
| Dias de Mora | 3 | Fecha Pago | 2024/09/09 |
| Número Autorización | 461134 | | |

### INFORMACIÓN BÁSICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombres | MILLER OSWALDO | Apellidos | FERNANDEZ AGREDO |
| Tipo de Identificación | CC | Número de Identificación | 10302831 |
| Tipo cotizante | DEPEND | Subtipo Cotizante | |
| Colombiano Temporalmente en el Exterior | NO | Extranjero no obligado a cotizar Pensión | NO |
| COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) : | | | SI |
| Departamento | CAUCA | Municipio | POPAYAN |
| Salario Básico | $ 4.000.000 | Tipo de Salario | FIJO |

### NOVEDADES

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 01-30 | | | | | | | | | |

### APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

| PENSIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | Administradora | 25-14 COLPENSIONES |
| Tarifa | 16,000 % | IBC | $ 1.900.000 |
| FSP - Solidaridad | $ 0 | Cotización Obligatoria | $ 304.000 |
| Aportes Voluntarios Empleador | $ 0 | FSP - Subsistencia | $ 0 |
| Indicadador tarifa especial | Normal | Aportes Voluntarios Cotizante | $ 0 |
| | | **Total Aporte** | **$ 304.000** |

| SALUD | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | Administradora | EPS005-SANITAS S.A. |
| Tarifa | 4,000 % | IBC | $ 1.900.000 |
| Nro Incapacidad por Enf. General | | Cotización Obligatoria | $ 76.000 |
| Nro Licencia de Maternidad | | Valor | $ 0 |
| Valor ADRES | $ 0 | Valor | $ 0 |
| | | **Total Aporte** | **$ 76.000** |

| RIESGOS PROFESIONALES | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | Administradora | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE |
| Clase de Riesgo | V | IBC | $ 1.900.000 |
| Centro de Trabajo | | Tarifa | 6,960 % |
| | | **Total Aporte** | **$ 132.300** |

### APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

| Administradora | Dias Cotizados | Tarifa | IBC | Total Aporte |
|---|---|---|---|---|
| CCF14-COMFACAUCA | 30 | 4,000 % | $ 1.900.000 | $ 76.000 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 588.300** |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

## SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 76334269

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre ó Razón Social | ZAFRA INGENIERIA SAS | | |
| Tipo Identificación | NIT | Número de Identificación | 901085127 |
| Ciudad/Municipio | FLORIDABLANCA | Departamento | SANTANDER |
| Dirección | CALLE 30 22 200 APTO 103 | Teléfono | 6398008 |
| Tipo Empresa | PRIVADA | Actividad Económica | Actividades de arquitectura e |
| Tipo Aportante | 01-EMPLEADOR | Clase Aportante | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| Forma Presentación | SUCURSAL | Sucursal/Dependencia | 001 - PERSONAL OBRA |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | 1744973014 | Tipo de Planilla | E-EMPLEADOS |
| Periodo Cotización Otros | agosto / 2024 | Periodo Cotización Salud | septiembre / 2024 |
| Dias de Mora | 3 | Fecha Pago | 2024/09/09 |
| Número Autorización | 461134 | | |

### INFORMACIÓN BÁSICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombres | JAIRO ANIBAL | Apellidos | MELENDEZ CHILITO |
| Tipo de Identificación | CC | Número de Identificación | 76334269 |
| Tipo cotizante | DEPEND | Subtipo Cotizante | |
| Colombiano Temporalmente en el Exterior | NO | Extranjero no obligado a cotizar Pensión | NO |
| COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) : | | | SI |
| Departamento | CAUCA | Municipio | TORIBIO |
| Salario Básico | $ 2.700.000 | Tipo de Salario | FIJO |

### NOVEDADES

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

### APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

| PENSIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | Administradora | 25-14 COLPENSIONES |
| Tarifa | 16,000 % | IBC | $ 2.700.000 |
| FSP - Solidaridad | $ 0 | Cotización Obligatoria | $ 432.000 |
| Aportes Voluntarios Empleador | $ 0 | FSP - Subsistencia | $ 0 |
| Indicadador tarifa especial | Normal | Aportes Voluntarios Cotizante | $ 0 |
| | | **Total Aporte** | **$ 432.000** |

| SALUD | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | Administradora | ESSC18 - EMSSANAR S.A.S. |
| Tarifa | 4,000 % | IBC | $ 2.700.000 |
| Nro Incapacidad por Enf. General | | Cotización Obligatoria | $ 108.000 |
| Nro Licencia de Maternidad | | Valor | $ 0 |
| Valor ADRES | $ 0 | Valor | $ 0 |
| | | **Total Aporte** | **$ 108.000** |

| RIESGOS PROFESIONALES | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | Administradora | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE |
| Clase de Riesgo | V | IBC | $ 2.700.000 |
| Centro de Trabajo | | Tarifa | 6,960 % |
| | | **Total Aporte** | **$ 188.000** |

### APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

| Administradora | Dias Cotizados | Tarifa | IBC | Total Aporte |
|---|---|---|---|---|
| CCF14-COMFACAUCA | 30 | 4,000 % | $ 2.700.000 | $ 108.000 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 836.000** |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

## SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1002918303

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre ó Razón Social | ZAFRA INGENIERIA SAS | | |
| Tipo Identificación | NIT | Número de Identificación | 901085127 |
| Ciudad/Municipio | FLORIDABLANCA | Departamento | SANTANDER |
| Dirección | CALLE 30 22 200 APTO 103 | Teléfono | 6398008 |
| Tipo Empresa | PRIVADA | Actividad Económica | Actividades de arquitectura e |
| Tipo Aportante | 01-EMPLEADOR | Clase Aportante | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| Forma Presentación | SUCURSAL | Sucursal/Dependencia | 001 - PERSONAL OBRA |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | **1744973014** | Tipo de Planilla | E-EMPLEADOS |
| Periodo Cotización Otros | agosto / 2024 | Periodo Cotización Salud | septiembre / 2024 |
| Dias de Mora | 3 | Fecha Pago | 2024/09/09 |
| Número Autorización | 461134 | | |

### INFORMACIÓN BÁSICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombres | CRISTIAN DAVID | Apellidos | MAYUNGA SEGURA |
| Tipo de Identificación | CC | Número de Identificación | 1002918303 |
| Tipo cotizante | DEPEND | Subtipo Cotizante | |
| Colombiano Temporalmente en el Exterior | NO | Extranjero no obligado a cotizar Pensión | NO |
| COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) : | | | SI |
| Departamento | CAUCA | Municipio | TORIBIO |
| Salario Básico | $ 2.280.000 | Tipo de Salario | FIJO |

### NOVEDADES

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

### APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

| PENSIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | Administradora | 25-14 COLPENSIONES |
| Tarifa | 16,000 % | IBC | $ 2.280.000 |
| FSP - Solidaridad | $ 0 | Cotización Obligatoria | $ 364.800 |
| Aportes Voluntarios Empleador | $ 0 | FSP - Subsistencia | $ 0 |
| Indicadador tarifa especial | Normal | Aportes Voluntarios Cotizante | $ 0 |
| | | **Total Aporte** | **$ 364.800** |

| SALUD | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | Administradora | ESSC62-ASMET SALUD EPS |
| Tarifa | 4,000 % | IBC | $ 2.280.000 |
| Nro Incapacidad por Enf. General | | Cotización Obligatoria | $ 91.200 |
| Nro Licencia de Maternidad | | Valor | $ 0 |
| Valor ADRES | $ 0 | Valor | $ 0 |
| | | **Total Aporte** | **$ 91.200** |

| RIESGOS PROFESIONALES | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | Administradora | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE |
| Clase de Riesgo | V | IBC | $ 2.280.000 |
| Centro de Trabajo | | Tarifa | 6,960 % |
| | | **Total Aporte** | **$ 158.700** |

### APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

| Administradora | Dias Cotizados | Tarifa | IBC | Total Aporte |
|---|---|---|---|---|
| CCF14-COMFACAUCA | 30 | 4,000 % | $ 2.280.000 | $ 91.200 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 705.900** |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

## SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1002955369

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre ó Razón Social | ZAFRA INGENIERIA SAS | | |
| Tipo Identificación | NIT | Número de Identificación | 901085127 |
| Ciudad/Municipio | FLORIDABLANCA | Departamento | SANTANDER |
| Dirección | CALLE 30 22 200 APTO 103 | Teléfono | 6398008 |
| Tipo Empresa | PRIVADA | Actividad Económica | Actividades de arquitectura e |
| Tipo Aportante | 01-EMPLEADOR | Clase Aportante | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| Forma Presentación | SUCURSAL | Sucursal/Dependencia | 001 - PERSONAL OBRA |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | 1744973014 | Tipo de Planilla | E-EMPLEADOS |
| Periodo Cotización Otros | agosto / 2024 | Periodo Cotización Salud | septiembre / 2024 |
| Dias de Mora | 3 | Fecha Pago | 2024/09/09 |
| Número Autorización | 461134 | | |

### INFORMACIÓN BÁSICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombres | ELIAN FELIPE | Apellidos | PAZ CRUZ |
| Tipo de Identificación | CC | Número de Identificación | 1002955369 |
| Tipo cotizante | DEPEND | Subtipo Cotizante | |
| Colombiano Temporalmente en el Exterior | NO | Extranjero no obligado a cotizar Pensión | NO |
| COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) : | | | SI |
| Departamento | CAUCA | Municipio | TORIBIO |
| Salario Básico | $ 2.500.000 | Tipo de Salario | FIJO |

### NOVEDADES

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

### APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

| PENSIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | Administradora | 230301-PORVENIR |
| Tarifa | 16,000 % | IBC | $ 2.500.000 |
| FSP - Solidaridad | $ 0 | Cotización Obligatoria | $ 400.000 |
| Aportes Voluntarios Empleador | $ 0 | FSP - Subsistencia | $ 0 |
| Indicadador tarifa especial | Normal | Aportes Voluntarios Cotizante | $ 0 |
| | | **Total Aporte** | **$ 400.000** |

| SALUD | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | Administradora | EPSIC3-ASOC. INDIG. DEL CAUCA A.I.C |
| Tarifa | 4,000 % | IBC | $ 2.500.000 |
| Nro Incapacidad por Enf. General | | Cotización Obligatoria | $ 100.000 |
| Nro Licencia de Maternidad | | Valor | $ 0 |
| Valor ADRES | $ 0 | Valor | $ 0 |
| | | **Total Aporte** | **$ 100.000** |

| RIESGOS PROFESIONALES | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | Administradora | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE |
| Clase de Riesgo | V | IBC | $ 2.500.000 |
| Centro de Trabajo | | Tarifa | 6,960 % |
| | | **Total Aporte** | **$ 174.000** |

### APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

| Administradora | Dias Cotizados | Tarifa | IBC | Total Aporte |
|---|---|---|---|---|
| CCF14-COMFACAUCA | 30 | 4,000 % | $ 2.500.000 | $ 100.000 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 774.000** |

# ZAFRA INGENIERIA SAS

## SEPTIEMBRE 2024

Carrera 40 No. 48-33 Apto 1804 Edificio Casa 40
Bucaramanga – Santander
3176606181
razafra@hotmail.com

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

## SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 13840816

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre ó Razón Social | ZAFRA INGENIERIA SAS | | |
| Tipo Identificación | NIT | Número de Identificación | 901085127 |
| Ciudad/Municipio | FLORIDABLANCA | Departamento | SANTANDER |
| Dirección | CALLE 30 22 200 APTO 103 | Teléfono | 6398008 |
| Tipo Empresa | PRIVADA | Actividad Económica | Actividades de arquitectura e |
| Tipo Aportante | 01-EMPLEADOR | Clase Aportante | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| Forma Presentación | SUCURSAL | Sucursal/Dependencia | 002 - ADMINISTRACION |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | 7944055848 | Tipo de Planilla | E-EMPLEADOS |
| Periodo Cotización Otros | septiembre / 2024 | Periodo Cotización Salud | octubre / 2024 |
| Dias de Mora | 0 | Fecha Pago | 2024/10/03 |
| Número Autorización | 956708937 | | |

### INFORMACIÓN BÁSICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombres | RAFAEL AUGUSTO | Apellidos | ZAFRA DULCEY |
| Tipo de Identificación | CC | Número de Identificación | 13840816 |
| Tipo cotizante | DEPEND | Subtipo Cotizante | REQ CUMP PENS |
| Colombiano Temporalmente en el Exterior | NO | Extranjero no obligado a cotizar Pensión | NO |
| COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) : | | | SI |
| Departamento | SANTANDER | Municipio | BUCARAMANGA |
| Salario Básico | $ 6.500.000 | Tipo de Salario | FIJO |

### NOVEDADES

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

### APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

| SALUD | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | Administradora | EPS005-SANITAS S.A. |
| Tarifa | 4,000 % | IBC | $ 6.500.000 |
| Nro Incapacidad por Enf. General | | Cotización Obligatoria | $ 260.000 |
| Nro Licencia de Maternidad | | Valor | $ 0 |
| Valor ADRES | $ 0 | Valor | $ 0 |
| | | **Total Aporte** | **$ 260.000** |

| RIESGOS PROFESIONALES | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | Administradora | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE |
| Clase de Riesgo | V | IBC | $ 6.500.000 |
| Centro de Trabajo | | Tarifa | 6,960 % |
| | | **Total Aporte** | **$ 452.400** |

### APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

| Administradora | Dias Cotizados | Tarifa | IBC | Total Aporte |
|---|---|---|---|---|
| CCF40-COMFENALCO SANTANDER | 30 | 4,000 % | $ 6.500.000 | $ 260.000 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 972.400** |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

## SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 10537854

DAVIVIENDA

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre ó Razón Social | ZAFRA INGENIERIA SAS | | |
| Tipo Identificación | NIT | Número de Identificación | 901085127 |
| Ciudad/Municipio | FLORIDABLANCA | Departamento | SANTANDER |
| Dirección | CALLE 30 22 200 APTO 103 | Teléfono | 6398008 |
| Tipo Empresa | PRIVADA | Actividad Económica | Actividades de arquitectura e |
| Tipo Aportante | 01-EMPLEADOR | Clase Aportante | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| Forma Presentación | SUCURSAL | Sucursal/Dependencia | 001 - PERSONAL OBRA |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | 7944123738 | Tipo de Planilla | E-EMPLEADOS |
| Periodo Cotización Otros | septiembre / 2024 | Periodo Cotización Salud | octubre / 2024 |
| Dias de Mora | 0 | Fecha Pago | 2024/10/03 |
| Número Autorización | 957559705 | | |

### INFORMACIÓN BÁSICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombres | VICTOR ELADIO | Apellidos | MANZANO BRAVO |
| Tipo de Identificación | CC | Número de Identificación | 10537854 |
| Tipo cotizante | DEPEND | Subtipo Cotizante | |
| Colombiano Temporalmente en el Exterior | NO | Extranjero no obligado a cotizar Pensión | NO |
| COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) : | | | SI |
| Departamento | CAUCA | Municipio | POPAYAN |
| Salario Básico | $ 5.570.000 | Tipo de Salario | FIJO |

### NOVEDADES

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

### APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

| PENSIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | Administradora | 25-14 COLPENSIONES |
| Tarifa | 16,000 % | IBC | $ 5.570.000 |
| FSP - Solidaridad | $ 27.900 | Cotización Obligatoria | $ 891.200 |
| Aportes Voluntarios Empleador | $ 0 | FSP - Subsistencia | $ 27.900 |
| Indicadador tarifa especial | Normal | Aportes Voluntarios Cotizante | $ 0 |
| | | **Total Aporte** | **$ 947.000** |

| SALUD | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | Administradora | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS |
| Tarifa | 4,000 % | IBC | $ 5.570.000 |
| Nro Incapacidad por Enf. General | | Cotización Obligatoria | $ 222.800 |
| Nro Licencia de Maternidad | | Valor | $ 0 |
| Valor ADRES | $ 0 | Valor | $ 0 |
| | | **Total Aporte** | **$ 222.800** |

| RIESGOS PROFESIONALES | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | Administradora | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE |
| Clase de Riesgo | V | IBC | $ 5.570.000 |
| Centro de Trabajo | | Tarifa | 6,960 % |
| | | **Total Aporte** | **$ 387.700** |

### APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

| Administradora | Dias Cotizados | Tarifa | IBC | Total Aporte |
|---|---|---|---|---|
| CCF14-COMFACAUCA | 30 | 4,000 % | $ 5.570.000 | $ 222.800 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 1.780.300** |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

## SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1088974605

DAVIVIENDA

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre ó Razón Social | ZAFRA INGENIERIA SAS | | |
| Tipo Identificación | NIT | Número de Identificación | 901085127 |
| Ciudad/Municipio | FLORIDABLANCA | Departamento | SANTANDER |
| Dirección | CALLE 30 22 200 APTO 103 | Teléfono | 6398008 |
| Tipo Empresa | PRIVADA | Actividad Económica | Actividades de arquitectura e |
| Tipo Aportante | 01-EMPLEADOR | Clase Aportante | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| Forma Presentación | SUCURSAL | Sucursal/Dependencia | 001 - PERSONAL OBRA |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | 7944123738 | Tipo de Planilla | E-EMPLEADOS |
| Periodo Cotización Otros | septiembre / 2024 | Periodo Cotización Salud | octubre / 2024 |
| Dias de Mora | 0 | Fecha Pago | 2024/10/03 |
| Número Autorización | 957559705 | | |

### INFORMACIÓN BÁSICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombres | EDIXON JAVIER | Apellidos | ZULUAGA ÑAÑEZ |
| Tipo de Identificación | CC | Número de Identificación | 1088974605 |
| Tipo cotizante | DEPEND | Subtipo Cotizante | |
| Colombiano Temporalmente en el Exterior | NO | Extranjero no obligado a cotizar Pensión | NO |
| COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) : | | | SI |
| Departamento | CAUCA | Municipio | POPAYAN |
| Salario Básico | $ 5.000.000 | Tipo de Salario | FIJO |

### NOVEDADES

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

### APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

| PENSIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | Administradora | 230201- PROTECCION |
| Tarifa | 16,000 % | IBC | $ 5.000.000 |
| FSP - Solidaridad | $ 0 | Cotización Obligatoria | $ 800.000 |
| Aportes Voluntarios Empleador | $ 0 | FSP - Subsistencia | $ 0 |
| Indicadador tarifa especial | Normal | Aportes Voluntarios Cotizante | $ 0 |
| | | **Total Aporte** | **$ 800.000** |

| SALUD | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | Administradora | EPS037-NUEVA EPS |
| Tarifa | 4,000 % | IBC | $ 5.000.000 |
| Nro Incapacidad por Enf. General | | Cotización Obligatoria | $ 200.000 |
| Nro Licencia de Maternidad | | Valor | $ 0 |
| Valor ADRES | $ 0 | Valor | $ 0 |
| | | **Total Aporte** | **$ 200.000** |

| RIESGOS PROFESIONALES | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | Administradora | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE |
| Clase de Riesgo | V | IBC | $ 5.000.000 |
| Centro de Trabajo | | Tarifa | 6,960 % |
| | | **Total Aporte** | **$ 348.000** |

### APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

| Administradora | Dias Cotizados | Tarifa | IBC | Total Aporte |
|---|---|---|---|---|
| CCF14-COMFACAUCA | 30 | 4,000 % | $ 5.000.000 | $ 200.000 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 1.548.000** |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

## SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 10302831

DAVIVIENDA

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre ó Razón Social | ZAFRA INGENIERIA SAS | | |
| Tipo Identificación | NIT | Número de Identificación | 901085127 |
| Ciudad/Municipio | FLORIDABLANCA | Departamento | SANTANDER |
| Dirección | CALLE 30 22 200 APTO 103 | Teléfono | 6398008 |
| Tipo Empresa | PRIVADA | Actividad Económica | Actividades de arquitectura e |
| Tipo Aportante | 01-EMPLEADOR | Clase Aportante | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| Forma Presentación | SUCURSAL | Sucursal/Dependencia | 001 - PERSONAL OBRA |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | 7944123738 | Tipo de Planilla | E-EMPLEADOS |
| Periodo Cotización Otros | septiembre / 2024 | Periodo Cotización Salud | octubre / 2024 |
| Dias de Mora | 0 | Fecha Pago | 2024/10/03 |
| Número Autorización | 957559705 | | |

### INFORMACIÓN BÁSICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombres | MILLER OSWALDO | Apellidos | FERNANDEZ AGREDO |
| Tipo de Identificación | CC | Número de Identificación | 10302831 |
| Tipo cotizante | DEPEND | Subtipo Cotizante | |
| Colombiano Temporalmente en el Exterior | NO | Extranjero no obligado a cotizar Pensión | NO |
| COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) : | | | SI |
| Departamento | CAUCA | Municipio | POPAYAN |
| Salario Básico | $ 4.000.000 | Tipo de Salario | FIJO |

### NOVEDADES

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 01-30 | | | | | | | | | |

### APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

| PENSIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| Administradora | 25-14 COLPENSIONES | | |
| Dias | 30 | IBC | $ 1.900.000 |
| Tarifa | 16,000 % | Cotización Obligatoria | $ 304.000 |
| FSP - Solidaridad | $ 0 | FSP - Subsistencia | $ 0 |
| Aportes Voluntarios Empleador | $ 0 | Aportes Voluntarios Cotizante | $ 0 |
| Indicadador tarifa especial | Normal | **Total Aporte** | **$ 304.000** |

| SALUD | | | |
|---|---|---|---|
| Administradora | EPS005-SANITAS S.A. | | |
| Dias | 30 | IBC | $ 1.900.000 |
| Tarifa | 4,000 % | Cotización Obligatoria | $ 76.000 |
| Nro Incapacidad por Enf. General | | Valor | $ 0 |
| Nro Licencia de Maternidad | | Valor | $ 0 |
| Valor ADRES | $ 0 | **Total Aporte** | **$ 76.000** |

| RIESGOS PROFESIONALES | | | |
|---|---|---|---|
| Administradora | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE | | |
| Dias | 30 | IBC | $ 1.900.000 |
| Clase de Riesgo | V | Tarifa | 6,960 % |
| Centro de Trabajo | | **Total Aporte** | **$ 132.300** |

### APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

| Administradora | Dias Cotizados | Tarifa | IBC | Total Aporte |
|---|---|---|---|---|
| CCF14-COMFACAUCA | 30 | 4,000 % | $ 1.900.000 | $ 76.000 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 588.300** |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

## SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 76334269

DAVIVIENDA

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre ó Razón Social | ZAFRA INGENIERIA SAS | | |
| Tipo Identificación | NIT | Número de Identificación | 901085127 |
| Ciudad/Municipio | FLORIDABLANCA | Departamento | SANTANDER |
| Dirección | CALLE 30 22 200 APTO 103 | Teléfono | 6398008 |
| Tipo Empresa | PRIVADA | Actividad Económica | Actividades de arquitectura e |
| Tipo Aportante | 01-EMPLEADOR | Clase Aportante | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| Forma Presentación | SUCURSAL | Sucursal/Dependencia | 001 - PERSONAL OBRA |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | **7944123738** | Tipo de Planilla | E-EMPLEADOS |
| Periodo Cotización Otros | septiembre / 2024 | Periodo Cotización Salud | octubre / 2024 |
| Dias de Mora | 0 | Fecha Pago | 2024/10/03 |
| Número Autorización | 957559705 | | |

### INFORMACIÓN BÁSICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombres | JAIRO ANIBAL | Apellidos | MELENDEZ CHILITO |
| Tipo de Identificación | CC | Número de Identificación | 76334269 |
| Tipo cotizante | DEPEND | Subtipo Cotizante | |
| Colombiano Temporalmente en el Exterior | NO | Extranjero no obligado a cotizar Pensión | NO |
| COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) : | | | SI |
| Departamento | CAUCA | Municipio | TORIBIO |
| Salario Básico | $ 2.700.000 | Tipo de Salario | FIJO |

### NOVEDADES

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

### APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

| PENSIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | Administradora | 25-14 COLPENSIONES |
| Tarifa | 16,000 % | IBC | $ 2.700.000 |
| FSP - Solidaridad | $ 0 | Cotización Obligatoria | $ 432.000 |
| Aportes Voluntarios Empleador | $ 0 | FSP - Subsistencia | $ 0 |
| Indicadador tarifa especial | Normal | Aportes Voluntarios Cotizante | $ 0 |
| | | **Total Aporte** | **$ 432.000** |

| SALUD | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | Administradora | ESSC18 - EMSSANAR S.A.S. |
| Tarifa | 4,000 % | IBC | $ 2.700.000 |
| Nro Incapacidad por Enf. General | | Cotización Obligatoria | $ 108.000 |
| Nro Licencia de Maternidad | | Valor | $ 0 |
| Valor ADRES | $ 0 | Valor | $ 0 |
| | | **Total Aporte** | **$ 108.000** |

| RIESGOS PROFESIONALES | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | Administradora | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE |
| Clase de Riesgo | V | IBC | $ 2.700.000 |
| Centro de Trabajo | | Tarifa | 6,960 % |
| | | **Total Aporte** | **$ 188.000** |

### APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

| Administradora | Dias Cotizados | Tarifa | IBC | Total Aporte |
|---|---|---|---|---|
| CCF14-COMFACAUCA | 30 | 4,000 % | $ 2.700.000 | $ 108.000 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 836.000** |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

## SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1002918303

DAVIVIENDA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre ó Razón Social | ZAFRA INGENIERIA SAS | | |
| Tipo Identificación | NIT | Número de Identificación | 901085127 |
| Ciudad/Municipio | FLORIDABLANCA | Departamento | SANTANDER |
| Dirección | CALLE 30 22 200 APTO 103 | Teléfono | 6398008 |
| Tipo Empresa | PRIVADA | Actividad Económica | Actividades de arquitectura e |
| Tipo Aportante | 01-EMPLEADOR | Clase Aportante | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| Forma Presentación | SUCURSAL | Sucursal/Dependencia | 001 - PERSONAL OBRA |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | **7944123738** | Tipo de Planilla | E-EMPLEADOS |
| Periodo Cotización Otros | septiembre / 2024 | Periodo Cotización Salud | octubre / 2024 |
| Dias de Mora | 0 | Fecha Pago | 2024/10/03 |
| Número Autorización | 957559705 | | |

| INFORMACIÓN BÁSICA | | | |
|---|---|---|---|
| Nombres | CRISTIAN DAVID | Apellidos | MAYUNGA SEGURA |
| Tipo de Identificación | CC | Número de Identificación | 1002918303 |
| Tipo cotizante | DEPEND | Subtipo Cotizante | |
| Colombiano Temporalmente en el Exterior | NO | Extranjero no obligado a cotizar Pensión | NO |
| COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) : | | | SI |
| Departamento | CAUCA | Municipio | TORIBIO |
| Salario Básico | $ 2.280.000 | Tipo de Salario | FIJO |

**NOVEDADES**

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

**APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL**

| PENSIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| Administradora | 25-14 COLPENSIONES | | |
| Dias | 30 | IBC | $ 2.280.000 |
| Tarifa | 16,000 % | Cotización Obligatoria | $ 364.800 |
| FSP - Solidaridad | $ 0 | FSP - Subsistencia | $ 0 |
| Aportes Voluntarios Empleador | $ 0 | Aportes Voluntarios Cotizante | $ 0 |
| Indicadador tarifa especial | Normal | **Total Aporte** | **$ 364.800** |

| SALUD | | | |
|---|---|---|---|
| Administradora | ESSC62-ASMET SALUD EPS | | |
| Dias | 30 | IBC | $ 2.280.000 |
| Tarifa | 4,000 % | Cotización Obligatoria | $ 91.200 |
| Nro Incapacidad por Enf. General | | Valor | $ 0 |
| Nro Licencia de Maternidad | | Valor | $ 0 |
| Valor ADRES | $ 0 | **Total Aporte** | **$ 91.200** |

| RIESGOS PROFESIONALES | | | |
|---|---|---|---|
| Administradora | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE | | |
| Dias | 30 | IBC | $ 2.280.000 |
| Clase de Riesgo | V | Tarifa | 6,960 % |
| Centro de Trabajo | | **Total Aporte** | **$ 158.700** |

**APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES**

| Administradora | Dias Cotizados | Tarifa | IBC | Total Aporte |
|---|---|---|---|---|
| CCF14-COMFACAUCA | 30 | 4,000 % | $ 2.280.000 | $ 91.200 |

| **TOTAL PAGADO:** | **$ 705.900** |
|---|---|

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

## SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1002955369

DAVIVIENDA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre ó Razón Social | ZAFRA INGENIERIA SAS | | |
| Tipo Identificación | NIT | Número de Identificación | 901085127 |
| Ciudad/Municipio | FLORIDABLANCA | Departamento | SANTANDER |
| Dirección | CALLE 30 22 200 APTO 103 | Teléfono | 6398008 |
| Tipo Empresa | PRIVADA | Actividad Económica | Actividades de arquitectura e |
| Tipo Aportante | 01-EMPLEADOR | Clase Aportante | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| Forma Presentación | SUCURSAL | Sucursal/Dependencia | 001 - PERSONAL OBRA |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | 7944123738 | Tipo de Planilla | E-EMPLEADOS |
| Periodo Cotización Otros | septiembre / 2024 | Periodo Cotización Salud | octubre / 2024 |
| Dias de Mora | 0 | Fecha Pago | 2024/10/03 |
| Número Autorización | 957559705 | | |

| INFORMACIÓN BÁSICA | | | |
|---|---|---|---|
| Nombres | ELIAN FELIPE | Apellidos | PAZ CRUZ |
| Tipo de Identificación | CC | Número de Identificación | 1002955369 |
| Tipo cotizante | DEPEND | Subtipo Cotizante | |
| Colombiano Temporalmente en el Exterior | NO | Extranjero no obligado a cotizar Pensión | NO |
| COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) : | | | SI |
| Departamento | CAUCA | Municipio | TORIBIO |
| Salario Básico | $ 2.500.000 | Tipo de Salario | FIJO |

**NOVEDADES**

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

**APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL**

| PENSIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| Administradora | 230301-PORVENIR | | |
| Dias | 30 | IBC | $ 2.500.000 |
| Tarifa | 16,000 % | Cotización Obligatoria | $ 400.000 |
| FSP - Solidaridad | $ 0 | FSP - Subsistencia | $ 0 |
| Aportes Voluntarios Empleador | $ 0 | Aportes Voluntarios Cotizante | $ 0 |
| Indicadador tarifa especial | Normal | **Total Aporte** | **$ 400.000** |

| SALUD | | | |
|---|---|---|---|
| Administradora | EPSIC3-ASOC. INDIG. DEL CAUCA A.I.C | | |
| Dias | 30 | IBC | $ 2.500.000 |
| Tarifa | 4,000 % | Cotización Obligatoria | $ 100.000 |
| Nro Incapacidad por Enf. General | | Valor | $ 0 |
| Nro Licencia de Maternidad | | Valor | $ 0 |
| Valor ADRES | $ 0 | **Total Aporte** | **$ 100.000** |

| RIESGOS PROFESIONALES | | | |
|---|---|---|---|
| Administradora | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE | | |
| Dias | 30 | IBC | $ 2.500.000 |
| Clase de Riesgo | V | Tarifa | 6,960 % |
| Centro de Trabajo | | **Total Aporte** | **$ 174.000** |

**APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES**

| Administradora | Dias Cotizados | Tarifa | IBC | Total Aporte |
|---|---|---|---|---|
| CCF14-COMFACAUCA | 30 | 4,000 % | $ 2.500.000 | $ 100.000 |

| **TOTAL PAGADO:** | **$ 774.000** |
|---|---|
