
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**NOMBRE DE TAREA**	**DURACIÓN**	**COMIENZO**	**FIN**
2	FARALLONES DE CALI - ADICIÓN	34 días	vie 8/11/24	mié 11/12/24
3	**PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO**	**1 día**	**vie 8/11/24**	**vie 8/11/24**
4	Firma de la adición	1 día	vie 8/11/24	vie 8/11/24
5	**PRELIMINARES**	**30 días**	**mar 12/11/24**	**mié 11/12/24**
6	**OBTENCIÓN DEL CUPO DE EXPLOSIVOS Y SOLICITUD DE COMPRA DEL MATERIAL EXPLOSIVO**	**3 días**	**mar 12/11/24**	**jue 14/11/24**
7	Solicitud de compra y cargue de compra de material explosivo	3 días	mar 12/11/24	jue 14/11/24
8	**ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)**	**30 días**	**mar 12/11/24**	**mié 11/12/24**
9	Elaboración y presentación de PMA	30 días	mar 12/11/24	mié 11/12/24
10	**CAMPAMENTO BASE**	**9 días**	**jue 14/11/24**	**vie 22/11/24**
11	Alistamiento H1 (Teófilo II) y H2 (Diógenes)	2 días	jue 14/11/24	vie 15/11/24

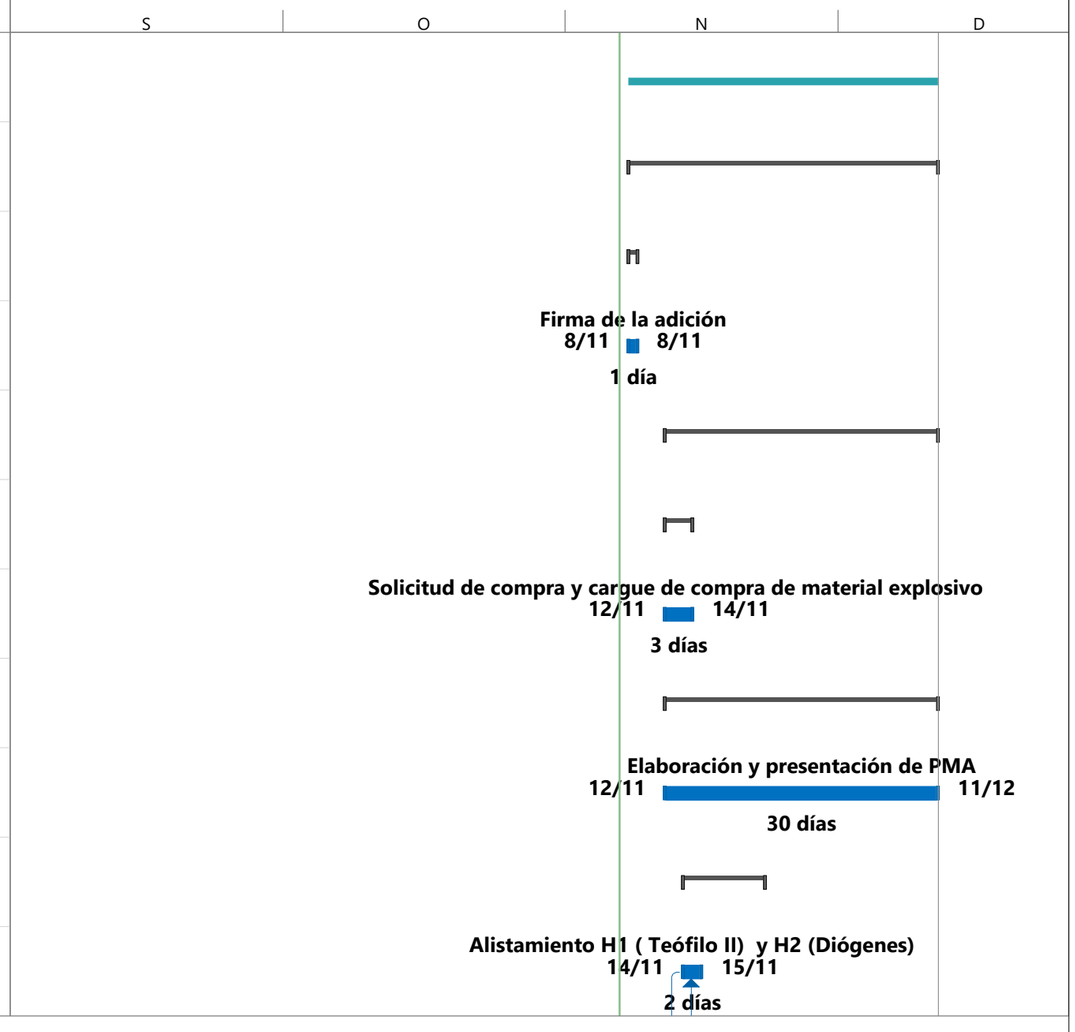


Proyecto: FARALLONES DE CALI
Fecha de elaboracion: jue

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
12	Instalación campamento base - Mina Teófilo II	1 día	dom 17/11/24	dom 17/11/24
13	Instalación campamento base - Diogenes	1 día	vie 22/11/24	vie 22/11/24
14	**TRANSPORTE**	**10 días**	**mié 13/11/24**	**vie 22/11/24**
15	**TRANSPORTE, ESCOLTA, CARGUE Y DESCARGUE ESPECIAL DE EXPLOSIVOS EN HELICÓPTERO**	**1 día**	**vie 15/11/24**	**vie 15/11/24**
16	Movilización 1 : Cantera en Cali – Farallones de Cali (Reconocimiento Helipuertos H1 y H2) – Cantera en Cali.	1 día	vie 15/11/24	vie 15/11/24
17	Movilización 2: Cantera en Cali – Movilización de Material H1 (Mina Teófilo II) – Cantera en Cali.	1 día	vie 15/11/24	vie 15/11/24
18	Movilización 3 : Cantera en Cali – Movilización de Material H2 (Mina Diogenes) – Cantera en Cali.	1 día	vie 15/11/24	vie 15/11/24
19	**TRANSPORTE DE MATERIALES**	**10 días**	**mié 13/11/24**	**vie 22/11/24**
20	Movilización de materiales y personal / Bogotá - Cali	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
21	Movilización de materiales y Personal - Teófilo II	1 día	dom 17/11/24	dom 17/11/24
22	Movilización de materiales y Personal - Diogenes	1 día	vie 22/11/24	vie 22/11/24

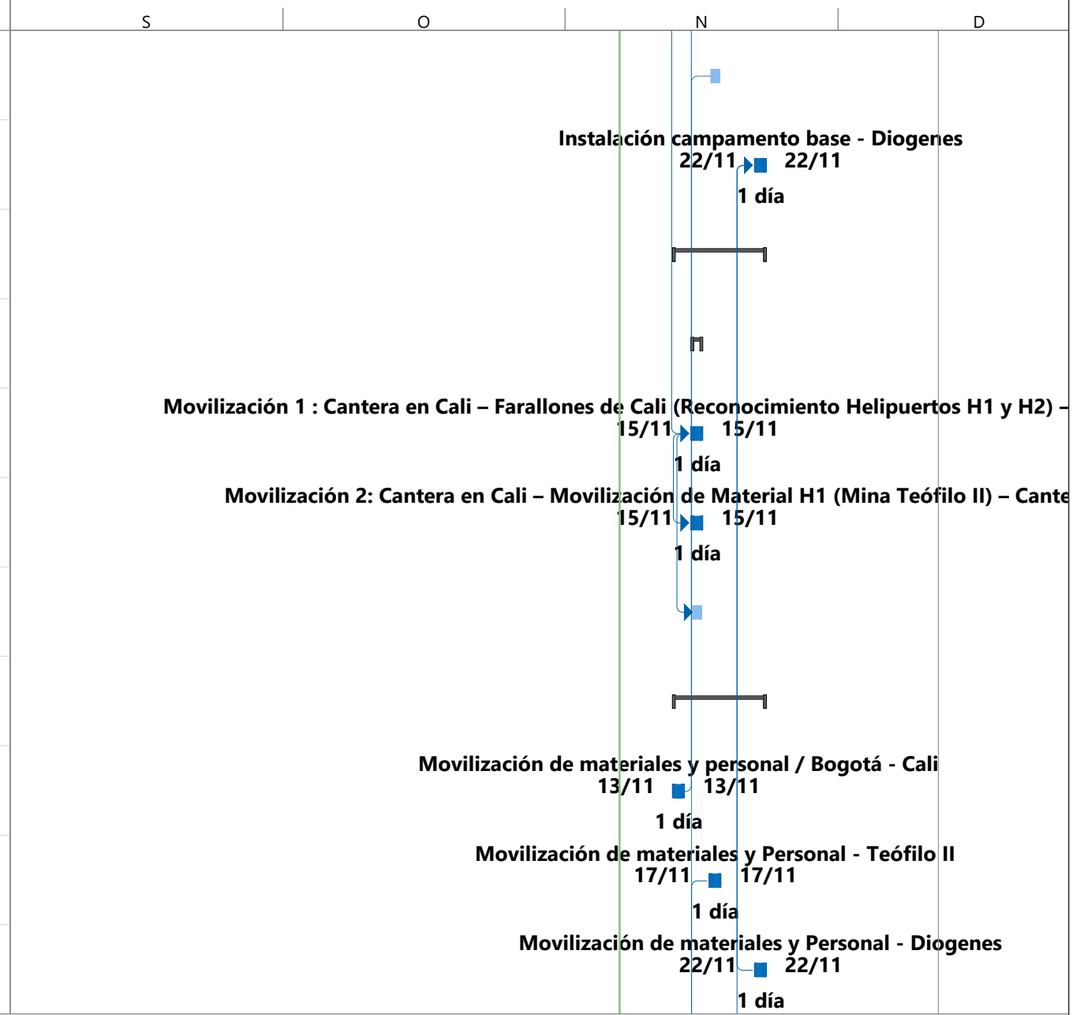


Proyecto: FARALLONES DE CALI
Fecha de elaboracion: jue

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
23	**SELLAMIENTO BOCAMINAS**	**8 días**	**dom 17/11/24**	**dom 24/11/24**
24	**PERFORACIÓN MECÁNICA DE TERRENO EN BOCAMINA PARA INSTALACIÓN DE EXPLOSIVOS**	**7 días**	**dom 17/11/24**	**sáb 23/11/24**
25	Perforación Mina Teófilo II	2 días	dom 17/11/24	lun 18/11/24
26	Perforación Mina Diógenes	2 días	vie 22/11/24	sáb 23/11/24
27	**INSTALACIÓN Y DETONACIÓN DE EXPLOSIVOS PARA SELLAMIENTO DE BOCAMINAS**	**6 días**	**mar 19/11/24**	**dom 24/11/24**
28	Cargue y detonación Mina - Teófilo II	1 día	mar 19/11/24	mar 19/11/24
29	Cargue y detonación Mina - Diógenes	1 día	dom 24/11/24	dom 24/11/24
30	**LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO**	**9 días**	**dom 17/11/24**	**lun 25/11/24**
31	Limpieza previa y final del área - Mina Teófilo II	3 días	dom 17/11/24	mar 19/11/24
32	Limpieza previa y final del área - Mina Diógenes	3 días	vie 22/11/24	dom 24/11/24
33	Retiro y disposición final de los desechos recolectados	1 día	lun 25/11/24	lun 25/11/24

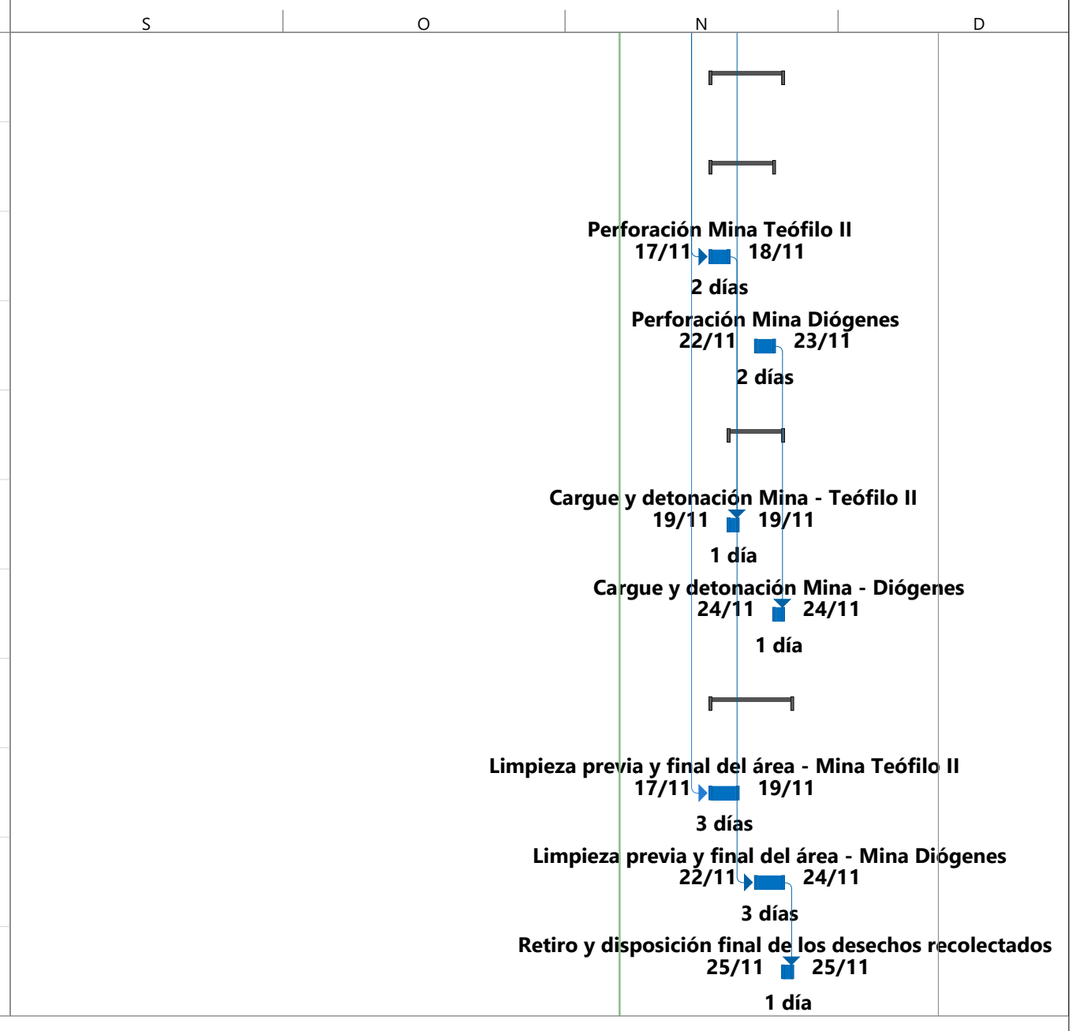

Proyecto: FARALLONES DE CALI
Fecha de elaboracion: jue

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	
