Civiltel Sas
INGENIERÍA TECNOLÓGICA

Bogotá D.C 19 de diciembre del año 2024

Señor Capitán RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA
Jefe Sección Servicios Técnicos
Supervisor del contrato 193-MDN-COGFM-ESDEG-2024

Asunto: Solicitud Prorroga Contrato 193-MDN-COGFM-ESDEG-2024

De la manera mas respetuosa y atenta me permito dirigirme al Señor Oficial Capitán **RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA** con la finalidad de SOLICITAR la aprobación referente a una prórroga del presente contrato hasta el día 26 de diciembre del año 2024 en razón a lo siguiente:

1. De acuerdo a las circunstancias de imprevistos establecidos por las constantes lluvias que suscitaron desde el 02 de diciembre hasta el 06 de diciembre del año 2024, se ha venido generando un retraso con la eficiencia del avance de obra que se tenia previsto y planeado dentro del cronograma de actividad ; esta situación de clima que supera nuestro capacidad de control y **que lleva una fuerza o causa mayor**, ha generado dificultadas para establecer y dar termino a las actividades iniciales dentro de la primera línea de obra como son los preliminares, situación que nos ha traído retraso frente a otras actividades que dependen del buen término de las mismas.

2. Así mismo se nos ha presentado retrasos en el suministro por parte de nuestro proveedor de materiales como el **ladrillo prensado macizo, e=0.24m**, el cual por su alta línea en el uso de construcción se genero un atraso en el envió , y esta situación nos genero una perdida de dos (2) días en el desarrollo de la planeación frente al cronograma de actividades prevista ; de igual manera el **Item Puerta Corta Fuego Acero Galvanizado**, ha tenido un retraso en su fabricación en razón a que los elementos a utilizar deben pasar por un sistema de certificación RETIE y ese proceso se encuentra sometido a un tercero, situación que nos sale del marco de control como Empresa.

3. Por último es necesario indicar a la Entidad que el desarrollo inicial de la obra se generó un previo análisis de **Cantidades Mayores y Menores**, de tal manera que nos permitirá optimizar el recursos y **subsanar los imprevistos dentro marco de la necesidad que se tiene planeada** esta situación nos generó un retraso de (2) dos días de tiempo para el desarrollo inicial de obra , en medida a que los cambios en el balance de obra debían ser aprobados por la Entidad para dar inicio de la estructura con total lineamiento de la obra sobre terreno.

Mencionadas situaciones nos generan como Empresa la necesidad de solicitar a la Entidad la viabilidad de extender el presente contrato hasta el día 26 de diciembre, días en los cuales podemos compensar los tiempos en los que no pudimos desarrollar el ejercicio de obra de manera correcta y con mayor eficiencia.

317 335 7813
Civiltelsoluciones.sas@gmail.com
Calle 169 N°48-10 Bogotá D.C - Colombia
Nit 900901360-8

Civiltel Sas
INGENIERÍA TECNOLÓGICA

Por último, al presente documento anexaremos el balance de obra, y las cantidades establecidas bajo el lineamiento de imprevistos ajustados en Mayores y Menores cantidades de obra, con la finalidad que la Entidad tenga certeza de las actividades que ya se han realizado del desarrollo del contrato de acuerdo a lo concertado dentro del acta de obra registrada el día 02 de diciembre del año 2024.

Respetuosamente,



Dagoberto Monroy Lancheros
Ingeniero Civil
T.P25202309709
C.C1.012.332.923 De Chiquinquirá
Representante Legal
CIVLTEL SOLUCIONES SAS
Nit: 900.901.360 -8
Dirección Cr 77 C- # 57T-21 Sur
civiltelsoluciones.sas@gmail.com

Anexo: Balance final Mayores y Menores Cantidades de obra

Civiltel Sas
INGENIERÍA TECNOLÓGICA

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "General Rafael Reyes Prieto" Colombia	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	XX-XXXX
	FORMATO CORTE PARCIAL - FINAL DE OBRA	0
		00-00-000

CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA No.193-MDN-COGFM-ESDEG-2024,
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO ELÉCTRICO PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA DEL AUDITORIO "BICENTENERIO BATALLA DE
CONTRATISTA	CIVILTEL SOLUCIKONES SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA
FECHA DE CORTE	miércoles, 11 de diciembre de 2024
BALANCE DE OBRA No.	1

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

No.ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			MAYORES (+) Y MENORES (-) CONTIDADES DE OBRA		OBRA POR EJECUTAR SALDO			
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES	
1	AUDITORIO BATALLA DE AYACUCHO										
1,1	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO, E=0.24M (incluye mortero elaborado en obra)	METROS CUADRADOS	46,52	$ 118.000,00	$ 5.489.360,00	46,60	$ 5.498.620,64	46,60	$ 5.498.620,64	0,08	MAYOR
1,2	VIGA DE AMARRE 3000 PSI (incluye herramienta menor, materiales necesarios para su correcta ejecución y mano de obra). Contempla acero longitudinal de ½" con estribos cada 20 cm.	METROS CUBICOS	0,68	$ 654.000,00	$ 444.720,00	1,99	$ 1.304.631,90	1,99	$ 1.304.631,90	1,31	MAYOR
1,3	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 3000 PSI (incluye herramienta menor, materiales necesarios para su correcta ejecución y mano de obra). Contempla acero longitudinal de ½" con estribos cada 20 cm.	METROS CUBICOS	0,76	$ 414.338,72	$ 314.897,42	0,77	$ 319.040,81	0,77	$ 319.040,81	0,01	MAYOR
1,4	PLACA DE CONTRA PISO 3000 PSI (incluye herramienta menor, materiales necesarios para su correcta ejecución y mano de obra). H=0,12. Contempla acero longitudinal y transversal cada 20cm.	METROS CUADRADOS	33,86	$ 101.160,00	$ 3.425.277,60	36,20	$ 3.661.971,77	36,20	$ 3.661.971,77	2,34	MAYOR
1,5	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1,5CM (incluye herramienta menor, materiales necesarios para su correcta ejecución y mano de obra).	METROS CUADRADOS	73,66	$ 22.270,37	$ 1.640.435,75	64,30	$ 1.431.899,53	64,30	$ 1.431.899,53	- 9,36	MENOR
1,6	PINTURA SOBRE PAÑETE LISO A 3 MANOS (incluye herramienta menor, vinilo tipo 1, materiales necesarios para su correcta ejecución y mano de obra).	METROS CUADRADOS	73,66	$ 14.012,35	$ 1.032.149,41	56,95	$ 798.003,10	56,95	$ 798.003,10	- 16,71	MENOR
1,7	SELLADOR E IMPERMEHABILIZANTE TRANSPARENTE PARA LADRILLO SIKA O SIMILAR (Incluye suministro y aplicación)	METROS CUADRADOS	42,30	$ 14.559,03	$ 615.847,03	58,55	$ 852.382,14	58,55	$ 852.382,14	16,25	MAYOR
1,8	BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22, DS = 90 (incluye soldadura, herramienta menor, materiales para su correcto funcionamiento y mano de obra)	METRO LINEAL	4,20	$ 63.697,08	$ 267.527,74	4,20	$ 267.527,74	4,20	$ 267.527,74	-	MENOR
1,9	IMPERMEABILIZANTE CON EMULSIÓN ASFALTICA CUBIERTAS (incluye herramienta menor, materiales necesarios para su correcta ejecución y mano de obra).	METROS CUADRADOS	8,68	$ 116.165,40	$ 1.008.315,67	17,70	$ 2.055.858,08	17,70	$ 2.055.858,08	9,02	MAYOR
1,10	PUERTA CORTA FUEGO 2 hojas Acero galvanizado (incluye marco, barra de trampa de un punto para trafico ligero, cierra puerta ligero, manija, bisagras, soldadura, sello perimetral, pintura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	METROS CUADRADOS	6,72	$ 742.000,00	$ 4.986.240,00	6,72	$ 4.984.990,47	6,72	$ 4.984.990,47	- 0,00	MENOR
1,11	PUERTA CORTA FUEGO Acero galvanizado (incluye marco, barra de trampa de un punto para tráfico ligero, cierra puerta ligero, manija, bisagras, soldadura, sello perimetral, pintura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	METROS CUADRADOS	2,35	$ 1.118.576,70	$ 2.628.655,25	2,35	$ 2.628.655,25	2,35	$ 2.628.655,25	-	MENOR
1,12	REJILLA DE VENTILACIÓN DE LAMAS FIJAS EN ACERO GALVANIZADO (incluye herramienta menor, soportes, celosía en lamas fijas de acero galvanizado, anclajes, chazos, silicona, remates y todo lo necesario para su correcta instalación).	METROS CUADRADOS	1,35	$ 484.262,19	$ 653.753,96	1,00	$ 484.262,19	1,00	$ 484.262,19	- 0,35	MENOR
1,13	SALIDA LÁMPARA EMT (incluye cajas, adaptador, tubo EMT (hasta 3 metros), curva EMT, soldadura, accesorios de instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	UNIDAD	4,00	$ 53.784,66	$ 215.138,66	4,00	$ 215.138,66	4,00	$ 215.138,66	-	MENOR
1,14	SALIDA TOMA DOBLE EMT (incluye cajas, interruptor doble, roseta, tubería EMT (Hasta 3 metros), curva EMT, soldadura, accesorios de instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	UNIDAD	2,00	$ 52.150,09	$ 104.300,18	4,00	$ 208.600,35	4,00	$ 208.600,35	2,00	MAYOR
1,15	LUMINARIA EN TIIRA LED (incluye mano de obra, elementos de fijación, herramienta menor y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	UNIDAD	4,00	$ 173.995,20	$ 695.980,80	4,00	$ 695.980,80	4,00	$ 695.980,80	-	MENOR
1,16	TUBERÍA CONDUIT EMT 1/2" (incluye elementos de fijación, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	METRO LINEAL	120,00	$ 23.199,36	$ 2.783.923,20	58,97	$ 1.368.112,66	58,97	$ 1.368.112,66	- 61,03	MENOR
1,17	TUBERÍA CONDUIT 1/2" (incluye elementos de fijación, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	METRO LINEAL	210,00	$ 18.057,06	$ 3.791.982,60	184,01	$ 3.322.620,67	184,01	$ 3.322.620,67	- 25,99	MENOR
1,18	CAJA DE INSPECCIÓN 30X30 (incluye acero de refuerzo, alambre negro, arena lavada, cemento gris, ladrillo tollet, recebo común, excavaciones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	UNIDAD	1,00	$ 371.564,90	$ 371.564,90	1,00	$ 371.564,90	1,00	$ 371.564,90	-	MENOR
				COSTO DIRECTO OBRA	$ 30.470.070,08		COSTO DIRECTO OBRA $ 30.469.861,65		COSTO DIRECTO OBRA $ 30.469.861,65		
				ADMINISTRACIÓN 19,00%	$ 5.789.313,32		19,00% $ 5.789.273,71		19,00% $ 5.789.273,71		
				IMPREVISTOS 4,00%	$ 1.218.802,80		4,00% $ 1.218.794,47		4,00% $ 1.218.794,47		
				UTILIDADES 5,00%	$ 1.523.503,50		5,00% $ 1.523.493,08		5,00% $ 1.523.493,08		
				IVA SOBRE UTILIDAD 19,00%	$ 289.465,67		19,00% $ 289.463,69		19,00% $ 289.463,69		
				COSTO TOTAL OBRA CIVIL	$ 39.291.155,37		TOTAL $ 39.290.886,60		TOTAL POR EJECUTAR $ 39.290.886,60		


Solicita:

Representante Legal Contratista
Firma y postfirma
DAGOBERTO MONROY LANCHEROS

Autoriza:

Interventoria o supervisor
Firma y postfirma
RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA

FORMATO	DETALLE CANTIDADES CONTRATO			
FECHA	19/12/2024	PRESENTA	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	
PROYECTO	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO ELÉCTRICO PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA DEL AUDITORIO "BICENTENERIO BATALLA DE AYACUCHO" DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"			
DESCRIPCIÓN	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO, E=0.24M (incluye mortero elaborado en obra)	UNID.	METROS CUADRADOS	ITEM 1,1

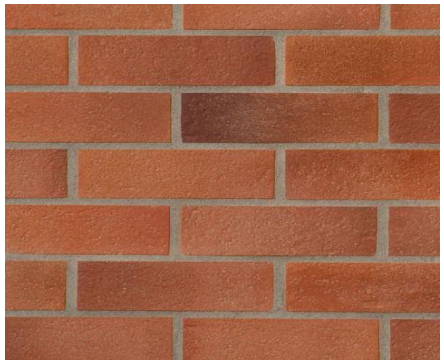

PISO	ZONA	DIMENSIONES			Cantidad	%	Medida total
		Longitud	Ancho	Alto			
piso 1	Principal	4,42		3,1		1,1	15,27
	Detrás	4,42		3,1		1,1	15,27
	Izuiqerda	3,64		3,1		1,1	12,57
	Derecha	3,64		3,1		1,1	12,57
	Puerta izquierda		2,85	2,3	-1		-6,56
	Puerta principal		1,00	2,3	-1		-2,30
	ventana		0,75	0,3	-1		-0,23
				Sub total			46,60
				Acumulado			0,00
				TOTAL			46,60

OBSERVACIONES:
Se modifican catidades de obra según nuevas medidas , se adiciona vacio de la ventana


FORMATO	DETALLE CANTIDADES CONTRATO			ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "General Rafael Reyes Prieto" Colombia
FECHA	19/12/2024	PRESENTA	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	
PROYECTO	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO ELÉCTRICO PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA DEL AUDITORIO "BICENTENERIO BATALLA DE AYACUCHO" DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"			
DESCRIPCIÓN	VIGA DE AMARRE 3000 PSI (incluye herramienta menor, materiales necesarios para su correcta ejecución y mano de obra). Contempla acero longitudinal de ½" con estribos cada	UNID.	METROS CUBICOS	ITEM 1,2



PISO	ZONA	DIMENSIONES			Cantidad	%	Medida total
		Longitud	Ancho	Alto			
piso 2	principal y detrás	4,42	0,25	0,15	3,00	1,10	0,55
	izquierda y derecha	3,64	0,25	0,15	3,00	1,10	0,45
piso 1	principal y detrás	4,42	0,25	0,15	3,00	1,10	0,55
	izquierda y derecha	3,64	0,25	0,15	3,00	1,10	0,45
				Sub total			1,99
				Acumulado			0,00
				TOTAL			1,99

OBSERVACIONES:
Se modifican medidas de perimetros placa,


FORMATO	DETALLE CANTIDADES CONTRATO			ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "General Rafael Reyes Prieto" Colombia
FECHA	19/12/2024	PRESENTA	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	
PROYECTO	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO ELÉCTRICO PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA DEL AUDITORIO "BICENTENERIO BATALLA DE AYACUCHO" DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"			
DESCRIPCIÓN	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 3000 PSI (incluye herramienta menor, materiales necesarios para su correcta ejecución y mano de obra). Contempla acero longitudinal de	UNID.	METROS CUBICOS	ITEM 1,3

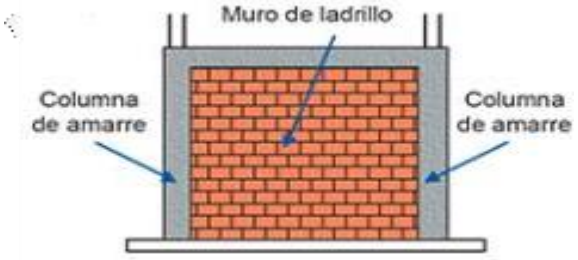

PISO	ZONA	DIMENSIONES			Cantidad	%	Medida total
		Longitud	Ancho	Alto			
piso 1	principal y detrás	2,80	0,25	0,25	4,00	1,10	0,77

OBSERVACIONES:		
	Sub total	0,77
	Acumulado	0,00
	TOTAL	0,77

FORMATO	DETALLE CANTIDADES CONTRATO			ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "General Rafael Reyes Prieto" Colombia
FECHA	19/12/2024	PRESENTA	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	
PROYECTO	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO ELÉCTRICO PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA DEL AUDITORIO "BICENTENERIO BATALLA DE AYACUCHO" DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"			
DESCRIPCIÓN	PLACA DE CONTRA PISO 3000 PSI (incluye herramienta menor, materiales necesarios para su correcta ejecución y mano de obra). H=0,12. Contempla acero longitudinal y transversal cada 20cm.	UNID.	METROS CUADRADOS	ITEM 1,4

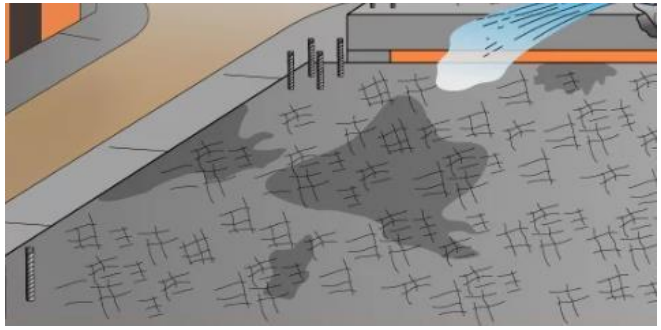

PISO	ZONA	DIMENSIONES			Cantidad	%	Medida total
		Longitud	Ancho	Alto			
piso 2		3,64	4,42		1,00	1,10	17,70
piso 1		3,64	4,42		1,00	1,15	18,50

OBSERVACIONES:
Se modifica según medidas de placa nuevas

Sub total	36,20
Acumulado	0,00
TOTAL	36,20

FORMATO	DETALLE CANTIDADES CONTRATO			ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "General Rafael Reyes Prieto" Colombia
FECHA	19/12/2024	PRESENTA	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	
PROYECTO	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO ELÉCTRICO PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA DEL AUDITORIO "BICENTENERIO BATALLA DE AYACUCHO" DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"			
DESCRIPCIÓN	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1,5CM (incluye herramienta menor, materiales necesarios para su correcta ejecución y mano de obra).	UNID.	METROS CUADRADOS	ITEM 1,5



PISO	ZONA	DIMENSIONES			Cantidad	%	Medida total
		Longitud	Ancho	Alto			
piso 1	Principal	4,42		3,1		1,10	15,27
	Detrás	4,42		3,1		1,10	15,27
	Izuiqerda	3,64		3,1		1,10	12,57
	Derecha	3,64		3,1		1,10	12,57
	Puerta izquierda		2,85	2,30	-1,00		-6,56
	Puerta principal		1,00	2,30	-1,00		-2,30
	ventana		0,75	0,3	-1		-0,23
piso 2	alistado de piso placa pendientado	4,42	3,64			1,10	17,70

OBSERVACIONES:
Se ajustan medidas según nuevas medidas y vanos de la maposteria

Sub total	64,30
Acumulado	0,00
TOTAL	64,30

FORMATO	DETALLE CANTIDADES CONTRATO			ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "General Rafael Reyes Prieto" Colombia
FECHA	19/12/2024	PRESENTA	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	
PROYECTO	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO ELÉCTRICO PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA DEL AUDITORIO "BICENTENERIO BATALLA DE AYACUCHO" DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"			
DESCRIPCIÓN	PINTURA SOBRE PAÑETE LISO A 3 MANOS (incluye herramienta menor, vinilo tipo 1, materiales necesarios para su correcta ejecución y mano de obra).	UNID.	METROS CUADRADOS	ITEM 1,6



PISO	ZONA	DIMENSIONES			Cantidad	%	Medida total
		Longitud	Ancho	Alto			
piso 1	Principal	4,42		3,1		1,10	15,27
	Detrás	4,42		3,1		1,10	15,27
	Izuiqerda	3,64		3,1		1,10	12,57
	Derecha	3,64		3,1		1,10	12,57
	Puerta izquierda		2,85	2,30	-1,00		-6,56
	Puerta principal		1,00	2,30	-1,00		-2,30
	ventana		0,75	0,30	-1,00		-0,23
piso 2	placa parte inferior	4,42		3,64		1,10	10,37

OBSERVACIONES:
Se ajustan medidas según nuevas medidas de pañetes, se adiciona pintura para placa entre piso por debajo

Sub total	56,96
Acumulado	0,00
TOTAL	56,96

FORMATO	DETALLE CANTIDADES CONTRATO			ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "General Rafael Reyes Prieto" Colombia
FECHA	19/12/2024	PRESENTA	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	
PROYECTO	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO ELÉCTRICO PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA DEL AUDITORIO "BICENTENERIO BATALLA DE AYACUCHO" DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"			
DESCRIPCIÓN	SELLADOR E IMPERMEHABILIZANTE TRANSPARENTE PARA LADRILLO SIKA O SIMILAR (Incluye suministro y aplicación)	UNID.	METROS CUADRADOS	ITEM 1,7



PISO	ZONA	DIMENSIONES			Cantidad	%	Medida total
		Longitud	Ancho	Alto			
piso 1	Principal	4,42		3,1		1,1	15,82
	Detrás	4,42		3,1		1,1	15,82
	Izuiqerda	3,64		3,1		1,1	13,03
	Derecha	3,64		3,1		1,1	13,03
	Puerta izquierda		2,85	2,30	-1,00		-6,56
	Puerta principal		1,00	2,30	-1,00		-2,30
	ventana		0,75	0,30	-1,00		-0,23
piso 2 antepecho interno	Principal	4,42		0,5		1,1	2,72
	Detrás	4,42		0,5		1,1	2,72
	Izuiqerda	3,64		0,5		1,1	2,24
	Derecha	3,64		0,5		1,1	2,24

OBSERVACIONES:
Se modifican medidas según nuevas medidas de la mamposteria

Sub total	58,55
Acumulado	0,00
TOTAL	58,55

FORMATO	DETALLE CANTIDADES CONTRATO			ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "General Rafael Reyes Prieto" Colombia
FECHA	19/12/2024	PRESENTA	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	
PROYECTO	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO ELÉCTRICO PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA DEL AUDITORIO "BICENTENERIO BATALLA DE AYACUCHO" DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"			

DESCRIPCIÓN	BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22, DS = 90 (incluye soldadura, herramienta menor, materiales para su correcto funcionamiento y mano de obra)	UNID.	METRO LINEAL		ITEM	1,8



PISO	ZONA	DIMENSIONES			Cantidad	%	Medida total
		Longitud	Ancho	Alto			
		4,20			1,00		4,20

OBSERVACIONES:	Sub total	4,20
	Acumulado	0,00
	TOTAL	4,20

FORMATO	DETALLE CANTIDADES CONTRATO			ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "General Rafael Reyes Prieto" Colombia
FECHA	19/12/2024	PRESENTA	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	
PROYECTO	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO ELÉCTRICO PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA DEL AUDITORIO "BICENTENERIO BATALLA DE AYACUCHO" DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"			
DESCRIPCIÓN	IMPERMEABILIZANTE CON EMULSIÓN ASFALTICA CUBIERTAS (incluye herramienta menor, materiales necesarios para su correcta ejecución y mano de obra).	UNID.	METROS CUADRADOS	ITEM 1,9



PISO	ZONA	DIMENSIONES			Cantidad	%	Medida total
		Longitud	Ancho	Alto			
piso 2	placa	3,64	4,42		1,00	1,10	17,70
Sub total							17,70
Acumulado							0,00
TOTAL							17,70

OBSERVACIONES:
Se modifican cantidades según nuevas medidas de placa de entre piso

FORMATO	DETALLE CANTIDADES CONTRATO			ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "General Rafael Reyes Prieto" Colombia
FECHA	19/12/2024	PRESENTA	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	
PROYECTO	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO ELÉCTRICO PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA DEL AUDITORIO "BICENTENERIO BATALLA DE AYACUCHO" DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"			
DESCRIPCIÓN	PUERTA CORTA FUEGO 2 hojas Acero galvanizado (incluye marco, barra de trampa de un punto para trafico ligero, cierra puerta ligero, manija, bisagras, soldadura, sello perimetral, pintura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	UNID.	METROS CUADRADOS	ITEM 1,10



PISO	ZONA	DIMENSIONES			Cantidad	%	Medida total
		Longitud	Ancho	Alto			
piso 1	Puerta izquierda		2,85	2,35			6,72

OBSERVACIONES:
Se modifican medidas de vanos según los vanos contemplados en la mamposteria

Sub total	6,72
Acumulado	0,00
TOTAL	6,72

FORMATO	DETALLE CANTIDADES CONTRATO			ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "General Rafael Reyes Prieto" Colombia
FECHA	19/12/2024	PRESENTA	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	
PROYECTO	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO ELÉCTRICO PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA DEL AUDITORIO "BICENTENERIO BATALLA DE AYACUCHO" DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"			
DESCRIPCIÓN	PUERTA CORTA FUEGO Acero galvanizado (incluye marco, barra de trampa de un punto para tráfico ligero, cierra puerta ligero, manija, bisagras, soldadura, sello perimetral, pintura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	UNID.	METROS CUADRADOS	ITEM 1,11




PISO	ZONA	DIMENSIONES			Cantidad	%	Medida total
		Longitud	Ancho	Alto			
piso 1	Puerta principal		1,00	2,35			2,35

OBSERVACIONES:
Se modifican medidas de vanos según los vanos contemplados en la mamposteria

Sub total	2,35
Acumulado	0,00
TOTAL	2,35

FORMATO	DETALLE CANTIDADES CONTRATO			ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "General Rafael Reyes Prieto" Colombia
FECHA	19/12/2024	PRESENTA	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	
PROYECTO	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO ELÉCTRICO PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA DEL AUDITORIO "BICENTENERIO BATALLA DE AYACUCHO" DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"			
DESCRIPCIÓN	REJILLA DE VENTILACIÓN DE LAMAS FIJAS EN ACERO GALVANIZADO (incluye herramienta menor, soportes, celosía en lamas fijas de acero galvanizado, anclajes, chazos, silicona, remates y todo lo necesario para su correcta instalación).	UNID.	METROS CUADRADOS	ITEM 1,12

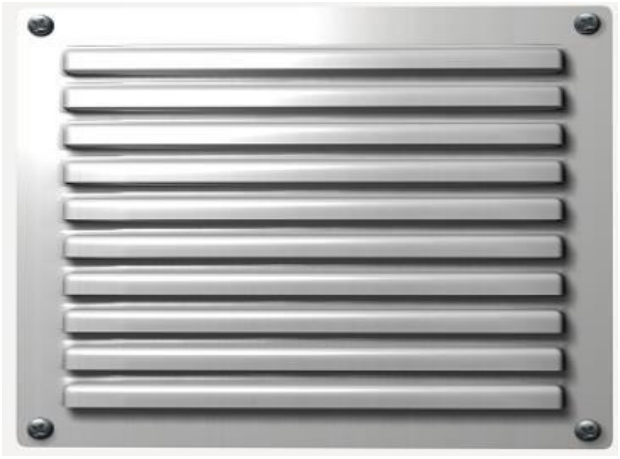

PISO	ZONA	DIMENSIONES			Cantidad	%	Medida total
		Longitud	Ancho	Alto			
piso 1	ventana	1,00		1,00	1,00		1,00

OBSERVACIONES:
Se modifican medidas de vanos según los vanos contemplados en la mamposteria

Sub total	1,00
Acumulado	0,00
TOTAL	1,00

FORMATO	DETALLE CANTIDADES CONTRATO			ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "General Rafael Reyes Prieto" Colombia
FECHA	19/12/2024	PRESENTA	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	
PROYECTO	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO ELÉCTRICO PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA DEL AUDITORIO "BICENTENERIO BATALLA DE AYACUCHO" DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"			
DESCRIPCIÓN	SALIDA LÁMPARA EMT (incluye cajas, adaptador, tubo EMT (hasta 3 metros), curva EMT, soldadura, accesorios de instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	UNID.	UNIDAD	ITEM 1,13



PISO	ZONA	DIMENSIONES			Cantidad	%	Medida total
		Longitud	Ancho	Alto			
piso 1					4		4

OBSERVACIONES:

Sub total	4,00
Acumulado	0,00
TOTAL	4,00

FORMATO	DETALLE CANTIDADES CONTRATO			ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "General Rafael Reyes Prieto" Colombia
FECHA	19/12/2024	PRESENTA	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	
PROYECTO	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO ELÉCTRICO PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA DEL AUDITORIO "BICENTENERIO BATALLA DE AYACUCHO" DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"			
DESCRIPCIÓN	SALIDA TOMA DOBLE EMT (incluye cajas, interruptor doble, roseta, tubería EMT (Hasta 3 metros), curva EMT, soldadura, accesorios de instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	UNID.	UNIDAD	ITEM 1,14

PISO	ZONA	DIMENSIONES			Cantidad	%	Medida total
		Longitud	Ancho	Alto			
piso 1	interrptores				2		2
piso 1	toma corrientes				2		2


OBSERVACIONES:		
se adicionan 2 cantidades para la instalacion de dos toma corrientes a 120 dentro del cuarto con el fin de ser usadas por el personal de mantenimientos	Sub total	4,00
	Acumulado	0,00
	TOTAL	4,00

FORMATO	DETALLE CANTIDADES CONTRATO			ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "General Rafael Reyes Prieto" Colombia
FECHA	19/12/2024	PRESENTA	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	
PROYECTO	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO ELÉCTRICO PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA DEL AUDITORIO "BICENTENERIO BATALLA DE AYACUCHO" DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"			
DESCRIPCIÓN	LUMINARIA EN TIIRA LED (incluye mano de obra, elementos de fijación, herramienta menor y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	UNID.	UNIDAD	ITEM 1,15

PISO	ZONA	DIMENSIONES			Cantidad	%	Medida total
		Longitud	Ancho	Alto			
					4		4

OBSERVACIONES:		
	Sub total	4,00
	Acumulado	0,00
	TOTAL	4,00

FORMATO	DETALLE CANTIDADES CONTRATO								
FECHA	19/12/2024	PRESENTA	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA						
PROYECTO	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO ELÉCTRICO PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA DEL AUDITORIO "BICENTENERIO BATALLA DE AYACUCHO" DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"								
DESCRIPCIÓN	TUBERÍA CONDUIT EMT 1/2" (incluye elementos de fijación, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	UNID.	METRO LINEAL			ITEM	1,16		
		PISO	ZONA	DIMENSIONES			Cantidad	%	Medida total
				Longitud	Ancho	Alto			
		piso 1	dentro de cuarto tecnico	18,71		4	1,2		26,12
		piso 1	conexión a tablero existente	25,57		3	1,2		32,86
OBSERVACIONES:		Sub total							58,97
		Acumulado							0,00
		TOTAL							58,97

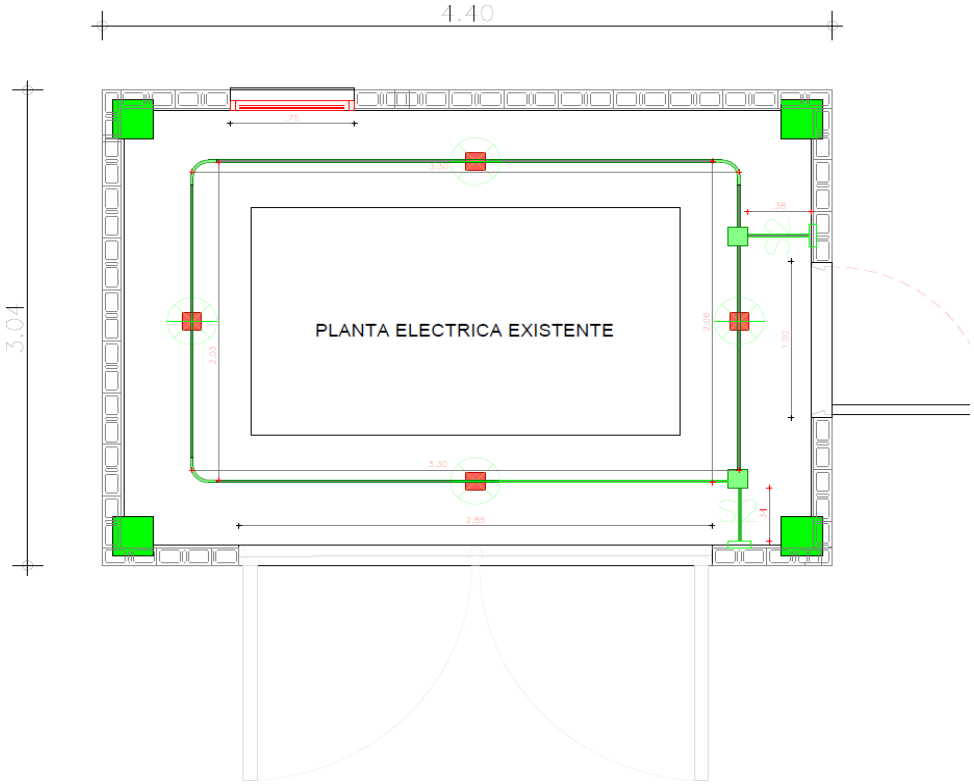

FORMATO	DETALLE CANTIDADES CONTRATO			ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "General Rafael Reyes Prieto" Colombia
FECHA	19/12/2024	PRESENTA	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	
PROYECTO	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO ELÉCTRICO PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA DEL AUDITORIO "BICENTENERIO BATALLA DE AYACUCHO" DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"			
DESCRIPCIÓN	TUBERÍA CONDUIT 1/2" (incluye elementos de fijación, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UNID.	METRO LINEAL	ITEM 1,17

PISO	ZONA	DIMENSIONES			Cantidad	%	Medida total
		Longitud	Ancho	Alto			
		0					0

OBSERVACIONES:
Según la revision en campo del desarrollo de las actividades este item ya no seria necesario ejecutarlo

Sub total	0,00
Acumulado	0,00
TOTAL	0,00

FORMATO	DETALLE CANTIDADES CONTRATO			ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "General Rafael Reyes Prieto" Colombia
FECHA	19/12/2024	PRESENTA	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	
PROYECTO	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO ELÉCTRICO PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA DEL AUDITORIO "BICENTENERIO BATALLA DE AYACUCHO" DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"			
DESCRIPCIÓN	CAJA DE INSPECCIÓN 30X30 (incluye acero de refuerzo, alambre negro, arena lavada, cemento gris, ladrillo tollet, recebo común, excavaciones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	UNID.	UNIDAD	ITEM 1,18

PISO	ZONA	DIMENSIONES			Cantidad	%	Medida total
		Longitud	Ancho	Alto			
					1		1

OBSERVACIONES:		
	Sub total	1,00
	Acumulado	0,00
	TOTAL	1,00

Civiltel Sas
INGENIERÍA TECNOLÓGICA

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Bogotá D.C, 16 de diciembre del año 2024

Señores
Escuela Superior de Guerra
Bogotá D.C

Yo **Dagoberto Monroy Lancheros** , identificado con numero de cedula de ciudadanía número 1.012.332.923 de Chiquinquirá, y Mariluz lozano Salamanca identificada con numero de Cedula 52.745.161 de Bogotá D.C en mi condición de Contadora Publica de la Empresa **CIVELTEL SOLUCIONES SAS** con Nit : 900.901.360 -8 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico que durante de los últimos seis (6) meses del calendario que legalmente sean exigibles en la citada fecha, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos), la compañía mencionada ha efectuado el pago de sus obligaciones en cuanto a los aportes a sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y que igualmente la empresa se encuentra al día con todas las obligaciones laborales.

La anterior certificación se expide de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, Articulo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el Articulo 1 de la Ley 89 de 1988 y se firma en la ciudad de Bogotá, el día 03 del mes de agosto de 2023.

Respetuosamente,

Dagoberto Monroy Lancheros
Ingeniero Civil
T.P25202309709
C.C1.012.332.923 De Chiquinquirá
Representante Legal
CIVLTEL SOLUCIONES SAS
Nit: 900.901.360 -8
Dirección Cr 77 C- # 57T-21 Sur
civiltelsoluciones.sas@gmail.com

MARILUZ LOZANO SALAMANCA.
C.C. 52.745.161 de Bogotá.
TP No.182665.
Cel. (601) 3052458368.

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900901360	8	CIVILTEL SOLICIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CR 77 C 57 T 21 SUR BRR CASABIANCA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3133223267	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1135941305	9477978185	E	2024/12/13	2024/12/18	NEQUI	5	$580,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$700	$0	$208,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$700	$0	$208,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$400	$0	$90,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$90,500	$400	$0	$90,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$200	$0	$52,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$52,000	$200	$0	$52,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$600	$0	$163,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$600	$0	$163,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$200	$0	$39,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$39,000	$200	$0	$39,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$100	$0	$26,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$26,000	$100	$0	$26,100
TOTAL				**1**	**$578,000**	**$2,200**	**$0**	**$580,200**

2024/12/18 09:27 AM
