# GRUPO METROLÓGICO COLOMBIANO

Bogotá D.C., 09 de diciembre de 2024

Señores
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
TE. Juan Fernando Astaiza Collazos
Supervisor Administrativo Contrato 026-00-A-COFAC-DILOA-2024

Asunto: Solicitud de prórroga al contrato 026-00-A-COFAC-DILOA-2024

De la manera más respetuosa me dirijo a usted en calidad de representante del Grupo Metrológico Colombiano y, en relación al contrato de calibración mencionado en el asunto de este documento, el cual, tiene como objeto "El servicio de sostenibilidad operacional de los equipos, bancos y herramientas de medición de todas las Unidades de La Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante calibración, mantenimiento preventivo y/o correctivo de acuerdo anexo técnico, excepto los contenidos en el contrato 104-00-A-COFAC-DILOA-2023 (Vigente)." para presentar la solicitud formal de prórroga al plazo de ejecución del mencionado contrato.

Se han presentado circunstancias imprevistas que han impactado significativamente en la ejecución de las actividades contratadas. Específicamente, retrasos sustanciales han surgido en el proceso de calibración de equipos, principalmente debido a la limitada disponibilidad de laboratorios acreditados en el territorio colombiano y a la alta demanda de servicios en laboratorios extranjeros. Adicionalmente, algunas unidades requieren reparaciones iniciales no incluidas dentro del contrato y posterior calibración, lo que ha extendido aún más los plazos originales de entrega.

Se han presentado circunstancias imprevistas que afectan significativamente la ejecución de las actividades contratadas. A continuación, detallo las novedades que han impactado en el desarrollo del contrato:

**1. RETRASOS EN LAS CALIBRACIONES EXTERNAS DE EQUIPOS:**

La limitada disponibilidad de laboratorios acreditados en Colombia y la alta demanda de servicios en el extranjero han provocado retrasos considerables en el proceso de calibración de los equipos comprometidos en el contrato. Estos equipos se detallan así:

- **I-Checker S/N O591104 y ID 118**

De acuerdo con los requisitos técnicos del contrato el equipo debe ser calibrado por un laboratorio acreditado ante ONAC o sus homólogos en otros paises. Adicional, durante la ejecución el CAMAN solicitó que la calibración se realizara in situ (en las instalaciones del

Comando Aéreo de Mantenimiento), pero no hay laboratorios acreditados para este servicio. Por lo anterior, se solicitó autorización para realizar la calibración en un laboratorio en el exterior o calibrar de forma no acreditada desde el 24 de septiembre, sin embargo, la respuesta no fue recibida sino hasta el 25 de noviembre, fecha desde la que se inició el trámite de cotización con el único laboratorio en Colombia que ofrece este servicio, quienes manifestaron que tienen una agenda hasta enero - febrero de 2025, excediendo el plazo actual de ejecución.

Novedad Equipo I-Checker

**Andrés Almanza Rodríguez** <produccion@cima-co.com> mar, 24 sept, 11:44 a.m.
para JUAN

Cordial saludo

Por medio de la presente me permito informar que a solicitud del CAMAN la calibración del I-Checker con ID 118 y S/N O591104 debe realizarse en sitio, sin embargo, ningún laboratorio a nivel nacional cuenta con esta capacidad acreditada, lo cual es requisito para los equipos que pertenecen al laboratorio de metrología. Por lo anterior solicitamos su autorización para realizar la calibración trazable en sitio o que dicha calibración se pueda realizar en un laboratorio en Estados Unidos.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a sus comentarios.

Si Usted tiene alguna **PETICIÓN / QUEJA / RECLAMO / SUGERENCIA** y no quiere que pase desapercibido, por favor diligencie el siguiente link https://cima-co.com/sugerencias-quejas-y-reclamos/ RESPUESTA GARANTIZADA DENTRO DE LOS SIGUIENTES 3 días hábiles.

Atentamente,

**Andrés Almanza Rodríguez**
Coordinador de producción
CIMA SAS

(+601) 404-0601 | (+601) 606-0782
produccion@cima-co.com
www.cima-co.com
Carrera 96J No. 23A-55 Fontibón - Bogotá, Colombia

**Oferta No.: C23DLT-2024-1993**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social:** | COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO | **Nit:** | 830097194 | | |
| **Dirección:** | Carrera 96J No. 23A-55 Bogotá D.C., Distrito Capital (Colombia) | **Ciudad:** | Bogotá D.C. | **Teléfono:** | 601 4040601 |
| **Contacto:** | **Andres Almanza Rodriguez** | **E-mail:** | **produccion@cima-co.com** | **Fecha Oferta:** | 2024-12-05 |
| **Forma de Pago:** | Anticipado con su orden de compra | **Moneda:** | $COL | **Validez:** | 2025-02-28 |
| **Ejecución:** | Previa programacion | **Entrega:** | Instalaciones del Cliente | **Su solicitud:** | **Solicitud 2024-12-03** |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Descuento | Valor Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calibrador de indicadores (0 a 150) mm<br>Servicio de calibración Trazado (Sin acreditación)<br>División de escala mayor o igual a 0,00002 mm<br>Marca: Mitutoyo<br>Modelo: 170-312A<br><br>El alcance del servicio No incluye calibración en puntos especiales<br><br>Lugar de Ejecución: Instalaciones del cliente - Comando Aéreo de Mantenimiento ubicado en Madrid - Cundinamarca<br><br>A la fecha de presentación de esta oferta la agenda de ejecución del servicio está para el mes de enero - febrero de 2025, sujeto a la recepción de cada orden de compra y confirmación de pago o estado de cartera al día.<br><br>Nota: De requerirse asistencia a charlas o cursos de seguridad, el cliente debe informar con anterioridad, adicional asegurar la logística y/o los permisos necesarios para el ingreso a las instalaciones.<br><br>*Ver consideraciones en el formato LM-F-155 adjunto* | 1 | | | |

*Todos nuestros servicios están sujetos a verificación técnica en nuestras instalaciones.*
*Los tiempos determinados para logística de entrega y/o despachos no están contemplados en el tiempo de ejecución del servicio.*
*Los servicios ofertados NO incluyen procesos metrológicos en puntos especiales.*
*Los puntos a tomar son determinados por el Laboratorio de Metrología de ECI SA. En caso de requerir puntos especiales por favor solicitarlos al laboratorio para evaluar técnicamente alcance y posible sobrecosto.*

- **Reference Pressure Monitor S/N 2472 y ID 252**

Una vez autorizado vía correo electrónico, se gestionó la recogida del equipo en el CAMAN para su posterior cotización en laboratorios acreditados en Estados Unidos. El equipo fue enviado el 2 de octubre de 2024 y llegó al laboratorio el día 16 del mismo mes y año, pero el laboratorio informa que, debido a su alto volumen de trabajo y festividades como el thanksgiving, black Friday y pre-navidad, la liberación que se esperaba para el 2 de diciembre no será materializada sino hasta el próximo jueves 12. Considerando los tiempos de nacionalización y liberación aduanal, se espera recibir el equipo entre el 30 de diciembre de 2024 y el 3 de enero de 2025.

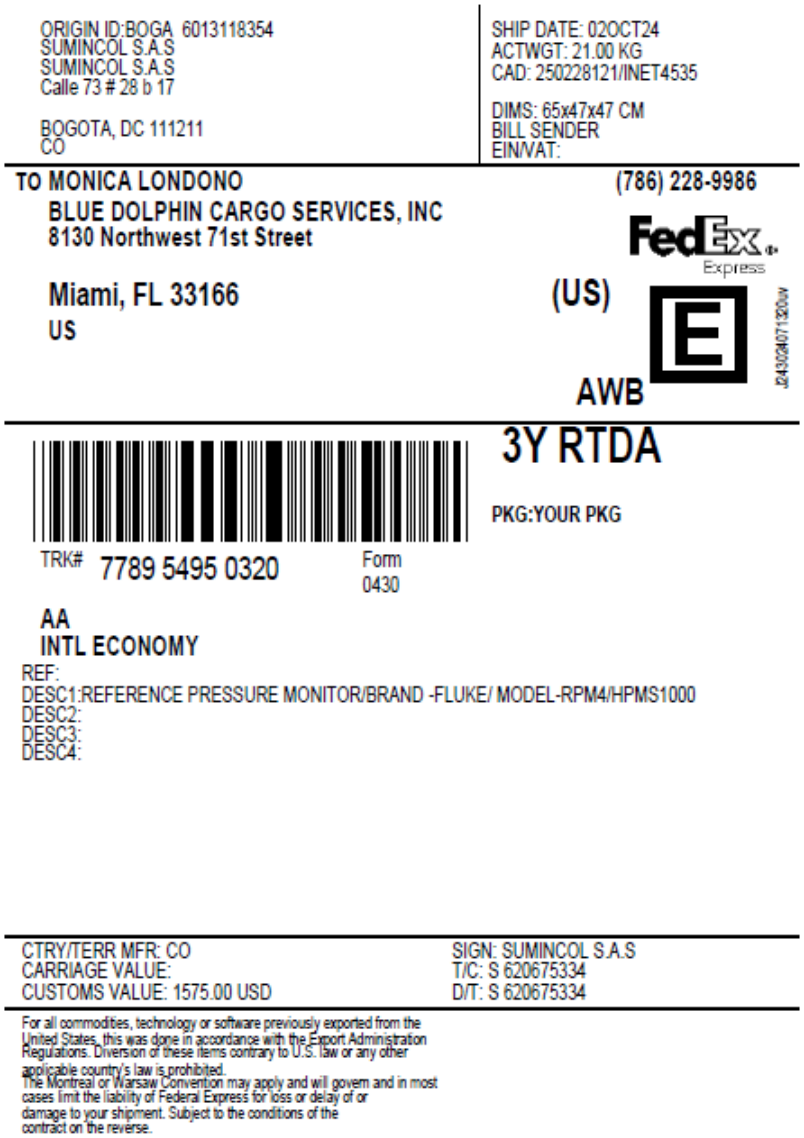

ORIGIN ID:BOGA 6013118354
SUMINCOL S.A.S
SUMINCOL S.A.S
Calle 73 # 28 b 17

BOGOTA, DC 111211
CO

SHIP DATE: 02OCT24
ACTWGT: 21.00 KG
CAD: 250228121/INET4535

DIMS: 65x47x47 CM
BILL SENDER
EIN/VAT:

TO MONICA LONDONO (786) 228-9986
BLUE DOLPHIN CARGO SERVICES, INC
8130 Northwest 71st Street

Miami, FL 33166 (US)
US

FedEx Express

AWB

3Y RTDA

PKG:YOUR PKG

TRK# 7789 5495 0320 Form 0430

AA
INTL ECONOMY

REF:
DESC1:REFERENCE PRESSURE MONITOR/BRAND -FLUKE/ MODEL-RPM4/HPMS1000
DESC2:
DESC3:
DESC4:

CTRY/TERR MFR: CO
CARRIAGE VALUE:
CUSTOMS VALUE: 1575.00 USD

SIGN: SUMINCOL S.A.S
T/C: S 620675334
D/T: S 620675334

For all commodities, technology or software previously exported from the United States, this was done in accordance with the Export Administration Regulations. Diversion of these items contrary to U.S. law or any other applicable country's law is prohibited.
The Montreal or Warsaw Convention may apply and will govern and in most cases limit the liability of Federal Express for loss or delay of or damage to your shipment. Subject to the conditions of the contract on the reverse.

CIMA S.A.S Compañía Internacional de Mantenimiento

SERVICIO AERONÁUTICO ESPECIALIZADO S.A.S.

SUMINCOL Suministros Industriales de Colombia S.A.S.

| ADDRESS | SHIP TO | ESTIMATE 1241 |
|---|---|---|
| Suministros industriales de Colombia SAS<br>Calle 73 No. 28B-17<br>Bogota, Bogota D.C. Colombia | Suministros industriales de Colombia SAS<br>Blue Dolphin Cargo<br>8130 NW 71St ST<br>Miami, Florida 33166 US | DATE 10/16/2024<br>EXPIRATION DATE 11/16/2024 |

PURCHASE ORDER
RFQ FLUKE RPM4-2-S/S

| ITEM | DESCRIPTION | QTY | RATE | AMOUNT |
|---|---|---|---|---|
| Calibration Service | Calibration 17025 acreditable W/As Found And As Left Data<br>PN RPM4-2-S/S<br>SN: 2472<br>LAB: FLUKE<br>LEAD TIME: 45 DAYS + TRANSIT | | | |

time of offer. Delivery/shipping is not included.

- **AC Corrent Shunt Set S/N 316169981 y ID 260**

Después de la autorización por correo electrónico, se gestionó la recogida del equipo en el CAMAN para cotizar con laboratorios acreditados en Estados Unidos. El equipo fue enviado el 1 de octubre de 2024 y recibido el día 16 del mismo mes y año. Sin embargo, el laboratorio informa que debido a su carga de trabajo y festividades como el thanksgiving, black Friday y navidad, la liberación se retrasaría hasta el 17 de diciembre. Considerando los tiempos de nacionalización, que aumentan por época navideña, se espera recibir el equipo entre el 20 y 24 de enero de 2025.

ORIGIN ID:BOGA 6013118354
SUMINCOL S.A.S
SUMINCOL S.A.S
Calle 73 # 28 b 17

BOGOTA, DC 111211
CO

SHIP DATE: 01OCT24
ACTWGT: 34.00 KG
CAD: 250228121/INET4535

DIMS: 85x76x45 CM
BILL SENDER
EIN/VAT:

TO MONICA LONDONO
BLUE DOLPHIN CARGO SERVICES, INC
8130 Northwest 71st Street

Miami, FL 33166
US

(786) 228-9986

FedEx Express

(US)

AWB

3Y RTDA

PKG:YOUR PKG

TRK# 7789 5143 4490

Form 0430

AA
INTL ECONOMY

REF:
DESC1:AC CURRENT SHUNT SET / BRAND - FLUKE / MODEL - A40B-SET / SE
DESC2:
DESC3:
DESC4:

CTRY/TERR MFR: CO
CARRIAGE VALUE:
CUSTOMS VALUE: 1820.00 USD

SIGN: SUMINCOL S.A.S
T/C: S 620675334
D/T: S 620675334

For all commodities, technology or software previously exported from the United States, this was done in accordance with the Export Administration Regulations. Diversion of these items contrary to U.S. law or any other applicable country's law is prohibited.
The Montreal or Warsaw Convention may apply and will govern and in most cases limit the liability of Federal Express for loss or delay of or damage to your shipment. Subject to the conditions of the contract on the reverse.






**BILL TO**
Suministros industriales de Colombia SAS
Calle 73 No. 28B-17
Bogota, Bogota D.C. Colombia

**SHIP TO**
Suministros industriales de Colombia SAS
Blue Dolphin Cargo
8130 NW 71St ST
Miami, Florida 33166 US

**INVOICE 12017**

**DATE** 11/27/2024 **TERMS** Net 60

**DUE DATE** 01/26/2025

| SHIP DATE | TRACKING NO. | PURCHASE ORDER |
|---|---|---|
| 12/17/2024 | WHR0001121034 | OC 2784 ITEM 3 |

| ITEM | DESCRIPTION | QTY | RATE | AMOUNT |
|---|---|---|---|---|
| **Calibration Service** | Calibration, Accredited primary (SIN REPARACION ) PN A40B-100A<br>PRODUCT CALIBRATOR<br>SN: 316169981<br>LAB: FLUKE | | | |

- **AC Measurement Standard S/N 3182030 y ID 262**

Después de la autorización por correo electrónico, se gestionó la recogida del equipo en el CAMAN para cotizar con laboratorios acreditados en Estados Unidos. El equipo fue enviado el 3 de octubre de 2024 y recibido el día 16 del mismo mes y año. Sin embargo, el laboratorio informa que debido a su carga de trabajo y festividades como el thanksgiving, black Friday y navidad, la liberación se daría el 15 de diciembre. Considerando los tiempos de nacionalización, que aumentan por época navideña, se espera recibir el equipo entre el 20 y 24 de enero de 2025.

# GRUPO METROLÓGICO COLOMBIANO

CIMA S.A.S
Compañía Internacional de Mantenimiento

SERVICIO AERONÁUTICO ESPECIALIZADO S.A.S.

SUMINCOL
Suministros Industriales de Colombia S.A.S.

ORIGIN ID:BOGA 6013118354
SUMINCOL S.A.S
SUMINCOL S.A.S
Calle 73 # 28 b 17

BOGOTA, DC 111211
CO

SHIP DATE: 03OCT24
ACTWGT: 36.00 KG
CAD: 250228121/INET4535

DIMS: 82x52x40 CM
BILL SENDER
EIN/VAT:

TO MONICA LONDONO (786) 228-9986
BLUE DOLPHIN CARGO SERVICES, INC
8130 Northwest 71st Street

Miami, FL 33166 (US)
US

FedEx Express

AWB

3Y RTDA

PKG:YOUR PKG

TRK# 7789 9604 9134 Form 0430

AA
INTL ECONOMY

REF:
DESC1:AC MEASUREMENT STANDARD / BRAND- FLUKE / MODEL- 5790A / SERI
DESC2:
DESC3:
DESC4:

CTRY/TERR MFR: CO
CARRIAGE VALUE:
CUSTOMS VALUE: 1820.00 USD

SIGN: SUMINCOL S.A.S
T/C: S 620675334
D/T: S 620675334

For all commodities, technology or software previously exported from the United States, this was done in accordance with the Export Administration Regulations. Diversion of these items contrary to U.S. law or any other applicable country's law is prohibited.
The Montreal or Warsaw Convention may apply and will govern and in most cases limit the liability of Federal Express for loss or delay of or damage to your shipment. Subject to the conditions of the contract on the reverse.

**ADDRESS**
Suministros industriales de Colombia SAS
Calle 73 No. 28B-17
Bogota, Bogota D.C. Colombia

**SHIP TO**
Suministros industriales de Colombia SAS
Blue Dolphin Cargo
8130 NW 71St ST
Miami, Florida 33166 US

**ESTIMATE 1240-R**

**DATE** 10/16/2024

**EXPIRATION DATE** 11/16/2024

**PURCHASE ORDER**
OC 2784 UPTADE ITEM 1

| ITEM | DESCRIPTION | QTY | RATE | AMOUNT |
|---|---|---|---|---|
| **Calibration Service** | Calibration, Calibration, Z540 Traceable, w/ Data PN 5790A/3 115 ,AC MEASUREMENT STANDARD + WIDEBAND OP<br>SN: 3182030<br>LAB: FLUKE<br>LEAD TIME: 60 DAYS + TRANSIT | | | |

- **Multiproduct Calibrator S/N 6785018 y ID 1**

Luego de la autorización de la adición presupuestal, se solicitó la recogida del equipo de manera urgente para evitar cualquier incumplimiento. A partir de la fecha en que se conoció la autorización (9 de octubre), e incluso antes de recibir el equipo se compró el repuesto necesario para la reparación, el cual, fue recibido el 24 de octubre y se inició la reparación, enviando el equipo el 8 de noviembre. Actualmente, el equipo se encuentra en proceso de calibración. Es importante señalar que el equipo fue recibido a pesar de saber y manifestar que estaría fuera de los tiempos establecidos para la reparación y calibración en el exterior, pues estos superarían el plazo de ejecución del contrato. Adicional, el día 4 de diciembre recibimos la novedad de que el equipo presenta una novedad en capacitancia y genera saltos en el voltaje AUX de salida, lo cual, no estaba contemplado dentro de la cotización de reparación inicial, pues únicamente se especificaba un cambio de teclado, sin embargo, estamos esperando cotización de reparación por parte del laboratorio para intentar a toda costa ofrecerles este servicio como valor agregado o, realizar la calibración limitada.



# GRUPO METROLÓGICO COLOMBIANO

CIMA S.A.S
Compañía Internacional de Mantenimiento

SERVICIO AERONÁUTICO ESPECIALIZADO S.A.S.

SUMINCOL
Suministros Industriales de Colombia S.A.S.

ORIGIN ID:VVCA 3208097691
Andres Almanza
CIMA SAS
Cra 96 J # 23 A - 55

BOGOTA, DC 110911
CO

SHIP DATE: 08NOV24
TOTWGT: 44.00 KG
CAD: 107096374/INET4535

DIMS: 66x53x43 CM
BILL SENDER
EIN/VAT:

**TO Karisa Thouvenel** **(920) 426-5894**

**3114 Medalist Drive**
**Oshkosh Wi 54902**
**OSHKOSH, WI 54902**
**US**

FedEx Express

**(US)**

**AWB**

J244024091920uv

**ST ATWA**

**PKG:YOUR PKG**

TRK# 7798 3182 9690
1 of 2

Form
0430

**AA**
**INTL CONN PLUS**

REF:
DESC1:MULTIPRODUCT CALIBRATOR IS SENT TO BE CALIBRATED AND RETURNS
DESC2:WIDEBAND POWER AMPLIFIER IS SENT TO BE CALIBRATED AND RETURN
DESC3:
DESC4:

CTRY/TERR MFR: US US
CARRIAGE VALUE:
CUSTOMS VALUE: 27750.00 USD

SIGN: Andres Almanza
T/C: S 429355141
D/T: S 429355141

For all commodities, technology or software previously exported from the United States, this was done in accordance with the Export Administration Regulations. Diversion of these items contrary to U.S. law or any other applicable country's law is prohibited.
The Montreal or Warsaw Convention may apply and will govern and in most cases limit the liability of Federal Express for loss or delay of or damage to your shipment. Subject to the conditions of the contract on the reverse.

**Drew Smith** <Drew.Smith@foxvalleymetrology.com>
para Tim, mi


mié, 4 dic, 12:36 p.m. (hace 5 días)

Traducir al español

Hello Andrés,

This is regarding your 5500A multifunction calibrator in for calibration. Unfortunately, your device is failing the AUX voltage output and the capacitance tests. While the capacitance can likely be adjusted, the AUX voltage output is causing over current trips and generally inoperable above 2.5Vac.

Durante el envío del equipo este presentó un retraso en la liberación aduanal en Estados Unidos, lo cual retrasó aún mas el cronograma de ejecución de estos equipos.

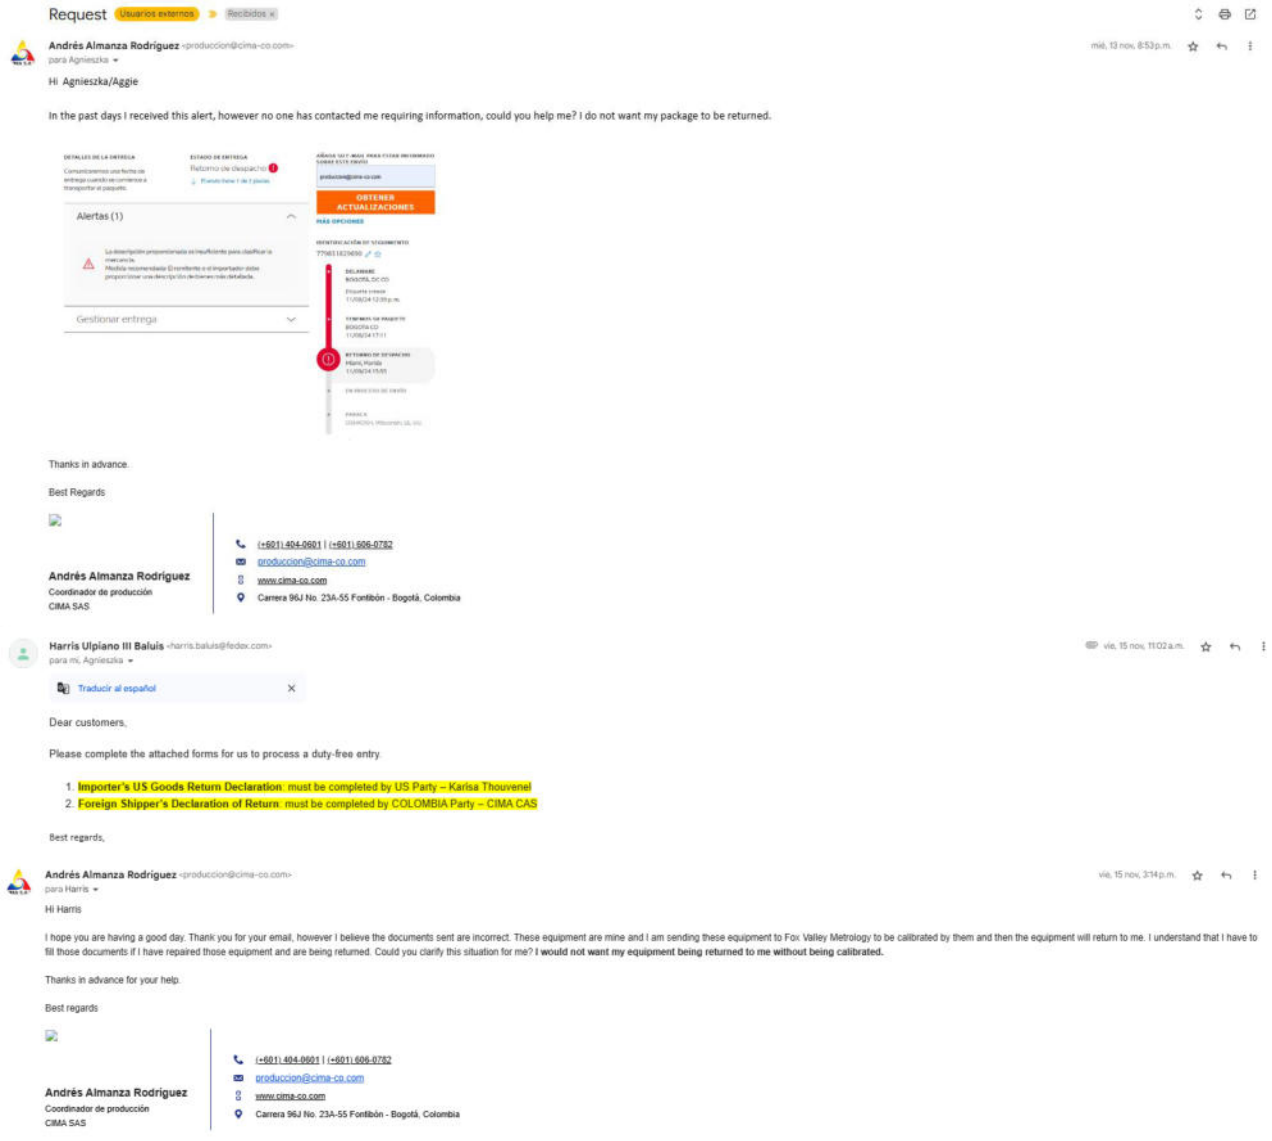

Request Usuarios externos Recibidos

**Andrés Almanza Rodriguez** <produccion@cima-co.com> mié, 13 nov, 8:53 p.m.
para Agnieszka

Hi Agnieszka/Aggie

In the past days I received this alert, however no one has contacted me requiring information, could you help me? I do not want my package to be returned.

Alertas (1)

Gestionar entrega

OBTENER ACTUALIZACIONES

Thanks in advance.

Best Regards

**Andrés Almanza Rodriguez**
Coordinador de producción
CIMA SAS

(+601) 404-0601 | (+601) 606-0782
produccion@cima-co.com
www.cima-co.com
Carrera 96J No. 23A-55 Fontibón - Bogotá, Colombia

**Harris Ulpiano III Baluis** <harris.baluis@fedex.com> vie, 15 nov, 11:02 a.m.
para mí, Agnieszka

Traducir al español

Dear customers,

Please complete the attached forms for us to process a duty-free entry.

1. **Importer's US Goods Return Declaration**: must be completed by US Party – Karisa Thouveniel
2. **Foreign Shipper's Declaration of Return**: must be completed by COLOMBIA Party – CIMA CAS

Best regards,

**Andrés Almanza Rodriguez** <produccion@cima-co.com> vie, 15 nov, 3:14 p.m.
para Harris

Hi Harris

I hope you are having a good day. Thank you for your email, however I believe the documents sent are incorrect. These equipment are mine and I am sending these equipment to Fox Valley Metrology to be calibrated by them and then the equipment will return to me. I understand that I have to fill those documents if I have repaired those equipment and are being returned. Could you clarify this situation for me? **I would not want my equipment being returned to me without being calibrated.**

Thanks in advance for your help.

Best regards

**Andrés Almanza Rodriguez**
Coordinador de producción
CIMA SAS

(+601) 404-0601 | (+601) 606-0782
produccion@cima-co.com
www.cima-co.com
Carrera 96J No. 23A-55 Fontibón - Bogotá, Colombia




Desafortunadamente, es necesario mencionar que la calibración de este equipo retrasa el envío del equipo Amplifier, Wideband Power S/N IP2878R y ID 40 pues el laboratorio no realiza facturas ni envíos parciales.

- **Hall Effect Gauss/Tesla Meters S/N 1223063 y ID 2**

Luego de la autorización de la adición presupuestal, se solicitó la recogida urgente del equipo el 25 de septiembre de 2024, iniciando de inmediato las gestiones necesarias con el fabricante FW BELL para la compra de la sonda requerida para la reparación. Sin embargo, el fabricante aún se encuentra en proceso de aprobación de la venta de este repuesto, ya que su venta está restringida por tratarse del ámbito militar.

El 11/19/2024 7:24 PM EST Jessica Jensen (EC) <jessica.jensen@parker.com> escribió:

Hello,

Apologies for the delayed response. Our Trade Compliance manager, who approves the end use statements for FW Bell orders, has been out on vacation and is still catching up on these. She is requesting more specific information from your end user in the "application and platform" section, on how they will be using our product. We need to ensure that our product is not being used for any sanctioned purpose, as well as determine if additional export licensing is required due to the intended use of the product. Please let me know if you have any questions.

Thank you,

**Jessica Jensen**
She/Her
Customer Account Representative
**Fire, Safety & Power Systems**
4607 SE International Way
Milwaukie, OR 97222

Parker MEGGiTT

Fecha: 11/26/2024 8:25 PM EST
Asunto: RE: [EXT] RE: [EXT] RE: [EXT] RE: Order 24220

Hello,


Thank you. I have forwarded this on to our trade compliance team for approval. Most of the office is out early for Thanksgiving, so likely it will not get approved until next week. I hope you have a pleasant Thanksgiving.

Thank you,

**Jessica Jensen**
She/Her
Customer Account Representative
**Fire, Safety & Power Systems**
4607 SE International Way
Milwaukie, OR 97222

- **Multiplicador de Torque S/N 842 y ID 78**

Tras la autorización de la adición presupuestal, se solicitó la recogida urgente del equipo para su posterior envío al laboratorio Team Torque en Estados Unidos para su calibración, pues a nivel nacional no existe laboratorio alguno que realice este servicio. Sin embargo, hoy hemos recibido una notificación indicando que el equipo requiere reparación, ya que presenta el siguiente fallo: “Esta unidad muestra -1 cuando se enciende y luego no permite ninguna otra acción”. Se envía la cotización CIMA-GC01-2024-500 para su revisión y posible autorización. Es importante destacar que se requiere más tiempo para la reparación y/o nacionalización del equipo.

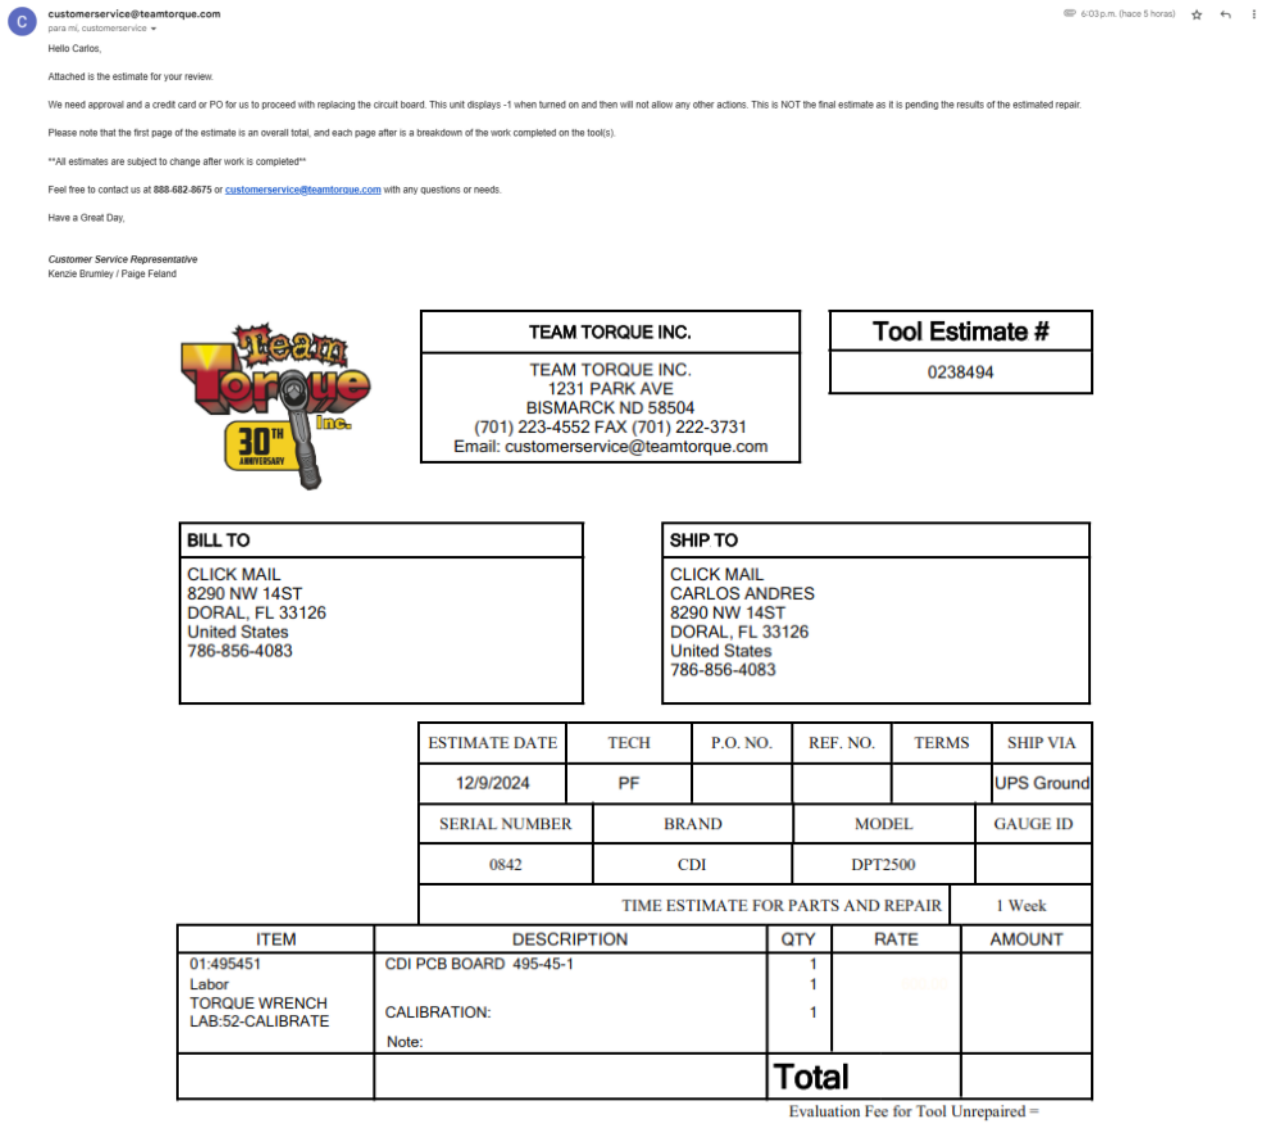

customerservice@teamtorque.com
para mí, customerservice

Hello Carlos,

Attached is the estimate for your review.

We need approval and a credit card or PO for us to proceed with replacing the circuit board. This unit displays -1 when turned on and then will not allow any other actions. This is NOT the final estimate as it is pending the results of the estimated repair.

Please note that the first page of the estimate is an overall total, and each page after is a breakdown of the work completed on the tool(s).

**All estimates are subject to change after work is completed**

Feel free to contact us at 888-682-8675 or customerservice@teamtorque.com with any questions or needs.

Have a Great Day,

*Customer Service Representative*
Kenzie Brumley / Paige Feland

| TEAM TORQUE INC. |
|---|
| TEAM TORQUE INC.<br>1231 PARK AVE<br>BISMARCK ND 58504<br>(701) 223-4552 FAX (701) 222-3731<br>Email: customerservice@teamtorque.com |

| Tool Estimate # |
|---|
| 0238494 |

| BILL TO |
|---|
| CLICK MAIL<br>8290 NW 14ST<br>DORAL, FL 33126<br>United States<br>786-856-4083 |

| SHIP TO |
|---|
| CLICK MAIL<br>CARLOS ANDRES<br>8290 NW 14ST<br>DORAL, FL 33126<br>United States<br>786-856-4083 |

| ESTIMATE DATE | TECH | P.O. NO. | REF. NO. | TERMS | SHIP VIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/9/2024 | PF | | | | UPS Ground |

| SERIAL NUMBER | BRAND | MODEL | GAUGE ID |
|---|---|---|---|
| 0842 | CDI | DPT2500 | |
| | TIME ESTIMATE FOR PARTS AND REPAIR | | 1 Week |

| ITEM | DESCRIPTION | QTY | RATE | AMOUNT |
|---|---|---|---|---|
| 01:495451<br>Labor<br>TORQUE WRENCH<br>LAB:52-CALIBRATE | CDI PCB BOARD 495-45-1<br><br>CALIBRATION:<br>Note: | 1<br>1<br><br>1 | | |
| | | **Total** | | |

Evaluation Fee for Tool Unrepaired =

**4. NOVEDADES ACTUALES EN PROCESOS DE CALIBRACIÓN:**

Conscientes de la importancia de garantizar la conclusión exitosa de todas las tareas pendientes sin comprometer la calidad del servicio prestado, solicitamos respetuosamente una prórroga del plazo de ejecución del contrato 026-00-A-COFAC-DILOA-2024 hasta el 31 de enero de 2025.

Es relevante destacar que los retrasos mencionados son atribuibles a factores externos fuera de nuestro control, lo que ha dificultado el cumplimiento oportuno de los plazos acordados inicialmente. Se han implementado medidas adicionales, como mantenimientos correctivos y préstamos de equipos adicionales a los ofrecidos dentro de los ponderables, con el objetivo de mitigar los impactos derivados de estas adversidades.

Agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente solicitud, reiteramos nuestro compromiso absoluto con el cumplimiento contractual y la satisfacción de nuestros clientes. Quedamos a disposición para proporcionar cualquier información adicional que se requiera en relación con esta solicitud de prórroga.

Quedamos a la espera de su pronta respuesta.

Cordialmente,

**CLAUDIA MILENA GONZALEZ DUARTE**
C.C.: 65.769.984 de Ibagué Tolima
Representante Legal
Unión Temporal Grupo Metrológico Colombiano

## 2. REPARACIONES Y CALIBRACIONES ADICIONALES:

Algunos equipos han requerido reparaciones y ajustes adicionales que no estaban contemplados inicialmente, lo cual, en ningún momento ha sido cobrado a la Fuerza Aérea Colombiana, sino que se ha brindado como un valor agregado al contrato en ejecución, sin embargo, esto ha incrementado nuestros costos de operación y ha extendido los plazos de entrega programados. Algunos de estos valores agregados han sido:

- **Equipo de Peso y Balance de Plataformas ID 166 y S/N 1331**

Reparación del cable perteneciente a la celda 4 (color azul) ya que indicaba “OVERLOAD” aún sin carga aplicada. El equipo fue retornado calibrado y operativo en su totalidad.

- **Ramp Test Set Transponder ID 240 y S/N 104002426**

Fue necesario intervenir internamente el equipo para reemplazar la batería, ya que, este es un proceso demasiado delicado que compromete la integridad del equipo. El equipo fue retornado calibrado y operativo en su totalidad.

- **Kit Balancer ID 133 y S/N 7BAL152**

El equipo requirió proceso de re-grabado en fábrica. El equipo fue retornado calibrado y operativo en su totalidad. El equipo fue retornado calibrado y operativo en su totalidad.

- **Pitot Static Tester ID 10 y S/N 4058900609**

El equipo llegó sin encender, actualmente se está intentando reparar, por lo que, estamos a la espera de la importación de un portafusibles para reemplazar el que tiene actualmente el equipo. Se espera retornar el equipo calibrado y operativo en su totalidad.

- **Flowmeter Test Set Assy ID 42 y S/N A0004**

Fue necesario reemplazar uno de los Manómetros del equipo por uno de las mismas especificaciones, ya que, el que traía el equipo se encontraba sin aguja indicadora. El equipo fue retornado calibrado y operativo en su totalidad.

## 3. IMPACTO ECONÓMICO NEGATIVO:

Durante la ejecución del contrato hemos recibido 20 equipos que suman $104.300.000, a los cuales, se les realizó toda la logística de recolección, diagnóstico y devolución a las diferentes unidades, ya que, los equipos presentaron novedades que afectaron directamente la calibración, generando perdidas para nuestra compañía, pues, no pudieron ser facturados.

**4. NOVEDADES ACTUALES EN PROCESOS DE CALIBRACIÓN:**

Conscientes de la importancia de garantizar la conclusión exitosa de todas las tareas pendientes sin comprometer la calidad del servicio prestado, solicitamos respetuosamente una prórroga del plazo de ejecución del contrato 026-00-A-COFAC-DILOA-2024 hasta el 31 de enero de 2025.

Es relevante destacar que los retrasos mencionados son atribuibles a factores externos fuera de nuestro control, lo que ha dificultado el cumplimiento oportuno de los plazos acordados inicialmente. Se han implementado medidas adicionales, como mantenimientos correctivos y préstamos de equipos adicionales a los ofrecidos dentro de los ponderables, con el objetivo de mitigar los impactos derivados de estas adversidades.

Agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente solicitud, reiteramos nuestro compromiso absoluto con el cumplimiento contractual y la satisfacción de nuestros clientes. Quedamos a disposición para proporcionar cualquier información adicional que se requiera en relación con esta solicitud de prórroga.

Quedamos a la espera de su pronta respuesta.

Cordialmente,

**CLAUDIA MILENA GONZALEZ DUARTE**
C.C.: 65.769.984 de Ibagué Tolima
Representante Legal
Unión Temporal Grupo Metrológico Colombiano
