
Upgrade del Sistema de Gestión de Energia PME 7.2 to 2023
Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea
1		**Duración Total del Proyecto**
2		**Actividades Previas**
3		Reunión de inicio de proyecto (Primera reunión de seguimiento al contrato 175-2024)
4		Envio de correo con los requerimeintos de Hardware, Software y Permisos de redes necesarios para la ejecución del Proyecto
5		Reunion Concepto Ambiental y Seguridad y Salud en Trabajo Contrato 175-2024
6		Envio de Cronograma de trabajo
7		Creación de VPN para el acceso de los servidores actuales
8		Entrega de los Servidores de Aplicaciones y de Bases de Datos Virtuales (Nuevos) con todos los requerimientos de usuarios y permisos de redes solicitados
9		Verificación de nuevos servidores (validacón)
10		**Comienzo de la Ejecución**
11		Pruebas en MV procedimiento de adecuación de BD
12		Situar los instaladores del PME 7.2.x, 8.2 y V2023 y SQL Server en los Servidores de Aplicaiones y de Bases de datos (Nuevos) respectivamente y Situar la herramienta de configuración para migraciones PME2023 en el Servidor de Aplicaciones actual
13		Ejecutar la herramienta de migración del PME 2023 en el servidor actual
14		Exportar de la Key de PME 7.2, copias de seguridad BDs, carpeta de configuración, copias de aplicativos desarrollados del Servidor de Aplicaciones y de Bases de Datos actuales
15		Importar de la Key de PME 7.2, copias de seguridad BDs, carpeta de configuración, copias de aplicativos desarrollados del Servidor de Aplicaciones y de Bases de Datos nuevos
16		Inactivar Firewall y Antivuros antes del proceso de instalación
17		Instalación SQL Server
18		Crear Instancias de Conexión SQL Server
19		Adjuntar Bases de Datos en el Servidor BD (Nuevo) importadas desde el Servidor de Bases de Datos actual
20		Tareas de depuración y optimización del Motor de Bases de Datos
21		**Proceso de Instalación de Software de Gestión de Energía**
22		Ejecutar instalador del aplicativo SPME 7.2.x
23		Ejecutar la herramienta de migración del PME 2023
24		Ejecutar instalador del aplicativo PME 8.2 (Upgrate In-Site)
25		Verificación de los dierentes desarollos importados desde la versión de PME 7.2.x to PME 8.2
26		Ejecutar la herramienta de migración del PME 2023
27		Ejecutar instalador del aplicativo PME 2023 (Upgrate In-Site)
28		Verificación de los dierentes desarollos importados desde la versión de PME 7.2.x to PME 8.2
29		Validar los datos historicos del aplicativo en producción o actual con el nuevo Servidor de Aplicaciones y de Bases de Datos
30		Tiempo de estabilización y chequeo del aplicativo nuevo
31		**Actividades Finales**
32		Devolver las licencias del servidor actual al servidor en la nube de Schneider
33		Generar las nuevas licencias de PME 2023 e instalarlas en el nuevo Servidor de Aplicaciones

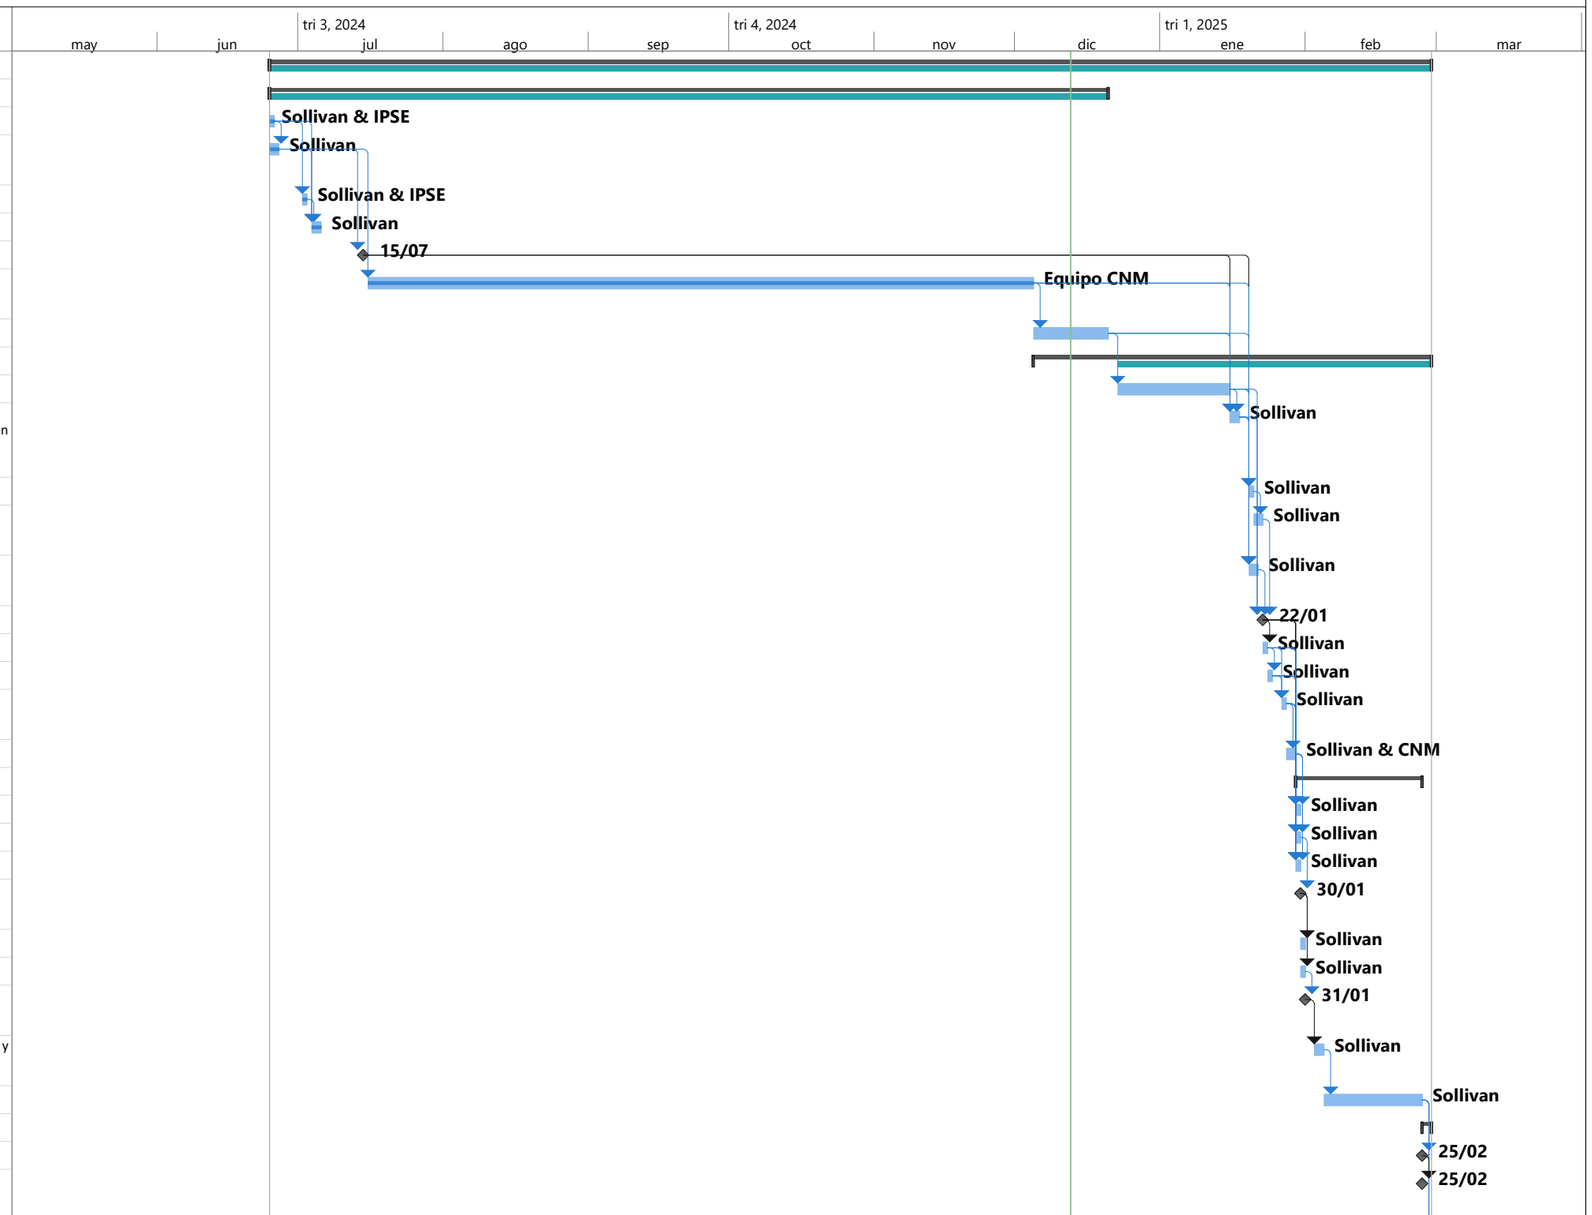

Proyecto: Cronograma Panasa
Fecha: vie 13/12/24

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea
34		Dar de baja el servidor actual (dejarlo como servidor de consulta)
35		Firma de Acta de Servicio y de capacitación
36		Elaboración de Informe
37		Facturación del Servicio



Proyecto: Cronograma Panasa
Fecha: vie 13/12/24

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	
