IPSE	**FORMATO DE NOVEDADES Y/O MODIFICACIONES CONTRACTUALES**	Código	Versión
		IPSE-CO-F77	3
		Fecha:	Paginas
		01/08/2024	1/3


Fecha:	16/12/2024				
Solicitante:	SANTIAGO ANDRES LLANOS VALENCIA -Supervisor				
No. De Contrato:	175-2024	**Proceso de Contratación No.**	IPSE- CNM-SA-003-2024		
Contratista:	SOLLIVAN SMART SOLUTIONS S A S				
Objeto del Contrato:	REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN, MIGRACIÓN Y SOPORTE DEL SOFTWARE POWER MONITORING EXPERT 7.2 A LA ÚLTIMA VERSIÓN VIGENTE DE ECOSTRUXURE POWER MONITORING EXPERT (PME)				
Valor Inicial:	NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($94.321.242)	**Inversión**			
		Funcionamiento	X		
		Proyecto	N/A		
		Rubro	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES		
Plazo de Ejecución Inicial:	El plazo de ejecución del contrato será de cuatro (4) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, aprobación de pólizas y la suscripción del acta de inicio.				
Fecha de Firma del Contrato:	14-06-2024	**Fecha de Inicio:**	24-06-2024	**Fecha de Terminación:**	23-12-2024
Supervisor Y/O Interventor:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 14 SANTIAGO ANDRES LLANOS VALENCIA				

Tipo De Solicitud:	***Modificación***	***Adición***	***Prórroga***	***Suspensión***
			X	
	Terminación anticipada	***Cesión***	***Reinicio***	***Otro***

Adición	**Valor de la Adición:**	N/A
	Valor CDP:	N/A
	No. Y Fecha CDP:	N/A
	Nuevo Valor Total:	N/A
Prórroga del Plazo de Ejecución	**Tiempo a Prorrogar:**	Tres (3) meses, es decir, hasta el 23 de marzo de 2025
	Fecha de Terminación Final:	23 de marzo de 2025

Datos De Modificaciones Anteriores (Si hay lugar a más de una modificación, agregar las casillas que corresponda)		
Modificación No. 1	**Fecha:** 21 de octubre de 2024	
Adición Presupuestal	**Prórroga**	**Aclaración**
$	**Tiempo:** dos (2) meses, es decir, hasta el 23 de diciembre del 2024	Se amplió el plazo del contrato hasta el 23 de diciembre del 2024, teniendo en cuenta que el IPSE no contaba con el personal técnico necesario para configurar los servidores requeridos por el contratista en el desarrollo del objeto contractual, quedando a la espera de la conformación del grupo TSI que pueda dar respuesta y apoyo técnico a las actividades propuestas en el cronograma remitido por el contratista.
Nuevo Valor: $	**Fecha De Terminación Final:** 23 de diciembre del 2024	

Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMMLV.
N/A
Desarrollo, Estado Actual Y Cumplimiento del Contrato
Se deja constancia sobre la verificación realizada por el supervisor, sobre los pagos de los aportes efectuados por parte del contratista a los sistemas de salud, pensión, ARL, cajas de compensación familiar, ICBF, SENA, de acuerdo con lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 23 de la Ley 750 de 2007 y el pago al sistema general de riesgos laborales, previsto por la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 723 de 2013), las constancias de pago de parafiscales podrán ser consultadas en el Orfeo con radicados 20241330073342, 20241330073352,20241330109062, 20241330114852 y 20241330114862.
Justificación De La Necesidad Y Conveniencia el Trámite Contractual
Frente a las actividades que se han llevado a cabo en el contrato 175-2024 cuyo objeto es el "REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN, MIGRACIÓN Y SOPORTE DEL SOFTWARE POWER MONITORING EXPERT 7.2 A LA ÚLTIMA VERSIÓN VIGENTE DE ECOSTRUXURE POWER MONITORING EXPERT (PME)" suscrito entre el IPSE y Sollivan Smart Solutions S.A.S, con acta de inicio del 24 de junio y con fecha de finalización el 23 de octubre de 2024, una vez perfeccionado el contrato, el contratista envió el cronograma aprobado por esta supervisión en el cual solicita, como hito principal, la entrega de dos servidores con sus respectivos sistemas operativos para poder realizar la actualización y migración del software Power Monotoring Expert.

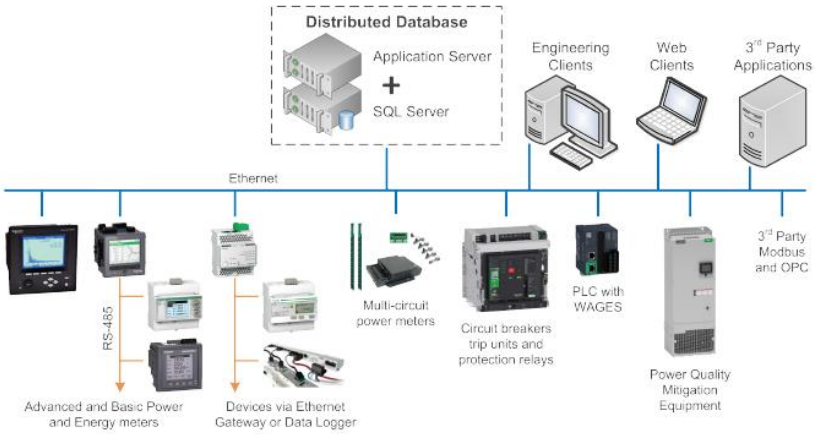

Mediante memorando con radicado 20241560030823 del 3 de julio de 2024 se realizaron los requerimientos de hardware y software (los 2 servidores configurados con su sistema operativo) necesarios para el inicio de la ejecución del contrato 175-2024 al grupo de tecnología del IPSE, solicitud que fue reiterada mediante memorandos con radicados 20241560033013 del 16 de julio y 20241560037043 del 06 de agosto. De igual forma se remitió memorando con radicado 20241560038283 del 14 de agosto de 2024 al ordenador del gasto exponiendo el estado del contrato y solicitando su apoyo para mediar con el grupo de tecnologías de la información para la entrega de los recursos solicitados.

El día 05 de septiembre con memorando con radicado 20241340042483 se recibe respuesta del memorando 20241560030823 por parte del grupo de Tecnología y Seguridad de la Información, argumentando que no ha sido posible dar solución al requerimiento de los 2 servidores por la falta de personal especializado en la administración de hiperconvergencia y de red. Por otro lado, el área de tecnología manifiesta que se está a la espera de la aprobación de la contratación del personal requerido para dar solución a los diferentes requerimientos del área. En base a esta respuesta, desde la supervisión se remitió memorando el día 06 de septiembre con radicado 20241560042763 enviado al Director General, solicitando el apoyo para dar celeridad a la contratación del personal requerido para dar respuesta a los requerimientos necesarios para dar ejecución al contrato 175-2024.

En base a lo anterior, y que el contrato ya no podría ejecutarse dentro de los tiempos prestablecidos inicialmente, desde la supervisión se procedió a solicitar la primer prórroga del contrato según radicado IPSE 20241560048843 del 09 de octubre de 2024, solicitando un plazo adicional de 2 meses para la ejecución de la actualización del software, mientras se adelantan los trámites por parte de la entidad para contratar el personal requerido por parte del grupo TSI y dar respuesta a los requerimientos del contratista, teniendo como nueva fecha de terminación el 23 de diciembre de 2024.

Por otro lado, es necesario resaltar que, mediate radicado IPSE 20241340055823 del 22 de noviembre del 2024, se suscribió el acta de inicio del contrato interadministrativo especifico no. 248 de 2024 entre suscrito entre el IPSE y ARTICS S.A.S, cuyo objeto es: “CONTRATAR SERVICIOS DE OPERACION DE TIC, PARA ADMINISTRAR, GESTIONAR Y MONITOREAR LA SEGURIDAD PERIMETRAL Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEL IPSE”, con el fin de dar respuesta a los requerimientos de infraestructura TIC de la entidad, dentro de los que se encuentra la configuración y entrega de servidores necesarios para continuar con la ejecución del contrato 175-2024.


Así las cosas, y teniendo en cuenta que aún se encontraba pendiente la entrega de los servidores por parte del área TSI, el contratista solicita una nueva prórroga de 3 meses con memorando 20241330107122 del 29 de noviembre de 2024 a la espera de que el IPSE cuente con los recursos necesarios para realizar las actividades programadas.

Desde el área TSI se remiten las credenciales de los servidores configurados el día 4 de diciembre de 2024 con radicado 20241330109862, por lo que, evaluando el horizonte de tiempo con el cronograma remitido por el contratista, ya no es posible culminar las actividades programadas antes del 23 de diciembre de 2024, por lo que es necesario realizar la segunda prórroga del contrato.

En forma adicional se debe tener en cuenta que la solicitud, no genera el reconocimiento a favor de SOLLIVAN SMART SOLUTIONS S A S de mayores erogaciones por parte del IPSE, a las ya dispuestas en el Contrato 175 de 2024.

Por lo anterior esta supervisión considera necesario realizar la segunda prórroga del contrato 175 de 2024 por un periodo de tres (3) meses teniendo como nueva fecha de terminación del contrato el día 23 de marzo de 2025.

Balance Financiero Del Contrato	
Valor Inicial Del Contrato:	$94.321.242
Valor Con Adiciones:	$94.321.242
Valor Total Ejecutado A La Fecha:	$0
valores pendientes de pago A La Fecha:	$94.321.242
Valor Total Pagado A La Fecha:	$0
Saldo Por Ejecutar:	$94.321.242

Anexos De La Solicitud	
1. Solicitud de prorroga y cronograma de actividades remitido por el contratista	
Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de interventor____ supervisor__X__ solicito la aprobación de la modificación del contrato	
Supervisor Y/O Interventor Del Contrato	SANTIAGO ANDRES LLANOS VALENCIA-Supervisor contrato 175-2024
Firma	

Reviso: Ing. Camilo Andrés Triana Estepa Coordinador Grupo de Seguimiento a la Prestación del Servicio.
Reviso: Abg.Yeimy Marcela Forero Ramírez, Contratista Secretaría General-IPSE
