MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE ASPC N° 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024661034728143**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-29.25

Bogotá, D.C, 19 de diciembre de 2024

Señor Teniente Coronel
GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GARCÍA
Subdirector de Adquisiciones Ejército
Carrera 50 No. 18-92 Puente Aranda
Bogotá, D.C

Asunto: Concepto Prorroga Contrato 010-SUADQ-INTR-2024

Con toda atención me permito solicitar a quien corresponda se tenga a bien recibir, la recomendación y sugerencia del comité evaluador y supervisor para poder realizar las modificaciones en las fechas de entrega de los elementos del Contrato 010-SUADQ-INTR-2024 que se relacionan a continuación.

SITUACIÓN CONTRACTUAL.

N° CONTRATO	ELEMENTO	TOTAL CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA SEGÚN CONTRATO
010-SUADQ-INTR-2024	PANTALONXILLO TIPO BOXER	239.785	26 de diciembre 2024

SOLICITUD MODIFICATORIO.


N° CONTRATO	ELEMENTO	CANTIDAD	FECHA DE PRORROGA
010-SUADQ-INTR-2024	PANTALONXILLO TIPO BOXER	239.785	31 de enero 2025

Dicha solicitud del modificatorio a los contratos se solicita teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

1. El proveedor manifiesta que por un hecho fortuito, consistente en la afectación de la quemada total del Compresor que reparte el aire a las maquinas neumáticas de confección, el pasado día 06 de Noviembre de 2024 y del cual por ser un elemento de origen Japones, su repuesto original tarda con las contingencias actuales de producción a nivel mundial unos 80 a 110 días en ser fabricado y enviado a la planta de producción, motivo por el cual, se decidió adquirir un nuevo compresor de Marca Italiana de referencia NUAIR, con condiciones técnicas mejoradas al compresor afectado, por lo cual y para garantizar producción de los elementos, se consiguió un compresor de tornillo el cual es de baja capacidad, con el fin de no

detener la producción de los Pantaloncillos tipo Bóxer, pero la capacidad de producción se nos bajó considerablemente al 20%, por ende se nos indicó por parte del personal técnico a cargo que la reparación, que el arreglo total estaría para entrega del compresor para el próximo 30 de Noviembre de 2024, mas 13 días de pruebas, daría fecha total del arreglo el 14 de Diciembre de 2024, pero debido a las dificultades técnicas de acoplamiento del nuevo compresor a la planta, el mismo a la fecha no se ha podido instalar de manera correcta, motivo por el cual la empresa encargada de su instalación nos indica que el mismo queda instalado hasta el próximo 27 de Diciembre de 2024, razón por la cual, se sigue trabajando con el compresor de tornillo a una capacidad de producción del 20%, generándonos una afectación en nuestro proceso productivo, ya que no se puede realizar la fabricación del Pantaloncillo tipo Bóxer en las capacidades inicialmente establecidas, y debido a esta afectación de un tercero, no se puede fabricar la cantidad de elementos requeridos para la tercera entrega establecida para el próximo 26 de diciembre de 2024.

IMÁGENES COMPRESOR AFECTADO

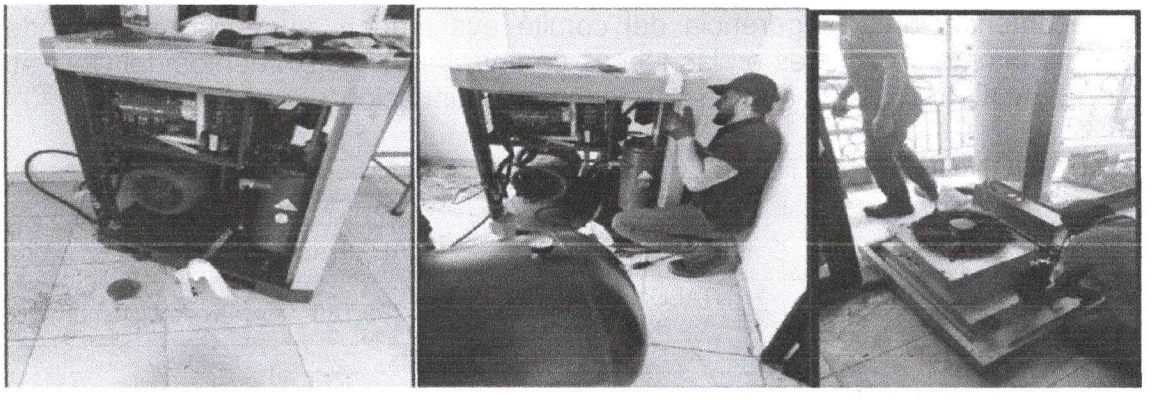

2. Finalmente teniendo en cuenta los anteriores aspectos sin generar un impacto negativo en la cadena logística en el desabastecimiento del material en los centros suministradores se solicita que se ajuste o se haga un modificatorio en las fechas y se ajuste de acuerdo a las actas de coordinación que se anexan en dicho informe con tal de que se asegure una entrega idónea de material.

Cordialmente,

Mayor CARRERO BLANCO CHRISTIAN
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC 21

Elaboró/ Cabo Segundo JUAN CHAGUENDO
Suboficial Control Calidad
