
Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
1	**1**	**IDU-1787-2021-GRUPO5-20241029**	**$ 56.926.928.761,00**	**1066 días**	**mar 28/12/21**	**mar 27/01/26**
2	**1.1**	**FRENTES DE OBRA VIGENCIAS 2022 - 2023 -2024 CONTRATO INICIAL**	**$ 40.523.428.507,00**	**828 días**	**mar 28/12/21**	**jue 27/02/25**
3	1.1.1	DISEÑOS - OBRA - AJUSTES - COMPONENTES	$ 40.523.428.507,00	828 días	mar 28/12/21	jue 27/02/25
4	**1.2**	**ADICIÓN 2 VIGENCIA 2025 - 2026**	**$ 16.403.500.254,00**	**261 días**	**mar 28/01/25**	**mar 27/01/26**
5	**1.2.1**	**FRENTES DE OBRA EXCLUIDOS (CTO INICIAL)**	**$ 10.603.560.681,00**	**241 días**	**mar 28/01/25**	**mar 30/12/25**
6	1.2.1.1	PROYECTO LA ARAÑA	$ 1.429.005.306,00	238 días	mar 28/01/25	jue 25/12/25
7	1.2.1.2	AVENIDA LOS COMUNEROS	$ 5.569.365.778,00	218 días	vie 28/02/25	mar 30/12/25
8	1.2.1.3	AVENIDA 1 DE MAYO (CALLE 22 SUR) ENTRE LA CARRERA 6 Y LA AUTOPISTA SUR	$ 1.365.523.180,00	197 días	vie 28/03/25	lun 29/12/25
9	1.2.1.4	CARRERA 27 ENTEA CALLE 19 (PALOQUEMAO) Y CALLE 26 (AVENIDA EL DORADO)	$ 590.050.128,00	63 días	mar 28/01/25	jue 24/04/25
10	1.2.1.5	TRANSVERSAL 53 DESDE AC 3 HASTA AK 68	$ 1.649.616.289,00	153 días	lun 28/04/25	mié 26/11/25
11	**1.2.2**	**FRENTES VIGENCIA 2025 Y 2026**	**$ 1.136.094.306,00**	**152 días**	**jue 27/02/25**	**dom 28/09/25**
12	1.2.2.1	RENOVACIÓN DE REDES SECTOR PATIO LA REFORMA)	$ 492.638.987,00	111 días	vie 28/03/25	vie 29/08/25
13	1.2.2.2	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO (SIN DISEÑO) SECTOR PATIO LA REFORMA (diseós)	$ 0,00	43 días	jue 27/02/25	lun 28/04/25
14	1.2.2.3	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO (SIN DISEÑO) SECTOR PATIO LA REFORMA	$ 643.455.319,00	89 días	mié 28/05/25	dom 28/09/25
15	**1.2.3**	**ATENCIONES ESPECIALES VIGENCIAS 2025 - 2026**	**$ 1.312.280.021,00**	**261 días**	**mar 28/01/25**	**mar 27/01/26**
16	1.2.3.1	PREVISION PARA ATENCIONES ESPECIALES	$ 1.312.280.021,00	261 días	mar 28/01/25	mar 27/01/26
17	**1.2.4**	**AJUSTES 2025 - 2026**	**$ 3.351.565.246,00**	**261 días**	**mar 28/01/25**	**mar 27/01/26**
18	1.2.4.1	AJUSTES	$ 3.351.565.246,00	240 días	mar 28/01/25	sáb 27/12/25
19	1.2.4.2	ENTREGA DE OBRA	$ 0,00	23 días	dom 28/12/25	mar 27/01/26
20	1.2.4.3	ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA	$ 0,00	0 días	mar 27/01/26	mar 27/01/26

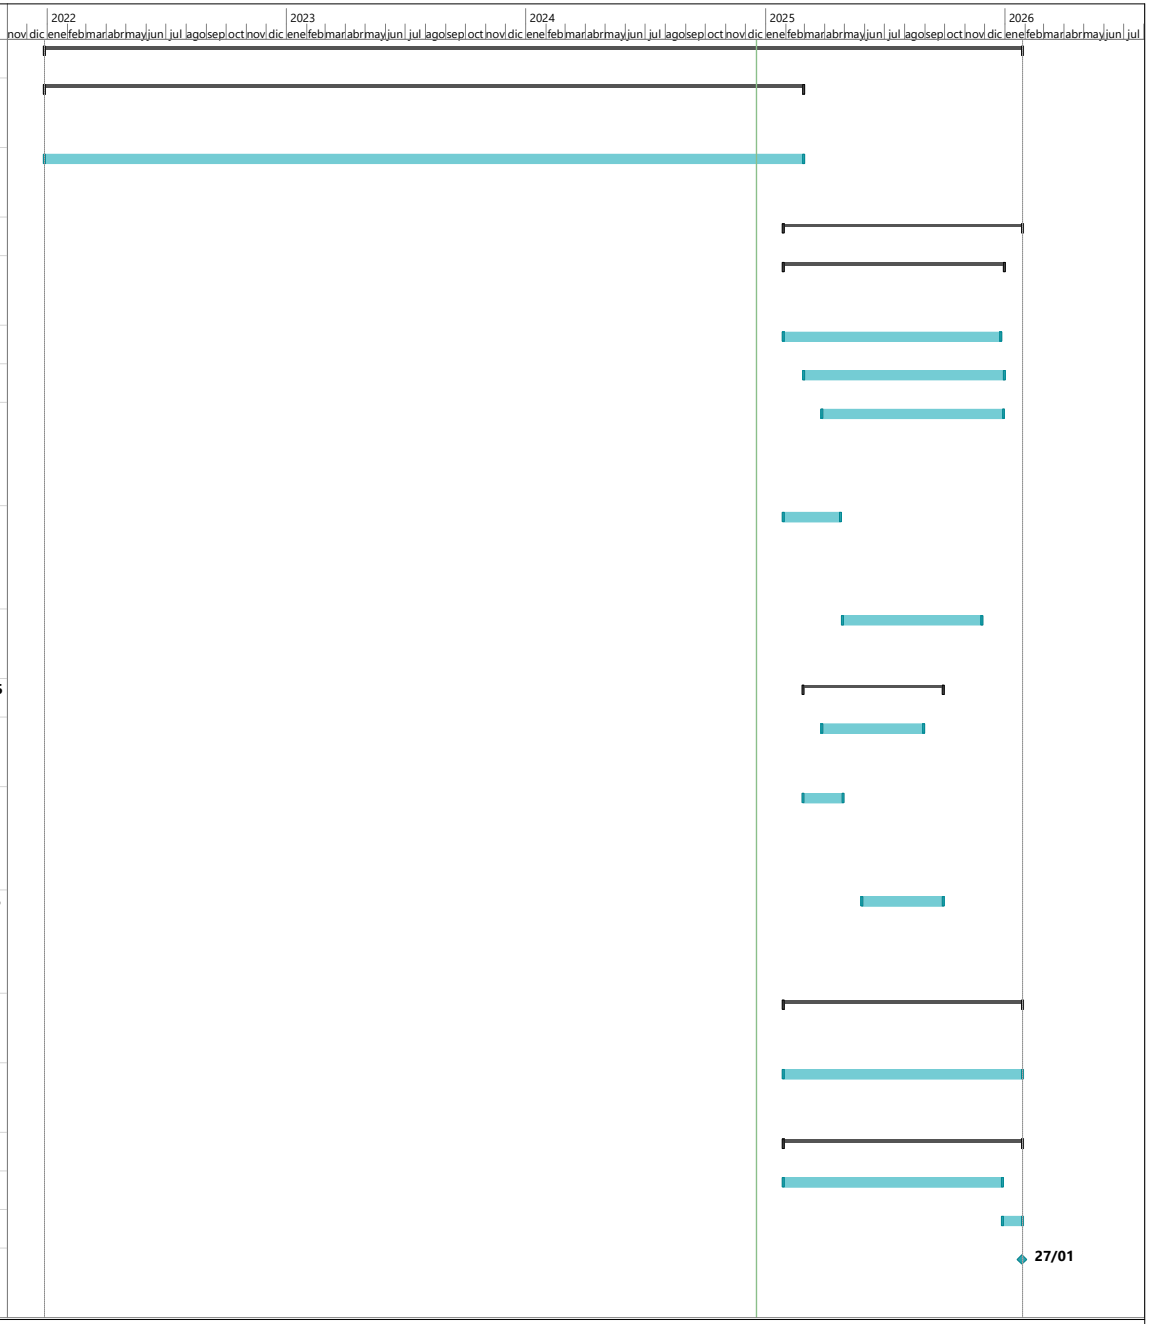

CRONOGRAMA ADICION 1
Fecha: mié 18/12/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual
