

3DStudio

WEB COMMUNICATION

BIENVENIDOS

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE)

Contratar los servicios tecnológicos para el mantenimiento evolutivo y soporte del portal web Bogotá Trabaja y la plataforma VCC

26/11/2024

3DStudio
WEB COMMUNICATION

Agenda



Gráfica del backlog y sprint



Actividades ejecutadas



Gráfica de Progreso del Sprint y Epic



Próximas actividades



Riesgos

3DStudio
WEB COMMUNICATION

Gráfica del backlog y sprint

Buscar en la lista

Compartir | 1 filtro aplicado | Grupo | Formato

Tipo	Clave	Resumen	Estado	Sprint
☑	SCRUM-6 SCRUM-46	20, [24] Opción al rol consejero empleador para que pued...	FINALIZADA	Tablero Sprint 4
☑	SCRUM-6 SCRUM-36	23, [9] Información básica vacante: Actualizar lista de val...	FINALIZADA	Tablero Sprint 4
☑	SCRUM-6 SCRUM-42	1, [5] No se encuentra en la parte superior derecha	FINALIZADA	Tablero Sprint 4
☑	SCRUM-6 SCRUM-30	4 [13] Visualizacion del usuario que realizo la última modif...	FINALIZADA	Tablero Sprint 4
☑	SCRUM-6 SCRUM-45	18, [19] Guardado temporal en la creación de vacantes	EN CURSO	Tablero Sprint 4
☑	SCRUM-6 SCRUM-28	19, [18] Al momento de crear una vacante, opción de prec...	TAREAS POR HA...	Tablero Sprint 4
☑	SCRUM-6 SCRUM-48	22, [11] Información básica vacante: ajustar el campo des...	TAREAS POR HA...	Tablero Sprint 4
☑	SCRUM-6 SCRUM-43	26, [17] Revisar precisión del algoritmo de matching (porc...	TAREAS POR HA...	Tablero Sprint 4

El Backlog de Jira es una lista organizada de todas las tareas, historias de usuario, bugs y otros elementos de trabajo que aún no han sido asignados a un Sprint. Representa todo el trabajo pendiente y es gestionado.

Actividades Ejecutadas

- **Mantenimientos:**
  - 21 requerimientos.
  - 2 bugs.

- Consumo bolsa de 40 horas:


  Sesión de revisión HU 18v2 1 hora
  Total consumo 4,5 Horas

Reuniones:

- 19 Nov 24 - Comité seguimiento CTO 1368-2024 3DStudio.
- 21 Nov 24 - Revisión Excel pruebas.
- 21 Nov 24 - Revisión ambientes GCP.
- 22 Nov 24 - Sesión inquietudes funcionales algoritmo


Actividades Ejecutadas

[24] Opción al rol consejero empleador para que pueda postular hojas de vida a una vacante

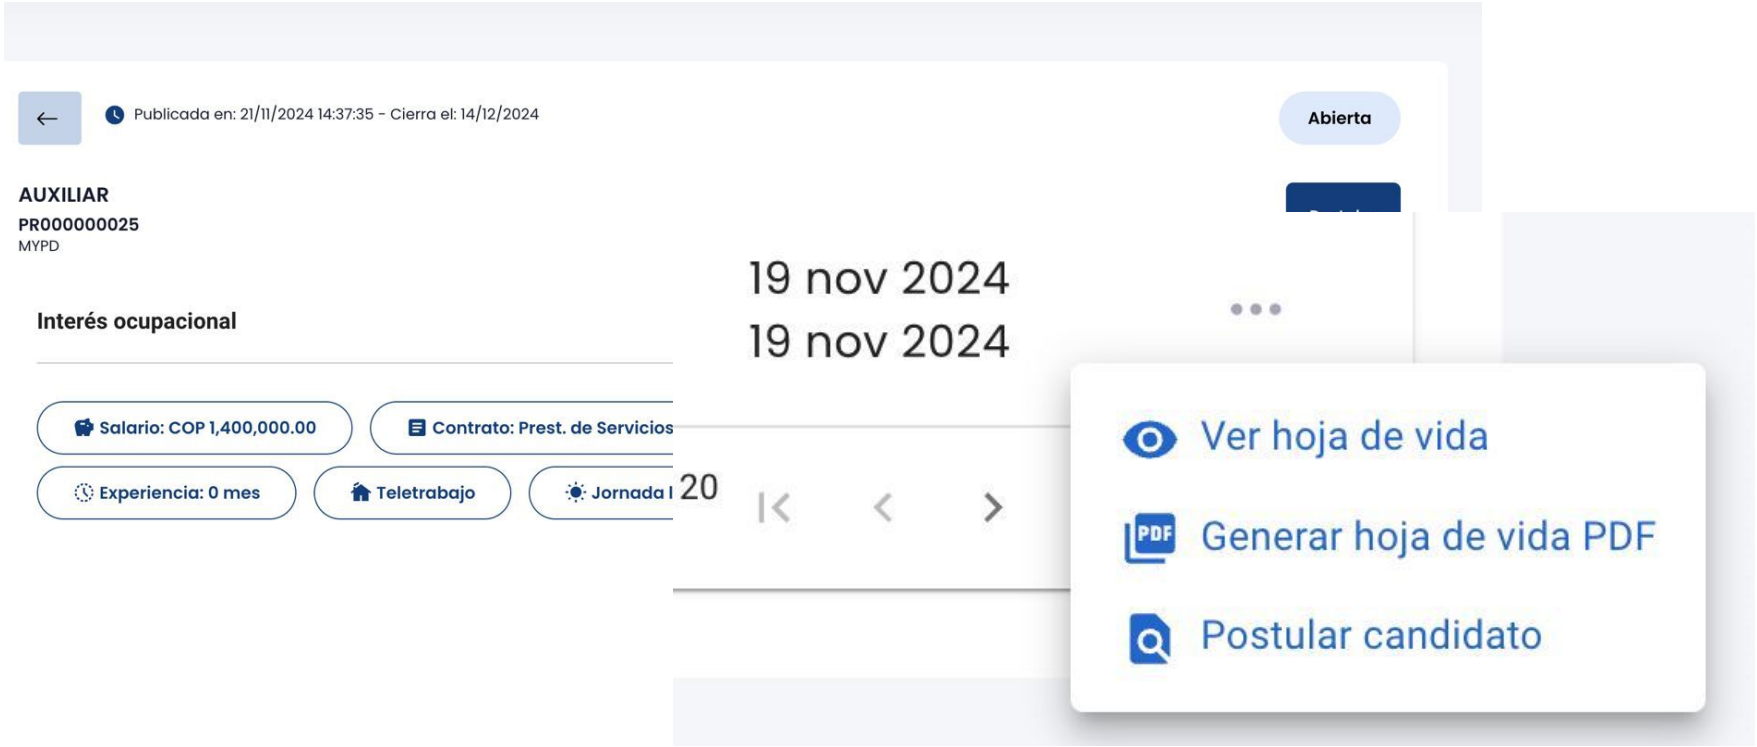

Actividades Ejecutadas

[23] Habilitar opción al rol consejero empleador para que pueda seleccionar y descargar en formato pdf, la hoja de vida de todos los candidatos postulados a una vacante

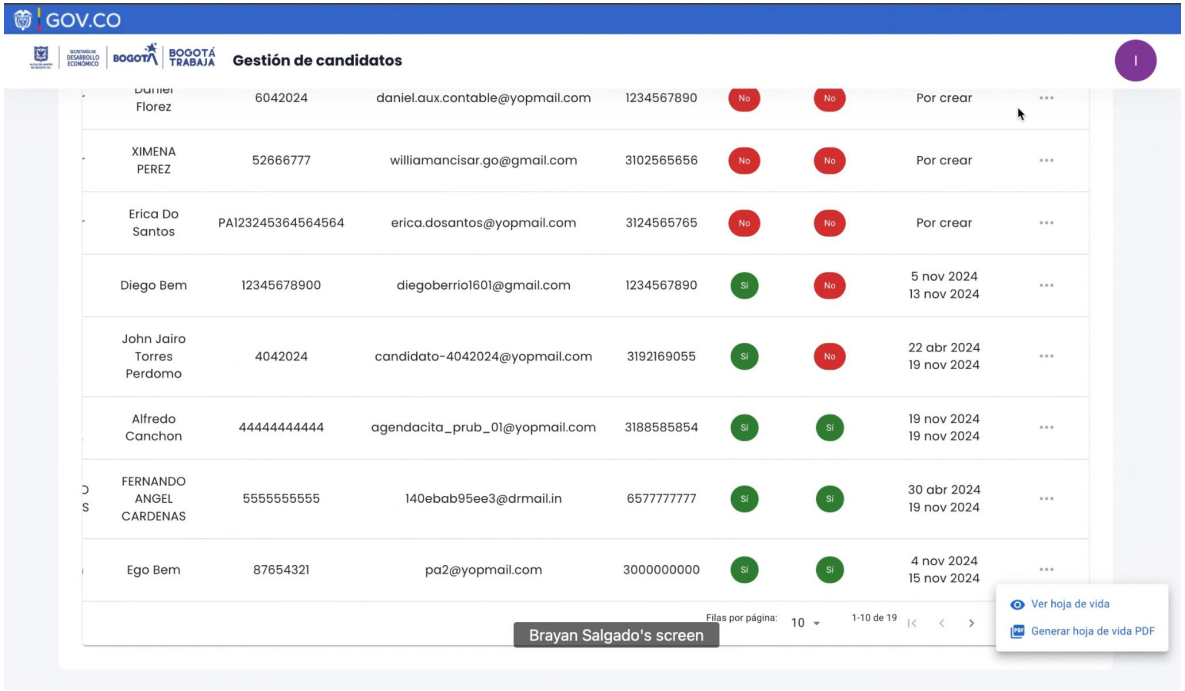



Actividades Ejecutadas

Aprobadas: 7
Pendientes: 8

CONSECUTIVO DE ACTAS						
No.	**Fecha**	**Asunto de la reunión**	**Aprobación y firma**	**Estado**	**Fecha envio de acta**	**Enviada por**
1	17/10/24	Reunión Área funcional contrato 1368-2024 "Mantenimiento portal web Bogotá Trabaja"	Aprobada	Completa	**N/A**	**N/A**
2	18/10/24	Reunión Área Técnica contrato 1368-2024 "Mantenimiento portal web Bogotá Trabaja"	Pendiente	sin firmas	**22/10/24**	**Via Mail**
3	23/10/24	Solución de inquietudes varias CTO 1368-2024	Aprobada	Completa	**N/A**	**N/A**
4	24/10/24	Módulos de formación virtual	Aprobada	Completa	**N/A**	**N/A**
5	25/10/24	Reunión Mantenimiento Evolutivo plataforma Bogotá Trabaja	Aprobada	Completa	**N/A**	**N/A**
6	30/10/24	Reunión para socialización de requerimientos del modulo de formación presencial.	Aprobada	Completa	**N/A**	**N/A**
7	1/11/24	Socialización de requerimientos de los módulos de acompañamiento de consejero candidato y empleador	Aprobada	Completa	**N/A**	**N/A**
8	5/11/24	Reunión de Seguimiento proyecto CTO 1368-2024	Pendiente	sin firmas	**8/11/24**	**Via Mail**
9	6/11/24	Apoyo a la Creación de Historias de Usuario	Pendiente	sin firmas	**8/11/24**	**Via Mail**
10	6/11/24	Reunión Técnica CTO 1368-2024	Pendiente	sin firmas	**8/11/24**	**Via Mail**
11	7/11/24	Reunión Revisión HU CTO 1368-2024	Pendiente	sin firmas	**8/11/24**	**Via Mail**
12	12/11/24	Comité de Seguimiento CTO 1386-2024	Pendiente	sin firmas	**13/11/24**	**Via Mail**
13	14/11/24	Rev-Historias usuario formación presencial	Pendiente	sin firmas	**18/11/24**	**Via Mail**
14	15/11/24	Comité de Seguimiento CTO 1386-2024	Pendiente	sin firmas	**18/11/24**	**Via Mail**
15	19/11/24	Reunion de Seguimiento CTO 1386-2024	Pendiente	sin firmas	**21/11/24**	**Via Mail**

Gráfica de Progreso del Sprint



La gráfica de Progreso del Sprint en Jira dentro de la sección de Insights muestra la cantidad el porcentaje de trabajo realizado, el trabajo que se encuentra en curso y el trabajo pendiente, permite medir el nivel de cumplimento de las actividades planeadas en el Sprint.

Gráfica de Progreso del Epic



La gráfica de Progreso del Epic en Insights ayuda a visualizar el avance global en los Epics, mostrando la cantidad de trabajo completado frente al trabajo restante. A medida que el equipo completa las tareas relacionadas con el Epic, la gráfica actualiza la información, mostrando una proyección del avance y permitiendo al equipo identificar tendencias de cumplimiento y posibles atrasos.

Próximas actividades

1. Recibir las historias de usuario del módulo de formación virtual.

2.
- Firma de las actas pendientes
- Resultados de pruebas desarrollos entregados.

3. Documentos para facturación de Fase 0.

4. Recibir las historias de usuario del nuevos desarrollos, módulos:

5. Definir los cortes de fechas de facturación.

1. Módulo Direccionamiento / Orientación
2. Módulo acompañamiento candidato
3. Módulo acompañamiento empresa
4. Módulo de parametrización de las listas de valores
5. Módulo Reportes
6. Módulo descarga detallados
7. Módulo atenciones

Riesgos

Id Riesgo	Descripción Riesgo	Causa Raíz	Fecha identificación	Tipo de Riesgo (Amenaza/Oportunidad)	Tipo de Impacto (Directo, Indirecto)	Objetivo del proyecto afectado (Tiempo, costo, alcance, calidad)
6	Retraso o no entrega de insumos	Entrega tardía de historias de usuario	16/10/2024	Amenaza	Directo	Tiempo

Id Riesgo	Probabilidad *Rara vez (1) Improbable (2) Posible (3) Probable (4) Casi seguro (5)*	Impacto *Insignificante (1) Menor (2) Moderado (3) Mayor (4) Catastrófico (5)*	Valor	Estrategia **Para las amenazas: Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar Para las oportunidades: Explotar, Mejorar, Compartir o Aceptar.**	Plan de respuesta a los riesgos	
					Actividades	Responsables
6	5	5	Zona de riesgo Alta	Mitigar	Ampliar el plazo del proyecto para continuar con los desarrollo evolutivos y nuevas funcionalidades.	SDDE /3D

¡Gracias!



3DStudio

WEB COMMUNICATION
