DATOS DE LA REUNIÓN	
Dependencia: SDDE	**Asunto**: Comité de Seguimiento CTO 1386-2024
Fecha:12/11/2024 11:00 am	**Lugar: Meet**
Asistentes/Participantes: Anexo: Listado de Asistencia	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

- Hacer seguimiento al contrato 1386-2024

AGENDA DE LA REUNIÓN

- Presentación de 3D al seguimiento del proyecto
- Preguntas varias

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1- Se da la bienvenida a los equipos de trabajo de 3DStudio y de la SDDE.

2- Paso seguido el ingeniero Carlos del equipo de 3D inicia su presentación con respecto a avance del proyecto, donde destaca lo siguiente:

- Indica que la fase 0 aun está pendiente de aprobación por parte del equipo de la secretaria.
- El 6 d de noviembre la SDDE presentó la plataforma que usan, conclusión esa plataforma no está disponible
- Se confirma que el 8 de noviembre se entregaron las HU de la primera fase del contrato con los 26 requerimientos por parte de la SDDE
- Se hizo activación de la bolsa de 40 horas donde ya hubo un consumo de 3.5 horas.
- A la fecha tenemos pendiente 9 actas pendiente de firmas.
- De la Fase 1 del proyecto vamos al 12% completado que corresponde al desarrollo de las HU suministradas por parte de la SDDE.
- Se vuelven a socializar los riesgos latentes en el proyecto

.

3- Adriana del equipo de la SDDE interviene comunicando que se radico por parte de la SSDE, un oficio donde contractualmente se especifica que la obligación de 3D es desplegar, instalar y montar los módulos. A lo que el ingeniero Felipe del equipo de 3D responde el contrato dice que hay una herramienta que se selecciona con el proveedor seleccionado: en el primer correo que puso 3D se preguntaron dudas puntuales, donde decían que ya existía una plataforma.

4- El ingeniero Carlos del equipo de 3D toma la palabra para intervenir con respecto a los ambientes de desarrollo: así 3D tenga el permiso y la autorización, no es responsabilidad de 3D clonar los ambientes, ya que es la SDDE quien debe provisionar los ambientes ya listos.

5- El ingeniero Felipe interviene y dice al respecto de los ambientes de desarrollo lo siguiente: el ambiente de desarrollo no se identifica donde esta. Aun clonándolo se rompe el desarrollo hay un montón de e cosas pero no se ha podido hacer desarrollo en Dev. Los 8 desarrollos que ya hizo el equipo de 3D del mantenimiento evolutivo se hicieron porque están en QA. No se puede desconectar lo que ya tienen, el givflow, la infraestructura no es la nuestra. El equipo de 3D ha estado en reconocimiento, pero no se ha podido hacer desarrollo el 3D


6- El ingeniero trae el tema del Voicebot, dice que la SDDE ya cuenta con un número de teléfono y la ingeniera Adriana responde que el día de hoy 12/11/2024 responde el correo que 3D envió con el fin de dar respuesta el proveedor del servicio.


7- La representante legal de 3D interviene solicitando una sesión de transferencia de conocimiento la cual se proyecta agendar para el día jueves-Reunión técnica.

8- La ingeniera Adriana ya para concluir habla de los entregables del primer pago, plazo máximo para radicar el 18 de noviembre y propone trabajar en conjunto esta semana para proceder con la facturación y revisar el día viernes 3pm los avances

9- Se da por terminada la sesión.

Anexos: Relacione anexos si se contemplan en el desarrollo de la reunión (Presentaciones, archivos Excel u otros)

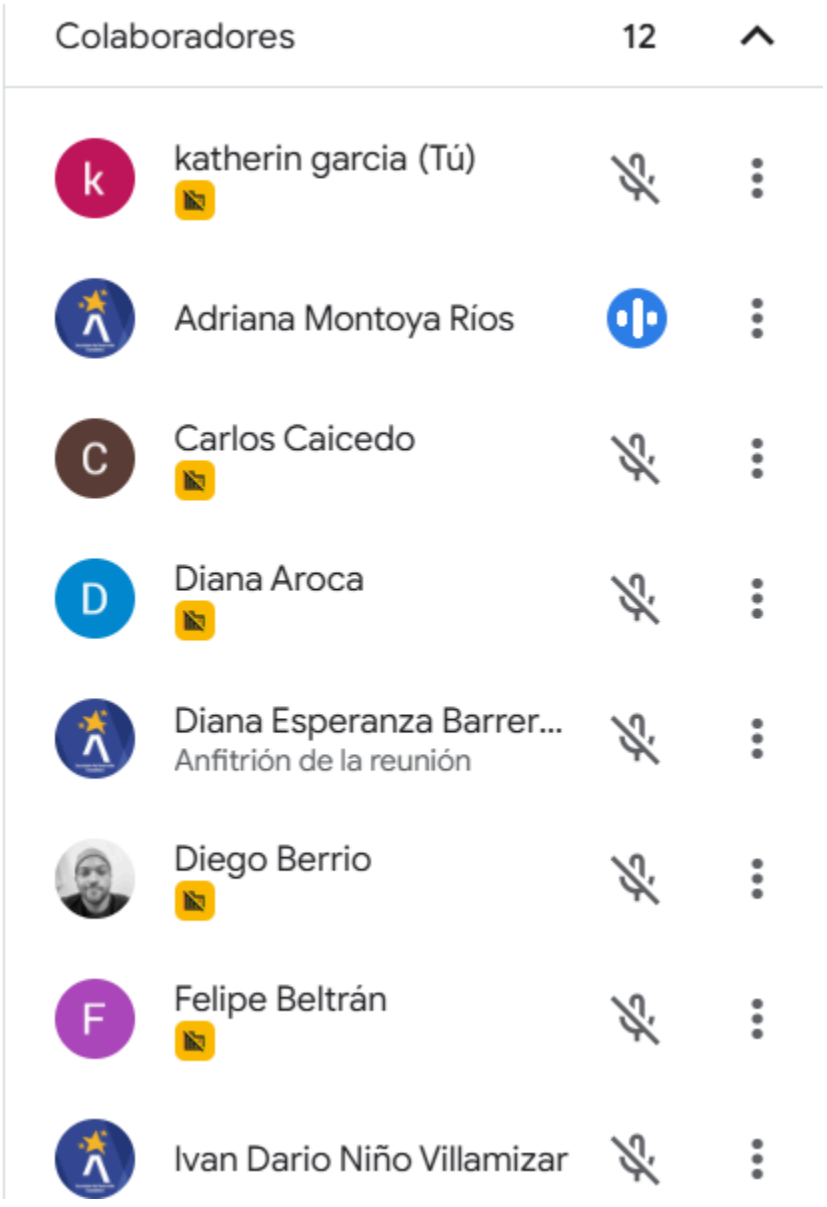
Colaboradores
12
katherin garcia (Tú)
Adriana Montoya Ríos
Carlos Caicedo
Diana Aroca
Diana Esperanza Barrer...
Anfitrión de la reunión
Diego Berrio
Felipe Beltrán
Ivan Dario Niño Villamizar

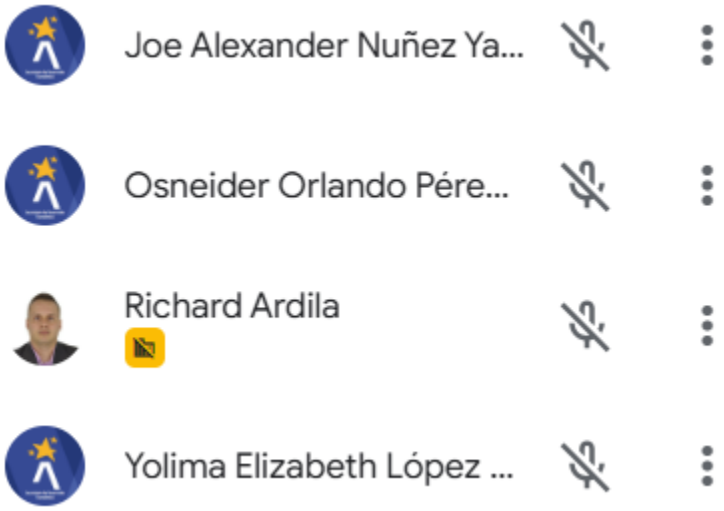

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN		
COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA CUMPLIMIENTO**
Responder correo del Voicebot	Adriana Montoya-SDDE	**12/11/2024**
Agendar sesión técnica jueves	Ivan Dario-SDDE	**14/11/2024**
Agendar Revisión de avances viernes 3 pm	Equipo SDDE	**15/11/2024**

En constancia de lo anterior firman:

Realizó

Nombre:
Cargo:

Revisó

Nombre:
Cargo:

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.
