MEMORANDO

STEST
202434600396773
Información Pública
Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., Diciembre 26 de 2024

PARA: **IVAN ABELARDO SARMIENTO GALVIS**
Director Técnico de Gestión Contractual

DE: Subdirector General de Infraestructura

REFERENCIA: Alcance al radicado 202434600392053 de fecha 19 diciembre de 2024, con el asunto Solicitud Modificación Contractual 10 al Contrato 1670-2020 - Reprogramación de Vigencias Incorporación Ajustes 1670 2020.

Respetado Dr. Sarmiento;

Respetuosamente se allega alcance al radicado 202434600392053 del 19 de diciembre de 2024, que solicitara la modificación No. 10 al contrato de Obra 1670 de 2020, en el sentido de ajustar de conformidad con lo siguiente:

Teniendo en cuenta la necesidad planteada en el radicado 202434600392053 del 19 de diciembre de 2024, se requiere reprogramar los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal de las vigencias 2024, 2025, 2026, 2027 y 2028:

OBRA				
GRUPO	**VIGENCIA**	**CDP**	**VALOR**	**EXPEDIDO POR**
4	2024	202401 5738	$98,351,235,511	TRANSMILENIO S.A.
	2024	202401 5746	$4,831,590,577	
	2025	202401 5746	$1,592,508,170	
	2026	202401 5746	$1,992,352,947	
	2027	202401 5746	$2,032,388,222	
	2028	202401 5746	$2,212,836,475	
TOTAL			$111,012,911,902	

Así mismo de acuerdo a la reprogramación de las vigencias futuras asociadas a la ejecución del Proyecto Av. Ciudad de Cali, dada por el CONFIS, TRANSMILENIO

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-08_V14

MEMORANDO

STEST
202434600396773
Información Pública
Al responder cite este número

S.A., y acorde con el Programa Anual de Caja (PAC) teniendo en cuenta el plazo actual del contrato y los recursos pendientes de ejecutar para el cierre del año 2024, se procedió a emitir los Certificados de Disponibilidad Presupuestal por parte de TRANSMILENIO S.A, de cada uno de los contratos suscritos con ocasión del desarrollo del proyecto, que para el caso que nos ocupa son los que se relacionan a continuación:

Lo anterior, aclarando que dicha reprogramación contempla las vigencias ya señaladas y no afecta lo ya ejecutado a la fecha. Es importante indicar que para la vigencia 2024, se cuenta con el CDP 202401 5738 por valor de $98,351,235,511 y teniendo en cuenta que la reprogramación de recursos (PAC) y la ejecución de la presente vigencia, se ejecutan para el año 2024 la suma de $45,057,275,314, por lo cual, el saldo se libera y hace parte de las reprogramaciones de las siguientes vigencias, así:

OBRA				
GRUPO	**VIGENCIA**	**CDP**	**VALOR**	**EXPEDIDO POR**
	2024	202401 5738	$45,057,275,314	TRANSMILENIO S.A.
4	2025	202412 9221	$41,563,013,507	
	2026	202412 9221	$11,730,946,690	
	2026	202412 9222	$1,266,167,639	
	2027	202412 9222	$2,532,335,278	
	2028	202412 9222	$2,532,335,278	
	2029	202412 9222	2,532,335,278	
	2030	202412 9222	2,532,335,278	
	2031	202412 9222	1,266,167,640	
TOTAL			$111,012,911,902	

De igual forma, se aclara que la fecha de terminación del proyecto es 29 de diciembre de 2030, de acuerdo con la última modificación Numero 8 al contrato 1670-2020 de plazo estimado así:

GRUPO	***ETAPA***	***DURACIÓN ETAPA***	***PLAZO TOTAL***
4	*PRECONSTRUCCIÓN*	*20 meses*	*119 meses*
	CONSTRUCCIÓN	*39 meses*	
	MANTENIMIENTO	*60 meses*	

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-08_V14

MEMORANDO

STEST
202434600396773
Información Pública
Al responder cite este número

Con fundamento en análisis previamente expuesto, la Dirección Técnica de Construcciones, recomienda a la Subdirección General de Infraestructura, en calidad de ordenadora del gasto, adelantar la solicitud de la Modificación No. 10 al Contrato de Obra IDU-1670-2020, a la Dirección Técnica de Gestión Contractual, en los términos presentados en el presente documento. Por lo anterior, se propone el siguiente clausulado:

ARTICULADO PROPUESTO:

CLAUSULA PRIMERA. Modificar la Cláusula 13 “Apropiaciones Presupuestales” del Contrato IDU-1670-2020, la cual fue modificada previamente mediante *CLÁUSULA PRIMERA* de la modificación No 6, en el sentido de incorporar la reprogramación de vigencias futuras, así:

“CLÁUSULA 13. APROPIACIONES PRESUPUESTALES.

(…)

Toda vez que el plazo estimado del presente Contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras según los Certificado de Disponibilidad Presupuestal de Vigencias Futuras suscritos por la Empresa de Transporte del Tercer Milenio, que se describen a continuación:

OBRA				
GRUPO	**VIGENCIA**	**CDP**	**VALOR**	**EXPEDIDO POR**
	2024	202401 5738	$45,057,275,314	TRANSMILENIO S.A.
4	2025	202412 9221	$41,563,013,507	
	2026	202412 9221	$11,730,946,690	
	2026	202412 9222	$1,266,167,639	
	2027	202412 9222	$2,532,335,278	
	2028	202412 9222	$2,532,335,278	
	2029	202412 9222	2,532,335,278	
	2030	202412 9222	2,532,335,278	
	2031	202412 9222	1,266,167,640	
TOTAL			$111,012,911,902	

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-08_V14

MEMORANDO

STEST
202434600396773
Información Pública
Al responder cite este número

PARÁGRAFO: Teniendo en cuenta la reprogramación de que trata la presente modificación, la cual pretende regularizar presupuestalmente el contrato y atender la proyección real de pagos derivada del mismo, de manera anualizada y con la vigencia futura asociada el año de ejecución y giro, la programación de vigencias futuras deberá ser revisada y de ser necesario ajustada, previa culminación del plazo ***contractual, con*** el fin de realizar una nueva la reprogramación ajustándola al desarrollo del contrato y el plazo final de su ejecución.”.

CLÁUSULA SEGUNDA: Incorporar al Contrato de Obra IDU-1670-2020 la suma de **DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE ($ 12.468.006.221)**, por concepto de ajustes con destino al Fondo de Compensaciones; consecuencialmente, Modificar la tabla contenida en el numeral **11.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO**, la cual quedará de la siguiente manera:

EL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL, se estima en la suma de:		
$ 179.491.572.009.00	**CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NUEVE PESOS M/C**	
VALOR PARA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE A.I.U)		
Es la suma de	**$ 86.588.490.730**	**OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/C**
VALOR PARA REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES (INCLUYE A.I.U)		
Es la suma de	**$ 13.597.033.455**	**TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/C**

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-08_V14

MEMORANDO

STEST
202434600396773
Información Pública
Al responder cite este número

PORCENTAJE OFICIAL DEL A.I.U. DE OBRAS PARA REDES	**33,824%**	**TREINTA Y TRES PUNTO OCHOCIENTOS VEINTICUATRO POR CIENTO**
VALOR OFICIAL DEL A.I.U. DE OBRAS PARA REDES	**$ 3.436.648.580**	**TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/C**
VALOR PARA REMUNERACIÓN PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE DESVÍOS (INCLUYE A.I.U)		
Es la suma de	**$ 176.241.310**	**CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/C**
PORCENTAJE OFICIAL DEL A.I.U. DE OBRAS PARA ADECUACIÓN DE DESVÍOS	**33,824%**	**TREINTA Y TRES PUNTO OCHOCIENTOS VEINTICUATRO POR CIENTO**
VALOR OFICIAL DEL A.I.U. DE OBRAS PARA ADECUACIÓN DE DESVÍOS	**$ 44.544.970**	**CUARENTA Y CUATRO MILLONES OBRAS PARA ADECUACIÓN DE QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO DESVÍOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/C**
VALOR PARA REMUNERACIÓN PARA OBRAS ESPECIALES (INCLUYE A.I.U)		
Es la suma de	**$ 2.786.447.825**	**DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO**

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-08_V14

MEMORANDO

STEST
202434600396773
Información Pública
Al responder cite este número

		PESOS M/C
PORCENTAJE OFICIAL DEL A.I.U. DE OBRAS PARA ADECUACIÓN DE DESVÍOS	**33,824%**	**TREINTA Y TRES PUNTO OCHOCIENTOS VEINTICUATRO POR CIENTO**
VALOR OFICIAL DEL A.I.U. DE OBRAS PARA ADECUACIÓN DE DESVÍOS	**$ 704.274.355**	**SETECIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/C**
VALOR PARA REEMBOLSO DE COMPENSACIONES Y ENSAYOS DE LABORATORIO		
Es la suma de	**$ 264.473.842**	**DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/C**
COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE AJUSTES E IVA)	**$ 237.134.644**	**DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/C**
COSTOS ESTIMADOS PARA COMPENSACIONES SDA (INCLUYE AJUSTES)	**$ 27.339.198**	**VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/C**
VALOR PARA REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST		
		CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE

MEMORANDO

STEST
202434600396773
Información Pública
Al responder cite este número

Es la suma de	**$ 5.347.403.739**	**MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/C**
VALOR OFICIAL DE LA REMUNERACIÓN AMBIENTAL PARA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN	**$ 125.504.545**	**CIENTO VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/C**
VALOR OFICIAL DE LA REMUNERACIÓN AMBIENTAL PARA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	**$ 4.624.657.519**	**CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS M/C**
VALOR OFICIAL DE LA REMUNERACIÓN AMBIENTAL PARA ETAPA DE MANTENIMIENTO	**$ 597.241.675**	**QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/C**
VALOR PARA REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA		
Es la suma de	**$ 3.557.254.684**	**TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/C**
VALOR OFICIAL DE LA REMUNERACIÓN DE DIALOGO		**TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUARENTA**

MEMORANDO

STEST
202434600396773
Información Pública
Al responder cite este número

CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN	**$ 336.044.053**	**Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/C**
VALOR OFICIAL DE LA REMUNERACIÓN DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	**$ 1.988.317.492**	**MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/C**
VALOR OFICIAL DE LA REMUNERACIÓN DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA ETAPA DE MANTENIMIENTO	**$ 1.232.893.139**	**MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS M/C**
VALOR PARA REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS		
Es la suma de	**$ 6.257.261.021**	**SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL VEINTIÚN PESOS M/C**
VALOR OFICIAL DE LA REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS PARA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN	**$ 145.813.010**	**CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL DIEZ PESOS M/C**
VALOR OFICIAL DE LA REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS PARA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	**$ 5.186.606.916**	**CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS M/C**

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-08_V14

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

MEMORANDO

STEST
202434600396773
Información Pública
Al responder cite este número

VALOR OFICIAL DE LA REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS PARA ETAPA DE MANTENIMIENTO	**$ 924.841.095**	**NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/C**
VALOR PARA PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES		
Es la suma de	**$ 48.136.416.152**	**CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE**
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		
Es la suma de	**$ 118.872.860**	**CIENTO DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTAPESOS M/C**
VALOR PARA REMUNERACIÓN POR OBRAS Y LABORES DE MANTENIMIENTO		
Es la suma de	**$ 12.661.676.391**	**DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/C**
Nota 1: Todos los ahorros que llegare a generar la ejecución del contrato se imputarán al Valor del Fondo de Compensación.		
NOTA 2: Los ensayos necesarios para que el contratista realice el control de recibo de obra y materiales establecidos en la Norma Técnica, los necesarios para verificar la calidad de los materiales adquiridos a sus proveedores y las pruebas y certificaciones necesarios para el recibo de las obras por parte de las empresas de servicios públicos como el de RETILAP, RETIE, o presión, desinfección, hermeticidad y estanqueidad, se incluyen en el porcentaje del AIU del contrato.		


MEMORANDO

STEST
202434600396773
Información Pública
Al responder cite este número

NOTA 3: El VALOR PARA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE A.I.U) incluye el COSTO ESTIMADO DE PRECONSTRUCCIÓN.

PARÁGRAFO PRIMERO: APROPIACIONES PRESUPUESTALES: La presente incorporación de recursos se encuentra amparada por el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

ONCAL	RAD IDU	RAD TM	VALOR	OBJETO	NÚMERO SOLICITUD	DOCUMENTO	DOCUMENTO EXPEDIDO	RT / CTO
Avda. Cali	202430501623151	2024-ER-64376	12,468,006,221	ADICIÓN AL IDU-1670-2020 PARA LA CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C GRUPO 4: EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.	2915	CDP	9318	IDU-1670-2020

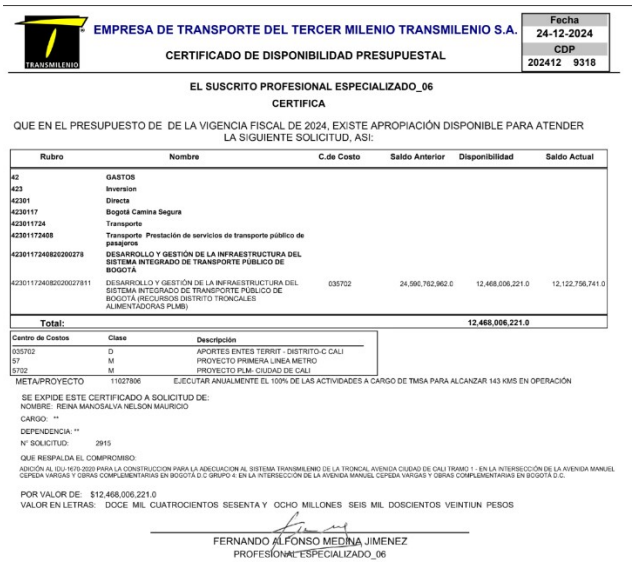

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Fecha 24-12-2024
CDP 202412 9318

EL SUSCRITO PROFESIONAL ESPECIALIZADO_06

CERTIFICA

QUE EN EL PRESUPUESTO DE DE LA VIGENCIA FISCAL DE 2024, EXISTE APROPIACIÓN DISPONIBLE PARA ATENDER LA SIGUIENTE SOLICITUD, ASI:

Rubro	Nombre	C.de Costo	Saldo Anterior	Disponibilidad	Saldo Actual
42	GASTOS				
423	Inversion				
42301	Directa				
4230117	Bogotá Camina Segura				
423011724	Transporte				
42301172408	Transporte Prestación de servicios de transporte público de pasajeros				
4230117240820200278	DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE BOGOTÁ				
42301172408202002781	DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE BOGOTÁ (RECURSOS DISTRITO TRONCALES ALIMENTADORAS PLMB)	035702	24,590,762,962.0	12,468,006,221.0	12,122,756,741.0
Total:				12,468,006,221.0	

Centro de Costos	Clase	Descripción
035702	D	APORTES ENTES TERRIT - DISTRITO-C CALI
57	M	PROYECTO PRIMERA LINEA METRO
5702	M	PROYECTO PLM- CIUDAD DE CALI

META/PROYECTO 11027806 EJECUTAR ANUALMENTE EL 100% DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE TMSA PARA ALCANZAR 143 KMS EN OPERACIÓN

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:
NOMBRE: REINA MANOSALVA NELSON MAURICIO
CARGO: **
DEPENDENCIA: **
N° SOLICITUD: 2915

QUE RESPALDA EL COMPROMISO:
ADICIÓN AL IDU-1670-2020 PARA LA CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C GRUPO 4: EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.

POR VALOR DE: $12,468,006,221.0
VALOR EN LETRAS: DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS

FERNANDO ALFONSO MEDINA JIMENEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO_06

PARÁGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la incorporación de ajustes de que trata la presente cláusula, el balance actualizado del Fondo de Compensaciones, es el siguiente:

Fondo Inicial	**39.377.863.949**
Traslado Bioseguridad	**319.671.518**

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-08_V14

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

MEMORANDO

STEST
202434600396773
Información Pública
Al responder cite este número

Total, Fondo	**39.697.535.467**
Presupuesto	**Valor Proyectado**
Ajuste Preconstrucción	22.285.798
Ajuste Const. Unitarios	2.070.676.277
Ajuste Const. Global	15.097.709.060
Ajuste Asfalto	365.855.155
Ajuste Componentes	1.677.351.576
Ajuste Z acero	46.987.831
Ajuste Real Mtto	-
Total, Certificado Septiembre 2024	**17.847.997.314**
Certificado Octubre	**1.432.868.383**
Total, Certificado a Origen	**19.280.865.697**
Nuevo Valor Componentes Mod No 8	**4.029.125.536**
NPS Certificados	**3.733.748.047**
NPS Pendientes	**2.276.271.060**
INCORPORACIÓN DE AJUSTES	**12.468.006.221**
Total, Consumido Fondo	**29.320.010.340**
Saldo Fondo	**22,845,531,348**

CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍAS: El Contratista se obliga a tramitar y a remitir al IDU la actualización de las garantías contractuales, de conformidad con lo previsto en la Cláusula 8 “Garantías” del Contrato, de manera que reflejen lo acordado en el presente modificatorio, y allegarlas a la Dirección Técnica de Gestión Contractual del IDU, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del mismo.

PARÁGRAFO: En caso de incumplimiento de las obligaciones consagradas en esta estipulación, el Contratista se hará acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el Contrato.

CLÁUSULA QUINTA. MANIFESTACIONES:

MANIFESTACIÓN DEL CONTRATISTA: El contratista manifiesta que el IDU deberá realizar las incorporaciones faltantes al Fondo de Compensación del Contrato 1670 – 2020, que de conformidad con lo manifestado en el comunicado del Contrato No. D 1423 del 12 de diciembre de 2024 y debidamente avalado por Interventoría e IDU corresponde al total relacionado en la comunicación mencionada. El Contratista manifiesta que con la suscripción del presente modificatorio no renuncia a ninguno de sus derechos, en especial, lo que corresponde a la solicitud de recursos faltantes para el referido fondo de compensaciones para la terminación efectiva de su contrato. Considerando que el IDU indica en el presente modificatorio que queda “pendiente de manera posterior la incorporación de recursos necesarios

MEMORANDO

STEST
202434600396773
Información Pública
Al responder cite este número

para la terminación del contrato," EL CONTRATISTA deja la salvedad que la incorporación posterior podrá tener destinación tanto a mayores cantidades de obra, como a NP pendientes y cualquier otro aspecto diferente a ajustes afectos al Fondo de Compensación.

MANIFESTACIÓN DEL IDU: Frente a la manifestación hecha por el contratista de obra, se precisa que, una vez se encuentre el recurso disponible por parte de Transmilenio S.A., y previa solicitud del contratista de obra y aval del contratista de Interventoría, se realizarán los trámites administrativos necesarios para acometer la modificación relacionada con la incorporación de ajustes asociados a la etapa de mantenimiento.

PARÁGRAFO: En virtud de lo indicado en la presente modificación, el IDU no renuncia a ejercer su potestad sancionatoria en caso de incumplimiento por parte del Contratista.

CLAUSULA SEXTA. DOCUMENTOS: Para todos los efectos, son documentos de la presente Modificación los enunciados en la parte considerativa.

CLAUSULA SÉPTIMA. Las demás Cláusulas del Contrato de Obra IDU-1670-2020 y sus Apéndices y/o Anexos Técnicos que no se vean modificadas con la suscripción de la presente novedad contractual conservan su vigencia y validez.

CLAUSULA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO: Esta modificación se perfecciona con la firma de las Partes y su aceptación en la plataforma SECOP II.

Agradezco de antemano su amable y oportuna atención.

Cordialmente,

NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
Subdirector General de Infraestructura
Firma mecánica generada el 26-12-2024 10:10:01 AM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-08_V14

MEMORANDO

STEST
202434600396773
Información Pública
Al responder cite este número

Anexos: 1 Otros

Aprobó: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Aprobó: LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN-Dirección Técnica de Construcciones
Elaboró: SANDRA YAMILE PORTILLA BUITRAGO-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-08_V14
