Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: XXXX

Código Único de Factura - CUFE :
XXXX

Banco Caja Social
UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

LESATH SAS *Identificado con* *NI9012390418*

Actualmente posee(n) el siguiente producto, radicado en la oficina 0007 CASTELLANA, con las siguientes características:

CUENTA DE AHORROS PYME

Número	:	*24121555333*
Fecha de Apertura	:	*24 de marzo de 2023*
Condiciones de Manejo	:	*Individual,1 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector*
Estado	:	*CUENTA ACTIVA*

Esta constancia se expide con destino a: QUIEN INTERESE ****
Realizada en la oficina 0007 CASTELLANA de la ciudad de BOGOTA, el día martes, 27 de febrero de 2024.

Cordialmente,

Efectuado por:
B5A0M1L4 - B. MONICA ALZATE MONTAÑEZ

FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

Establecimiento Bancario | Banco Caja Social | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | VIGILADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS TERRITORIAL SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER PERIODO MES: 01 de Mayo al 26 de Mayo de 2024 y Del 11 de Junio al 15 de Junio de 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 8 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. --- (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. --- (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 7.985.472,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	24-jun-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MIGUEL MATEUS		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	24-jun-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MIGUEL MATEUS		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	26/0/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	OSCAR PATIÑO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARLON GAMBOA	Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Fecha: 2024.07.30 18:16:25 -05'00'	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Fecha: 2024.07.30 18:16:57 -05'00'	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 3540 de 2023 DE 2022

OBJETO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER

CONTRATISTA: Lesath SAS **NIT.** 901.239.041 - 8

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: Lesath SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 8.043.827,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 01 de Mayo al 26 de Mayo de 2024 y Del 11 de Junio al 15 de Junio de 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE
Matricula profesional No.:
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Fecha: 2024.07.30 18:17:07 -05'00'
Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matricula profesional No.:
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre:
Matricula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Fecha: 2024.07.30 18:17:16 -05'00'
Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matrícula Profesional No.:
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 24/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS TERRITORIAL SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No.** 8 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 7.985.472,00 **MES** 01 de Mayo al 26 de Mayo de 2024 y Del 11 de Junio al 15 de Junio de 2024

ACTA FINAL ☑

CONTRATO No : 3540 de 2023 (Indique número y año)

OBJETO:

ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER

CONTRATISTA: Lesath SAS (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3556 de 2023 INTERVENTOR: Mateus Acosta Ingeniería SAS

PLAZO INICIAL: Dos (02) Meses (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: Seis Meses + 14 Días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18/10/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/05/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 11/06/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418.094.516,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 20.233.484,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 438.328.000,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 02 de fecha 28 de Marzo de 2024		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1		E	201 - 22		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	12,00	$ 202.600,00	$ 2.431.200,00	5,00	$ 1.013.000,00	-	$ -	5,00	$ 1.013.000,00
2		E	211 - 22		REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	1.888,40	$ 17.100,00	$ 32.291.640,00	20,00	$ 342.000,00	-	$ -	20,00	$ 342.000,00
3		SB	311 - 22		AFIRMADO	m3	400,00	$ 126.600,00	$ 50.640.000,00	490,00	$ 62.034.000,00	8,00	$ 1.012.800,00	489,30	$ 61.945.380,00
4		OA	600 - 22		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	294,00	$ 28.700,00	$ 8.437.800,00	1.020,00	$ 29.274.000,00	-	$ -	1.020,00	$ 29.274.000,00
5		OA	610 - 22		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	260,00	$ 74.500,00	$ 19.370.000,00	230,00	$ 17.135.000,00	-	$ -	230,00	$ 17.135.000,00
6		OA	630 - 22		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN	m3	84,00	$ 825.900,00	$ 69.375.600,00	96,00	$ 79.286.400,00	4,00	$ 3.303.600,00	95,80	$ 79.121.220,00
7		OA	630 - 22		CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	7,75	$ 510.600,00	$ 3.957.150,00	14,00	$ 7.148.400,00	2,00	$ 1.021.200,00	14,00	$ 7.148.400,00
8		OA	640 - 22		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	kg	4.703,60	$ 8.300,00	$ 39.039.880,00	6.390,00	$ 53.037.000,00	-	$ -	6.390,00	$ 53.037.000,00
9		OA	661 - 22		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	36,00	$ 696.200,00	$ 25.063.200,00	42,00	$ 29.240.400,00	-	$ -	42,00	$ 29.240.400,00
10		OA	681 - 22		GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	m3	430,00	$ 295.000,00	$ 126.850.000,00	522,00	$ 153.990.000,00	-	$ -	522,00	$ 153.990.000,00
11		T	900 - 22		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)-TRANSPORTE CON VOLQUETA DE 6m3	m3-Km	15.950,18	$ 2.100,00	$ 33.495.386,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Ajuste al Peso Actas de Modificación										$ -				
*	Subtotal Obras								$ 410.951.856,00		$ 432.500.200,00		$ 5.337.600,00		$ 432.246.400,00
*	PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) PROVISION PARA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION PARA REDUCIR LA EXPOSICION Y CONTAGIO DEL COVIC 19								$ 4.109.519,00		$ 2.647.872,00		$ 2.647.872,00		$ 2.647.872,00
*	VALOR TOTAL BASICO DE LAS OBRAS								$ 415.061.375,00		$ 435.148.072,00		$ 7.985.472,00		$ 434.894.272,00
*	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)								$ 3.033.141,00		$ 3.179.928,00		$ 58.355,00		$ 3.178.073,00
*	ESTUDIOS Y DISEÑOS								$ -		$ -		$ -		$ -
*	VALOR IVA (ESTUDIO Y DISEÑOS) (19%)								$ -		$ -		$ -		$ -
*	SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYE IVA)								$ -		$ -		$ -		$ -
*	Valor básico implementación del protocolo de bioseguridad por covid-19								$ -		$ -		$ -		$ -
*	Administración protocolo de bioseguridad por covid-19(2,5% valor básico implementación del protocolo de bioseguridad por covid-19)								$ -		$ -		$ -		$ -
*	VALOR IVA (19% Administración protocolo de bioseguridad por covid-19)								$ -		$ -		$ -		$ -
*	Valor implementación del protocolo de bioseguridad por covid-19 (incluye IVA)								$ -		$ -		$ -		$ -
*	Valor total básico obras, estudios y diseños e implementación del protocolo de bioseguridad por covid-19								$ 415.061.375,00		$ 435.148.072,00		$ 7.985.472,00		$ 434.894.272,00
*	Valor total IVA obras, estudios y diseños e implementación del protocolo de bioseguridad por covid-19								$ 3.033.141,00		$ 3.179.928,00		$ 58.355,00		$ 3.178.073,00
*															
*	**VALOR TOTAL**								**$ 418.094.516,00**		**$ 438.328.000,00**		**$ 8.043.827,00**		**$ 438.072.345,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30,00%
Utilidad 5,00%

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*VALOR TOTAL OBRAS	$ 7.985.472,00	$ 58.355,00	$ 8.043.827,00
*PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) PROVISION PARA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION, PARA REDUCIR LA EXPOSICION Y CONTAGIO DEL COVIC 19	$ -	$ -	$ -
* ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
* Valor implementación del protocolo de bioseguridad por covid-19	$ -	$ -	$ -
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 7.985.472,00**	**$ 58.355,00**	**$ 8.043.827,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ -	$ 1.355.000,00
SB	$ 1.012.800,00	$ 61.945.380,00
B	$ -	$ -
P	$ -	$ -
OA	$ 4.324.800,00	$ 368.946.020,00
SCT	$ -	$ -
OV	$ -	$ -
T	$ -	$ -
TOTAL	**$ 5.337.600,00**	**$ 432.246.400,00**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 7.985.472,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 7.985.472,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 8.043.827,00 **VALOR EN LETRAS:** OCHO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: **Leonardo Iván Ramirez Bernal**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202 - 97499 CND

Firma:
Nombre: **Mateus Acosta Ingeniería SAS**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 68202 - 109529 STD

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 24/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS TERRITORIAL SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 8 **DE** 01 de Mayo al 26 de Mayo de 2024 y Del 11 de Junio al 15 de (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 7.985.472,00

SEGUIMIENTO No. 8 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 3540 de 2023

OBJETO:

ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER


CONTRATISTA: Lesath SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3556 de 2023 **INTERVENTOR:** Mateus Acosta Ingeniería SAS

PLAZO INICIAL: Dos (02) Meses (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18/10/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/05/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418.094.516,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 438.328.000,00

PLAZO ACUMULADO: Seis Meses + 14 Días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 11/06/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 20.233.484,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					18 de Octubre al 31 de Diciembre de 2023	01 de Enero de 2024 al 31 de Enero de 2024	01 de Febrero al 29 de Febrero de 2024	01 de Marzo al 31 de Marzo de 2024	01 de Abril al 30 de Abril de 2024	01 de Mayo al 27 de Mayo de 2024 y Del 11 de Junio al 15 de Junio de 2024	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N…
EXPLANACIONES (E) (1 y 2)	$ 34.722,84	8,449%	0,313%	% P	0,00%	2,00%	3,00%	2,00%	0,00%	-0,69%				
				$ P	$0	$8.650	$12.975	$8.650	$0	-$28.920				
	$ 1.355,00	0,313%	$ 1.355,00	$ E	$0	$0	$0	$299.250	$1.055	$0				
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,069%	0,24%	0,00%				
AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES (SB) (B) (3)	$ 50.640,00	12,323%	14,323%	% P	0,00%	0,50%	3,00%	4,00%	3,84%					
				$ P	$0	$2.163	$12.975	$12.975	$17.300	$16.621				
	$ 62.034,00	14,343%	$ 61.945,38	$ E	$0	$0	$0	$0	$50.639	$31.016				
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,088%	0,23%				
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE (OA) (4,5,6,7,8,9 Y 10)	$ 292.093,63	71,077%	85,305%	% P	0,00%	5,00%	21,00%	18,00%	20,00%	21,34%				
				$ P	$0	$21.625	$90.825	$77.850	$86.500	$92.311				
	$ 369.111,20	85,344%	$ 368.946,02	$ E	$0	$41.812	$145.553	$105.302	$70.961	$4.325				
				% E	0,00%	9,70%	33,77%	24,43%	16,41%	1,00%				
OBRAS VARIAS Y DE MITIGACION AMBIENTAL (OV)	$ -	0,000%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
	$ -	0,000%	$ -	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
TRANSPORTES (T) (11)	$ 33.495,39	8,151%	0,000%	% P	0,00%	1,50%	2,00%	2,00%	0,00%	-5,50%				
				$ P	$0	$6.488	$8.650	$8.650	$0	-$23.788				
	$ -	0,000%	$ -	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
GPP6	$ -	0,000%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
	$ -	0,000%	$ -	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
GPP7	$ -	0,000%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
	$ -	0,000%	$ -	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
GPP8	$ -	0,000%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
	$ -	0,000%	$ -	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
TOTAL OTROS ITEMS	$ -	0,000%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
	$ -	0,000%	$ -	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 410.951,86**	**100,000%**	**99,94%**											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 432.500,20**	**100,000%**	**$ 432.246,40**											

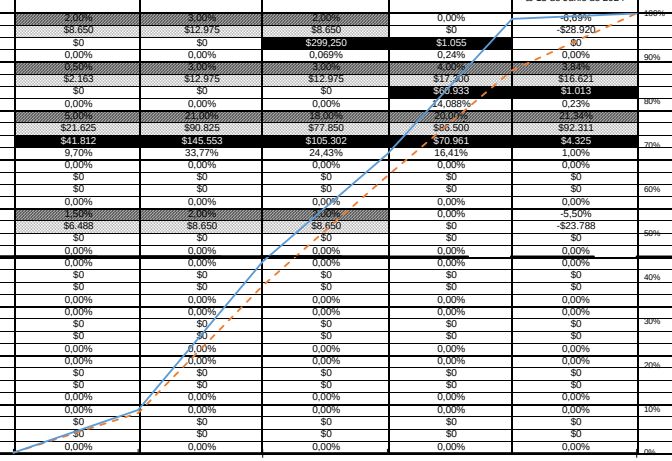

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	9,00%	29,00%	25,00%	24,00%	13,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ 38.925,02	$ 125.425,06	$ 108.125,05	$ 103.800,05	$ 56.225,03	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	9,00%	38,00%	63,00%	87,00%	100,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ 38.925,02	$ 164.350,08	$ 272.475,13	$ 376.275,17	$ 432.500,20	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	9,70%	33,77%	24,50%	30,74%	1,23%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ 41.953,88	$ 146.046,85	$ 105.959,81	$ 132.948,25	$ 5.337,60	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	9,70%	43,47%	67,97%	98,71%	99,94%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ 41.953,88	$ 188.000,73	$ 293.960,55	$ 426.908,80	$ 432.246,40	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
* PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) PROVISION PARA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION PARA REDUCIR LA EXPOSICION Y CONTAGIO DEL COVIC 19	$ 4.109,52 / $ 2.647,87	$ 2.647.872,00	%
* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 3.033,14 / $ 3.179,93	$ 58,36	1,835%
* SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYE IVA)	$ - / $ -	$ -	%
* Valor implementación del protocolo de bioseguridad por covid-19 (incluye IVA)	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 7.142,66	$ 2.647.930,36	45436,191%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 5.827,80		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 418.094,52**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B')	**$ 438.328,00**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: Leonardo Ivan Ramirez Bernal
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202 - 97499

Aprueba Firma:
Nombre: Miguel Roberto Mateus Acosta *
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 68202 - 109529 STD

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	CODIGO	AFINCO-FR-12
		VERSION	1
		PAGINA	1

CONTRATO No. 3540 de 2023

		%	TIPO DE PAGO		NUMERO DE ACTA O CENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	8	01 de Mayo al 26 de Mayo de 2024 y Del 11 de Junio al 15 de Junio de 2024
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. De Recurso Presupuestal que financia el proyecto

(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1132323	RUBRO No.	C-2402-0600-11-0-2402098-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 8.043.827,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	$ 8.043.827,00

Nombre : **OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 3540 de 2023 **Contratista** Lesath SAS

Objeto del Contrato ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER

Acta No 8 **Valor basico** $ 7.985.472,00 **Período** 01 de Mayo al 26 de Mayo de 2024 y Del 11 de Junio al 15 de Junio de 2024

Valor incluido el Iva $ $ 8.043.827,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1		Río Negro	$ 3.284.534,00	$ -	$ -	**$ 3.284.534,00**
2		Tona	$ 4.759.293,00	$ -	$ -	**$ 4.759.293,00**
	TOTALES		**$ 8.043.827,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.043.827,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

	DEPARTAMENTO 1	SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	RIONEGRO Nit : 890.204.646 - 3	$ 3.284.534,00	$ 3.260.706,00
	MUNICIPIO 2	TONA Nit : 890.205.581 - 8	$ 4.759.293,00	$ 4.724.766,00
	MUNICIPIO 3		$ -	$ -
	MUNICIPIO 4		$ -	
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 8.043.827,00**	**$ 7.985.472,00**

	DEPARTAMENTO 2			
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			**0,00**

Leonardo Iván Ramirez Bernal
Representante Legal
CONTRATISTA

Miguel Roberto Mateus Acosta
Representante Legal o Apoderado
INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS TERRITORIAL SANTANDER

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 3540 de 2023

CONTRATISTA: Lesath SAS

MES INFORME MENSUAL: 8

PROYECTO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3556 de 2023

INTERVENTOR: Mateus Acosta Ingeniería SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1132323	C-2402-0600-11-0-2402098-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SITIO CRÍTICO DE LA RED TERCIARIA ESTABILIZADO - MEJORAMIENTO ,MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED TERCIARIA. NACIONAL	11	Nación	Contrato Principal	$ 418.094.516,00	$ 418.094.516,00
					Adicional No. 01	$ 20.233.484,00	$ 20.233.484,00
TOTAL						$ 438.328.000,00	$ 438.328.000,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 438.328.000,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
										$ 438.328.000,00	**$ 438.328.000,00**				
1	Obra	Del 18 de Octubre de 2023 al 31 de Octubre de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1132323 - 22 de Enero de 2024	$ 438.328.000,00	$ 438.328.000,00			x	
2	Obra	Del 01 de Noviembre de 2023 al 30 de Noviembre de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1132323 - 22 de Enero de 2024	$ 438.328.000,00	$ 438.328.000,00			x	
3	Obra	Del 01 de Diciembre de 2023 al 31 de Diciembre de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1132323 - 22 de Enero de 2024	$ 438.328.000,00	$ 438.328.000,00			x	
4	Obra	Del 18 de Octubre de 2023 al 17 de Enero de 2024	$ 41.812.100,00	$ 305.550,00	$ 42.117.650,00	$ -	$ -	$ -	1132323 - 22 de Enero de 2024	$ 396.210.350,00	$ 396.210.350,00			x	
5	Obra	Del 01 de Febrero de 2024 al 29 de Febrero de 2024	$ 145.553.280,00	$ 1.063.659,00	$ 146.616.939,00	$ -	$ -	$ -	1132323 - 22 de Enero de 2024	$ 249.593.411,00	$ 249.593.411,00			x	
6	Obra	Del 01 de Marzo de 2024 al 31 de Marzo de 2024	$ 123.490.300,00	$ 902.429,00	$ 124.392.729,00	$ -	$ -	$ -	1132323 - 22 de Enero de 2024	$ 125.200.682,00	$ 125.200.682,00			x	
7	Obra	Del 01 de Abril de 2024 al 30 de Abril de 2024	$ 116.053.120,00	$ 848.080,00	$ 116.901.200,00	$ -	$ -	$ -	1132323 - 22 de Enero de 2024	$ 8.299.482,00	$ 8.299.482,00				
8	Obra	01 de Mayo al 27 de Mayo de 2024 y Del 11 de Junio al 15 de Junio de 2024	$ 7.985.472,00	$ 58.355,00	$ 8.043.827,00	$ -	$ -	$ -	1132323 - 22 de Enero de 2024	$ 255.655,00	$ 255.655,00				
9															
10															
11															
TOTALES			**$ 434.894.272,00**	**$ 3.178.073,00**	**$ 438.072.345,00**										

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* Ajuste al Peso Actas de Modificación	$ -	$ -	**$ -**
* Subtotal Obras	$ 432.246.400,00	$ 3.158.724,00	**$ 435.405.124,00**
* PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) PROVISION PARA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION PARA REDUCIR LA EXPOSICION Y CONTAGIO DEL COVIC 19	$ 2.647.872,00	$ 19.349,00	**$ 2.667.221,00**
* ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	**$ -**
* Valor básico implementación del protocolo de bioseguridad por covid-19	$ -	$ -	**$ -**
* Administración protocolo de bioseguridad por covid-19 (2,5% valor básico implementación del protocolo de bioseguridad por covid-19)	$ -	$ -	**$ -**
*			
*			
VALOR TOTAL	**$ 434.894.272,00**	**$ 3.178.073,00**	**$ 438.072.345,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaracicnes pertinentes.

Firma
Nombre: MARCO ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202 - 095046 CND

Firma
Nombre: Mateus Acosta Ingeniería SAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202 - 109529 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Bogotá D.C., 17 de junio de 2024

LESATH SAS

CERTIFICACIÓN

Yo, LEONARDO IVÁN RAMÍREZ BERNAL , identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.909.677 expedida en Bogotá, obrando en calidad de Representante Legal de LESATHSAS., con NIT 901.239.041-8, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 9º de la Ley 828 de 2003, CERTIFICO Y DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Artículo 442, que la citada empresa ha efectuado el pago por concepto de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el periodo del 01 de mayo al 15 de junio de 2024 con ocasión a la suscripción del Acta de Recibo Parcial No. 08 del contrato de obra No 3540 de 2023 suscrito entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS y LESATH S.A.S y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Nota: Para el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se han tenido en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999, Artículos 19º al 24º. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales, se ha tenido en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el Artículo 10º de la Ley 21 de 1982.

LEONARDO IVÁN RAMÍREZ BERNAL
Representante Legal

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901239041-8	LESATH SAS		CL 77 13 47 OF 605	3554197	contabilidad.cumbreingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	V POPULAR	V POPULAR	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	17/06/2024	77902140	$1.078.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	39.900	0		0		0	4	200	0	40.100	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	22.600	0		0		0	4	100	0	22.700	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	52.000	0		0		0	4	200	0	52.200	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	22.600	0		0		0	4	100	0	22.700	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.800	0		0		0	4	100	0	1.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	7.000	0	0	0	0	4	100	0	7.100	1
230301	Porvenir	800224808-8	388.400	0	0	0	0	4	1.300	0	389.700	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	159.500	0	0	0	0	4	600	0	160.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	241.600				241.600	4	800	242.400			2.416	242.400	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	138.900	4	500	139.400	5

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901239041-8	LESATH SAS		CL 77 13 47 OF 605	3554197	contabilidad.cumbreingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	V POPULAR	V POPULAR	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	17/06/2024	77902140	$1.078.300	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	138.900	139.600
Pensión	3	554.900	556.900
Riesgos Laborales	1	241.600	242.400
CCF	1	138.900	139.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	1.074.300	1.078.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901239041-8	LESATH SAS		CL 77 13 47 OF 605	3554197	contabilidad.cumbreingenieria@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	V POPULAR	V POPULAR	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	17/06/2024	77902140	$1.078.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	3120689	MONTAÑO BALLEN JORGE ELIESER	1	0			S		X															230201	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS017	43.334	1.800	14-11	43.334	5	3.100	CCF22	43.334	1.800	0	0	0	0	0
2	CC	1072716435	VENEGAS SANCHEZ SARA LUCIA	1	0			S		X															230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	15875811	CAICEDO CARDENAS RAUL MAURICIO	1	0			S	X	X															25-14	996.667	159.500	0	0	0	0	EPS001	996.667	39.900	14-11	996.667	5	69.400	CCF22	996.667	39.900	0	0	0	0	0
4	CC	79301672	LOPEZ TRIVIÑO CAMPO ELIAS	1	0			S	X	X															230301	563.334	90.200	0	0	0	0	EPS002	563.334	22.600	14-11	563.334	5	39.300	CCF22	563.334	22.600	0	0	0	0	0
5	CC	79422456	LOPEZ TRIVIÑO JAIRO	1	0			S	X	X															230301	563.334	90.200	0	0	0	0	EPS010	563.334	22.600	14-11	563.334	5	39.300	CCF22	563.334	22.600	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764057443351

(415)7707212489984(8020) 001876405744335 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 2 3 9 0 4 1	8				

11. Razón social
LESATH SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 77 13 47 OF 605

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2023-10-04 / 04:10:50 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres RAMIREZ BERNAL LEONARDO IVAN
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 79909677 1004. DV 6
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización LESATH SAS

997. Fecha formalización 2023-10-04 16:10:50

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764057443351

(415)7707212489984(8020) 001876405744335 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 2 3 9 0 4 1	8				

11. Razón social
LESATH SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	LESATH SAS CL 77 13 47 OF 605	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4		18	200	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14986899998

(415)7707212489984(8020) 000001498689999 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 3 9 0 4 1	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
LESATH SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 77 13 47 OF 605

42. Correo electrónico contabilidad.cumbreingenieria@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 2 9 7 3 5 6 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 8 1 2 1 4							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	8	5	2	5	5															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 02 - 29 / 14 : 59: 47

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ BERNAL LEONARDO IVAN

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14986899998

(415)7707212489984(8020) **000001498689999 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 3 9 0 4 1	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 8 1 2 1 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 8 1 2 1 8	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 0 4 6 1 3 2	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 8 1 2 1 4	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 8	2 0 1 8 1 2 1 8		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14986899998

(415)7707212489984(8020) **000001498689999 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 3 9 0 4 1	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 1 2 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 9 0 9 6 7 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMIREZ	BERNAL	LEONARDO	IVAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14986899998

(415)7707212489984(8020) **000001498689999 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 3 9 0 4 1	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 1 1 5 5 3 1 2		2 5 7 9 8 5

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
VARGAS	RODRIGUEZ	WENDY	TATIANA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 9 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO
