Gonzaga Valencia Herrera
Construcción e Ingeniería

Pereira, diciembre 23 de 2024 GVH-001-2024

Ingeniero
JUAN DANIEL GIRALDO OCHOA
Supervisor
Secretaría de Infraestructura
Municipio de Pereira

REF: Aceptación de Oferta Referencia: Proceso de mínima cuantía N° SMI-IPMC-306-2024

OBJETO: "ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS Y DRENAJE, SECTOR 2500 LOTES, CONTIGUO A LA URBANIZACIÓN ENTRE VERDES. COMUNA EL OSO"
Asunto: Solicitud PRORROGA

Estimado ingeniero,


Con el fin de darle celeridad a las obras del contrato de la referencia, y con motivo de las fiestas de fin de año, se presentan varios inconvenientes que obviamente me obligan a solicitarles la respectiva prórroga del contrato en referencia y las cuales enuncio para conocimiento de esa supervisión:

- Acceso al sitio de los trabajos muy enmalezado y pendiente lo cual hace del trasiego de materiales un poco más lento.






- Cierre de proveedores de materiales y equipos para actividades extras, sobre todo estos últimos que tuvieron su cierre el pasado 20 de diciembre con iniciación de actividades el próximo 13 de enero del 2025.
- Las condiciones climáticas exigen obras adicionales que implican actividades y materiales no previstos, como zanjas de coronación recubiertas con mortero y así evitar el empozamiento de la zona de los trabajos.

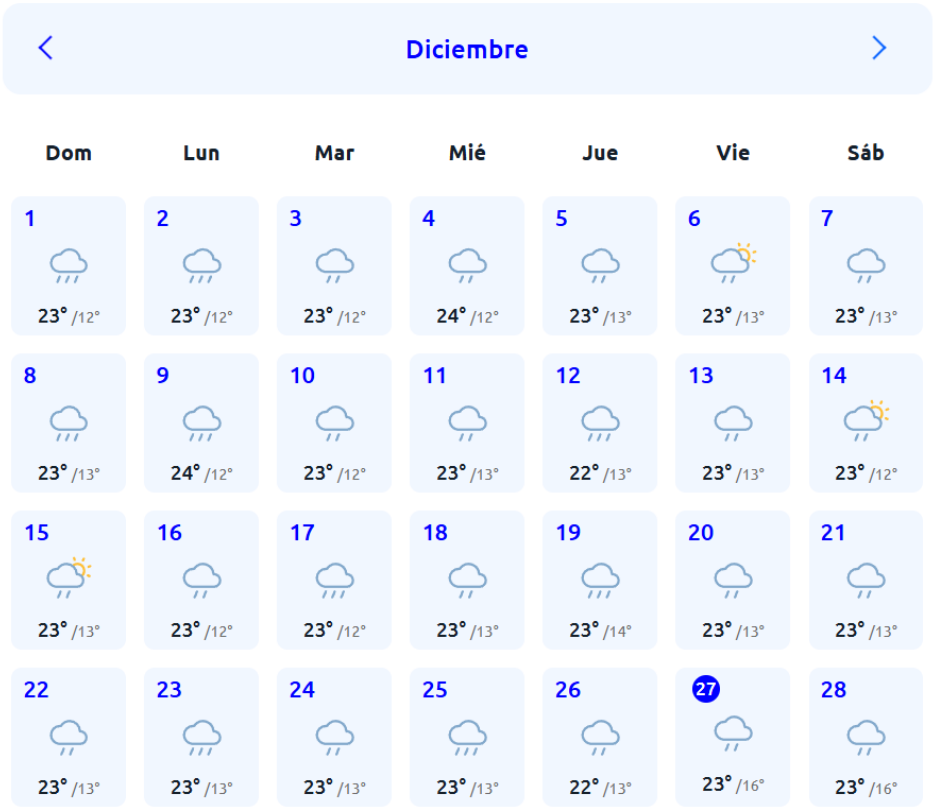



Para efectos de iniciar y gestionar la prórroga necesaria y darle continuidad a las obras objeto del contrato de la referencia, le estoy solicitando, muy comedidamente, una prórroga consistente en **20 días calendario**.

Cordialmente,

GONZAGA VALENCIA HERRERA
Contratista

6-324 33 28
320 677 92 38
gonzaga@etp.net.co
gonzagavh@hotmail.com
Calle 13 N0 24-17 Of 103
Pereira
