ACTA No. 01		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Verificación de las condiciones del contrato **No CO1.PCCNTR.7151389,** para adición de recursos.		
CIUDAD Y FECHA: Pitalito Huila, 26/12/2024	**HORA INICIO:** 8:30 am	**HORA FIN:** 9:30 am
LUGAR Y/O ENLACE: Sede Yamboró	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Verificar condiciones del contrato No CO1.PCCNTR.7151389
2. Analizar las necesidades del Centro de Formación en relación con los equipos de barismo, con su respectiva verificación presupuestal.
3. Solicitud de Adición al contrato **No CO1.PCCNTR.7151389**

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

1. Verificar condiciones del contrato para adición de recursos.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Los firmantes se reúnen para desarrollar los puntos señalados en la agenda establecida para lo cual se trabaja en las siguientes actividades:

1. Verificar condiciones del contrato No CO1.PCCNTR.7151389

Se inicia la reunión en la oficina de SENNOVA, en donde se hace verificación de las siguientes condiciones del contrato:

ID del contrato en SECOP: **CO1.PCCNTR.7151389**
Estado de contrato: En ejecución
Objeto del contrato: Entregar a título de compraventa tostadoras de café para el cumplimiento de los objetivos del proyecto SENNOVA SGPS-12644-2024.
Tipo de Contrato: mínima cuantía
Duración del contrato: 8 días
Fecha de inicio de contrato: 24/12/2024
Fecha de terminación del contrato: 31/12/2024
Valor del contrato: $ 105.057.603
N° y Valor del CDP que ampara el proceso: 7824 del 2024 - $ 254.694.618 – con una destinación de $ 135.000.000 para el contrato.
Código del compromiso presupuestal: 203324 – Valor: $ 105.057.603

Estado de ejecución: A la fecha de la presente acta se ha ejecutado el contrato conforme a las obligaciones contractuales y especificaciones técnicas requeridas.

2. <u>Analizar las necesidades del Centro de Formación en relación con los equipos de laboratorio y verificación presupuestal.</u>

El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano adelantó proceso de selección abreviada SASI HIL CGDSS 002 2024, con objeto: Entregar a título de compraventa equipos para el desarrollo del proyecto SENNOVA SGPS-12644-2024 "Modernización tecnológica de los laboratorios de la Escuela Nacional de la Calidad del Café, que estaba compuesto por 5 lotes, siendo adjudicados los lotes 1 y 3 el 12 de noviembre del 2024 y declarándose desiertos los lotes 2, 4 y 5.

En consecuencia, de lo antes mencionado, el Centro de Formación no logro satisfacer la necesidad de adquirir equipos de tostión para modernizar el área de transformación de la Escuela Nacional de la Calidad del Café, por lo que se hizo necesario abrir un nuevo proceso en modalidad de contratación de mínima cuantía; proceso que tiene por objeto: Entregar a título de compraventa tostadoras de café para el cumplimiento de los objetivos del proyecto SENNOVA SGPS-12644-2024. Igualmente, se adelantaron procesos de mínima cuantía para cubrir las necesidades de los lotes 2 y 5 correspondientes a trilladoras de café y laboratorios móviles para la calidad del café.

Para la ejecución de estos 3 procesos contractuales en la modalidad de mínima cuantía, se tenía disponible un valor de $ 254.694.618, de los cuales se comprometieron $ 208.317.503; comprometidos de la siguiente manera: contrato CO1.PCCNTR.7151389 correspondiente a compra de tostadoras por valor de $ 105.057.603, contrato CO1.PCCNTR.7151928 correspondiente a laboratorios móviles por valor de $ 56.559.900 y el contrato CO1.PCCNTR.7166884 correspondiente a trilladoras para café por valor de $ 46.700.000.

Por la modalidad de contratación, en cada uno de los procesos contractuales anteriormente mencionados, se tuvo un ahorro económico significativo, teniendo en cuenta que las empresas a quienes se les adjudicaron los correspondientes contratos tuvieron la oferta más baja y cumplieron con cada uno de los requisitos solicitados en los pliegos de condiciones. por consiguiente, de este ahorro económico quedó un valor disponible de **$ 46.377.115. en el CDP N° 7824 del 14 de abril del 2024**

Teniendo en cuenta que según estudio previo del contrato N° **CO1.PCCNTR.7151389** correspondiente a compra de tostadoras, indica en el numeral **7.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS QUE DEBEN CUMPLIR**, ***Nota 2****: El SENA podrá adjudicar el proceso contractual hasta por la totalidad del presupuesto oficial asignado, por lo tanto, el oferente que cumple con los requerimientos habilitantes sea el primero en el orden de elegibilidad y sea con quien se contrate,* ***acepta aumentar la cantidad de algunos ítems ofertados, según lo establezca la entidad hasta copar la totalidad del presupuesto oficial del presente proceso contractual.*** *El proponente de obliga a entregar los bienes adicionales de los ítems que sean indicados por el Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano,*

bajo las mismas condiciones de precio final y calidad indicadas en el presente proceso contractual.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que, se cuenta con un saldo disponible de $ 46.377.115. en el CDP N° 7824, y que, los aprendices de la Escuela Nacional de la Calidad del Café (ENCC), requieren realizar sus prácticas de tostado de manera individual, se requiere adicionar al contrato **CO1.PCCNTR.7151389** una (1) tostadora de muestras, lo que permitirá a un mayor número de aprendices llevar a cabo sus prácticas de manera eficiente, contribuyendo al desarrollo de sus habilidades en el proceso de tostado

Por consiguiente, teniendo en cuenta los valores de la oferta económica de la empresa **HUASKA COFFEE ROASTERS S.A.S con NIT 901432966**, los valores a adicionar arrojan un valor total de **TREINTA Y CINCO MILLONES DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS UN PESO M/C ($ 35.019.201**) como se observa: (tabla 1)

Tabla 1 – Equipos y valor total para adición al contrato **CO1.PCCNTR.7151389**

ITEM	CODIGOS UNSP	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unitario	Valor total
1	**48101500**	TOSTADORA PARA MUESTRAS DE CAFÉ Cantidad de tambores: 2 Capacidad máxima: 150 gramos de café verde por tambor Tiempo de tostación: 6 a 12 minutos Tipo de combustible: GLP/GN Potencia de quemador: 3kW / 10200 BTU/h Conexión eléctrica: 110V / 60 Hz Peso vacío: 42 Kg Materiales: Acero al carbón, acero inoxidable y madera. Con un sistema único de transmisión por contacto lo que permite que la tostadora tenga un nivel de ruido muy bajo, ideal para un espacio de trabajo de laboratorio. Libre de lubricación y agentes contaminantes para el proceso. Homogeneización ideal en el bache.	Unidad	1	$ 35.019.201	$ 35.019.201
Total						$ 35.019.201

Por tanto, se determina aumentar las cantidades de los elementos al ítem 1, que se describen a continuación, con el propósito de cubrir al máximo la necesidad que tiene la entidad: (Tabla 2)

Tabla 2 – cantidades finales del contrato

ITEM	CODIGOS UNSP	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD INICIAL SOLICITADA	CANTIDAD FINAL AJUSTADA
1	**48101500**	TOSTADORA PARA MUESTRAS DE CAFÉ Cantidad de tambores: 2 Capacidad máxima: 150 gramos de café verde por tambor Tiempo de tostación: 6 a 12 minutos Tipo de combustible: GLP/GN Potencia de quemador: 3kW / 10200 BTU/h Conexión eléctrica: 110V / 60 Hz	UNIDAD	3	4

		Peso vacío: 42 Kg Materiales: Acero al carbón, acero inoxidable y madera. Con un sistema único de transmisión por contacto lo que permite que la tostadora tenga un nivel de ruido muy bajo, ideal para un espacio de trabajo de laboratorio. Libre de lubricación y agentes contaminantes para el proceso. Homogeneización ideal en el bache.			

El contratista considera que es viable asumir la entrega de los adicionales del ítems 1.

2. Solicitud de Adición al contrato No CO1.PCCNTR.7151389

VALOR TOTAL DE LA ADICIÓN: $ 35.019.201

- ✓ El valor de la adición no supera el 50% del presupuesto oficial del contrato.
- ✓ Con esta adición el valor del contrato quedaría por valor de **$ 140.076.804**
- ✓ Finalmente, la distribución presupuestal quedará de la siguiente manera:

AREA	SALDOS EN CDP 7824	VALOR ADICIÒN
SENNOVA 952823	$ 46.377.115	$ 35.019.201

Así las cosas, tras la aprobación de la presente acta se contará con el siguiente presupuesto:

PRESUPUESTO DEL PROCESO – compra de tostadoras de café

Valor inicial del contrato	Adición de presupuesto -Dependencia 952823	Valor del contrato + adición
$ 105.057.603	$ 35.019.201	**$ 140.076.804**

3. Solicitud de Prórroga al contrato No CO1.PCCNTR.7151389

Teniendo en cuenta la solicitud enviada al correo electrónico por parte del Contratista con los soportes correspondientes, donde menciona que la empresa Huaska es fabricante y trabaja sobre pedido, y que ya dio inicio a la producción de los equipos relacionados con el contrato y que necesita un plazo de 45 días calendario, porque tuvo que importar motores y termómetros, que tardan unas semanas en llegar y que están en proceso de importación dede el 3 de diciembre del 2024.

Captura de pantalla comunicación de empresa Huaska a la supervisión del contrato.

TP

Tatiana Pérez<administrativo@huaska.co>

Para: Maria Del Rosario Castañeda

Mar 24/12/2024 12:14 PM

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Vie 22/12/2034 12:14 PM

Este remitente administrativo@huaska.co es de fuera de su organización.

Bloquear remitente

solicitud ampliacion de plazo...
713 KB

No suele recibir correo electrónico de administrativo@huaska.co. Por qué es esto importante

Buenas tardes

adjunto documento, para solicitud ampliacion de plazo de entrega, maquinas tostadoras de muestra para cafe

Muchas gracias.

Atentamente,

Pereira, 24 de diciembre de 2024

Señores:
Sena Pitalito

Asunto: Solicitud ampliación de plazo entrega

Solicito comedidamente aplazar la entrega de las maquinas tostadoras de muestra para café debido a que nosotros somos los fabricantes y trabajamos sobre pedido, la produccion ya inicio y necesitamos un plazo de 45 dias calendario debido a que tenemos que importar motores y termometros, estos tardan unas semanas en llegar, los termometros que son los que más demoran en importación de pidieron desde el martes 3 de diciembre; a la fecha se encuentran elaboradas las partes de ensamble tales como, bastidores, bisagras, ciclones, turbinas, palancas,.

Por lo tanto se relacionan las evidencias fotográficas de los avances que tenemos en produccion:















Para analizar la solicitud de prórroga, la supervisión procede a revisar el avancé presentado por el contratista y evidencia a través de registro fotográfico que, a la fecha el contratista ha elaborado las partes de ensamble de los equipos, como son: bastidores, bisagras, ciclones, turbinas y palanca; es decir, que ha tenido un avance en la ejecución del contrato del 10%.

En cuanto a la prórroga, el contratista menciona que su solicitud se soporta en dos razones: la primera es que los equipos se fabrican sobre pedido del cliente, por lo que no cuenta con existencias de las referencias pedidas en el contrato, y la segunda, es que los equipos solicitados en el contrato requieren de motores y termómetros que deben ser importados; además, menciona que el 3 de diciembre remitió orden de compra de 25 termómetros de expansión y 15 motores a la empresa Instrumentos Wika Colombia S.A.S.

Captura de pantalla orden de compra a empresa Instrumentos Wika Colombia S.A.S.

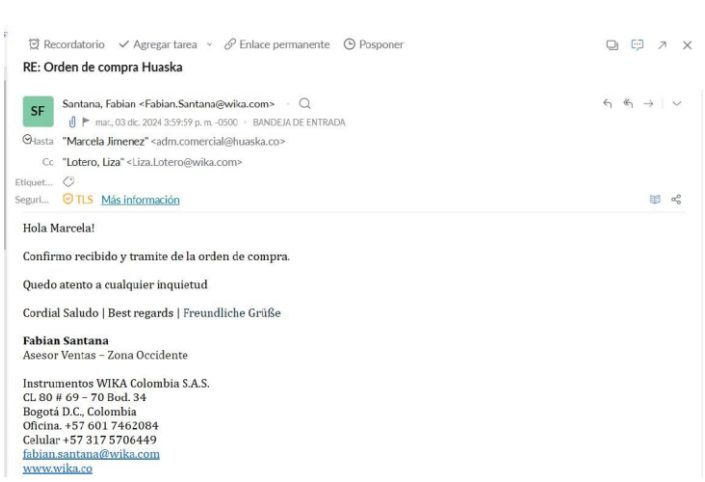

Al revisar el los soportes de las ordenes de compra se confirma que los elementos se despachas desde Estados Unidos y que los tiempos de entregas están establecidos entre 8 a 10 semanas, a partir de la fecha de compra.

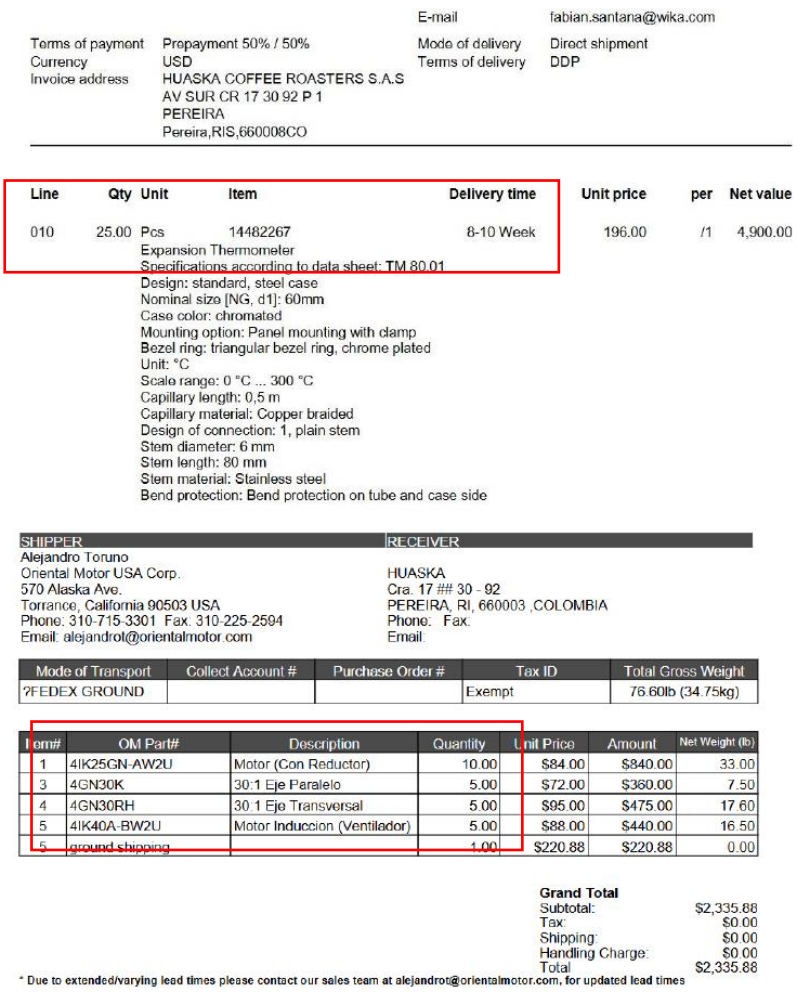

		E-mail	fabian.santana@wika.com
Terms of payment	Prepayment 50% / 50%	Mode of delivery	Direct shipment
Currency	USD	Terms of delivery	DDP
Invoice address	HUASKA COFFEE ROASTERS S.A.S AV SUR CR 17 30 92 P 1 PEREIRA Pereira,RIS,660008CO		

Line	Qty	Unit	Item	Delivery time	Unit price	per	Net value
010	25.00	Pcs	14482267 Expansion Thermometer Specifications according to data sheet: TM 80.01 Design: standard, steel case Nominal size [NG, d1]: 60mm Case color: chromated Mounting option: Panel mounting with clamp Bezel ring: triangular bezel ring, chrome plated Unit: °C Scale range: 0 °C ... 300 °C Capillary length: 0,5 m Capillary material: Copper braided Design of connection: 1, plain stem Stem diameter: 6 mm Stem length: 80 mm Stem material: Stainless steel Bend protection: Bend protection on tube and case side	8-10 Week	196.00	/1	4,900.00

SHIPPER	RECEIVER
Alejandro Toruno Oriental Motor USA Corp. 570 Alaska Ave. Torrance, California 90503 USA Phone: 310-715-3301 Fax: 310-225-2594 Email: alejandrot@orientalmotor.com	HUASKA Cra. 17 ## 30 - 92 PEREIRA, RI, 660003 ,COLOMBIA Phone: Fax: Email:

Mode of Transport	Collect Account #	Purchase Order #	Tax ID	Total Gross Weight
?FEDEX GROUND			Exempt	76.60lb (34.75kg)

Item#	OM Part#	Description	Quantity	Unit Price	Amount	Net Weight (lb)
1	4IK25GN-AW2U	Motor (Con Reductor)	10.00	$84.00	$840.00	33.00
3	4GN30K	30:1 Eje Paralelo	5.00	$72.00	$360.00	7.50
4	4GN30RH	30:1 Eje Transversal	5.00	$95.00	$475.00	17.60
5	4IK40A-BW2U	Motor Induccion (Ventilador)	5.00	$88.00	$440.00	16.50
5	ground shipping		1.00	$220.88	$220.88	0.00

Grand Total	
Subtotal:	$2,335.88
Tax:	$0.00
Shipping:	$0.00
Handling Charge:	$0.00
Total	$2,335.88

* Due to extended/varying lead times please contact our sales team at alejandrot@orientalmotor.com, for updated lead times

Al evaluar la evidencias y razones expuestas por el contratista, se encontró:

1. El contratista ha desarrollado acciones y presenta un avance del 10 % en la ejecución del contrato.
2. Que, el contratista fabrica equipos sobre pedido, por lo que no cuenta con existencias de las referencias solicitadas en el contrato.
3. Que, los equipos solicitados en el contrato requieren de motores y termómetros que deben ser importados.
4. Que, en su quehacer diario el contratista hizo orden de compra de 25 termómetros de expansión y 15 motores a la empresa Instrumentos Wika Colombia S.A.S, desde el 3 de diciembre y la llegada estimada de las piezas a Colombia es de 8 a 10 semanas.

5. La supervisión del contrato sugiere al ordenador del gasto autorizar la prórroga por 45 días calendario del contrato CO1.PCCNTR. 7151389 del 2024, para satisfacer en su totalidad la necesidad que tiene la Entidad.

Al evaluar la evidencias y razones expuestas por el contratista, se concluye que estas son ajenas a su voluntad y no permiten el cumplimiento del objeto contractual dentro de la fecha establecida 31 de diciembre del 2024, por tanto, se considera la prórroga de cuarenta y cinco (45) días calendario, con fecha máxima de finalización el 14 de febrero de 2024.

Se da por terminada la reunión concluyendo la aprobación para la prórroga del contrato.

CONCLUSIONES

Se justifica la necesidad de incrementar el valor de **TREINTA Y CINCO MILLONES DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS UN PESO M/C ($ 35.019.201)** al valor adjudicado al contrato **CO1.PCCNTR.7151389**, de tal manera que, se cubran las necesidades manifestadas por el personal encargado de la ejecución del proyecto relacionado con la dependencia SIIF 952823, quedando como valor total del contrato la suma de **CIENTO CUARENTA MILLONES SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/C ($ 140.076.804).**

Las razones expuestas por el contratista son ajenas a su voluntad y no permiten el cumplimiento del objeto contractual dentro de la fecha establecida 31 de diciembre del 2024, por tanto, se considera la prórroga de cuarenta y cinco (45) días calendario, con fecha máxima de finalización el 14 de febrero de 2024.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS Y/O DECISIONES


ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA
Tramitar ante el ordenador del gasto la adición de recursos para el contrato **CO1.PCCNTR.7151389**	Inmediato	Maria del Rosario Castañeda Supervisor del contrato	

ASISTENTES

(Incorporar evidencias asistentes. Ver Instructivo)

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Maribel Rivera Vargas	SENNOVA	SI	Ninguna	
María del Rosario Castañeda	SENNOVA	SI	Ninguna	

Alejandría Soto Jiménez	Representante legal HUASKA COFFEE ROASTERS S.A.S Contratista	SI	Ninguna	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS
