ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**27/11/2024**	**Inicio**	**10:00 a.m.**	**Fin**	**11:00 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Tercer Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos y Supervisora del convenio** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Ingrid Gutiérrez - Contratista DCTME** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Jessica Culma – Analista de datos** **Samira Mogollón - Contratista – DCTME – Apoyo financiero** **Genny Vargas – Contratista Apoyo jurídico**					**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Programas de Educación, Inglés y Artes** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**	
Fecha de Elaboración	**27/11/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**			**Próxima Reunión**	**Pendiente**

+Desarrollo de la Agenda

- **COMPROMISOS SEGUNDO COMITÉ:** A continuación se presentan los comités acordados en el segundo comité.
  - **Alertas colegios:** La siguiente tabla presenta los compromisos relacionados con las alertas de las IED en la implementación del componente de diagnóstico.

COLEGIO	TIPO DIAGNÓSTICO	ALERTA	ACCIONES	ESTADO
Acacia II	Robusto	Programar observaciones de clase	Se realizaron las acciones pendientes	Resuelta
Instituto Técnico Internacional	Robusto	Programar observaciones de clase	No observaciones	Resuelta
Arborizadora Alta	Robusto	Programar observaciones de clase	Se realizaron las acciones pendientes	Resuelta
Codema	Robusto	Programar observaciones de clase	Se realizaron las acciones pendientes	Resuelta
Marruecos y Molinos	Robusto	Pruebas estudiantes	Se realizaron las acciones pendientes	Resuelta
Brasilia - Bosa	Robusto	Programar observaciones de clase	Se realizaron las acciones pendientes	Resuelta
Porfirio Barba Jacob	Robusto	Programar observaciones de clase	No observaciones	Resuelta
Diana Turbay	Robusto	Programar observaciones de clase	Se realizaron las acciones pendientes	Resuelta
Santa Bárbara	Robusto	Programar observaciones de clase	No observaciones	Resuelta

Todas fueron resueltas, con apoyo de los equipos del British Council y la Secretaría de Educación

Fecha	**27/11/2024**	**Inicio**	**10:00 a.m.**	**Fin**	**11:00 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Tercer Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos y Supervisora del convenio** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Ingrid Gutiérrez - Contratista DCTME** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Jessica Culma – Analista de datos** **Samira Mogollón - Contratista – DCTME – Apoyo financiero** **Genny Vargas – Contratista Apoyo jurídico**					**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Programas de Educación, Inglés y Artes** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**	

Fecha de Elaboración	**27/11/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**	**Próxima Reunión**	**Pendiente**

- Queda como pendiente del comité consultar con los expertos del documento 1, el cual hace referencia a las herramientas de tecnología e IA para el aprendizaje del inglés, para que indiquen qué elementos no deben estar bloqueados en los computadores de los colegios para que corra la herramienta de IA

AVANCES A LA FECHA POR COMPONENTE: *Reporte hasta el 26 de noviembre*

Componente 1: Diagnóstico

Robusto:

- Luego de realizar el análisis del número real de docentes por institución, se identificaron **453 docentes** en total**.** Se aplicaron **469 encuestas sobre estos 453 docentes identificados,** lo que genera un **103%** de ejecución en este ítem. Este número adicional de docentes se debe a que en los grupos y grados focalizados había docentes adicionales que no estaban en la muestra, sin embargo, desearon participar en la aplicación de las encuestas.
- Se obtuvo un **96%** de ejecución en cuanto a encuestas de rectores, se logra encuestar a **163 de 169 rectores.**
- En cuanto a observaciones de clase, que fue la estrategia más retadora, se logran observar **348 docentes** sobre **453,** indicando un porcentaje de ejecución del **77%.** Hubo muchos inconvenientes por actividades institucionales que impidieron llevar a cabo las observaciones de clases regulares por la época del año.
- En cuanto a recorridos en IED, se llega a **165 sobre 169**, lo que genera un porcentaje de avance del **98%.**

Simple: Encuestas aplicadas a coordinadores o rectores: **90 / 97** con un porcentaje de avance del **93%.**


- Recorridos en IED: **91 / 97** con un porcentaje de avance del **94%.**
-

Reporte general: Consolidado entre diagnóstico simple y robusto: Tablero general de seguimiento

Fecha	**27/11/2024**	**Inicio**	**10:00 a.m.**	**Fin**	**11:00 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Tercer Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos y Supervisora del convenio** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Ingrid Gutiérrez - Contratista DCTME** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Jessica Culma – Analista de datos** **Samira Mogollón - Contratista – DCTME – Apoyo financiero** **Genny Vargas – Contratista Apoyo jurídico**					**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Programas de Educación, Inglés y Artes** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**	

Fecha de Elaboración	**27/11/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**	**Próxima Reunión**	**Pendiente**

- **Robusto:**

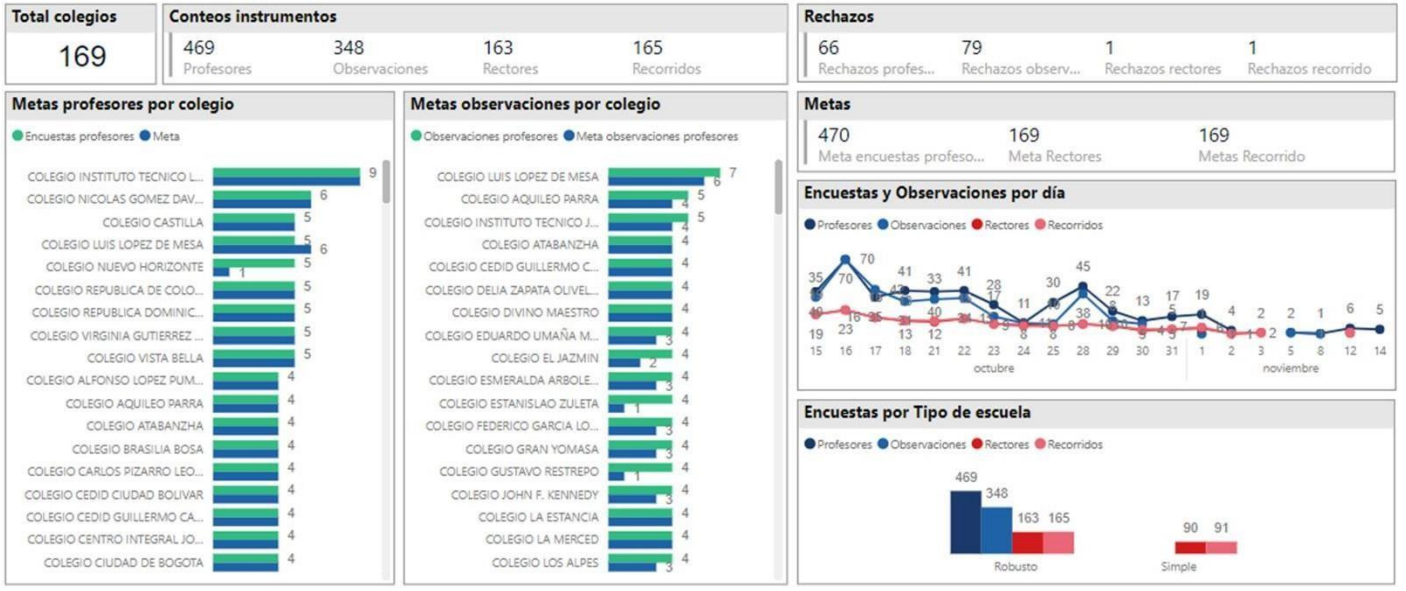


Fecha	**27/11/2024**	**Inicio**	**10:00 a.m.**	**Fin**	**11:00 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Tercer Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos y Supervisora del convenio** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Ingrid Gutiérrez - Contratista DCTME** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Jessica Culma – Analista de datos** **Samira Mogollón - Contratista – DCTME – Apoyo financiero** **Genny Vargas – Contratista Apoyo jurídico**					**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Programas de Educación, Inglés y Artes** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**	

Fecha de Elaboración	**27/11/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**	**Próxima Reunión**	**Pendiente**

Total colegios: Total colegios visitados al menos una vez
Profesores: Encuestas a docentes
Observaciones: Observaciones de clase realizadas
Rectores: Encuestas aplicadas a rectores
Recorridos: Recorridos realizados en las instituciones

- **Simple:**

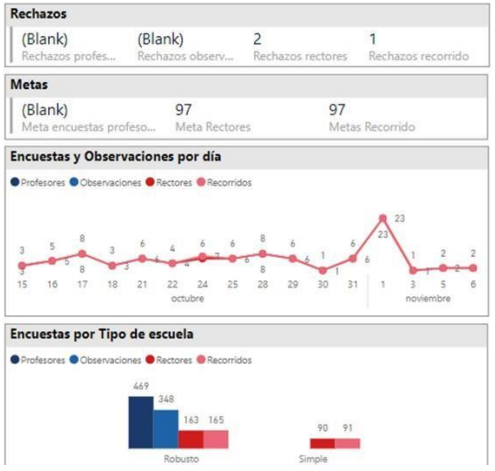




Fecha	**27/11/2024**	**Inicio**	**10:00 a.m.**	**Fin**	**11:00 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Tercer Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos y Supervisora del convenio** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Ingrid Gutiérrez - Contratista DCTME** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Jessica Culma – Analista de datos** **Samira Mogollón - Contratista – DCTME – Apoyo financiero** **Genny Vargas – Contratista Apoyo jurídico**					**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Programas de Educación, Inglés y Artes** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**	
Fecha de Elaboración	**27/11/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**			**Próxima Reunión**	**Pendiente**

Total de colegios: Total colegios visitados al menos una vez
Rectores: Encuestas aplicadas a rectores
Recorridos: Recorridos realizados en las instituciones

- **Reporte por instrumentos aplicados**

La siguiente gráfica muestra el detalle del número de instrumentos aplicado por tipo de IED, según su focalización.

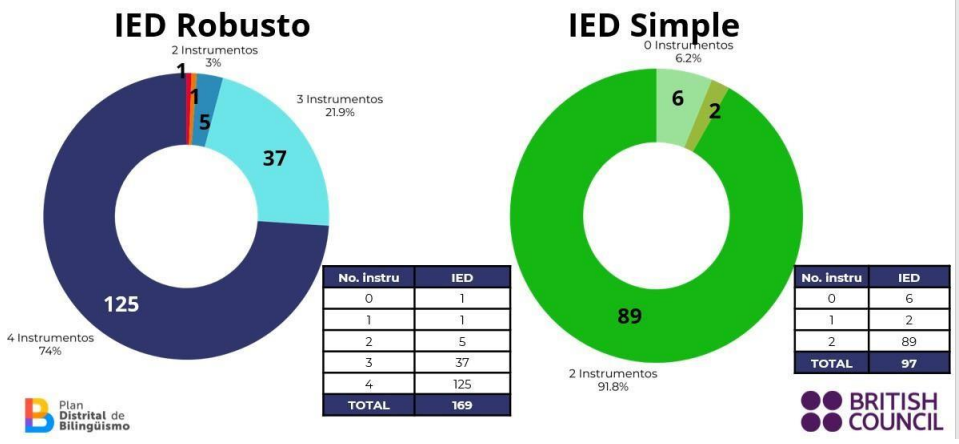

No. instru	IED
0	1
1	1
2	5
3	37
4	125
TOTAL	169

No. instru	IED
0	6
1	2
2	89
TOTAL	97

Fecha	**27/11/2024**	**Inicio**	**10:00 a.m.**	**Fin**	**11:00 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Tercer Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos y Supervisora del convenio** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Ingrid Gutiérrez - Contratista DCTME** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Jessica Culma – Analista de datos** **Samira Mogollón - Contratista – DCTME – Apoyo financiero** **Genny Vargas – Contratista Apoyo jurídico**					**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Programas de Educación, Inglés y Artes** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**	

Fecha de Elaboración	**27/11/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**	**Próxima Reunión**	**Pendiente**

Robusto: 4 instrumentos en total en este diagnóstico (encuesta a docentes, observación de clase, encuesta a rector/coordinador y recorrido por la IED)

- 4 instrumentos fueron aplicados en total en 125 IED.
- 3 instrumentos en 37 IED.
- 2 instrumentos en 5 IED.
- 1 instrumento en 1 IED.
- 1 IED que no permitió la aplicación de ningún instrumento, solamente se realizaron pruebas, esta IED es José Jaime Rojas.

Simple: 2 instrumentos en total en este diagnóstico (encuesta a rector/coordinador)


- 2 instrumentos fueron aplicados en total en 89 IED.
- 1 instrumento en 2 IED.
- 6 IED en las que no se pudo aplicar ningún instrumento**.**

*****En total son 7 instituciones a las cuales no se pudo ingresar.

Fecha	**27/11/2024**	**Inicio**	**10:00 a.m.**	**Fin**	**11:00 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Tercer Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos y Supervisora del convenio** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Ingrid Gutiérrez - Contratista DCTME** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Jessica Culma – Analista de datos** **Samira Mogollón - Contratista – DCTME – Apoyo financiero** **Genny Vargas – Contratista Apoyo jurídico**					**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Programas de Educación, Inglés y Artes** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**	
Fecha de Elaboración	**27/11/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**			**Próxima Reunión**	**Pendiente**

- **Reporte por instrumentos – Robusto**

  La siguiente gráfica muestra los instrumentos aplicados a docentes y generales en las IED de diagnóstico robusto.

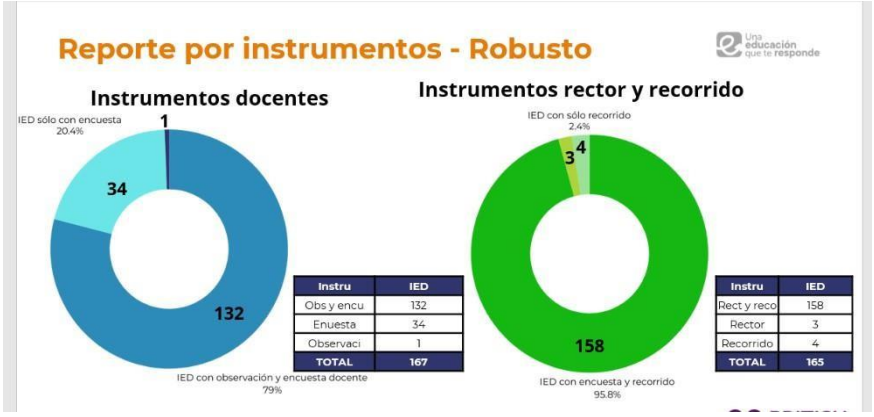

Instrumentos docentes: Encuesta de docentes y Observación de clase

- En 132 IED se aplicaron los 2 instrumentos.
- En 34 IED sólo se aplicó encuesta a docentes.
- En 1 IED sólo se aplicó observación de clase.

Fecha	**27/11/2024**	**Inicio**	**10:00 a.m.**	**Fin**	**11:00 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Tercer Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos y Supervisora del convenio** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Ingrid Gutiérrez - Contratista DCTME** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Jessica Culma – Analista de datos** **Samira Mogollón - Contratista – DCTME – Apoyo financiero** **Genny Vargas – Contratista Apoyo jurídico**					**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Programas de Educación, Inglés y Artes** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**	

Fecha de Elaboración	**27/11/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**	**Próxima Reunión**	**Pendiente**

Instrumentos rector y recorrido: Encuesta de rectores y recorrido IED

- En 158 IED se aplicaron los dos instrumentos
- En 3 IED sólo aplicó encuesta a rector/coordinador.
- En 4 IED sólo se realizó recorrido.

Seguimiento cronograma: No hay alertas en el cumplimiento del cronograma

Convocatoria a instituciones	General	Finalizado	28/08/2024 → 06/09/2024	Secretaría de Educación de Bogotá
Diseño del modelo conceptual del Framework	General	En progreso	06/09/2024 → 28/11/2024	British Council
Consolidadación de equipo evaluador	General	Finalizado	06/09/2024 → 13/09/2024	British Council
Diseño de instrumentos de recolección de información	General	Finalizado	06/09/2024 → 27/09/2024	British Council
Capacitación a los representantes del equipo evaluador	General	Finalizado	07/10/2024 → 11/10/2024	British Council
Selección de instituciones	General	Finalizado	09/09/2024 → 13/09/2024	Secretaría de Educación de Bogotá

Fecha	**27/11/2024**	**Inicio**	**10:00 a.m.**	**Fin**	**11:00 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Tercer Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos y Supervisora del convenio** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Ingrid Gutiérrez - Contratista DCTME** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Jessica Culma – Analista de datos** **Samira Mogollón - Contratista – DCTME – Apoyo financiero** **Genny Vargas – Contratista Apoyo jurídico**					**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Programas de Educación, Inglés y Artes** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**	
Fecha de Elaboración	**27/11/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**			**Próxima Reunión**	**Pendiente**

Análisis de datos existentes	Diagnóstico robusto	En progreso	18/09/2024 → 28/11/2024	British Council
Selección de docentes para observación	Diagnóstico robusto	Finalizado	23/09/2024 → 27/09/2024	British Council
Diseño de rutas para recorrido por cada IED y aplicación de encuestas	Diagnóstico robusto	Finalizado	30/09/2024 → 19/11/2024	British Council
Observación de clase	Diagnóstico robusto	Finalizado	15/10/2024 → 08/11/2024	British Council
Aplicación de encuesta a 3 o 4 docentes por cada IED	Diagnóstico robusto	Finalizado	15/10/2024 → 19/11/2024	British Council
Aplicación de encuesta al rector o coordinador	Diagnóstico robusto	Finalizado	15/10/2024 → 19/11/2024	British Council
Recolección de información en recorrido a la IED	Diagnóstico robusto	Finalizado	22/10/2024 → 19/11/2024	British Council
Análisis de datos existentes	Diagnóstico simple	En progreso	18/09/2024 → 28/11/2024	British Council
Recolección de información en recorrido a la IED	Diagnóstico simple	Finalizado	15/10/2024 → 19/11/2024	British Council
Aplicación de encuesta a un enlace	Diagnóstico simple	Finalizado	15/10/2024 → 19/11/2024	British Council
Entrega de visión general de las IED a la SED	Diagnóstico simple	No iniciado	30/11/2024 → 13/12/2024	British Council


***Es importante** resaltar el poco tiempo en el que se realizó la implementación de los instrumentos, y se debe tener en cuenta que, en caso de que estas acciones se realicen en futuros años, lo ideal es iniciar con la implementación lo más cercano al inicio del calendario escolar para poder tener un mayor tiempo de impacto y reunir la información más completa. Adicionalmente, es relevante reforzar el mensaje en las IED que estas actividades no son punitivas sino formativas.

*Además, es clave recordar a los docentes la confidencialidad de los resultados, ya que en algunas IED los docentes se desearon ser observados o tomar la prueba por temor a factores de índole evaluativo.

Fecha	**27/11/2024**	**Inicio**	**10:00 a.m.**	**Fin**	**11:00 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Tercer Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos y Supervisora del convenio** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Ingrid Gutiérrez - Contratista DCTME** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Jessica Culma – Analista de datos** **Samira Mogollón - Contratista – DCTME – Apoyo financiero** **Genny Vargas – Contratista Apoyo jurídico**					**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Programas de Educación, Inglés y Artes** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**	
Fecha de Elaboración	**27/11/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**			**Próxima Reunión**	**Pendiente**

- **Componente 2:**

  Línea Base Estudiantes:
  La siguiente gráfica muestra los resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas de clasificación de inglés, Richmond Placement Test.

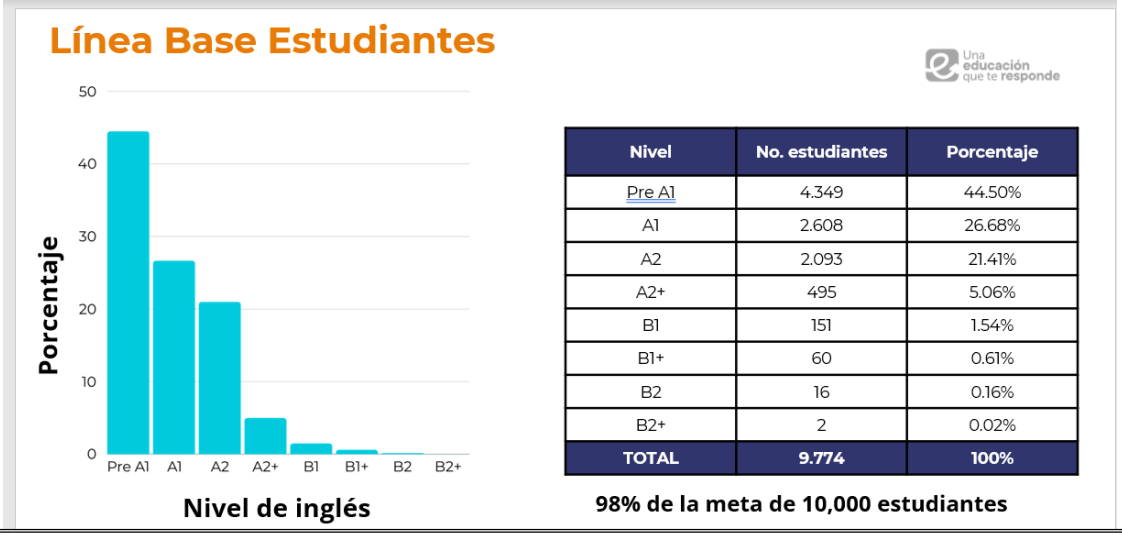

Nivel	No. estudiantes	Porcentaje
Pre A1	4.349	44.50%
A1	2.608	26.68%
A2	2.093	21.41%
A2+	495	5.06%
B1	151	1.54%
B1+	60	0.61%
B2	16	0.16%
B2+	2	0.02%
TOTAL	**9.774**	**100%**

98% de la meta de 10,000 estudiantes

Fecha	**27/11/2024**	**Inicio**	**10:00 a.m.**	**Fin**	**11:00 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Tercer Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos y Supervisora del convenio** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Ingrid Gutiérrez - Contratista DCTME** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Jessica Culma – Analista de datos** **Samira Mogollón - Contratista – DCTME – Apoyo financiero** **Genny Vargas – Contratista Apoyo jurídico**					**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Programas de Educación, Inglés y Artes** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**	

Fecha de Elaboración	**27/11/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**	**Próxima Reunión**	**Pendiente**

- Se logró ingresar a las 169 IED y se realizaron pruebas a 9.774 estudiantes, lo que indica un 98% de la meta, que eran hasta 10.000 estudiantes, a pesar de la conectividad y demás factores que influyeron en la presentación de pruebas.
- **Análisis de resultados:**
  - Se tiene la mayoría de los estudiantes en niveles Pre-A1, A1 y A2

Línea Base Docentes: La siguiente gráfica muestra la distribución de los docentes según el tipo de IED, y el ejemplo del certificado que obtienen en la prueba English Score. **Línea Base Docentes**

TIPO	NO. DOCENTES
Diagnóstico robusto	652
Diagnóstico simple	86
MEB	80
IED no focalizada	14
No aprobados	22
TOTAL	**854**

Docentes certificados 832




- Se logra llegar a 854 docentes con la prueba.
- Se emiten 832 certificados a docentes.
- Los 22 docentes no aprobados son 20 docentes que no se encuentran en la base de datos de planta docente y 2 que aparecen con la prueba invalidada. Esta información fue confirmada por la SED.

Fecha	27/11/2024	Inicio	10:00 a.m.	Fin	11:00 a.m.	Lugar	Sala Virtual Plataforma TEAMS
Asunto	Tercer Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital						
Asistentes	Equipo SED: Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos y Supervisora del convenio Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo Ingrid Gutiérrez - Contratista DCTME Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo Jessica Culma – Analista de datos Samira Mogollón - Contratista – DCTME – Apoyo financiero Genny Vargas – Contratista Apoyo jurídico					Asistentes Externos Equipo British Council: Laura Barragán – Directora de Programas de Educación, Inglés y Artes Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés Nathalia Lizcano – Líder Técnico Edson Gómez – Consultor de datos Camila Gil – Coordinadora Financiera Lorena Torres – Coordinadora Administrativa	

Fecha de Elaboración	27/11/2024	Elaborado por	Lisset Diosa	Próxima Reunión	Pendiente

- El resultado de los docentes de diagnóstico robusto es confidencial y no se comparte. La SED ya tiene los resultados de simple, MEB e IED no focalizada.

- **Resultados:**
  A continuación, se presentan los resultados obtenidos por los 854 docentes que tomaron la prueba y la gráfica que acompaña los resultados.




Nivel	No. docentes	Porcentaje
Pre A1	2	0.2%
A1	15	1.8%
A2	77	9%
B1	258	30.2%
B2	349	40.9%
C1	153	17.9%
TOTAL	854	100%

- El 89% de los docentes se encuentra en niveles superiores de inglés (B1, B2 y C1)
- Se llega al 85% de la meta de hasta 1.000 docentes.

Fecha	**27/11/2024**	**Inicio**	**10:00 a.m.**	**Fin**	**11:00 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Tercer Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos y Supervisora del convenio** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Ingrid Gutiérrez - Contratista DCTME** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Jessica Culma – Analista de datos** **Samira Mogollón - Contratista – DCTME – Apoyo financiero** **Genny Vargas – Contratista Apoyo jurídico**					**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Programas de Educación, Inglés y Artes** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**	
Fecha de Elaboración	**27/11/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**			**Próxima Reunión**	**Pendiente**

- **Datos desagregados por habilidad:**
  Las siguientes gráficas muestran el desagregado por cada habilidad para los 854 docentes que presentaron la prueba.

  Gramática:

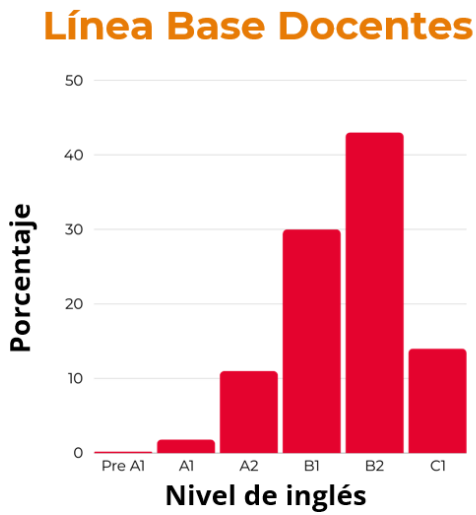


Nivel	No. docentes	Porcentaje
Pre A1	4	0%
A1	15	2%
A2	95	11%
B1	256	30%
B2	368	43%
C1	116	14%
TOTAL	**854**	**100%**

En la habilidad de Grammar prevalece el nivel B2 con un 43%, es decir 368 docentes. B2, hay que ver si a futuro se pueden establecer estrategias de fortalecimiento en la lengua para los docentes.

Fecha	**27/11/2024**	**Inicio**	**10:00 a.m.**	**Fin**	**11:00 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Tercer Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos y Supervisora del convenio** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Ingrid Gutiérrez - Contratista DCTME** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Jessica Culma – Analista de datos** **Samira Mogollón - Contratista – DCTME – Apoyo financiero** **Genny Vargas – Contratista Apoyo jurídico**					**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Programas de Educación, Inglés y Artes** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**	
Fecha de Elaboración	**27/11/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**			**Próxima Reunión**	**Pendiente**

Vocabulario:

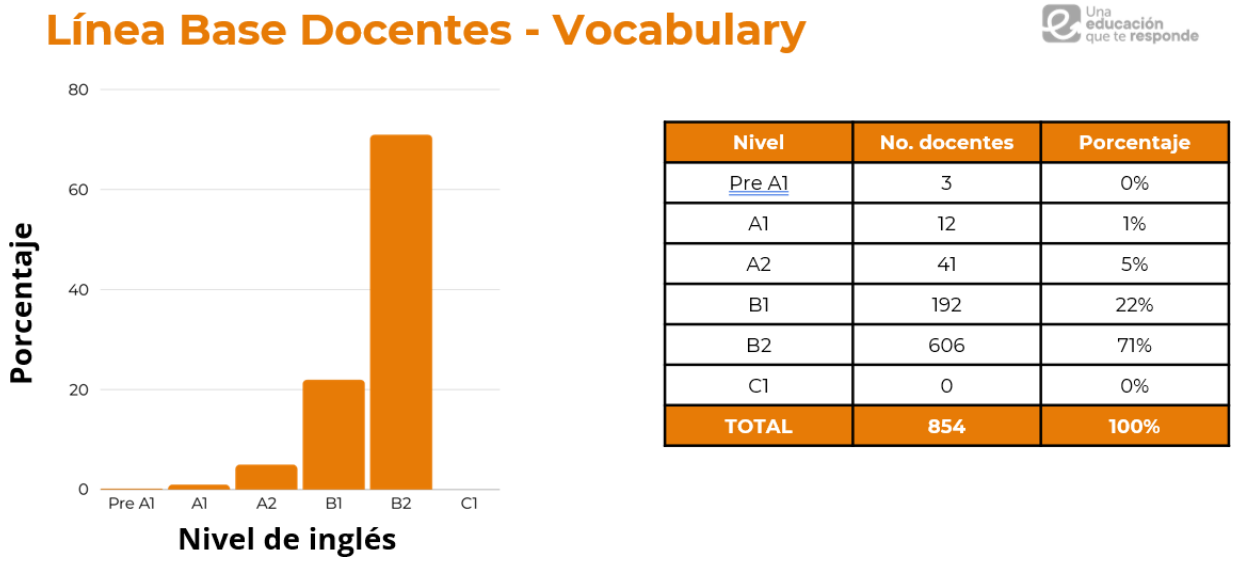


Nivel	No. docentes	Porcentaje
Pre A1	3	0%
A1	12	1%
A2	41	5%
B1	192	22%
B2	606	71%
C1	0	0%
TOTAL	**854**	**100%**

En la habilidad de Vocabulary se destaca el nivel B2 con un total de 606 docentes, lo que representa el 71% de los docentes evaluados.

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**27/11/2024**	**Inicio**	**10:00 a.m.**	**Fin**	**11:00 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Tercer Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos y Supervisora del convenio** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Ingrid Gutiérrez - Contratista DCTME** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Jessica Culma – Analista de datos** **Samira Mogollón - Contratista – DCTME – Apoyo financiero** **Genny Vargas – Contratista Apoyo jurídico**					**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Programas de Educación, Inglés y Artes** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**	
Fecha de Elaboración	**27/11/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**			**Próxima Reunión**	**Pendiente**

Lectura:

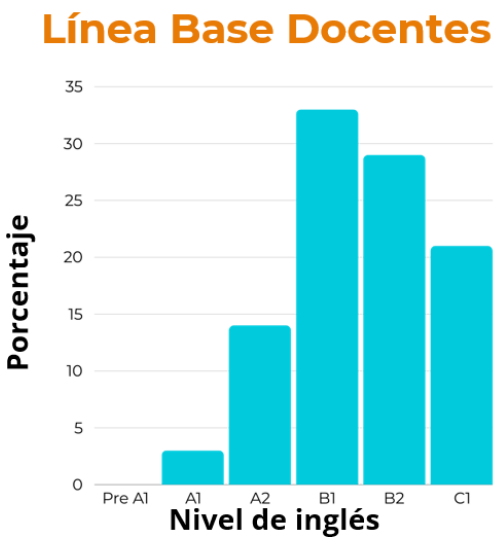


Nivel	No. docentes	Porcentaje
Pre A1	2	0%
A1	29	3%
A2	119	14%
B1	283	33%
B2	245	29%
C1	176	21%
TOTAL	**854**	**100%**

***** En la habilidad de Reading (lectura) predominaron los niveles de desempeño superior (B1, B2 y C1) con un total de 704 docentes, lo que representa el 83% de los evaluados*

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**27/11/2024**	**Inicio**	**10:00 a.m.**	**Fin**	**11:00 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Tercer Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos y Supervisora del convenio** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Ingrid Gutiérrez - Contratista DCTME** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Jessica Culma – Analista de datos** **Samira Mogollón - Contratista – DCTME – Apoyo financiero** **Genny Vargas – Contratista Apoyo jurídico**					**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Programas de Educación, Inglés y Artes** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**	
Fecha de Elaboración	**27/11/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**			**Próxima Reunión**	**Pendiente**

Escucha:

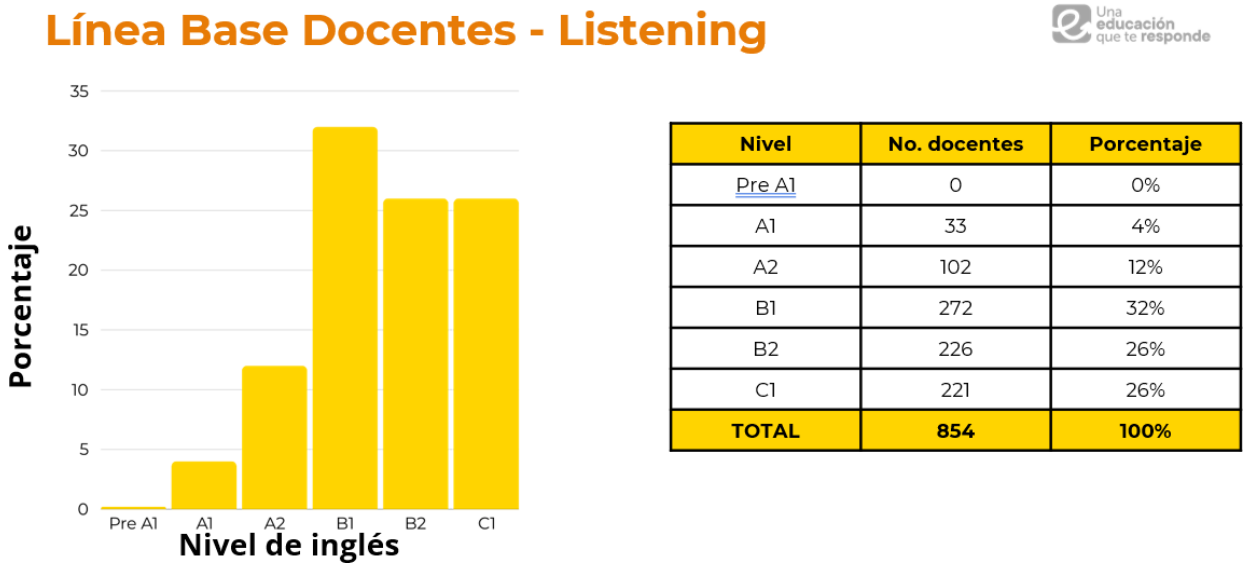

Nivel	No. docentes	Porcentaje
Pre A1	0	0%
A1	33	4%
A2	102	12%
B1	272	32%
B2	226	26%
C1	221	26%
TOTAL	**854**	**100%**

En la habilidad de escucha, nuevamente los niveles B1, B2 y C1 sobresalen
Se solicita desagregar resultados para ver específicamente los de diagnóstico Robusto

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**27/11/2024**	**Inicio**	**10:00 a.m.**	**Fin**	**11:00 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Tercer Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos y Supervisora del convenio** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Ingrid Gutiérrez - Contratista DCTME** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Jessica Culma – Analista de datos** **Samira Mogollón - Contratista – DCTME – Apoyo financiero** **Genny Vargas – Contratista Apoyo jurídico**					**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Programas de Educación, Inglés y Artes** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**	

Fecha de Elaboración	**27/11/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**	**Próxima Reunión**	**Pendiente**

Se complementa la presentación con la información desagregada al terminar el comité y se adjunta el acta como referencia

Seguimiento cronograma:

Convocatoria a instituciones para línea base	Línea base estudiantes	Finalizado	28/08/2024 → 06/09/2024	Secretaría de Educación de Bogotá
Seleccion y compra de licencias prueba para 10,000 estudiantes de grado 8	Línea base estudiantes	Finalizado	06/09/2024	British Council
Cotización de apoyo logístico y equipos	Línea base estudiantes	Finalizado	06/09/2024 → 13/09/2024	British Council
Diseño de protocolo de aplicación de pruebas	Línea base estudiantes	Finalizado	10/09/2024 → 11/09/2024	Secretaría de Educación de Bogotá
Diseño de la ruta de aplicación de las pruebas	Línea base estudiantes	Finalizado	13/09/2024 → 08/11/2024	British Council
Caracterización de IED - Tipo 1 y tipo 2	Línea base estudiantes	Finalizado	16/09/2024 → 27/09/2024	British Council
Selección de muestra de reserva de estudiantes de 8°	Línea base estudiantes	Finalizado	16/09/2024 → 20/09/2024	British Council
Capacitacion al equipo logístico para la aplicacion de las pruebas	Línea base estudiantes	Finalizado	18/09/2024 → 20/09/2024	British Council
Comunicación a las IED con información de grupos seleccionados	Línea base estudiantes	Finalizado	19/09/2024 → 20/09/2024	Secretaría de Educación de Bogotá
Asignación de licencias a base de datos de estudiantes	Línea base estudiantes	Finalizado	23/09/2024 → 08/11/2024	British Council
Selección de la muestra de estudiantes	Línea base estudiantes	Finalizado	23/09/2024 → 27/09/2024	British Council
Selección de las hasta 170 IED para pruebas a estudiantes de 8°	Línea base estudiantes	Finalizado	23/09/2024 → 27/09/2024	Secretaría de Educación de Bogotá
Confirmación de equipos para ruta Tipo 1	Línea base estudiantes	Finalizado	25/09/2024 → 08/11/2024	British Council
Acompañamiento a aplicación de pruebas	Línea base estudiantes	Finalizado	30/09/2024 → 08/11/2024	Convenio
Reasignación de licencias	Línea base estudiantes	Finalizado	30/09/2024 → 08/11/2024	British Council
Aplicación de pruebas a 10,000 estudiantes de 8°	Línea base estudiantes	Finalizado	30/09/2024 → 08/11/2024	Convenio
Impresión de usuarios y contraseñas por institución	Línea base estudiantes	Finalizado	07/10/2024 → 08/11/2024	British Council
Consolidación de resultados	Línea base estudiantes	Finalizado	01/11/2024 → 08/11/2024	British Council
Envio de resultados consolidados a Los Andes	Línea base estudiantes	Finalizado	11/11/2024	British Council
Reporte de resultados	Línea base estudiantes	En progreso	18/11/2024 → 28/11/2024	British Council
Analisis de los resultados	Línea base estudiantes	En progreso	18/11/2024 → 28/11/2024	British Council

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**27/11/2024**	**Inicio**	**10:00 a.m.**	**Fin**	**11:00 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Tercer Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos y Supervisora del convenio** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Ingrid Gutiérrez - Contratista DCTME** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Jessica Culma – Analista de datos** **Samira Mogollón - Contratista – DCTME – Apoyo financiero** **Genny Vargas – Contratista Apoyo jurídico**					**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Programas de Educación, Inglés y Artes** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**	

Fecha de Elaboración	**27/11/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**	**Próxima Reunión**	**Pendiente**

Analisis de los resultados	Línea base docentes	No iniciado	18/11/2024 → 28/11/2024	British Council
Consolidación de resultados	Línea base docentes	Finalizado	12/11/2024 → 14/11/2024	British Council
Envío de resultados consolidados a Los Andes	Línea base docentes	Finalizado	14/11/2024	British Council
Aplicación de pruebas a 1,000 docentes	Línea base docentes	Finalizado	15/10/2024 → 12/11/2024	Convenio
Webinar con instrucciones para diligenciar prueba	Línea base docentes	Finalizado	16/10/2024	British Council
Envío de correos electrónicos con Connect code	Línea base docentes	Finalizado	15/10/2024 → 18/10/2024	British Council
Seleccion y compra de licencias prueba para 1,000 docentes	Línea base docentes	Finalizado	16/09/2024 → 20/09/2024	British Council
Selección de las hasta 170 IED donde se aplicarán las pruebas a docentes	Línea base docentes	Finalizado	09/09/2024 → 20/09/2024	Secretaría de Educación de Bogotá
Convocatoria a docentes que tomarán la prueba	Línea base docentes	Finalizado	28/08/2024 → 06/09/2024	Secretaría de Educación de Bogotá
Cotización de apoyo logístico y equipos	Línea base docentes	Finalizado	06/09/2024 → 13/09/2024	British Council
Convocatoria a instituciones para línea base docentes	Línea base docentes	Finalizado	28/08/2024 → 06/09/2024	Secretaría de Educación de Bogotá


No hay alertas en el cronograma

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**27/11/2024**	**Inicio**	**10:00 a.m.**	**Fin**	**11:00 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Tercer Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos y Supervisora del convenio** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Ingrid Gutiérrez - Contratista DCTME** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Jessica Culma – Analista de datos** **Samira Mogollón - Contratista – DCTME – Apoyo financiero** **Genny Vargas – Contratista Apoyo jurídico**					**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Programas de Educación, Inglés y Artes** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**	
Fecha de Elaboración	**27/11/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**			**Próxima Reunión**	**Pendiente**

- **Resumen Línea Base y Diagnóstico – Robusto:**


A continuación, se presenta el resumen entre los componentes de diagnóstico y línea base. Inicialmente se presenta la gráfica para diagnóstico robusto y le sigue la de simple.

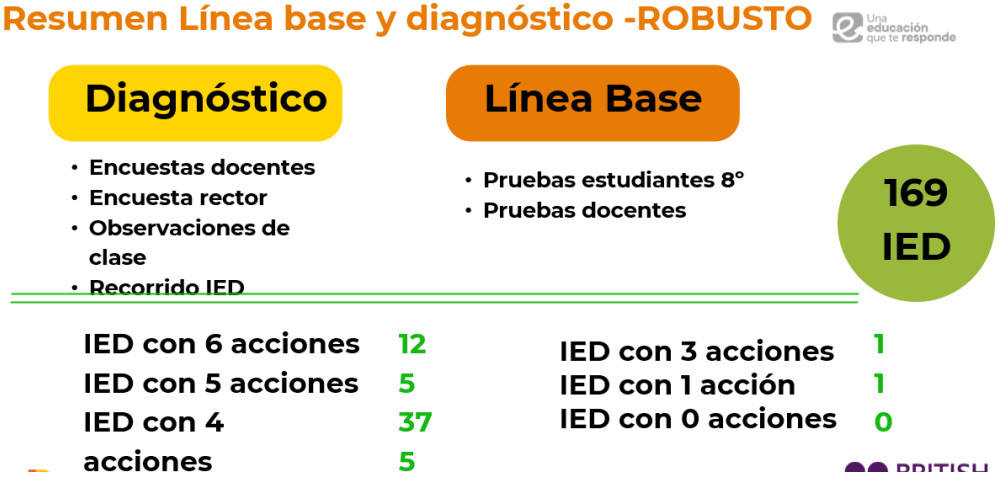

Fecha	**27/11/2024**	**Inicio**	**10:00 a.m.**	**Fin**	**11:00 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Tercer Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos y Supervisora del convenio** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Ingrid Gutiérrez - Contratista DCTME** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Jessica Culma – Analista de datos** **Samira Mogollón - Contratista – DCTME – Apoyo financiero** **Genny Vargas – Contratista Apoyo jurídico**					**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Programas de Educación, Inglés y Artes** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**	
Fecha de Elaboración	**27/11/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**			**Próxima Reunión**	**Pendiente**

- En 12 IED, se realizaron 6 acciones.
- En 5 IED, se realizaron 5 acciones.
- En 37 IED, se realizaron 4 acciones.
- En 3 IED, se realizó 1 acción.
- En 1 IED, se realizó 1 acción.

- **Resumen Línea Base y Diagnóstico – Simple:**

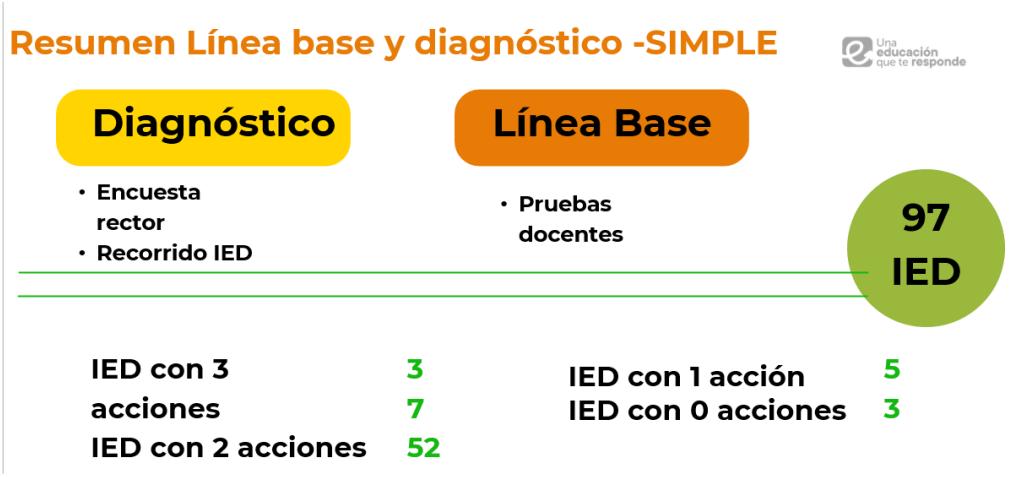


Fecha	**27/11/2024**	**Inicio**	**10:00 a.m.**	**Fin**	**11:00 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Tercer Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos y Supervisora del convenio** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Ingrid Gutiérrez - Contratista DCTME** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Jessica Culma – Analista de datos** **Samira Mogollón - Contratista – DCTME – Apoyo financiero** **Genny Vargas – Contratista Apoyo jurídico**					**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Programas de Educación, Inglés y Artes** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**	

Fecha de Elaboración	**27/11/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**	**Próxima Reunión**	**Pendiente**

- En 7 IED, se realizaron 3 acciones.
- En 52 IED, se realizaron 2 acciones.
- En 5 IED, se realizó 1 acción.

Componente 3: Documentos y materiales

- Se presenta a continuación el avance de los 3 elementos que componen Documentos y Materiales:

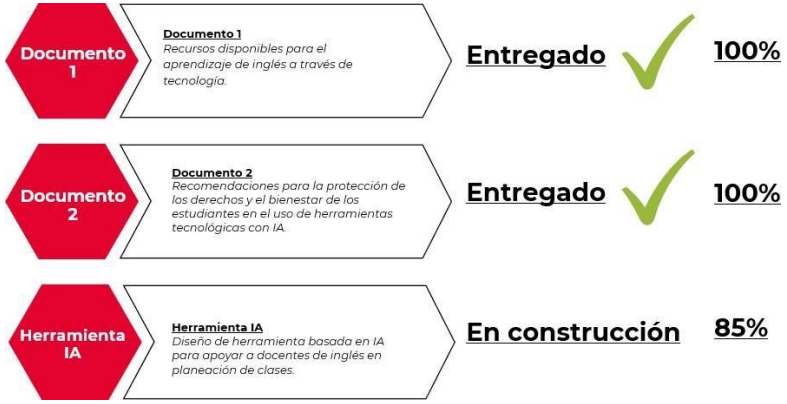

Fecha	**27/11/2024**	**Inicio**	**10:00 a.m.**	**Fin**	**11:00 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Tercer Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos y Supervisora del convenio** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Ingrid Gutiérrez - Contratista DCTME** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Jessica Culma – Analista de datos** **Samira Mogollón - Contratista – DCTME – Apoyo financiero** **Genny Vargas – Contratista Apoyo jurídico**					**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Programas de Educación, Inglés y Artes** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**	

Fecha de Elaboración	**27/11/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**	**Próxima Reunión**	**Pendiente**

Los documentos entregados hacen parte del segundo desembolso y actualmente se está en proceso de ajustes después de revisión de la SED

- En la primera entrega que se realizó a la SED se envió la primera versión de los 2 primeros documentos: tanto el primero de comparación de herramientas mediadas por inteligencia artificial, como el documento de recomendaciones para protección de menores de edad, ya se recibió la retroalimentación por parte de la SED y están en proceso de subsanación.
- La herramienta de IA se encuentra en construcción con un avance del **85%.**

- **Cronograma:**

Creación de campos y opciones de navegación	Herramienta IA	En progreso	21/09/2024 → 29/11/2024	British Council
Creación de sistemas y entrenamiento de modelos de IA	Herramienta IA	En progreso	21/09/2024 → 29/11/2024	British Council
Actualización e indexación de metadatos existentes	Herramienta IA	En progreso	21/09/2024 → 29/11/2024	British Council
Diseño de formatos predeterminados	Herramienta IA	En progreso	21/09/2024 → 29/11/2024	British Council
Redacción de los dos documentos.	Herramienta IA	En progreso	21/09/2024 → 29/11/2024	British Council
Análisis de información sobre políticas de protección al menor	Herramienta IA	Finalizado	16/09/2024 → 18/10/2024	British Council
Valoración de aplicaciones y alternativas	Herramienta IA	Finalizado	13/09/2024 → 18/10/2024	British Council
Revisión de investigaciones y mejores prácticas en el uso de tecnología en la educación.	Herramienta IA	Finalizado	13/09/2024 → 18/10/2024	British Council

Fecha	**27/11/2024**	**Inicio**	**10:00 a.m.**	**Fin**	**11:00 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Tercer Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos y Supervisora del convenio** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Ingrid Gutiérrez - Contratista DCTME** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Jessica Culma – Analista de datos** **Samira Mogollón - Contratista – DCTME – Apoyo financiero** **Genny Vargas – Contratista Apoyo jurídico**					**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Programas de Educación, Inglés y Artes** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**	

Fecha de Elaboración	**27/11/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**	**Próxima Reunión**	**Pendiente**

Todas las que se encuentran “en progreso” es por el documento en construcción de la Herramienta IA, las cuales estarán culminadas al 11 de diciembre de 2024, previo a la terminación del convenio.

- **Ejecución financiera:**

1er Desembolso	oct-24	$ 1.020.000.000,00	60%
2do Desembolso	dic-24	$ 680.000.000,00	40%

APORTE	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	COMPROMETIDO	% EJECUCIÓN	% COMPROMETIDO	PENDIENTE POR EJECUTAR	% PENDIENTE POR EJECUTAR
SED	$ 1.700.000.000	$ 644.840.209	$ 678.133.506	38%	40%	$ 1.055.159.791	62%
British Council	$ 431.154.041	$ 381.643.740	$ 16.658.298	89%	4%	$ 49.510.301	11%
TOTAL	**$ 2.131.154.041**	**$ 1.026.483.949**	**$ 694.791.804**	**48,17%**	**32,60%**	**$ 1.104.670.092**	**51,83%**

COMPONENTE	PRESUPUESTADO		EJECUTADO A 21 DE NOVIEMBRE		COMPROMETIDO		PENDIENTE POR EJECUTAR/COMPROMETER		% De ejecución		% Comprometido	
	SED	BC	SED	BC	SED	BC	SED	BC	SED	BC	SED	BC
Equipo	$ 162.257.214	$ 58.304.041	$ 71.483.754	$ 33.316.596	$ 49.393.506	$ 16.658.298	$ 41.379.954	$ 8.329.147	44%	57%	30%	29%
Diagnostico y linea base	$ 1.373.800.000	$ 160.000.000	$ 507.940.000	$ 160.000.000	$ 607.940.000		$ 257.920.000		37%	100%	44%	
Documentos y materiales	$ 70.350.000	$ 127.850.000		$ 124.577.144	$ 20.800.000		$ 49.550.000	$ 3.272.856		97%	30%	
Gastos administrativos	$ 93.592.786	$ 85.000.000	$ 65.416.455	$ 63.750.000			$ 28.176.331	$ 21.250.000	70%	75%		
Totales	**$ 1.700.000.000**	**$ 431.154.041**	**$ 644.840.209**	**$ 381.643.740**	**$ 678.133.506**	**$ 16.658.298**	**$ 377.026.285**	**$ 32.852.003**	**38%**	**89%**	**40%**	**4%**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**27/11/2024**	**Inicio**	**10:00 a.m.**	**Fin**	**11:00 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Tercer Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos y Supervisora del convenio** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Ingrid Gutiérrez - Contratista DCTME** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Jessica Culma – Analista de datos** **Samira Mogollón - Contratista – DCTME – Apoyo financiero** **Genny Vargas – Contratista Apoyo jurídico**					**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Programas de Educación, Inglés y Artes** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**	

Fecha de Elaboración	**27/11/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**	**Próxima Reunión**	**Pendiente**

*Del presupuesto, se ha ejecutado por parte de la SED un 34% y por parte de British Council del 89%. Se tiene pendiente por ejecutar por parte de la SED un 62% y por parte del British Council un 11%; sin embargo, ya hay un 40% y 4% en proceso de pago por parte del British Council y la SED, respectivamente – presupuesto por “salir del banco” *

*No hay ninguna alerta por reportar frente al presupuesto**

- Se pregunta al comité cómo reportar las eficiencias de equipo de los primeros días, ya que no ingresaron el 1 de septiembre, que es equivalente a $7.000.000 aproximadamente.
- Samira Mogollón:
  - Está pendiente un último comité, en ese informe financiero se incluirá una columna que se denomine “Saldos pendientes por ejecutar” por cada una de las líneas.
  - La línea que quedaría con saldo sería la de “Equipo”. Tener presente que el saldo que quede por ejecutar solo sea aportes de la Secretaría, no pueden quedar saldos pendientes de aportes por parte de los aliados.
  - Finalmente, esta información se presentará también en el informe financiero, en el que se recoge el 100% de la ejecución, con todos sus soportes y se deja el saldo que sería ya no “por ejecutar” sino saldo “por reintegrar recursos no ejecutados”. *Incluir por favor en el último comité”

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**27/11/2024**	**Inicio**	**10:00 a.m.**	**Fin**	**11:00 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Tercer Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos y Supervisora del convenio** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Ingrid Gutiérrez - Contratista DCTME** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Jessica Culma – Analista de datos** **Samira Mogollón - Contratista – DCTME – Apoyo financiero** **Genny Vargas – Contratista Apoyo jurídico**					**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Programas de Educación, Inglés y Artes** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**	
Fecha de Elaboración	**27/11/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**			**Próxima Reunión**	**Pendiente**

- **Avance segundo desembolso:**

ACTIVIDAD	FECHA	ESTADO
Envío de entregables	15 Nov	Cumplido
Retroalimentación	22 Nov	Cumplido
Ajustes	28 Nov	Pendiente
Aprobación final	4 Dic	Pendiente
Radicación	9 Dic	Pendiente

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**27/11/2024**	**Inicio**	**10:00 a.m.**	**Fin**	**11:00 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Tercer Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos y Supervisora del convenio** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Ingrid Gutiérrez - Contratista DCTME** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Jessica Culma – Analista de datos** **Samira Mogollón - Contratista – DCTME – Apoyo financiero** **Genny Vargas – Contratista Apoyo jurídico**					**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Programas de Educación, Inglés y Artes** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**	

Fecha de Elaboración	**27/11/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**	**Próxima Reunión**	**Pendiente**

- **COMPROMISOS Y CONCLUSIONES:**

IED ROBUSTO

- IED JOSÉ JAIME ROJAS - Se agendó visita pero la docente no vlvió a contestar llamadas o mensajes

En ninguna de estas 5 IED se logró llevar a cabo la visita, por ende, no cuentan con ningún instrumento aplicado

IED SIMPLE

- IED JUAN REY - No hubo respuesta a pesar de las acciones de la SED y el British Council
- IED RUFINO JOSÉ CUERVO - No hubo respuesta a pesar de las acciones de la SED y el British Council
- IED GUSTAVO ROJAS PINILLA - Agendamos pero no recibieron visita
- IED LAURA HERRERA DE VARELA - Agendamos pero coord nunca volvió a contestar

Estos son los colegios que se mencionaron inicialmente de Diagnóstico Simple y Robusto, que no tienen ningún instrumento aplicado
No se pudo aplicar ningún instrumento, se trató de establecer comunicación por diferentes medios y de parte de todos los equipos, sin embargo, no se obtuvo respuesta por parte de ninguna de estas instituciones
*Asimismo, ocurrió en el IED José Jaime Rojas, se aplicaron pruebas, pero no los demás instrumentos de Diagnóstico Robusto"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**27/11/2024**	**Inicio**	**10:00 a.m.**	**Fin**	**11:00 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Tercer Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos y Supervisora del convenio** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Ingrid Gutiérrez - Contratista DCTME** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Jessica Culma – Analista de datos** **Samira Mogollón - Contratista – DCTME – Apoyo financiero** **Genny Vargas – Contratista Apoyo jurídico**					**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Programas de Educación, Inglés y Artes** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**	

Fecha de Elaboración	**27/11/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**	**Próxima Reunión**	**Pendiente**

En el IED Laura Herrera de Varela, se aplicó el instrumento de recorrido, pero no la encuesta
A pesar de los esfuerzos de los 3 equipos, SED, British Council y la Universidad de Los Andes, no se pudieron aplicar los instrumentos que se habían proyectado
Esto se reportó a la SED en el documento en línea de alertas

- **Comentarios finales:**
  Frank Herrera: Al final del día se enviará una actualización respecto a estas últimas alertas, que se trataron con el equipo de la SED.
  Agradece por la ejecución.
  Para definir la fecha del precomité y comité antes de que el convenio finalice, se propondrán opciones de fechas para definir.

- **Compromisos:**
  1. Desagregar la información de los resultados de línea base de docentes para conocer el resultado de los docentes de Diagnóstico Robusto y agregarlo a la presentación de este comité - British Council.
  2. En la presentación del último comité, en el punto de “Ejecución financiera”, incluir las “eficiencias de Equipo”
  3. Enviar actualización de Alertas de los colegios pendientes de instrumentos - SED
  4. Establecer fecha y hora del pre-comité y 4to comité antes de que termine el convenio – SED y British Council

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**27/11/2024**	**Inicio**	**10:00 a.m.**	**Fin**	**11:00 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Tercer Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos y Supervisora del convenio** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Ingrid Gutiérrez - Contratista DCTME** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Jessica Culma – Analista de datos** **Samira Mogollón - Contratista – DCTME – Apoyo financiero** **Genny Vargas – Contratista Apoyo jurídico**					**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Programas de Educación, Inglés y Artes** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**	

Fecha de Elaboración	**27/11/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**	**Próxima Reunión**	**Pendiente**

NOMBRE: Angela Maria Cubillos
CARGO: Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos.

NOMBRE: Jaime Andrés Galindo
CARGO: Contratista

NOMBRE: Ingrid Gutiérrez
CARGO: Contratista

NOMBRE: Franck Alexander Herrera
CARGO: Contratista

NOMBRE: Jessica Culma Perdomo
CARGO: Contratista

NOMBRE: Samira Bibiana Mogollón
CARGO: Contratista

NOMBRE: Genny Marley Vargas
CARGO: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**27/11/2024**	**Inicio**	**10:00 a.m.**	**Fin**	**11:00 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Tercer Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos y Supervisora del convenio** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Ingrid Gutiérrez - Contratista DCTME** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Jessica Culma – Analista de datos** **Samira Mogollón - Contratista – DCTME – Apoyo financiero** **Genny Vargas – Contratista Apoyo jurídico**					**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Programas de Educación, Inglés y Artes** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**	

Fecha de Elaboración	**27/11/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**	**Próxima Reunión**	**Pendiente**

NOMBRE: Laura Barragán
CARGO: Directora de Programas de Educación, Inglés y Artes

NOMBRE: Carolina Cruz
CARGO: Jefe de Programas de Inglés

NOMBRE: Lisseth Diosa
CARGO: Asistente administrativa

NOMBRE: María Alejandra Bernal
CARGO: Gerente de proyectos de inglés

NOMBRE: Mayra Alejandra Acosta
CARGO: Oficial de proyectos de inglés

NOMBRE: Edson Gómez
CARGO: Consultor de datos

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**27/11/2024**	**Inicio**	**10:00 a.m.**	**Fin**	**11:00 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Tercer Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos y Supervisora del convenio** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Ingrid Gutiérrez - Contratista DCTME** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Jessica Culma – Analista de datos** **Samira Mogollón - Contratista – DCTME – Apoyo financiero**					**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Programas de Educación, Inglés y Artes** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**	

Fecha de Elaboración	**27/11/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**	**Próxima Reunión**	**Pendiente**

Nathalia Lizcano Rivera

NOMBRE: Nathalia Lizcano
CARGO: Líder técnico

NOMBRE: Camila Gil
CARGO: Coordinadora financiera

NOMBRE: Lorena Torres
CARGO: Coordinadora administrativa
