PRORROGA No. 03 SUSPENSIÓN N° 03 DEL CONTRATO DE OBRA N° 019 DEL 2023	
CONTRATANTE:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL**
CONTRATISTA:	CONSORCIO ABASTECER 23
OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 26.353.092.065.oo
ADICIONAL No. 01	$ 4.151.483.338
ADICIONAL No. 02	$ 954.726.859
VALOR ACTUAL	$31.459.302.262
PLAZO:	**DIECINUEVE (19) MESES**
PRÓRROGA No. 01	15 de enero de 2024
PRÓRROGA No. 02	15 de marzo de 2024
PRÓRROGA No. 03	15 de mayo de 2024
PRÓRROGA No. 04	28 de junio de 2024
PRÓRROGA No. 05	29 de julio de 2024
PRÓRROGA No. 06	22 de octubre de 2024
SUPERVISOR:	JORGE ELMER DIAZ MORALES Director de Planeación – IBAL S.A E.S.P
INTERVENTOR:	CONSORCIO TOLIMA 2023
FECHA DE INICIO	16 de marzo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 01	15 de Agosto de 2024
FECHA DE REINICIACIÓN N° 01	20 de Agosto de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 02	03 de octubre de 2024
FECHA DE REINICIACIÓN N° 02	22 de octubre de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 03	06 de noviembre de 2024
FECHA DE PRÓRROGA No. 01 SUSPENSIÓN N° 03	20 de noviembre de 2024
FECHA DE PRÓRROGA No. 02 SUSPENSIÓN N° 03	05 de Diciembre de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN	08 de noviembre de 2024

A los dos (02) días del mes de enero de 2025, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber, FABIAN ALONSO TINOCO, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con **NIT 800.089.809-6**, de una parte y el señor **NELSON ALFONSO CASAS ALFONSO** quien actúa como represéntate legal del **CONSORCIO TOLIMA 2023** identificada con **NIT 901.687.324-8** en su calidad de interventor del contrato; y por la otra, **YOLI MARCELA LOZANO BARRETO** identificada con cédula de ciudadanía No. 38.361.752, en su calidad de Representante Legal de la empresa **CONSORCIO ABASTECER 23** identificada con **NIT 901.683.056-0**, con el fin de suspender el contrato en mención, por el término de **QUINCE (15) DÍAS**, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

El constructor mediante comunicado **COM-COOR-ABAS-101-24 manifiesta** que a la fecha no han sido superados los hechos, los cuales obedecen a la energización del proyecto por parte del proveedor de servicios CELSIA. a la fecha del presente comunicado se está a la espera del agendamiento de la visita para el recibo técnico del proyecto, según lo manifestado por el proveedor mediante correo electrónico el 30 de diciembre de 2024.

Aclarando que, al momento las obras civiles y de interconexión ya se encuentran ejecutadas y que la funcionalidad del sistema se puede garantizar dentro de esta ejecución. que el sistema se encuentra en la puesta en marcha.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,

YOLI MARCELA LOZANO BARRETO
Representante Legal
Consorcio Abastecer 23

FABIAN ALONSO TINOCO
Director de Planeación (E)
IBAL S.A E.S.P OFICIAL
Supervisor contrato 019 de 2023

NELSON ALFONSO CASAS ALFONSO
Representante Legal
CONSORCIO TOLIMA 2023
Interventoría contrato 019 de 2023

CONSORCIO ABASTECER 23

COM-COOR-ABAS-101-24

Ibagué, 02 de enero de 2025

Señores

CONSORCIO TOLIMA 2023

ATN. RICARDO GAONA

Director de interventoría

ASUNTO: PRÓRROGA NO. 03 SUSPENSIÓN NO. 03 CONTRATO 019 DE 2023.

REF: CONTRATO 019 DE 2023 **OBJETO:** CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.


Respetado ingeniero,

Por medio de la presente nos permitimos solicitar prorroga No. 03 de la suspensión No. 03, basados en que, los hechos por los cuales se realizó dicha suspensión a la fecha no han sido superados, los cuales obedecen a la energización del proyecto por parte del proveedor de servicios CELSIA, a la fecha del presente comunicado se está a la espera del agendamiento de la visita para el recibo técnico del proyecto, según lo manifestado por el proveedor mediante correo electrónico el 30 de diciembre de 2024.

Aclarando que el consorcio, ha estado acompañando dicho proceso, para poder obtener dicha maniobra.

Dicho lo anterior, se solicita ampliar la suspensión No. 03 del contrato 019 de 2023, por un término de QUINCE (15) DÍAS con el compromiso que si las circunstancias se superan con anticipación se reiniciará el contrato, para continuar con la etapa de liquidación.

Ilustración No. 01 Copia Correo recibido el 30 de diciembre de 2024.

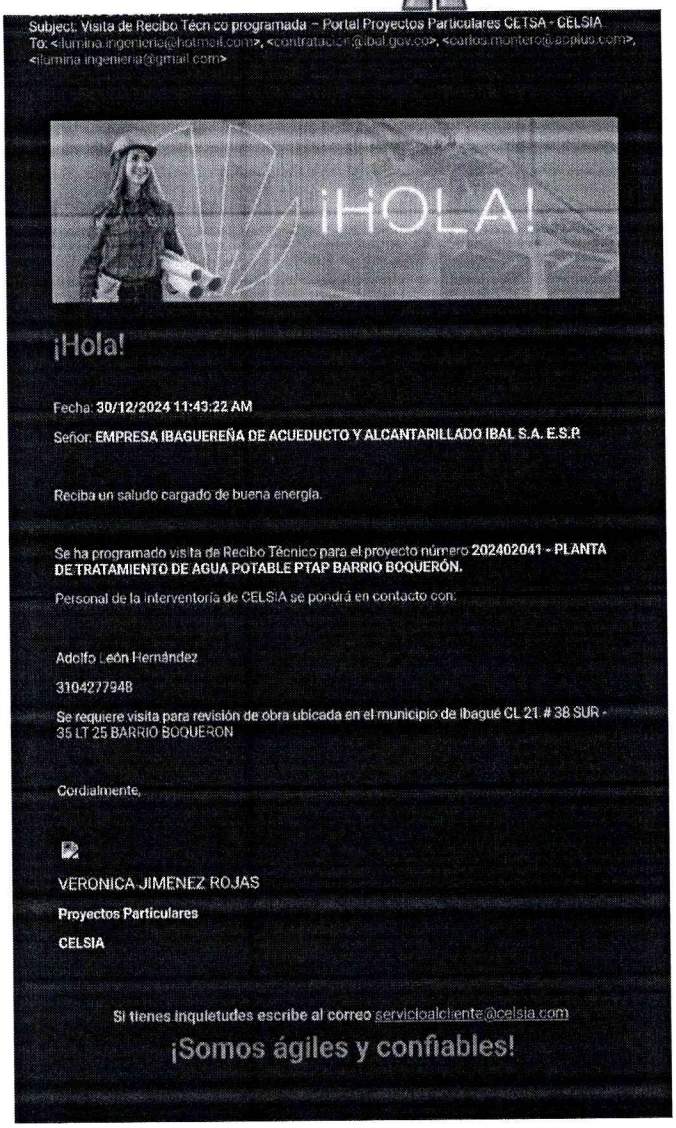

Subject: Visita de Recibo Técnico programada – Portal Proyectos Particulares CELSIA - CELSIA
To: <ilumina.ingenieria@hotmail.com>, <contratacion@ibal.gov.co>, <carlos.montero@acplus.com>, <ilumina.ingeniería@gmail.com>

¡HOLA!

¡Hola!

Fecha: **30/12/2024 11:43:22 AM**

Señor: **EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P.**

Reciba un saludo cargado de buena energía.

Se ha programado visita de Recibo Técnico para el proyecto número **202402041 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP BARRIO BOQUERÓN.**

Personal de la interventoría de CELSIA se pondrá en contacto con:

Adolfo León Hernández

3104277948

Se requiere visita para revisión de obra ubicada en el municipio de Ibagué CL 21 # 38 SUR - 35 LT 25 BARRIO BOQUERON

Cordialmente,

VERONICA JIMENEZ ROJAS

Proyectos Particulares

CELSIA

Si tienes inquietudes escribe al correo servicioalcliente@celsia.com

¡Somos ágiles y confiables!

Sin otro en particular,

YOLI MARCELA LOZANO BARRETO

R.L CONSORCIO ABASTECER 23

NIT. 901.683.056-0

Copia: JORGE ELMER DÍAZ MORALES- Supervisor contrato 019 de 2023- IBAL S.A E.S.P OFICIAL
