

Id	Nombre de tarea	Duración
0	**CRONOGRAMA**	**114 días?**
1		
2	**CONCURSO DE MERITOS No. 003 DE 2024**	**114 días?**
3	**1. INICIO DE PROYECTO**	**6 días**
4	Firma del contrato	2 días
5	Reunión inicial para alineación de objetivos	3 días
6	Planeación Logistica y detallada de actividades	2 días
7	**2. RECONOCIMIENTO INICIAL**	**11 días**
8	Visita técnica (registo fotográfico detallado del	6 días
9	Solicitud y recopilación de información	7 días
10	Validacion de documentos obtenidos con la Entidad y otros	4 días
11	**3. ESTUDIOS ESPECIALIZADOS (ESTUDIO DE SUELOS)**	**23 días**
12	Realización del estudio de suelos y análisis	7 días
13	Informe de resultados para revisión y	3 días
14	Ensayos complementarios	7 días
15	Consolidación de datos obtenidos para el	6 días
16	Informe final Estudio de Suelos	2 días
17	**4. PATOLOGÍA ESTRUCTURAL**	**25 días**
18	Inspección directa de la estructura	4 días
19	Imágenes ferromagnéticas	5 días

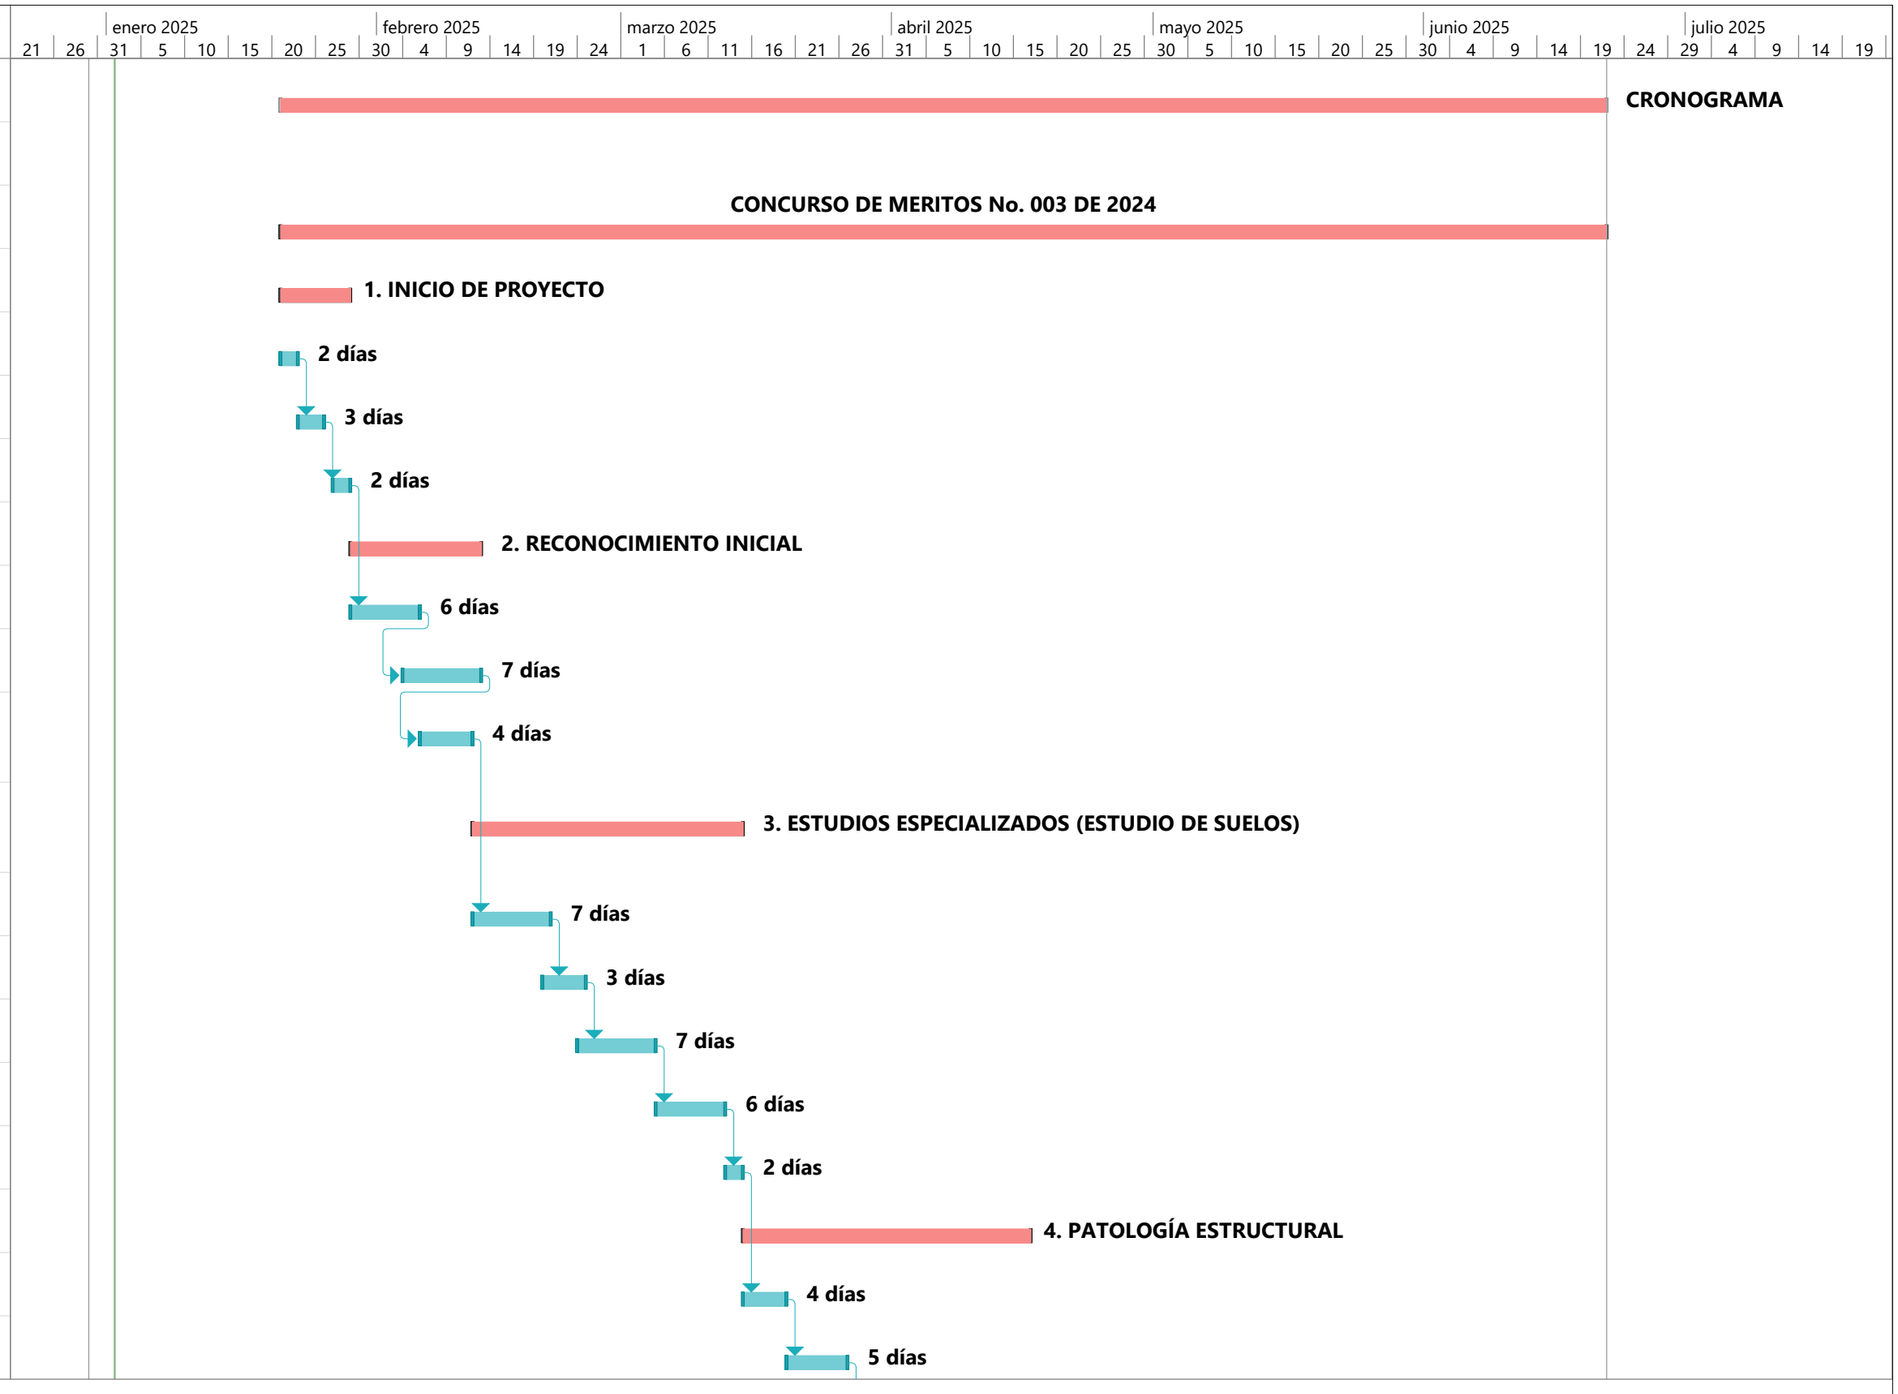

Proyecto: CRONOGRAMA
Fecha: jue 2/01/25

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id		Nombre de tarea	Duración
20		Ensayos no destructivos	5 días
21		Extracción de núcleos y ensayos destructivos	7 días
22		Levantamiento de lesiones, ataques y	4 días
23		**5.ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD**	**29 días**
24		Análisis de indices de sobreesfuerzo y flexilibidad general	3 días
25		Desarrollo de hipótesis de fallas progresivas	3 días
26		Cálculo del indice de vulnerabilidad conforme a la NSR-10	3 días
27		Redacción de informe de vulnerabilidad	2 días
28		Análisis de carga según las disposiciones de la	5 días
29		Recomendaciones y conclusiones	2 días
30		Diseño de Reforzamiento	5 días
31		Elaboración de Planos y Presupuestos	5 días
32		**6. ENTREGA DE DOCUMENTOS FINALES**	**8 días**
33		Presentación del informe de análisis de	2 días
34		Entrega de : Planos de levantamiento estructural	2 días
35		Entrega de : Registro fotográfico consolidado	2 días
36		Incorporación de ajustes solicitados por la entidad	2 días
37		**7. REVISIÓN Y CIERRE**	**6 días**
38		Supervisión del informe por parte de interventoría y aprobación final	2 días
39		Ajustes finales y entrega formal del proyecto	2 días

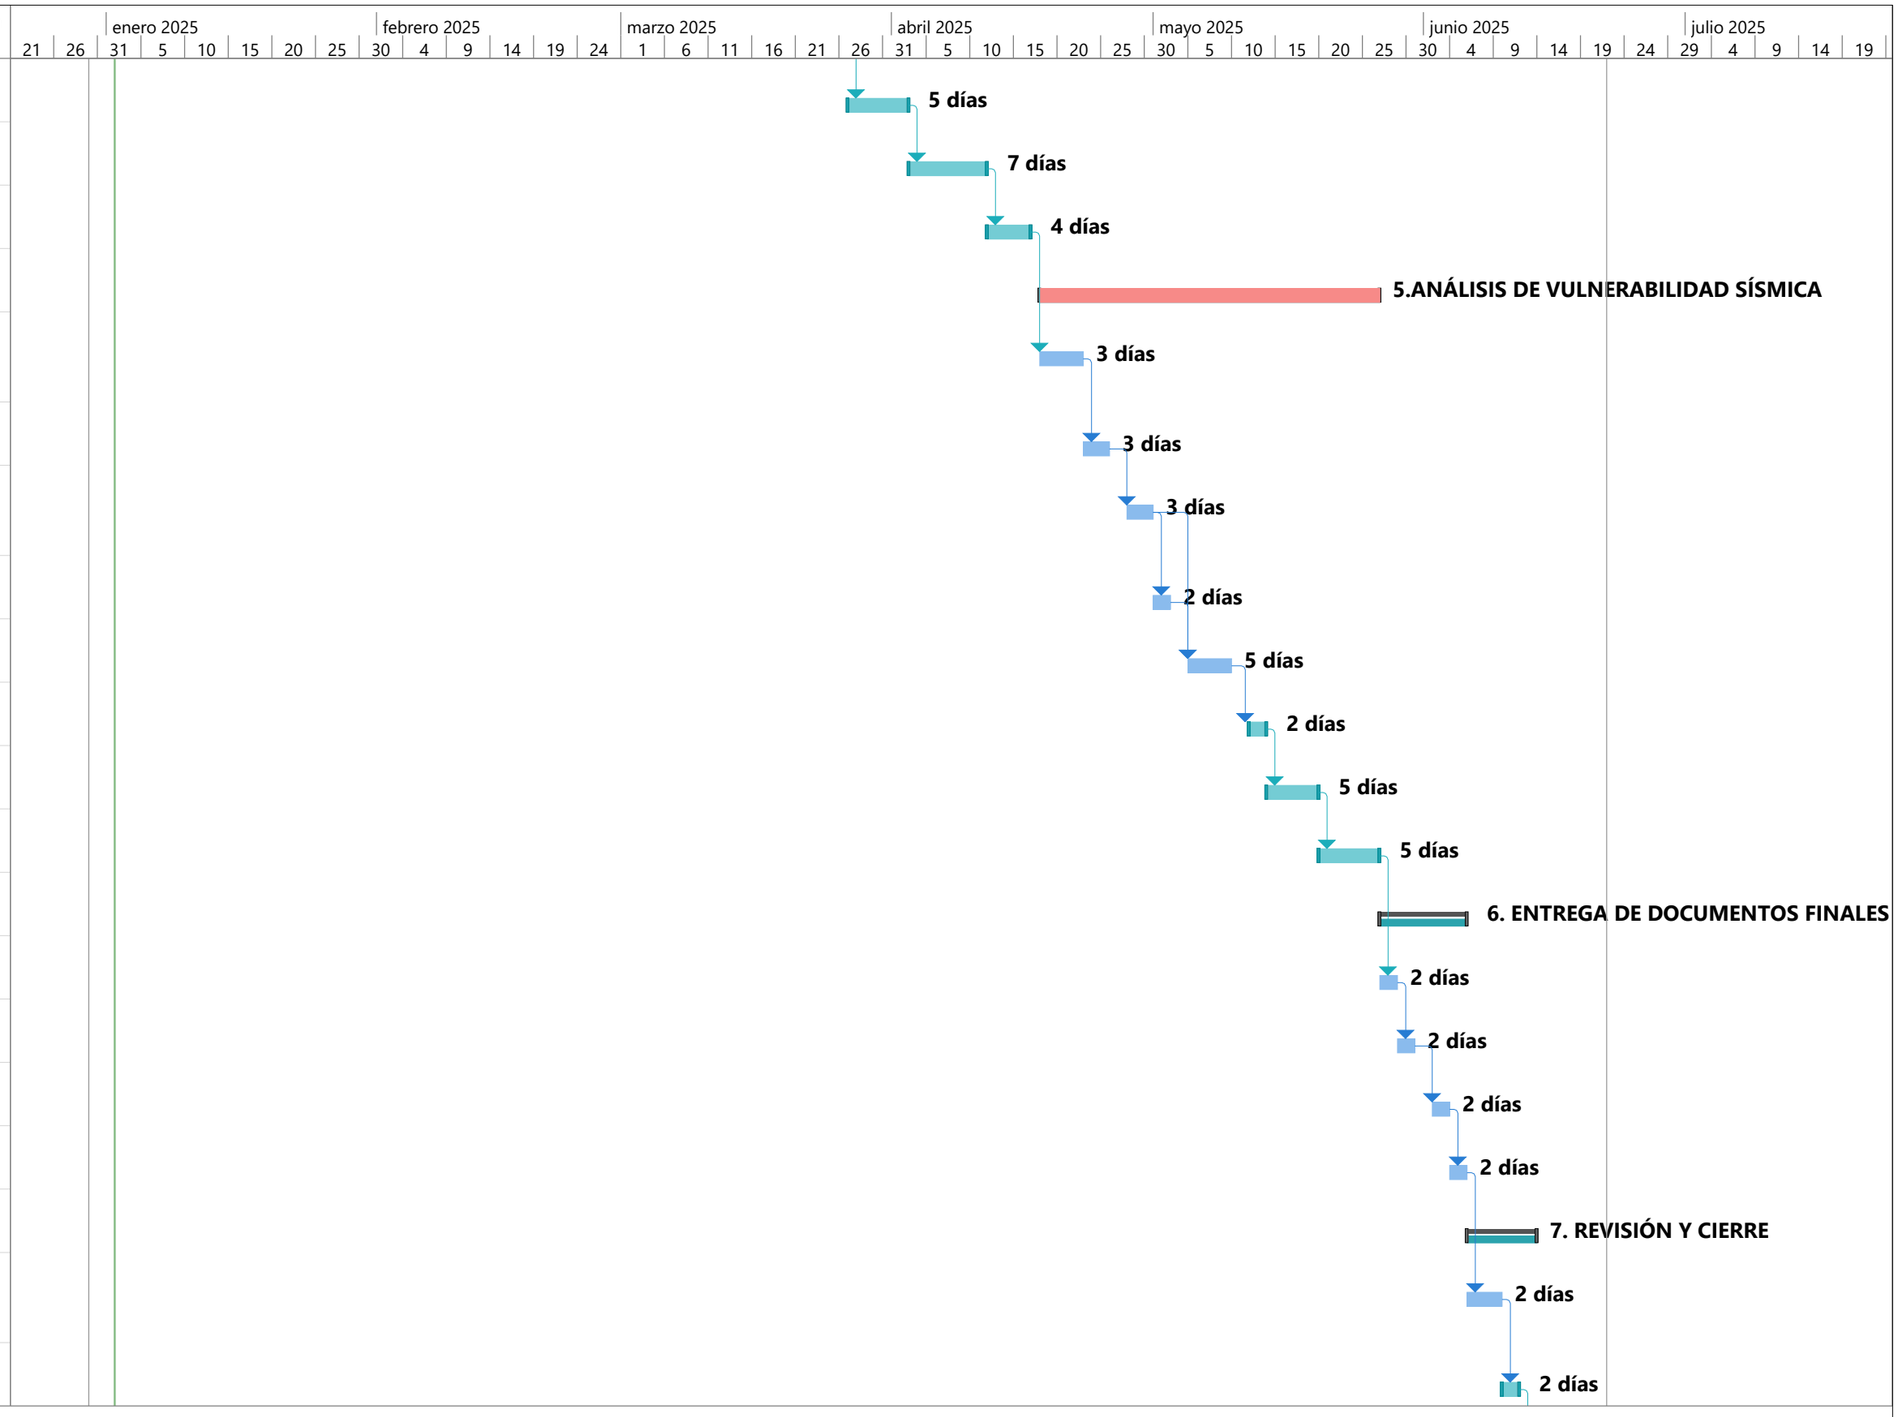

Proyecto: CRONOGRAMA
Fecha: jue 2/01/25

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	

Id		Nombre de tarea	Duración
40		Aprobación y Finalización del Contrato	2 días



Proyecto: CRONOGRAMA
Fecha: jue 2/01/25

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	
