
DIAGRAMA DE GANTT

ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO - TRAMO 1 DEL K0+400 AL 3+500

Id	Nombre de tarea	Costo	Duración
0	**AVENIDA DEL RIO - TRAMO 1**	**$55,770,126,516**	**639 días**
1	Preliminares	$139,964,371	166 días
2	Localizacion	$357,624,159	273 días
3	Señalizacion preliminar	$292,949,358	630 días
4	Demoliciones y Desmontes	$3,006,318,336	214 días
5	Excavacion descapote	$2,595,194,207	204 días
6	Muro en suelo reforzado	$0	0 días
7	Estabilidad de taludes	$7,055,410,725	183 días
8	**Alcantarillado**	**$4,188,745,216**	**206 días**
9	Excavaciones	$1,011,349,138	190 días
10	Instalacion tuberias	$2,079,191,330	165 días
11	Llenos	$352,592,632	173 días
12	Obras en concreto	$745,612,116	142 días
13	**Acueducto**	**$592,208,286**	**80 días**
14	Instalacion tuberias y acces	$532,570,474	80 días
15	Valvulas e hidrantes	$59,637,812	4 días
16	**Puente estructura concreto**	**$10,599,531,677**	**444 días**
17	Excavacion profunda	$907,534,414	243 días
18	Acero de refuerzo	$3,083,411,470	212 días
19	Cimentacion profunda	$1,716,146,563	208 días
20	Pilas y estribos	$766,374,228	198 días
21	Vigas y riostras	$1,255,126,701	225 días
22	Placa puente	$8,620,045	7 días
23	Muros de contención	$1,240,753,831	221 días
24	Juntas puentes	$174,080,583	35 días
25	Losas de aproximacion	$28,104,941	18 días
26	Aproches puentes	$1,419,378,902	164 días
27	**Instalaciones electricas**	**$2,489,208,451**	**427 días**
28	Desmontes	$221,314,728	119 días
29	Redes electricas - Cables	$571,050,668	173 días
30	Postes para redes de media y alta	$477,807,467	50 días
31	Trasnformadores	$49,966,033	7 días
32	Canalizaciones	$1,081,169,965	187 días
33	Semaforizacion	$59,776,202	36 días
34	Decrechos RETIE/RETILAB	$28,123,388	30 días
35	**Pavimentos**	**$11,348,735,009**	**143 días**
36	Subbase granular	$2,402,880,963	65 días
37	Base granular	$2,239,089,497	54 días
38	Pavimento	$6,706,764,549	84 días
39	**Puente peatonal**	**$8,611,190,433**	**203 días**
40	Infraesturctura	$6,777,203,044	152 días
41	Estructura Metalica	$1,833,987,389	173 días
42	**Urbanismo**	**$4,493,046,288**	**237 días**
43	Sardineles	$1,168,022,325	117 días
44	Andenes	$1,102,688,832	170 días
45	Señalizacion Final	$671,245,031	146 días
46	Zonas verdes	$414,613,023	88 días
47	Amoblamiento	$168,531,175	24 días
48	Iluminacion	$967,945,902	40 días

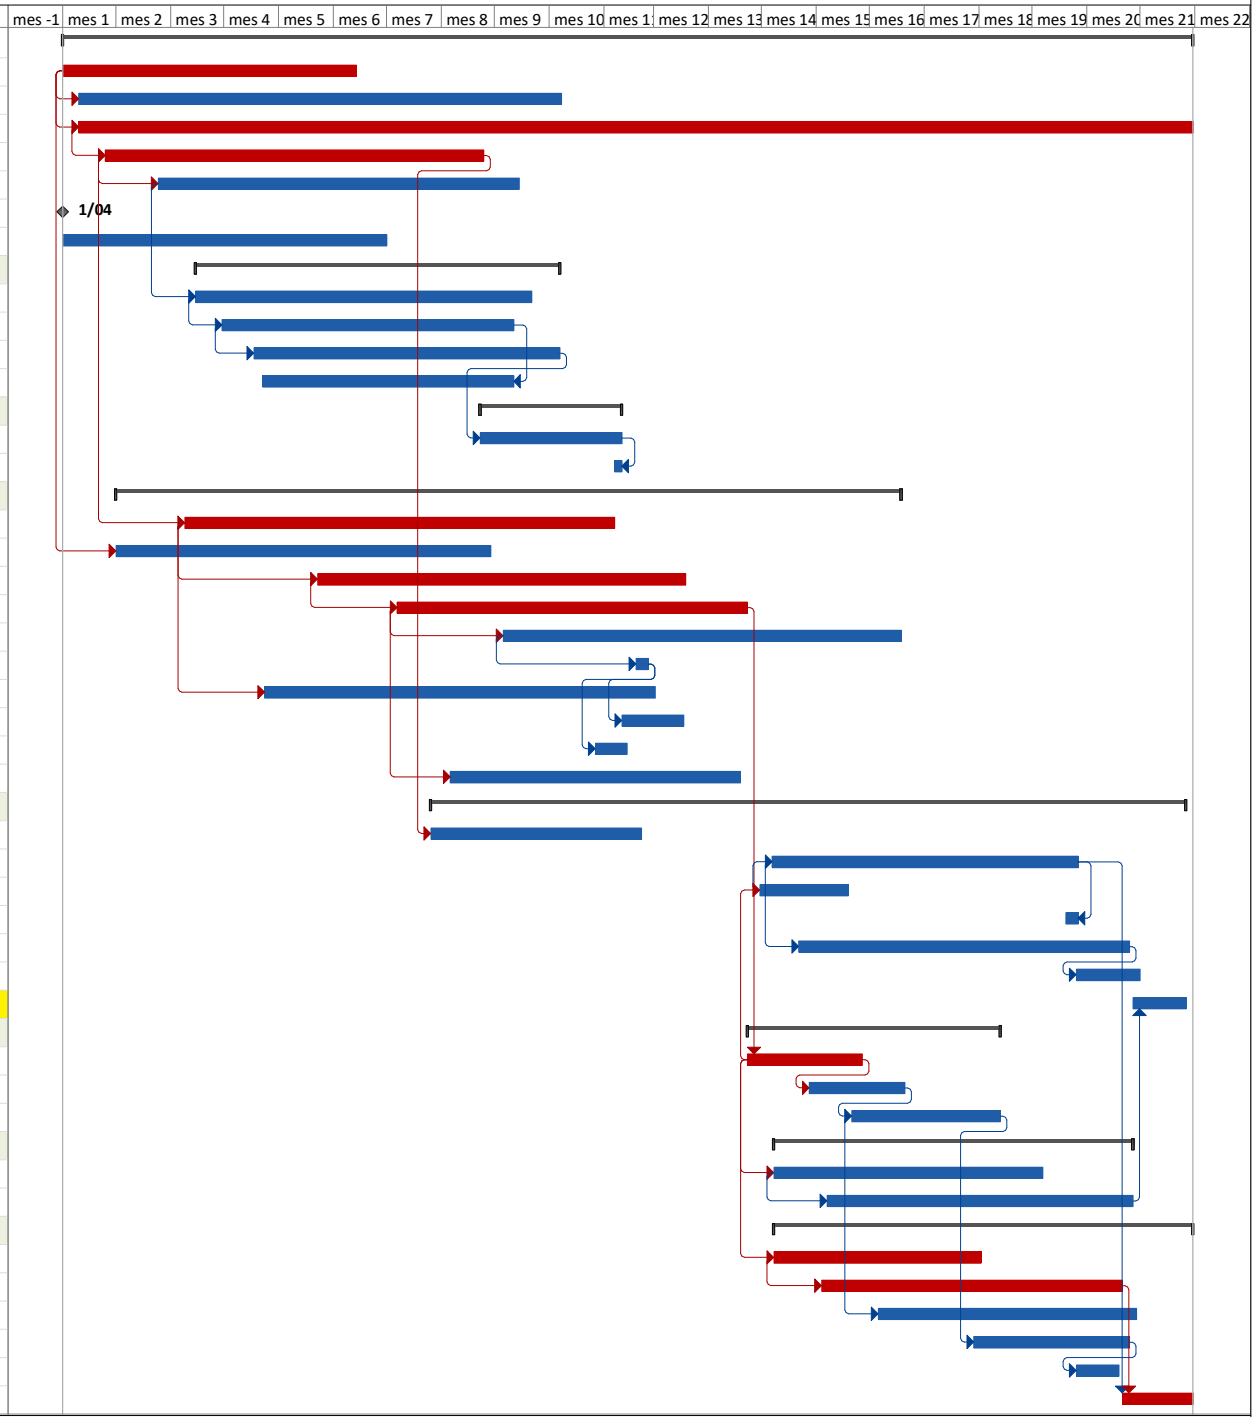

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DICIEMBRE 2024
VERSION 1

Tarea — Hito — Fecha límite — División crítica

División — Resumen — Tareas críticas — Progreso
