
DIAGRAMA DE GANTT

ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO - TRAMO 2 DEL K3+500 AL 5+162

Id	Nombre de tarea	Costo	Duración
0	**AVENIDA DEL RIO - TRAMO 2**	**$39,797,236,827**	**639 días**
1	Preliminares	$136,353,698	171 días
2	Localizacion	$123,431,752	178 días
3	Señalizacion preliminar	$282,421,556	630 días
4	Demoliciones y Desmontes	$708,805,503	227 días
5	Excavacion descapote	$1,318,361,207	114 días
6	Muro en suelo reforzado	$4,786,011,786	235 días
7	Estabilidad de taludes	$1,798,800,817	127 días
8	**Alcantarillado**	**$3,802,638,208**	**232 días**
9	Excavaciones	$637,578,003	232 días
10	Instalacion tuberias	$2,298,422,302	154 días
11	Llenos	$395,965,201	173 días
12	Obras en concreto	$470,672,702	129 días
13	**Acueducto**	**$29,225,542**	**4 días**
14	Instalacion tuberias y acces	$2,223,750	1 día
15	Valvulas e hidrantes	$27,001,792	4 días
16	**Puente estructura concreto**	**$17,349,669,947**	**531 días**
17	Excavacion profunda	$1,144,744,926	180 días
18	Acero de refuerzo	$5,699,383,092	262 días
19	Cimentacion profunda	$1,442,570,460	221 días
20	Pilas y estribos	$2,621,667,245	192 días
21	Vigas y riostras	$2,687,279,885	216 días
22	Placa puente	$996,774,536	206 días
23	Muros de contención	$2,040,852,331	137 días
24	Juntas puentes	$175,050,477	46 días
25	Losas de aproximacion	$29,469,258	18 días
26	Aproches puentes	$511,877,737	89 días
27	**Instalaciones electricas**	**$2,063,385,587**	**365 días**
28	Desmontes	$89,761,662	82 días
29	Redes electricas - Cables	$380,021,014	50 días
30	Postes para redes de media y alta	$322,898,901	40 días
31	Trasnformadores	$46,194,856	12 días
32	Canalizaciones	$1,144,341,679	176 días
33	Semaforizacion	$33,909,838	12 días
34	Decrechos RETIE/RETILAB	$46,257,637	7 días
35	**Pavimentos**	**$4,097,542,964**	**40 días**
36	Subbase granular	$852,155,643	23 días
37	Base granular	$794,068,778	20 días
38	Pavimento	$2,451,318,543	31 días
39	**Puente peatonal**	**$0**	**30 días**
40	Infraesturctura	$0	0 días
41	Estructura Metalica	$0	0 días
42	**Urbanismo**	**$3,300,588,260**	**260 días**
43	Sardineles	$519,167,081	128 días
44	Andenes	$689,055,190	168 días
45	Señalizacion Final	$837,007,689	84 días
46	Zonas verdes	$712,091,017	68 días
47	Amoblamiento	$75,421,048	18 días
48	Iluminacion	$467,846,236	39 días

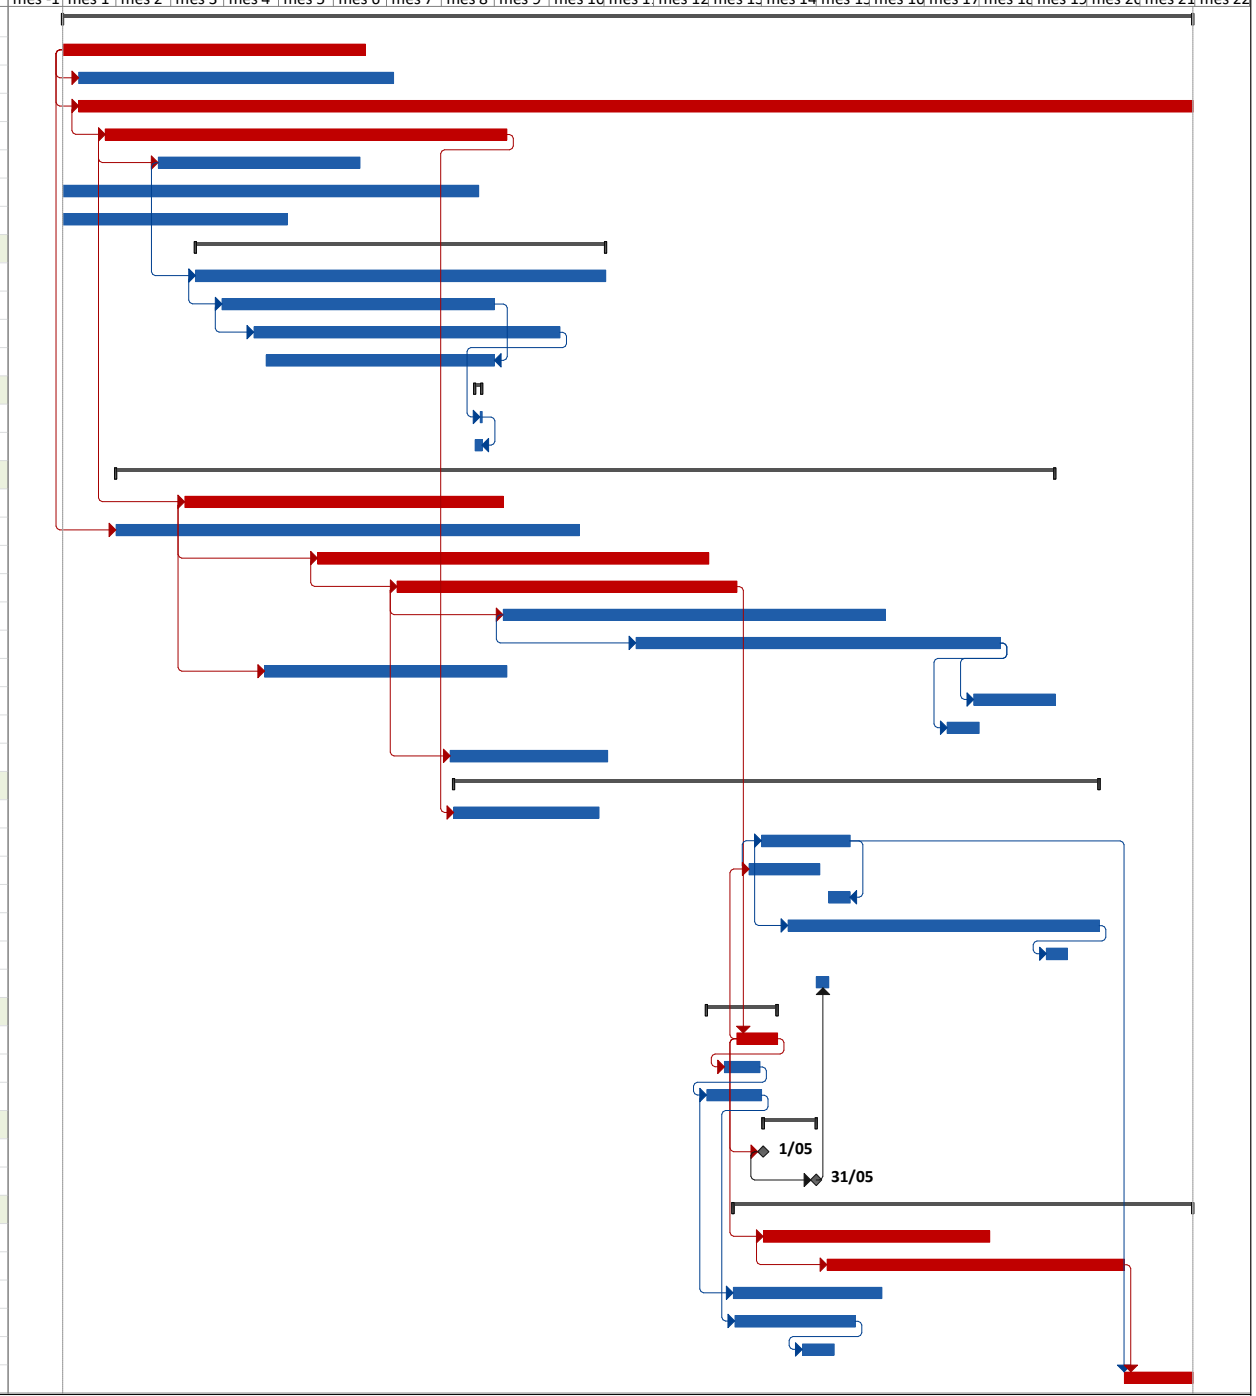

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DICIEMBRE 2024
VERSION 1

Tarea — Hito — Fecha límite — División crítica

División — Resumen — Tareas críticas — Progreso
