Departamento del Valle del Cauca Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02 Versión:02 Fecha de Aprobación: 17/06/2019 Página: 1 de 20

Fecha:	01	De	OCTUBRE	de	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO			CONVENIO	X	
Contrato número:	1.210.18.02-10705	De	Septiembre 16 de 2024		

Disponibilidad y Registro presupuestal:

Disponibilidad No. 6000000211 23/08/2024
Disponibilidad No. 6000000212 23/08/2024

Registro presupuestal No. 7000000264 de 17.09.2024

Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato:

Nombre del plan:	Paraíso para todos
Sector plan de Desarrollo:	32. Educación
Objetivo estratégico	Promover una educación inclusiva y equitativa con calidad, enfocada en el desarrollo de habilidades, valores cívicos, conciencia social para formar ciudadanos comprometidos con la construcción de una sociedad justa.
Programa plan de desarrollo:	2201- Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media
Subprograma plan de desarrollo:	2402301- Construyendo y mejorando la educación.
Meta de resultados plan de desarrollo:	24013- Disminuir a 4,45% la tasa de deserción escolar en básica y media en el Departamento del Valle del Cauca.
Metas de producto plan de desarrollo:	MP2401301112201036 - desarrollar un contenido educativo para la educación inicial, preescolar, básica y media durante el periodo de gobierno
	MP2401301172201047 - Implementar en una institución educativa oficial de los municipios no certificados del valle del cauca el modelo único de Incolballet durante el periodo de gobierno
	MP2401301192201049 - Beneficiar a 900 personas con la oferta educativa informal de Incolballet

Proyecto:	ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET EN EL VALLE DEL CAUCA
Actividades del proyecto objeto a contratar:	Evaluar el modelo pedagógico de INCOLBALLET en los niveles de educación inicial, preescolar, básica y media.
	Actualizar el modelo pedagógico de INCOLBALLET para la educación inicial, preescolar, básica y media.
	Ampliar el acceso a la educación formal e informal en danza para niños, niñas y jóvenes con talento artístico en el Valle del Cauca.

PROYECTO BPIN: 2024003760113
ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET EN EL VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA.

OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE COMPONEN EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET EN EL VALLE DEL CAUCA.

Supervisor:	Nombre: ALVARO JOSE ZULUAGA CARDONA Cédula de ciudadanía número 6.219.809 expedida en Candelaria Cargo: Supervisor – Líder de programa Ubicación: Piso 7 Gobernación- Educación
Contratista	Representante legal: KAROLYNNA HERNANTEZ ORTEGA Cédula de ciudadanía número 31.446.061 expedida en Jamundí Cargo: Directora General Entidad: Instituto Colombiano de Ballet Clásico INCOLBALLET Nit. 890.326.969-0 Ubicación: Km. 4 Vía Jamundí Callejón Pío XII Teléfono: 5553130

OBJETIVO DEL INFORME

El informe tiene como objeto realizar seguimiento a las actividades del convenio de No. 1.210.18.02-10705 de 16/09/2024, suscrito con el INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO – INCOLBALLET Nit: 890.326.969-0

- Verificar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas.
- Verificar y dejar constancia del pago de aporte parafiscales, acorde a las planillas presentada por el contratista, en el cual se evidencie que el contratista este cumpliendo con las obligaciones de afiliación y pagos al sistema de seguridad social integral, ARL y aportes parafiscales, según sea el caso.
- Revisar si la Factura Electrónica de Venta presentada por el contratista INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO – INCOLBALLET Nit: 890.326.969-0, se evidencia claramente el concepto, valor del servicio prestado de acuerdo con las obligaciones pactadas.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

	ACTIVIDAD / SUBACTIVIDAD	% contractual
	1. EVALUAR EL MODELO PEDAGÓGICO DE INCOLBALLET EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA:	**10%**
	1.1 Caracterizar el Modelo pedagógico de Enseñanza y niveles de experiencia con los que cuenta Incolballet	
	1.2 Diagnosticar de manera participativa el Modelo Pedagógico con la comunidad educativa perteneciente a la institución educativa Incolballet	
	1.3 Evaluación del modelo educativo de Incolballet	
	1.4 Analizar casos de éxitos y tendencias curriculares.	
	1.5 Identificar acciones o estrategias de innovación pedagógica	
	1.6 Definir los ejes temáticos del Modelo Pedagógico	
	1.7 Construir el modelo pedagógico inicial pedagógico de Incolballet para la educación inicial, preescolar, básica y media	
	1.8 Organizar talleres y programas de formación para los profesores, asegurando que adquieran y actualicen sus conocimientos y habilidades pedagógicas.	

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	**2. ACTUALIZAR EL MODELO PEDAGÓGICO DE INCOLBALLET PARA LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA.**	**0%**
	2.1 Realizar una prueba piloto del nuevo modelo en un grupo de estudiantes (plan piloto)	
	2.2 Ajustar la metodología basado en los resultados del piloto.	
	2.3 Desarrollar el nuevo modelo de manera gradual para facilitar la adaptación de los estudiantes y profesores.	
	2.4 Realizar evaluación y monitoreo para mantener un proceso de mejora continua.	
	3. AMPLIAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN FORMAL E INFORMAL EN DANZA PARA NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON TALENTO ARTÍSTICO EN EL VALLE DEL CAUCA.	**5%**
	3.1 Implementar talleres de danza, que incluyen ballet clásico, danza contemporánea y danza folclórica, en instituciones educativas del Valle del Cauca	
	3.2 Realizar talleres dirigidos a niños y jóvenes que promuevan la creatividad a través de la improvisación y la creación coreográfica.	
	3.3 Organizar y participar en competencias y festivales de danza para estimular el espíritu competitivo y la excelencia artística	
	3.4 Promover a niños, niñas y jóvenes en educación inicial, preescolar, básica y media de Incolballet.	
Porcentaje de cumplimiento	Para el presente desembolso, el contratista INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO – INCOLBALLET Nit: 890.326.969-0, evidencia un porcentaje de ejecución del **15%** acumulado.	**15% Acumulado**

Sugerencias

Sugerencia	Fecha de entrega	Responsable
No aplica		

Prorroga, suspensiones o adiciones		
Fecha suspensión, prorroga o adición	**Fecha de reinicio**	**Responsable**
No aplica		

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

Para tal fin se realizó seguimiento a las acciones desarrolladas, así como revisión de las actas de reuniones y entregables de soporte de las actividades u obligaciones específicas del objeto contractual ejecutadas:

Actividad 1: EVALUAR EL MODELO PEDAGÓGICO DE INCOLBALLET EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA:

Subactividad 1.1: Caracterizar el Modelo pedagógico de Enseñanza y niveles de experiencia con los que cuenta Incolballet.

Se verificó el cumplimiento de esta subactividad por parte de INCOLBALLET, con el desarrollo, creación y análisis de una encuesta con el objetivo de identificar y analizar las prácticas pedagógicas y los enfoques educativos utilizados por los docentes de la Institución. La fuente de datos utilizada fue encuesta por censo a la población de docentes y directivos docentes de la Institución Educativa.

Para el desarrollo metodológico de la encuesta la Institución realizó el análisis de los datos recolectados para caracterizar el modelo pedagógico y niveles de experiencia de los docentes y directivos docentes, arrojando un informe técnico de la encuesta como entregable de esta subactividad.

En resumen, la subactividad de caracterización del modelo pedagógico de enseñanza y niveles de experiencia en INCOLBALLET se ha cumplido de manera efectiva, proporcionando información valiosa para la mejora continua de los procesos educativos. A continuación, adjunto evidencia del desarrollo de la encuesta.




Imagen 1 – Fuente: Creación INCOLBALLET



ENCUESTA PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL MODELO PEDAGÓGICO, ARTÍSTICO Y ACADÉMICO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO - INCOLBALLET

Objetivo: Identificar y analizar las prácticas pedagógicas y los enfoques educativos utilizados por los docentes de INCOLBALLET.

Instrucciones: Por favor, responda cada pregunta basándose en su experiencia dentro de la institución. Sus respuestas serán de gran valor para la mejora continua de nuestro modelo pedagógico.

proyectos@incolballet.com Cambiar de cuenta

No compartido

Imagen 2 – Fuente: Creación INCOLBALLET

Subactividad 1.2: Diagnosticar de manera participativa el Modelo Pedagógico con la comunidad educativa perteneciente a la institución educativa INCOLBALLET.

Dentro del ejercicio de la Supervisión, se evidenció el desarrollo del diagnóstico del Modelo Pedagógico de INCOLBALLET en colaboración con la comunidad educativa de la Institución, dejando evidencias del desarrollo de una mesa técnica de evaluación del

enfoque pedagógico actual de INCOLBALLET, espacio de trabajo que arrojó como resultado fotos, actas de reunión y la identificación de debilidades , oportunidades, fortalezas y amenazas a través de un taller de retroalimentación en el que se desarrolló una herramienta de análisis estratégico DOFA.

Se verificó que la actividad descrita anteriormente fue desarrollada por la Institución mediante la implementación de observación participativa en clases y actividades. Esta metodología permitió que recopilaran evidencia detallada sobre el seguimiento y desarrollo del modelo pedagógico actual dentro de las aulas. La observación participativa facilitó el desarrollo de discusiones y análisis profundos en torno a los hallazgos obtenidos.

Además, en conjunto con el análisis DOFA, la Institución elaboró un informe como herramienta de planificación estratégica. Este informe se utilizó para guiar la actualización de los procesos de enseñanza en la educación artística, asegurando que las estrategias propuestas respondan de manera efectiva a las necesidades identificadas durante el diagnóstico.

En resumen, la actividad de diagnóstico participativo del modelo pedagógico se cumplió de manera rigurosa y efectiva, proporcionando una base sólida para la mejora continua de los procesos educativos en Incolballet. Se anexa evidencia fotográfica del desarrollo de la mesa técnica.

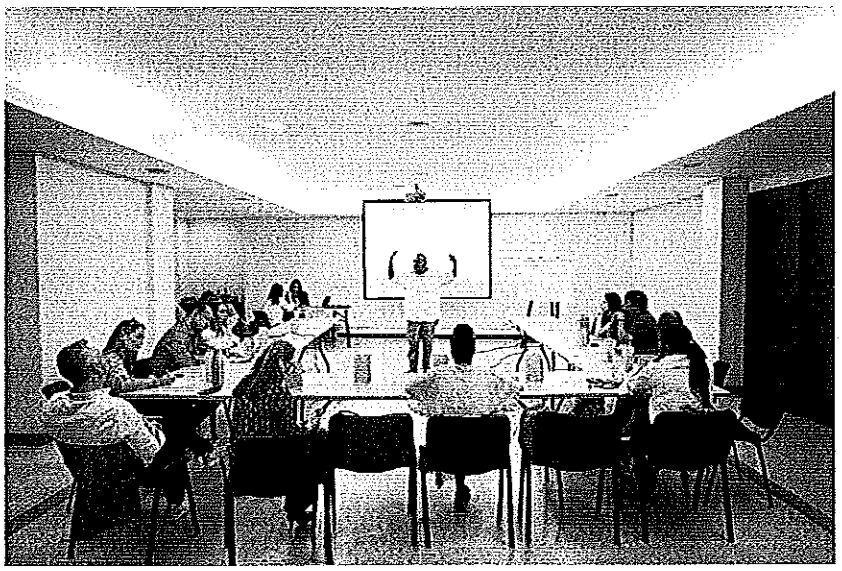


Imagen 3 – Fuente: INCOLBALLET, Mesa Técnica #1 Diagnostico modelo pedagógico.



Imagen 4 – Fuente: INCOLBALLET, Mesa Técnica #1 Diagnostico modelo pedagógico.

Subactividad 1.3 Evaluación del modelo educativo de Incolballet.

De acuerdo con las evidencias presentadas por el Instituto Colombiano de Ballet Clásico – INCOLBALLET, se puede demostrar que para el desarrollo de esta subactividad tomaron como insumo los resultados de las subactividades 1.1 Caracterizar el Modelo pedagógico de Enseñanza y niveles de experiencia con los que cuenta Incolballet y 1.2 Diagnosticar de manera participativa el Modelo Pedagógico con la comunidad educativa perteneciente a la institución educativa INCOLBALLET.

Los resultados de la encuesta dirigida a los maestros de la institución, les permitió conocer la percepción de la comunidad docente del Instituto sobre el modelo pedagógico actual proporcionándoles una visión detallada y participativa de la actualidad del proceso educativo. Por otra parte, la actividad de diagnóstico permitió la identificación de puntos de mejoras, debilidades y fortalezas del modelo pedagógico actual. Estos insumos fueron utilizados por la Institución educativa para la elaboración del informe de evaluación del modelo educativo INCOLBALLET, insumo entregable para el desarrollo de este convenio dando cumplimiento así a esta subactividad.

Subactividad 1.4 Analizar casos de éxitos y tendencias curriculares.

La subactividad 1.4 Analizar casos de éxitos y tendencias curriculares, presenta un desarrollo parcial a la fecha. El informe del análisis de estos casos de éxito se encuentra en proceso de elaboración. Actualmente, se están llevando a cabo actividades investigativas y de revisión documental con el objetivo de proporcionar un enfoque global que combine diversas perspectivas pedagógicas.

Estas actividades incluyen la recopilación y análisis de datos de instituciones similares a INCOLBALLET, tanto a nivel nacional como internacional. Se están revisando modelos pedagógicos exitosos, la finalidad es identificar las mejores prácticas y estrategias que puedan ser adaptadas y aplicadas en INCOLBALLET.

A la fecha se reportan reuniones de articulación con el Instituto de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano- FUNDANZA (Armenia-Quindío) en las cuales se evidencia transferencia de conocimiento, análisis del PEI, modelos únicos y experiencias significativas por parte de cada una de las instituciones.

Subactividad 1.5 Identificar acciones o estrategias de innovación pedagógica.

Dentro del ejercicio de supervisión se puede evidenciar que para la subactividad 1.5, INCOLBALLET hay un cumplimiento parcial, puesto que se planea el desarrollo de esta durante la segunda semana del mes octubre, dado que para el desarrollo de esta se planea el desarrollo de revisión de la literatura, el análisis de casos de éxito y la consulta con expertos en educación.

Es importante resaltar que el desarrollo de esta subactividad es de vital importancia para el proyecto dado que transformar el proceso educativo, mejora tanto el rendimiento académico como el desarrollo artístico de los estudiantes potencializando su desarrollo integral y preparándolos para enfrentar los desafíos del mundo contemporáneo.

Subactividad 1.6 Definir los ejes temáticos del Modelo Pedagógico.

El desarrollo de esta subactividad se realizará en la segunda semana del mes de octubre, dado que estos ejes representan los contenidos básicos y los núcleos estructurantes sobre los cuales se desarrolla la actualización del modelo pedagógico, se requiere de consulta con la comunidad educativa, evaluación y ajustes. El entregable de esta subactividad será la actualización del proceso de enseñanza de la institución. Esta actualización deberá incluir los ejes temáticos definidos y aprobados, además de la evidencia de la gestión realizada.

Subactividad 1.7 Construir el modelo pedagógico inicial pedagógico de Incolballet para la educación inicial, preescolar, básica y media.

El cumplimiento de esta subactividad está previsto para la tercera semana de octubre. El entregable de esta subactividad será un documento que contenga la actualización del modelo pedagógico, considerando los ámbitos desarrollados en las subactividades 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6.

Subactividad 1.8 Organizar talleres y programas de formación para los profesores, asegurando que adquieran y actualicen sus conocimientos y habilidades pedagógicas.

Para dar cumplimiento a esta subactividad el Instituto Colombiano de Ballet Clásico, tiene programado en el cronograma de ejecución del convenio, la organización de talleres y programas de formación para la última semana del mes de octubre, en la que además se realizaran talleres participativos sobre la actualización del modelo pedagógico a la comunidad docente de INCOLBALLET.

ACTIVIDAD 2. ACTUALIZAR EL MODELO PEDAGÓGICO DE INCOLBALLET PARA LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA.

En el ejercicio de supervisión de este convenio se evidencia que el cumplimiento a la actividad 2. Actualizar el modelo pedagógico de Incolballet para la educación inicial, preescolar, básica y media, iniciará desarrollo con una prueba piloto planeada para ejecutarse desde la segunda semana de octubre , hasta las primeras semanas del mes de noviembre, las actividades que se desarrollaran en el periodo de tiempo mencionado darán justificación a las subactividades 2.1,2.2,2.3,2.4 reportando a esta supervisión los avances y ajustes metodológicos, basados en los resultados de la prueba piloto que se desarrollará en la sede INCOLBALLET, Cañasgordas.

ACTIVIDAD 3. AMPLIAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN FORMAL E INFORMAL EN DANZA PARA NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON TALENTO ARTÍSTICO EN EL VALLE DEL CAUCA.

Subactividad 3.1 Implementar talleres de danza, que incluyen ballet clásico, danza contemporánea y danza folclórica, en instituciones educativas del Valle del Cauca.

El cumplimiento de esta subactividad se evidencia con la implementación de talleres de formación de danza para los estudiantes de INCOLBALLET, Cada taller tiene una preparación artística donde se implementa formación en danza, esta implementación comienza desde preescolar, preparando a los estudiantes para recibir talleres de la siguiente manera:

- Danza Clásica: Desde los 8 años.
- Danza Nacional o Contemporánea: Desde los 6 años.
- Promotores Culturales: Desde los 6 años.

INCOLBALLET cuenta con dos sedes, una sede central que abarca parte de la educación básica primaria (grados 4 y 5), básica secundaria y media técnica y la sede de Cañasgordas donde alberga a los estudiantes desde el nivel de transición hasta el grado 3 de primaria y donde se evidencia la implementación de talleres de inducción a la danza.

Subactividad 3.2 Realizar talleres dirigidos a niños y jóvenes que promuevan la creatividad a través de la improvisación y la creación coreográfica.

Se da cumplimiento a la subactividad 3.2 verificando la realización de talleres dirigidos a niños y jóvenes como recurso de descentralización del quehacer cultural de INCOLBALLET para las comunas de Santiago de Cali y en los departamentos del Valle del Cauca. Esta realización de talleres se evidencia mediante el desarrollo de 3 programas de formación dancística informal que promueve la improvisación y la creación coreográfica. A continuación, se mencionan los programas de formación que dan cumplimiento a esta actividad.

- Enseña programa de Extensión: 61 inscritos en modalidades
  - Baby Ballet
  - Ballet Iniciación
  - Danza contemporánea iniciación
  - Danza contemporánea
  - Cuerpo Vital

- Semillero Siloé – Enseña programa de extensión: 40 inscritos en modalidades:
  - Ballet iniciación
  - Danza contemporánea iniciación

- Valle ballet: clases de ballet clásico y danza: 60 inscritos
  - Ballet iniciación
  - Danza contemporánea iniciación

Subactividad 3.3 Organizar y participar en competencias y festivales de danza para estimular el espíritu competitivo y la excelencia artística.

Se verifica un cumplimiento parcial de la subactividad 3.3, INCOLBALLET hace entrega del

cronograma de funciones y competencias de la Compañía Colombiana de Ballet y la Compañía Colombiana de danza contemporánea, reportando la planeación de la participación de estas en festivales y/o competencias que facilita la evaluación y retroalimentación de los componentes artísticos y metodológicos las líneas de formación de la institución.

A continuación, se detalla el cronograma de competencias y presentaciones planeado para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024. Este cronograma deberá reportar evidencia fotografía y de participación para los próximos informes.

TABLA 1. CRONOGRAMA DE FUNCIONES – COMPAÑIAS

FECHA FUNCION	HORA	COMPAÑÍA	OBRA	LUGAR	ACTIVIDAD	# BAILARINES
25 sep	7:00 P.M.	Compañía de Danza Contemporánea	18+1 y LAK	CENTRO DE DANZA LA LICORERA	ENSAYO ABIERTO	14
27 sep	7:00 pm	Compañía Colombiana de Danza Contemporánea	18+1 y LAK	Teatro Municipal Enrique Buenaventura	Presentación artística de la compañía.	14
19 oct	7:00 pm	Compañía Colombiana de Ballet Clásico	Memorias del dorado y Exquisite Mess	Teatro Municipal Enrique Buenaventura	Presentación artística de la compañía.	23
29 oct	7:00 pm	Compañía Colombiana de Ballet Clásico	Longing	Teatro al aire libre LOS CRISTALES	Festival Internacional de Ballet	23
30 oct	7:00 pm	Compañía Colombiana de Ballet Clásico	nuestros valses	Teatro al aire libre LOS CRISTALES	Festival Internacional de Ballet	10
31 oct	7:00 pm	Compañía Colombiana de Ballet Clásico	nuestros valses	Teatro al aire libre LOS CRISTALES	Festival Internacional de Ballet	10
3 nov	7:00 om	Compañía Colombiana de Ballet Clásico	Longing/nuestros valses	gran teatro nacional sala covarrubias/teatro Marti	FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALLET DE LA HABANA CUBA	15
4 nov	7:00 p. m.	Compañía Colombiana de Ballet Clásico	Longing/nuestros valses	gran teatro nacional sala covarrubias/teatro Marti	FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALLET DE LA HABANA CUBA	15

5 nov	7:00 p. m.	Compañía Colombiana de Ballet Clásico	Longing/nuestros valses	gran teatro nacional sala covarrubias/teatro Marti	FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALLET DE LA HABANA CUBA	15
6 nov	7:00 p. m.	Compañía Colombiana de Ballet Clásico	Longing/nuestros valses	gran teatro nacional sala covarrubias/teatro Marti	FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALLET DE LA HABANA CUBA	15
7 nov	7:00 p. m.	Compañía Colombiana de Ballet Clásico	Longing/nuestros valses	gran teatro nacional sala covarrubias/teatro Marti	FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALLET DE LA HABANA CUBA	15
14 nov	12:30 PM	Compañía Colombiana de Danza contemporánea	El Ruido del Silencio.	Plazoleta San Francisco	FERIA DE LA TRANSPARENCIA	14
14 nov	7:00 PM	Compañía Colombiana de Ballet Clásico	Giselle/Segundo acto	Universidad Javeriana	presentación artística	25
16 nov	7:00 pm	Compañía Colombiana de Danza contemporánea	LA HORA AZUL	Teatro Municipal Enrique Buenaventura	Presentación artística de la compañía.	14
17 nov	Pendiente confirmar	Compañía Colombiana de Ballet Clásico	TRILOGIA	Teatro Universitario	DANZAMED	25
23 nov	7:00 p.m.	compañía Colombiana de Ballet clásico	EL CASCANUECES	Teatro Jorge Isaacs	Presentación artística de la compañía.	50
5 al 9 de dic	7:00 p.m.	compañía Colombiana de Ballet clásico	EL CASCANUECES	Teatro Julio Mario Santo domingo	Presentación artística de la compañía.	23

Fuente: INCOLBALLET

Nota: El cronograma puede estar sujeto a cambios.

Subactividad 3.4 Promover a niños, niñas y jóvenes en educación inicial, preescolar, básica y media de Incolballet.

Se verifica que el cumplimiento de esta actividad es parcial, reportando como evidencia el cronograma de funciones de la Escuela de INCOLBALLET, donde participan niños, niñas y jóvenes en educación inicial, preescolar, básica y media. La promoción de estos estudiantes se da a través de la producción, creación y reposición de obras que son representadas en espacios diseñados para que los estudiantes de la escuela tengan experiencias significativas que potencialicen su nivel técnico y artístico.

A continuación, se detalla el cronograma de obras para la promoción de niños, niñas y jóvenes en educación inicial, preescolar, básica y media de la escuela INCOLBALLET. Este cronograma está sujeto a cambios y deberá reportar evidencia fotográfica y de participación en los próximos informes.

TABLA 2. CRONOGRAMA DE FUNCIONES – ESCUELA

FECHA FUNCION	HORA	COMPAÑÍA	OBRA	LUGAR	ACTIVIDAD	# BAILARINES
3 nov	4:00 p.m.	Escuela	Domingos infantiles	Teatro Municipal Enrique Buenaventura	Presentación artística de la escuela.	20
8 nov	10:00 AM	Escuela	Región Caribe	Colegio Colombi Británico	Actividad Académica Región Caribe	12
29 nov	Pendiente por confirmar	Escuela	Por definir Obras/creación autoría docentes artísticos	Teatro Jorge Isaacs	Grados escuela	Pendiente por confirmar
30 nov	Pendiente por confirmar	Escuela	Por definir Obras/creación autoría docentes artísticos	Teatro Jorge Isaacs	Grados escuela	Pendiente por confirmar

Nota: El instituto Colombiano de Ballet Clásico INCOLBALLET presenta cronograma de actividades.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONVENIO 1.210.18.02-10705	MES 1	2	3	4
OBJ 1: Evaluar el modelo pedagógico de INCOLBALLET en los niveles de educación inicial, preescolar, básica y media				
1.1 Caracterizar el Modelo pedagógico de Enseñanza y niveles de experiencia con los que cuenta INCOLBALLET.	X			
1.2 Diagnosticar de manera participativa el Modelo Pedagógico con la comunidad educativa perteneciente a la institución educativa INCOLBALLET.	X			
1.3 Evaluación del modelo educativo de INCOLBALLET.	X			
1.4 Analizar casos de éxitos y tendencias curriculares.	X	X		

1.5 Identificar acciones o estrategias de innovación pedagógica	X	X		
1.6 Definir de los ejes temáticos del Modelo Pedagógico	X	X		
1.7 Construir el modelo pedagógico inicial pedagógico de INCOLBALLET para la educación inicial, preescolar, básica y media	X	X		
1.8 Organizar talleres y programas de formación para los profesores, asegurando que adquieran y actualicen sus conocimientos y habilidades pedagógicas.	X	X		
OBJ 2: Actualizar el modelo pedagógico de INCOLBALLET para la educación inicial, preescolar, básica y media.				
2.1 Realizar una prueba piloto del nuevo modelo en un grupo de estudiantes (plan piloto)		X	X	
2.2 Ajustar la metodología basada en los resultados del piloto.		X	X	
2.3 Desarrollar el nuevo modelo de manera gradual para facilitar la adaptación de los estudiantes y profesores.		X	X	
2.4 Realizar evaluación y monitoreo para mantener un proceso de mejora continua.		X	X	
OBJ 3: Ampliar el acceso a la educación formal e informal en danza para niños, niñas y jóvenes con talento artístico en el Valle del Cauca.				
3.1 Implementar talleres de danza, que incluyen ballet clásico, danza contemporánea y danza folclórica, en instituciones educativas del Valle del Cauca	X	X	X	X
3.2 Realizar talleres dirigidos a niños y jóvenes que promuevan la creatividad a través de la improvisación y la creación coreográfica.	X	X	X	X
3.3 Organizar y participar en competencias y festivales de danza para estimular el espíritu competitivo y la excelencia artística	X	X	X	X
3.4 Promover a niños, niñas y jóvenes en educación inicial, preescolar, básica y media de INCOLBALLET.	X	X	X	X

Con el anterior informe se da cumplimiento a la presentación del plan de trabajo, cronograma de ejecución de las actividades, y programación de actividades artísticas y culturales.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

El día 16 de septiembre de 2024, se firmó el Convenio interadministrativo No. 1.210.18.02-10705, con el INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO – INCOLBALLET Nit: 890.326.969-0, el cual tiene por objeto: *AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE COMPONEN EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET EN EL VALLE DEL CAUCA.*

El plazo previsto para la ejecución del contrato será hasta el 20 de diciembre de 2024, iniciando a partir de previos requisitos de perfeccionamiento y ejecución en la plataforma SECOP II.

Las actividades administrativas realizadas por el contratista INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO – INCOLBALLET Nit: 890.326.969-0, se ejecutaron en la ciudad de Cali, en la secretaría de Educación Departamental, piso 7.

SUPERVISIÓN: Para este período se alcanzó el 15 % de las actividades programadas.

Las obligaciones realizadas por el contratista INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO – INCOLBALLET Nit: 890.326.969-0, fueron recibidas a entera satisfacción por el Departamento del Valle del Cauca – Secretaría de Educación.

Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: El expediente contractual físico se encuentra actualizado y cumple con las normas de gestión documental y de calidad. El convenio Interadministrativo No. 1.210.18.02-10705 de 16/09/2024 está publicado en la página del SECOP II, mediante enlace: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6729558&isFromPublicArea=True&isModal=False ,cumpliendo así con el principio de publicidad de los procesos de contratación.

De igual manera se encuentra el expediente físico en las instalaciones de la Secretaría de Educación Departamental piso 7º.

Presenta las pólizas y Acta de aprobación de pólizas cumpliendo lo establecido en el contrato y la normatividad vigente: **SI APLICA**

De conformidad con el tipo de contrato (convenio interadministrativo), se hizo exigible la constitución de garantías, de conformidad con el artículo 7º. De la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3 del Decreto 1082 de 2015, a favor del Departamento del Valle del Cauca – Secretaría de Educación:

AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	10% DEL VALOR TOTAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN Y SEIS MESES MAS
PAGO DE SALARIOS	5% DEL VALOR TOTAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	IGUAL AL PLAZO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Y TRES AÑOS MAS
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	400 SMMLV	IGUAL AL PLAZO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Y UN

		AÑO MAS

NOTA: Se adjunta aprobación de garantías y verificación de las mismas.

- Cumplimiento de las obligaciones laborales: **NO APLICA**
- Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: **NO APLICA**
- Cumplimiento de las obligaciones del contratista, en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato. **SI APLICA**
- El contratista, ha cumplido con el pago oportuno de los aportes legales de parafiscales, de acuerdo con las certificaciones que se adjunta. **SI APLICA**

Conforme a la cláusula segunda que establece: RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES. INCOLBALLET y en los términos y condiciones establecidos en las Leyes y Normas sobre la materia en especial el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y la Resolución 1740 de junio 28 de 2019. Incolballet presentó certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales, suscrita por, **KAROLYNNA HERNANDEZ ORTEGA** en su condición de Director General de INCOLBALLET y MARIA AMPARO SANCHEZ contadora, certifica que la entidad realizó el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al mes de enero, febrero, marzo exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

- Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso. **SI APLICA**

El convenio 1.210.18.02-10705 está sujeto a vigilancia y control ciudadano en los términos que señala el artículo 66 de la ley 80 de 1993 modificada por la ley 1150 y la ley 850 de 2003, para lo cual el convenio interadministrativo está publicado en la página del SECOP II mediante el ID de contrato CO1.PCCNTR.6776674.

Que el objeto del contrato se ha desarrollado de acuerdo con lo establecido en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, ley 190 de 1995, ley 617 de 2000, ley 821 de 2003 y el Decreto 1082 de 2015.

El contratista INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO – INCOLBALLET Nit: 890.326.969-0, no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para ser contratado, el Contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del Artículo 32 de la Ley 80.

Que la secretaría de Educación Departamental cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal número:

DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL:

Disponibilidad No. 6000000211 23/08/2024
Disponibilidad No. 6000000212 23/08/2024
Registro presupuestal No. 70000002640 de 17.09.2024

FORMA DE PAGO:

FORMA DE DESEMBOLSO. El valor del aporte del Departamento al convenio interadministrativo es de **DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS MCTE ($2.322.000.000.OO) M/CTE.** incluido impuesto, tasas, gravámenes, contribuciones y descuentos establecidos por la Ley; el Departamento del Valle del Cauca, Secretaria de Educación, desembolsará al conveniente de acuerdo a su disponibilidad presupuestal en la siguiente forma: tres (3) desembolsos parciales previa ejecución de las actividades del proyecto así: A) Un primer desembolso sobre el valor total del convenio, es decir SETECIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS ($770.000.000) M/CTE, una vez aprobación en la plataforma del SECOP II- presentado el plan de trabajo con el cronograma de ejecución de las actividades, y previa presentación de informe de avance de ejecución de las actividades del objeto convenido avalado por el supervisor. Además de demostrar una ejecución de actividades del 15% B) Un segundo desembolso equivalente al 65% sobre el valor total del convenio, es decir, decir SETECIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS ($770.000.000) M/CTE,, previa presentación de informe de avance de ejecución de la actividades del objeto convenido avalado por el supervisor, Además de demostrar una ejecución de actividades del 65% C) Un tercer y último desembolso sobre el valor total del convenio, es decir, SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($782.000.00). previa presentación de informe de avance de ejecución de las actividades del objeto convenido avalado por el supervisor, Además de demostrar una ejecución de actividades del 100%, además del informe de avance de ejecución de actividades final consolidado y recibido a satisfacción por el supervisor.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	***Valor***	**Concepto (Anticipo, avances, pagos)**	**Fecha**	**Valor**	**Observaciones**
Valor inicial del contrato	$ 2.322.000.000				
Valor Adiciones	$0				
Reajustes	$ 0				
Actualización de precios	$ 0				
Valor Total del Contrato	$ 2.322.000.000				
Valor pagado	$ 0				
Valor causado que no se ha pagado	$770.000.000				
Valor total ejecutado	$770.000.000				
Valor saldo por ejecutar	$ 1.552.000.000				
Intereses moratorios	$ 0				

Nota: Se autoriza pago de la Factura que se adjunta al presente informe.

SEGUIMIENTO JURIDICO

Se cumplió con las disposiciones jurídica para la celebración del contrato tales como:
La Ley 80 de 1993, en el literal c numeral 4, el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del decreto 1082 de 2015 y los que se enuncien en las consideraciones del contrato.

De acuerdo a certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales suscrita por KAROLYNNA HERNANDEZ ORTEGA en su condición de Directora General de INCOLBALLET, MARIA AMPARO SANCHEZ contadora, certifica que la entidad ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

INFORME SOBRE SANCIONES

N/A

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

El convenio 1.210.18.02-10705 está sujeto a vigilancia y control ciudadano en los términos que señala el artículo 66 de la ley 80 de 1993 modificada por la ley 1150 y la ley 850 de 2003, para lo cual el convenio interadministrativo está publicado en la página del SECOP II mediante el id de contrato SECOP CO1.PCCNTR.6776674, enlace:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6729558&isFromPublicArea=True&isModal=False

Fecha del próximo informe	30	De	OCTUBRE	de	2024

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los:

PRIMER	día del mes de	OCTUBRE	de	2024

ALVARO JOSE ZULUAGA CARDONA
Cédula de ciudadanía número 6219809
Supervisor
Líder de Programa
Secretaría de Educación
