ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 4, 08/07/2024

ACTA PARCIAL N°: 1 ACTA FINAL

CONTRATO No y FECHA	No. LIC 401 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2024
TIPO DE CONTRATO	Obra
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	30 DE DICIEMBRE DE 2024
No (s) REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	1158 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
VALOR DEL CONTRATO	$1.279.545.260,00
ORIGEN DE LOS RECURSOS	Propios ( ) Regalías ( ) Tasas Retributivas ( ) Transferencia Termotasajero (X) Fondo Nacional de Regalías ( ) Convenio ( ) No _____ Cuenta especial _____
DURACIÓN DEL CONTRATO INICIAL	30 DIAS
PRORROGA 1	30 DIAS
ASISTENTES	UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024 R/L ZURISADAY PRADILLA ATUESTA Contratista UNIÓN TEMPORALINTERRESERVORIOS NORTE R/L MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA Interventor JAVIER ALEXIS BECERRA Supervisor
COBRO POR CONCEPTO DE Ó PERIODO A COBRAR	Del 05 de diciembre hasta el 30 diciembre de 2024
VALOR A COBRAR	$ 200.963.023,17
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA	15.71%
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	$ 200.963.023,17
ACTIVIDADES REALIZADAS O RESULTADOS OBTENIDOS	Localización y replanteo manual Limpieza y descapote manual 10 cm, incluye retiro Colchon de arena 5 cm

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 4, 08/07/2024

ESTADO FINANCIERO

I. VALOR CONTRATO		$ 1.279.545.260,00
I.1 Adicionales		$0,00
I.1.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 1.279.545.260,00
II.PAGOS REALIZADOS:		$0,00
III. VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		$ 200.963.023,17
IV. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 1.078.582.236,83

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
El SUPERVISOR JAVIER ALEXIS BECERRA y el INTERVENTOR UNIÓN TEMPORALINTERRESERVORIOS NORTE R/L R/L MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA del contrato hace constar, que el contratista, UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024 R/L ZURISADAY PRADILLA ATUESTA cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato correspondientes al presente pago, por lo anterior se autoriza cancelar la suma referenciada en este documento.	
No CUENTA Y ENTIDAD BANCARIA DEL CONTRATISTA	497-000091-72 CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA
FECHA: (espacio exclusivo para la Subd. Financiera)	

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024
R/L ZURISADAY PRADILLA ATUESTA
CONTRATISTA NORTE

UNIÓTEMPORALINTERRESERVORIOS NORTE
R/L MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA
INTERVENTOR

JAVIER ALEXIS BECERRA ALBARRACIN
SUPERVISOR CORPONOR

Corponor

CUADRO INFORME MENSUAL OBRA EJECUTADA

MPA-01-F-26, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO No.:	**OBRA No. LIC 401 DE 2024**		**CONTRATO No.:**	INTERVENTORIA No. CMA 412 DE 2024		**PERIODO REPORTADO**
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**		**OBJETO:**	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.	UNIÓN TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE	**DESDE:** 5/12/2024
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024		**INTERVENTOR:**	UNIÓN TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE		**HASTA:** 30/12/2024

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO						MODIFICACION			EJECUTADO		ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR ($)**	**+/-**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**
1	Localización y replanteo manual	m2	6650	$ 4.065,00	$ 27.032.250,00				6.650,00	$ 27.032.250,00	6.650,00	$ 27.032.250,00
2	Limpieza y descapote manual 10 cm, incluye retiro	m2	6650	$ 6.309,00	$ 41.954.850,00				6.650,00	$ 41.954.850,00	6.650,00	$ 41.954.850,00
3	Colchon de arena 5 cm	m3	332,5	$ 251.407,00	$ 83.592.827,50				332,50	$ 83.592.827,50	332,50	$ 83.592.827,50
4	Suministro e instalación de tanque tipo austrialiano 73100 lt	und	70	$ 11.673.799,00	$ 817.165.930,00					$ -		$ -
5	Divulgar y socializar el proyecto a la comunidad y actores involucrados	und	70	$ 24.871,00	$ 1.740.970,00					$ -		$ -
COSTO DIRECTO CONTRATO INICIAL					**$ 971.486.827,50**					**$ 152.579.928**		**$ 152.579.928**
ADMINISTRACION		20%			$ 194.297.365,50					$ 30.515.985,50		$ 30.515.985,50
IMPREVISTOS		1%			$ 9.714.868,28					$ 1.525.799,28		$ 1.525.799,28
UTILIDADES		9%			$ 87.433.814,48					$ 13.732.193,48		$ 13.732.193,48
IVA sobre utilidad		19%			$ 16.612.424,75					$ 2.609.093,76		$ 2.609.093,76
VALOR TOTAL					**$ 1.279.545.301,00**					**$ 200.963.000,00**		**$ 200.963.000,00**
PORCENTAJE DE AVANCE										**15,71%**		**15,71%**

AVANCE FÍSICO : **15,71%**

OBSERVACIONES:

ZURISADAY PRADILLA ATUESTA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024

MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
UNIÓN TEMPORALINTERRESERVORIOS NORTE

JAVIER ALEXIS BECERRA ALBARRACIN
SUPERVISOR - CORPONOR
OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS

Espacio para
Logo Corporativo

UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024
NIT 901.891.548-4
CL 8 C N 2 74 BRR BARRIO EL BOSQUE
Tel: (607) 3228507948
Cúcuta - Colombia
jaricocontabilidad@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FERE 2

Señores	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE FRONTERA NORORIENTAL		
NIT	890.505.253-4	**Teléfono**	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	AV EL BOSQUE 3 ESTE 278 CAOBOS	**Ciudad**	Cúcuta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/12/2024, 09:56
Expedición	30/12/2024, 10:10
Vencimiento	29/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COSTO DIRECTO	1.00	152,579,928.00
2	ADMINISTRACION	1.00	30,515,985.60
3	IMPREVISTOS	1.00	1,525,799.28
4	UTILIDAD	1.00	16,341,310.29

Saday Pradilla

Total items: 4

Valor en Letras:
Doscientos millones novecientos sesenta y tres mil veintitres pesos m/cte con diecisiete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-29 por $ 200,963,023.17

Total Bruto	198,353,906.40
IVA 19%	2,609,116.77
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	200,963,023.17

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084279083 aprobado en 20241127 prefijo FERE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 5c4c4b7deccb24e2a3b0037c357747963694e15b057419d95a51783638e0e05eefbc655aaebed02d451428fe671bbd38

UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024

San José de Cúcuta, 30 de diciembre de 2024

Sr. TESORERIA CORPONOR

ASUNTO: NOTA ACLARATORIA

Señores

Corporación autónoma regional de la Frontera Nororiental
CORPONOR

En mi calidad de representante legal de la UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024. YO ZURISADAY PRADILLA ATUESTA con NIT 901.891.548-4 cerífico que el cobro de la presente acta No 1 por valor de $ 200.963.023,17 del contrato LIC 401-2024 celebrado con la corporación, destinaria los recursos a inversión dentro de los municipios: ARBOLEDAS, CUCUTILLA, DURANIA, MUTISCUA, SALAZAR, SAN CAYETANO Y SILOS.

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO						ARBOLEDAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)
1	Localización y replanteo manual	m2	6650	$ 4.065,00	$ 27.032.250,00	855,00	$ 3.475.575,00
2	Limpieza y descapote manual 10 cm, incluye retiro	m2	6650	$ 6.309,00	$ 41.954.850,00	855,00	$ 5.394.195,00
3	Colchon de arena 5 cm	m3	332,5	$ 251.407,00	$ 83.592.828,00	42,75	$ 10.747.649,00
COSTO DIRECTO					**$ 971.486.828,00**		**$ 19.617.419,00**
ADMINISTRACIÓN				20%	194297365,6		3923483,8
IMPREVISTOS				1%	9714868,28		196174,19
UTILIDADES				9%	87433814,52		1765567,71
IVA sobre utilidad				19%	16612424,76		335457,8649
COSTO INDIRECTO					**$ 308.058.432,00**		**$ 6.220.684,00**
VALOR TOTAL					**$ 1.279.545.260,00**		**$ 25.838.103,00**

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO						cucutilla	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)
1	Localización y replanteo manual	m2	6650	$ 4.065,00	$ 27.032.250,00	855,00	$ 3.475.575,00
2	Limpieza y descapote manual 10 cm, incluye retiro	m2	6650	$ 6.309,00	$ 41.954.850,00	855,00	$ 5.394.195,00
3	Colchon de arena 5 cm	m3	332,5	$ 251.407,00	$ 83.592.828,00	42,75	$ 10.747.649,00
COSTO DIRECTO					**$ 971.486.828,00**		**$ 19.617.419,00**
ADMINISTRACIÓN				20%	194297365,6		3923483,8
IMPREVISTOS				1%	9714868,28		196174,19
UTILIDADES				9%	87433814,52		1765567,71
IVA sobre utilidad				19%	16612424,76		335457,8649
COSTO INDIRECTO					**$ 308.058.432,00**		**$ 6.220.684,00**
VALOR TOTAL					**$ 1.279.545.260,00**		**$ 25.838.103,00**

UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO						Durania	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)
1	Localización y replanteo manual	m2	6650	$ 4.065,00	$ 27.032.250,00	1.140,00	$ 4.634.100,00
2	Limpieza y descapote manual 10 cm, incluye retiro	m2	6650	$ 6.309,00	$ 41.954.850,00	1.140,00	$ 7.192.260,00
3	Colchon de arena 5 cm	m3	332,5	$ 251.407,00	$ 83.592.828,00	57,00	$ 14.330.199,00
COSTO DIRECTO					**$ 971.486.828,00**		**$ 26.156.559,00**
ADMINISTRACIÓN				20%	194297365,6		5231311,8
IMPREVISTOS				1%	9714868,28		261565,59
UTILIDADES				9%	87433814,52		2354090,31
IVA sobre utilidad				19%	16612424,76		447277,16
COSTO INDIRECTO					**$ 308.058.432,00**		**$ 8.294.245,00**
VALOR TOTAL					**$ 1.279.545.260,00**		**$ 34.450.804,00**

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO						Mutiscua	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)
1	Localización y replanteo manual	m2	6650	$ 4.065,00	$ 27.032.250,00	1.235,00	$ 5.020.275,00
2	Limpieza y descapote manual 10 cm, incluye retiro	m2	6650	$ 6.309,00	$ 41.954.850,00	1.235,00	$ 7.791.615,00
3	Colchon de arena 5 cm	m3	332,5	$ 251.407,00	$ 83.592.828,00	61,75	$ 15.524.382,00
COSTO DIRECTO					**$ 971.486.828,00**		**$ 28.336.272,00**
ADMINISTRACIÓN				20%	194297365,6		5667254,4
IMPREVISTOS				1%	9714868,28		283362,72
UTILIDADES				9%	87433814,52		2550264,48
IVA sobre utilidad				19%	16612424,76		484550,25
COSTO INDIRECTO					**$ 308.058.432,00**		**$ 8.985.432,17**
VALOR TOTAL					**$ 1.279.545.260,00**		**$ 37.321.704,17**

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO						salazar	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)
1	Localización y replanteo manual	m2	6650	$ 4.065,00	$ 27.032.250,00	855,00	$ 3.475.575,00
2	Limpieza y descapote manual 10 cm, incluye retiro	m2	6650	$ 6.309,00	$ 41.954.850,00	855,00	$ 5.394.195,00
3	Colchon de arena 5 cm	m3	332,5	$ 251.407,00	$ 83.592.828,00	42,75	$ 10.747.649,00
COSTO DIRECTO					**$ 971.486.828,00**		**$ 19.617.419,00**
ADMINISTRACIÓN				20%	194297365,6		3923483,8
IMPREVISTOS				1%	9714868,28		196174,19
UTILIDADES				9%	87433814,52		1765567,71
IVA sobre utilidad				19%	16612424,76		335457,8649
COSTO INDIRECTO					**$ 308.058.432,00**		**$ 6.220.684,00**
VALOR TOTAL					**$ 1.279.545.260,00**		**$ 25.838.103,00**

UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO						san cayetano	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)
1	Localización y replanteo manual	m2	6650	$ 4.065,00	$ 27.032.250,00	855,00	$ 3.475.575,00
2	Limpieza y descapote manual 10 cm, incluye retiro	m2	6650	$ 6.309,00	$ 41.954.850,00	855,00	$ 5.394.195,00
3	Colchon de arena 5 cm	m3	332,5	$ 251.407,00	$ 83.592.828,00	42,75	$ 10.747.649,00
COSTO DIRECTO					**$ 971.486.828,00**		**$ 19.617.419,00**
ADMINISTRACIÓN				20%	194297365,6		3923483,8
IMPREVISTOS				1%	9714868,28		196174,19
UTILIDADES				9%	87433814,52		1765567,71
IVA sobre utilidad				19%	16612424,76		335457,8649
COSTO INDIRECTO					**$ 308.058.432,00**		**$ 6.220.684,00**
VALOR TOTAL					**$ 1.279.545.260,00**		**$ 25.838.103,00**

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO						silos	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)
1	Localización y replanteo manual	m2	6650	$ 4.065,00	$ 27.032.250,00	855,00	$ 3.475.575,00
2	Limpieza y descapote manual 10 cm, incluye retiro	m2	6650	$ 6.309,00	$ 41.954.850,00	855,00	$ 5.394.195,00
3	Colchon de arena 5 cm	m3	332,5	$ 251.407,00	$ 83.592.828,00	42,75	$ 10.747.649,00
COSTO DIRECTO					**$ 971.486.828,00**		**$ 19.617.419,00**
ADMINISTRACIÓN				20%	194297365,6		3923483,8
IMPREVISTOS				1%	9714868,28		196174,19
UTILIDADES				9%	87433814,52		1765567,71
IVA sobre utilidad				19%	16612424,76		335457,8649
COSTO INDIRECTO					**$ 308.058.432,00**		**$ 6.220.684,00**
VALOR TOTAL					**$ 1.279.545.260,00**		**$ 25.838.103,00**

ZURISADAY PRADILLA ATUESTA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024

UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024

San José de Cúcuta, 30 de diciembre de 2024

Señores
Corporación autónoma regional de la Frontera Nororiental
CORPONOR

Asunto: Declaración y Pago de Seguridad Social y Parafiscales

En mi calidad de Representante legal de la UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024, certifico bajo la gravedad de juramento que se han efectuado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales (si aplica) exigidos por la ley y nos encontramos al día a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes, el periodo del 5 al 30 de diciembre de 2024, los documentos soportes (planillas) de los pagos de aportes obligatorios al sistema general de seguridad social en salud, pensión y ARL (Riesgos laborales) y Parafiscales (si aplica), del contrato de obra LIC 401-2024.

Saday Pradilla

UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024
R/L ZURISADAY PRADILLA ATUESTA
CC. 1. 0 9 3. 7 8 3. 0 1 5
CL 8 CN # 2 - 74 BRR EL BOSQUE
Contabilidadingesap2023@gmail.com
Cúcuta

Adjunto: Planillas de pago de seguridad social

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901891548	4	UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UT RESERVORIOS DEL NORTE	CLL 8CN # 2-74 EL BOSQUE	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5772577	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	79608272	9479608272	E	2025/01/14	2024/12/30	BANCO AV VILLAS	0	$1,542,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	60448600	AVELLA VILLAMIZAR DIANA PATRICIA	230301	26	$1,126,667	$180,300	EPS005	26	$1,126,667	$140,900	CCF37	26	$1,126,667	$45,100	14-11	26	$1,126,667	$78,500	26	$1,126,667	$56,500
2	CC	1094348026	CUADROS CUBILLA LIBARDO ANDRES	230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS037	28	$1,213,334	$151,700	CCF37	28	$1,213,334	$48,600	14-11	28	$1,213,334	$84,500	28	$1,213,334	$60,800
3	CC	88211813	VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE	230301	26	$1,126,667	$180,300	EPS005	26	$1,126,667	$140,900	CCF37	26	$1,126,667	$45,100	14-11	26	$1,126,667	$78,500	26	$1,126,667	$56,500
Total	**Afiliados(3)**					**$3,466,668**	**$554,800**			**$3,466,668**	**$433,500**			**$3,466,668**	**$138,800**			**$3,466,668**	**$241,500**		**$3,466,668**	**$173,800**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$554,800	$0	$0	$554,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$554,800	$0	$0	$554,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$241,500	$0	$0	$241,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$241,500	$0	$0	$241,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$138,800	$0	$0	$138,800
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	3	$138,800	$0	$0	$138,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$433,500	$0	$0	$433,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$151,700	$0	$0	$151,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$281,800	$0	$0	$281,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$104,300	$0	$0	$104,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$104,300	$0	$0	$104,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$69,500	$0	$0	$69,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$69,500	$0	$0	$69,500
TOTAL				3	$1,542,400	$0	$0	$1,542,400

2024/12/30 08:51 AM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que INGESAP INGENIERIA Y PROYECTOS SAS identificado(a) con NI 901275996 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ZURISADAY PRADILLA ATUESTA identificado(a) con CC 1093783015

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9479375192	1148018529	E	2024-12-23	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30																		$1,300,000	4%	$52,000
9479375192	1148018529	E	2024-12-23	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$1,300,000	16%	$208,000
9479375192	1148018529	E	2024-12-23	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-12	30																		$1,300,000		$0
9479375192	1148018529	E	2024-12-23	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-12	30																		$1,300,000		$0
9479375192	1148018529	E	2024-12-23	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-12	30																		$0	0%	$0
9479375192	1148018529	E	2024-12-23	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-12	30																		$0	0%	$0
9479375192	1148018529	E	2024-12-23	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$1,300,000	6.96%	$90,500
9479375192	1148018529	E	2024-12-23	CCF	CCF36	COMFAORIENTE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$1,300,000	4%	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-12-30 a las 07:54.

Certificación Bancaria

Bancolombia

CUCUTA, 26 de noviembre de 2024

Señor(a)

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informa que **UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024**identificado (a) con **NIT 901891548** a fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos, con buen manejo:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha de apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	497-000091-72	2024/11/26	ACTIVA

Atentamente,
Claudia María Posada Álvarez
Gerente Transformación de Sucursales

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Scanned with CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 2 5 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario 141145155157

(415)7707212489984(8020) 000014114515515 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 1 5 4 8	4	Impuestos de Cúcuta 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1

41. Dirección principal
CL 8 CN # 2 - 74 BRR EL BOSQUE

42. Correo electrónico contabilidadingesap2023@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 8 5 0 7 9 4 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 4 1 0 2 4							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	4	8	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 11 - 22 / 10 : 32: 26

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PRADILLA ATUESTA ZURISADAY

985. Cargo Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141145155157

(415)7707212489984(8020) **000014114515515 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 1 5 4 8	4	Impuestos de Cúcuta	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 1 0 2 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 1 0 2 4	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	5 4	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 1 0 2 4	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 4 1 1 2 2		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141145155157

(415)7707212489984(8020) **000014114515515 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 1 5 4 8	4	Impuestos de Cúcuta	7

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 1 0 2 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 9 3 7 8 3 0 1 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PRADILLA	ATUESTA	ZURISADAY	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141145155157

(415)7707212489984(8020) **000014114515515 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 1 5 4 8	4	Impuestos de Cúcuta	7

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 2 7 5 9 9 6	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGESAP INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	7 4	2 0 2 4 1 0 2 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 2 4 7 9 6 1	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA MATICCES P & B LTDA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 5	2 0 2 4 1 0 2 4	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 3 2 6 7 6 3 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PEREZ	AMADOR	EUSEBIO	RAFAEL

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1	2 0 2 4 1 0 2 4	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5


111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DE OBRA
Desde el 5 hasta el 30 de diciembre de 2024

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

1. ANTECEDENTES

1.1. GENERALIDADES

El efecto climático depende de la época del año en que se representa el fenómeno y el impacto socioeconómico esta más relacionado con las vulnerabilidades de los recursos naturales y de las diferentes actividades y regiones del país, así como de los sectores productivos nacionales y locales.


La sequía como un efecto del fenómeno del cambio climático ha estado afectado al sector agropecuario del Norte de Santander, donde se ha presentado grandes mermas económicas por la pérdida de cultivos, la muerte de peces, ganado en general, por la disminución considerable de los caudales de los ríos, quebradas, nacientes y por el uso restringido del agua solo para consumo humano. Esta problemática de escasez de agua ha generado el incremento de la pobreza en el sector rural y el incremento de los desplazamientos de los campesinos a la ciudad en busca de mejores opciones de vida.

Al anterior escenario se suma la variación climática representada en la alteración de las temporadas de lluvia en la región, con déficit o excesos de lluvia en algunos casos, redundando en el caso del déficit en una menor disponibilidad de agua tanto superficial como subterránea, para uso en consumo humano agropecuario e industrial entre otros.

En el caso del evento del niño en Colombia, periódicamente, el calentamiento del océano pacifico tiene efectos en las dinámicas atmosféricas, representadas en aumento de temperatura y disminución de lluvias, los efectos de este fenómeno natural son notables en nuestro país, particularmente en el norte de la región pacifica, los departamentos de la región Andina y en los departamentos de la región Caribe. Este fenómeno repercute negativamente en el sector agropecuario: variaciones en el rendimiento de algunos cultivos, diminución del caudal de los ríos, incremento en el riesgo de incendios forestales y posibles racionamientos de agua, tanto para riego, consumo animal y humano.

Como parte de esta estrategia de preparación para prevenir y atender las emergencias ocasionadas por la llegada del fenómeno, la corporación, a fin de prever acciones que permitan hacer frente oportunamente a este fenómeno natural, en su plan de acción incorpora proyectos que permitan enfocar esfuerzos en los municipios de su jurisdicción vulnerables a sufrir desabastecimiento de agua, afectaciones por sequía, incendios forestales, entre otros.

En virtud de lo anterior, la Corporación Autónoma Regional De La Frontera Nororiental – CORPONOR viene implementando el proyecto de construcción de reservorios como una



estrategia orientada al almacenamiento de agua para uso agropecuario principalmente, permitiéndole al campesino contar con un volumen de agua disponible para ser utilizado en periodos de déficit de lluvias.

El reservorio se constituye en un elemento en un elemento estructural destinado al almacenamiento de agua, convirtiéndose en un medio de mitigación en el evento de escasez en la región. Esta estructura permite almacena agua que se acumula producto de la escorrentía y la que fluye por la superficie del terreno, para que sea directamente disponible en uso agrícola y pecuario. El proyecto surge como una alternativa a la comunidad rural que se encuentra limitada en la sostenibilidad de las áreas siembra y pecuario en la obtención de eficiencia a la hora de regar el área ya cultivada y para el abrevadero de animales, ya que el caudal que se puede captar de fuentes superficiales posiblemente sea insuficiente y con limitaciones en cuanto a su uso, por situaciones climáticas de disminución de lluvias y reducción de nivel en los acuíferos.

La construcción de reservorios permitirá contar con una alternativa de disponibilidad de agua, por medio de una estructura que almacene agua producto de la escorrentía superficial o almacenar aquella que normalmente no se utiliza durante las horas de la noche.

Algunos beneficios identificados con el proyecto son:


- Contar con un elemento estructural que permita almacenar agua de escorrentía para uso múltiple
- Realizar un uso eficiente y ahorro del agua
- Mantener reserva de agua para enfrentar periodos de déficit de lluvias
- Disponibilidad de agua para uso en riego, abrevadero de animales y piscicultura

El objeto de general del proyecto corresponde al adelantar esfuerzos en el desarrollo de las obras que permitan contribuir a la reducción de los efectos negativos del cambio climático en el sector rural del departamento Norte de Santander, en especial en ellos municipios de la cuenca media- alta de rio Zulia, a través de la construcción de reservorios para almacenamiento de agua.

La utilización de reservorios para almacenar agua de escorrentía permitirá mantener un depósito alternativo que supla requerimientos de riego y abrevadero de animales en periodos de déficit de lluvias, ayudando a reducir el uso intensivo de aguas superficiales y subterráneas, a la vez que facilita el aumento de producción agrícola, mediante la implementación de nuevas áreas de cultivos que utilicen el riego tecnificado.

Es importante destacar que “un reservorio no dará más agua” sino que permitirá que su uso sea de manera estratégica, eficiente y para aprovecharla en momentos críticos.

Dando cumplimiento con su objeto ambiental, la corporación plantea adelantar acciones encaminadas a enfrentar el cambio climático, en especial en lo referente a medidas de solución para mitigar el déficit de agua producto de la disminución de las precipitaciones, ofreciendo soluciones individuales a las familias ubicadas en zonas rural dispersa a través de la adecuación reservorios para el almacenamiento de agua de uso múltiple, minimizando efectos generados por la deficiencias en la disponibilidad de agua para riego y pecuario.



En atención a lo expuso CORPONOR proyecta la construcción de SETENTA (70) reservorios en la zona rural dispersa de los municipios de Mutiscua, Silos, Cucutilla, Arboledas, Durania, Salazar y San Cayetano, como un proyecto orientado a mantener un volumen de agua que supla requerimientos de riego y abrevadero de animales en periodos de déficit de lluvias, ayudando a reducir el uso intensivo de aguas superficiales y subterráneas a la vez que facilita el aumento de producción agropecuaria.

1.2 ALCANCES DEL PROYECTO




Imagen 1. Tipo de Reservorio Australiano

A continuación, se describen las actividades contempladas:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.1	Localización y replanteo, manual	M2	95
1.2	Limpieza, descapote y adecuación del terreno, incluye distribución de sobrantes de excavación.	M2	95
1.3	Colchon de arena de 5cm	M3	4.75
1.4	Suministrio instalación de kit tanque de geomembrana PVC reforzada, lamina metálica cal 40 mls de diámetro 9.40 metros y 1.10m de alto, incluye tornillería, válvula de 3” y manguera de polietileno 1” (100m)	UND	1
1.5	Divulgar y socializar el proyecto a la comunidad y actores involucrados.	UND	1

El reservorio tendrá un diámetro de 9.40 metros por 1.10 metros de altura (aprox 70m3 de capacidad). Se suministrará un rollo de manguera (100m) de polietileno de 1” de diámetro para ser adecuada a la salida del reservorio. Estará compuesto por laminas de acero galvanizado calibre 18 (1.23mm), el cual deberá cumplir con los requerimientos de la norma NTC 4011. Cumpliendo con las normas:



- Norma técnica colombiana – NTC 4011-2021 – productos planos de acero recubierto con zinc (galvanizado) o recubiertos con aleación de hierro zinc (galvannealed) mediante procesos de inmersión en caliente
- Norma técnica colombiana – NTC 1685 – Metales no forrosos, laminas y chapas de aluminio y de aleaciones de Aluminio, ASTM – A1011, A653.
- Internamente el tanque estará recubierto por una geomembrana en PVC reforzada, como recubrimiento o barrera de permeabilidad
- Los accesorios de instalación se conforman por tornillos de acero galvanizado, con cabeza hexagonal. Incluye también un flanche en acero y sus pernos para hacer el anclaje y válvula pvc de 3”.
- Preparación del sitio de instalación del tanque reservorio tipo australiano en geomembrana PVC reforzada: el área de ubicación del tanque tiene que ser una superficie por lo menos de 2 metros mayor al diámetro del tanque.

Ejecución de los trabajos

Las actividades abarcan labores como preparación del terreno, instalación de la estructura, la excavación de las trincheras de drenaje y colocación del revestimiento.

Selección del lugar

Se debe seleccionar un lugar entre 1 a 2 metros mas grande que el diámetro del tanque: si es un tanque de diámetro, se debe de hacer terraplén a 10.5 metros de diámetros. Las condiciones de instalación del terreno que se escoja no deben de superar los 0.5 grados de desnivel, en ninguna dirección del terreno que se trabajó.


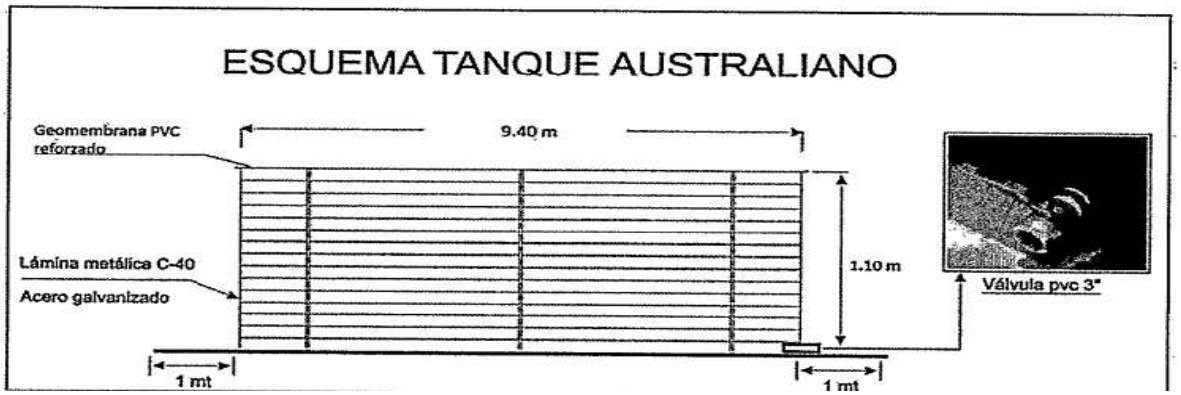


Imagen 2. Sección corte tanque – reservorio

Preparación del terreno

La superficie sobre la cual se va a construir el reservorio debe estar debidamente perfilada y nivelada. Es fundamental limpiar la superficie retirando troncos, piedras y cualquier elemento suelto o con aristas agudas o filadas que dificulte el contacto de la estructura con el suelo o que lo pueda punzonar o rasgar.



Localización

Los tanques deberán ser construidos en lugares elevados para alimentar por gravedad a los sistemas de riego y bebederos de los animales.
Después de haber seleccionado el terreno, se debe descapotar la maleza, pasto. Se coloca una estaca en la mitad del terreno y con una cuerda mide el radio del tanque (la mitad de su diámetro). Se recomienda dejar un pasillo o corredor, por donde se va a transitar.

Trazar la circunferencia

Medir y marcar la circunferencia del tanque, utilizando una cuerda para guiar una marca como eje compas y la cuerda debe tener el lado de igual a la longitud del área del tanque y con este se genera una marca fácilmente visible en el suelo.

Trazar la circunferencia

Medir y marcar la circunferencia del tanque, utilizando una cuerda para guiar una marca como eje compas y la cuerda debe de tener el lardo de igual a la longitud del área del tanque y con este se genera una marca fácilmente visible en el suelo.

Excavación del fondo

Cuando van equipados con un acople a tubería en la parte central del piso, este sirve para insertar la tubería de drenaje. Para direccionar el agua por gravedad hacia este drenaje, el terreno debe tener una inclinación, por lo tanto, se debe excavar un cono con una inclinación de 25cm en el centro.

Excavar zanja de drenaje

Para la inclinación de la tubería se debe realizar una zanja que permita enterrarla para que el sistema funcione por gravedad; las dimensiones de la zanja varían según el diámetro del tubo, regularmente es entre 2 a 3 pulgadas; requiriéndose de al menos 25 centímetros de profundo x 25cm de ancho


Ensamble de las laminas

Para el ensamble de las láminas metálicas, debe colocarse la cabeza de los tornillos en el lado interno del tanque. Por su parte, las tuercas y arandelas van en el lado externo.

Instalación de tunería de drenaje

Se debe utilizar una batería adecuada para el diámetro del acople del fondo del tanque, esta debe tener un codo de 90° que una sección vertical con la horizontal del tubo.
El tubo debe sobre salir del suelo al menos 5 cm para permitir realizar el acople del fondo del tanque. Una vez instalado el tubo de drenaje, tape la zanja, con el mismo material.

Conformación estructura del reservorio



Una vez se tiene la zanja a nivel a lo largo de esta se distribuyen las laminas que forman el anillo, luego se empalman las láminas. Posteriormente se colocan sus respectivos tornillos, arandelas de neopreno y tuercas, dejando los flojos sin apretar. Posteriormente se procede al ajuste final de los tornillos, comenzando el apretado de los tornillos desde el centro hacia los extremos de la doble hilera. Una vez conformada la estructura metálica se procede a instalar el geotextil impermeable, para garantizar que no vaya a haber perdidas o infiltraciones del liquido a contener.

El alcance del proyecto está en las obras a desarrollar en las siguientes actividades:

- Divulgar y socializar a la comunidad y actores involucrados


- Construir setenta (70) reservorios tipo australiano para el almacenamiento de agua en la zona rural dispersa de los municipios de Mutiscua, silos, cucutilla, Arboledas, Salazar, San Cayetano y Durania, cuenca hidrográfica del rio zulia, según diseños entregados por CORPONOR, con una capacidad de 70m3 de almacenamiento de agua.

- Los reservorios para el almacenamiento de agua tendrán las siguientes características:
- Corresponderá as un tanque australiano con un diámetro de 9.40 metros por 1.10 metros de altura (aprox70m3 de capacidad), que estará compuesto por laminas de acero galvanizada calibre 18(1.23mm), el cual deberá cumplir con los requerimientos de la NTC 4011. Accesorios de instalación que se conforman por tornillos de acero galvanizado, con cabeza hexagonal, con un flanche en acero y sus pernos para hacer el anclaje. Cuenta con una válvula PVC de 3” para la conexión con la tubería de descarga de agua. Internamente el tanque estará recubierto por una geomembrana PVC reforzada como recubrimiento o barrera de permeabilidad.

- Las actividades contemplan el suministro e instalación del reservorio compuesto por el tanque australiano, donde para su instalación se requiere realizar la limpieza y nivelación del terreno, la ejecución de 95 m2 de localización y replanteo del área donde se establecerá el reservorio y el transporte del material, personal de instalación y profesional de socialización y capacitación. Se suministrará un rollo de manguera (100m) de polietileno de 1” de diámetro para ser adecuada a la salida del reservorio.

- Se contempla el transporte de todos los materiales requeridos para su construcción desde la ciudad de Cúcuta hasta cada uno de los puntos de instalación donde se construirán los reservorios localizados en los municipios de Mutiscua, Silos, Cucutilla, Arboledas, Salazar, San Cayetano y Durania, en predios previamente seleccionados por las alcaldías locales, hasta los cuales deberán existir vías de acceso.

- La construcción de los setenta (70) reservorios para el almacenamiento de agua, será acorde con las especificaciones técnicas.



1.3 LOCALIZACION DEL PROYECTO


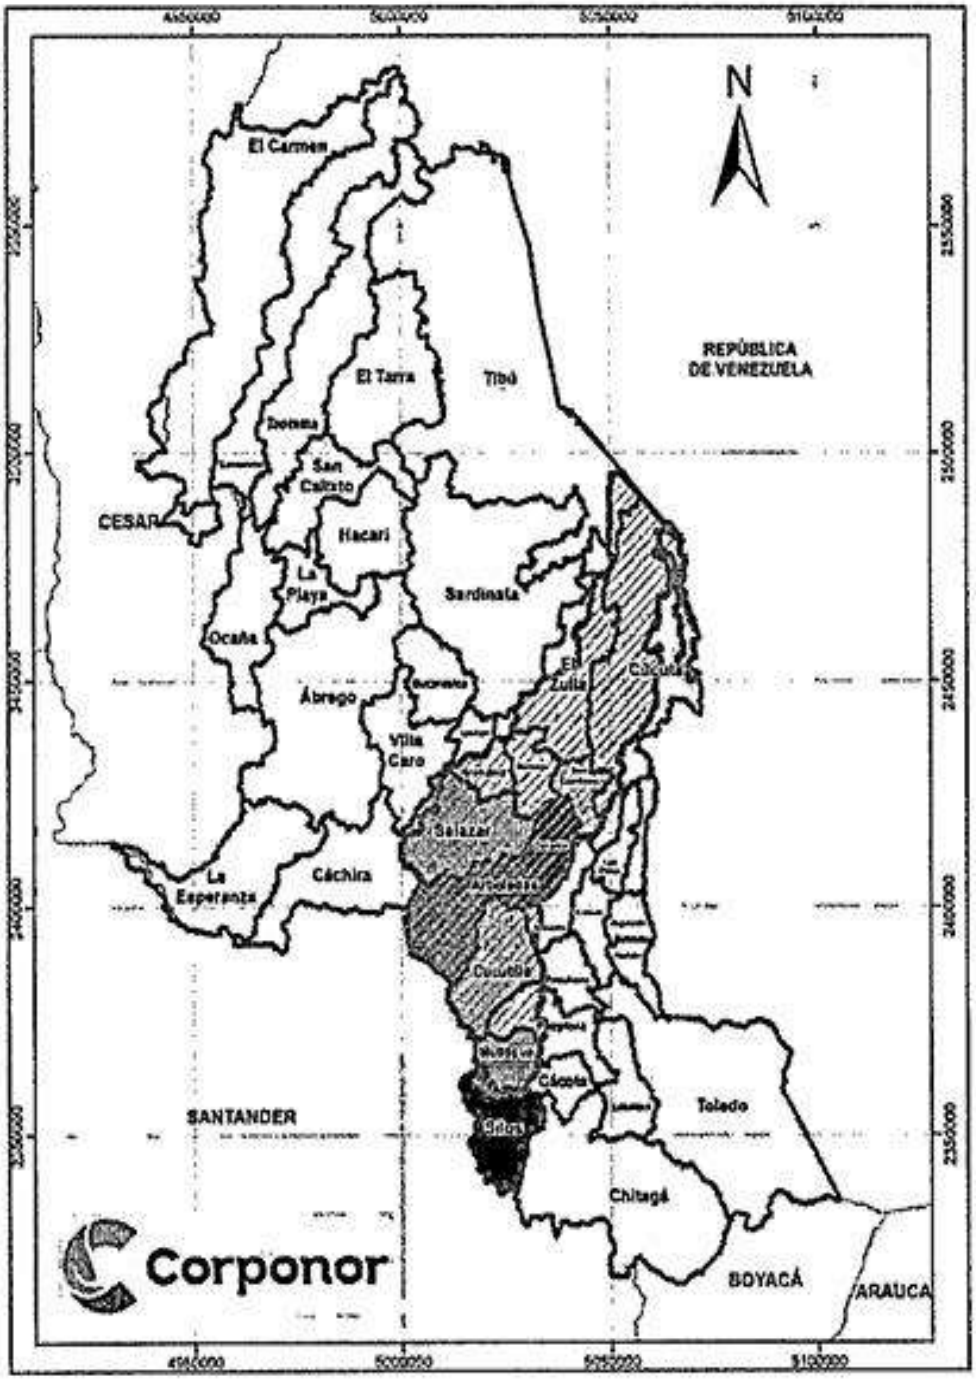


Imagen No.3 Mapa político Norte de Santander y localización municipios que hacen parte del proyecto
Fuente: CORPONOR



1.4 POBLACION BENEFICIADA

El presente proyecto se plantea desarrollar en los municipios de:


Municipio	Cuenca	No. De reservorios
Santo domingo de silos	Rio Zulia	9
Mutiscua		13
Cucutilla		9
Arboledas		9
Salazar de las palmas		9
Durania		12
San Cayetano		9

El municipio de santo domingo de silos se encuentra localizado a 123km de Cúcuta, temperatura promedio mensual anual corresponde a 12.1 °C y a una altura de 2.845 metros sobre el nivel del mar, siendo el municipio más alto de Norte de Santander. Gran parte del municipio forma parte del páramo de Santurbán, fuente hídrica para Santander y norte de Santander una característica sobresaliente de su posición geográfica es la ubicación en el llamado Nudo de Santurbán sobre la cordillera oriental, lo que le permite poseer una gran extensión de paramos y una oferta hídrica que constituye a las cuencas del zulia y Orinoco. Municipio de Mutiscua se encuentra ubicado en la subregión suroccidental del departamento norte de Santander, su cabecera municipal dista de la capital del departamento en 102Km

2. CONDICIONES CONTRACTUALES

2.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA No. LIC 401 DE 2024

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
TIPO DE CONTRATO	OBRA LIC-401 - 2024
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	24 DE NOVIEMBRE DE 2024
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	1158 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2024
ENTIDAD CONTRATANTE	CORPONOR
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024
OBJETO	**CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**
VALOR DEL CONTRATO	$1.279.545.260,00
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL CONTRATADO	$1.279.545.260,00
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	1 MES



PLAZO DE EJECUCION ADICIONAL	1 MES
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	2 MESES
FECHA DE INICIO	5 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	4 DE FEBRERO DEL 2025

2.2 PLAZO CONTRACTUAL

Con relación al plazo contractual, es de un (1) mes que corresponde a 31 días calendario, más 1 (mes) adicionales para un total de dos (2) meses que corresponde a 62 días.


2.3 RELACIÓN DE POLIZAS SUSCRITAS INICIALES

CONTRATO DE OBRA No. LIC 401 DE 2024			
ASEGURADORA:	Aseguradora solidaria de Colombia	**POLIZA No.:**	460 47 994000080967 Anexo 0
FECHA DE EXPEDICION:		**FECHA DE APROBACION:**	26/11/2024
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	25/11/2024	25/04/2025	127,954,526.00
PRESTACIONES SOCIALES	25/11/2024	25/12/2027	63,977,263.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	VER NOTA ACLARATORIA		383,863,578.00

ASEGURADORA:	Aseguradora solidaria de Colombia	**POLIZA No.:**	460 74 994000008097 Anexo 0
FECHA DE EXPEDICION:	26/11/2024	**FECHA DE APROBACION:**	26/11/2024
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS RCE PATRONAL VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	25/11/2024	25/12/2024	260,000,000.00

***** NOTA ACLARATORIA *****
EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

Anexo *de pólizas iniciales contrato de obra.*




CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 - 2024			
ASEGURADORA:	Aseguradora solidaria de Colombia	**POLIZA No.:**	460 47 994000080967 Anexo 1
FECHA DE EXPEDICION:	11/12/2024	**FECHA DE APROBACION:**	12/12/2024
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	05/12/2024	05/05/2025	127,954,526.00
PRESTACIONES SOCIALES	05/12/2024	05/01/2028	63,977,263.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	VER NOTA ACLARATORIA		383,863,578.00

ASEGURADORA:	Aseguradora solidaria de Colombia	**POLIZA No.:**	460 74 994000008097 Anexo 1
FECHA DE EXPEDICION:	11/12/2024	**FECHA DE APROBACION:**	11/12/2024
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS RCE PATRONAL VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	25/12/2024	05/01/2025	260,000,000.00

ASEGURADORA:	Aseguradora solidaria de Colombia	**POLIZA No.:**	460 74 994000008097 Anexo 2
FECHA DE EXPEDICION:	11/12/2024	**FECHA DE APROBACION:**	11/12/2024
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS RCE PATRONAL VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	5/12/2024	05/01/2025	260,000,000.00

2.3.1 RELACIÓN DE POLIZAS SUSCRITAS POR ADICION Y/O REINICIO

CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 - 2024			
ASEGURADORA:	Aseguradora solidaria de Colombia	**POLIZA No.:**	460 47 994000080967 Anexo 2
FECHA DE EXPEDICION:	28/12/2024	**FECHA DE APROBACION:**	12/12/2024
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	05/12/2024	03/06/2025	127,954,526.00
PRESTACIONES SOCIALES	05/12/2024	03/02/2028	63,977,263.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	VER NOTA ACLARATORIA		383,863,578.00



ASEGURADORA:	Aseguradora solidaria de Colombia	**POLIZA No.:**	460 74 994000008097 Anexo 3
FECHA DE EXPEDICION:	28/12/2024	**FECHA DE APROBACION:**	28/12/2024
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS RCE PATRONAL VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	05/01/2025	03/02/2025	260,000,000.00

ASEGURADORA:	Aseguradora solidaria de Colombia	**POLIZA No.:**	460 74 994000008097 Anexo 4
FECHA DE EXPEDICION:	28/12/2024	**FECHA DE APROBACION:**	28/12/2024
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS RCE PATRONAL VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	05/12/2024	03/02/2025	260,000,000.00

***** NOTA ACLARATORIA *****


EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA

SE REALIZA EL PRESENTE ANEXO SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 05/12/2024.

Anexo *de pólizas actualizadas contrato de obra.*

2.4 ACTIVIDADES CONTRACTUALES A EJECUTAR

Las actividades cantidades de obra a desarrollas según contrato inicial, adiciones y/o modificaciones:




CONTRATO INICIAL						ADICIÓN O MODIFICACIÓN			TOTAL CONTRATADO	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR. UNITARIO**	**V/R PARCIAL**	**+/-**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**V/R PARCIAL**
1	Localización y replanteo manual	m2	95	**$ 4065,00**	**$ 386.175,00**				95	**$ 386.175,00**
2	Limpieza y descapote		95	$6309,00	$599.355,00				95	$599.355,00
3	Colchón de arena 5 cm	m2	4.75	$ 251.407,00	$ 1.194.183,00				4.75	$ 1.194.183,00
4	Suministro e instalación de tanque tipo australiano 73100 lt	UND	1	11.673.799,00	$11.673.799,00				1	$11.673.799,00
5	Divulgar y socializar el proyecto a la comunidad y actores involucrados	UND	1	$ 24.871,00	$24.871,00				1	$24.871,00
TOTAL, COSTOS DIRECTOS					**$13.878.383,00**			**$**		**$13.878.383,00**
ADMINISTRACION 20%					$ 2.775.676,60					$ 2.775.676,60
IMPREVISTOS 1%					$ 138.783,83					$ 138.783,83
UTILIDAD 9%					$ 1.249.054,47					$ 1.249.054,47
IVA 19%					$ 237.320,35					$ 237.320,35
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$4.400.835,00**			**$**		**$4.400.835,00**
COSTO TOTAL OBRAS					**$18.279.218,00**			**$**		**$18.279.218,00**
TOTAL, COSTO DE OBRA 70 RESERVORIOS					**$ 1.279.545.260,00**					**$ 1.279.545.260,00**

2.4.1 ACTAS SUSCRITAS

DESCRIPCION	**FECHA**
***CONTRATO DE OBRA* No. LIC-401 - 2024**	
ACTA DE INICIO	5/12/2024
ACTA DE PRÓRROGA	27/12/2024
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01	30/12/2024

Anexo. *Actas suscritas en el periodo del informe con su respectivo registro fotográfico (suspensión, modificación y reinicio)*



3 CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS DE EJECUCION

Con relación al plazo contractual, han transcurrido veinte seis (26) días calendario desde la suscripción del acta de inicio.

Cumplimiento de los tiempos de ejecución: **15.71%**

Corponor

ANEXO 1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE FONDOS

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024



CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 - 2024				CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CMA412 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER					DESDE:	5/12/2024
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024	SUPERVISOR:	JAVIER ALEXIS BECERRA ALBARRACIN	INFORME No.	1	HASTA:	30/12/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	MES No. 1 05/12/2024 - 30/12/2024 DIAS	MES No. 1 CANT	MES No. 1 V. TOTAL	ACUMULADO DIAS	ACUMULADO CANT	ACUMULADO V. TOTAL	PORCENTAJE EJECUTADO
1	Localización y replanteo manual	m2	6650	$ 4.065,00	$ 27.032.250,00	12,00	6650,00	$ 27.032.250,00	12	6650	$ 27.032.250,00	100%
						12,00	6650,00	$ 27.032.250,00	12	6650	$ 27.032.250,00	
2	Limpieza y descapote	m2	6650	$ 6.309,00	$ 41.954.850,00	16,00	6650,00	$ 41.954.850,00	16	6650	$ 41.954.850,00	100%
						16,00	6650,00	$ 41.954.850,00	16	6650	$ 41.954.850,00	
3	Colchón de arena 5 cm	m3	332,5	$ 251.407,00	$ 83.592.828,00	13,00	332,50	$ 83.592.828,00	13	333	$ 83.592.828,00	100%
						13,00	332,50	$ 83.592.828,00	13	333	$ 83.592.828,00	
4	Suministro e instalación de tanque tipo australiano 73100 lt	und	70	$ 11.673.799,00	$ 817.165.930,00	13,00	70	$ 817.165.930,00	13	70	$ 817.165.930,00	
								$ -			$ -	
5	Divulgar y socializar el proyecto a la comunidad y actores involucrados	und	70	$ 24.871,00	$ 1.740.970,00	6,00	70,00	$ 1.740.970,00	6	70	$ 1.740.970,00	
								$ -			$ -	
COSTO DIRECTO CONTRATADO Y/O PROGAMADO					$ 971.486.828,00	PROGRAMADO MES 1		$ 971.486.828,00	PROGRAMADO ACUMULADO		$ 971.486.828,00	
ADMINISTRACIÓN				20%	194297365,6			194297365,6			194297365,6	
IMPREVISTOS				1%	9714868,28			9714868,28			9714868,28	
UTILIDADES				9%	87433814,52			87433814,52			87433814,52	
IVA sobre utilidad				19%	16612424,76			16612424,76			16612424,76	
COSTO INDIRECTO CONTRATADO Y/O PROGAMADO					$ 308.058.432,00			$ 308.058.473,00			$ 308.058.473,00	
VALOR TOTAL CONTRATADO Y/O PROGAMADO					$ 1.279.545.260,00			$ 1.279.545.301,00			$ 1.279.545.301,00	
% AVANCE MENSUAL												
% AVANCE ACUMULADO												

COSTO DIRECTO EJECUTADO		EJECUTADO MES 1	$ 152.579.928,00	EJECUTADO ACUMULADO $ 152.579.928,00
ADMINISTRACION	20%		30515985,6	30515985,6
IMPREVISTOS	1%		1525799,28	1525799,28
UTILIDADES	9%		13732193,52	13732193,52
IVA sobre utilidad	19%		2899116,769	2899116,769
COSTO INDIRECTO EJECUTADO			$ 48.383.095,17	$ 48.383.095,17
VALOR TOTAL EJECUTADO			$ 200.963.023,17	$ 200.963.023,17
% AVANCE MENSUAL				
% AVANCE ACUMULADO				


RESIDENTE DE OBRA
DIANA PATRICIA AVELLA VILLAMIZAR

DIRECTOR DE OBRA
JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS

Ver Anexo No. 1 *(Cronograma de actividades y flujo de fondos)*



Corponor

ANEXO 2. CONTROL DE TIEMPOS
MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024



CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 - 2024					CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CMA412 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER					DESDE:	5/12/2024
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024	SUPERVISOR:	JAVIER ALEXIS BECERRA ALBARRACIN	INTERVENTOR:	UNIÓN TEMPORALINTERRESERVORIOS NORTE	HASTA:	30/12/2024
						INFORME No.	1

Fecha de inicio:	5/12/2024

Fecha de terminación:	4/02/2025

Plazo inicial (meses)	1,00
Plazo adicional (meses)	1,00
Duración total (meses)	2,00

Días ejecucion inicial:	31
Días ejecucion	31
Total Días ejecucion :	62


Fecha de reporte	30/12/2024
Días planeados	62
Días transcurridos	26
Días faltantes	36

N°	Descripción de la etapa	Duración en (días)	Inicio	Fin	Estatus	Fecha de terminación Estimado
1	Ejecución Inicial	31	05/12/24	04/01/25	Ejecución	4/01/2025
2	Adición o Prorroga	31	05/01/25	04/02/25	Ejecución	4/02/2025
3	Informe No.1	22	05/12/24	26/12/24	Entregado	
4	Acta Parcial No. 1	22	05/12/24	26/12/24	Entregado	



OBSERVACIONES:

Ver Anexo No. 2 *(Control de tiempos)*



4 AVANCE FISICO – FINANCIERO

El avance físico – financiero del contrato de obra es 15.71% del valor total contratado.

Del avance de ejecución del proyecto es de 15.71%.

ANEXO 3. BALANCE FISICO - FINANCIERO DE OBRA
MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 - 2024				CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CMA412 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024				PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER							DESDE:	5/12/2024
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024	SUPERVISOR:	JAVIER ALEXIS BECERRA ALBARRACIN	INTERVENTOR:	UNION TEMPORALINTERRESERVORIOS NORTE	INFORME No.	1	HASTA:	30/12/2024

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO						MODIFICACION O ADICIÓN			TOTAL CONTRATADO		INFORME No. 1 05/12/2024 - 20/12/2024		ACUMULADO EJECUTADO		% EJECUTADO	POR EJECUTAR		% POR EJECUTAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR ($)	+/-	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)		CANTIDAD	VALOR ($)	
1	Localización y replanteo manual	m2	6650	$ 4.065,00	$ 27.032.250,00				6.650,00	$ 27.032.250,00	6.650,00	$ 27.032.250,00	6.650,00	$ 27.032.250,00	100%			
2	Limpieza y descapote manual 10 cm. Incluye retiro	m2	6650	$ 6.308,00	$ 41.954.850,00				6.650,00	$ 41.954.850,00	6.650,00	$ 41.954.850,00	6.650,00	$ 41.954.850,00	100%			
3	Colchon de arena 5 cm	m3	332,5	$ 251.407,00	$ 83.592.828,00				332,50	$ 83.592.828,00	332,50	$ 83.592.828,00	332,50	$ 83.592.828,00	100%			
4	Suministro e instalación de tanque tipo australiano 73100 lt	und	70	$ 11.673.799,00	$ 817.165.930,00				70,00	$ 817.165.930,00	-		-			70,00	$ 817.165.930,00	100%
5	Divulgar y socializar el proyecto a la comunidad y actores involucrados	und	70	$ 24.871,00	$ 1.740.970,00				70,00	$ 1.740.970,00	-		-			70,00	$ 1.740.970,00	100%
COSTO DIRECTO					$ 971.486.828,00					$ 971.486.828,00		$ 152.579.928,00		$ 152.579.928,00			$ 815.906.900,00	
ADMINISTRACIÓN				20%	194297365,6					194297365,6		30515985,6		30515985,6			163781380	
IMPREVISTOS				1%	9714868,28					9714868,28		1525799,28		1525799,28			8189069	
UTILIDADES				9%	87433814,52					87433814,52		13732193,52		13732193,52			73701621	
IVA sobre utilidad				19%	16612424,76					16612424,76		2609116,77		2609116,77			14003307,99	
COSTO INDIRECTO					$ 308.058.432,00					$ 308.058.432,00		$ 48.383.095,17		$ 48.383.095,17			$ 259.675.354,83	
VALOR TOTAL					$ 1.279.545.260,00					$ 1.279.545.260,00		$ 200.963.023,17		$ 200.963.023,17			$ 1.075.582.254,83	
PORCENTAJE DE AVANCE											15,71%		15,71%			84,29%		

AVANCE FÍSICO :	15,71%

OBSERVACIONES:

Ver anexo No. 3. *(Balance físico – financiero contrato de obr*

5. CONDICIONES CLIMATICAS Y/O ORDEN PUBLICO

Las temperaturas máximas diarias son alrededor de 30 °C, rara vez bajan a menos de 27 °C o exceden 32 °C. Las temperaturas mínimas diarias son alrededor de 23 °C, rara vez bajan a menos de 21 °C o exceden 24 °C.
Durante el periodo del presente proyecto se caracteriza por tener temperaturas promedio de 24°C en el día y 13°C en la noche, y lluvias de 10 días.

En cuanto a vías terciarias encontramos:

El municipio de Arboledas en la vereda de Juan Bueno está ejecutando una placa huella.

El municipio de Cucutilla en la salida hacia las veredas de San miguel y guayabito se realiza la pavimentación de la vía hacia el corregimiento de san José de la montaña se está realizando un box culvert.

En el municipio de Salazar en la vereda el arenal se está ejecutando una placa huella

6. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES EJECUTADAS

1. Elección del lugar y ubicación del tanque:

Los tanques australianos deben ser construidos en lugares elevados para alimentar por gravedad a los sistemas de riego y bebederos de los animales. La ubicación de los tanques se determina en base al uso que se le dará. Como norma general siempre se ubican preferentemente cercanos a la fuente de abastecimiento de agua y en el sector más alto del campo posible. Se debe considerar tener una altura superior al punto más lejano a donde se desea llevar el agua para permitir la conducción de agua por gravedad. Debe instalarse lejos de cañadones y cursos de agua que pudieran socavar la base del tanque.

2. Localización y replanteo manual

El área delimitada debe estar completamente despejado de malezas, ramas, piedras y finalmente nivelado en una superficie al diámetro al tanque australiano que en nuestro caso es de 9.40m.

Al nivelar el piso del terreno debe dársele la pendiente adecuada hacia el punto definido para el drenaje del mismo, esto con finalidad de facilitar las labores de limpieza del mismo.







3. Excavación de fondo:


Fijar un punto en el centro del terreno nivelado y con una estaca clavada en ese punto utilizar una cuerda para trazar una circunferencia con radio de 4.75 m que señale en el suelo la línea que indicara la posición de las láminas del tanque a instalar. siguiendo esta línea de referencia se debe cavar una profundidad de 10 cms, tomando especial cuidado en que el fondo quede completamente a nivel.



4. Colchón de arena:

A la excavación realizada de 10cm se le realiza un colchón de arena fina de 5cm, se compacta con la finalidad de proteger el geotextil que se instalara.





ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	V/R PACIAL
1	Localización y replanteo manual	M2	6650	$ 4065	$ 27.032.250,00
2	Limpieza y descapote manual 10 cm, incluye retiro	M2	6650	$ 6309	$ 41.954.850,00
3	Colchón de arena 5 cm	M3	332.5	$ 251.407	$ 83.592.828,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 152.579.928,00**
ADMINISTRACION 20%					30515985,6
IMPREVISTOS 1%					1525799,28
UTILIDAD 9%					13732193,52
IVA 19%					2609116,77
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$ 48.383.0795,17**
COSTO TOTAL OBRA					**$ 200.963.023,17**

Ver Anexo No. 5. *(Registro fotográfico del avance del proyecto del periodo del informe presentado y condiciones climáticas)*

7. ESTADO FINANCIERO Y RELACION DE PAGOS

El financiero pagado del contrato de obra es 15.71% del valor total contratado.

Ver Anexo No. 6. *(Estado financiero de obra y relación de pagos)*


Se suscribió acta parcial de obra No. 1 por valor de $ 200.963.023,17, para un valor total a cobrar de $ 200.963.023,17 del valor total contratado $ 1.279.545.260,00.

Saldo por pagar $ $ 1.078.582.254,83, una vez se hagan efectivos los pagos parciales de las actas suscritas.

8. CONTROL SOCIAL

Durante este periodo se realizaron siete (7) reuniones de socializaciones y la conformación de las veedurías por municipios relacionados al proyecto.

Ver Anexo 7. *(Actas de reuniones de socialización)*
Ver Anexo 8. *(Acta de conformación de veeduría)*



9. CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS HSEQ DE CORPONOR

Durante el periodo del informe, se diligenció el formato *MPA-01-F-28 versión 2 "Informe mensual de seguridad y salud en el trabajo y manejo ambiental en obras públicas*, con sus respectivos anexos establecidos por la Corporación. Se debe presentar el control diario del equipo de trabajo del contratista de obra.

***Anexo** (Informes mensuales HSEQ con sus respectivos anexos al informe solicitados en el formato MPA-01-F28 Versión 2).*

9.1 LISTADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE OBRA

Para la ejecución del proyecto se contrató el siguiente personal:

NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO.
Jesús enrique Vargas Rodríguez	88.211.813	Director de obra
Diana patricia Avella Villamizar	60.448.600	Residente de obra
Libardo Andrés cuadros cubillas	1.094.348.026	Obrero

9.2 LISTADO DE PERSONAL INGRESADO

NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO.	FECHA DE INGRESO
Jesús enrique Vargas Rodríguez	88.211.813	Director de obra	5/12/2024
Diana patricia Avella Villamizar	60.448.600	Residente de obra	5/12/2024
Libardo Andrés cuadros cubillas	1.094.348.026	Obrero	3/12/2024

9.2.1 EXÁMENES DE INGRESO

Se presentan las copias de los exámenes de ingreso del personal de técnico y administrativo vinculado en el periodo del informe.
Anexo (Exámenes de ingreso del personal ingresado)


9.3 AFILIACIÓN DEL PERSONAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se presentan copias de las certificaciones de afiliación al sistema de seguridad social salud, pensión y ARL del personal de obra y administrativo vinculado en el periodo del informe.

9.3.1 CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL – SALUD
Anexo *(Certificaciones de afiliación al sistema de seguridad social del personal contratado - Salud)*

9.3.2 CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIÓN
Anexo *(Certificaciones de afiliación al sistema de seguridad social del personal contratado- Pensión)*

9.3.3 CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL - ARL
***Anexo** (Certificaciones de afiliación al sistema de seguridad social del personal contratado- ARL)*




9.4 LISTADO DE PERSONAL RETIRADO

A la fecha del presente informe no se presentan retiros de personal.


9.5. PLANILLAS DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se presentan copias de las planillas de pago al sistema de seguridad social salud, pensión y ARL del personal de obra y administrativo vinculado en el periodo del informe.
Anexo *(planillas de pago al sistema de seguridad social)*

ZURISADAY PRADILLA ATUESTA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024



ANEXOS



Anexo.

Pólizas iniciales.

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4603107139

PÓLIZA No: 460 -74 - 994000008097 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: **CUCUTA QUINTA VELEZ** COD. AGE: 460 RAMO: 74 PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
26	11	2024	25	11	2024	23:59	25	12	2024	23:59	30	26	11	2024

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO EXPEDICION

VIGENCIA DEL ANEXO DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
25	11	2024	23:59	25	12	2024	23:59	30

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.891.548-4**

DIRECCIÓN: CL 8CN 2 74 BRR EL BOSQUE CIUDAD: CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER TELÉFONO: 3228507948

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.505.253-4**

DIRECCIÓN: CALLE 13 NÂº 3 E 278 CAOBOS CIUDAD: **CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER** TELÉFONO: 6075828484

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR NIT : 890505253

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER CIUDAD: CÚCUTA

DIRECCION:

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA: 0-1

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 260,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260,000,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260,000,000.00		
	RCE PATRONAL	260,000,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO. LIC401-2024, DE FECHA 25/11/2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***260,000,000.00	$ **********50,000	$********0.00	$ *******9,500	$ **********59,500

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
ZORAIDA VILLAMIZAR CARO	4884	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000460310713

Sadoy Pradilla

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADE207B0E0FFB7F5C

CLIENTE

JACARO 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000008097 **ANEXO:** 0 **TIPO DE MOVIMIENTO:** 0 **PAGINA:** 2

TOMADOR: UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024 **IDENTIFICACION:** 901.891.548-4

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA	890505253-4		CÚCUTA	260,000,000.00	50,000	59,500

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
50,000	59,500

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4603107113

PÓLIZA No: 460 - 47 - 994000080967 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **CUCUTA QUINTA VELEZ** COD. AGENCIA: 460 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	11	2024	26	11	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.891.548-4**

DIRECCIÓN: CL 8CN 2 74 BRR EL BOSQUE CIUDAD: CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER TELÉFONO: 3228507948

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.505.253-4**

BENEFICIARIO: **CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.505.253-4**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	25/11/2024	25/04/2025	127,954,526.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	25/11/2024	25/12/2027	63,977,263.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	383,863,578.00

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 901275996 - INGESAP INGENIERIA Y PROYECTOS SAS - PART: 74.00%
NIT 900247961 - CONSTRUCTORA MATICCES P & B LTDA - PART: 25.00%
CC 13267635 - PEREZ AMADOR, EUSEBIO RAFAEL - PART: 1.00%

BENEFICIARIOS
NIT 890505253 - CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO NO. LIC401-2024, DE FECHA 25/11/2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***575,795,367.00	$ ********4,340,989	$****11,000.00	$ ******826,878	$ ********5,178,867

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
ZORAIDA VILLAMIZAR CARO	4884	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN : HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000460310711

Sadoy Pradilla

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CADE207B0E0FFB7F5E

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano *** Celular:** 312 342 6229 *** Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna *** Celular:** 310 223 4304 *** Correo electrónico:** martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá *** Teléfono:** (601) 791 91 80 *** Fax:** (601) 791 91 80 *** Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento
Compañía de Seguros
GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CUCUTA QUINTA VELEZ COD. AGENCIA: 460 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000080967** ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.891.548-4**

ASEGURADO: **CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.505.253-4**

BENEFICIARIO: **CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.505.253-4**

TEXTO ITEM 1

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4603107139

PÓLIZA No: 460 -74 - 994000008097 ANEXO:1

AGENCIA EXPEDIDORA: **CUCUTA QUINTA VELEZ** COD. AGE: 460 RAMO: 74 PAP:

DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO
11	12	2024	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	25	12	2024	23:59		05	01	2025	23:59	11	11	12	2024
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DESDE			A LAS		VIGENCIA HASTA			A LAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN		

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA

	DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
VIGENCIA DEL ANEXO	25	12	2024	23:59		05	01	2025	23:59	11
	VIGENCIA DESDE			A LAS		VIGENCIA HASTA			A LAS	

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.891.548-4**

DIRECCIÓN: CL 8CN 2 74 BRR EL BOSQUE CIUDAD: CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER TELÉFONO: 3228507948

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.505.253-4**

DIRECCIÓN: CALLE 13 NÂº 3 E 278 CAOBOS CIUDAD: **CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER** TELÉFONO: 6075828484

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR NIT : 890505253

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER CIUDAD: CÚCUTA

DIRECCION:

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA: 0-1

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 260,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260,000,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260,000,000.00		
	RCE PATRONAL	260,000,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO. LIC401-2024, DE FECHA 25/11/2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

SE REALIZA EL PRESENTE ANEXO SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 05/12/2024.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***260,000,000.00	$ **********0	$********0.00	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
ZORAIDA VILLAMIZAR CARO	4884	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000460310713

Sadoy Pradilla

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADE207B0E0DFE795B CLIENTE JACARO 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano *** Celular:** 312 342 6229 *** Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna *** Celular:** 310 223 4304 *** Correo electrónico:** martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá *** Teléfono:** (601) 791 91 80 *** Fax:** (601) 791 91 80 *** Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000008097 **ANEXO:** 1 **TIPO DE MOVIMIENTO:** 0 **PAGINA:** 2

TOMADOR: UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024 **IDENTIFICACION:** 901.891.548-4

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA	890505253-4		CÚCUTA	260,000,000.00	0	0

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
0	0

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4603107139

PÓLIZA No: 460 -74 - 994000008097 ANEXO:2

AGENCIA EXPEDIDORA: **CUCUTA QUINTA VELEZ** COD. AGE: 460 RAMO: 74 PAP:

	DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICIÓN	11	12	2024		VIGENCIA DE LA PÓLIZA	05	12	2024	23:59		05	01	2025	23:59	31	11	12	2024
					VIGENCIA DESDE				A LAS		VIGENCIA HASTA			A LAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN		

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO MODIFICACION

	DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
VIGENCIA DEL ANEXO	05	12	2024	23:59		05	01	2025	23:59	31
	VIGENCIA DESDE			A LAS		VIGENCIA HASTA			A LAS	

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.891.548-4**

DIRECCIÓN: CL 8CN 2 74 BRR EL BOSQUE CIUDAD: CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER TELÉFONO: 3228507948

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.505.253-4**

DIRECCIÓN: CALLE 13 NÂº 3 E 278 CAOBOS CIUDAD: **CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER** TELÉFONO: 6075828484

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR NIT : 890505253

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER CIUDAD: CÚCUTA

DIRECCION:

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA: 0-1

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 260,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260,000,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260,000,000.00		
	RCE PATRONAL	260,000,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO. LIC401-2024, DE FECHA 25/11/2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

SE REALIZA EL PRESENTE ANEXO SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 05/12/2024.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ **********0.00	$ **********0	$*******0.00	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
ZORAIDA VILLAMIZAR CARO	4884	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000460310713

Sadoy Pradilla

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADE207B0E0DFE795A CLIENTE JACARO 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano *** Celular:** 312 342 6229 *** Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna *** Celular:** 310 223 4304 *** Correo electrónico:** martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá *** Teléfono:** (601) 791 91 80 *** Fax:** (601) 791 91 80 *** Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000008097 **ANEXO:** 2 **TIPO DE MOVIMIENTO:** 0 **PAGINA:** 2

TOMADOR: UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024 **IDENTIFICACION:** 901.891.548-4

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA	890505253-4		CÚCUTA	0.00	0	0

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
0	0

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4603107113

PÓLIZA No: 460 - 47 - 994000080967 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: **CUCUTA QUINTA VELEZ** COD. AGENCIA: 460 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	12	2024	12	12	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.891.548-4**

DIRECCIÓN: CL 8CN 2 74 BRR EL BOSQUE CIUDAD: CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER TELÉFONO: 3228507948

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.505.253-4**

BENEFICIARIO: **CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.505.253-4**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	05/12/2024	05/05/2025	127,954,526.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	05/12/2024	05/01/2028	63,977,263.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	383,863,578.00

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 901275996 - INGESAP INGENIERIA Y PROYECTOS SAS - PART: 74.00%
NIT 900247961 - CONSTRUCTORA MATICCES P & B LTDA - PART: 25.00%
CC 13267635 - PEREZ AMADOR, EUSEBIO RAFAEL - PART: 1.00%

BENEFICIARIOS
NIT 890505253 - CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO NO. LIC401-2024, DE FECHA 25/11/2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***575,795,367.00	$ **********0	$********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
ZORAIDA VILLAMIZAR CARO	4884	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN : HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000460310711

Sadoy Padilla

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADE207B0E0DFE795C

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano *** Celular:** 312 342 6229 *** Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna *** Celular:** 310 223 4304 *** Correo electrónico:** martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá *** Teléfono:** (601) 791 91 80 *** Fax:** (601) 791 91 80 *** Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento
Compañía de Seguros
GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CUCUTA QUINTA VELEZ COD. AGENCIA: 460 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000080967** ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.891.548-4**

ASEGURADO: **CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.505.253-4**

BENEFICIARIO: **CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.505.253-4**


TEXTO ITEM 1

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

SE REALIZA EL PRESENTE ANEXO SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 05/12/2024.

CLIENTE



Anexo

Pólizas actualizadas

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4603107113

PÓLIZA No: 460 - 47 - 994000080967 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: **CUCUTA QUINTA VELEZ** COD. AGENCIA: 460 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	12	2024	28	12	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.891.548-4**

DIRECCIÓN: CL 8CN 2 74 BRR EL BOSQUE CIUDAD: CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER TELÉFONO: 3228507948

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.505.253-4**

BENEFICIARIO: **CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.505.253-4**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	05/12/2024	03/06/2025	127,954,526.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	05/12/2024	03/02/2028	63,977,263.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	383,863,578.00

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 901275996 - INGESAP INGENIERIA Y PROYECTOS SAS - PART: 74.00%
NIT 900247961 - CONSTRUCTORA MATICCES P & B LTDA - PART: 25.00%
CC 13267635 - PEREZ AMADOR, EUSEBIO RAFAEL - PART: 1.00%

BENEFICIARIOS
NIT 890505253 - CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO NO. LIC401-2024, DE FECHA 25/11/2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***575,795,367.00	$ **********91,496	$*********0.00	$ *******17,384	$ **********108,881

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
ZORAIDA VILLAMIZAR CARO	4884	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN : HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000460310711

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CADE207B0E0CF97657

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano *** Celular:** 312 342 6229 *** Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna *** Celular:** 310 223 4304 *** Correo electrónico:** martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá *** Teléfono:** (601) 791 91 80 *** Fax:** (601) 791 91 80 *** Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento
Compañía de Seguros
GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CUCUTA QUINTA VELEZ COD. AGENCIA: 460 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000080967** ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.891.548-4**

ASEGURADO: **CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.505.253-4**

BENEFICIARIO: **CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.505.253-4**

TEXTO ITEM 1

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

SE REALIZA EL PRESENTE ANEXO AMPLIANDO LAS VIGENCIAS SEGUN PRORROGA NO. 01 AL CONTRATO.

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4603107139

PÓLIZA No: 460 -74 - 994000008097 ANEXO:3

AGENCIA EXPEDIDORA: **CUCUTA QUINTA VELEZ** COD. AGE: 460 RAMO: 74 PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE				A LAS	VIGENCIA HASTA			A LAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO
28	12	2024	05	01	2025	23:59		03	02	2025	23:59	29	28	12	2024

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA

VIGENCIA DEL ANEXO										
VIGENCIA DESDE				A LAS	VIGENCIA HASTA				A LAS	DIAS
DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS		
05	01	2025	23:59		03	02	2025	23:59		29

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.891.548-4**

DIRECCIÓN: CL 8CN 2 74 BRR EL BOSQUE CIUDAD: CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER TELÉFONO: 3228507948

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.505.253-4**

DIRECCIÓN: CALLE 13 NÂº 3 E 278 CAOBOS CIUDAD: **CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER** TELÉFONO: 6075828484

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR NIT : 890505253

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER CIUDAD: CÚCUTA

DIRECCION:

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA: 0-1

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 260,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260,000,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260,000,000.00		
	RCE PATRONAL	260,000,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO. LIC401-2024, DE FECHA 25/11/2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

SE REALIZA EL PRESENTE ANEXO AMPLIANDO LAS VIGENCIAS SEGUN PRORROGA NO. 01 AL CONTRATO.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***260,000,000.00	$ **********41,315	$********0.00	$ ********7,850	$ **********49,165

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
ZORAIDA VILLAMIZAR CARO	4884	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000460310713

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADE207B0E0CF97656 CLIENTE JACARO 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano *** Celular:** 312 342 6229 *** Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna *** Celular:** 310 223 4304 *** Correo electrónico:** martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá *** Teléfono:** (601) 791 91 80 *** Fax:** (601) 791 91 80 *** Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000008097 **ANEXO:** 3 **TIPO DE MOVIMIENTO:** 0 **PAGINA:** 2

TOMADOR: UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024 **IDENTIFICACION:** 901.891.548-4

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA	890505253-4		CÚCUTA	260,000,000.00	41,315	49,165

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
41,315	49,165

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4603107139

PÓLIZA No: 460 -74 - 994000008097 ANEXO:4

AGENCIA EXPEDIDORA: **CUCUTA QUINTA VELEZ** COD. AGE: 460 RAMO: 74 PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
28	12	2024	VIGENCIA DESDE 05	12	2024	A LAS 23:59	03	02	2025	23:59	60	28	12	2024

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO MODIFICACION

VIGENCIA DEL ANEXO DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
VIGENCIA DESDE 05	12	2024	A LAS 23:59	03	02	2025	23:59	60

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.891.548-4**

DIRECCIÓN: CL 8CN 2 74 BRR EL BOSQUE CIUDAD: CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER TELÉFONO: 3228507948

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.505.253-4**

DIRECCIÓN: CALLE 13 NÂº 3 E 278 CAOBOS CIUDAD: **CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER** TELÉFONO: 6075828484

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR NIT : 890505253

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER CIUDAD: CÚCUTA

DIRECCION:

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA: 0-1

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 260,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260,000,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260,000,000.00		
	RCE PATRONAL	260,000,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO. LIC401-2024, DE FECHA 25/11/2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

SE REALIZA EL PRESENTE ANEXO AMPLIANDO LAS VIGENCIAS SEGUN PRORROGA NO. 01 AL CONTRATO.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ **********0.00	$ **********0	$*******0.00	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
ZORAIDA VILLAMIZAR CARO	4884	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000460310713

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADE207B0E0CF9775F CLIENTE JACARO 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano *** Celular:** 312 342 6229 *** Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna *** Celular:** 310 223 4304 *** Correo electrónico:** martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá *** Teléfono:** (601) 791 91 80 *** Fax:** (601) 791 91 80 *** Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA


No. POLIZA: 994000008097 **ANEXO:** 4 **TIPO DE MOVIMIENTO:** 0 **PAGINA:** 2

TOMADOR: UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024 **IDENTIFICACION:** 901.891.548-4

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA	890505253-4		CÚCUTA	0.00	0	0

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
0	0



Anexo.

Actas suscritas en el periodo del informe

ACTA DE INICIO

MPA-01-F-04, versión 5, 08/07/2024

CONTRATO No Y FECHA	LIC401-2024 del 24 de noviembre de 2024
TIPO DE CONTRATO	Obra
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	Cúcuta, 05 de diciembre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.279.545.260
DURACIÓN DEL CONTRATO	1 mes
ASISTENTES:	UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024 ZURISADAY PRADILLA ATUESTA Contratista MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA UNIÓN TEMPORALINTERRESERVORIOS NORTE Interventoría JAVIER ALEXIS BECERRA ALBARRACIN Supervisor

DESARROLLO: Dar inicio a las actividades objeto del contrato de la referencia.

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

Contratista

Interventoría

Supervisor

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR"

PRORROGA No 01 DEL CONTRATO DE DE OBRA No. LIC401-2024

Entre los suscritos **RAFAEL HUMBERTO CAMACHO CARRILLO**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la Cédula de Ciudadanía Nº 1.090.374.75836 expedida en Cúcuta, quien en su calidad de Director General, nombrado mediante acuerdo N° 021 del 26 de Octubre de 2023 y acta de posesión No.13287 de fecha 18 de Diciembre de 2023, y quien obra en nombre y representación de la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL–CORPONOR**-,entidad corporativa, descentralizada, creada mediante decreto 3450 de 1983 y transformada por la Ley 99 de 1993, quien para efectos del presente contrato se denominará CORPONOR, con NIT 890.505.253-4, por una parte y por la otra la **UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024.**Representante ZURISADAY PRADILLA ATUESTA, identificada con cédula de ciudadanía No 1.093.783.015 de los Patios, INTEGRANTES : 1) EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR cedula de ciudanía No 13.267.635 DE TIBÚ Participación del 1% 2) CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA NIT 900.247.961-9 Representante legal HUGO PEREZ ALVAREZ Identificado con cedula de ciudadanía No 88.212.328 de Cúcuta, con participación del 25%.3) INGESAP INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S NIT 901.275.996-9 representante legal ZURISADAY PRADILLA ATUESTA identificada con cedula de ciudadanía No 1.093.783.015 de los patios. Con participación del 74 %., quien adelante se denominará, el **CONTRATISTA,** hemos convenido realizar la prórroga No 1 al contrato de obra LIC401-2024 , consignado en las cláusulas que se pactan a continuación, previa las siguientes consideración es: **1.-** Que, la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental- e publicó en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II, el aviso de convocatoria pública, el análisis del sector, los estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones documentos asociados al Proceso de Licitación Pública **No. LIC401-2024.** cuto objeto es **CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. 2)** Que el presupuesto oficial del proceso corresponde al valor de UN **MIL TRESCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS MCTE ($1.310.342.180,00**), incluido el valor del A.I.U., y el IVA sobre la utilidad, Amparado el Certificado de disponibilidad No 516 del 3 de octubre de 2024 1700 - 2.3.2.01.01.001.03.19.3203.0900-1.A.1.B.2-02 – 20. Otras obras de ingeniería civil $ 40.000.000 Y 1700 - 2.3.2.01.01.001.03.19.3203.0900-1.A.1.B.2-02 – 24. Otras obras de ingeniería civil. $ 1.270.432.180, PROYECTO 1.1.2 GESTIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO Y USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, META RELACIONADA CON EL PAC MANTENER LA OFERTA DEL RECURSO HÍDRICO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS QUE REGULAN LA OFERTA HÍDRICA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS. **3)** Que, El director general de CORPONOR, ordenó mediante la Resolución No.707 del 18 de octubre de 2024, la apertura del proceso de Licitación Pública No LIC401- 2024 y se publicó en la misma fecha el texto definitivo del Pliego de condiciones que regirían el proceso de selección en la página www.contratos.gov.co. **4)** Que la audiencia de Cierre y apertura de propuestas, se llevó a cabo a través del sistema de Contratación Estatal – SECOP II, El 31 de octubre 2024 se realizó el cierre del proceso y apertura de ofertar, se dio apertura al sobre 1 que contiene las ofertas que contiene los requisitos habilitantes , se publicó en la plataforma lista de ofertas y se publicaron las ofertas se recibió ofertas por parte de **UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024.**Representante ZURISADAY PRADILLA ATUESTA,

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR"

PRORROGA No 01 DEL CONTRATO DE DE OBRA No. LIC401-2024

identificada con cédula de ciudadanía No 1.093.783.015 de los Patios, INTEGRANTES : 1) EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR cedula de ciudanía No 13.267.635 DE TIBÚ Participación del 1% 2) CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA NIT 900.247.961-9 Representante legal HUGO PEREZ ALVAREZ Identificado con cedula de ciudadanía No 88.212.328 de Cúcuta, con participación del 25%.3) INGESAP INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S NIT 901.275.996-9 representante legal ZURISADAY PRADILLA ATUESTA identificada con cedula de ciudadanía No 1.093.783.015 de los patios. Con participación del 74 %. **5)** Que mediante resolución No 799 de 21 de noviembre de 2024 . s adjudico el proceso de selección No **Nº LIC401 de** , cuyo objeto es la "**CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.** Al oferente **UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024.**Representante ZURISADAY PRADILLA ATUESTA, identificada con cédula de ciudadanía No 1.093.783.015 de los Patios, INTEGRANTES : 1) EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR cedula de ciudanía No 13.267.635 DE TIBÚ Participación del 1% 2) CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA NIT 900.247.961-9 Representante legal HUGO PEREZ ALVAREZ Identificado con cedula de ciudadanía No 88.212.328 de Cúcuta, con participación del 25%.3) INGESAP INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S NIT 901.275.996-9 representante legal ZURISADAY PRADILLA ATUESTA identificada con cedula de ciudadanía No 1.093.783.015 de los patios con participación del 74 %, quien obtuvo un resultado total de **(89)** puntos con la evaluación de la oferta económica**,** por el valor de **MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($1.279.545.260)** , A cargo de la vigencia fiscal del año 2024, amparado por el certificado de Disponibilidad Presupuestal No 516 del 3 de octubre de 2024 1700 - 2.3.2.01.01.001.03.19.3203.0900-1.A.1.B.2-02 – 20. Otras obras de ingeniería civil $ 40.000.000 Y 1700 - 2.3.2.01.01.001.03.19.3203.0900-1.A.1.B.2-02 – 24. Otras obras de ingeniería civil. $ 1.270.432.180, PROYECTO 1.1.2 GESTIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO Y USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, META RELACIONADA CON EL PAC MANTENER LA OFERTA DEL RECURSO HÍDRICO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS QUE REGULAN LA OFERTA HÍDRICA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS. **6)** Que como resultado del proceso de selección se suscribió el contratado No LIC401 del 24 de noviembre de 2024 con la otra **UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024.**Representante ZURISADAY PRADILLA ATUESTA, identificada con cédula de ciudadanía No 1.093.783.015 de los Patios, y se dio inicio a su ejecución el 5 de Diciembre de 2024.**7)** Que el valor del contrato corresponde a la suma de **MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($1.279.545.260). 8)** Que el plazo de ejecución del contrato es TREINTA (30) DIAS el cual se encuentra vigente hasta el 4 de enero de 2025 , contrato con acta de inicio del 5 de Diciembre de 2024 **9)** Que por solicitud de fecha 17-12-2024, de parte del contratista de obra, UNIÓN TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024, cuyo representante legal es la señora ZURISADAY PRADILLA ATUESTA, quien solicita una prórroga en el marco del contrato de obra No. LIC-410-2024, cuyo objeto corresponde a la "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER" .La solicitud se efectúa debido a diversos factores imprevistos, que han generado inconvenientes

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR"

PRORROGA No 01 DEL CONTRATO DE DE OBRA No. LIC401-2024


afectando el avance del proyecto, lo que requiere una revisión del cronograma de ejecución para asegurar el cumplimiento total del contrato.**10)** Que Se hace énfasis en que los proveedores encargados de suministrar materiales claves para la instalación del reservorio, específicamente las láminas y la geomembrana PVC, han notificado retrasos en la entrega de dichos materiales, impactando la ejecución de las actividades programadas (Se anexa documento JM Multicolores y Peñaloza – Corona). **11)** Que atendiendo a lo anterior, y con el fin de garantizar la correcta ejecución de las actividades contratadas, la UNIÓN TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024, solicita una prórroga de tiempo de UN (1) MES, para poder atender la totalidad de las labores pendientes, reformulando el cronograma y ajustándolo a las nuevas condiciones. **12)** Que en virtud de lo anterior la entidad considerando que se deben evaluar las condiciones de equilibrio económico del contrato, así como el cumplimiento del objeto del mismo, y verificar la viabilidad de aprobar o no la solicitud efectuada por el contratista de obra, la interventoría del proceso, UNIÓN TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE, representada por la señora MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA, solicita a la entidad mediante comunicación de fecha 18-12-2024, la convocatoria de un comité de obra, con el propósito de socializar la solicitud de prórroga presentada por la UNIÓN TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024.**13)** Que en fecha diciembre 18 del 2024 se lleva a cabo un Comité de Obra con participación de la ingeniera MAIRA ALEJANDRA PICÓN, representante legal de la empresa UNIÓN TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE, a cargo de la interventoría; la ingeniera ZURISADAY PRADILLA ATUESTA, Representante Legal de la empresa UNIÓN TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024, contratista de obra y el arquitecto Javier Alexis Becerra Albarracín, supervisor de CORPONOR, con el objeto de evaluar la solicitud de prorroga al contrato de obra No. LIC-410-2024, así como el contrato de interventoría No. CMA 412 DE 2024, atendiendo a la situación anteriormente manifestada. **14)** Que en desarrollo del comité, el contratista de obra presentó las justificaciones y documentos correspondientes, incluyendo los oficios emitidos por los proveedores de los materiales que explican las razones de los retrasos y los nuevos plazos de entrega. Además, se discutió el impacto que estos retrasos pueden tener sobre el cronograma original y las alternativas para mitigar los efectos de esta situación.**15)** Que en virtud de lo anterior, y acorde con lo establecido en el acta de Comité de Obra No. 01 de fecha 18-12-2024, es aprobada la prórroga requerida por el contratista de obra de UN (1) MES más, solicitándose el ajuste del cronograma de actividades conforme a los nuevos plazos de entrega de los materiales, asegurando que la calidad y seguridad del proyecto no se vean comprometidas.**16)** Que l plazo inicial del Contrato de Obra LIC-410-25-11-2024 se pactó con una duración de UN (1) MES con acta de inicio dada el 5 -12-2024 el cual se encuentra vigente Las condiciones de equilibrio económico del contrato se mantienen sin que se supere el presupuesto inicial.**17)** Que el monto de los recursos del contrato de obra inicial no se modifica, manteniéndose en la suma de **UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($1.279.545.260,00),** aportados por CORPONOR.**18)** Que es necearía la prórroga entiempo por UN (1) MES MAS a lo estipulado en el contrato inicial, teniendo en cuenta el pedido y disponibilidad de las láminas y geomembranas para la conformación de los reservorios.. **19)** Que Conforme a lo anteriormente expuesto, y de acuerdo a la necesidad de prorrogar en tiempo el Contrato principal, la ley 80 de 1993 establece que "Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.**20)** Que e*l artículo 209 de la Constitución Política establece que "(…) la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (…)".**21)*** Que e*l artículo 3 de la Ley 80 de 1993 dispone que "(…) los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidadesbuscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y*

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR"

PRORROGA No 01 DEL CONTRATO DE DE OBRA No. LIC401-2024

eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines (…)". ***21)*** *Que, el numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 señala que "(…) Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a protegerlos derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. (…)".*. ***23)*** *Que el artículo 40 de la ley 80 de 1993, inciso 2do y 3ro, establece: "(…) Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no seancontrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración. (…)".*. ***24)*** Que, las partes que suscriben el presente prorroga No1 al contrato de Obra No LIC401 de 2024 , no se hallan incursas en conflictos de intereses, ni en las causales de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y demás normas vigentes aplicables y en caso de sobrevenir cualquiera de ellas en el Contratista se procederá conforme a lo dispuesto en las normas aplicables. **25)**.- Que, con fundamento en lo previamente expuesto, las partes acuerdan celebrar la presente prorroga 01 al contrato LIC401-2024, en el cual se entienden pactadas las presentes cláusulas y consideraciones que las partes acuerdan: **CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL COTRATO:** Efectuar la prórroga No 1 al contrato de Obra No LIC401-2024 cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. ,** conforme los estudios previos que justifican prorroga , y los demás documentos que hacen parte integral del mismo que definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del mismo. **CLAUSULA SEGUNDA PRORROGA EN TIEMPO.** Se adiciona la CLÁUSULA TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato LIC401/2024, por el término de UN (1) MES, contado a partir de la terminación pactada del contrato inicial, es decir a partir del 04 hasta el enero de 2025, quedando el plazo total de ejecución del contrato en SESENTA (60) DIAS de la siguiente forma: TREINTA (30) DIAS DEL PLAZO INCIAL Y TREINTA (30) DE LA PROROGA 1. conforme los estudios previos que justifican prorroga , y los demás documentos que hacen parte integral del mismo que definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del mismo **CLÁUSULA TERCERA. GARANTÍA ÚNICA:** Las Garantía única se deberá ampliar de conformidad a los términos de la adición introducida a través del presente documento en cada uno de los amparos establecidos en el contrato principal, la póliza deberá remitir a CORPONOR en el término de dos días para su aprobación **CLÁUSULA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**: El presente adicional 01 se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere la expedición del Registro presupuestal por el área financiera de CORPONOR. **CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS NO MODIFICADAS**: -Las demás cláusulas y estipulaciones contenidas en el contrato **LIC401-2024** y sus anexos, continúan vigentes en lo que no resulten contrarias al presente adicional 01. **CLÁUSULA SÉXTA: INTEGRALIDAD DEL CONTRATO**: El presente documento hace parte integral del contrato electrónico publicado en el SECOP II, al igual que sus disposiciones específicas y generales.

Proyectó: Diana Del Pilar Gutiérrez Castro.
Asesora externa Dirección General



Anexo No. 1.

CRONOGRAMA Y FLUJO DE FONDOS

ANEXO 1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE FONDOS

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024




CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 - 2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CMA412 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	PERIODO REPORTADO

PROYECTO:	**CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**			**DESDE:**	**5/12/2024**
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024	**SUPERVISOR:**	JAVIER ALEXIS BECERRA ALBARRACIN	**HASTA:**	30/12/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	MES No. 1 05/12/2024 - 30/12/2024			ACUMULADO			PORCENTAJE EJECUTADO
						DIAS	CANT	V. TOTAL	DIAS	CANT	V. TOTAL	
1	Localización y replanteo manual	m2	6650	$ 4.065,00	$ 27.032.250,00	12,00	6650,00	$ 27.032.250,00	12	6650	$ 27.032.250,00	100%
						12,00	6650,00	$ 27.032.250,00	12	6650	$ 27.032.250,00	
2	Limpieza y descapote	m2	6650	$ 6.309,00	$ 41.954.850,00	16,00	6650,00	$ 41.954.850,00	16	6650	$ 41.954.850,00	100%
						16,00	6650,00	$ 41.954.850,00	16	6650	$ 41.954.850,00	
3	Colchón de arena 5 cm	m3	332,5	$ 251.407,00	$ 83.592.828,00	13,00	332,50	$ 83.592.828,00	13	333	$ 83.592.828,00	100%
						13,00	332,50	$ 83.592.828,00	13	333	$ 83.592.828,00	
4	Suministro e instalación de tanque tipo australiano 73100 lt	und	70	$ 11.673.799,00	$ 817.165.930,00	13,00	70	$ 817.165.930,00	13	70	$ 817.165.930,00	
								$ -			$ -	
5	Divulgar y socializar el proyecto a la comunidad y actores involucrados	und	70	$ 24.871,00	$ 1.740.970,00	6,00	70,00	$ 1.740.970,00	6	70	$ 1.740.970,00	
								$ -			$ -	
COSTO DIRECTO CONTRATADO Y/O PROGAMADO					**$ 971.486.828,00**	PROGRAMADO MES 1		**$ 971.486.828,00**	PROGRAMADO ACUMULADO		**$ 971.486.828,00**	
ADMINISTRACIÓN				20%	194297365,6			194297365,6			194297365,6	
IMPREVISTOS				1%	9714868,28			9714868,28			9714868,28	
UTILIDADES				9%	87433814,52			87433814,52			87433814,52	
IVA sobre utilidad				19%	16612425			16612424,76			16612424,76	
COSTO INDIRECTO CONTRATADO Y/O PROGAMADO					**$ 308.058.432,00**			**$ 308.058.473,00**			**$ 308.058.473,00**	
VALOR TOTAL CONTRATADO Y/O PROGAMADO					**$ 1.279.545.260,00**			**$ 1.279.545.301,00**			**$ 1.279.545.301,00**	
% AVANCE MENSUAL												
% AVANCE ACUMULADO												

COSTO DIRECTO EJECUTADO		EJECUTADO MES 1	**$ 152.579.928,00**	EJECUTADO ACUMULADO	**$ 152.579.928,00**
ADMINISTRACIÓN	20%		30515985,6		30515985,6
IMPREVISTOS	1%		1525799,28		1525799,28
UTILIDADES	9%		13732193,52		13732193,52
IVA sobre utilidad	19%		2609116,769		2609116,769
COSTO INDIRECTO EJECUTADO			**$ 48.383.095,17**		**$ 48.383.095,17**
VALOR TOTAL EJECUTADO			**$ 200.963.023,17**		**$ 200.963.023,17**
% AVANCE MENSUAL					
% AVANCE ACUMULADO					

RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
DIANA PATRICIA AVELLA VILLAMIZAR	JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS



Anexo No. 2.
CONTROL DE TIEMPOS

ANEXO 2. CONTROL DE TIEMPOS

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024



CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 - 2024				CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CMA412 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	**CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**					**DESDE:**	5/12/2024
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024	**SUPERVISOR:**	JAVIER ALEXIS BECERRA ALBARRACIN	**INTERVENTOR:**	UNIÓN TEMPORALINTERRESERVORIOS NORTE	**HASTA:**	30/12/2024
						INFORME No.	1

Fecha de inicio:	**5/12/2024**

Fecha de terminación:	**4/02/2025**

Plazo inicial (meses)	**1,00**
Plazo adicional (meses)	**1,00**
Duración total (meses)	**2,00**

Días ejecucíon inicial:	**31**
Días ejecucíon	**31**
Total Días ejecucíon :	**62**


Fecha de reporte	30/12/2024
Días planeados	**62**
Días transcurridos	**26**
Días faltantes	**36**

N°	Descripción de la etapa	Duración en (días)	Inicio	Fin	Estatus	Fecha de terminación Estimado
1	Ejecución inicial	31	05/12/24	04/01/25	Ejecución	*4/01/2025*
2	Adición o Prorroga	31	05/01/25	04/02/25	Ejecución	*4/02/2025*
3	Informe No.1	22	05/12/24	26/12/24	Entregado	
4	Acta Parcial No. 1	22	05/12/24	26/12/24	Entregado	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	#	#	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
05/12/24	06/12/24	07/12/24	08/12/24	09/12/24	10/12/24	11/12/24	12/12/24	13/12/24	14/12/24	15/12/24	16/12/24	17/12/24	18/12/24	19/12/24	20/12/24	21/12/24	22/12/24	23/12/24	24/12/24	25/12/24	26/12/24	27/12/24	28/12/24	29/12/24	30/12/24	31/12/24	01/01/25	02/01/25	03/01/25	04/01/25	05/01/25	06/01/25	07/01/25	08/01/25

OBSERVACIONES:

DIANA PATRICIA AVELLA VILLAMIZAR	**MYRIAM DOLORES ARTEAGA**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ	**MAIRA ALEJANDRA PICON**
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA



Anexo No. 3.

BALANCE FISICO FINANCIERO

ANEXO 3. BALANCE FISICO - FINANCIERO DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024



CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 - 2024				CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CMA412 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024			PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	**CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**						**DESDE:**	**5/12/2024**
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024	**SUPERVISOR:**	JAVIER ALEXIS BECERRA ALBARRACIN	**INTERVENTOR:**	UNION TEMPORALINTERRESERVORIOS NORTE	**INFORME No.** 1	**HASTA:**	30/12/2024

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO						MODIFICACION O ADICIÓN			TOTAL CONTRATADO		INFORME No. 1 05/12/2024 - 26/12/2024		ACUMULADO EJECUTADO		% EJECUTADO	POR EJECUTAR		% POR EJECUTAR
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR ($)**	**+/-**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**		**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	
1	Localización y replanteo manual	m2	6650	$ 4.065,00	$ 27.032.250,00				6.650,00	$ 27.032.250,00	6.650,00	$ 27.032.250,00	6.650,00	$ 27.032.250,00	100%			
2	Limpieza y descapote manual 10 cm, incluye retiro	m2	6650	$ 6.309,00	$ 41.954.850,00				6.650,00	$ 41.954.850,00	6.650,00	$ 41.954.850,00	6.650,00	$ 41.954.850,00	100%			
3	Colchon de arena 5 cm	m3	332,5	$ 251.407,00	$ 83.592.828,00				332,50	$ 83.592.828,00	332,50	$ 83.592.828,00	332,50	$ 83.592.828,00	100%			
4	Suministro e instalación de tanque tipo austrialiano 73100 lt	und	70	$ 11.673.799,00	$ 817.165.930,00				70,00	$ 817.165.930,00	-		-			70,00	$ 817.165.930,00	100%
5	Divulgar y socializar el proyecto a la comunidad y actores involucrados	und	70	$ 24.871,00	$ 1.740.970,00				70,00	$ 1.740.970,00	-		-			70,00	$ 1.740.970,00	100%
COSTO DIRECTO					**$ 971.486.828,00**					**$ 971.486.828,00**		**$ 152.579.928,00**		**$ 152.579.928,00**			**$ 818.906.900,00**	
ADMINISTRACIÓN				20%	194297365,6					194297365,6		30515985,6		30515985,6			163781380	
IMPREVISTOS				1%	9714868,28					9714868,28		1525799,28		1525799,28			8189069	
UTILIDADES				9%	87433814,52					87433814,52		13732193,52		13732193,52			73701621	
IVA sobre utilidad				19%	16612424,76					16612424,76		2609116,77		2609116,77			14003307,99	
COSTO INDIRECTO					**$ 308.058.432,00**					**$ 308.058.432,00**		**$ 48.383.095,17**		**$ 48.383.095,17**			**$ 259.675.354,83**	
VALOR TOTAL					**$ 1.279.545.260,00**					**$ 1.279.545.260,00**		**$ 200.963.023,17**		**$ 200.963.023,17**			**$ 1.078.582.254,83**	
PORCENTAJE DE AVANCE											**15,71%**		**15,71%**			**84,29%**		

AVANCE FÍSICO : 15,71%

OBSERVACIONES:


DIANA PATRICIA AVELLA VILLAMIZAR
RESIDENTE DE OBRA

MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JESUS ENRIQUE VARGAS
DIRECTOR DE OBRA

MAIRA ALEJANDRA DICON GARCIA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Anexo No. 5.
REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA

Corponor	**ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	

DEL 5/12/2024 HASTA 30/12/2024

CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 - 2024

UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**	**INFORME No.**	**1**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**Localización y replanteo manual**	**DESDE:**	**5/12/2024**
		HASTA:	**30/12/2024**



Localización y replanteo manual




Localización y replanteo manual



Localización y replanteo manual



Localización y replanteo manual

Corponor	**ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	

DEL 5/12/2024 HASTA 30/12/2024

CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 - 2024

UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**	**INFORME No.**	**1**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**Colchon de arena 5 cm**	**DESDE:**	**5/12/2024**
		HASTA:	**30/12/2024**



Colchon de arena 5 cm




Colchon de arena 5 cm



Colchon de arena 5 cm



Colchon de arena 5 cm

Corponor	**ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	

DEL 5/12/2024 HASTA 30/12/2024

CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 - 2024

UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**	**INFORME No.**	**1**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**Limpieza y descapote manual 10 cm, incluye retiro**	**DESDE:**	**5/12/2024**
		HASTA:	**30/12/2024**



Limpieza y descapote
manual 10 cm, incluye retiro



Limpieza y descapote
manual 10 cm, incluye retiro



Limpieza y descapote
manual 10 cm, incluye retiro



Limpieza y descapote
manual 10 cm, incluye retiro


Corponor	**ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	

DEL 5/12/2024 HASTA 30/12/2024


CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 - 2024

UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**	**INFORME No.**	**1**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**Instalacion de vaya informativa**	**DESDE:**	**5/12/2024**
		HASTA:	**30/12/2024**

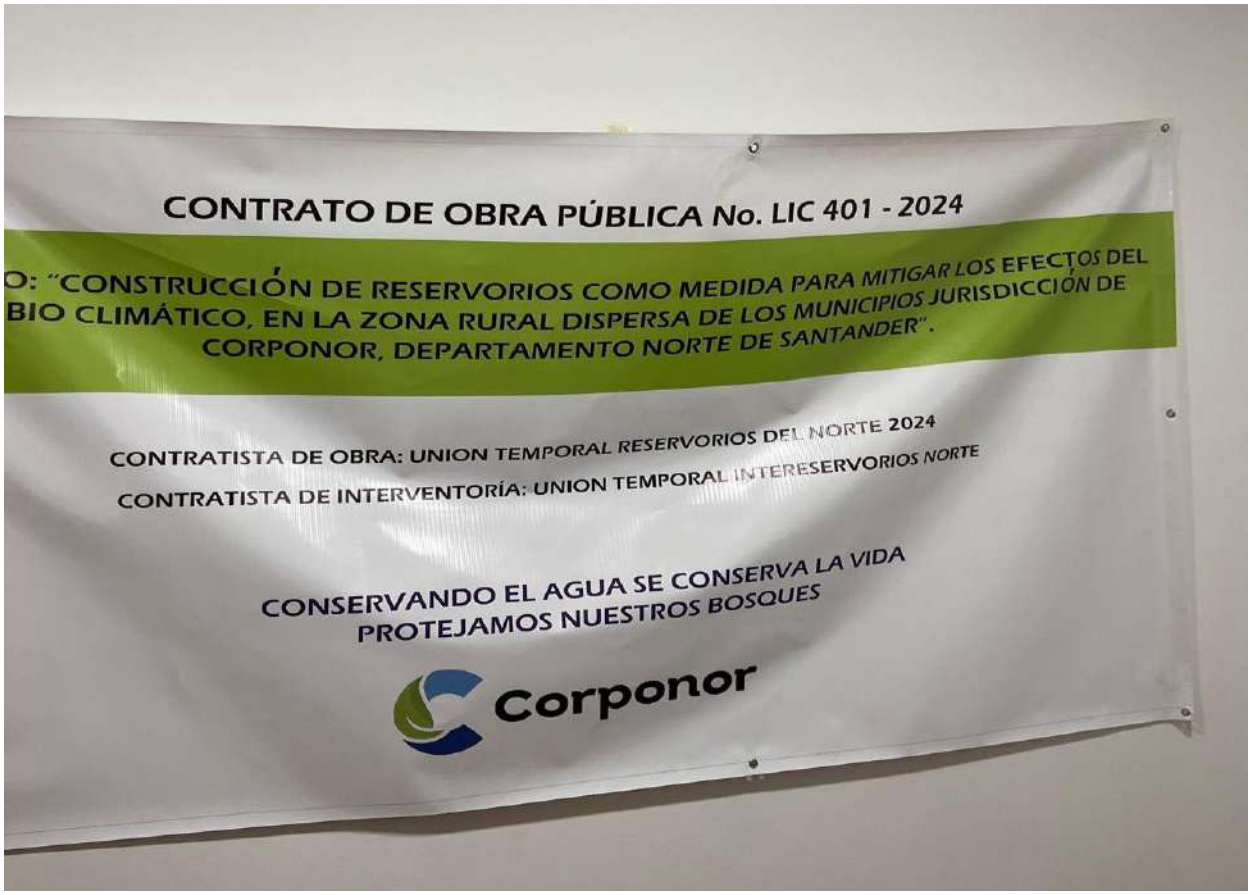

Se instalaron las vayas informativas en las diferentes alcaldias



Anexo No. 6.
RELACION DE PAGOS DE OBRA

Corponor

ANEXO 6. RELACIÓN DE PAGOS DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024



CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 - 2024				CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CMA412 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024				PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER							DESDE:	5/12/2024
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024	SUPERVISOR:	JAVIER ALEXIS BECERRA ALBARRACIN	INTERVENTOR:	LINTERRESE	INFORME No.	1	HASTA:	26/12/2024

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO						MODIFICACION O ADICIÓN Fecha			TOTAL CONTRATADO		ACTA PARCIAL No. 1 05/12/2024 - 26/12/2024		ACUMULADO EJECUTADO Y PAGADO EN ACTAS		% PAGADO	POR COBRAR		% POR COBRAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR ($)	+/-	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)		CANTIDAD	VALOR ($)	
1	Localización y replanteo manual	m2	6650	$ 4.065,00	$ 27.032.250,00				6.650,00	$ 27.032.250,00	6.650,00	$ 27.032.250,00	6.650,00	$ 27.032.250,00	100%			
2	Limpieza y descapote manual 10 cm, incluye retiro	m2	6650	$ 6.309,00	$ 41.954.850,00				6.650,00	$ 41.954.850,00	6.650,00	$ 41.954.850,00	6.650,00	$ 41.954.850,00	100%			
3	Colchon de arena 5 cm	m3	332,5	$ 251.407,00	$ 83.592.828,00				332,50	$ 83.592.828,00	332,50	$ 83.592.828,00	332,50	$ 83.592.828,00	100%			
4	Suministro e instalación de tanque tipo austrialiano 73100 lt	und	70	$ 11.673.799,00	$ 817.165.930,00				70,00	$ 817.165.930,00			-			70,00	$ 817.165.930,00	100%
5	Divulgar y socializar el proyecto a la comunidad y actores involucrados	und	70	$ 24.871,00	$ 1.740.970,00				70,00	$ 1.740.970,00			-			70,00	$ 1.740.970,00	100%
COSTO DIRECTO					**$ 971.486.828,00**					**$ 971.486.828,00**		**$ 152.579.928,00**		**$ 152.579.928,00**			**$ 818.906.900,00**	
ADMINISTRACIÓN				20%	194297365,6					194297365,6		30515985,6		30515985,6			163781380	
IMPREVISTOS				1%	9714868,28					9714868,28		1525799,28		1525799,28			8189069	
UTILIDADES				9%	87433814,52					87433814,52		13732193,52		13732193,52			73701621	
IVA sobre utilidad				19%	16612424,76					16612424,76		2609116,77		2609116,77			14003307,99	
COSTO INDIRECTO					**$ 308.058.432,00**					**$ 308.058.432,00**		**$ 48.383.095,17**		**$ 48.383.095,17**			**$ 259.675.354,83**	
VALOR TOTAL					**$ 1.279.545.260,00**					**$ 1.279.545.260,00**		**$ 200.963.023,17**		**$ 200.963.023,17**			**$ 1.078.582.254,83**	
PORCENTAJE DE AVANCE												**15,71%**		**15,71%**			**84,29%**	

AVANCE FÍSICO : **15,71%**

OBSERVACIONES:

DIANA PATRICIA AVELLA VILLAMIZAR
RESIDENTE DE OBRA

MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JESUS ENRIQUE VARGAS
DIRECTOR DE OBRA

MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 6. RELACIÓN DE PAGOS DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024



CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 - 2024				CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CMA412 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024				PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER							DESDE:	5/12/2024
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024	SUPERVISOR:	JAVIER ALEXIS BECERRA ALBARRACIN	INTERVENTOR:	LINTERRESE	INFORME No.	1	HASTA:	26/12/2024

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATISTA DE OBRA

Valor inicial del contrato	**$**	**1.279.545.260,00**
Valor Adicional del contrato	**$**	**-**
Valor Total del contrato	**$**	**1.279.545.260,00**


No. Acta	Valor cobrado	Valor Acumulado	Saldo del contrato	% parcial ejecutado	% ejecutado acumulado	Periodo cobrado		Comprobante de egreso	Observaciones
						Desde	Hasta		
1	$ 200.963.023,17	$ 200.963.023,17	$ 1.078.582.236,83	15,71%	15,71%	5/12/2024	30/12/2024		
				0%					

DIANA PATRICIA AVELLA VILLAMIZAR
RESIDENTE DE OBRA

MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JESUS ENRIQUE VARGAS
DIRECTOR DE OBRA

MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



Anexo *No.* 7.
ACTA DE SOCIALIZACIÓN

Corponor	SOCIALIZACIÓN PROYECTOS MITIGACIÓN DEL RIESGO REUNION INICIAL	
CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 de 2024 **OBJETO:** **"CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".**	**CONTRATISTA:** **UNIÓN TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024** **R/L. ZURISADAY PRADILLA ATUESTA**	**INTERVENTORÍA:** **UT INTERRESERVORIOS NORTE** **R/L MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA**
FECHA: 4-12-24	**HORA INCIO: 10:00 AM**	**HORA FIN: 12:00 PM**
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER		
MUNICIPIO: CUCUTILLA		
LUGAR: VIVE DIGITAL		

En el día de hoy se reunieron representantes de la Comunidad, de CORPONOR, representantes de la firma contratista con el objeto de socializar las obras de "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

CORPONOR: Javier Alexis Becerra Albarracín

Jefe oficina Gestión de Proyectos

CORPONOR: Javier Enrique Trujillo Camacho

Profesional Universitario Oficina Gestión de Proyectos

Comunidad: Juntas de Acción Comunal

Representantes del Contratista responsable del proyecto: ZURISADAY PRADILLA.

Representantes de la Corporaciòn: Funcionarios Oficina de Proyectos.

Representantes de la interventoria responsable del proyecto: MARIA ALEJANDRA PICON.

Representantes del Municipio: SEC. PLANEACION ANGEL ALBARRACIN.

OBJETIVO DEL LA REUNIÓN:

1. Dar inicio a la intervención formalmente ante la comunidad
2. Presentar el proyecto y resolver las inquietudes de los asistentes con relación al mismo
3. Presentar a los reponsables del proyecto y establecer los canales de comunicación para la atención al ciudadano
4. Exponer la estrategia de Veedurías Ciudadanas como el mecanismo de rendición de cuentas y participación ciudadana establecido por CORPONOR.

TEMAS TRATADOS:

Explicar a la comunidad las actividades que hacen parte del objeto del contrato
Duración de la obra
Alcance del contrato
Presentación de los contratistas
Participación de la comunidad

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS ESTABLECIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Dar cumplimiento al objeto del contrato	Firma contratista	Acorde a la duración del mismo
Verificar el cumplimiento del objeto del contrato y obligaciones del contratista	Supervisión de CORPONOR	Durante la ejecución del contrato
Prestar apoyo y seguimiento para el cumplimiento de las actividades del contrato	Comunidad - Comité de veeduria	Durante la ejecución del contrato

DIRECTORIO DE CONTACTOS:

Personas que participarán en el seguimiento al desarrollo del proyecto, para cualquier tema con relación al proyecto de parte de CORPONOR, El Contratista de Obra, Interventoria y Representante del Comité de Veeduría

NOMBRE	CARGO/EMPRESA	TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO
ANGEL EUELIO ALBARRACIN	SEC. PLANEACION	3114764350.
MATIAS CHACON	VEEDURIA.	3202435167.
HERNANDO PARADA	VEEDURIA.	3163917571.
YEFERSON CONTRERAS	VEEDURIA.	3209666548.
SADAY PRADILLA.	CONTRATISTA.	3228509948.
MAIRA ALEJANDRA PICON	INTERVENTORIA	3208994100.

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.

Corponor

SOCIALIZACIÓN PROYECTOS DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA
REUNION INICIAL

CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 de 2024
OBJETO:
"CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

LUGAR : VIVE DIGITAL CUCUTILLA **FECHA: 4 DE DICIEMBRE DE 2024**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



Corponor

CONTROL DE ASISTENCIA – LISTADO DE PARTICIPANTES
REUNIONES CON COMUNIDADES

ASUNTO: Socialización proyecto construcción Reservorios- LIC-401-2024.

LUGAR Y FECHA: Cucutilla. Diciembre 4 de 2024.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	VEREDA	PREDIO O ENTIDAD	TELEFONO / CELULAR
1	Yeferson Danpel Contreras	1005011471	Alrededor	Luzcal	3208666508
2	Maria Camila Acuña Prada	1090546054	B. Molino		3104856197
3	Adriana Cardina Carvallido	1093767492	Morales		3177549218
4	Luis Eudoro Lizcano Gelves	5.431.115	Alto de lomeso	lu victoria del carmen	3118165115
5	Rosalino Sepulveda Gelvez	5.431.737	Pedregal Bajo		3115301257
6	Matias Chacon Hernandez	88345.312	Pedregal Alto	Cueva Rica	3202435167
7	Hernando Parada Gelvez	88145454	Morgrecha Sur	La loma	3143917571
8	Elsa Leonor Gelvez Contreras	60262763	Vereda San Miguel Alto	El Palchal	3115492840
9	Orfa Lucelly Lizcano Edgar Galvis	88157.701.	Vereda. Caracoli	La loma	3118787576 3208555330.
10	Fredy Arley Vargas Granados	91.508.162	UMATA	UMATA	3112430368.
11	Analyd Julyana Sanchez Diaz	1005171134		Interventoría	3208419919100
12	Javier Enrique Trujillo C	13.469.231		CORPONOR / Proyectos	3107537332.
13	Angel Julio Albornoz Rubio	88145839	Alrededor Cucutilla	Soc. planeación	3114764350
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Corponor	SOCIALIZACIÓN PROYECTOS MITIGACIÓN DEL RIESGO REUNION INICIAL	
CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 de 2024 **OBJETO:** **"CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".**	**CONTRATISTA:** **UNIÓN TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024** **R/L. ZURISADAY PRADILLA ATUESTA**	**INTERVENTORÍA:** **UT INTERRESERVORIOS NORTE** **R/L MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA**
FECHA: 3 DE DICIEMBRE DE 2024	**HORA INCIO: 2:00PM**	**HORA FIN: 4:00PM**
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER		
MUNICIPIO: SALAZAR DE LAS PALMAS		
LUGAR: VIVE DIGITAL		

En el día de hoy se reunieron representantes de la Comunidad, de CORPONOR, representantes de la firma contratista con el objeto de socializar las obras de "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

CORPONOR: Javier Alexis Becerra Albarracín

Jefe oficina Gestión de Proyectos

CORPONOR: Javier Enrique Trujillo Camacho

Profesional Universitario Oficina Gestión de Proyectos

Comunidad: Juntas de Acción Comunal

Representantes del Contratista responsable del proyecto: ZURISADAY PRADILLA ATUESTA

Representantes de la Corporaciòn: Funcionarios Oficina de Proyectos.

Representantes de la interventoria responsable del proyecto: MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA

Representantes del Municipio: JUAN CARLOS BAIBOR

OBJETIVO DEL LA REUNIÓN:

1. Dar inicio a la intervención formalmente ante la comunidad
2. Presentar el proyecto y resolver las inquietudes de los asistentes con relación al mismo
3. Presentar a los reponsables del proyecto y establecer los canales de comunicación para la atención al ciudadano
4. Exponer la estrategia de Veedurías Ciudadanas como el mecanismo de rendición de cuentas y participación ciudadana establecido por CORPONOR.

TEMAS TRATADOS:

Explicar a la comunidad las actividades que hacen parte del objeto del contrato
Duración de la obra
Alcance del contrato
Presentación de los contratistas
Participación de la comunidad

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS ESTABLECIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Dar cumplimiento al objeto del contrato	Firma contratista	Acorde a la duración del mismo
Verificar el cumplimiento del objeto del contrato y obligaciones del contratista	Supervisión de CORPONOR	Durante la ejecución del contrato
Prestar apoyo y seguimiento para el cumplimiento de las actividades del contrato	Comunidad - Comité de veeduria	Durante la ejecución del contrato

DIRECTORIO DE CONTACTOS:

Personas que participarán en el seguimiento al desarrollo del proyecto, para cualquier tema con relación al proyecto de parte de CORPONOR, El Contratista de Obra, Interventoría y Representante del Comité de Veeduría

NOMBRE	CARGO/EMPRESA	TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO
ZURISADAY PRADILLA ATUESTA	CONTRATISTA	322 8507948
MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA	INTERVENTORIA	3208499100
JUAN CARLOS BAIBOR	ALCLADE	3252426346
SANDRITH PEÑARANDA GUTIERREZ	SECRETARIA DE PLANEACION	3142993185
JESUS BAUTISTA	VEEDURIA	3112026783
OSCAR JAVIER GRANADOS	VEEDURIA	3219685688

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.

Corponor

SOCIALIZACIÓN PROYECTOS DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA
REUNION INICIAL

CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 de 2024
OBJETO:
"CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

LUGAR : ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARBOLEDAS **FECHA: 4 DE DICIEMBRE DE 2024**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



Corponor

CONTROL DE ASISTENCIA – LISTADO DE PARTICIPANTES
REUNIONES CON COMUNIDADES

ASUNTO: Socialización Obras Construcción de Reservorios. LIC-401-2024

LUGAR Y FECHA: Salazar de las Palmas, Diciembre 3 de 2024

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	VEREDA	PREDIO O ENTIDAD	TELEFONO / CELULAR
1	JESUS ALBERTO BAUTISTA	88178937	Juan Esteban	San Francisco	3112026783
2	Oscar Javier Granados Rey	88236463	Los Mercados	La cabaña	3214685688
3	Miguel A. Rojas Ríos	5440690	Alto de los sanchez	San Javier	3142661034
4	Arturo Buendia Arias	13239683	Alto de los Sandias	el Boterito	3214367141
5	ELEAZAR Buendia Tirado	3124159130	Alto de los Sanchez	El desengaño	3124159130
6	Sandrith Peñaranda Gutierrez	1043886454	—	Alcaldia Salazar	3142493185
7	Eddy Belén Garcia pabón	27.805595	Carrizal	la esperanza	3216554945
8	Jose Carlos Bacca.	88179533		Alcalde.	3212426396.
9	Gloria Stella Ortiz	27.805384	Vda Zulia	Predio el Leon	3115529489
10	Marcal Dario Delgado	88179754	Bajo Arenal	El Mason	317.313.9925
11	Analyd Juliana Sanchez Diaz	1090517134		Interventoria	3208499100.
12	Javier E Trujillo C.	13469231		CORPONOR / Proyectos	3107537332
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Corponor	SOCIALIZACIÓN PROYECTOS MITIGACIÓN DEL RIESGO REUNION INICIAL	
CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 de 2024 **OBJETO:** **"CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".**	**CONTRATISTA:** **UNIÓN TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024** **R/L. ZURISADAY PRADILLA ATUESTA**	**INTERVENTORÍA:** **UT INTERRESERVORIOS NORTE** **R/L MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA**
FECHA: 5 DE DICIEMBRE DE 2024	**HORA INCIO: 9:00 AM**	**HORA FIN: 11:00 AM**
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER		
MUNICIPIO: DURANIA		
LUGAR: ALCALDIA DE DURANIA		

En el día de hoy se reunieron representantes de la Comunidad, de CORPONOR, representantes de la firma contratista con el objeto de socializar las obras de "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

CORPONOR: Javier Alexis Becerra Albarracín

Jefe oficina Gestión de Proyectos

CORPONOR: Javier Enrique Trujillo Camacho

Profesional Universitario Oficina Gestión de Proyectos

Comunidad: Juntas de Acción Comunal

Representantes del Contratista responsable del proyecto: ZURISADAY PRADILLA.

Representantes de la Corporación: Funcionarios Oficina de Proyectos.

Representantes de la interventoria responsable del proyecto: MAIRA ALEJANDRA PICON.

Representantes del Municipio: MARLYN YOHANA MARQUEZ RIVERA.

OBJETIVO DEL LA REUNIÓN:

1. Dar inicio a la intervención formalmente ante la comunidad
2. Presentar el proyecto y resolver las inquietudes de los asistentes con relación al mismo
3. Presentar a los reponsables del proyecto y establecer los canales de comunicación para la atención al ciudadano
4. Exponer la estrategia de Veedurías Ciudadanas como el mecanismo de rendición de cuentas y participación ciudadana establecido por CORPONOR.

TEMAS TRATADOS:

Explicar a la comunidad las actividades que hacen parte del objeto del contrato
Duración de la obra
Alcance del contrato
Presentación de los contratistas
Participación de la comunidad

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS ESTABLECIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Dar cumplimiento al objeto del contrato	Firma contratista	Acorde a la duración del mismo
Verificar el cumplimiento del objeto del contrato y obligaciones del contratista	Supervisión de CORPONOR	Durante la ejecución del contrato
Prestar apoyo y seguimiento para el cumplimiento de las actividades del contrato	Comunidad - Comité de veeduria	Durante la ejecución del contrato

DIRECTORIO DE CONTACTOS:

Personas que participarán en el seguimiento al desarrollo del proyecto, para cualquier tema con relación al proyecto de parte de CORPONOR, El Contratista de Obra, Interventoria y Representante del Comité de Veeduria

NOMBRE	CARGO/EMPRESA	TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO
MARLYN MARQUEZ	ALCALDESA	3223135511
SANTIAGO MORENO.	INTERVENTORIA.	3214326161
ZURISADAY PRADILLA.	CONTRATISTA.	3229507948
LUIS HERNANDO CASTELLANO	VEEDURIA.	3115246579
GUILLERMO JOSE TORRES	VEEDURIA.	3115357795.
LUIS ALEJANDRO CARVAJAL	VEEDURIA.	3124584565.

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.

Corponor

SOCIALIZACIÓN PROYECTOS DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA
REUNION INICIAL

CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 de 2024
OBJETO:
"CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

LUGAR : ALCALDÍA MUNICIPAL DE DURANIA **FECHA: 5 DE DICIEMBRE DE 2024**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



Corponor

CONTROL DE ASISTENCIA – LISTADO DE PARTICIPANTES
REUNIONES CON COMUNIDADES

ASUNTO: Socialización obras construcción de Reservorios LIC-401-2024

LUGAR Y FECHA: Durania, Diciembre 5 de 2024

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	VEREDA	PREDIO O ENTIDAD	TELEFONO / CELULAR
1	Angelica Bustos Saenz	27696636	La chuspa	La calera	3124503093
2	Omar Enrique Durán Bustos	1090465218	SAN JUAN	EL RECREO	3176094959
3	Guillermo Flores P	1956478	Tejarito	La union chiquita	3115457795
4	Octavio Vega serrano	5139665	El inmenso	Finca balcon	3208866572
5	Marino Jerez	5440532	Buena vista	Miloflores	3107608597
6	[illegible] Marquez Rivera	60 390198		Alcaldesa	3227[illegible]
7	Freddy Moncada	88025113	Libano	LA colorada	3204942256
8	Henry Moncada	88177417	Santa elena	LA fuente.	3124160470
9	Diomar Diaz (Luis Hernando, cast diaz)	88242646	Cuatadoras	Santana	3115246579
10	Luis Alejandro Carvajal S.	13235783	San Juan	Nuevo Malecon	31245845 65
11	Francisco Julio Suarez	5441586	Retiro	Villa leiva	3180117777
12	Nidia Zuleima Caicedo.	27697341	Sepolturas		3122614485
13	Javier E Trujillo C	13.469.231	—	CORPONOR / Proyectos	3107537332
14	Analyd Juliana Sanchez Diaz	1090517134	—	Interventoria	3208499100
15	Santiago Moreno Castellon	1233508292	—	Interventoria	3214726161
16					
17					
18					
19					
20					

Corponor	**SOCIALIZACIÓN PROYECTOS MITIGACIÓN DEL RIESGO** **REUNION INICIAL**	
CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 de 2024 **OBJETO:** **"CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".**	**CONTRATISTA:** **UNIÓN TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024** **R/L. ZURISADAY PRADILLA ATUESTA**	**INTERVENTORÍA:** **UT INTERRESERVORIOS NORTE** **R/L MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA**
FECHA: 4-12-24	**HORA INCIO: 2:00 PM**	**HORA FIN: 04:00 PM**
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER		
MUNICIPIO: ARBOLEDAS		
LUGAR: ALCALDIA DE ARBOLEDAS		

En el día de hoy se reunieron representantes de la Comunidad, de CORPONOR, representantes de la firma contratista con el objeto de socializar las obras de "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

CORPONOR: Javier Alexis Becerra Albarracín

Jefe oficina Gestión de Proyectos

CORPONOR: Javier Enrique Trujillo Camacho

Profesional Universitario Oficina Gestión de Proyectos

Comunidad: Juntas de Acción Comunal

Representantes del Contratista responsable del proyecto: ZURISADAY PRADILLA.

Representantes de la Corporaciòn: Funcionarios Oficina de Proyectos.

Representantes de la interventoria responsable del proyecto: MAIRA ALEJANDRA PICON.

Representantes del Municipio: ANA ELETICIA AMBARRACIN BALAGUERA.

OBJETIVO DEL LA REUNIÓN:

1. Dar inicio a la intervención formalmente ante la comunidad
2. Presentar el proyecto y resolver las inquietudes de los asistentes con relación al mismo
3. Presentar a los reponsables del proyecto y establecer los canales de comunicación para la atención al ciudadano
4. Exponer la estrategia de Veedurías Ciudadanas como el mecanismo de rendición de cuentas y participación ciudadana establecido por CORPONOR.

TEMAS TRATADOS:

Explicar a la comunidad las actividades que hacen parte del objeto del contrato
Duración de la obra
Alcance del contrato
Presentación de los contratistas
Participación de la comunidad

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS ESTABLECIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Dar cumplimiento al objeto del contrato	Firma contratista	Acorde a la duración del mismo
Verificar el cumplimiento del objeto del contrato y obligaciones del contratista	Supervisión de CORPONOR	Durante la ejecución del contrato
Prestar apoyo y seguimiento para el cumplimiento de las actividades del contrato	Comunidad - Comité de veeduria	Durante la ejecución del contrato

DIRECTORIO DE CONTACTOS:

Personas que participarán en el seguimiento al desarrollo del proyecto, para cualquier tema con relación al proyecto de parte de CORPONOR, El Contratista de Obra, Interventoría y Representante del Comité de Veeduría

NOMBRE	CARGO/EMPRESA	TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO
ANA ELETICIA AMBARACIN.	EXTENSION RURAL	3213733685.
PEDRO JOSE CASTILLO.	VEEDURIA.	3212659520.
ALVEIRO URBINA.	VEEDURIA.	3102109265.
JUAN TARAZONA.	VEEDURIA.	3229372355.
SORAY PRADILLA.	CONTRATISTA	3228507948
NAIRA APICON.	INTERVENTORIA	3208999100.

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.

Corponor

SOCIALIZACIÓN PROYECTOS DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA
REUNION INICIAL

CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 de 2024
OBJETO:
"CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

LUGAR : ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARBOLEDAS **FECHA: 4 DE DICIEMBRE DE 2024**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



Corponor

CONTROL DE ASISTENCIA – LISTADO DE PARTICIPANTES
REUNIONES CON COMUNIDADES

ASUNTO: Socialización Obras construcción de Reservorios. LIC-401-2024

LUGAR Y FECHA: Arboledas, Diciembre 3 de 2024.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	VEREDA	PREDIO O ENTIDAD	TELEFONO / CELULAR
1	Gladys Emira Rolón de Ardila	27619054	Juan Bueno	El Reparo	3144437686
2	Josefinidad S	8826948	Juan Bucho	El Palmita	3225864289
3	Campo Elias Rozo	1092645662	San pablo Nuevo	Materiba	3224576492
4	Jose Perez	13411 039.	Juan Bueno	La loma.	
5	Juan Carlos Tarazona Hernandez	1092.647228	Almendro	La Jagua	322 8723551
6	Veronica Tarazona Hernandez	27622251	Almendro	El coro	3143801229
7	Pedro-José Castillo C.	13.411.879	Sinaida	El Bambam	3212659520
8	Norayma Parada U.	1092645438	San Joaquin.	Santa Ana	3134953321
9	Ana E. Albarracin Balaguera	1091.802031	Alcaldia	Coord. Extension Rural	3213733685
10	Alveiro urbina U	88249888	Almendro	buena vista	3109109965
11	Analyd Juliana Sanchez Ortiz	1090517134	—	Interventoria.	3208499100
12	JHON carlos Bustos	1092644525	MOHAN	Ajustes	3123242799
13	Javier E Trujillo C	13469.231	—	CORPONOR/proyectos	3107537332
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Corponor	**SOCIALIZACIÓN PROYECTOS DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA** **REUNION INICIAL**	
CONTRATO DE OBRA No. LIC -401-2024 **OBJETO:** **CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**	**CONTRATISTA:** **UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024** **R/L: ZURISADAY PRADILLA ATUESTA**	**INTERVENTORÍA:** **UNION TEMPORAL INTERESERVORIOS NORTE** **R/L:MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA**

FECHA: DICIEMBRE 18 DEL 2024	**HORA INCIO: 10:00 PM**	**HORA FIN:**
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER		
MUNICIPIO: SILOS		
LUGAR: ALCALDÍA MUNICIPAL		

En el día de hoy se reunieron representantes de la Comunidad, de CORPONOR, representantes de la firma contratista e interventoria con el objeto de socializar las obras de OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

CORPONOR: Melva Yaneth Alvarez Vargas

Subdirectora de Planeación y Fronteras

CORPONOR: Javier Enrique Trujillo Camacho

Profesional Universitario Subdirección de Planeación y Fronteras

Comunidad: Beneficiarios del Proyecto

Representantes del Contratista responsable del proyecto:

Representantes de la Interventoría contratada para el proyecto:

OBJETIVO DEL LA REUNIÓN:

1. Dar inicio a la intervención formalmente ante la comunidad
2. Presentar el proyecto y resolver las inquietudes de los asistentes con relación al mismo
3. Presentar a los reponsables del proyecto y establecer los canales de comunicación para la atención al ciudadano
4. Exponer la estrategia de Veedurías Ciudadanas como el mecanismo de rendición de cuentas y participación ciudadana establecido por CORPONOR.

TEMAS TRATADOS:

Explicar a la comunidad las actividades que hacen parte del objeto del contrato
Duración de la obra
Contratación de mano de obra de la localidad
Alcance del contrato
Presentación de los contratistas e interventoria
Participación de la comunidad

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS ESTABLECIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Dar cumplimiento al objeto del contrato	Firma contratista	Acorde a la duración del mismo
Verificar el cumplimiento del objeto del contrato y obligaciones del contratista	Firma interventoria	Durante la ejecución del contrato
Prestar apoyo y seguimiento para el cumplimiento de las actividades del contrato	Comunidad - Comité de veeduria	Durante la ejecución del contrato

DIRECTORIO DE CONTACTOS:

Personas que participarán en el seguimiento al desarrollo del proyecto, para cualquier tema con relación al proyecto de parte de CORPONOR, El Contratista de Obra, La Interventoría y El Representante del Comité de Veeduría

NOMBRE	CARGO/EMPRESA	TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO
Wilson Umaña	Representante alcalde	3219696945
Santiago Hoyos	Interventor	3214326161
Javier E Trujillo	Corponor	3109539392
Luis Ernesto Zapata	Veeduría	3168647803
Gloria Hernandez	veeduría	3167496047

Scanned with CamScanner

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.

Corponor

SOCIALIZACIÓN PROYECTOS DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA

LUGAR : SILOS **FECHA: 18-12-2024**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



Scanned with CamScanner

Corponor

CONTROL DE ASISTENCIA – LISTADO DE PARTICIPANTES
REUNIONES CON COMUNIDADES

ASUNTO: CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

LUGAR Y FECHA:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	VEREDA	PREDIO O ENTIDAD	TELEFONO / CELULAR
1	Zoraida gonzalez	27846860	pachacual (aguedina)	El Tunel	3118824764
2	Victor Florez Rodriguez	88760897	Ranchadero	Bentana grande	3224675654
3	Ciro Jaimes Laguado	88'166.007	Ranchadero	Finca el Degredo	3157386730
4	Luis Ernesto capacho C.	8875903	pachacual	Finca el pino	3158642803
5	Elcida Correa pabon	27847079	pachacual	Finca el Cocano	3102899969
6	Florencio Fuentes	5.504.208	Ranchadero	Finca la oyada	3203208049
7	Cristina Delgado	88760977	Ranchadero	Puente Piedra	3188528777
8	Gloria Hernandez	27751791	Aguedina	Finca La union	3157490647
9	William Alfredo Romero Tarazona	88157285	UMATA	Alcaldia silos	3213969645
10	Santiago Moreno Castrillon	1233508297	—	Intervencion	3147266
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Scanned with CamScanner

Corponor	**SOCIALIZACIÓN PROYECTOS DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA** **REUNION INICIAL**

CONTRATO DE OBRA No. LIC -401-2024 **OBJETO:** **CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**	**CONTRATISTA:** **UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024** **R/L: ZURISADAY PRADILLA ATUESTA**	**INTERVENTORÍA:** **UNION TEMPORAL INTERESERVORIOS NORTE** **R/L:MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA**

FECHA: DICIEMBRE 10 DEL 2024	**HORA INCIO: 10:00 PM**	**HORA FIN:**
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER		
MUNICIPIO: SAN CAYETANO		
LUGAR: ALCALDÍA MUNICIPAL		

En el día de hoy se reunieron representantes de la Comunidad, de CORPONOR, representantes de la firma contratista e interventoria con el objeto de socializar las obras de OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

CORPONOR: Melva Yaneth Alvarez Vargas

Subdirectora de Planeación y Fronteras

CORPONOR: Javier Enrique Trujillo Camacho

Profesional Universitario Subdirección de Planeación y Fronteras

Comunidad: Beneficiarios del Proyecto

Representantes del Contratista responsable del proyecto:

Representantes de la Interventoría contratada para el proyecto:

OBJETIVO DEL LA REUNIÓN:

1. Dar inicio a la intervención formalmente ante la comunidad
2. Presentar el proyecto y resolver las inquietudes de los asistentes con relación al mismo
3. Presentar a los reponsables del proyecto y establecer los canales de comunicación para la atención al ciudadano
4. Exponer la estrategia de Veedurías Ciudadanas como el mecanismo de rendición de cuentas y participación ciudadana establecido por CORPONOR.

TEMAS TRATADOS:

Explicar a la comunidad las actividades que hacen parte del objeto del contrato
Duración de la obra
Contratación de mano de obra de la localidad
Alcance del contrato
Presentación de los contratistas e interventoría
Participación de la comunidad

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS ESTABLECIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Dar cumplimiento al objeto del contrato	Firma contratista	Acorde a la duración del mismo
Verificar el cumplimiento del objeto del contrato y obligaciones del contratista	Firma interventoria	Durante la ejecución del contrato
Prestar apoyo y seguimiento para el cumplimiento de las actividades del contrato	Comunidad - Comité de veeduria	Durante la ejecución del contrato

DIRECTORIO DE CONTACTOS:

Personas que participarán en el seguimiento al desarrollo del proyecto, para cualquier tema con relación al proyecto de parte de CORPONOR, El Contratista de Obra, La Interventoría y El Representante del Comité de Veeduría

NOMBRE	CARGO/EMPRESA	TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO
Saday Pradilla	Contratista	322 850 7948
Carmen Parada Jobino	Veeduría	323 30 93 620
Deadys Arenes Salano	Veeduría	310 603 9374
Carlos Enrique Pato Zuleta	Veeduría	320 998 52 46
Santiago Moreno Castaño	Interventoría	321 4925161

Scanned with CamScanner

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.

Corponor

SOCIALIZACIÓN PROYECTOS DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA

LUGAR : SAN CAYETANO **FECHA: 10-12-2024**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



Scanned with CamScanner

Corponor

CONTROL DE ASISTENCIA – LISTADO DE PARTICIPANTES
REUNIONES CON COMUNIDADES

ASUNTO:

LUGAR Y FECHA:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	VEREDA	PREDIO O ENTIDAD	TELEFONO / CELULAR
1	Beatriz Arenas Solano	63535740	La Palma	Alfomante	3106039374
2	Miriam Peña Peres	37176515	urimaco	Finca canaan	3115068216
3	Carmen Felisa Parada urbina	1091966378	Guaduas	Rancho Alegre	3235093625
4	Yasmin Irzaraza Villamizar	60354792	la florida	Siken	3222729919
5	John Javier Aguilar Solano	1094346993	la palma	finca el oasis	3125529980
6	Mario Alvarez lopez	1090471565	Guaduas	los tesoros	3213270214
7	Jose Vicente Suarez Blanco	88288664	La Palma	los cachos Varado	3105604056
8	nubia stella Avarez soto	27818822	la Florida	los tamarindo	3106987515
9	Miguel Alvarez SOTO	5489620	la florida	CHaparral	3213725694
10	Graciela Zuleta Caceres	27696630	Ayacucho	los Alpes-Ayacucho	3203985745
11	Santiago Moreno Castrillon	1233582292	—	Inventoria	3214926161
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Scanned with CamScanner

Corponor	**SOCIALIZACIÓN PROYECTOS DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA** **REUNION INICIAL**

CONTRATO DE OBRA No. LIC -401-2024 **OBJETO:** **CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**	**CONTRATISTA:** **UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024** **R/L: ZURISADAY PRADILLA ATUESTA**	**INTERVENTORÍA:** **UNION TEMPORAL INTERESERVORIOS NORTE** **R/L:MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA**

FECHA: DICIEMBRE 11 DEL 2024	**HORA INCIO: 10:00 PM**	**HORA FIN:**
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER		
MUNICIPIO: MUTISCUA		
LUGAR: ALCALDÍA MUNICIPAL		

En el día de hoy se reunieron representantes de la Comunidad, de CORPONOR, representantes de la firma contratista e interventoria con el objeto de socializar las obras de OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

CORPONOR: Melva Yaneth Alvarez Vargas

Subdirectora de Planeación y Fronteras

CORPONOR: Javier Enrique Trujillo Camacho

Profesional Universitario Subdirección de Planeación y Fronteras

Comunidad: Beneficiarios del Proyecto

Representantes del Contratista responsable del proyecto:

Representantes de la Interventoria contratada para el proyecto:

OBJETIVO DEL LA REUNIÓN:

1. Dar inicio a la intervención formalmente ante la comunidad
2. Presentar el proyecto y resolver las inquietudes de los asistentes con relación al mismo
3. Presentar a los reponsables del proyecto y establecer los canales de comunicación para la atención al ciudadano
4. Exponer la estrategia de Veedurías Ciudadanas como el mecanismo de rendición de cuentas y participación ciudadana establecido por CORPONOR.

TEMAS TRATADOS:

Explicar a la comunidad las actividades que hacen parte del objeto del contrato
Duración de la obra
Contratación de mano de obra de la localidad
Alcance del contrato
Presentación de los contratistas e interventoría
Participación de la comunidad

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS ESTABLECIDOS:

COMPROMISO	**RESPONSABLE**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Dar cumplimiento al objeto del contrato	Firma contratista	Acorde a la duración del mismo
Verificar el cumplimiento del objeto del contrato y obligaciones del contratista	Firma interventoria	Durante la ejecución del contrato
Prestar apoyo y seguimiento para el cumplimiento de las actividades del contrato	Comunidad - Comité de veeduria	Durante la ejecución del contrato

DIRECTORIO DE CONTACTOS:

Personas que participarán en el seguimiento al desarrollo del proyecto, para cualquier tema con relación al proyecto de parte de CORPONOR, El Contratista de Obra, La Interventoría y El Representante del Comité de Veeduría

NOMBRE	**CARGO/EMPRESA**	**TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO**
Santiago Mesa Castillo	Interventoria	3214726161
Esperanza Dias Jaimes	Veeduria	3122321812
José alberto Bautista	Veeduría	313 499 2483
Isidro Cadenas	Veeduría	314 393 5056
Javier E Trujillo	Cooperador	310 737 7777
Erday Pradilla	Contratista	322 850 9948

Scanned with CamScanner

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.

Corponor

SOCIALIZACIÓN PROYECTOS DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA

LUGAR : MUTISCUA **FECHA: 11-12-2024**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



Scanned with CamScanner

Corponor

CONTROL DE ASISTENCIA – LISTADO DE PARTICIPANTES
REUNIONES CON COMUNIDADES

ASUNTO:

LUGAR Y FECHA:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	VEREDA	PREDIO O ENTIDAD	TELEFONO / CELULAR
1	Rafael Eduardo Cambaza Cano	1094808508	Tapagua	Rascador	3123159146
2	Alonso Rodriguez	27.751.304	Aventino		3106417
3	Esperanza Diaz Jaimes	60.252.910	San Agustin	El Guichal	3122321812
4	Maxia Graciela Hernandez	37.751418	Sucre	Arenal	3705764
5	Campo Elias Jaimes	5.468765	Sucre	Reposo	3134
6	Wilmer Hernandez suarez	88031523	Sucre	Vano grande 2	3214476444
7	Jose Alberto Barrago	88762315	Sucre	La acuatra	3134992483
8	Jose Libardo Galvez Jaimes	88031576	Sucre	El Recreo	3212106214
9	Humberto Contreras Gamboa	———	Las Mercedes	El Tabano	3143335056
10	Maria Elena Barrago Ramon	1094808737	Tapagua	El arrayan	3223898361
11	Javier E Trujillo Camacho	13.169.231	——	CORPONOR	3107337332
12	Ana Edelmira Sierra Hoyos	27'751.932	El Aventino	Alcaldia Mutiscua	3152467751
13	Yesid Leonardo Cha	88.034.676	Tapaguci	Las Tapias	3204755
14	Pablo Enrique Acevedo Gil	5.435.320	Aventino	El Arrayan	3124122311
15	Eder Bladimir Jaimes Galvez	1094808444	Ospina	la laguna	3204981
16	Henry Ricardo Contreras	1094808307	las mercedes	La Huerta	3214498
17	Santiago Moreno Caballero	1233508292	——	Intervention	3214926
18					
19	Pablo Antonio Peña Barrago	1972140	Las Mercedes	Mercedes	3123508
20					

Scanned with CamScanner

Anexo *No.* 8.

ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ VEEDURÍAS CIUDADANAS.

Corponor	**VEEDURÍAS CIUDADANAS** **ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ**	
CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 de 2024 **OBJETO:** **"CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.**	**CONTRATISTA:** **UNIÓN TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024** **R/L. ZURISADAY PRADILLA ATUESTA**	**INTERVENTORÍA:** **UT INTERRESERVORIOS NORTE** **R/L MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA**

FECHA: 4 DE DICIEMBRE 2024

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER

MUNICIPIO: CUCUTILLA

LUGAR: VIVE DIGITAL

DESARROLLO

El dia de hoy se realiza la reunión inicial de socialización del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER" con el fin de conformar las Veedurías Ciudadanas, así como comunicar a la comunidad acerca de las actividades del proyecto. Se presentan los contratistas responsables de la obra y se describen las actividades del proyecto.

Los objetivos del Comité de Veeduría Ciudadana son:

1. Permitir que la información que CORPONOR, El Contrastista de Obra e intervnetoría suministren acerca de la intervención, sea divulgada a la Comunidad

2. Contribuir a que CORPONOR, El Contrastista de Obra y la interventoría, tengan contacto organizado y eficaz con representantes de la comunidad para así evitar desinformación

Las responsabilidades del Comité de Veeduría Ciudadana son:

1. Servir de canal de comunicación entre la comunidad y CORPONOR, El Contrastista de Obra y la interventoría, transmitir la información de avance del proyecto a los diferentes sectores, que a su vez informarán a la población interesada en el proyecto de la comunidad

2. Co-administrar los Servicios de Atención al Ciudadano, con el fin de canalizar las inquietudes de la comunidad

3. Apoyar la realización y presentación de informes de su seguimiento y demás que sean requeridos

4. Colaborar al Contratista de Obra y a la Interventoria, para informar a la ciudadanía de los riesgos de no respetar las medidas de seguridad relacionadas con el proyecto

Los requisitos para participar en el Comité de Veeduría Ciudadana son los siguientes:

* Disponibilidad de tiempo para participar en las reuniones ó comités que se programen durante el desarrollo del proyecto

* Vivir o desarrollar actividades en el sector donde se desarrolla el proyecto

* Tener interés en el desarrollo de su sector y el bienestar colectivo y no particular

* Tener un punto donde se pueda localizar fácilmente por teléfono o correo electrónico

* Comprometerse a transmitir la información que recibe de manera veraz a la comunidad del avance del proyecto

CORPONOR, El Contrastista de Obra y la Interventoria, se comprometen a transmitirle información al COMITÉ para su difusión, así como a atender, de manera oportuna a sus integrantes, en los espacios que para ello se determinen.

La comunidad presente, manifiesta su aceptación de los miembros postulados para conformar el Comité de Veeduría Ciudadana, por lo tanto queda conformado por las siguientes personas, y se certifica con el listado anexo.

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.

Corponor	**VEEDURÍAS CIUDADANAS** **ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ**

CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 de 2024
OBJETO:
"CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

LUGAR : MUNICIPIO DE CUCUTILLA — **FECHA: 4 DE DICIEMBRE DE 2024**

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

El Comité de Veeduría Ciudadana del Proyecto, quedó conformado de la siguiente manera:

1	NOMBRE Y APELLIDO: Matías Chacon Hernandez		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 88145312
	TELÉFONO: 3202435167	CORREO ELECTRÓNICO: nancyluzmary@hotmail.com	FIRMA: Matías Chacón Hernández
2	NOMBRE Y APELLIDO: Hernando Parada Gelvez		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 88145454
	TELÉFONO: 3143917571	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA: Hernando Parada.
3	NOMBRE Y APELLIDO: Yeferson Contreras Ortega		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 1005011471
	TELÉFONO: 3208666548	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA: Yeferson Contreras
	TELÉFONO:	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA:

REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

1	NOMBRE Y APELLIDO:		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.:
	TELÉFONO:	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA: Matías Chacón Hernández

REGISTRO FOTOGRÁFICO INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

FOTO 1



FOTO 2



Corponor	VEEDURÍAS CIUDADANAS ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ

CONTRATO DE OBRA No. LIC -401-2024 OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024 R/L: ZURISADAY PRADILLA ATUESTA	INTERVENTORÍA: UNION TEMPORAL INTERESERVORIOS NORTE R/L:MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA

FECHA: DICIEMBRE 3 DEL 2024

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER

MUNICIPIO: SALAZAR DE LAS PALMAS

LUGAR: ALCALDÍA MUNICIPAL

DESARROLLO

El día de hoy se realiza la reunión inicial de socialización del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER", con el fin de conformar las Veedurías Ciudadanas, así como comunicar a la comunidad acerca de las actividades del proyecto. Se presentan los contratistas responsables de la obra y se describen las actividades del proyecto.

Los objetivos del Comité de Veeduría Ciudadana son:

1. Permitir que la información que CORPONOR, el Contrastista de Obra ó Interventoria suministren acerca de la intervención, sea divulgada a la Comunidad

2. Contribuir a que CORPONOR, El Contrastista de Obra, la interventoría y la supervisión, tengan contacto organizado y eficaz con representantes de la comunidad para así evitar desinformación

Las responsabilidades del Comité de Veeduría Ciudadana son:

1. Servir de canal de comunicación entre la comunidad y CORPONOR, El Contrastista de Obra, la interventoría y la supervisión; transmitir la información de avance del proyecto a los diferentes sectores, que a su vez informarán a la población interesada en el proyecto de la comunidad

2. Co-administrar los Servicios de Atención al Ciudadano, con el fin de canalizar las inquietudes de la comunidad

3. Apoyar la realización y presentación de informes de su seguimiento y demás que sean requeridos

4. Colaborar al Contratista de Obra y a la Interventoría, para informar a la ciudadanía de los riesgos de no respetar las medidas de seguridad relacionadas con el proyecto

Los requisitos para participar en el Comité de Veeduría Ciudadana son los siguientes:

* Disponibilidad de tiempo para participar en las reuniones ó comités que se programen durante el desarrollo del proyecto

* Vivir o desarrollar actividades en el sector donde se desarrolla el proyecto

* Tener interés en el desarrollo de su sector y el bienestar colectivo y no particular

* Tener un punto donde se pueda localizar fácilmente por teléfono o correo electrónico

* Comprometerse a transmitir la información que recibe de manera veraz a la comunidad del avance del proyecto

CORPONOR, El Contrastista de Obra, la interventoría y la supervisión, se comprometen a transmitirle información al COMITÉ para su difusión, así como a atender, de manera oportuna a sus integrantes, en los espacios que para ello se determinen.

La comunidad presente, manifiesta su aceptación de los miembros postulados para conformar el Comité de Veeduría Ciudadana, por lo tanto queda conformado por las siguientes personas, y se certifica con el listado anexo.

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.

Corponor

VEEDURÍAS CIUDADANAS
ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ

CONTRATO DE OBRA No. LIC -401-2024

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

LUGAR :MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS **FECHA: DICIEMBRE 3 DEL 2024**

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

El Comité de Veeduría Ciudadana del Proyecto, quedó conformado de la siguiente manera:

1	NOMBRE Y APELLIDO: Miguel Rojas		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 5440690
	TELÉFONO: 3142661034	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA:
2	NOMBRE Y APELLIDO: Oscar Javier M Granados.		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 88236463
	TELÉFONO: 3219685688	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA: Oscar Javier Granados
3	NOMBRE Y APELLIDO: Jesus Bautista		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 88178937
	TELÉFONO: 3112026783	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA: Jesus A Bautista
	TELÉFONO:	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA:

REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

1	NOMBRE Y APELLIDO: Jesus Bautista		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 88178937
	TELÉFONO: 3112026783	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA: Jesus A Bautista

REGISTRO FOTOGRÁFICO INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

FOTO 1



FOTO 2



Corponor	**VEEDURÍAS CIUDADANAS** **ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ**	
CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 de 2024 **OBJETO:** **"CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.**	**CONTRATISTA:** **UNIÓN TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024** **R/L. ZURISADAY PRADILLA ATUESTA**	**INTERVENTORÍA:** **UT INTERRESERVORIOS NORTE** **R/L MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA**

FECHA: 5 DE DICIEMBRE 2024

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER

MUNICIPIO: DURANIA

LUGAR: ALCALDIA DE DURANIA

DESARROLLO

El día de hoy se realiza la reunión inicial de socialización del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER" con el fin de conformar las Veedurías Ciudadanas, así como comunicar a la comunidad acerca de las actividades del proyecto. Se presentan los contratistas responsables de la obra y se describen las actividades del proyecto.

Los objetivos del Comité de Veeduría Ciudadana son:

1. Permitir que la información que CORPONOR, El Contrastista de Obra e intervnetoría suministren acerca de la intervención, sea divulgada a la Comunidad

2. Contribuir a que CORPONOR, El Contrastista de Obra y la interventoría, tengan contacto organizado y eficaz con representantes de la comunidad para así evitar desinformación

Las responsabilidades del Comité de Veeduría Ciudadana son:

1. Servir de canal de comunicación entre la comunidad y CORPONOR, El Contrastista de Obra y la interventoría, transmitir la información de avance del proyecto a los diferentes sectores, que a su vez informarán a la población interesada en el proyecto de la comunidad

2. Co-administrar los Servicios de Atención al Ciudadano, con el fin de canalizar las inquietudes de la comunidad

3. Apoyar la realización y presentación de informes de su seguimiento y demás que sean requeridos

4. Colaborar al Contratista de Obra y a la Interventoría, para informar a la ciudadanía de los riesgos de no respetar las medidas de seguridad relacionadas con el proyecto

Los requisitos para participar en el Comité de Veeduría Ciudadana son los siguientes:

* Disponibilidad de tiempo para participar en las reuniones ó comités que se programen durante el desarrollo del proyecto

* Vivir o desarrollar actividades en el sector donde se desarrolla el proyecto

* Tener interés en el desarrollo de su sector y el bienestar colectivo y no particular

* Tener un punto donde se pueda localizar fácilmente por teléfono o correo electrónico

* *Comprometerse a transmitir la información que recibe de manera veraz a la comunidad del avance del proyecto*

CORPONOR, El Contrastista de Obra y la Interventoría, se comprometen a transmitirle información al COMITÉ para su difusión, así como a atender, de manera oportuna a sus integrantes, en los espacios que para ello se determinen.

La comunidad presente, manifiesta su aceptación de los miembros postulados para conformar el Comité de Veeduría Ciudadana, por lo tanto queda conformado por las siguientes personas, y se certifica con el listado anexo.

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.

Corponor	**VEEDURÍAS CIUDADANAS** **ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ**

CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 de 2024
OBJETO:
"CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

LUGAR :MUNICIPIO DE [illegible] . FECHA: 5 DE DICIEMBRE DE 2024

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

El Comité de Veeduría Ciudadana del Proyecto, quedó conformado de la siguiente manera:

	NOMBRE Y APELLIDO:		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.:
1	Luis Hernando Castellanos Melo		13219157
	TELÉFONO: 3115246579	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA: Luis Hernando Castellanos
	NOMBRE Y APELLIDO:		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.:
2	Luis Alejandro Carvajal Solano		13235783
	TELÉFONO: 3124584565	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA: Luis Alejandro Carvajal
	NOMBRE Y APELLIDO:		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.:
3	Guillermo Jose Torres Parra		1956478
	TELÉFONO: 3115357795	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA: Guillermo J Torres P
	TELÉFONO:	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA:

REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

	NOMBRE Y APELLIDO:		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.:
1	Luis Hernando castellanos melo		1321915 7.
	TELÉFONO: 3115246579.	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA: Luis Hernando Castellanos

REGISTRO FOTOGRÁFICO INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

FOTO 1



FOTO 2



Corponor	**VEEDURÍAS CIUDADANAS** **ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ**	
CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 de 2024 **OBJETO:** **"CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.**	**CONTRATISTA:** **UNIÓN TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024** **R/L. ZURISADAY PRADILLA ATUESTA**	**INTERVENTORÍA:** **UT INTERRESERVORIOS NORTE** **R/L MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA**

FECHA: 4 DE DICIEMBRE 2024

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER

MUNICIPIO: ARBOLEDAS

LUGAR: ALCALDIA MUNICIPAL

DESARROLLO

El día de hoy se realiza la reunión inicial de socialización del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER" con el fin de conformar las Veedurías Ciudadanas, así como comunicar a la comunidad acerca de las actividades del proyecto. Se presentan los contratistas responsables de la obra y se describen las actividades del proyecto.

Los objetivos del Comité de Veeduría Ciudadana son:

1. Permitir que la información que CORPONOR, El Contrastista de Obra e intervnetoría suministren acerca de la intervención, sea divulgada a la Comunidad

2. Contribuir a que CORPONOR, El Contrastista de Obra y la interventoría, tengan contacto organizado y eficaz con representantes de la comunidad para así evitar desinformación

Las responsabilidades del Comité de Veeduría Ciudadana son:

1. Servir de canal de comunicación entre la comunidad y CORPONOR, El Contrastista de Obra y la interventoría, transmitir la información de avance del proyecto a los diferentes sectores, que a su vez informarán a la población interesada en el proyecto de la comunidad

2. Co-administrar los Servicios de Atención al Ciudadano, con el fin de canalizar las inquietudes de la comunidad

3. Apoyar la realización y presentación de informes de su seguimiento y demás que sean requeridos

4. Colaborar al Contratista de Obra y a la Interventoría, para informar a la ciudadanía de los riesgos de no respetar las medidas de seguridad relacionadas con el proyecto

Los requisitos para participar en el Comité de Veeduría Ciudadana son los siguientes:

* Disponibilidad de tiempo para participar en las reuniones ó comités que se programen durante el desarrollo del proyecto

* Vivir o desarrollar actividades en el sector donde se desarrolla el proyecto

* Tener interés en el desarrollo de su sector y el bienestar colectivo y no particular

* Tener un punto donde se pueda localizar fácilmente por teléfono o correo electrónico

* Comprometerse a transmitir la información que recibe de manera veraz a la comunidad del avance del proyecto

CORPONOR, El Contrastista de Obra y la Interventoría, se comprometen a transmitirle información al COMITÉ para su difusión, así como a atender, de manera oportuna a sus integrantes, en los espacios que para ello se determinen.

La comunidad presente, manifiesta su aceptación de los miembros postulados para conformar el Comité de Veeduría Ciudadana, por lo tanto queda conformado por las siguientes personas, y se certifica con el listado anexo.

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.

Corponor	**VEEDURÍAS CIUDADANAS** **ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ**

CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 de 2024
OBJETO:
"CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

LUGAR : MUNICIPIO DE ARBOLEDAS — **FECHA: 4 DE DICIEMBRE DE 2024**

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

El Comité de Veeduría Ciudadana del Proyecto, quedó conformado de la siguiente manera:

1	NOMBRE Y APELLIDO: Pedro Jose Castillo Carrillo		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 13411879
	TELÉFONO: 3212659520	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA: PedroJoseCastilloC.
2	NOMBRE Y APELLIDO: Juan Carlos Tarazona		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 1092647228
	TELÉFONO: 3228723551	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA: Juan carlos Tarazona
3	NOMBRE Y APELLIDO: Alveiro Urbina Vega		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 88249888
	TELÉFONO: 3102109265	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA: Alveiro Urbina V
	TELÉFONO:	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA:

REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

1	NOMBRE Y APELLIDO: Pedro Jose Castillo Carrillo		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 13411879
	TELÉFONO: 3212659520	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA: PedroJoseCastilloC.

REGISTRO FOTOGRÁFICO INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

FOTO 1



FOTO 2



Corponor	**VEEDURÍAS CIUDADANAS** **ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ**

CONTRATO DE OBRA No. LIC -401-2024 **OBJETO:** **CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**	**CONTRATISTA:** **UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024** **R/L: ZURISADAY PRADILLA ATUESTA**	**INTERVENTORÍA:** **UNION TEMPORAL INTERESERVORIOS NORTE** **R/L:MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA**

FECHA: DICIEMBRE 10 DEL 2024

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER

MUNICIPIO: SAN CAYETANO

LUGAR: ALCALDÍA MUNICIPAL

DESARROLLO

El día de hoy se realiza la reunión inicial de socialización del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER", con el fin de conformar las Veedurías Ciudadanas, así como comunicar a la comunidad acerca de las actividades del proyecto. Se presentan los contratistas responsables de la obra y se describen las actividades del proyecto.

Los objetivos del Comité de Veeduría Ciudadana son:

1. Permitir que la información que CORPONOR, el Contrastista de Obra ó Interventoria suministren acerca de la intervención, sea divulgada a la Comunidad

2. Contribuir a que CORPONOR, El Contrastista de Obra, la interventoría y la supervisión, tengan contacto organizado y eficaz con representantes de la comunidad para así evitar desinformación

Las responsabilidades del Comité de Veeduría Ciudadana son:

1. Servir de canal de comunicación entre la comunidad y CORPONOR, El Contrastista de Obra, la interventoría y la supervisión; transmitir la información de avance del proyecto a los diferentes sectores, que a su vez informarán a la población interesada en el proyecto de la comunidad

2. Co-administrar los Servicios de Atención al Ciudadano, con el fin de canalizar las inquietudes de la comunidad

3. Apoyar la realización y presentación de informes de su seguimiento y demás que sean requeridos

4. Colaborar al Contratista de Obra y a la Interventoría, para informar a la ciudadanía de los riesgos de no respetar las medidas de seguridad relacionadas con el proyecto

Los requisitos para participar en el Comité de Veeduría Ciudadana son los siguientes:

* Disponibilidad de tiempo para participar en las reuniones ó comités que se programen durante el desarrollo del proyecto

* Vivir o desarrollar actividades en el sector donde se desarrolla el proyecto

* Tener interés en el desarrollo de su sector y el bienestar colectivo y no particular

* Tener un punto donde se pueda localizar fácilmente por teléfono o correo electrónico

* Comprometerse a transmitir la información que recibe de manera veraz a la comunidad del avance del proyecto

CORPONOR, El Contrastista de Obra, la interventoría y la supervisión, se comprometen a transmitirle información al COMITÉ para su difusión, así como a atender, de manera oportuna a sus integrantes, en los espacios que para ello se determinen.

La comunidad presente, manifiesta su aceptación de los miembros postulados para conformar el Comité de Veeduría Ciudadana, por lo tanto queda conformado por las siguientes personas, y se certifica con el listado anexo.

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.

Scanned with CamScanner

Corponor

VEEDURÍAS CIUDADANAS
ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ

CONTRATO DE OBRA No. LIC -401-2024

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

LUGAR :MUNICIPIO DE SAN CAYETANO **FECHA: DICIEMBRE 10 DEL 2024**

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

El Comité de Veeduría Ciudadana del Proyecto, quedó conformado de la siguiente manera:

	NOMBRE Y APELLIDO:		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.:
1	Carmen Felisa Parada Urbina		1091966378
	TELÉFONO: 3233093620	CORREO ELECTRÓNICO: felisa.parada06@gmail.com	FIRMA: Carmen Felisa Parada U.
	NOMBRE Y APELLIDO: Beatriz Arenas Solano		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 63 535 740
2	TELÉFONO: 3106039374	CORREO ELECTRÓNICO: betyca.frank30@gmail.com	FIRMA: Beatriz Aren S.
	NOMBRE Y APELLIDO: Carlos Enrique Pinto Zisalo		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 88261 53
3	TELÉFONO: 3203985245	CORREO ELECTRÓNICO: danisebos1220@gmail.com.	FIRMA:
	TELÉFONO:	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA:

REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

	NOMBRE Y APELLIDO:		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.:
1	Carmen Felisa Parada Urbina		1091966378
	TELÉFONO: 3233093620	CORREO ELECTRÓNICO: Felisa.Parada@gmail.com	FIRMA: Carmen Felisa Parada U.

REGISTRO FOTOGRÁFICO INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

FOTO 1



FOTO 2



Yasmin Izcazo Villamizar cc 60354792
tel 3222729919

culmanperezn@gamil.com.

Scanned with CamScanner

Corponor	VEEDURÍAS CIUDADANAS ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ	
CONTRATO DE OBRA No. LIC -401-2024 OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024 R/L: ZURISADAY PRADILLA ATUESTA	INTERVENTORÍA: UNION TEMPORAL INTERESERVORIOS NORTE R/L:MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA

FECHA: DICIEMBRE 11 DEL 2024

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER

MUNICIPIO: MUTISCUA

LUGAR: ALCALDÍA MUNICIPAL

DESARROLLO

El dia de hoy se realiza la reunión inicial de socialización del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER", con el fin de conformar las Veedurías Ciudadanas, así como comunicar a la comunidad acerca de las actividades del proyecto. Se presentan los contratistas responsables de la obra y se describen las actividades del proyecto.

Los objetivos del Comité de Veeduría Ciudadana son:

1. Permitir que la información que CORPONOR, el Contrastista de Obra ó Interventoria suministren acerca de la intervención, sea divulgada a la Comunidad

2. Contribuir a que CORPONOR, El Contrastista de Obra, la interventoría y la supervisión, tengan contacto organizado y eficaz con representantes de la comunidad para así evitar desinformación

Las responsabilidades del Comité de Veeduría Ciudadana son:

1. Servir de canal de comunicación entre la comunidad y CORPONOR, El Contrastista de Obra, la interventoría y la supervisión; transmitir la información de avance del proyecto a los diferentes sectores, que a su vez informarán a la población interesada en el proyecto de la comunidad

2. Co-administrar los Servicios de Atención al Ciudadano, con el fin de canalizar las inquietudes de la comunidad

3. Apoyar la realización y presentación de informes de su seguimiento y demás que sean requeridos

4. Colaborar al Contratista de Obra y a la Interventoría, para informar a la ciudadanía de los riesgos de no respetar las medidas de seguridad relacionadas con el proyecto

Los requisitos para participar en el Comité de Veeduría Ciudadana son los siguientes:

* Disponibilidad de tiempo para participar en las reuniones ó comités que se programen durante el desarrollo del proyecto

* Vivir o desarrollar actividades en el sector donde se desarrolla el proyecto

* Tener interés en el desarrollo de su sector y el bienestar colectivo y no particular

* Tener un punto donde se pueda localizar fácilmente por teléfono o correo electrónico

* Comprometerse a transmitir la información que recibe de manera veraz a la comunidad del avance del proyecto

CORPONOR, El Contrastista de Obra, la interventoría y la supervisión, se comprometen a transmitirle información al COMITÉ para su difusión, así como a atender, de manera oportuna a sus integrantes, en los espacios que para ello se determinen.

La comunidad presente, manifiesta su aceptación de los miembros postulados para conformar el Comité de Veeduría Ciudadana, por lo tanto queda conformado por las siguientes personas, y se certifica con el listado anexo.

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.

Scanned with CamScanner

Corponor

VEEDURÍAS CIUDADANAS
ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ

CONTRATO DE OBRA No. LIC -401-2024

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

LUGAR :MUNICIPIO DE MUTISCUA **FECHA: DICIEMBRE 11 DEL 2024**

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

El Comité de Veeduría Ciudadana del Proyecto, quedó conformado de la siguiente manera:

	NOMBRE Y APELLIDO:	CÉDULA DE CIUDADANÍA No.:
1	Esperanza Diaz Jaimes	60.252.910
	TELÉFONO: 3122321812 / CORREO ELECTRÓNICO: espe28dia2@gmail.com / FIRMA:	
	NOMBRE Y APELLIDO:	CÉDULA DE CIUDADANÍA No.:
2	Jose Alberto Beltrago	88761315
	TELÉFONO: 3134992483 / CORREO ELECTRÓNICO: / FIRMA:	
	NOMBRE Y APELLIDO:	CÉDULA DE CIUDADANÍA No.:
3	Isidro Contreras.	7094808449
	TELÉFONO: 3163735056 / CORREO ELECTRÓNICO: / FIRMA:	
	TELÉFONO: / CORREO ELECTRÓNICO: / FIRMA:	

REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

	NOMBRE Y APELLIDO:	CÉDULA DE CIUDADANÍA No.:
1	Jose Alberto Beltrago	88761315
	TELÉFONO: 3134992483 / CORREO ELECTRÓNICO: / FIRMA:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

FOTO 1



FOTO 2



Scanned with CamScanner

Corponor	VEEDURÍAS CIUDADANAS ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ	
CONTRATO DE OBRA No. LIC -401-2024 **OBJETO:** **CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**	**CONTRATISTA:** **UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024** **R/L: ZURISADAY PRADILLA ATUESTA**	**INTERVENTORÍA:** **UNION TEMPORAL INTERESERVORIOS NORTE** **R/L:MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA**

FECHA: DICIEMBRE 18 DEL 2024

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER

MUNICIPIO: SILOS

LUGAR: ALCALDÍA MUNICIPAL

DESARROLLO

El dia de hoy se realiza la reunión inicial de socialización del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER", con el fin de conformar las Veedurías Ciudadanas, así como comunicar a la comunidad acerca de las actividades del proyecto Se presentan los contratistas responsables de la obra y se describen las actividades del proyecto.

Los objetivos del Comité de Veeduría Ciudadana son:

1. Permitir que la información que CORPONOR, el Contrastista de Obra ó Interventoria suministren acerca de la intervención, sea divulgada a la Comunidad

2. Contribuir a que CORPONOR, El Contrastista de Obra, la interventoría y la supervisión, tengan contacto organizado y eficaz con representantes de la comunidad para así evitar desinformación

Las responsabilidades del Comité de Veeduría Ciudadana son:

1. Servir de canal de comunicación entre la comunidad y CORPONOR, El Contrastista de Obra, la interventoría y la supervisión; transmitir la información de avance del proyecto a los diferentes sectores, que a su vez informarán a la población interesada en el proyecto de la comunidad

2. Co-administrar los Servicios de Atención al Ciudadano, con el fin de canalizar las inquietudes de la comunidad

3. Apoyar la realización y presentación de informes de su seguimiento y demás que sean requeridos

4. Colaborar al Contratista de Obra y a la Interventoría, para informar a la ciudadanía de los riesgos de no respetar las medidas de seguridad relacionadas con el proyecto

Los requisitos para participar en el Comité de Veeduría Ciudadana son los siguientes:

* Disponibilidad de tiempo para participar en las reuniones ó comités que se programen durante el desarrollo del proyecto

* Vivir o desarrollar actividades en el sector donde se desarrolla el proyecto

* Tener interés en el desarrollo de su sector y el bienestar colectivo y no particular

* Tener un punto donde se pueda localizar fácilmente por teléfono o correo electrónico

* Comprometerse a transmitir la información que recibe de manera veraz a la comunidad del avance del proyecto

CORPONOR, El Contrastista de Obra, la interventoría y la supervisión, se comprometen a transmitirle información al COMITÉ para su difusión, así como a atender, de manera oportuna a sus integrantes, en los espacios que para ello se determinen.

La comunidad presente, manifiesta su aceptación de los miembros postulados para conformar el Comité de Veeduría Ciudadana, por lo tanto queda conformado por las siguientes personas, y se certifica con el listado anexo.

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.

Corponor

VEEDURÍAS CIUDADANAS
ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ

CONTRATO DE OBRA No. LIC -401-2024

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

LUGAR :MUNICIPIO DE SILOS — **FECHA: DICIEMBRE 18 DEL 2024**

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

El Comité de Veeduría Ciudadana del Proyecto, quedó conformado de la siguiente manera:

1	NOMBRE Y APELLIDO: Victor florez Rodriguez		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 88.160.897
	TELÉFONO: 3224615654	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA: Victor Florez R
2	NOMBRE Y APELLIDO: Ciro Jaimes Laguado		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 88.166.007
	TELÉFONO: 3157386730	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA: Ciro Jaimes Laguado
3	NOMBRE Y APELLIDO: florencio Jaimes Laguado		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 5 504 208
	TELÉFONO: 3203208049	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA: Florencio Jaimes Laguado
	TELÉFONO:	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA:

REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

1	NOMBRE Y APELLIDO: Victor flórez Rodriguez		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 88.160.897
	TELÉFONO: 3224615654	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA: Victor Florez R

REGISTRO FOTOGRÁFICO INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA


FOTO 1





FOTO 2





Anexo No. 9

Informes mensuales HSEQ con sus respectivos anexos MPA-01-F28 Versión 2.

CONTRATO No Y FECHA	LIC401-2024 del 24 de noviembre de 2024	
TIPO DE CONTRATO	OBRA	
SEMANA No:	1 a 4	
FECHA DEL INFORME	DESDE: 05 de diciembre de 2024	HASTA: 30 de diciembre de 2024
FECHA DE ENTREGA DEL INFORMA	30 de diciembre de 2024	
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024 R/L Zurisaday Pradilla Atuesta	
SUPERVISOR CORPONOR	JAVIER ALEXIS BECERRA ALBARRACIN	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Desde el área de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa y en cumplimiento del decreto 1072 de 2015 – Decreto único del sector Trabajo y Resolución 0312 de 2019. Estándares mínimos del SG-SST, UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024, ha realizado las siguientes actividades:

1. INDUCCIÓN DE PERSONAL

En el proceso de inducción de personal el responsable de SG-SST, de la Unión Temporal capacita al personal en las siguientes temáticas:

- Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo
- Socialización de Políticas
  - Política SST
  - Política de Prevención Alcoholismo, Sustancias Psicoactivas y Tabaquismo
  - Política Prevención de acoso laboral
- Socialización de reglamentos
  - Reglamento interno de trabajo
  - Reglamento de higiene y seguridad industrial

- Socialización de Perfiles ocupacionales y responsabilidades generales ante el SG-SST

- Socialización de Funcionamiento del Vigía de S.S.T. y/o COPASST – y convivencia laboral

- Socialización de Metodología de Identificación de peligros y valoración de riesgos GTC-45 y se realiza actividad taller de identificación de peligros y valoración de riesgos, donde se explican cada uno de los riesgos y peligros contemplados en la GTC-45 para determinar los asociados a la labor a desempeñar, según cada cargo.

- Socialización de procedimiento Reportes incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laborales, donde se determinan las responsabilidades tanto de la Unión Temporal como de cada uno de los empleados, se recalca la importancia del reporte oportuno

- Importancia y obligación del uso de Elementos de protección personal – E.P.P.

- Socialización de procedimiento de inspección y se explica la importancia de inspeccionar los sitios de trabajo con el fin de identificar posibles causas de accidentalidad y eliminarlas, o reportar al jefe inmediato para realizar intervención

2. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y ATENCION DE EMERGENCIAS

- Se realiza la entrega de los EPP y dotación correspondiente tales como: Camisa, pantalón, botas, casco y guantes.

- Entrega de botiquín personal para atención de emergencias

3. EXAMENES MEDICOS DE INGRESO

Se realizan los exámenes médicos de ingreso en convenio con las **IPS MEDCARE DE COLOMBIA S.A.S Y SALUD EMPRESARIAL** y estos adicionales son socializados a cada uno de los empleados con el fin de notificar su estado de salud actual al momento de ingreso a la empresa donde se tienen en cuenta.

- Recomendaciones medicas
- Restricciones medicas
- Seguimientos médicos
- Necesidad de incluir en un PVE

Se les hace entrega de la copia del resultado de exámenes médicos con el fin de que el empleado cuente con soporte documental de su estado de salud.

4. PROCESOS DE AFILIACION

Desde el área administrativa se realizan las respectivas afiliaciones a los diferentes subsistemas de salud, se dejan evidencias soporte del proceso de afiliación y se anexa en hoja de vida, las evidencias son:

- Afiliación a ARL - Sura
- Afiliación a EPS - Depende de cada EPS del empleado
- Afiliación a CCF - EL personal se afilia a COMFANORTE
- Afiliación a AFP - Depende de cada AFP del empleado

5. PLAN DE FORMACION

El área de seguridad y salud en el trabajo realizara actividades de medicina preventiva en formación para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedad laboral:

- Uso de los EPP
- Inducción de SG-SST.

6. INSPECCIONES EN SITIOS DE TRABAJO

Se realizaron visitas de inspección a beneficiarios para monitoreo de avances del proyecto, con el fin de validar:

- Uso de los EPP
- Control de avances
- Capacitaciones a personal en puntos de trabajo (charlas)

7. NOMBRAMIENTO DEL VIGIA Y CCL

El día 05 de diciembre de 2024 el responsable del SG-SST cita al personal de la unión temporal por solicitud de gerencia designando como líder a **DIANA PATRICIA AVELLA** identificado con C.C 60.488.600 de Cúcuta quien a partir de la fecha realizará las siguientes funciones:

- Participar de las actividades de promoción, divulgación e información, sobre seguridad y salud en el trabajo entre empleadores y trabajadores, para obtener su participación en el desarrollo de los programas y actividades del SG-SST;
- Actuar como instrumento de vigilancia para el cumplimiento del SG-SST en los lugares de trabajo de la empresa e informar sobre el estado de ejecución de los mismos a las autoridades de seguridad y salud en el trabajo cuando haya deficiencias en su desarrollo;

- Recibir copias, por derecho propio, de las conclusiones sobre inspecciones e investigaciones que realicen las autoridades de seguridad y salud en el trabajo en los sitios de trabajo.
- Proponer a la administración de la empresa o establecimiento de trabajo la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo.
- Proponer y participar en actividades de capacitación en seguridad y salud en los trabajos dirigidos a trabajadores, supervisores y directivos de la empresa
- Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de seguridad y salud en el trabajo en las actividades que éstos adelanten en la empresa y recibir por derecho propio los informes correspondientes.
- Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de seguridad y salud en el trabajo debe realizar la empresa de acuerdo con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes; promover su divulgación y observancia.
- Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y proponer al empleador las medidas correctivas que haya lugar para evitar su ocurrencia. Evaluar los programas que se hayan realizado.
- Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de trabajadores e informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control.
- Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores en la solución de los problemas relativos a la seguridad y salud en el trabajo. Tramitar los reclamos de los trabajadores relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
- Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y enfermedades laborales con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en la Resolución 2013 de 1986.
- Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se desarrollen el cual estará en cualquier momento a disposición del empleador, los trabajadores y las autoridades competentes.
- Las demás funciones que le señalen las normas sobre seguridad y salud en el trabajo.

Quien además la persona anteriormente mencionada además de la función como vigía, realizará las funciones como miembro principal del comité de convivencia laboral.

Teniendo en cuenta que si se realizan procesos de contratación que aumenten la cantidad de empleados de 10 en adelante se realizará proceso de elección para definir miembros designados y miembros elegidos por votación para que hagan parte tanto del comité de convivencia laboral como del COPASST

8. REPORTE DE INCIDENTES - ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O ENFERMEDAD LABORAL

En fecha de levantamiento y corte del presente informe del 05 de diciembre del 2024 al 30 de diciembre de 2024, no se evidencian reportes de incidentes y/o accidentes reportados por el personal activo laboralmente.

ZURISADAY PRADILLA ATUESTA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA
1.	Matriz de riesgo de la obra (Formato propio de la unión temporal o consorcio).		X
2.	Plan de manejo ambiental (Formato propio de la unión temporal o consorcio).		X
3.	Plan de señalización (Formato propio de la unión temporal o consorcio).		X
4.	Plan de emergencia (Formato propio de la unión temporal o consorcio).		X
5.	Novedades de personal de obra (Ver anexo 1).	SI	
6.	Empleos generados de obra (Ver anexo).	SI	
7.	Constancia de entrega de dotación en obras públicas (Ver anexo).	SI	
8.	Capacitación o charla en obras públicas (Ver anexo).	SI	
9.	Formato Inspección de botiquín y camilla en obras públicas (Ver anexo 5).		X
10.	Formato inspección de extintores en obras públicas (Ver anexo 6).		X
11.	Formato inspección de vehículos en obras públicas (Ver anexo 7).		X
12.	Formato inspección de volquetas en obras públicas (Ver anexo 8).		X
13.	Formato inspección de maquinaria pesada y equipos ligeros en obras públicas (ver anexo 9).		X
14.	Formato señalización en obras públicas (ver anexo 10).		X

Nota: los formatos se entregan mensualmente adjuntos a los informes mensuales de obra

REGISTRO FOTOGRAFICO

	
FOTO No.1: Entrega de EPP	FOTO No. 2: Trabajo en terreno

ANEXOS

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

ANEXO N° 1. NOVEDADES

Corponor

ANEXO 1. NOVEDADES DE PERSONAL DE OBRA
MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.:LIC401-2024 del 24 de noviembre de 2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: CMA412 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA DE OBRA: UNIÓN TEMPORAL RESERVORIOS 2024	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: UNIÓN TEMPORALINTERRESERVORIOS NORTE

CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

MES No.	1	DESDE:	5/12/2024
		HASTA:	30/12/2024

No.	NOMBRE	APELLIDO	C.C.	NOVEDAD			Nº DIAS LABORADOS	DIRECTO	INDIRECTO	SALUD	ARL	PENSIÓN
				ING	RET	INC						
1	Zurisaday	Pradilla	1093785015	X			30		X	Nueva EPS	Sura	Porvenir
2	Jesús	Vega	88 211 813	X			30	X		Sanitas	Sura	Porvenir
3	Diana	Avella	60.488.600	X			30	X		Sanitas	Sura	Porvenir
4	Libardo	Cuadros	1094348076	X			30	X		Nueva EPS	Sura	Porvenir

Zurisaday Pradilla

ZURISADAY PRADILLA ATUESTA

REPRESENTANTE LEGAL

UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024

ANEXO N° 2. EMPLEOS GENERADOS

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

Corponor

ANEXO 2. EMPLEOS GENERADOS DE OBRA

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.:LIC401-2024 del 24 de noviembre de 2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: CMA412 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: UNIÓN TEMPORALINTERRESERVORIOS NORTE

CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

MES No.	1	DESDE:	5/12/2024
		HASTA:	30/12/2024

No.	CARGO	DIRECTOS	INDIRECTOS
1	REPRESENTANTE LEGAL		1
2	DIRECTOR DE OBRA	1	
3	RESIDENTE DE OBRA	1	
4	OBRERO	1	
	TOTAL	3	1


ZURISADAY PRADILLA

REPRESENTANTE LEGAL

UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024

ANEXO N° 3. ENTREGA DE DOTACIÓN

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

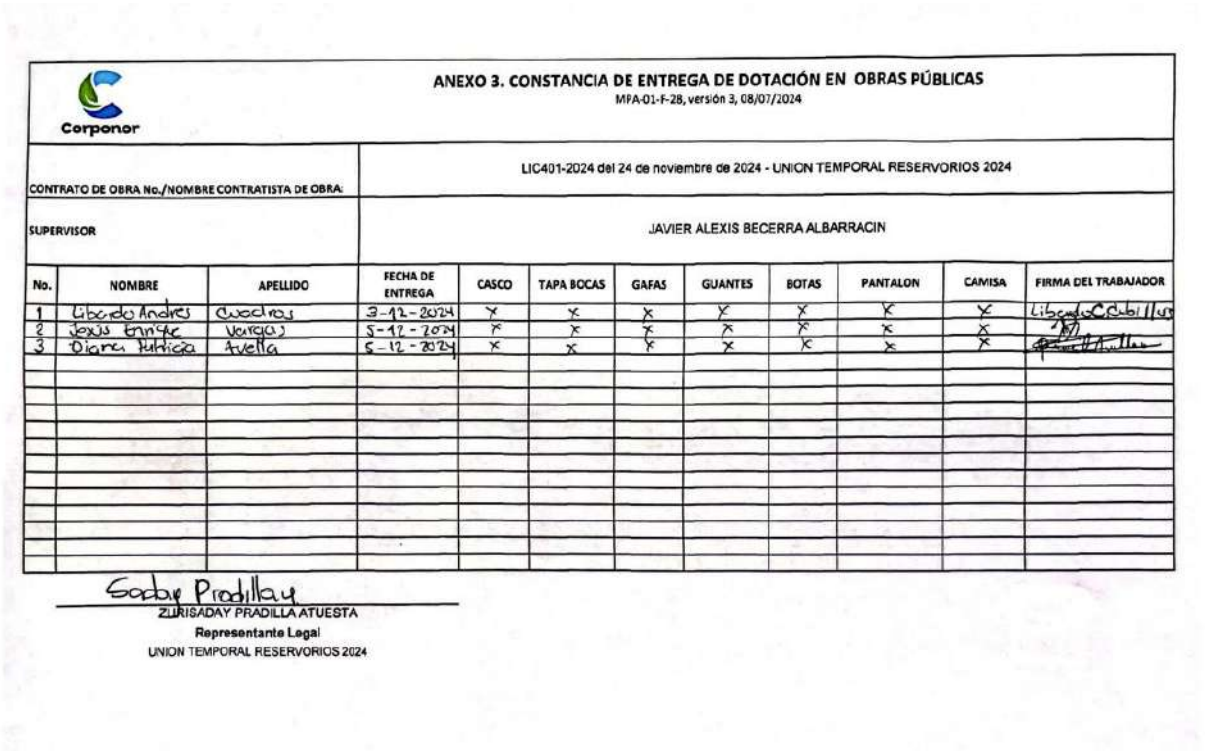

ANEXO 3. CONSTANCIA DE ENTREGA DE DOTACIÓN EN OBRAS PÚBLICAS
MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No./NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	LIC401-2024 del 24 de noviembre de 2024 - UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024
SUPERVISOR	JAVIER ALEXIS BECERRA ALBARRACIN

No.	NOMBRE	APELLIDO	FECHA DE ENTREGA	CASCO	TAPA BOCAS	GAFAS	GUANTES	BOTAS	PANTALON	CAMISA	FIRMA DEL TRABAJADOR
1	Libardo Andres	Cuadros	3-12-2024	X	X	X	X	X	X	X	
2	Jesus Enrique	Noriega	5-12-2024	X	X	X	X	X	X	X	
3	Diana Patricia	Avella	5-12-2024	X	X	X	X	X	X	X	

ZURISADAY PRADILLA ATUESTA
Representante Legal
UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024

ANEXO N° 4. CAPACITACIÓN O CHARLA EN OBRAS PÚBLICAS

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

ANEXO 4. CAPACITACIÓN O CHARLAS EN OBRAS PUBLICAS

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No./NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	LIC401-2024 del 24 de noviembre de 2024 - UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024
SUPERVISOR	JAVIER ALEXIS BECERRA ALBARRACIN
OBJETO DE LA CAPACITACIÓN	Induccion del SG-SST
FECHA DE REALIZACIÓN:	05-12-2024

No.	Nombre	Apellido	Cédula	Firma
1	Libardo Andres	Cuadros	1.04.348.08	
2	Jexis Enrique	Vargas	88. 211. 61	
3	Diana Patricia	Avella	60. 448. 60	

Sabay Pradilla y

ZURISADAY PRADILLA ATUESTA
Representante Legal
UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024

Corponor

ANEXO 4. CAPACITACIÓN O CHARLAS EN OBRAS PUBLICAS

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No./NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	LIC401-2024 del 24 de noviembre de 2024 - UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024
SUPERVISOR	JAVIER ALEXIS BECERRA ALBARRACIN
OBJETO DE LA CAPACITACIÓN	Uso de los EPP
FECHA DE REALIZACIÓN:	05-12-2024

No.	Nombre	Apellido	Cédula	Firma
1	Libardo Andres	Cuadros	1064848026	
2	Jesus Enrique	Vargas	88 211 813	
3	Diana Patricia	Avella	60 448600	

Soplay Pradilla

ZURISADAY PRADILLA ATUESTA
Representante Legal
UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024

ANEXO 5. EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024	GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 1.0
	EVALUACION DE LA INDUCCION	Fecha: diciembre 2024
		Página 1 de 2

NOMBRE:	Libardo Andrés Cuadros C	NÚMERO CEDULA:	1094348026
OBRA:	U.T Reservorios del Nte 2024	FECHA:	3/12/2024
CARGO	Obrero		

EVALUACIÓN S.S.T

1. Identifique los factores de riesgo presentes en su puesto de trabajo: (Marcar *con una X)*

	BIOLOGICO		FISICO		QUIMICO		FENOMENOS NATURALES		CONDICIONES DE SEGURIDAD
X	Virus	X	Ruido	X	Polvos	X	Sismo		Mecánico
X	Bacterias		Iluminación		Fibras		Terremoto		Eléctrico
	Hongos		Vibración		Líquidos		Vendaval		Locativo
	Parásitos		Temperaturas extremas		Gases y Vapores		Inundación		Tecnológico
X	Picaduras		Presión atmosférica		Humos		Derrumbe	X	Accidentes de transito
X	Mordeduras		Radiaciones ionizantes	X	Material particulado	X	Precipitaciones		Públicos
	Fluidos o excrementos		Radiaciones no ionizantes		———		———		Trabajo en Alturas

	BIOMECANICOS		PSICOLOGICOS
X	Postura		Gestión organizacional
X	Esfuerzo		Características de la organización del trabajo
	Movimiento repetitivo		Características del grupo social de trabajo
	Manipulación manual de cargas	X	Condiciones de la tarea
—	———		Interfase persona - tarea
—	———		Jornada de trabajo

2. Identifique los E.P.P. (Equipos de protección persona que debe usar con respecto a su puesto de trabajo. (Marcar *con una X)*

X	Casco de Seguridad	X	Tapabocas
	Gorro o cofia		Respiradores
	Gafas de Seguridad		Orejeras
	Monogafas de Seguridad		Guantes plásticos
	Careta de Seguridad		Guantes de aluminio
	Guantes dieléctricos	X	Botas de seguridad
X	Botas plásticas		Arnés
	Zapatos antideslizantes		Casco con barbuquejo
X	Dotación		Calzado

UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024	GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 1.0
	EVALUACION DE LA INDUCCION	Fecha: diciembre 2024
		Página 2 de 2

3. Preguntas de selección múltiple: (Marque con un X)

1. ¿Qué es un accidente de trabajo?:

(a.) Todo acontecimiento repentino que suceda por causa o con ocasión del trabajo que desempeña una persona y que por este hecho el trabajador tenga una lesión en su cuerpo, se perturben sus funciones, se le genere una invalidez o incluso el trabajador muera
b. son las posibilidades de que un trabajador sufra una enfermedad o un accidente vinculado a su trabajo
c. Ninguna de las anteriores

2. ¿Cuántos días se dispone para reportar el accidente de trabajo?

(a) Inmediato
b. Cinco días
c. No se deben reportar

3. ¿A dónde debo llevar mis incapacidades laborales?

a. Clínica
(b.) UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024

4. ¿A qué clínica debe dirigirse en caso de accidente de trabajo?

a. Clínica Norte
b. Clínica san José
c. Clínica Santa Ana
(d.) Hospital más cercano a la obra

4. Indique si el enunciado presentado es Falso o Verdadero

Enunciado	V	F
a. Es una obligación que los empleados mantengan los EPP durante el desarrollo de su actividad laboral	X	
b. Es una prohibición el ingerir sustancias psicoactivas o fumar en el lugar de trabajo	X	
c. Se deben reportar los Incidentes y Accidentes de trabajo	X	
d. Es obligatorio reportar con antelación los permisos para ausentarse de la empresa (citas, reuniones, diligencias personales)	X	
e. Lo exámenes médicos de ingreso sirven para validar el estado de salud de los empleados que ingresen a la organización	X	
f. El procedimiento de descargos permite realizar llamados de atención de manera correcta sin vulnerar los derechos de los empleados, basándose en el Reglamento internos de trabajo	X	

CALIFICACIÓN	50
CALIFICADOR	Sorday Prudilla
ACCION DE MEJORA	No aplica.

Libardo Andres C.	Libardo Andres Cuadros	1094348026
NOMBRES	**FIRMA**	**CEDULA**

UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024	GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 1.0
	EVALUACION DE LA INDUCCION	Fecha: diciembre 2024
		Página 1 de 2

NOMBRE:	Jesus Enrique Vargas R.	NÚMERO CEDULA:	88.211.813
OBRA:	U.T Reservorios de Norte 2024	FECHA:	5/12/2024
CARGO	Director de Obra		

EVALUACIÓN S.S.T

1. Identifique los factores de riesgo presentes en su puesto de trabajo: (Marcar *con una X)*

	BIOLOGICO		FISICO		QUIMICO		FENOMENOS NATURALES		CONDICIONES DE SEGURIDAD
X	Virus	X	Ruido	X	Polvos	X	Sismo	X	Mecánico
X	Bacterias		Iluminación		Fibras		Terremoto	X	Eléctrico
	Hongos		Vibración		Líquidos		Vendaval		Locativo
	Parásitos		Temperaturas extremas		Gases y Vapores		Inundación		Tecnológico
X	Picaduras		Presión atmosférica		Humos		Derrumbe	X	Accidentes de transito
	Mordeduras		Radiaciones ionizantes		Material particulado	X	Precipitaciones		Públicos
	Fluidos o excrementos		Radiaciones no ionizantes		———		———		Trabajo en Alturas

	BIOMECANICOS		PSICOLOGICOS
X	Postura		Gestión organizacional
X	Esfuerzo		Características de la organización del trabajo
X	Movimiento repetitivo		Características del grupo social de trabajo
	Manipulación manual de cargas	X	Condiciones de la tarea
—	———		Interfase persona - tarea
—	———		Jornada de trabajo

2. Identifique los E.P.P. (Equipos de protección persona que debe usar con respecto a su puesto de trabajo. (Marcar *con una X)*

X	Casco de Seguridad	X	Tapabocas
	Gorro o cofia		Respiradores
X	Gafas de Seguridad		Orejeras
	Monogafas de Seguridad		Guantes plásticos
	Careta de Seguridad		Guantes de aluminio
	Guantes dieléctricos	X	Botas de seguridad
X	Botas plásticas		Arnés
	Zapatos antideslizantes		Casco con barbuquejo
X	Dotación		Calzado

UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024	GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 1.0
	EVALUACION DE LA INDUCCION	Fecha: diciembre 2024
		Página 2 de 2

3. Preguntas de selección múltiple: (Marque con un X)

1. ¿Qué es un accidente de trabajo?: X a. Todo acontecimiento repentino que suceda por causa o con ocasión del trabajo que desempeña una persona y que por este hecho el trabajador tenga una lesión en su cuerpo, se perturben sus funciones, se le genere una invalidez o incluso el trabajador muera b. son las posibilidades de que un trabajador sufra una enfermedad o un accidente vinculado a su trabajo c. Ninguna de las anteriores	2. ¿Cuántos días se dispone para reportar el accidente de trabajo? X a. Inmediato b. Cinco días c. No se deben reportar
3. ¿A dónde debo llevar mis incapacidades laborales? a. Clínica X b. UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024	4. ¿A qué clínica debe dirigirse en caso de accidente de trabajo? a. Clínica Norte b. Clínica san José c. Clínica Santa Ana X d. Hospital más cercano a la obra

4. Indique si el enunciado presentado es Falso o Verdadero

Enunciado	V	F
a. Es una obligación que los empleados mantengan los EPP durante el desarrollo de su actividad laboral	X	
b. Es una prohibición el ingerir sustancias psicoactivas o fumar en el lugar de trabajo	X	
c. Se deben reportar los Incidentes y Accidentes de trabajo	X	
d. Es obligatorio reportar con antelación los permisos para ausentarse de la empresa (citas, reuniones, diligencias personales)	X	
e. Lo exámenes médicos de ingreso sirven para validar el estado de salud de los empleados que ingresen a la organización	X	
f. El procedimiento de descargos permite realizar llamados de atención de manera correcta sin vulnerar los derechos de los empleados, basándose en el Reglamento internos de trabajo	X	

CALIFICACIÓN	5.0
CALIFICADOR	Saday Pradilla
ACCION DE MEJORA	No aplica

Jesus Enrique Vargas		88.211.713
NOMBRES	FIRMA	CEDULA

UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024	GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 1.0
	EVALUACION DE LA INDUCCION	Fecha: diciembre 2024
		Página 1 de 2

NOMBRE:	Ana Patricia Ayella	NÚMERO CEDULA:	60. 488. 600
OBRA:	Unión Temporal Reservorios	FECHA:	5/12/2024
CARGO	Residente de Obra		

EVALUACIÓN S.S.T

1. Identifique los factores de riesgo presentes en su puesto de trabajo: (Marcar *con una X)*

	BIOLOGICO		FISICO		QUIMICO		FENOMENOS NATURALES		CONDICIONES DE SEGURIDAD
X	Virus	X	Ruido	X	Polvos	X	Sismo		Mecánico
	Bacterias		Iluminación		Fibras		Terremoto		Eléctrico
	Hongos		Vibración		Líquidos		Vendaval		Locativo
	Parásitos		Temperaturas extremas		Gases y Vapores		Inundación		Tecnológico
X	Picaduras		Presión atmosférica		Humos		Derrumbe	X	Accidentes de transito
	Mordeduras		Radiaciones ionizantes	X	Material particulado	X	Precipitaciones		Públicos
	Fluidos o excrementos		Radiaciones no ionizantes		_____		_____		Trabajo en Alturas

	BIOMECANICOS		PSICOLOGICOS
X	Postura		Gestión organizacional
	Esfuerzo		Características de la organización del trabajo
X	Movimiento repetitivo		Características del grupo social de trabajo
	Manipulación manual de cargas	X	Condiciones de la tarea
—	_____		Interfase persona - tarea
—	_____		Jornada de trabajo

2. Identifique los E.P.P. (Equipos de protección persona que debe usar con respecto a su puesto de trabajo. (Marcar *con una X)*

X	Casco de Seguridad	X	Tapabocas
	Gorro o cofia		Respiradores
	Gafas de Seguridad		Orejeras
	Monogafas de Seguridad		Guantes plásticos
	Careta de Seguridad		Guantes de aluminio
	Guantes dieléctricos	X	Botas de seguridad
	Botas plásticas		Arnés
	Zapatos antideslizantes		Casco con barbuquejo
X	Dotación		Calzado

UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024	GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 1.0
	EVALUACION DE LA INDUCCION	Fecha: diciembre 2024
		Página 2 de 2

3. Preguntas de selección múltiple: (Marque con un X)

1. ¿Qué es un accidente de trabajo?:
   - (a.) Todo acontecimiento repentino que suceda por causa o con ocasión del trabajo que desempeña una persona y que por este hecho el trabajador tenga una lesión en su cuerpo, se perturben sus funciones, se le genere una invalidez o incluso el trabajador muera
   - b. son las posibilidades de que un trabajador sufra una enfermedad o un accidente vinculado a su trabajo
   - c. Ninguna de las anteriores

2. ¿Cuántos días se dispone para reportar el accidente de trabajo?
   - (a.) Inmediato
   - b. Cinco días
   - c. No se deben reportar

3. ¿A dónde debo llevar mis incapacidades laborales?
   - a. Clínica
   - (b.) UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024

4. ¿A qué clínica debe dirigirse en caso de accidente de trabajo?
   - a. Clínica Norte
   - b. Clínica san José
   - c. Clínica Santa Ana
   - (d.) Hospital más cercano a la obra

4. Indique si el enunciado presentado es Falso o Verdadero

Enunciado	V	F
a. Es una obligación que los empleados mantengan los EPP durante el desarrollo de su actividad laboral	X	
b. Es una prohibición el ingerir sustancias psicoactivas o fumar en el lugar de trabajo	X	
c. Se deben reportar los Incidentes y Accidentes de trabajo	X	
d. Es obligatorio reportar con antelación los permisos para ausentarse de la empresa (citas, reuniones, diligencias personales)	X	
e. Lo exámenes médicos de ingreso sirven para validar el estado de salud de los empleados que ingresen a la organización	X	
f. El procedimiento de descargos permite realizar llamados de atención de manera correcta sin vulnerar los derechos de los empleados, basándose en el Reglamento internos de trabajo	X	

CALIFICACIÓN	5.0
CALIFICADOR	Sacky Pradilla.
ACCION DE MEJORA	No aplica

Diana Patricia Cuella		60.488.600
NOMBRES	**FIRMA**	**CEDULA**

ANEXO N° 6.
AFILIACIONES A LA ARL

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

ARL | sura

Medellín, 06 de December de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL NORTE DE SANTANDER		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C60448600	AVELLA VILLAMIZAR DIANA PATRICIA	07/12/2024		1925129q	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 06/12/2024 16:51:56 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.32.118.102, 192.230.104.12, 172.16.42.57



ARL | sura

Medellín, 02 de December de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL NORTE DE SANTANDER			Clase: 5		Porcentaje Cotización	6.96 %
C1094348026	CUADROS CUBILLAS LIBARDO ANDRES	03/12/2024		I1584015	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 02/12/2024 08:02:00 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.32.118.102, 192.230.104.12, 172.16.42.57

ARL | sura

Medellín, 06 de December de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL NORTE DE SANTANDER		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C88211813	VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE	07/12/2024		181231f2	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 06/12/2024 16:50:32 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.


Dirección IP: 179.32.118.102, 192.230.104.12, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

ANEXO N° 7.
AFILIACIONES A LA EPS

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

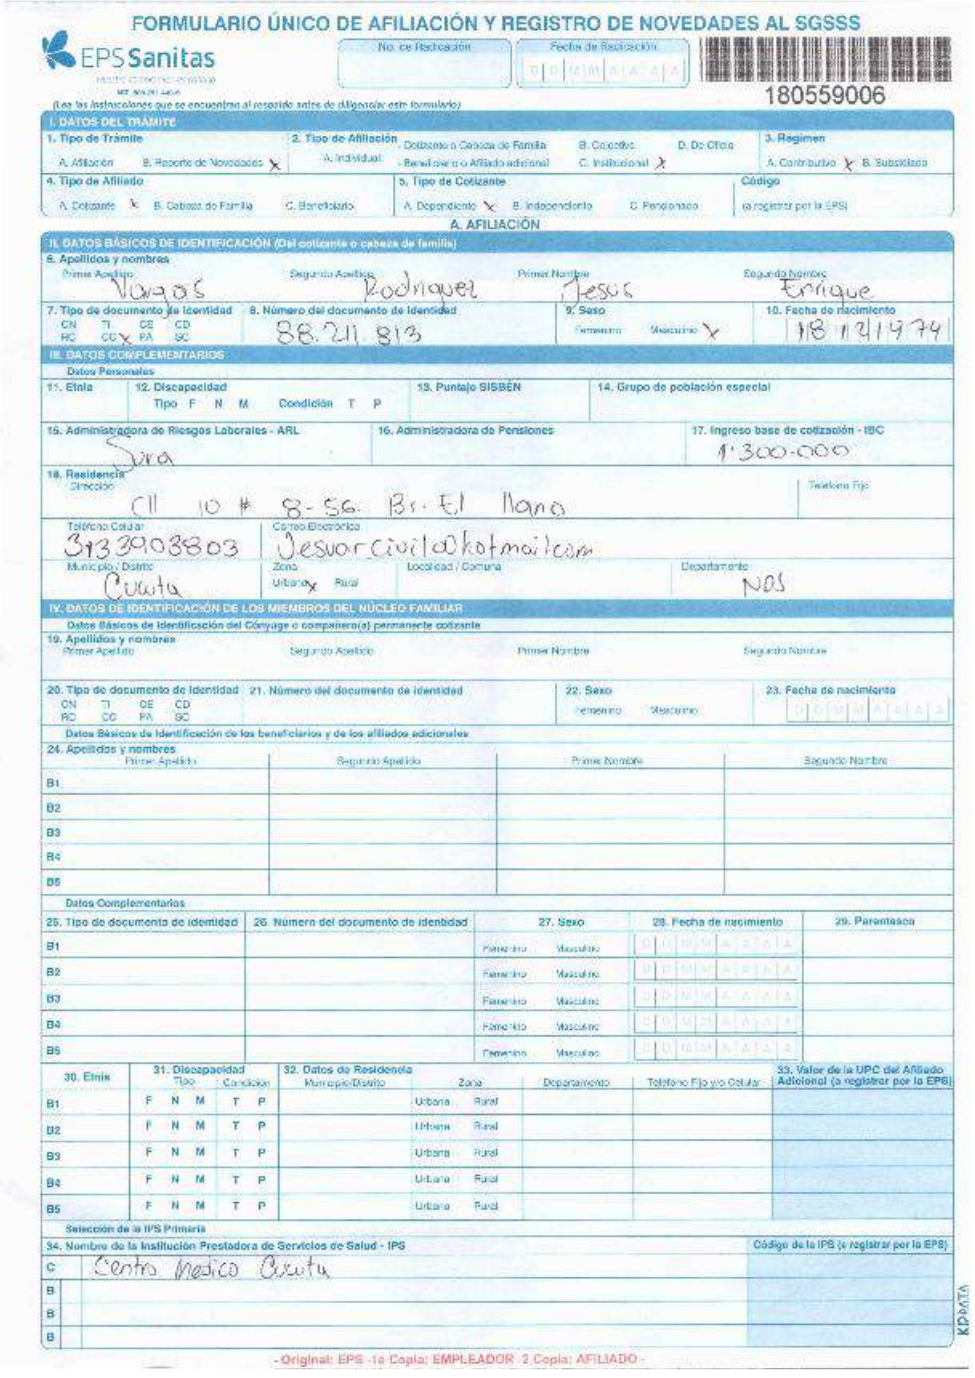

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

EPS Sanitas

No. de Radicación

Fecha de Radicación

180559006

(Lea las instrucciones que se encuentran al respaldo antes de diligenciar este formulario)

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación; B. Reporte de Novedades X
2. Tipo de Afiliación: A. Individual; Cotizante o Cabeza de Familia; Beneficiario o Afiliado adicional; B. Colectivo; C. Institucional X; D. De Oficio
3. Régimen: A. Contributivo X; B. Subsidiado
4. Tipo de Afiliado: A. Cotizante X; B. Cabeza de Familia; C. Beneficiario
5. Tipo de Cotizante: A. Dependiente X; B. Independiente; C. Pensionado
Código (a registrar por la EPS)

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (Del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres
Primer Apellido: Vargas | Segundo Apellido: Rodriguez | Primer Nombre: Jesus | Segundo Nombre: Enrique
7. Tipo de documento de identidad: CN, TI, CE, CD, RC, CC X, PA, SC
8. Número del documento de identidad: 88.211.813
9. Sexo: Femenino, Masculino X
10. Fecha de nacimiento: 18/12/1974

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos Personales

11. Etnia
12. Discapacidad: Tipo F N M; Condición T P
13. Puntaje SISBÉN
14. Grupo de población especial
15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL: Sura
16. Administradora de Pensiones
17. Ingreso base de cotización - IBC: 1'300.000
18. Residencia
Dirección: Cll 10 # 8-56 Bs. El Llano
Teléfono Fijo
Teléfono Celular: 3133908803
Correo Electrónico: Jesvarcivil@hotmail.com
Municipio / Distrito: Cúcuta
Zona: Urbana X, Rural
Localidad / Comuna
Departamento: NDS

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos Básicos de identificación del Cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres
Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre
20. Tipo de documento de identidad: CN, TI, CE, CD, RC, CC, PA, SC
21. Número del documento de identidad
22. Sexo: Femenino, Masculino
23. Fecha de nacimiento

Datos Básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

Datos Complementarios

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo	28. Fecha de nacimiento	29. Parentesco
B1			Femenino Masculino		
B2			Femenino Masculino		
B3			Femenino Masculino		
B4			Femenino Masculino		
B5			Femenino Masculino		

	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F N M; Condición T P	32. Datos de Residencia Municipio/Distrito	Zona	Departamento	Teléfono Fijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del Afiliado Adicional (a registrar por la EPS)
B1		F N M T P		Urbana Rural			
B2		F N M T P		Urbana Rural			
B3		F N M T P		Urbana Rural			
B4		F N M T P		Urbana Rural			
B5		F N M T P		Urbana Rural			


Selección de la IPS Primaria

34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS		Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C	Centro Medico Cucuta	
B		
B		
B		

KDATA

- Original: EPS -1a Copia: EMPLEADOR 2 Copia: AFILIADO -

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

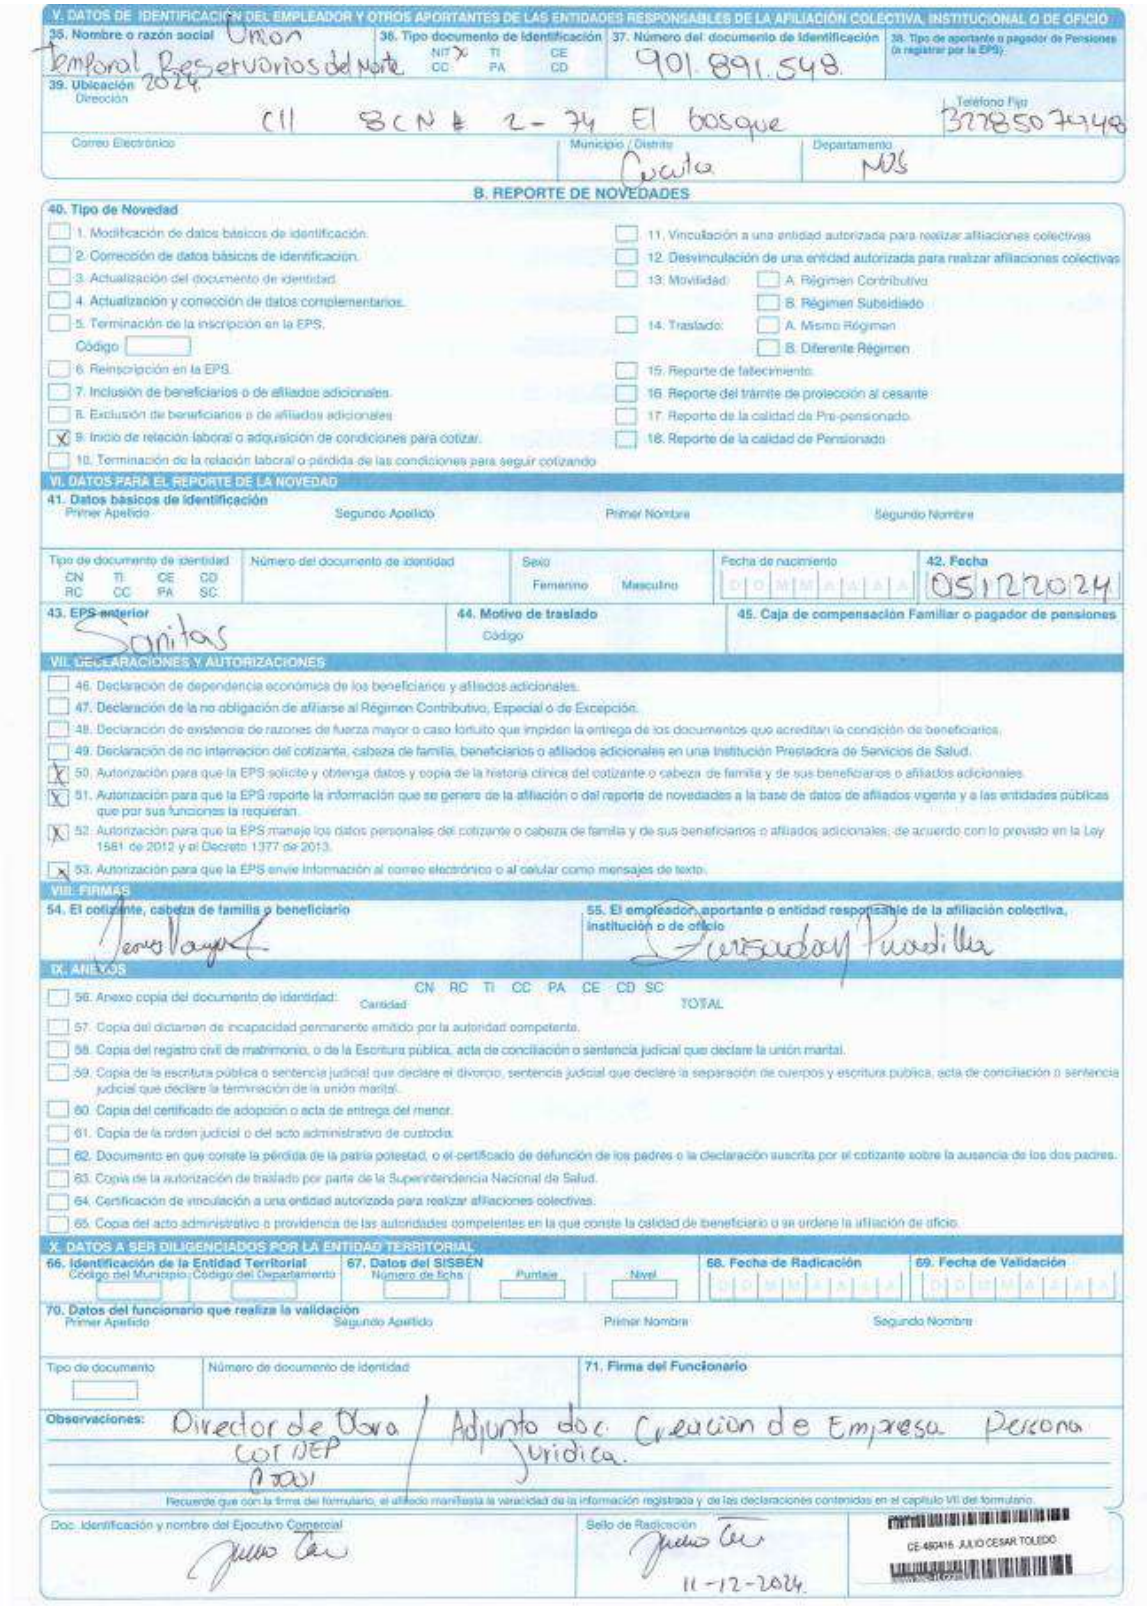

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social: Unión Temporal Reservorios del Norte 2024
36. Tipo documento de identificación: NIT X TI CE CC PA CD
37. Número del documento de identificación: 901.891.548
38. Tipo de aportante o pagador de Pensiones (a registrar por la EPS):
39. Ubicación — Dirección: Cll 8CN # 2-74 El bosque
Teléfono Fijo: 3778507448
Correo Electrónico:
Municipio / Distrito: Cucuta
Departamento: NDS

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad
- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [X] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación — Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad: CN RC TI CC CE PA CD SC | Número del documento de identidad | Sexo: Femenino Masculino | Fecha de nacimiento | 42. Fecha: 05/12/2024

43. EPS anterior: Sanitas | 44. Motivo de traslado — Código | 45. Caja de compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no información del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [X] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [X] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [X] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [X] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario

55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institución o de oficio

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CN RC TI CC PA CE CD SC — Cantidad — TOTAL
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial — Código del Municipio | Código del Departamento
67. Datos del SISBEN — Número de ficha | Puntaje | Nivel
68. Fecha de Radicación
69. Fecha de Validación

70. Datos del funcionario que realiza la validación — Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre

Tipo de documento | Número de documento de identidad | 71. Firma del Funcionario

Observaciones: Director de Obra / Adjunto doc: Creacion de Empresa Persona Juridica. COT DEP 0001


Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Doc. Identificación y nombre del Ejecutivo Comercial

Sello de Radicación: 11-12-2024

CE-480416 JULIO CESAR TOLEDO

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

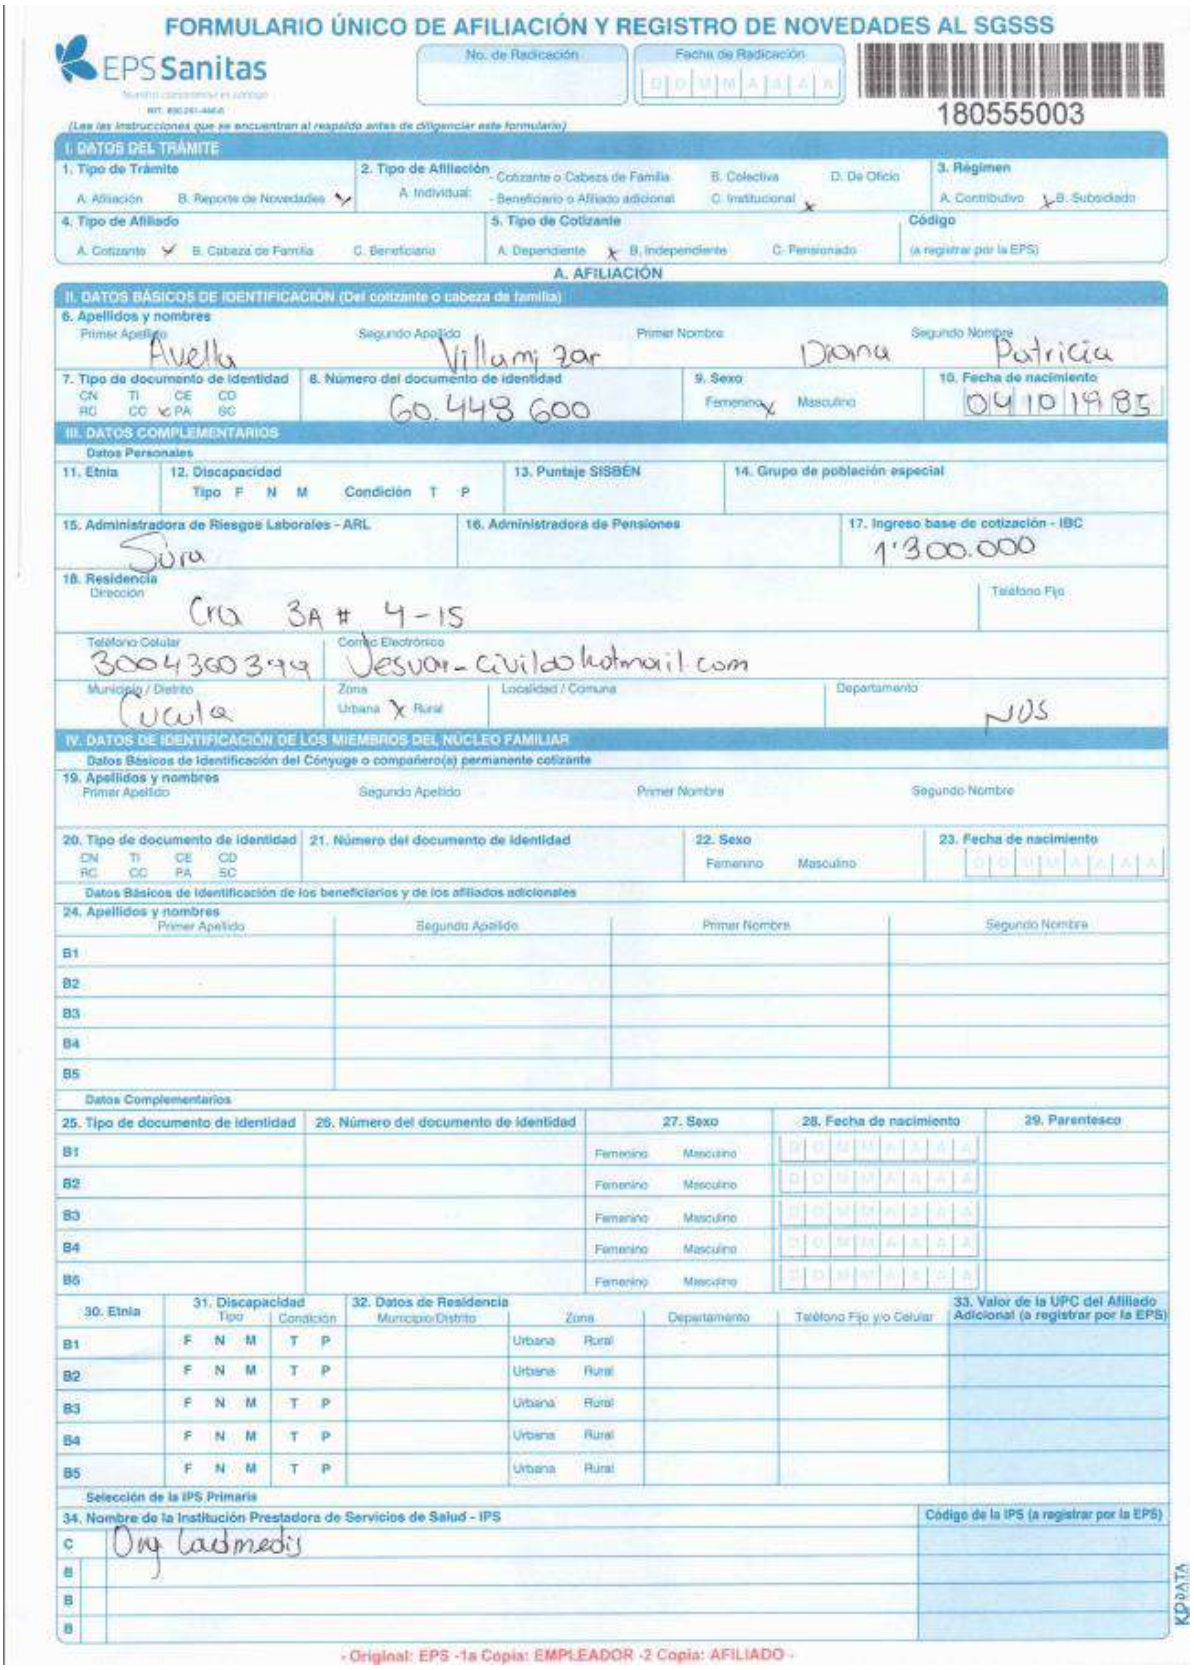

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

EPS Sanitas

No. de Radicación

Fecha de Radicación

180555003

(Lea las instrucciones que se encuentran al respaldo antes de diligenciar este formulario)

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación — B. Reporte de Novedades: X
2. Tipo de Afiliación: A. Individual: - Cotizante o Cabeza de Familia — B. Colectiva — D. De Oficio; - Beneficiario o Afiliado adicional — C. Institucional: X
3. Régimen: A. Contributivo — B. Subsidiado: X
4. Tipo de Afiliado: A. Cotizante: X — B. Cabeza de Familia — C. Beneficiario
5. Tipo de Cotizante: A. Dependiente: X — B. Independiente — C. Pensionado
Código (a registrar por la EPS)

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (Del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres
Primer Apellido: Avella — Segundo Apellido: Villamizar — Primer Nombre: Diana — Segundo Nombre: Patricia

7. Tipo de documento de identidad: CN TI CE CD RC CC: X PA SC
8. Número del documento de identidad: 60.448 600
9. Sexo: Femenino: X — Masculino
10. Fecha de nacimiento: 04 10 1985

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos Personales

11. Etnia
12. Discapacidad — Tipo F N M — Condición T P
13. Puntaje SISBÉN
14. Grupo de población especial

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL: Sura
16. Administradora de Pensiones
17. Ingreso base de cotización - IBC: 1'300.000

18. Residencia
Dirección: Cra 3A # 4-15
Teléfono Fijo
Teléfono Celular: 3004300394
Correo Electrónico: Jesvar-civil@hotmail.com
Municipio / Distrito: Cúcuta
Zona — Urbana: X — Rural
Localidad / Comuna
Departamento: NDS

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos Básicos de identificación del Cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres
Primer Apellido — Segundo Apellido — Primer Nombre — Segundo Nombre

20. Tipo de documento de identidad: CN TI CE CD RC CC PA SC
21. Número del documento de identidad
22. Sexo: Femenino — Masculino
23. Fecha de nacimiento

Datos Básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

Datos Complementarios

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo	28. Fecha de nacimiento	29. Parentesco
B1			Femenino Masculino		
B2			Femenino Masculino		
B3			Femenino Masculino		
B4			Femenino Masculino		
B5			Femenino Masculino		

	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo	Condición	32. Datos de Residencia Municipio/Distrito	Zona	Departamento	Teléfono Fijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del Afiliado Adicional (a registrar por la EPS)
B1		F N M	T P		Urbana Rural			
B2		F N M	T P		Urbana Rural			
B3		F N M	T P		Urbana Rural			
B4		F N M	T P		Urbana Rural			
B5		F N M	T P		Urbana Rural			


Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C	Org Lasmedis	
B		
B		
B		

KPDATA

- Original: EPS -1a Copia: EMPLEADOR -2 Copia: AFILIADO -

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

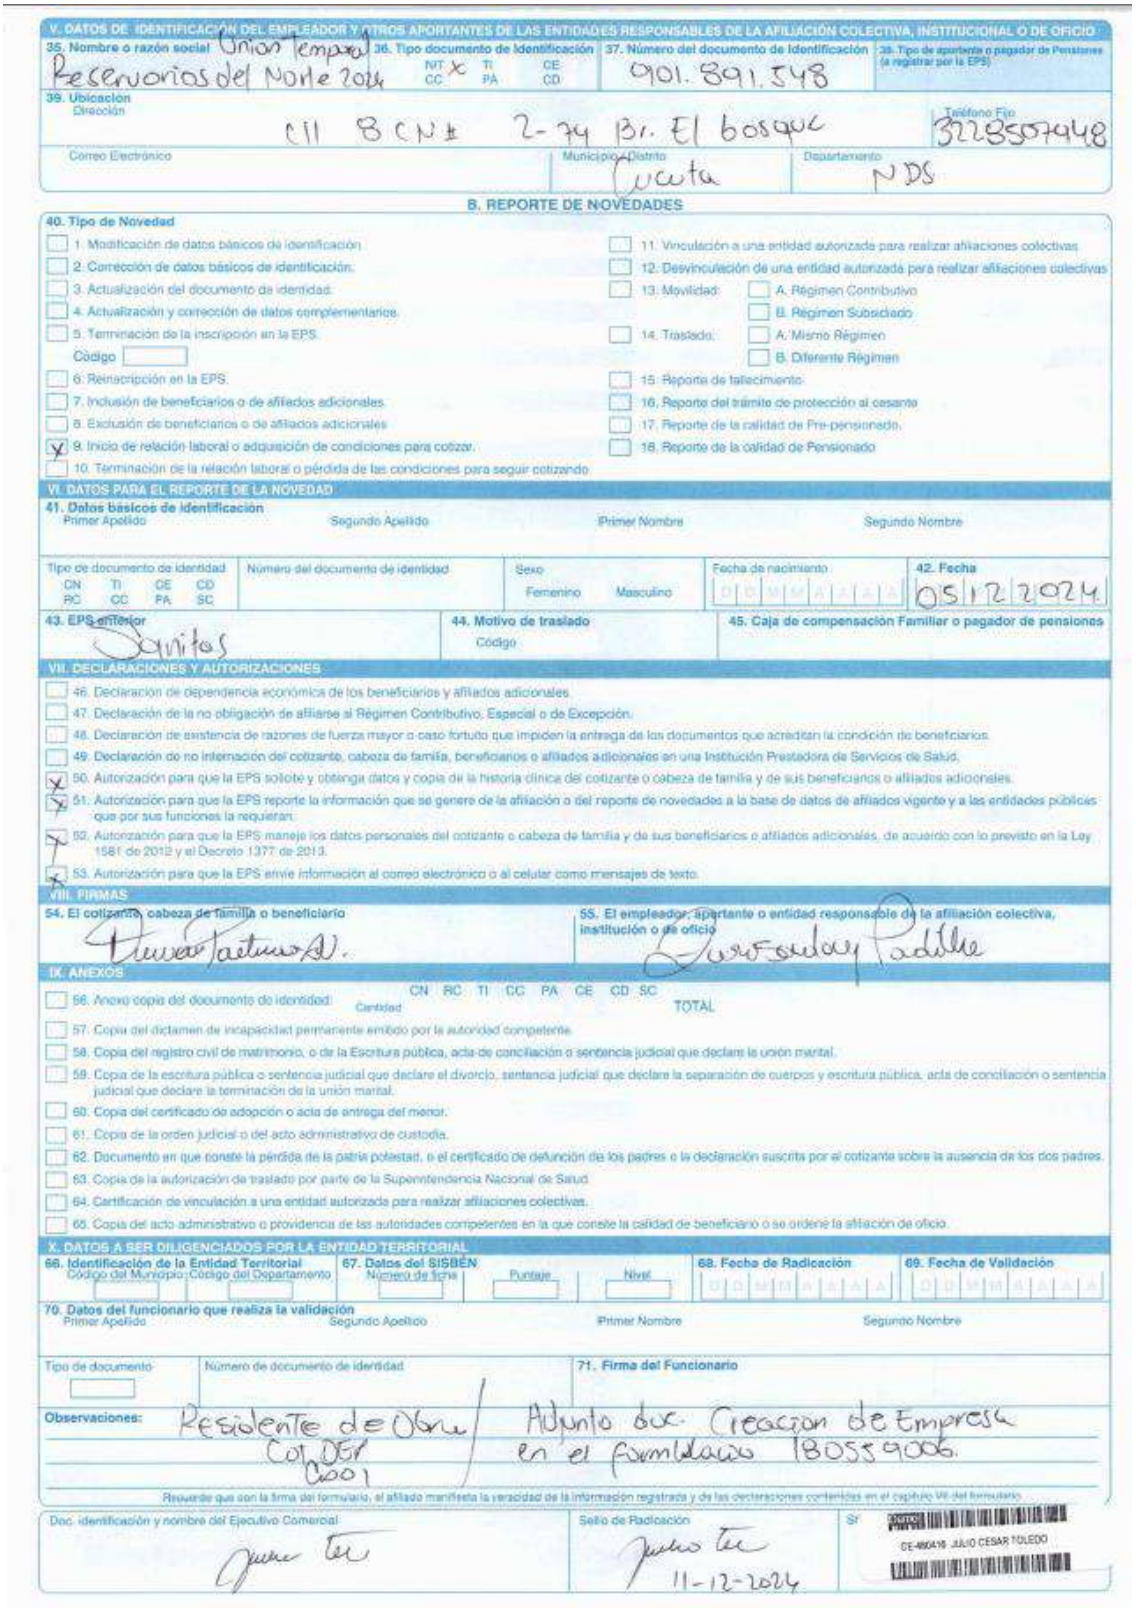

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social: Unión Temporal Reservorios del Norte 2024
36. Tipo documento de Identificación: NIT X CC TI PA CE CD
37. Número del documento de Identificación: 901.891.548
38. Tipo de aportante o pagador de Pensiones (a registrar por la EPS)
39. Ubicación — Dirección: Cll 8 CN # 2-74 Br. El bosque
Teléfono Fijo: 3228507448
Correo Electrónico
Municipio/Distrito: Cucuta
Departamento: NDS

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad
- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS.
  Código
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [X] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 13. Movilidad: A. Régimen Contributivo / B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: A. Mismo Régimen / B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación — Primer Apellido / Segundo Apellido / Primer Nombre / Segundo Nombre
Tipo de documento de identidad: CN RC TI CC CE PA CD SC
Número del documento de identidad
Sexo: Femenino Masculino
Fecha de nacimiento: D D M M A A A A
42. Fecha: 05/12/2024
43. EPS anterior: Sanitas
44. Motivo de traslado — Código
45. Caja de compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no información del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [X] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [X] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [X] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [X] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario
55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institución o de oficio

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad — Cantidad: CN RC TI CC PA CE CD SC — TOTAL
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL


66. Identificación de la Entidad Territorial — Código del Municipio / Código del Departamento
67. Datos del SISBEN — Número de ficha / Puntaje / Nivel
68. Fecha de Radicación: D D M M A A A A
69. Fecha de Validación: D D M M A A A A
70. Datos del funcionario que realiza la validación — Primer Apellido / Segundo Apellido / Primer Nombre / Segundo Nombre
Tipo de documento
Número de documento de identidad
71. Firma del Funcionario

Observaciones: Residente de Obra / Cod OBR 0001 / Adjunto doc. Creacion de Empresa en el formulario 1805590O6.

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Doc. identificación y nombre del Ejecutivo Comercial
Sello de Radicación: 11-12-2024
Sr: CE-490418 JULIO CESAR TOLEDO

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

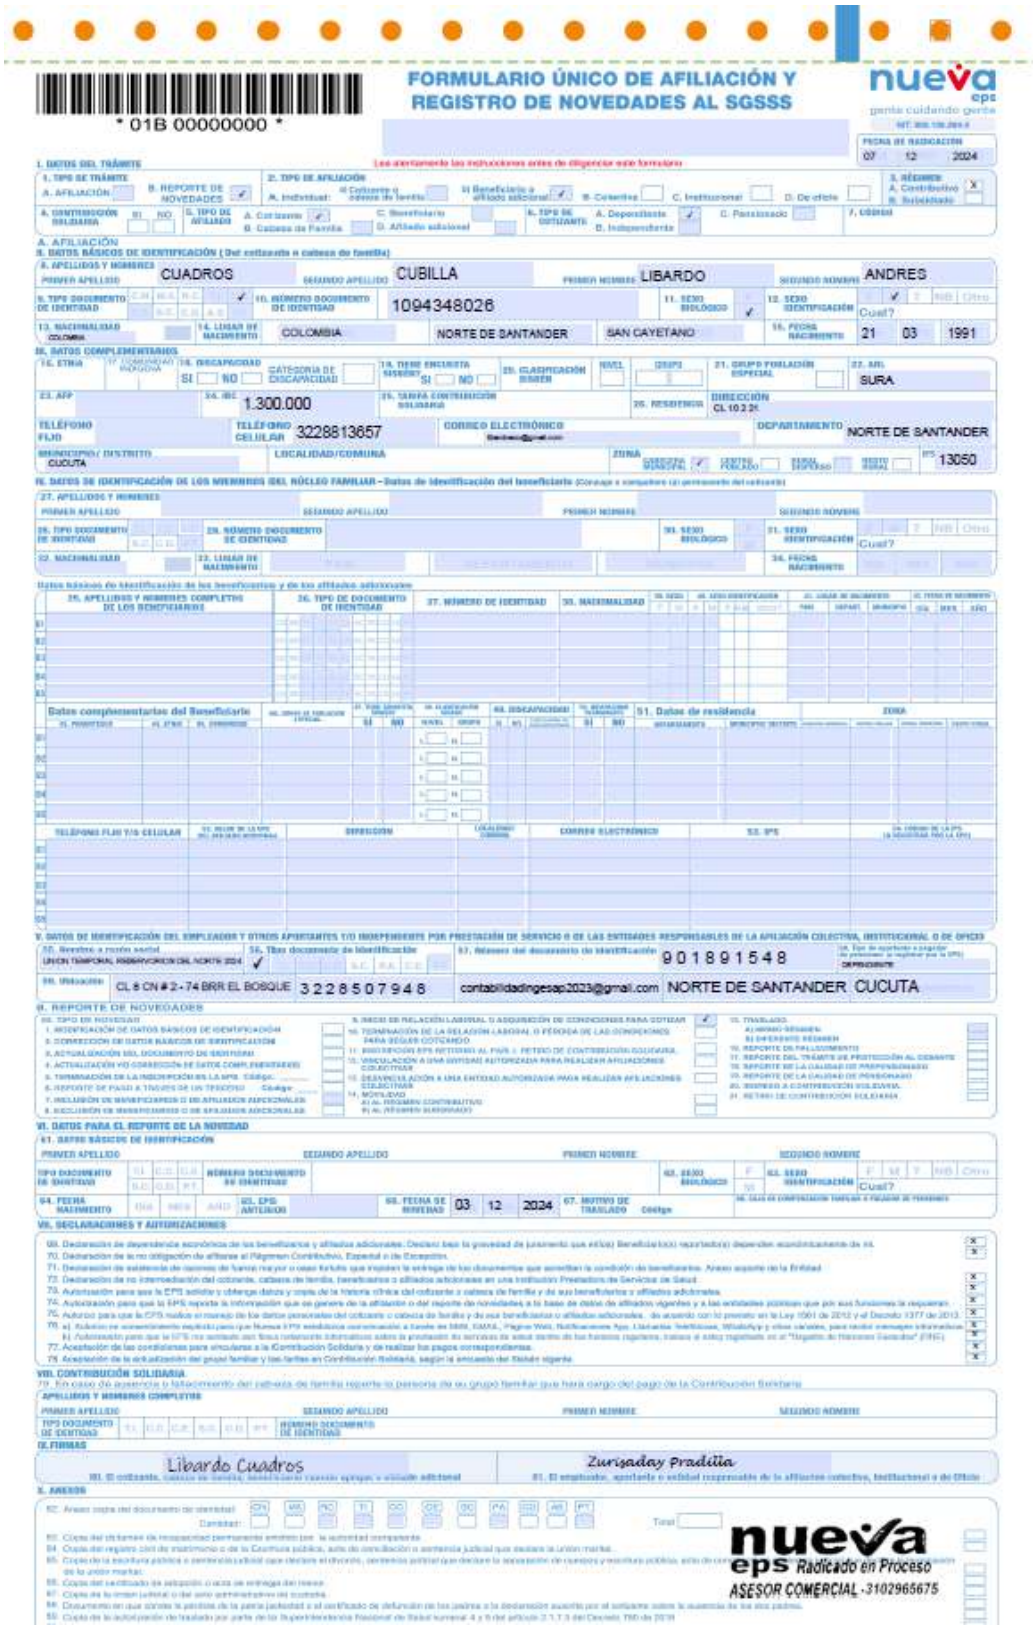

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps
gente cuidando gente

* 01B 00000000 *

FECHA DE RADICACIÓN: 07 12 2024

I. DATOS DEL TRÁMITE

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (Del cotizante o cabeza de familia)

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
CUADROS	CUBILLA	LIBARDO	ANDRES

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	SEXO BIOLÓGICO	FECHA DE NACIMIENTO
CC	1094348026	M	21 03 1991

NACIONALIDAD: COLOMBIA — LUGAR DE NACIMIENTO: COLOMBIA / NORTE DE SANTANDER / SAN CAYETANO

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

ETNIA: NO PERTENECE A NINGUNA ETNIA — DISCAPACIDAD: NO — TIENE CUIDADOR: NO — CLASIFICACIÓN SISBEN: NIVEL 1 — GRUPO POBLACIONAL ESPECIAL: NO

AFP: 23 — IBC: 1.300.000 — TARIFA CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA: 25 — RESIDENCIA: DIRECCIÓN CL 10 2 2E

TELÉFONO FIJO	TELÉFONO CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO / DISTRITO	LOCALIDAD/COMUNA	ZONA	PTS
	3228813657	[redacted]	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA		URBANA ✓	13050

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR – Datos de identificación del beneficiario (Consulte e completare un permanente del cotizante)

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DE LOS BENEFICIARIOS	TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NÚMERO DE IDENTIDAD	NACIONALIDAD	SEXO BIOLÓGICO	SEXO IDENTIFICACIÓN	LUGAR DE NACIMIENTO	TIPO DE NACIMIENTO
1							
2							
3							
4							
5							

Datos complementarios del Beneficiario

PARENTESCO	ETNIA	DISCAPACIDAD	DATOS DE RESIDENCIA	ZONA
1				
2				
3				
4				
5				

TELÉFONO FIJO Y/O CELULAR	DIRECCIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	EPS

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES Y/O INDEPENDIENTE POR PRESTACIÓN DE SERVICIO O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

50. Nombre o razón social	56. Tipo documento de identificación	57. Número del documento de identificación	58. Tipo de aportante a registrar (no pensionado ni registrar por la EPS)
UNION TEMPORAL RESERVACION DEL NORTE 2024	NIT ✓	901891548	EMPRESARIO

59. Ubicación					
CL 8 CN # 2 - 74 BRR EL BOSQUE	3228507948	contabilidadingesap2023@gmail.com	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	

VI. REPORTE DE NOVEDADES

60. TIPO DE NOVEDAD

1. IDENTIFICACIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN
2. CORRECCIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN
3. ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD
4. ACTUALIZACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE DATOS COMPLEMENTARIOS
5. TERMINACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN LA EPS Código:
6. REPORTE DE PAGO A TERCEROS DE UN TERCERO Código
7. INCLUSIÓN DE MIEMBROS/BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES
8. EXCLUSIÓN DE MIEMBROS/BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES
9. INICIO DE RELACIÓN LABORAL O ADQUISICIÓN DE CONDICIONES PARA COTIZAR ✓
10. TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL O PÉRDIDA DE LAS CONDICIONES PARA SEGUIR COTIZANDO
11. INSCRIPCIÓN EPS RETORNO AL PAR O PETICIÓN DE CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA
12. VINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS
13. DESVINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS
14. MOVILIDAD
   a) Al RÉGIMEN CONTRIBUTIVO
   b) Al RÉGIMEN SUBSIDIADO
15. TRASLADO
   a) ENTRE SEDES
   b) DEFINITIVO REGIMEN
16. REPORTE DE FALLECIMIENTO
17. REPORTE DEL TRÁMITE DE PROTECCIÓN AL CESANTE
18. REPORTE DE LA CALIDAD DE PENSIONADO
19. REPORTE DE LA CALIDAD DE PENSIONADO
20. INGRESO A CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA
21. RETIRO DE CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

VII. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

61. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	62. SEXO BIOLÓGICO	63. SEXO IDENTIFICACIÓN

64. FECHA NACIMIENTO	65. EPS ANTERIOR	66. FECHA DE NOVEDAD	67. MOTIVO DE TRASLADO Código	68. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR A PAGAR EL PENSIONADO
DIA MES AÑO		03 12 2024		

VIII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

69. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales. Declaro bajo la gravedad de juramento que estos Beneficiario(s) dependen económicamente de mí. ✓
70. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. ✓
71. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios. Anexo soporte de la Entidad.
72. Declaración de no intermediación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
73. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
74. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades, a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones lo requieran.
75. Autorizo para que la EPS realice el manejo de los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
76. a) Autorizo de consentimiento explícito para que Nueva EPS establezca comunicación a través de SMS, EMAIL, Página Web, Notificaciones App, Llamadas Telefónicas, WhatsApp y otros canales, para recibir mensajes informativos.
   b) Autorizo para que la EPS no contacte con fines netamente informativos sobre la prestación de servicios de salud dentro de los términos regulares, tratará el sitio registrado en el "Registro de Números Excluidos" (RNE).
77. Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes.
78. Aceptación de la afiliación del grupo familiar y las faltas en Contribución Solidaria, según la emisión del Estado vigente.

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

IX. FIRMAS

Libardo Cuadros
80. El cotizante, cabeza de familia, beneficiario cuando aplique o afiliado adicional

Zurisaday Pradilla
81. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de Oficio

X. ANEXOS

82. Anexo copia del documento de identidad: CN MA PC TI CC CE SC PA CD AS PT — Cantidad: — Total

83. Copia del certificado de discapacidad permanente emitido por la autoridad competente
84. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital
85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación de la unión marital
86. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor
87. Copia de la orden judicial o del auto administrativo de custodia
88. Documento en que conste la petición de la parte peticionaria o el certificado de defunción de los padres o la declaración ausente por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
89. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud numeral 4 y 5 del artículo 2.1.7.3 del Decreto 780 de 2016

nueva eps Radicado en Proceso
ASESOR COMERCIAL 3102965675

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

Autorización de mensajes de texto. (Circular externa 000016 mayo de 2013)

Yo LIBARDO ANDRES CUADROS CUBILLA identificado (a) con C.C. ✓ número 1094348026 de SAN CAYETANO certifico que:

1	¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la carta de derechos y deberes del afiliado y del paciente?	SÍ [X] No [ ]
2	¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la carta de desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	SÍ [X] No [ ]
3	¿Leyó el contenido de la carta de derechos y deberes del afiliado y del paciente?	SÍ [X] No [ ]
4	¿Leyó el contenido de la carta de desempeño de la EPS?	SÍ [X] No [ ]
5	¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información, fue asesorado adecuadamente por la EPS?	SÍ [X] No [ ]

Así mismo autorizo a NUEVA EPS, para que envíe información al teléfono celular No. _____ y/o correo electrónico _____

SÍ [ ] No [X]

Autorizo la entrega de la carta de Derechos y Deberes del Afiliado y carta de Desempeño, en formato electrónico. SÍ [ ] No [ ]

Consulte la carta de derechos y deberes y la carta de desempeño en el micrositio Web https://www.nuevaeps.com.co/carta-derechos-deberes

Evitando impresiones para ser amigable con el planeta SI [ ] NO [ ]

Cordialmente,

Firma: *Libardo Cuadros*
Tipo ID: CC No. ID: 1094348026
Fecha de Solicitud: 07 12 2024
Dirección: CL 10 2 21
Tel: 3228813657 Municipio: CUCUTA
Departamento: NORTE DE SANTANDER
Huella

Afiliado manifiesta que no sabe o no puede firmar, autoriza a:

Firma:
Tipo ID: No. ID:
Fecha (dd/mm/aaaa):
Dirección:
Tel: Municipio:
Departamento:
Huella

Manifiesto con mi firma la aceptación de todas las declaraciones y términos incorporados en este formato y el consentimiento expreso, previo e informado en relación con el tratamiento de mis datos personales que hará NUEVA EPS S.A., en sujeción a la política para el tratamiento de datos personales de la NUEVA EPS S.A.

Autorizaciones

En virtud de la anterior certificación, autorizo expresamente y conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la Ley 527 de 1995, a NUEVA EPS S.A. para que me remita información en forma de mensajes de datos, a través de mecanismos como sms -short message service- , correos electrónicos y redes sociales, relacionada con los servicios de NUEVA EPS S.A. y la carta de derecho de deberes.

Autorizo de manera expresa a NUEVA EPS S.A. y/o a la persona natural o jurídica a quien ésta encargue, para que recolecte, almacene, use, haga circular, actualice o suprima mis datos personales, para acceder a los servicios de la NUEVA EPS S.A. y para el cumplimiento de la carta de derechos y deberes.

Aviso de privacidad

Hago constar expresamente que NUEVA EPS S.A. me informó sobre los siguientes derechos que me asisten como titular de datos personales:

* Acceder los datos personales que hayan sido objeto de tratamiento conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
* Conocer, actualizar y rectificar los datos personales frente al responsable del tratamiento y al encargado del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros datos, en relación con datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos datos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.
* Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento, salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.
* Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, previa solicitud, con respecto del uso que le ha dado a los datos personales.
* Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
* Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el tratamiento el responsable o encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la constitución.

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la política de tratamiento de los datos personales de NUEVA EPS S.A., a través de los siguientes mecanismos que ponemos a su disposición:

Sitio web: www.nuevaeps.co
Régimen Contributivo:
Línea Gratuita: **01 8000 954400**
Línea de atención en Bogotá: **(601) 307 7022**
Régimen Subsidiado:
Línea Gratuita: **01 8000 95 2000**
Línea de atención en Bogotá: **(601) 307 7051**
Oficinas de atención al afiliado de NUEVA EPS S.A.
Conmutador: **(601) 419 3000**
Dirección Administrativa: Carrera 65k No. 46A – 66 Piso 2

Sr.(a) afiliado(a), la información por usted suministrada en este formato, así como la relacionada en el formulario de afiliación y/o demás documentos anexos, serán utilizados por NUEVA EPS S.A. como responsable del tratamiento de la información únicamente para los fines específicos relacionados con la administración y prestación de servicios en salud de Plan Obligatorio de Salud, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 "Hábeas Data"; dicho tratamiento podrá implicar la trasferencia, trasmisión y/o recepción de los datos, y el cual se realizará a través de sí misma, terceros encargados de tratamiento de información o de sus aliados comerciales, para fines comerciales y para la correcta prestación del servicio, de la forma indicada en los Términos y Condiciones de cada uno de sus portales y de la Política de Confidencialidad y Protección de Datos.

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR EL TRABAJADOR INDEPENDIENTE CUYO INGRESO SEA IGUAL O SUPERIOR A 1 SMMLV

ACTIVIDAD ECONÓMICA	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	POSEE VIVIENDA PROPIA	PROMOTOR AGROPECUARIO
			$	SI / NO	SI / NO

Nivel de Escolaridad: Ninguno, Primaria, Secundaria, Media académica o clásica (bachillerato básico), Media técnica (bachillerato básico), Normalista, Técnica Profesional, Tecnológica, Profesional, Especialización, Maestría, Doctorado, Último Grado, Apostado

Posición Ocupacional: Patrón/Empleador, Contratista, Trabaja por su Cuenta

Inicio Contrato: Fin Contrato:

SEÑOR USUARIO, TRABAJADOR INDEPENDIENTE O CONTRATISTA, RECUERDE REPORTAR LA NOVEDAD DE RETIRO EN LA PLANILLA DE PAGO A PARTIR DEL MOMENTO QUE DECIDA NO CONTINUAR CON LOS SERVICIOS DE SALUD, EL NO HACERLO LE GENERA MORA, LA CUAL TENDRÁ VIGENCIA HASTA EL MOMENTO EN EL QUE REPORTE SU RETIRO AL SISTEMA. DECRETO 806 ART. 07 DE 1998 Y ART. 38 DECRETO 1406 DE 1999.

SÓLO DILIGENCIAR SI ES COTIZANTE INDEPENDIENTE PAGO POR TERCERO | Nombre del Tercero | Tipo de Identificación: NIT, C.C., C.E., P.A., T.I., C.D. | Identificación del Tercero que realiza el Aporte | DV

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR LA EPS

Nombre del ASESOR o PROMOTOR	CÓDIGO ASESOR o PROMOTOR	Nombre de OFICINA	CIUDAD Y FECHA
JESSICA ARANGO	C2180	CÚCUTA	CÚCUTA 07 12 2024

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

ANEXO N° 8.
AFILIACIONES A LA AFP

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.
En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR
NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

LIBARDO ANDRES CUADROS CUBILLA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.094.348.026**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 13 de Diciembre del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.
En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR
NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **88.211.813**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir.**

La presente certificación se expide el 13 de Diciembre del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.
En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR
NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

DIANA PATRICIA AVELLA VILLAMIZAR, identificado(a) con cédula de ciudadanía **60.448.600**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 13 de Diciembre del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

ANEXO N° 9. EXÁMENES DE INGRESO

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

I.P.S. MEDCARE DE COLOMBIA S.A.S.

IPS MEDCARE DE COLOMBIA S.A.S.
Nit. 900257281 - 1
Dirección: AV 2E # 5-35 LA CEIBA
Tel: 5777177 - 5777188 - 5777199

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

Tipo certificación:	Ingreso ⊗	Periódico ○	Retiro ○	Post incapacidad ○	Caso ocupacional ○
	Control ○	Reubicación ○	Ingreso al SVE ○	Trabajo en alturas ○	

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **04/12/2024 08:13:00** Empresa **UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024**

Nombre **JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ**

Cargo **DIRECTOR DE OBRA** Doc. Identidad **CC 88211813**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

1 EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL INGRESO	2	3
4	5	6
7	8	9

EXAMEN DE INGRESO	SI	NO
Sin restricciones para desempeñar el cargo	⊗	○
Aplazado	○	○
Con restricciones para desempeñar el cargo	○	○
Apto para trabajar en alturas	○	○
Apto para trabajar en espacios confinados	○	○
Apto para trabajar con equipos de suministro de aire o auto contenido	○	○
Apto para participar en la brigada	○	○
Apto para el requerimiento del cargo de la empresa o contratista	○	○

EXAMEN PERIÓDICO	SI	NO
Sin restricciones para continuar desempeñando el cargo sin limitaciones	○	○
Con restricciones para continuar desempeñando el cargo	○	○
Requiere reubicación laboral temporal	○	○
Requiere reubicación laboral permanente	○	○
Apto para trabajar en alturas	○	○
Apto para trabajar en espacios confinados	○	○

EXAMEN DE RETIRO	SI	NO
Sospecha de enfermedad profesional	○	○
Secuelas de accidentes de trabajo	○	○
Enfermedad común	○	○

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ○ Auditivo ○ Respiratorio ○ Cardiovascular ○ Psicosocial ○ Ergonómico ○ Otros ○

REMISIÓN	SI ○	NO ⊗	ARL	SI ○	NO ○	EPS	SI ○	NO ○

SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO,USO RESPONSABLE DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, PAUSAS ACTIVAS, HIGIENE POSTURAL,RECOMENDACIONES SOBRE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

DR. RAFAEL NICOLAS GUZMAN PADILLA
MEDICO LABORAL
RM 319293- REG. SO. 1446 (29/04/2021)

RAFAEL GUZMAN PADILLA - ML
Especialidad: SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES
CC: 786882731 RM: 319293-REG.SO.1446

Trabajador: JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ
CC 88211813
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biométrica

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

I.P.S. MEDCARE DE COLOMBIA S.A.S.

IPS MEDCARE DE COLOMBIA S.A.S.
Nit. 900257281 - 1
Dirección: AV 2E # 5-35 LA CEIBA
Tel: 5777177 - 5777188 - 5777199

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

Tipo certificación:	Ingreso ⊗	Periódico ○	Retiro ○	Post incapacidad ○	Caso ocupacional ○
	Control ○	Reubicación ○	Ingreso al SVE ○	Trabajo en alturas ○	

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **04/12/2024 09:05:00** Empresa **UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024**

Nombre **DIANA PATRICIA AVELLA VILLAMIZAR**

Cargo **RESIDENTE DE OBRA** Doc. Identidad **CC 60448600**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

1 EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL INGRESO	2	3
4	5	6
7	8	9

EXAMEN DE INGRESO	SI	NO
Sin restricciones para desempeñar el cargo	⊗	○
Aplazado	○	○
Con restricciones para desempeñar el cargo	○	○
Apto para trabajar en alturas	○	○
Apto para trabajar en espacios confinados	○	○
Apto para trabajar con equipos de suministro de aire o auto contenido	○	○
Apto para participar en la brigada	○	○
Apto para el requerimiento del cargo de la empresa o contratista	○	○

EXAMEN PERIÓDICO	SI	NO
Sin restricciones para continuar desempeñando el cargo sin limitaciones	○	○
Con restricciones para continuar desempeñando el cargo	○	○
Requiere reubicación laboral temporal	○	○
Requiere reubicación laboral permanente	○	○
Apto para trabajar en alturas	○	○
Apto para trabajar en espacios confinados	○	○

EXAMEN DE RETIRO	SI	NO
Sospecha de enfermedad profesional	○	○
Secuelas de accidentes de trabajo	○	○
Enfermedad común	○	○

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ○ Auditivo ○ Respiratorio ○ Cardiovascular ○ Psicosocial ○ Ergonómico ○ Otros ○

REMISIÓN	SI ○	NO ⊗	ARL	SI ○	NO ○	EPS	SI ○	NO ○

SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO,USO RESPONSABLE DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, PAUSAS ACTIVAS, HIGIENE POSTURAL,RECOMENDACIONES SOBRE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

DR. RAFAEL NICOLAS GUZMAN PADILLA
MEDICO LABORAL
RM 319293- REG. SO. 1446 (29/04/2021)

RAFAEL GUZMAN PADILLA - ML
Especialidad: SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES
CC: 786882731 RM: 319293-REG.SO.1446

Trabajador: DIANA PATRICIA AVELLA VILLAMIZAR
CC 60448600
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biométrica

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

Corponor

SALUD EMPRESARIAL IPS S.A.S.
PROFESIONALES EN MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

CERTIFICADO MEDICO LABORAL

LICENCIA S.O. No. 00121

EXAMEN DE INGRESO

ENFASIS OSTEOMUSCULAR

CALLE 3 NO. 1E-09 LA CEIBA Tel. 5711515- CEL 3174037456 NIT 900.443.363-4

FECHA 30/11/2024 **HORA** 10:04:19 **CUCUTA - NORTE DE SANTANDER**



EMPRESA 901891548-4 UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024

NOMBRE LIBARDO ANDRES CUADROS CUBILLA

CC : 1094348026 **DE** SAN CAYETANO

DIRECCION CALLE 29 1E -045 LA CORDIALIDA LOS PATIOS

CELULAR 3228813657 **EDAD** 33 **GENERO** M **RH** B+

CARGO AUXILIAR

AFP PORVENIR **ARL** **EPS** NUEVA EPS

EXAMENES MEDICOS : EXAMEN FÍSICO COMPLETO, TAMIZAJE VISUAL, SISTEMA CARDIOPULMONAR, PRUEBAS DE COORDINACIÓN, EXPLORACIÓN DIRIGIDA POR MANIOBRAS INDIVIDUALES DE CADA EXTREMIDAD Y DE CADA MÚSCULO (CUELLO, HOMBROS, MUÑECA, MANOS, TRONCO, CADERA, RODILLA, TOBILLO, PIES) PRUEBA PARA TÚNEL DEL CARPO, PRUEBA PARA TENDINITIS, TENOSINOVITIS Y TRASTORNOS DE HOMBRO, PRUEBAS DINÁMICAS DE COLUMNA, EXPLORACIÓN DE ARCOS DE MOVILIDAD, REFLEJOS OSTEOTENDINOSOS, EXPLORACIÓN DE ALTERACIONES DE PIEL Y VARICES, EXPLORACIÓN DE HERNIAS.
Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y de acuerdo a la Resolución 2346 de 2007 y la Resolución 1918 de 2009, la

OTROS EXAMENES :

AUDIOMETRIA	NO	**OPTOMETRIA**	NO	**ESPIROMETRIA**	NO	**PSICOLOGIA**	NO
RX TORAX	NO	**RX COLUMNA**	SI	**RX PIES**	NO	**ECOGRAFIA**	NO
C. MOTRIZ	NO	**PSICOSENSOMETRICA**	NO	**ELECTROCARDIOGRAMA**	NO		

LABORATORIO :

CONCEPTO DE APTITUD : SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO

RECOMENDACIONES : USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, HIGIENE POSTURAL, PAUSAS ACTIVAS, ESTILO DE VIDA SALUDABLE, USO DE LENTES CORRECTIVOS

INGRESA AL SVE

CONSTANCIA

Certifico que toda la información suministrada en este documento es verdadera y no oculte información sobre mi estado de salud, enfermedad laboral y/o accidente de trabajo presentados antes de este examen.

Libardo cuadros

ANEXO N° 10. SOCIALIZACIÓN DE EXAMENES

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

UNION TEMPORAL TALUD GRAMALOTE 2024 NIT: 901.691.867-9	GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 1.0
		Fecha: diciembre 2024
	COMUNICADO INTERNO	Página 1 de 1

Fecha	5/12/2024
De	UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024
Para	JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ

Señor(a), **JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ** identificado(a) con CC N° 88.211.813 expedida en CÚCUTA por medio de la presente notificamos su estado de salud y/o recomendaciones a tener en cuenta según resultados de exámenes médicos de INGRESO realizados en **IPS MEDCARE DE COLOMBIA S.A.S**

En los resultados emitidos por la empresa prestadora del servicio el día 04 de diciembre de 2024, se hacen las siguientes observaciones:

- **Resultado:** SIN LIMITACIONES O RESTRICCIONES PARA EL CARGO
- **Recomendación:** USO RESPONSABLE DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, HIGIENE POSTURAL, PAUSAS ACTIVAS, ESTILO DE VIDA SALUDABLE.
- **Restricciones:** N/A
- **PVE:** N/A

Desde el área de SG-SST, de la **UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024,** notifica de su estado de salud y recomendaciones que se deben tener en cuenta para mantener estados de salud adecuados, previniendo de esta manera la ocurrencia de incidentes, accidentes y/o enfermedades laborales.

Agradecemos su atención prestada y el compromiso adquirido al cumplimiento de las recomendaciones pactadas o recibidas.

Nombre	Jesús Enrique Vargas.
Cedula	88.211.813
Firma	

Atentamente

Zuriseday Pradilla A.

ZURISADAY PRADILLA ATUESTA
Representante Legal

UNION TEMPORAL TALUD GRAMALOTE 2024 NIT: 901.891.007-9	GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 1.0
		Fecha: diciembre 2024
	COMUNICADO INTERNO	Página 1 de 1

Fecha	5/12/2024
De	UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024
Para	DIANA PATRICIA AVELLA VILLAMIZAR

Señor(a), **DIANA PATRICIA AVELLA VILLAMIZAR,** identificado(a) con CC N° 60.448.600 expedida en CÚCUTA por medio de la presente notificamos su estado de salud y/o recomendaciones a tener en cuenta según resultados de exámenes médicos de INGRESO realizados en **IPS MEDCARE DE COLOMBIA S.A.S**

En los resultados emitidos por la empresa prestadora del servicio el día 04 de diciembre de 2024, se hacen las siguientes observaciones:

- **Resultado:** SIN LIMITACIONES O RESTRICCIONES PARA EL CARGO
- **Recomendación:** USO RESPONSABLE DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, HIGIENE POSTURAL, PAUSAS ACTIVAS, ESTILO DE VIDA SALUDABLE.
- **Restricciones:** N/A
- **PVE:** N/A

Desde el área de SG-SST, de la **UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024,** notifica de su estado de salud y recomendaciones que se deben tener en cuenta para mantener estados de salud adecuados, previniendo de esta manera la ocurrencia de incidentes, accidentes y/o enfermedades laborales.

Agradecemos su atención prestada y el compromiso adquirido al cumplimiento de las recomendaciones pactadas o recibidas.

Nombre	Diana Patricia Avella
Cedula	60.448.600
Firma	

Atentamente

ZURISADAY PRADILLA ATUESTA
Representante Legal

UNION TEMPORAL TALUD GRAMALOTE 2024 NIT: 901.891.087-9	GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 1.0
		Fecha: diciembre 2024
	COMUNICADO INTERNO	Página 1 de 1

Fecha	3/12/2024
De	UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024
Para	LIBARDO ANDRES CUADROS

Señor(a), **LIBARDO ANDRES CUADROS CUBILLOS** identificado(a) con CC N° 1.094.348.026 expedida en SAN CAYETANO por medio de la presente notificamos su estado de salud y/o recomendaciones a tener en cuenta según resultados de exámenes médicos de INGRESO realizados en **IPS SALUD EMPRESARIAL**

En los resultados emitidos por la empresa prestadora del servicio el día 30 de noviembre de 2024, se hacen las siguientes observaciones:

- **Resultado:** SIN LIMITACIONES O RESTRICCIONES PARA EL CARGO
- **Recomendación:** USO RESPONSABLE DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, HIGIENE POSTURAL, PAUSAS ACTIVAS, ESTILO DE VIDA SALUDABL, USO DE LENTES CORRECTIVOS
- **Restricciones:** N/A
- **PVE:** N/A

Desde el área de SG-SST, de la **UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024,** notifica de su estado de salud y recomendaciones que se deben tener en cuenta para mantener estados de salud adecuados, previniendo de esta manera la ocurrencia de incidentes, accidentes y/o enfermedades laborales.

Agradecemos su atención prestada y el compromiso adquirido al cumplimiento de las recomendaciones pactadas o recibidas.

Nombre	Libardo Andres Cuadros
Cedula	1094.348.026
Firma	Libardo Andres Cuadros C.

Atentamente

ZURISADAY PRADILLA ATUESTA
Representante Legal

ANEXO N° 11. INDICE DE ACCIDENTABILIDAD

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

ARL | sura

Medellín, 30 de diciembre de 2024

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024, NIT N901891548, no presenta accidentes de trabajo desde el 01 de diciembre de 2024 hasta el 30 de diciembre de 2024.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,

Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente
Dirección IP: 179.32.185.73, 192.230.104.12, 172.16.42.57.

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

ANEXO N° 12. CERTIFICADO DE AFILIACIÓN A LA ARL DE LA U.T.

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

ARL | sura

Medellín, 28 de Diciembre de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la circular externa 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera (título VI, numeral 1.5, literal g), se expide la presente constancia de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales.

Nombre o razón	UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024
Cédula de ciudadanía o Nit	N901891548
Fecha inicio de vigencia	23/11/2024 00:00:00
Fecha fin de vigencia	AFILIADA
Estado	EN COBERTURA
Número de centros de trabajo	1
Número de afiliados dependientes	3
Número de afiliados independientes	0
Número cotizantes en mora:	0
% cotizantes en mora:	0 %
Código de actividad principal	5429001
Clase de riesgo 5	Tasa de riesgo 6.96%

ACTIVIDAD ECONÓMICA: CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN,

"Mora: Es el incumplimiento que se genera cuando existiendo afiliación no se realiza la autoliquidación acompañada del respectivo pago de las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social en los plazos establecidos en las disposiciones legales vigentes.

Entiéndase dentro de este concepto, la mora que registra el empleador respecto de algunos trabajadores a su cargo. Art 6

En el estado de cuenta integral podrás encontrar el resumen y detalle actualizado de tus moras, inexactitudes, recobros de AT, pagos de incapacidades y devoluciones disponibles. Esto dará claridad a las diferencias y la mora que presentas. Para consultar el estado de cuenta integral, ingresa a https://www.arlsura.com da clic en Empresa e inicia sesión y sigue esta ruta: Gestión Administrativa/ Mi Empresa/ Estado de Cuenta/ Estado de Cuenta Integral.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:


Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
Dirección IP: 179.32.176.181, 192.230.104.8,

ANEXO N° 13. PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

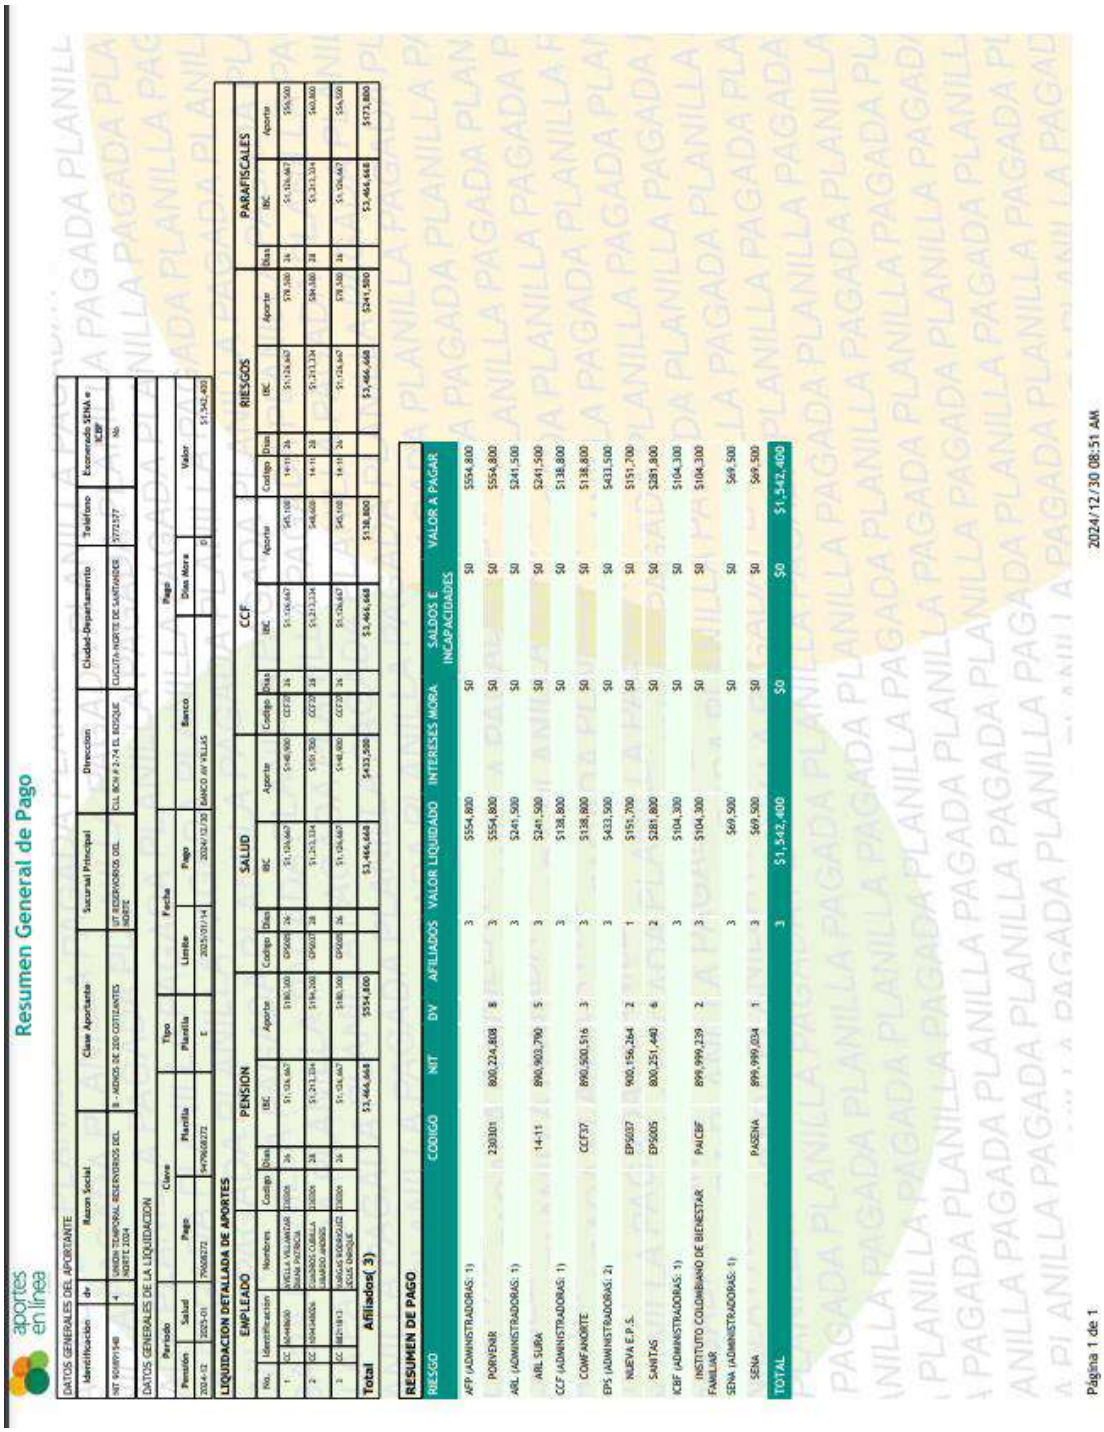

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900901548	4	UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UT RESERVORIOS DEL NORTE	CLL 8CN # 2-74 EL ESFUQUE	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5771577	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago				
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2024-12	2025-01	75008372	549968372	E	2025/01/14	2024/12/30	BANCO AV VILLAS	0	$1,542,400		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

		EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF			RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 1004	AVILLA VILLAMIZAR DIANA PATRICIA	23005	26	$1,134,667	$190,360	EPS005	26	$1,134,667	$136,160	CCF37	26	$1,134,667	$45,100	14-11	26	$1,134,667	$79,380	26	$1,134,667	$56,500
2	CC 1004	CUADROS CABALLERO ANDRES	23005	28	$1,213,334	$194,560	EPS037	28	$1,213,334	$155,700	CCF37	28	$1,213,334	$48,600	14-11	28	$1,213,334	$84,880	28	$1,213,334	$60,800
3	CC 1067	AVILLA RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE	23005	26	$1,134,667	$190,360	EPS005	26	$1,134,667	$136,160	CCF37	26	$1,134,667	$45,100	14-11	26	$1,134,667	$79,380	26	$1,134,667	$56,500
Total	**Afiliados(3)**				$3,482,668	$554,800			$3,482,668	$428,020			$3,482,668	$138,800			$3,482,668	$241,800		$3,482,668	$173,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$554,800	$0	$0	$554,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$554,800	$0	$0	$554,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$241,500	$0	$0	$241,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$241,500	$0	$0	$241,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$138,800	$0	$0	$138,800
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	3	$138,800	$0	$0	$138,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$433,500	$0	$0	$433,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$151,700	$0	$0	$151,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$281,800	$0	$0	$281,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$104,300	$0	$0	$104,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$104,300	$0	$0	$104,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$69,500	$0	$0	$69,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$69,500	$0	$0	$69,500
TOTAL				3	$1,542,400	$0	$0	$1,542,400

Página 1 de 1

2024/12/30 08:51 AM

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que INGESAP INGENIERIA Y PROYECTOS SAS identificado(a) con NI 901275996 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ZURISADAY PRADILLA ATUESTA identificado(a) con CC 1093783015

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9479375192	1148018529	E	2024-12-23	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30																		$1,300,000	4%	$52,000
9479375192	1148018529	E	2024-12-23	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$1,300,000	16%	$208,000
9479375192	1148018529	E	2024-12-23	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-12	30																		$1,300,000		$0
9479375192	1148018529	E	2024-12-23	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-12	30																		$1,300,000		$0
9479375192	1148018529	E	2024-12-23	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-12	30																		$0	0%	$0
9479375192	1148018529	E	2024-12-23	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-12	30																		$0	0%	$0
9479375192	1148018529	E	2024-12-23	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$1,300,000	6.96%	$90,500
9479375192	1148018529	E	2024-12-23	CCF	CCF36	COMFAORIENTE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$1,300,000	4%	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-12-30 a las 07:54.

ANEXO 14. NOMBRAMIENTO DEL VIGIA

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 1.0
	ACTA DE NOMBRAMIENTO DE VIGIAS Y CCL	Fecha: Diciembre 2024
		Página 1 de 2

El día 05 de diciembre de 2024, en las instalaciones de la **UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024**, el representante legal **ZURISADAY PRADILLA ATUESTA,** Designa a la señora **DIANA PATRICIA AVELLA** identificado con C.C. 60.488.600 de Cúcuta, como Vigía y Líder del Comité de convivencia laboral.

Recalcando algunas de las funciones:

VIGIA

- Participar de las actividades de promoción, divulgación e información, sobre seguridad y salud en el trabajo entre empleadores y trabajadores, para obtener su participación activa en el desarrollo de los programas y actividades del SG-SST;
- Actuar como instrumento de vigilancia para el cumplimiento del SG-SST en los lugares de trabajo de la empresa e informar sobre el estado de ejecución de los mismos a las autoridades de seguridad y salud en el trabajo cuando haya deficiencias en su desarrollo;
- Recibir copias, por derecho propio, de las conclusiones sobre inspecciones e investigaciones que realicen las autoridades de seguridad y salud en el trabajo en los sitios de trabajo.
- Proponer a la administración de la empresa o establecimiento de trabajo la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo.
- Proponer y participar en actividades de capacitación en seguridad y salud en los trabajos dirigidos a trabajadores, supervisores y directivos de la empresa
- Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de seguridad y salud en el trabajo en las actividades que éstos adelanten en la empresa y recibir por derecho propio los informes correspondientes.
- Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de seguridad y salud en el trabajo debe realizar la empresa de acuerdo con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes; promover su divulgación y observancia.
- Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y proponer al empleador las medidas correctivas que haya lugar para evitar su ocurrencia. Evaluar los programas que se hayan realizado.
- Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de trabajadores e informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control.
- Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores en la solución de los problemas relativos a la seguridad y salud en el trabajo. Tramitar los reclamos de los trabajadores relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
- Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y enfermedades laborales con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en la Resolución 2013 de 1986.
- Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se desarrollen el cual estará en cualquier momento a disposición del empleador, los trabajadores y las autoridades competentes.
- Las demás funciones que le señalen las normas sobre seguridad y salud en el trabajo

UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 1.0
	ACTA DE NOMBRAMIENTO DE VIGIAS Y CCL	Fecha: Diciembre 2024
		Página 2 de 2

CONVIVENCIA LABORAL

- Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.
- Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de la entidad pública o empresa privada.
- Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja.
- Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva
- Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la confidencialidad.
- Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja y verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado.
- En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de Convivencia Laboral, deberá remitir la queja a la Procuraduría General de la Nación, tratándose del sector público. En el sector privado, el Comité informará a la alta dirección de la empresa, cerrará el caso y el trabajador puede presentar la queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez competente.
- Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, así como el informe anual de resultados de la gestión del Comité de Convivencia Laboral y los informes requeridos por los organismos de control.
- Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de Convivencia a las dependencias de gestión del recurso humano y salud ocupacional de las empresas e instituciones públicas y privadas.
- Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta dirección de la entidad pública o empresa privada.

La presente se firma en consideración y aceptación de roles el 05 de diciembre de 2024, de parte de:

ZURISADAY PRADILLA ATUESTA
Representante legal

DIANA PATRICIA AVELLA
Vigía

INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DE INTERVENTORIA
05 de diciembre del 2024 – 30 de diciembre del 2024

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

1. ANTECEDENTES

1.1. GENERALIDADES

CORPONOR a través del Contrato No. LIC-410-2024, se encuentra adelantando las obras relacionadas con la "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER" proyecto que hace parte del Plan de Acción 2024-2028, para armonizarlo con las Líneas, objetivos y acciones Estratégicas del Plan Estratégico Ambiental Regional – PGAR/PLANEAR, se estable el PROYECTO 1.1.2 1.1.2 GESTIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO Y USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO – cuyo objetivo corresponde Mantener la oferta del recurso hídrico y la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica.

Así mismo, a través del Contrato CMA-412-2024 del 25-11-2024, suscrito con la UNIÓN TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE, cuya representante legal es la señora MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.331.288, adelanta las actividades relacionadas con la Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera al Contrato de Obra No. 410 – 2024 cuyo objeto corresponde a la "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

Conforme a lo establecido en el artículo 31 numeral 6 de la ley 99 de 1993 dentro de sus funciones, CORPONOR podrá celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras entidades públicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de ejecutar de mejor manera alguna o algunas de sus funciones cuando no correspondan al ejercicio de funciones administrativas.

La Corporación tiene como función legal, entre otras, ejecutar, administrar, operar y mantener proyectos y programas de desarrollo sostenible para la recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, función que debe realizar en coordinación con las entidades territoriales.

Corresponde a las CARS, promover y ejecutar obras ambientales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población, interviniendo factores que están generando la degradación del medio ambiente y amenazando los recursos naturales, con lo cual se

determinan soluciones a problemas prioritarios ambientales como es la contaminación de fuentes hídricas. De igual manera es función de la Corporación ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por el mismo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República de Colombia, así como los del orden regional que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción.

De conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán la función de ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables.

Dentro del Plan de Acción Cuatrienal -PAC se encuentra el Programa 1.1: Gestión Integral del Recurso hídrico, cuyo objetivo estratégico corresponde: “Administrar de manera integral y eficiente el recurso hídrico, articulado con el ordenamiento territorial, para promover un desarrollo económico y social sostenible, asegurando la participación ciudadana inclusiva y equitativa (considerando etnias y género)”.

De acuerdo con el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC 2007), la adaptación al cambio climático hace referencia al ajuste de los sistemas naturales o humanos en respuesta a los estímulos o efectos climáticos reales o esperados, siendo entonces las acciones y medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante los efectos del cambio climático.

La vulnerabilidad hace referencia al grado de susceptibilidad o incapacidad de un sistema para afrontar los efectos adversos del cambio climático, incluyendo la variabilidad climática y los fenómenos extremos El IDEAM (Documento cambio climático) establece que las estimaciones bajo los diversos escenarios de cambio climático coinciden en una reducción fuerte en la escorrentía para la región Andina y Caribe respecto a las demás áreas hidrológicas del país (disminuciones mayores del 30% respecto al promedio). La región Andina y Caribe son las más afectadas durante todos los periodos (entre -30% y -10%).

Como parte de la estrategia de preparación para prevenir y atender las emergencias ocasionadas por la llegada del fenómeno, la Corporación, a fin de prever acciones que permitan hacer frente oportunamente a este fenómeno natural, en su Plan de Acción incorpora proyectos que permitirán enfocar esfuerzos en los municipios de su jurisdicción vulnerables a sufrir desabastecimiento de agua, afectaciones por sequía, incendios forestales, entre otros.

En virtud de lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR viene implementando el proyecto de construcción de reservorios como una estrategia orientada al almacenamiento de agua para uso agropecuario principalmente, permitiéndole al campesino contar con un volumen de agua disponible para ser utilizado en periodos de déficit de lluvias.

El reservorio se constituye en un elemento estructural destinado al almacenamiento de agua, convirtiéndose en un medio de mitigación en el evento de escasez en la región. Esta estructura permite almacena agua que se acumula producto de la escorrentía y la que fluye por la superficie del terreno, para que sea directamente disponible en uso agrícola y pecuario. El proyecto surge como una alternativa a la comunidad rural que se encuentra limitada en la sostenibilidad de las áreas de siembra y pecuario en la obtención de eficiencia a la hora de regar el área ya cultivada y para el abrevadero de animales, ya que el caudal que se puede captar de fuentes superficiales posiblemente sea insuficiente y con limitaciones en cuanto a su uso, por situaciones climáticas de disminución de lluvias y reducción de nivel en los acuíferos.

En atención a lo antes expuesto CORPONOR, adelanta la construcción de SETENTA (70) reservorios en la zona rural dispersa de los municipios de Mutiscua, Silos, Cucutilla, Arboledas, Durania, Salazar y San Cayetano, como un proyecto orientado a mantener un volumen de agua que supla requerimientos de riego y abrevadero de animales en periodos de déficit de lluvias, ayudando a reducir el uso intensivo de aguas superficiales y subterráneas, a la vez que facilita el aumento de producción agropecuaria, a través del contrato de obra No. LIC-410-2024, siendo la interventoría desarrollada por intermedio del Contrato CMA-412-2024.

1.2 ALCANCES DEL PROYECTO

Las actividades del contrato de Obra LIC 410 del 2024 abarcan la construcción de SETENTA (70) reservorios tipo australiano para el almacenamiento de agua en la zona rural dispersa de los municipios de Mutiscua, Silos, Cucutilla, Arboledas, Salazar, San Cayetano y Durania, cuenca hidrográfica del rio Zulia, según diseño entregado por CORPONOR, con una capacidad de media 70M3 de almacenamiento de agua.

Las actividades de interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de obra resultante de la licitación pública cuyo objeto es la CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, son realizadas a través del contrato CMA-412-2024.

El tanque australiano es un reservorio de agua, conformado por un círculo con paredes perimetrales de láminas de acero galvanizado curvadas y agujereadas y unidas entre sí por pernos de alta resistencia, recubiertas por una geomembrana. Tiene un diámetro de 9,40 metros por 1.10 metros de altura (apx 70 m3 de capacidad). Adicionalmente, se suministra un rollo de manguera (100m) de polietileno de 1” de diámetro para ser adecuada a la salida del reservorio.



Figura 1. Fotografía de tipo de reservorio (Australiano) en ejecución

1.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como objetivo la construcción de 70 reservorios en la zona rural dispersa de los municipios de Mutiscua, Silos, Cucutilla, Arboledas, Durania, Salazar y San Cayetano, ubicados en el departamento de Norte de Santander, en la región nororiental de Colombia.

La región es caracterizada por su diversidad geográfica, con zonas montañosas, valles y llanuras, lo que la hace propensa a la escasez de agua en épocas de sequía.

Los municipios beneficiados por el proyecto se encuentran en una zona de alta vulnerabilidad climática, con una gran dependencia de la agricultura y la ganadería como actividades económicas principales. La ubicación estratégica de los reservorios permitirá capturar y almacenar agua de lluvia y escorrentía, lo que reducirá la pérdida de agua y aumentará la disponibilidad de agua para riego y abrevadero de animales.

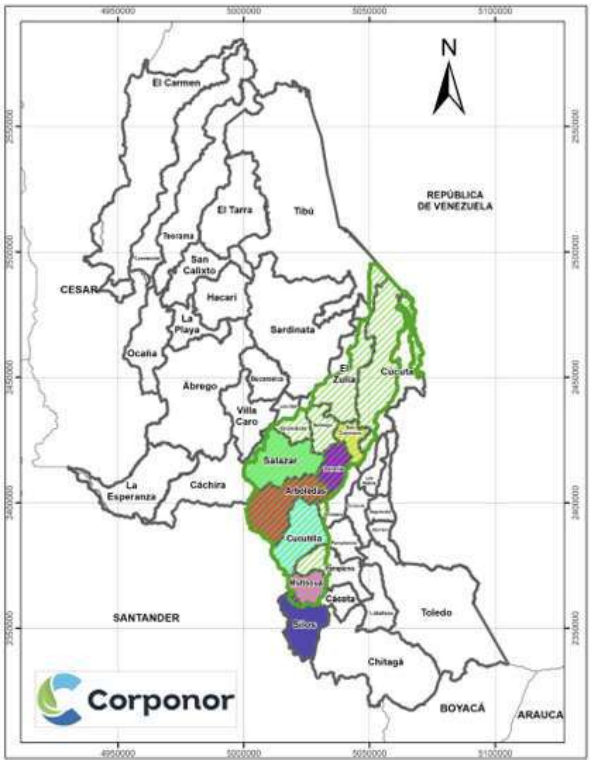


Figura 2. Mapa de político Norte de Santander y localización municipios que hacen parte del proyecto.
Fuente: CORPONOR

Los municipios de Santo Domingo de Silos, Mutiscua, Arboledas, Cucutilla, Durania, Salazar de Las Palmas y San Cayetano se encuentran ubicados en diferentes subregiones del departamento de Norte de Santander, en la región nororiental de Colombia.

1.4 POBLACIÓN BENEFICIADA

El presente proyecto se plantea desarrollar en los municipios de:

MUNICIPIO	CUENCA	NO. DE RESERVORIOS
SANTO DOMINGO DE SILOS	ZULIA	9
MUTISCUA		13
CUCUTILLA		9
ARBOLEDAS		9
SALAZAR DE LAS PALMAS		9
DURANIA		12
SAN CAYETANO		9
TOTAL RESERVORIOS		**70**

Tabla 1. Municipios y número de reservorios a construir
Fuente: Análisis del sector

Cada municipio tiene características geográficas y climáticas únicas, como la altitud, temperatura y precipitación. Por ejemplo:

- ✓ Santo Domingo de Silos es el municipio más alto del departamento, con una altitud de 2.845 metros sobre el nivel del mar, y una temperatura promedio de 12,1 °C.
- ✓ Mutiscua se encuentra a una altitud de 2.650 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 14 °C.
- ✓ Arboledas tiene una altitud de 946 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 22 °C.
- ✓ Cucutilla se encuentra a una altitud de 1.017 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 22 °C.
- ✓ Durania tiene una altitud de 950 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 22 °C.
- ✓ Salazar de Las Palmas se encuentra a una altitud de 815 metros sobre el nivel del mar.
- ✓ San Cayetano tiene una altitud media de 235 metros sobre el nivel del mar.

2. CONDICIONES CONTRACTUALES

2.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA No. LIC401/2024

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PUBLICA
TIPO DE CONTRATO	OBRA
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	25 DE NOVIEMBRE DE 2024
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	1158 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2024
ENTIDAD CONTRATANTE	CORPONOR
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO	$1.279.545.260
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL CONTRATADO	$1.279.545.260
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	30 DÍAS
PLAZO DE EJECUCIÓN ADICIONAL	30 DÍAS
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	60 DÍAS
FECHA DE INICIO	05 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	03 DE FEBRERO DE 2025

2.2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA412/2024

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONCURSO DE MÉRITOS
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	25 DE NOVIEMBRE DE 2024
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	1110 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024
ENTIDAD CONTRATANTE	CORPONOR
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO	$ 83.009.127
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 83.009.127
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	30 DÍAS
PLAZO DE EJECUCIÓN ADICIONAL	30 DÍAS
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	60 DÍAS
FECHA DE INICIO	05 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	03 DE FEBRERO DE 2025

2.3 PLAZO CONTRACTUAL

Con relación al plazo contractual, es de un (1) mes que corresponde a 30 días calendario, más un (1) mes adicional para un total de dos (2) meses que corresponde a 60 días.

2.4 RELACIÓN DE PÓLIZAS

2.4.1 RELACIÓN DE PÓLIZAS SUSCRITAS INICIALES

2.4.1.1 RELACIÓN DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA LIC401 DE 2024			
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.	**PÓLIZA No.:**	46047994000080967
FECHA DE EXPEDICIÓN:	26/11/2024	**FECHA DE APROBACIÓN:**	26/11/2024
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	25/11/2024	25/04/2025	$127.954.526,00
PRESTACIONES SOCIALES	25/11/2024	25/04/2025	$63.977.263,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	VER NOTA ACLARATORIA		$383.863.578,00

CONTRATO DE OBRA LIC401 DE 2024			
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.	**PÓLIZA No.:**	46074994000008097
FECHA DE EXPEDICIÓN:	26/11/2024	**FECHA DE APROBACIÓN:**	26/11/2024
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	25/11/2024	25/12/2024	$260.000.000

***** NOTA ACLARATORIA *****
EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.
Pólizas iniciales contrato de obra.

CONTRATO DE OBRA LIC401 DE 2024			
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.	**PÓLIZA No.:**	46047994000080967
FECHA DE EXPEDICIÓN:	11/12/2024	**FECHA DE APROBACIÓN:**	11/12/2024
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	05/12/2024	05/05/2025	$127.954.526,00
PRESTACIONES SOCIALES	05/12/2024	05/01/2028	$63.977.263,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	VER NOTA ACLARATORIA		$383.863.578,00

ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.	**PÓLIZA No.:**	46074994000008097
FECHA DE EXPEDICIÓN:	11/12/2024	**FECHA DE APROBACIÓN:**	11/12/2024
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	25/12/2024	05/01/2025	$260.000.000

***** NOTA ACLARATORIA *****
EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.
Pólizas actualizadas – Acta de inicio - Contrato de obra.

2.4.1.2 RELACIÓN DE PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA CMA412 DE 2024			
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**PÓLIZA No.:**	460-47-994000080982
FECHA DE EXPEDICIÓN:	26/11/2024	**FECHA DE APROBACIÓN:**	26/11/2024
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	25/11/2024	25/04/2025	$8.300.912,70

PRESTACIONES SOCIALES	25/11/2024	25/07/2027	$4.150.456,35
ESTABILIDAD DE LA OBRA	25/12/2024	25/12/2029	$8.300.912,70

ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**PÓLIZA No.:**	460-74-994000008100
FECHA DE EXPEDICIÓN:	26/11/2024	**FECHA DE APROBACIÓN:**	26/11/2024
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	25/11/2024	25/12/2024	$260.000.000

Anexo *de pólizas iniciales contrato de interventoría.*

CONTRATO DE OBRA CMA412 DE 2024			
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**PÓLIZA No.:**	460-47-994000080982
FECHA DE EXPEDICIÓN:	06/12/2024	**FECHA DE APROBACIÓN:**	06/12/2024
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	05/12/2024	04/05/2025	$8.300.912,70
PRESTACIONES SOCIALES	05/12/2024	04/01/2028	$4.150.456,35
ESTABILIDAD DE LA OBRA	04/01/2025	04/01/2030	$8.300.912,70

ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**PÓLIZA No.:**	460-74-994000008100
FECHA DE EXPEDICIÓN:	06/12/2024	**FECHA DE APROBACIÓN:**	06/12/2024
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	05/12/2024	04/01/2024	$260.000.000

Anexo *de pólizas iniciales – Acta de inicio - Contrato de interventoría.*

2.4.2 RELACIÓN DE PÓLIZAS SUSCRITAS POR MODIFICACIONES Y SUSPENSIONES

2.4.2.1 RELACIÓN DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA LIC401 DE 2024			
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.	**PÓLIZA No.:**	46047994000080967
FECHA DE EXPEDICIÓN:	28/12/2024	**FECHA DE APROBACIÓN:**	28/12/2024
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	05/12/2024	0306/2024	$127.954.526,00
PRESTACIONES SOCIALES	05/12/2024	03/02/2024	$63.977.263,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	VER NOTA ACLARATORIA		$383.863.578,00

ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.	**PÓLIZA No.:**	46074994000008097
FECHA DE EXPEDICIÓN:	28/12/2024	**FECHA DE APROBACIÓN:**	28/12/2024
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	05/12/2024	03/02/2025	$260.000.000

***** NOTA ACLARATORIA *****
EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.
Pólizas actualizadas del contrato de obra.

2.4.2.2 RELACIÓN DE PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA CMA412 DE 2024			
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**PÓLIZA No.:**	460-47-994000080982
FECHA DE EXPEDICIÓN:	27/12/2024	**FECHA DE APROBACIÓN:**	27/12/2024
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	05/12/2024	03/06/2025	$8.300.912,70
PRESTACIONES SOCIALES	05/12/2024	03/02/2028	$4.150.456,35
ESTABILIDAD DE LA OBRA	03/02/2025	03/02/2030	$8.300.912,70

ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**PÓLIZA No.:**	460-74-994000008100
FECHA DE EXPEDICIÓN:	27/12/2024	**FECHA DE APROBACIÓN:**	27/12/2024
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	04/01/2024	03/02/2025	$260.000.000

Anexo *de pólizas actualizadas del contrato de interventoría.*

2.5 SEGUIMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES DEL PROYECTO

Las actividades cantidades de obra a desarrollas según contratos:

CONTRATO INICIAL						ADICIÓN O MODIFICACIÓN			TOTAL CONTRATADO	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR. UNITARIO**	**V/R PARCIAL**	**+ /-**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**V/R PARCIAL**
1	Localización y replanteo manual	m2	95	**$4065,00**	**$ 386.175,00**				95	**$386.175,00**
2	Limpieza y descapote		95	$6309,00	$599.355,00				95	$599.355,00
3	Colchón de arena 5 cm	m2	4.75	$251.407,00	$1.194.183,00				4.75	$1.194.183,00
4	Suministro e instalación de tanque tipo australiano 73100 lt	UND	1	$11.673.799,00	$11.673.799,00				1	$11.673.799,00
5	Divulgar y socializar el proyecto a la	UND	1	$24.871,00	$24.871,00				1	$24.871,00



CONTRATO INICIAL						ADICIÓN O MODIFICACIÓN			TOTAL CONTRATADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	V/R PARCIAL	+/-	CANT	VR. PARCIAL	CANT	V/R PARCIAL
	comunidad y actores involucrados									
TOTAL, COSTOS DIRECTOS					**$13.878.383,00**			**$**		**$13.878.383,00**
ADMINISTRACIÓN 20%					$2.775.676,60					$2.775.676,60
IMPREVISTOS 1%					$ 138.783,83					$138.783,83
UTILIDAD 9%					$1.249.054,47					$1.249.054,47
IVA 19%					$ 237.320,35					$237.320,35
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$4.400.835,00**			**$**		**$4.400.835,00**
COSTO TOTAL OBRAS					**$18.279.218,00**			**$**		**$18.279.218,00**
TOTAL, COSTO DE OBRA 70 RESERVORIOS					**$1.279.545.260,00**					**$1.279.545.260,00**
INTERVENTORIA										**$83.009.127,00**
TOTAL PROYECTO										**$1.362.554.387,00**

Aclaración sobre Ajuste en la Carga Administrativa del Personal de Interventoría

Se presenta la siguiente aclaración con respecto a la solicitud realizada por la interventoría a la entidad contratante, con el objetivo de mantener el equilibrio económico del contrato. En este sentido, la interventoría propuso un ajuste en la carga administrativa del personal, distribuyéndola de la siguiente manera:

- Director de interventoría: 30% de dedicación

PRESUPUESTO INICIAL

Corponor	PRESUPESTO INTERVENTORIA					
INTERVENTORIA A LA OBRA CONTRUCCIÓN DE RESERVORIOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA CONA RURAL DISPERSA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER						
1. COSTO DE PERSONAL						
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**DURACION (meses)**	**OCUPACIÓN**	**COSTO/MES**	**F.M.**	**COSTO PERSONAL/MES**
Director	1	1	100%	$ 6.500.000,00	203,25%	$ 13.211.536,00
Ingeniero Residente	3	1	100%	$ 4.550.000,00	203,25%	$ 27.744.226,00
Contador	1	1	20%	$ 4.550.000,00	203,25%	$ 1.849.615,00
Secretaria	1	1	100%	$ 1.560.000,00	203,25%	$ 3.170.769,00
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL						**$ 45.976.146,00**
2. COSTO GENERALES						
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**OCUPACIÓN**	**TIEMPO (meses)**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**VALOR /MES**
LEGALIZACION DE CONTRATO	GLB				$ 1.079.423,14	$ 1.079.423,00
TOPOGRAFÍA,INCLUYE EQUIPOS, TOPÓGRAFO, CADENEROS,	MES	100%	1,00	1	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00
ALQUILER DE OFICINA	MES		1,00	1	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
ALQUILER DE VEHICULO, INCLUYE CHOFER	MES	100%	1,00	2	$ 5.500.000,00	$ 11.000.000,00
COMUNICACIONES(TELEFONÍA FIJA Y/O CELULAR, FAX, CORREO, INTERNET, OTROS MEDIOS)	MES		1,00		$ 500.000,00	$ 500.000,00
EDICION DE INFORMES, PAPELERIA, REPRODUCCION DE DOCUMENTOS, PLANOS, FOTOGRAFÍAS , OTROS	MES		1,00		$ 200.000,00	$ 200.000,00
SUBTOTAL COSTO GENERALES						**$ 23.779.423,00**
COSTO BÁSICO: COSTO PERSONAL (1) + COSTO GENERALES (2)						**$ 69.755.569,00**
VALOR IVA (19%)						**$ 13.253.558,00**
VALOR TOTAL PROPUESTA						**$ 83.009.127,00**

MARIA ALEJANDRA [illegible] GARCIA
C.C. 37.281.788 de Ocaña
UNION TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE
Representante Legal

Adicionalmente, se realizarán ajustes salariales específicos para los profesionales, conforme a las necesidades particulares de cada uno. También se efectuarán modificaciones en los salarios correspondientes a los costos generales del proyecto, aunque se aclara que el valor total inicial del contrato no sufrirá alteraciones.

Este ajuste es considerado necesario, ya que, a pesar de haberse otorgado una prórroga en la duración del contrato, no se han asignado recursos adicionales para cubrir los costos operativos derivados de dicha extensión. Por lo tanto, se ha propuesto una redistribución de los porcentajes de dedicación del personal, con el fin de asegurar que el seguimiento y control de la ejecución de las obras continúen siendo adecuados y eficaces, respetando los límites presupuestarios establecidos.

Asimismo, el ajuste contempla la modificación del presupuesto de interventoría para garantizar una distribución equitativa de los recursos durante el mes de diciembre. Este ajuste permitirá que la interventoría continúe cumpliendo con sus funciones de manera eficiente y conforme a los plazos y condiciones contractuales, sin comprometer el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para el proyecto.

PRESUPUESTO AJUSTADO MEDIANTE AJUSTE DE CARGAS

Corponor	PRESUPESTO INTERVENTORIA

INTERVENTORIA A LA OBRA CONTRUCCIÓN DE RESERVORIOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA CONA RURAL DISPERSA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

1. COSTO DE PERSONAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	DURACION (meses)	OCUPACIÓN	COSTO/MES	F.M.	COSTO PERSONAL/MES
Director	1	2	30%	$ 6.500.000,00	203,25%	$ 7.926.922,00
Ingeniero Residente	3	2	100%	$ 2.296.666,73	203,25%	$ 28.008.457,00
Contador	1	2	20%	$ 4.550.000,00	203,25%	$ 3.699.230,00
Secretaria	1	2	100%	$ 1.560.000,00	203,25%	$ 6.341.537,00
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL						**$ 45.976.146,00**

2. COSTO GENERALES

DESCRIPCION	UNIDAD	OCUPACIÓN	TIEMPO (meses)	CANTIDAD	VALOR	VALOR /MES
LEGALIZACION DE CONTRATO	GLB				$ 1.079.423,14	$ 1.079.423,00
TOPOGRAFÍA,INCLUYE EQUIPOS, TOPÓGRAFO, CADENEROS,	MES	100%	1,00	1	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00
ALQUILER DE OFICINA	MES		2,00	1	$ 1.000.000,00	$ 2.000.000,00
ALQUILER DE VEHICULO, INCLUYE CHOFER	MES	100%	2,00	2	$ 3.575.000,00	$ 14.300.000,00
COMUNICACIONES(TELEFONÍA FIJA Y/O CELULAR, FAX, CORREO, INTERNET, OTROS MEDIOS)	MES		2,00		$ 500.000,00	$ 1.000.000,00
EDICION DE INFORMES, PAPELERIA, REPRODUCCION DE DOCUMENTOS, PLANOS, FOTOGRAFÍAS , OTROS	MES		2,00		$ 200.000,00	$ 400.000,00
SUBTOTAL COSTO GENERALES						**$ 23.779.423,00**

COSTO BÁSICO: COSTO PERSONAL (1) + COSTO GENERALES (2)	**$ 69.755.569,00**
VALOR IVA (19%)	**$ 13.253.558,00**
VALOR TOTAL PROPUESTA	**$ 83.009.127,00**

Figura 3. Propuesta económica prorroga

2.5.1 ACTAS SUSCRITAS

DESCRIPCIÓN	***FECHA***
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA412/2024	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	25-11-2024
ACTA DE INICIO	05-12-2024
ACTA DE SOCIALIZACIÓN – SALAZAR DE LAS PALMAS	03-12-2024
ACTA DE VEEDURÍA – SALAZAR DE LAS PALMAS	03-12-2024
ACTA DE SOCIALIZACIÓN – ARBOLEDAS	04-12-2024
ACTA DE VEEDURÍA – ARBOLEDAS	04-12-2024
ACTA DE SOCIALIZACIÓN No. 1 – CUCUTILLA	04-12-2024
ACTA DE VEEDURÍA – CUCUTILLA	04-12-2024
ACTA DE SOCIALIZACIÓN – DURANIA	05-12-2024
ACTA DE VEEDURÍA – DURANIA	05-12-2024
ACTA DE SOCIALIZACIÓN – SAN CAYETANO	10-12-2024
ACTA DE VEEDURÍA – SAN CAYETANO	10-12-2024
ACTA DE SOCIALIZACIÓN – MUTISCUA	11-12-2024
ACTA DE VEEDURÍA – MUTISCUA	11-12-2024
ACTA DE SOCIALIZACIÓN – SILOS	18-12-2024
ACTA DE VEEDURÍA – SILOS	18-12-2024
ACTA DE COMITÉ No. 1	19-12-2024
PRORROGA No. 1	27-12-2024

DESCRIPCIÓN	FECHA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA412/2024	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01	30-12-2024

Anexo. *Actas suscritas en el periodo del informe (Comités, suspensión y reinicio)*

3 CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS DE EJECUCIÓN

Con relación al plazo contractual, han transcurrido VEINTISÉIS (26) días calendario desde la suscripción del acta de inicio, por lo cual tiempo laborado corresponde al 17,71% del total del tiempo contractual en 75 dias calendario.

DIAS LABORADOS DEL CONTRATO No. LIC390/2024		
FECHA DE INICIO	**FECHA FIN**	**CANTIDAD EN DIAS**
05/12/2024	30/12/2024	26
TOTAL		26
DIAS LABORADOS DEL CONTRATO No. CMA399/2024		
FECHA DE INICIO	**FECHA FIN**	**CANTIDAD EN DIAS**
05/12/2024	30/12/2024	26
TOTAL		26

ANEXO 1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE FONDOS

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 - 2024				CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CMA412 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER					DESDE:	5/12/2024
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024	SUPERVISOR:	JAVIER ALEXIS BECERRA ALBARRACIN	INFORME No.	1	HASTA:	30/12/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	MES No. 1 05/12/2024 - 30/12/2024 DIAS	MES No. 1 CANT	MES No. 1 V. TOTAL	ACUMULADO DIAS	ACUMULADO CANT	ACUMULADO V. TOTAL	PORCENTAJE EJECUTADO
1	Localización y replanteo manual	m2	6650	$ 4.065,00	$ 27.032.250,00	12,00	6650,00	$ 27.032.250,00	12	6650	$ 27.032.250,00	100%
						12,00	6650,00	$ 27.032.250,00	12	6650	$ 27.032.250,00	
2	Limpieza y descapote	m2	6650	$ 6.309,00	$ 41.954.850,00	16,00	6650,00	$ 41.954.850,00	16	6650	$ 41.954.850,00	100%
						16,00	6650,00	$ 41.954.850,00	16	6650	$ 41.954.850,00	
3	Colchón de arena 5 cm	m3	332,5	$ 251.407,00	$ 83.592.828,00	13,00	332,50	$ 83.592.828,00	13	333	$ 83.592.828,00	100%
						13,00	332,50	$ 83.592.828,00	13	333	$ 83.592.828,00	
4	Suministro e instalación de tanque tipo australiano 73100 lt	und	70	$ 11.673.799,00	$ 817.165.930,00	13,00	70	$ 817.165.930,00	13	70	$ 817.165.930,00	
								$ -			$ -	
5	Divulgar y socializar el proyecto a la comunidad y actores involucrados	und	70	$ 24.871,00	$ 1.740.970,00	6,00	70,00	$ 1.740.970,00	6	70	$ 1.740.970,00	
								$ -			$ -	
	COSTO DIRECTO CONTRATADO Y/O PROGAMADO				**$ 971.486.828,00**	PROGRAMADO MES 1		**$ 971.486.828,00**	PROGRAMADO ACUMULADO		**$ 971.486.828,00**	
	ADMINISTRACIÓN			20%	194297365,6			194297365,6			194297365,6	
	IMPREVISTOS			1%	9714868,28			9714868,28			9714868,28	
	UTILIDADES			9%	87433814,52			87433814,52			87433814,52	
	IVA sobre utilidad			19%	16612425			16612424,76			16612424,76	
	COSTO INDIRECTO CONTRATADO Y/O PROGAMADO				**$ 308.058.432,00**			**$ 308.058.473,00**			**$ 308.058.473,00**	
	VALOR TOTAL CONTRATADO Y/O PROGAMADO				**$ 1.279.545.260,00**			**$ 1.279.545.301,00**			**$ 1.279.545.301,00**	
	% AVANCE MENSUAL											
	% AVANCE ACUMULADO											

COSTO DIRECTO EJECUTADO		EJECUTADO MES 1	**$ 152.579.928,00**	EJECUTADO ACUMULADO **$ 152.579.928,00**
ADMINISTRACIÓN	20%		30515985,6	30515985,6
IMPREVISTOS	1%		1525799,28	1525799,28
UTILIDADES	9%		13732193,52	13732193,52
IVA sobre utilidad	19%		2609116,769	2609116,769
COSTO INDIRECTO EJECUTADO			**$ 48.383.072,00**	**$ 48.383.072,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO			**$ 200.963.000,00**	**$ 200.963.000,00**
% AVANCE MENSUAL				
% AVANCE ACUMULADO				

ANEXO 2. CONTROL DE TIEMPOS
MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024


CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 - 2024				CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CMA412 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER					DESDE:	5/12/2024
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024	SUPERVISOR:	JAVIER ALEXIS BECERRA ALBARRACIN	INTERVENTOR:	UNIÓN TEMPORALINTERRESERVORIOS NORTE	HASTA:	30/12/2024
						INFORME No.	1

Fecha de inicio:	5/12/2024
Plazo inicial (meses)	1,00
Plazo adicional (meses)	0,00
Duración total (meses)	1,00

Fecha de terminación	4/01/2025
Días ejecucíon	31
Días ejecucíon	0
Total Días ejecucíon	31

Fecha de reporte	30/12/2024
Días planeados	31
Días transcurridos	26
Días faltantes	5

N°	Descripción de la etapa	Duración en (días)	Inicio	Fin	Estatus	Fecha de terminación Estimado
1	Ejecución inicial	31	05/12/24	04/01/25	Ejecución	4/01/2025
2	Adición o Prorroga	31	05/01/25	04/02/25	Ejecución	4/02/2025
3	Informe No.1	22	05/12/24	26/12/24	Entregado	
4	Acta Parcial No. 1	22	05/12/24	26/12/24	Entregado	



Ver Anexos del informe de obra - *Anexo No. 1 (Cronograma de actividades y flujo de fondos) y Anexo No. 2 (Tablero de control de tiempos).*

4 CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA

La obra tiene para su ejecución un plazo de un (1) mes que corresponde a 30 días calendario, contados a partir de la fecha de acta de inicio, es decir a partir del 05 de diciembre de 2024 y con fecha de finalización del día 04 de enero de 2024, sin embargo, se le realizo una prórroga de un (1) mes para un total de dos (2) meses que corresponde a 60 días, con fecha de finalización del día 03 de febrero de 2024. Se realiza el seguimiento y control al cronograma de ejecución del proyecto, representando gráficamente las actividades programas Vs ejecutadas.

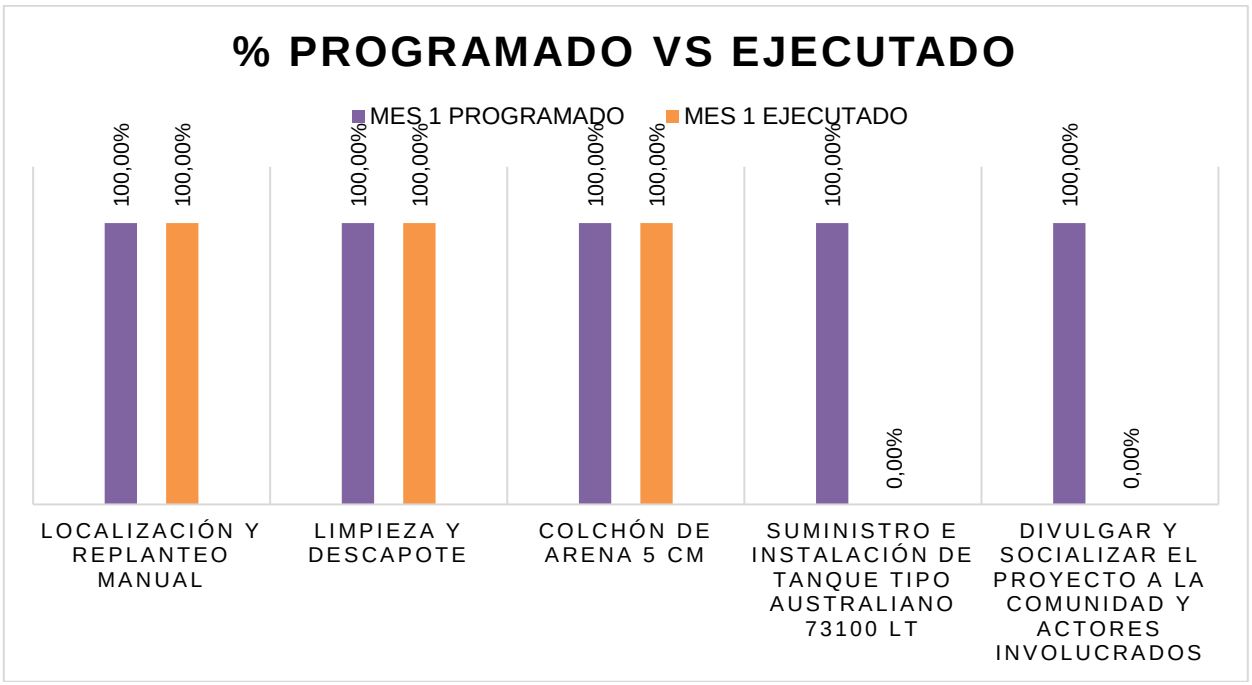


Gráfico 1. Actividades programadas vs ejecutado

5 AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

El valor del contrato corresponde a la suma de **OCHENTA Y TRES MILLONES NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/CTE ($83.009.127,00). Incluido IVA.** LA CORPORACIÓN reconocerá y pagará a la INTERVENTORÍA las sumas del valor del contrato de la siguiente manera: con la suscripción de actas parciales de ejecución de las actividades presentadas por el contratista, con el debido lleno de los requisitos legales exigidos y aprobados por la supervisión.

El presente informe para acta de cobro parcial No 1, en el cual se relaciona un avance físico – financiero ejecutado acumulado del 17,71%, correspondiente a valor de **TRECE MILLONES CUARENTA MIL VEINTE PESOS M/CTE. ($13.040.020,00)** del valor total contratado.

ANEXO 1. BALANCE FISICO - FINANCIERO DE OBRA E INTERVENTORIA
MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 - 2024				CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CMA412 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024			PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER						DESDE:	5/12/2024
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024	SUPERVISOR:	JAVIER ALEXIS BECERRA ALBARRACIN	INTERVENTOR	TEMPORALINTERRESERVORIOS UNION NORTE	INFORME No. 1	HASTA:	30/12/2024

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO						MODIFICACION O ADICIÓN			TOTAL CONTRATADO		INFORME No. 1 05/12/2024 - 26/12/2024		ACUMULADO EJECUTADO		% EJECUTADO	POR EJECUTAR		% POR EJECUTAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR ($)	+/-	CANTIDAD	VALOR ($	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)		CANTIDAD	VALOR ($)	
1	Localización y replanteo manual	m2	6650	$ 4.065,00	$ 27.032.250,00				6.650,00	$ 27.032.250,00	6.650,00	$ 27.032.250,00	6.650,00	$ 27.032.250,00	100%			
2	Limpieza y descapote manual 10 cm, incluye retiro	m2	6650	$ 6.309,00	$ 41.954.850,00				6.650,00	$ 41.954.850,00	6.650,00	$ 41.954.850,00	6.650,00	$ 41.954.850,00	100%			
3	Colchon de arena 5 cm	m3	332,5	$ 251.407,00	$ 83.592.828,00				332,50	$ 83.592.828,00	332,50	$ 83.592.828,00	332,50	$ 83.592.828,00	100%			
4	Suministro e instalación de tanque tipo austrialiano 73100 lt	und	70	$ 11.673.799,00	$ 817.165.930,00				70,00	$ 817.165.930,00	-		-			70,00	$ 817.165.930,00	100%
5	Divulgar y socializar el proyecto a la comunidad y actores involucrados	und	70	$ 24.871,00	$ 1.740.970,00				70,00	$ 1.740.970,00	-		-			70,00	$ 1.740.970,00	100%
COSTO DIRECTO					$ 971.486.828,00					$ 971.486.828,00		$ 152.579.928,00		$ 152.579.928,00			$ 818.906.900,00	
ADMINISTRACIÓN				20%	$ 194.297.365,60					$ 194.297.365,60		$ 30.515.985,60		$ 30.515.985,60			$ 163.781.380,00	
IMPREVISTOS				1%	$ 9.714.868,28					$ 9.714.868,28		$ 1.525.799,28		$ 1.525.799,28			$ 8.189.069,00	
UTILIDADES				9%	$ 87.433.814,52					$ 87.433.814,52		$ 13.732.193,52		$ 13.732.193,52			$ 73.701.621,00	
IVA sobre utilidad				19%	$ 16.612.424,76					$ 16.612.424,76		$ 2.609.116,77		$ 2.609.116,77			$ 14.003.307,99	
COSTO INDIRECTO					$ 308.058.432,00					$ 308.058.432,00		$ 48.383.072,00		$ 48.383.095,00			$ 259.675.360,00	
VALOR TOTAL					$ 1.279.545.260,00					$ 1.279.545.260,00		$ 200.963.000,00		$ 200.963.000,00			$ 1.078.582.260,00	
PORCENTAJE DE AVANCE											15,71%		15,71%			84,29%		
INTERVENTORIA					$ 69.755.569,00					$ 69.755.569,00		$ 10.958.000,00		$ 10.958.000,00			$ 58.797.569,00	
IVA Interventoria				19%	$ 13.253.558,11		$ -			$ 13.253.558,11		$ 2.082.020,00		$ 2.082.020,00			$ 11.171.538,11	
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO					$ 83.009.127,00		$ -			$ 83.009.127,00		$ 13.040.020,00		$ 13.040.020,00			$ 69.969.107,00	
PORCENTAJE DE AVANCE INTERVENTORIA											15,71%		15,71%			84,29%		

AVANCE FÍSICO :	15,71%

***Anexo No. 1**. (Balance físico – financiero de obra e interventoría)*

6 CONDICIONES CLIMÁTICAS Y/O ORDEN PUBLICO

Las temperaturas máximas diarias son alrededor de 30 °C, rara vez bajan a menos de 27 °C o exceden 32 °C. Las temperaturas mínimas diarias son alrededor de 23 °C, rara vez bajan a menos de 21 °C o exceden 24 °C.

Durante el periodo del presente proyecto se caracteriza por tener temperaturas promedio de 24°C en el día y 13°C en la noche, y lluvias de 10 días.

- Se presentan intervenciones sobre las vías principales como lo son entrada al municipio de Santiago que comunica a los municipios de Salazar, Arboledas y Cucutilla, vía que comunica a Salazar con Arboledas y Cucutilla.

En cuanto a vías terciarias encontramos:

- El municipio de Arboledas en la vereda de Juan Bueno está ejecutando una placa huella.
- El municipio de Cucutilla en la salida hacia las veredas de San miguel y guayabito se realiza la pavimentación de la vía hacia el corregimiento de san José de la montaña se está realizando un box culvert.
- En el municipio de Salazar en la vereda el arenal se está ejecutando una placa huella

7 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES EJECUTADAS OBRA E INTERVENTORIA

- **Elección del lugar y ubicación del tanque:** Los tanques australianos deben ser construidos en lugares elevados para alimentar por gravedad a los sistemas de riego y bebederos de los animales. La ubicación de los tanques se determina en base al uso que se le dará. Como norma general siempre se ubican preferentemente cercanos a la fuente de abastecimiento de agua y en el sector más alto del campo posible. Se debe considerar tener una altura superior al punto más lejano a donde se desea llevar el agua para permitir la conducción de agua por gravedad. Debe instalarse lejos de cañadones y cursos de agua que pudieran socavar la base del tanque.
- **Localización y replanteo manual:** El área delimitada debe estar completamente despejado de malezas, ramas, piedras y finalmente nivelado en una superficie al diámetro al tanque australiano que en nuestro caso es de 9.40m. Al nivelar el piso del terreno debe dársele la pendiente adecuada hacia el punto definido para el drenaje del mismo, esto con finalidad de facilitar las labores de limpieza del mismo.
- **Excavación de fondo:** Fijar un punto en el centro del terreno nivelado y con una estaca clavada en ese punto utilizar una cuerda para trazar una circunferencia con radio de 4.75 m que señale en el suelo la línea que indicara la posición de las láminas del tanque a instalar. siguiendo esta línea de referencia se debe cavar una profundidad de 10 cms, tomando especial cuidado en que el fondo quede completamente a nivel.
- **Colchón de arena:** A la excavación realizada de 10cm se le realiza un colchón de arena fina de 5cm, se compacta con la finalidad de proteger el geotextil que se instalara.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	V/R PACIAL
1	Localización y replanteo manual	M3	6858	$19.702,00	$135.116.316,00
2	Limpieza y descapote	M3	2227	$18.757,00	$41.771.839,00
3	Colchón de arena 5 cm	M3	1693	$19.702,00	$33.355.486,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$152.579.928,00**
ADMINISTRACIÓN 20%					$30.515.985,60
IMPREVISTOS 1%					$1.525.799,28
UTILIDAD 9%					$13.732.193,52
IVA 19%					$2.609.116,77
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$48.383.072,00**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	V/R PACIAL
COSTO TOTAL OBRA					$200.963.00,00
INTERVENTORIA					$13.040.020,00
TOTAL PROYECTO ADICIONAL					$214.003.020,00

Ver Anexo del informe de obra - *Anexo No. 4. (Memorias de cálculo de cantidades de obra desarrolladas en el periodo del informe)*

Anexo No. 02. (*Registro fotográfico de interventoría del avance del proyecto del periodo del informe presentado y condiciones climáticas)*.

Anexo (*Bitácora con firma de los residentes de obra e interventoría y su respectivo registro fotográfico. (Dejar constancia de los días en que hace presencia el director de obra y solo se entrega en el informe final la bitácora original)*

7.2 DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

El contratista de obra mantuvo todo el personal tanto administrativo como de obra, según su propuesta durante el periodo de corte de ejecución. Así mismo la interventoría también mantuvo el personal tanto administrativo como de obra, según su propuesta durante el periodo de corte de ejecución.

Se realizan actividades administrativas como:

1. Elaboración de bitácora de obra
2. Elaboración de Comités técnicos de obra
3. Elaboración Informe periodo
4. Relación de personal en obra
5. Revisión de cantidades de obra (acta parcial)
6. Elaboración de Registro fotográfico de obra.
7. Control de cantidades ejecutadas de obra.

7.3 PERMISOS GESTIONADOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Se describen los permisos gestionados y entrega de documentos solicitados requeridos para la ejecución del proyecto. Estos documentos son solicitados en las obligaciones del contratista según la naturaleza del proyecto y exigidos por el supervisor de Corponor.
Anexar *documentos solicitados si aplica.*

7.4 INFORMES EJECUTIVOS DE ACCIONES MENSUALES DE LOS ASESORES ESPECIALISTAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Cada asesor o especialista que se encuentra relacionado en la propuesta del contrato de interventoría debe entregar mensualmente un informe mensual de las acciones realizadas en durante el periodo del informe presentado.
Anexo *informes de los especialistas y/o asesores*

7.5 ESTADO FINANCIERO Y RELACIÓN DE PAGOS

7.5.1 ESTADO FINANCIERO Y RELACIÓN DE PAGOS DEL CONTRATO DE OBRA

El avance físico – financiero del contrato de obra es 15,71% del valor total contratado.

Se suscribió acta parcial de obra No. 1 por valor de $200.963.00,00, para un valor total a cobrar de $$200.963.00,00del valor total contratado de $1.279.545.260,00.

Saldo por pagar $1.078.582.260,00, una vez se hagan efectivos los pagos parciales de las actas suscritas.

7.5.2 ESTADO FINANCIERO Y RELACIÓN DE PAGOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

El avance físico – financiero del contrato de interventoría es 15,71% del valor total contratado.

Ver Anexo No. 3 *(Relación de pagos obra e interventoría)*

Se suscribió acta parcial de obra No. 1 por valor de $13.040.020,00, para un valor total a cobrar de $13.040.020,00del valor total contratado de $83.009.127,00.

Saldo por pagar $69.969.107,00, una vez se hagan efectivos los pagos parciales de las actas suscritas.

8 VERIFICACIÓN DEL CONTROL SOCIAL

Durante el presente periodo se realizaron las acta de socialización en los respectivos municipios y se elaboraron las actas de conformación de la veeduría.

SALAZAR DE LAS PALMAS



ARBOLEDAS



CUCUTILLA



DURANIA



SAN CAYETANO



MUTISCUA



SILOS



9 VERIFICACIÓN CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO DE HSEQ DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se realiza seguimiento y control a los criterios de cumplimiento de seguridad, salud en el trabajo y manejo ambiental de obras públicas realizado por el contratista de obra y mencionar que los soportes se anexan en el informe de ejecución del contratista de obra. Revisión de seguimiento y aplicación de planes (Riesgo, Ambiental, Señalización, emergencia y calidad)

Anexo MPA-01-F-25 - Versión 3 *(Lista de verificación del cumplimiento de criterios de seguridad, salud en el trabajo y manejo ambiental en obras públicas).*

Anexo *(Informes mensuales HSEQ con sus respectivos anexos al informe solicitados en el formato MPA-01-F28 Versión 2). (Informes mensuales HSEQ con sus respectivos anexos al informe solicitados en el formato MPA-01-F28 Versión 2).*

9.1 LISTADO DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Para la ejecución del proyecto se contrató el siguiente personal:

NOMBRE	CEDULA	CARGO
MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA	37.331.288	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MYRIAM DOLORES ARTEAGA CÁRDENAS	60.292.980	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LUIS ALBERTO CARRIEDO ESPINEL	13.270.332	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ERIKA MILENA SANABRIA GARCÍA	1.090.987.537	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
JHONNY HARVEY TAPIAS NAVARRO	13.276.265	CONTADOR
SANTIAGO MORENO CASTRILLÓN	1.233.508.292	SECRETARIA

	INTERVENTORIA	
	CONTROL DIARIO DE PERSONAL	
	CODIGO:	FO-INT-008
	FECHA:02/12/24	dic-24
	Versión: 1	Pagina 1 de 1

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"

INFORME MENSUAL No:	1	SECTOR:	VEREDA EL MOLINO, ABREGO NORTE DE SANTANDER.	FECHA DE ELABORACIÓN:	30 / 12 / 2024
CONTRATISTA INTERVENTORÍA:	UNION TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE			CONTRATO No.	CMA412
CONTRATISTA OBRA:	UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024			CONTRATO No.	LIC410

REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRE	CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA					x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x		x	x	x		x	
MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA					x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x		x	x	x		x	
LUIS ALBERTO CARRIEDO ESPINEL	RESIDENTE DE INTERVENTORIA					x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x		x	x	x		x	
ERIKA MILENA SANABRIA GARCIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA					x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x		x	x	x		x	
JHONNY HARVEY TAPIAS NAVARRO	CONTADOR					x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x		x	x	x		x	
SANTIAGO MORENO CASTRILLON	SECRETARIA					x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x		x	x	x		x	

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS
Residente de Interventoría

Figura 4. Control de personal DIC 2024

Anexo. *Control diario del personal de interventoría (Asistencia)*

9.1.1 LISTADO DE PERSONAL INGRESADO

Listado del personal ingresado en orden alfabético del personal técnico y administrativo

Se debe cumplir lo señalado en el numeral 8.2.1, 8.2.2 y 8.2.3. Para cada una de las personas ingresadas.

9.1.1.1 EXÁMENES DE INGRESO

Se presentan las copias de los exámenes de ingreso del personal de técnico y administrativo vinculado en el periodo del informe.
Ver Anexo (exámenes de ingreso)

9.2 AFILIACIÓN DEL PERSONAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se presentan copias de las certificaciones de afiliación al sistema de seguridad social salud, pensión y ARL del personal de técnico y administrativo vinculado en el periodo del informe del contrato de interventoría.

9.2.1 CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL – SALUD

Anexo *(Certificaciones de afiliación al sistema de seguridad social del personal contratado - Salud)*

9.2.2 CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

Anexo *(Certificaciones de afiliación al sistema de seguridad social del personal contratado- Pensión)*

9.2.3 CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL – ARL

Anexo *(Certificaciones de afiliación al sistema de seguridad social del personal contratado- ARL)*

9.3 LISTADO DE PERSONAL RETIRADO

Se debe anexar el listado del personal retirado en orden alfabético por nombre.

9.3.1 EXÁMENES DE RETIRO

Anexo *(Exámenes del personal retirado en orden alfabético)*

9.4 PLANILLAS DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE INTERVENTORÍA Y REVISIÓN DE PAGOS DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se presentan copias de las planillas de pago al sistema de seguridad social salud, pensión y ARL del personal de obra y administrativo vinculado en el periodo del informe del contrato de interventoría. Y revisión de los pagos realizados por el contratista de obra.

Anexo *(planillas de pago al sistema de seguridad social)*

9.5 CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

El interventor debe realizar el seguimiento de la aplicación del protocolo de bioseguridad, aprobado por la ARL al inicio del proyecto.

9.6 SEGUIMIENTO DE PLANES (SOCIOAMBIENTAL, CALIDAD, EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN)

El interventor debe realizar la revisión, seguimiento y aplicación de planes (Riesgo, Ambiental, Señalización, emergencia y calidad)

MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL
UNIÓN TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE

ANEXOS

Anexo. Pólizas iniciales contrato de interventoría.

Anexo. Pólizas actualizadas del contrato de interventoría

Anexo. Actas suscritas en el periodo del informe (Comités, suspensión y reinicio)

Ver Anexo No. 1. *BALANCE FÍSICO FINANCIERO OBRA - INTERVENTORIA*

Anexo. (Bitácora con firma de los residentes de obra e interventoría y su respectivo registro fotográfico. (Dejar constancia de los días en que hace presencia el director de obra y solo se entrega en el informe final la bitácora original)

Ver *Anexo No. 2.* *REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE INTERVENTORIA*

Ver *Anexo No. 3.* *ESTADO FINANCIERO OBRA E INTERVENTORIA*

Anexo *MPA-01-F-25 - Versión 3 (Lista de verificación del cumplimiento de criterios de seguridad, salud en el trabajo y manejo ambiental en obras públicas).*

Anexo *(Informes mensuales HSEQ con sus respectivos anexos al informe solicitados en el formato MPA-01-F28 Versión 2). Para las actividades realizadas por el coordinador de HSEQ de Interventoría; la revisión y aprobación de las actividades e inspecciones realizadas por el contratista de obra.*

Anexo. *Control diario del personal de interventoría (Asistencia)*

Anexo *(Certificaciones de afiliación al sistema de seguridad social del personal contratado - Salud)*

Anexo *(Certificaciones de afiliación al sistema de seguridad social del personal contratado- Pensión)*

Anexo *(Certificaciones de afiliación al sistema de seguridad social del personal contratado- ARL)*

Anexo *(planillas de pago al sistema de seguridad social)*

Anexo. Pólizas iniciales contrato de interventoría.

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4603107584

PÓLIZA No: 460 -74 - 994000008100 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: **CUCUTA QUINTA VELEZ** COD. AGE: 460 RAMO: 74 PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
26	11	2024	25	11	2024	23:59	25	12	2024	23:59	30	26	11	2024

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO EXPEDICION

VIGENCIA DEL ANEXO DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
25	11	2024	23:59	25	12	2024	23:59	30

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **UNION TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.891.407-4**

DIRECCIÓN: CLL 11 15 59 AP 501 ED CATALUÑA CIUDAD: OCAÑA, NORTE DE SANTANDER TELÉFONO: 3164476533

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.505.253-4**

DIRECCIÓN: CALLE 13 NÂº 3 E 278 CAOBOS CIUDAD: **CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER** TELÉFONO: 6075828484

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR NIT : 890505253

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER CIUDAD: CÚCUTA

DIRECCION:

ACTIVIDAD: CONTRATO DE INTERVENTORIA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA: 0-1

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 260,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260,000,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260,000,000.00		
	RCE PATRONAL	260,000,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO # CMA 412-2024DE FECHA 25/11/2024, REFERENTE A INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***260,000,000.00	$ **********50,000	$********0.00	$ *******9,500	$ **********59,500

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
ZORAIDA VILLAMIZAR CARO	4884	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000460310758

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

JACARO 0

CADE207B0E0FFB7B57 CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000008100 **ANEXO:** 0 **TIPO DE MOVIMIENTO:** 0 **PAGINA:** 2

TOMADOR: UNION TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE **IDENTIFICACION:** 901.891.407-4

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA	890505253-4		CÚCUTA	260,000,000.00	50,000	59,500

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
50,000	59,500

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4603107550

PÓLIZA No: 460 - 47 - 994000080982 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **CUCUTA QUINTA VELEZ** COD. AGENCIA: 460 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN	DIA	MES	AÑO
	26	11	2024

FECHA DE IMPRESIÓN	DIA	MES	AÑO
	26	11	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **UNION TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.891.407-4**

DIRECCIÓN: CLL 11 15 59 AP 501 ED CATALUÑA CIUDAD: OCAÑA, NORTE DE SANTANDER TELÉFONO: 3164476533

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.505.253-4**

BENEFICIARIO: **CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.505.253-4**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION CONTRATO	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
	CUMPLIMIENTO	25/11/2024	25/04/2025	8,300,912.70
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	25/11/2024	25/12/2027	4,150,456.35
	CALIDAD DEL SERVICIO	25/12/2024	25/12/2029	8,300,912.70

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 901294312 - M.A.P.G. INGENIERIA CIVIL S.A.S. - PART: 60.00%
CC 88283109 - RAMIREZ ARIAS, EVER LEONARDO - PART: 15.00%
CC 60292980 - ARTEAGA CARDENAS, MYRIAM DOLORES - PART: 25.00%

BENEFICIARIOS
NIT 890505253 - CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO NO. CMA 412-2024, DE FECHA 25/11/2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****20,752,281.75	$ **********115,508	$****11,000.00	$ *******24,036	$ **********150,544

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
ZORAIDA VILLAMIZAR CARO	4884	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN : HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000460310755

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CADE207B0E0FFB7B5A

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano *** Celular:** 312 342 6229 *** Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna *** Celular:** 310 223 4304 *** Correo electrónico:** martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá *** Teléfono:** (601) 791 91 80 *** Fax:** (601) 791 91 80 *** Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4603107550

PÓLIZA No: 460 - 47 - 994000080982 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: **CUCUTA QUINTA VELEZ** COD. AGENCIA: 460 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN	DIA	MES	AÑO
	06	12	2024

FECHA DE IMPRESIÓN	DIA	MES	AÑO
	06	12	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **UNION TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.891.407-4**

DIRECCIÓN: CLL 11 15 59 AP 501 ED CATALUÑA CIUDAD: OCAÑA, NORTE DE SANTANDER TELÉFONO: 3164476533

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.505.253-4**

BENEFICIARIO: **CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.505.253-4**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION CONTRATO	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
	CUMPLIMIENTO	05/12/2024	04/05/2025	8,300,912.70
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	05/12/2024	04/01/2028	4,150,456.35
	CALIDAD DEL SERVICIO	04/01/2025	04/01/2030	8,300,912.70

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 901294312 - M.A.P.G. INGENIERIA CIVIL S.A.S. - PART: 60.00%
CC 88283109 - RAMIREZ ARIAS, EVER LEONARDO - PART: 15.00%
CC 60292980 - ARTEAGA CARDENAS, MYRIAM DOLORES - PART: 25.00%

BENEFICIARIOS
NIT 890505253 - CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO NO. CMA 412-2024, DE FECHA 25/11/2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****20,752,281.75	$ **********0	$*******0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
ZORAIDA VILLAMIZAR CARO	4884	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN : HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000460310755

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CADE207B0E0EF4765D

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano *** Celular:** 312 342 6229 *** Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna *** Celular:** 310 223 4304 *** Correo electrónico:** martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá *** Teléfono:** (601) 791 91 80 *** Fax:** (601) 791 91 80 *** Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CUCUTA QUINTA VELEZ COD. AGENCIA: 460 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000080982** ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **UNION TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.891.407-4**

ASEGURADO: **CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.505.253-4**

BENEFICIARIO: **CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.505.253-4**

TEXTO ITEM 1

SE REALIZA EL PRESENTE ANEXO AJUSTANDO LAS VIGENCIAS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 05/12/2024.

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Somos la Decimocuarta Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2024
Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMÉRICA LATINA 2021

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4603107584

PÓLIZA No: 460 -74 - 994000008100 **ANEXO:2**

AGENCIA EXPEDIDORA: **CUCUTA QUINTA VELEZ** COD. AGE: 460 RAMO: 74 PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
06	12	2024	VIGENCIA DESDE 05	12	2024	23:59 A LAS	04	01	2025	23:59 A LAS	30 DIAS	06	12	2024

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO MODIFICACION

VIGENCIA DEL ANEXO	DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS		DIAS
	05	12	2024	23:59		04	01	2025	23:59		30
	VIGENCIA DESDE			A LAS		VIGENCIA HASTA			A LAS		

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **UNION TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.891.407-4**

DIRECCIÓN: CLL 11 15 59 AP 501 ED CATALUÑA CIUDAD: OCAÑA, NORTE DE SANTANDER TELÉFONO: 3164476533

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.505.253-4**

DIRECCIÓN: CALLE 13 NÂº 3 E 278 CAOBOS CIUDAD: **CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER** TELÉFONO: 6075828484

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR NIT : 890505253

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER CIUDAD: CÚCUTA

DIRECCION:

ACTIVIDAD: CONTRATO DE INTERVENTORIA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA: 0-1

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 260,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260,000,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260,000,000.00		
	RCE PATRONAL	260,000,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO # CMA 412-2024DE FECHA 25/11/2024, REFERENTE A INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

SE REALIZA EL PRESENTE ANEXO AJUSTANDO LAS VIGENCIAS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 05/12/2024.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ **********0.00	$ **********0	$*******0.00	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
ZORAIDA VILLAMIZAR CARO	4884	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000460310758

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

JACARO 0

CADE207B0E0EF47659 CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000008100 **ANEXO:** 2 **TIPO DE MOVIMIENTO:** 0 **PAGINA:** 2

TOMADOR: UNION TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE **IDENTIFICACION:** 901.891.407-4

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA	890505253-4		CÚCUTA	0.00	0	0

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
0	0

Anexo. Pólizas actualizadas del contrato de interventoría

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Somos la Decimocuarta Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2024
Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMÉRICA LATINA 2021

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4603107584

PÓLIZA No: 460 -74 - 994000008100 ANEXO:3

AGENCIA EXPEDIDORA: **CUCUTA QUINTA VELEZ** COD. AGE: 460 RAMO: 74 PAP:

	DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS			DIA	MES	AÑO
VIGENCIA DE LA PÓLIZA	04	01	2025	23:59		03	02	2025	23:59	30		27	12	2024
	FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DESDE	A LAS			VIGENCIA HASTA	A LAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN		

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA

	DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
VIGENCIA DEL ANEXO	04	01	2025	23:59		03	02	2025	23:59	30
	VIGENCIA DESDE			A LAS		VIGENCIA HASTA			A LAS	

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **UNION TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.891.407-4**

DIRECCIÓN: CLL 11 15 59 AP 501 ED CATALUÑA CIUDAD: OCAÑA, NORTE DE SANTANDER TELÉFONO: 3164476533

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.505.253-4**

DIRECCIÓN: CALLE 13 NÂº 3 E 278 CAOBOS CIUDAD: **CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER** TELÉFONO: 6075828484

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR NIT : 890505253

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER CIUDAD: CÚCUTA

DIRECCION:

ACTIVIDAD: CONTRATO DE INTERVENTORIA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA: 0-1

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 260,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260,000,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260,000,000.00		
	RCE PATRONAL	260,000,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO # CMA 412-2024DE FECHA 25/11/2024, REFERENTE A INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

SE REALIZA EL PRESENTE ANEXO AMPLIANDO LAS VIGENCIAS SEGUN PRORROGA NO. 01 AL CONTRATO.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***260,000,000.00	$ **********42,740	$********0.00	$ ********8,121	$ **********50,860

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
ZORAIDA VILLAMIZAR CARO	4884	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000460310758

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

JACARO 0

CADE207B0E0CF9785B

CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano *** Celular:** 312 342 6229 *** Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna *** Celular:** 310 223 4304 *** Correo electrónico:** martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá *** Teléfono:** (601) 791 91 80 *** Fax:** (601) 791 91 80 *** Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000008100 **ANEXO:** 3 **TIPO DE MOVIMIENTO:** 0 **PAGINA:** 2

TOMADOR: UNION TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE **IDENTIFICACION:** 901.891.407-4

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA	890505253-4		CÚCUTA	260,000,000.00	42,740	50,860

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
42,740	50,860

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4603107550

PÓLIZA No: 460 - 47 - 994000080982 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: **CUCUTA QUINTA VELEZ** COD. AGENCIA: 460 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN	DIA	MES	AÑO
	27	12	2024

FECHA DE IMPRESIÓN	DIA	MES	AÑO
	27	12	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **UNION TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.891.407-4**

DIRECCIÓN: CLL 11 15 59 AP 501 ED CATALUÑA CIUDAD: OCAÑA, NORTE DE SANTANDER TELÉFONO: 3164476533

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.505.253-4**

BENEFICIARIO: **CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.505.253-4**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION CONTRATO	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
	CUMPLIMIENTO	05/12/2024	03/06/2025	8,300,912.70
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	05/12/2024	03/02/2028	4,150,456.35
	CALIDAD DEL SERVICIO	03/02/2025	03/02/2030	8,300,912.70

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 901294312 - M.A.P.G. INGENIERIA CIVIL S.A.S. - PART: 60.00%
CC 88283109 - RAMIREZ ARIAS, EVER LEONARDO - PART: 15.00%
CC 60292980 - ARTEAGA CARDENAS, MYRIAM DOLORES - PART: 25.00%

BENEFICIARIOS
NIT 890505253 - CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO NO. CMA 412-2024, DE FECHA 25/11/2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****20,752,281.75	$ **********17,057	$*********0.00	$ ********3,241	$ **********20,297

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
ZORAIDA VILLAMIZAR CARO	4884	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN : HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000460310755

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CADE207B0E0CF9785C

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano *** Celular:** 312 342 6229 *** Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna *** Celular:** 310 223 4304 *** Correo electrónico:** martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá *** Teléfono:** (601) 791 91 80 *** Fax:** (601) 791 91 80 *** Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CUCUTA QUINTA VELEZ COD. AGENCIA: 460 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000080982** ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **UNION TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.891.407-4**

ASEGURADO: **CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.505.253-4**

BENEFICIARIO: **CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.505.253-4**

TEXTO ITEM 1

SE REALIZA EL PRESENTE ANEXO SEGUN PRORROGA NO. 01 AL CONTRATO.

CLIENTE

Anexo. Actas suscritas en el periodo del informe (Comités, suspensión y reinicio)

ACTA DE INICIO

ACTA DE INICIO

MPA-01-F-04, versión 5, 08/07/2024

CONTRATO No Y FECHA	CMA412 del 25 de noviembre de 2024
TIPO DE CONTRATO	Interventoría
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	Cúcuta, 05 de diciembre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO	$ 83.009.127
DURACIÓN DEL CONTRATO	1 mes
ASISTENTES:	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA UNIÓN TEMPORALINTERRESERVORIOS NORTE Contratista JAVIER ALEXIS BECERRA ALBARRACIN Supervisor

DESARROLLO: Dar inicio a las actividades objeto del contrato de la referencia.

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.



CONTRATISTA



SUPERVISOR CORPONOR

ACTA DE SOCIALIZACIÓN – SALAZAR DE LAS PALMAS

Corponor	SOCIALIZACIÓN PROYECTOS MITIGACIÓN DEL RIESGO REUNION INICIAL	
CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 de 2024 **OBJETO:** **"CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".**	**CONTRATISTA:** **UNIÓN TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024** **R/L. ZURISADAY PRADILLA ATUESTA**	**INTERVENTORÍA:** **UT INTERRESERVORIOS NORTE** **R/L MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA**
FECHA: 3 DE DICIEMBRE DE 2024	**HORA INCIO: 2:00PM**	**HORA FIN: 4:00PM**
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER		
MUNICIPIO: SALAZAR DE LAS PALMAS		
LUGAR: VIVE DIGITAL		

En el día de hoy se reunieron representantes de la Comunidad, de CORPONOR, representantes de la firma contratista con el objeto de socializar las obras de "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

CORPONOR: Javier Alexis Becerra Albarracín

Jefe oficina Gestión de Proyectos

CORPONOR: Javier Enrique Trujillo Camacho

Profesional Universitario Oficina Gestión de Proyectos

Comunidad: Juntas de Acción Comunal

Representantes del Contratista responsable del proyecto: ZURISADAY PRADILLA ATUESTA

Representantes de la Corporaciòn: Funcionarios Oficina de Proyectos.

Representantes de la interventoria responsable del proyecto: MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA

Representantes del Municipio: JUAN CARLOS BAIBOR

OBJETIVO DEL LA REUNIÓN:

1. Dar inicio a la intervención formalmente ante la comunidad
2. Presentar el proyecto y resolver las inquietudes de los asistentes con relación al mismo
3. Presentar a los reponsables del proyecto y establecer los canales de comunicación para la atención al ciudadano
4. Exponer la estrategia de Veedurías Ciudadanas como el mecanismo de rendición de cuentas y participación ciudadana establecido por CORPONOR.

TEMAS TRATADOS:

Explicar a la comunidad las actividades que hacen parte del objeto del contrato
Duración de la obra
Alcance del contrato
Presentación de los contratistas
Participación de la comunidad

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS ESTABLECIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Dar cumplimiento al objeto del contrato	Firma contratista	Acorde a la duración del mismo
Verificar el cumplimiento del objeto del contrato y obligaciones del contratista	Supervisión de CORPONOR	Durante la ejecución del contrato
Prestar apoyo y seguimiento para el cumplimiento de las actividades del contrato	Comunidad - Comité de veeduria	Durante la ejecución del contrato

DIRECTORIO DE CONTACTOS:

Personas que participarán en el seguimiento al desarrollo del proyecto, para cualquier tema con relación al proyecto de parte de CORPONOR, El Contratista de Obra, Interventoría y Representante del Comité de Veeduría

NOMBRE	CARGO/EMPRESA	TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO
ZURISADAY PRADILLA ATUESTA	CONTRATISTA	322 8507948
MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA	INTERVENTORIA	3208499100
JUAN CARLOS BAIBOR	ALCLADE	3252426346
SANDRITH PEÑARANDA GUTIERREZ	SECRETARIA DE PLANEACION	3142993185
JESUS BAUTISTA	VEEDURIA	3112026783
OSCAR JAVIER GRANADOS	VEEDURIA	3219685688

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.

Corponor

SOCIALIZACIÓN PROYECTOS DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA
REUNION INICIAL

CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 de 2024
OBJETO:
"CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

LUGAR : ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARBOLEDAS **FECHA: 4 DE DICIEMBRE DE 2024**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



Corponor

CONTROL DE ASISTENCIA – LISTADO DE PARTICIPANTES
REUNIONES CON COMUNIDADES

ASUNTO: Socialización Obras Construcción de Reservorios. LIC-401-2024

LUGAR Y FECHA: Salazar de las Palmas, Diciembre 3 de 2024

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	VEREDA	PREDIO O ENTIDAD	TELEFONO / CELULAR
1	JESUS ALBERTO BAUTISTA	88178937	Juan Esteban	San Francisco	3112026783
2	Oscar Javier Granados Rey	88236463	Los Morros	La cabaña	3214685688
3	Miguel A. Rojas Rios	5440690	Alto de los sanchez	San Javier	3142661034
4	Arturo Buendia Arias	13239683	Alto de los Sandoval	el Boterito	3214367141
5	ELEAZAR Buendia Tirado	3124159130	Alto de los Sanchez	El desengaño	3124159130
6	Sandrith Peñaranda Gutierrez	1043886454	—	Alcaldia Salazar	3142493185
7	Eddy Belén Garcia pabón	27.805595	Carrizal	la esperanza	3216554945
8	Jose Carlos Bacca.	88179533		Alcalde.	3212426396.
9	Gloria Stella Ortiz	27.805384	Vda Zulia	Predio el Leon	3115529489
10	Marcal Dario Delgado	88179754	Bajo Arenal	El Mason	317.313.9925
11	Analyd Juliana Sanchez Diaz	1090517134		Interventoria,	3208499100.
12	Javier E Trujillo C.	13469231		CORPONOR / Proyectos	3107537332
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

ACTA DE VEEDURÍA – SALAZAR DE LAS PALMAS

Corponor	VEEDURÍAS CIUDADANAS ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ

CONTRATO DE OBRA No. LIC -401-2024 OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024 R/L: ZURISADAY PRADILLA ATUESTA	INTERVENTORÍA: UNION TEMPORAL INTERESERVORIOS NORTE R/L:MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA

FECHA: DICIEMBRE 3 DEL 2024

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER

MUNICIPIO: SALAZAR DE LAS PALMAS

LUGAR: ALCALDÍA MUNICIPAL

DESARROLLO

El día de hoy se realiza la reunión inicial de socialización del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER", con el fin de conformar las Veedurías Ciudadanas, así como comunicar a la comunidad acerca de las actividades del proyecto. Se presentan los contratistas responsables de la obra y se describen las actividades del proyecto.

Los objetivos del Comité de Veeduría Ciudadana son:

1. Permitir que la información que CORPONOR, el Contrastista de Obra ó Interventoria suministren acerca de la intervención, sea divulgada a la Comunidad

2. Contribuir a que CORPONOR, El Contrastista de Obra, la interventoría y la supervisión, tengan contacto organizado y eficaz con representantes de la comunidad para así evitar desinformación

Las responsabilidades del Comité de Veeduría Ciudadana son:

1. Servir de canal de comunicación entre la comunidad y CORPONOR, El Contrastista de Obra, la interventoría y la supervisión; transmitir la información de avance del proyecto a los diferentes sectores, que a su vez informarán a la población interesada en el proyecto de la comunidad

2. Co-administrar los Servicios de Atención al Ciudadano, con el fin de canalizar las inquietudes de la comunidad

3. Apoyar la realización y presentación de informes de su seguimiento y demás que sean requeridos

4. Colaborar al Contratista de Obra y a la Interventoría, para informar a la ciudadanía de los riesgos de no respetar las medidas de seguridad relacionadas con el proyecto

Los requisitos para participar en el Comité de Veeduría Ciudadana son los siguientes:

* Disponibilidad de tiempo para participar en las reuniones ó comités que se programen durante el desarrollo del proyecto

* Vivir o desarrollar actividades en el sector donde se desarrolla el proyecto

* Tener interés en el desarrollo de su sector y el bienestar colectivo y no particular

* Tener un punto donde se pueda localizar fácilmente por teléfono o correo electrónico

* Comprometerse a transmitir la información que recibe de manera veraz a la comunidad del avance del proyecto

CORPONOR, El Contrastista de Obra, la interventoría y la supervisión, se comprometen a transmitirle información al COMITÉ para su difusión, así como a atender, de manera oportuna a sus integrantes, en los espacios que para ello se determinen.

La comunidad presente, manifiesta su aceptación de los miembros postulados para conformar el Comité de Veeduría Ciudadana, por lo tanto queda conformado por las siguientes personas, y se certifica con el listado anexo.

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.

Corponor

VEEDURÍAS CIUDADANAS
ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ

CONTRATO DE OBRA No. LIC -401-2024

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

LUGAR :MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS **FECHA: DICIEMBRE 3 DEL 2024**

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

El Comité de Veeduría Ciudadana del Proyecto, quedó conformado de la siguiente manera:

1	NOMBRE Y APELLIDO: Miguel Rojas		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 5440690
	TELÉFONO: 3142661034	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA:
2	NOMBRE Y APELLIDO: Oscar Javier M Granados.		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 88236463
	TELÉFONO: 3219685688	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA: Oscar Javier Granados
3	NOMBRE Y APELLIDO: Jesus Bautista		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 88178937
	TELÉFONO: 3112026783	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA: Jesus A Bautista
	TELÉFONO:	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA:

REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

1	NOMBRE Y APELLIDO: Jesus Bautista		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 88178937
	TELÉFONO: 3112026783	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA: Jesus A Bautista

REGISTRO FOTOGRÁFICO INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

FOTO 1



FOTO 2



ACTA DE SOCIALIZACIÓN – ARBOLEDAS

Corponor	**SOCIALIZACIÓN PROYECTOS MITIGACIÓN DEL RIESGO** **REUNION INICIAL**	
CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 de 2024 **OBJETO:** **"CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".**	**CONTRATISTA:** **UNIÓN TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024** **R/L. ZURISADAY PRADILLA ATUESTA**	**INTERVENTORÍA:** **UT INTERRESERVORIOS NORTE** **R/L MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA**
FECHA: 4-12-24	**HORA INCIO: 2:00 PM**	**HORA FIN: 04:00 PM**
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER		
MUNICIPIO: ARBOLEDAS		
LUGAR: ALCALDIA DE ARBOLEDAS		

En el día de hoy se reunieron representantes de la Comunidad, de CORPONOR, representantes de la firma contratista con el objeto de socializar las obras de "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

CORPONOR: Javier Alexis Becerra Albarracín

Jefe oficina Gestión de Proyectos

CORPONOR: Javier Enrique Trujillo Camacho

Profesional Universitario Oficina Gestión de Proyectos

Comunidad: Juntas de Acción Comunal

Representantes del Contratista responsable del proyecto: ZURISADAY PRADILLA.

Representantes de la Corporaciòn: Funcionarios Oficina de Proyectos.

Representantes de la interventoria responsable del proyecto: MAIRA ALEJANDRA PICON.

Representantes del Municipio: ANA ELETICIA AMBARRACIN BALAGUERA.

OBJETIVO DEL LA REUNIÓN:

1. Dar inicio a la intervención formalmente ante la comunidad
2. Presentar el proyecto y resolver las inquietudes de los asistentes con relación al mismo
3. Presentar a los reponsables del proyecto y establecer los canales de comunicación para la atención al ciudadano
4. Exponer la estrategia de Veedurías Ciudadanas como el mecanismo de rendición de cuentas y participación ciudadana establecido por CORPONOR.

TEMAS TRATADOS:

Explicar a la comunidad las actividades que hacen parte del objeto del contrato
Duración de la obra
Alcance del contrato
Presentación de los contratistas
Participación de la comunidad

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS ESTABLECIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Dar cumplimiento al objeto del contrato	Firma contratista	Acorde a la duración del mismo
Verificar el cumplimiento del objeto del contrato y obligaciones del contratista	Supervisión de CORPONOR	Durante la ejecución del contrato
Prestar apoyo y seguimiento para el cumplimiento de las actividades del contrato	Comunidad - Comité de veeduria	Durante la ejecución del contrato

DIRECTORIO DE CONTACTOS:

Personas que participarán en el seguimiento al desarrollo del proyecto, para cualquier tema con relación al proyecto de parte de CORPONOR, El Contratista de Obra, Interventoría y Representante del Comité de Veeduría

NOMBRE	CARGO/EMPRESA	TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO
ANA ELETICIA AMBARACIN.	EXTENSION RURAL	3213733685.
PEDRO JOSE CASTILLO.	VEEDURIA.	3212659520.
ALVEIRO URBINA.	VEEDURIA.	3102109265.
JUAN TARAZONA.	VEEDURIA.	3229372355.
SORAY PRADILLA.	CONTRATISTA	3228507948
NAIRA APICON.	INTERVENTORIA	3208999100.

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.

Corponor

SOCIALIZACIÓN PROYECTOS DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA
REUNION INICIAL

CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 de 2024
OBJETO:
"CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

LUGAR : ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARBOLEDAS **FECHA: 4 DE DICIEMBRE DE 2024**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



Corponor

CONTROL DE ASISTENCIA – LISTADO DE PARTICIPANTES
REUNIONES CON COMUNIDADES

ASUNTO: Socialización Obras construcción de Reservorios. LIC-401-2024

LUGAR Y FECHA: Arboledas, Diciembre 3 de 2024.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	VEREDA	PREDIO O ENTIDAD	TELEFONO / CELULAR
1	Gladys Emira Rolón de Ardila	27619054	Juan Bueno	El Reparo	3144437696
2	Josefinidad S	88269418	Juan Bucho	El Palmita	3225864289
3	Campo Elias Rozo	1092645662	San pablo Nuevo	Materiba	3224576492
4	Jose Perez	13411 039.	Juan Bueno	La loma.	
5	Juan Carlos Tarazona Hernandez	1092.647228	Almendro	La Jagua	322 8723551
6	Veronica Tarazona Hernandez	27622251	Almendro	El coro	3143801229
7	Pedro-José Castillo C.	13.411.879	Sinaida	El Bambam	3212659520
8	Norayma Parada U.	1092645438	San Joaquin.	Santa Ana	3134953321
9	Ana E. Albarracin Balaguera	1091.802031	Alcaldia	Coord. Extension Rural	3213733685
10	Alveiro urbina U	88243888	Almendro	buena vista	3109109965
11	Analyd Juliana Sanchez Ortiz	1090517134	—	Interventoria.	3208499100
12	JHON carlos Bustos	1092644525	MOHON	Ajustes	3123242799
13	Javier E Trujillo C	13469.231	—	CORPONOR/proyectos	3107537332
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

ACTA DE VEEDURÍA – ARBOLEDAS

Corponor	**VEEDURÍAS CIUDADANAS** **ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ**	
CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 de 2024 **OBJETO:** **"CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.**	**CONTRATISTA:** **UNIÓN TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024** **R/L. ZURISADAY PRADILLA ATUESTA**	**INTERVENTORÍA:** **UT INTERRESERVORIOS NORTE** **R/L MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA**

FECHA: 4 DE DICIEMBRE 2024

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER

MUNICIPIO: ARBOLEDAS

LUGAR: ALCALDIA MUNICIPAL

DESARROLLO

El día de hoy se realiza la reunión inicial de socialización del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER" con el fin de conformar las Veedurías Ciudadanas, así como comunicar a la comunidad acerca de las actividades del proyecto. Se presentan los contratistas responsables de la obra y se describen las actividades del proyecto.

Los objetivos del Comité de Veeduría Ciudadana son:

1. Permitir que la información que CORPONOR, El Contrastista de Obra e intervnetoría suministren acerca de la intervención, sea divulgada a la Comunidad

2. Contribuir a que CORPONOR, El Contrastista de Obra y la interventoría, tengan contacto organizado y eficaz con representantes de la comunidad para así evitar desinformación

Las responsabilidades del Comité de Veeduría Ciudadana son:

1. Servir de canal de comunicación entre la comunidad y CORPONOR, El Contrastista de Obra y la interventoría, transmitir la información de avance del proyecto a los diferentes sectores, que a su vez informarán a la población interesada en el proyecto de la comunidad

2. Co-administrar los Servicios de Atención al Ciudadano, con el fin de canalizar las inquietudes de la comunidad

3. Apoyar la realización y presentación de informes de su seguimiento y demás que sean requeridos

4. Colaborar al Contratista de Obra y a la Interventoría, para informar a la ciudadanía de los riesgos de no respetar las medidas de seguridad relacionadas con el proyecto

Los requisitos para participar en el Comité de Veeduría Ciudadana son los siguientes:

* Disponibilidad de tiempo para participar en las reuniones ó comités que se programen durante el desarrollo del proyecto

* Vivir o desarrollar actividades en el sector donde se desarrolla el proyecto

* Tener interés en el desarrollo de su sector y el bienestar colectivo y no particular

* Tener un punto donde se pueda localizar fácilmente por teléfono o correo electrónico

* Comprometerse a transmitir la información que recibe de manera veraz a la comunidad del avance del proyecto

CORPONOR, El Contrastista de Obra y la Interventoría, se comprometen a transmitirle información al COMITÉ para su difusión, así como a atender, de manera oportuna a sus integrantes, en los espacios que para ello se determinen.

La comunidad presente, manifiesta su aceptación de los miembros postulados para conformar el Comité de Veeduría Ciudadana, por lo tanto queda conformado por las siguientes personas, y se certifica con el listado anexo.

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.

Corponor	**VEEDURÍAS CIUDADANAS** **ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ**

CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 de 2024
OBJETO:
"CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

LUGAR : MUNICIPIO DE ARBOLEDAS — **FECHA: 4 DE DICIEMBRE DE 2024**

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

El Comité de Veeduría Ciudadana del Proyecto, quedó conformado de la siguiente manera:

1	NOMBRE Y APELLIDO: Pedro Jose Castillo Carrillo		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 13411879
	TELÉFONO: 3212659520	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA: PedroJoseCastilloC.
2	NOMBRE Y APELLIDO: Juan Carlos Tarazona		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 1092647228
	TELÉFONO: 3228723551	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA: Juan carlos Tarazona
3	NOMBRE Y APELLIDO: Alveiro Urbina Vega		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 88249888
	TELÉFONO: 3102109265	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA: Alveiro Urbina V
	TELÉFONO:	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA:

REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

1	NOMBRE Y APELLIDO: Pedro Jose Castillo Carrillo		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 13411879
	TELÉFONO: 3212659520	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA: PedroJoseCastilloC.

REGISTRO FOTOGRÁFICO INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

FOTO 1



FOTO 2



ACTA DE SOCIALIZACIÓN – CUCUTILLA

Corponor	SOCIALIZACIÓN PROYECTOS MITIGACIÓN DEL RIESGO REUNION INICIAL	
CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 de 2024 **OBJETO:** **"CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".**	**CONTRATISTA:** **UNIÓN TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024** **R/L. ZURISADAY PRADILLA ATUESTA**	**INTERVENTORÍA:** **UT INTERRESERVORIOS NORTE** **R/L MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA**
FECHA: 4-12-24	**HORA INCIO: 10:00 AM**	**HORA FIN: 12:00 PM**
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER		
MUNICIPIO: CUCUTILLA		
LUGAR: VIVE DIGITAL		

En el día de hoy se reunieron representantes de la Comunidad, de CORPONOR, representantes de la firma contratista con el objeto de socializar las obras de "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

CORPONOR: Javier Alexis Becerra Albarracín

Jefe oficina Gestión de Proyectos

CORPONOR: Javier Enrique Trujillo Camacho

Profesional Universitario Oficina Gestión de Proyectos

Comunidad: Juntas de Acción Comunal

Representantes del Contratista responsable del proyecto: ZURISADAY PRADILLA.

Representantes de la Corporaciòn: Funcionarios Oficina de Proyectos.

Representantes de la interventoria responsable del proyecto: MARIA ALEJANDRA PICON.

Representantes del Municipio: SEC. PLANEACION ANGEL ALBARRACIN.

OBJETIVO DEL LA REUNIÓN:

1. Dar inicio a la intervención formalmente ante la comunidad
2. Presentar el proyecto y resolver las inquietudes de los asistentes con relación al mismo
3. Presentar a los reponsables del proyecto y establecer los canales de comunicación para la atención al ciudadano
4. Exponer la estrategia de Veedurías Ciudadanas como el mecanismo de rendición de cuentas y participación ciudadana establecido por CORPONOR.

TEMAS TRATADOS:

Explicar a la comunidad las actividades que hacen parte del objeto del contrato
Duración de la obra
Alcance del contrato
Presentación de los contratistas
Participación de la comunidad

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS ESTABLECIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Dar cumplimiento al objeto del contrato	Firma contratista	Acorde a la duración del mismo
Verificar el cumplimiento del objeto del contrato y obligaciones del contratista	Supervisión de CORPONOR	Durante la ejecución del contrato
Prestar apoyo y seguimiento para el cumplimiento de las actividades del contrato	Comunidad - Comité de veeduria	Durante la ejecución del contrato

DIRECTORIO DE CONTACTOS:

Personas que participarán en el seguimiento al desarrollo del proyecto, para cualquier tema con relación al proyecto de parte de CORPONOR, El Contratista de Obra, Interventoria y Representante del Comité de Veeduría

NOMBRE	CARGO/EMPRESA	TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO
ANGEL EUELIO ALBARRACIN	SEC. PLANEACION	3114764350.
MATIAS CHACON	VEEDURIA.	3202435167.
HERNANDO PARADA	VEEDURIA.	3163917571.
YEFERSON CONTRERAS	VEEDURIA.	3209666548.
SADAY PRADILLA.	CONTRATISTA.	3228509948.
MAIRA ALEJANDRA PICON	INTERVENTORIA	3208994100.

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.

Corponor

SOCIALIZACIÓN PROYECTOS DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA
REUNION INICIAL

CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 de 2024
OBJETO:
"CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

LUGAR : VIVE DIGITAL CUCUTILLA **FECHA: 4 DE DICIEMBRE DE 2024**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



Corponor

CONTROL DE ASISTENCIA – LISTADO DE PARTICIPANTES
REUNIONES CON COMUNIDADES

ASUNTO: Socialización proyecto construcción Reservorios- LIC-401-2024.

LUGAR Y FECHA: Cucutilla. Diciembre 4 de 2024.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	VEREDA	PREDIO O ENTIDAD	TELEFONO / CELULAR
1	Yeferson Danpel Contreras	1005011471	Alrededor	Luzcal	3208666508
2	Maria Camila Acuña Prada	1090546054	B. Molino		3104856197
3	Adriana Cardina Carvallido	1093767492	Morales		3177549218
4	Luis Eudoro Lizcano Gelves	5.431.115	Alto de lomeso	lu victoria del carmen	3118165115
5	Rosalino Sepulveda Gelvez	5.431.737	Pedregal Bajo		3115301257
6	Matias Chacon Hernandez	88345.312	Pedregal Alto	Cueva Rica	3202435167
7	Hernando Parada Gelvez	88145454	Morgrecha Sur	La loma	3143917571
8	Elsa Leonor Gelvez Contreras	60262763	Vereda San Miguel Alto	El Palchal	3115492840
9	Orfa Lucelly Lizcano Edgar Galvis	88157.701.	Vereda. Caracoli	La loma	3118787576 3208555330.
10	Fredy Arley Vargas Granados	91.508.162	UMATA	UMATA	3112430368.
11	Analyd Julyana Sanchez Diaz	1005171134		Interventoría	3208419919100
12	Javier Enrique Trujillo C	13.469.231		CORPONOR / Proyectos	3107537332.
13	Angel Julio Albornoz Rubio	88145839	Alrededor Cucutilla	Soc. planeación	3114764350
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

ACTA DE VEEDURÍA – CUCUTILLA

Corponor	**VEEDURÍAS CIUDADANAS** **ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ**	
CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 de 2024 **OBJETO:** **"CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.**	**CONTRATISTA:** **UNIÓN TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024** **R/L. ZURISADAY PRADILLA ATUESTA**	**INTERVENTORÍA:** **UT INTERRESERVORIOS NORTE** **R/L MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA**

FECHA: 4 DE DICIEMBRE 2024

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER

MUNICIPIO: CUCUTILLA

LUGAR: VIVE DIGITAL

DESARROLLO

El dia de hoy se realiza la reunión inicial de socialización del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER" con el fin de conformar las Veedurías Ciudadanas, así como comunicar a la comunidad acerca de las actividades del proyecto. Se presentan los contratistas responsables de la obra y se describen las actividades del proyecto.

Los objetivos del Comité de Veeduría Ciudadana son:

1. Permitir que la información que CORPONOR, El Contrastista de Obra e intervnetoría suministren acerca de la intervención, sea divulgada a la Comunidad

2. Contribuir a que CORPONOR, El Contrastista de Obra y la interventoría, tengan contacto organizado y eficaz con representantes de la comunidad para así evitar desinformación

Las responsabilidades del Comité de Veeduría Ciudadana son:

1. Servir de canal de comunicación entre la comunidad y CORPONOR, El Contrastista de Obra y la interventoría, transmitir la información de avance del proyecto a los diferentes sectores, que a su vez informarán a la población interesada en el proyecto de la comunidad

2. Co-administrar los Servicios de Atención al Ciudadano, con el fin de canalizar las inquietudes de la comunidad

3. Apoyar la realización y presentación de informes de su seguimiento y demás que sean requeridos

4. Colaborar al Contratista de Obra y a la Interventoria, para informar a la ciudadanía de los riesgos de no respetar las medidas de seguridad relacionadas con el proyecto

Los requisitos para participar en el Comité de Veeduría Ciudadana son los siguientes:

* Disponibilidad de tiempo para participar en las reuniones ó comités que se programen durante el desarrollo del proyecto

* Vivir o desarrollar actividades en el sector donde se desarrolla el proyecto

* Tener interés en el desarrollo de su sector y el bienestar colectivo y no particular

* Tener un punto donde se pueda localizar fácilmente por teléfono o correo electrónico

* Comprometerse a transmitir la información que recibe de manera veraz a la comunidad del avance del proyecto

CORPONOR, El Contrastista de Obra y la Interventoria, se comprometen a transmitirle información al COMITÉ para su difusión, así como a atender, de manera oportuna a sus integrantes, en los espacios que para ello se determinen.

La comunidad presente, manifiesta su aceptación de los miembros postulados para conformar el Comité de Veeduría Ciudadana, por lo tanto queda conformado por las siguientes personas, y se certifica con el listado anexo.

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.

Corponor	**VEEDURÍAS CIUDADANAS** **ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ**

CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 de 2024
OBJETO:
"CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

LUGAR : MUNICIPIO DE CUCUTILLA — **FECHA: 4 DE DICIEMBRE DE 2024**

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

El Comité de Veeduría Ciudadana del Proyecto, quedó conformado de la siguiente manera:

1	NOMBRE Y APELLIDO: Matías Chacon Hernandez		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 88145312
	TELÉFONO: 3202435167	CORREO ELECTRÓNICO: nancyluzmary@hotmail.com	FIRMA: Matías Chacón Hernández
2	NOMBRE Y APELLIDO: Hernando Parada Gelvez		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 88145454
	TELÉFONO: 3143917571	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA: Hernando Parada.
3	NOMBRE Y APELLIDO: Yeferson Contreras Ortega		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 1005011471
	TELÉFONO: 3208666548	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA: Yeferson Contreras
	TELÉFONO:	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA:

REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

1	NOMBRE Y APELLIDO:		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.:
	TELÉFONO:	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA: Matías Chacón Hernández

REGISTRO FOTOGRÁFICO INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

FOTO 1



FOTO 2



ACTA DE SOCIALIZACIÓN – DURANIA

Corponor	SOCIALIZACIÓN PROYECTOS MITIGACIÓN DEL RIESGO REUNION INICIAL	
CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 de 2024 **OBJETO:** **"CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".**	**CONTRATISTA:** **UNIÓN TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024** **R/L. ZURISADAY PRADILLA ATUESTA**	**INTERVENTORÍA:** **UT INTERRESERVORIOS NORTE** **R/L MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA**
FECHA: 3 DE DICIEMBRE DE 2024	**HORA INCIO: 2:00PM**	**HORA FIN: 4:00PM**
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER		
MUNICIPIO: SALAZAR DE LAS PALMAS		
LUGAR: VIVE DIGITAL		

En el día de hoy se reunieron representantes de la Comunidad, de CORPONOR, representantes de la firma contratista con el objeto de socializar las obras de "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

CORPONOR: Javier Alexis Becerra Albarracín

Jefe oficina Gestión de Proyectos

CORPONOR: Javier Enrique Trujillo Camacho

Profesional Universitario Oficina Gestión de Proyectos

Comunidad: Juntas de Acción Comunal

Representantes del Contratista responsable del proyecto: ZURISADAY PRADILLA ATUESTA

Representantes de la Corporaciòn: Funcionarios Oficina de Proyectos.

Representantes de la interventoria responsable del proyecto: MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA

Representantes del Municipio: JUAN CARLOS BAIBOR

OBJETIVO DEL LA REUNIÓN:

1. Dar inicio a la intervención formalmente ante la comunidad
2. Presentar el proyecto y resolver las inquietudes de los asistentes con relación al mismo
3. Presentar a los reponsables del proyecto y establecer los canales de comunicación para la atención al ciudadano
4. Exponer la estrategia de Veedurías Ciudadanas como el mecanismo de rendición de cuentas y participación ciudadana establecido por CORPONOR.

TEMAS TRATADOS:

Explicar a la comunidad las actividades que hacen parte del objeto del contrato
Duración de la obra
Alcance del contrato
Presentación de los contratistas
Participación de la comunidad

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS ESTABLECIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Dar cumplimiento al objeto del contrato	Firma contratista	Acorde a la duración del mismo
Verificar el cumplimiento del objeto del contrato y obligaciones del contratista	Supervisión de CORPONOR	Durante la ejecución del contrato
Prestar apoyo y seguimiento para el cumplimiento de las actividades del contrato	Comunidad - Comité de veeduria	Durante la ejecución del contrato

DIRECTORIO DE CONTACTOS:

Personas que participarán en el seguimiento al desarrollo del proyecto, para cualquier tema con relación al proyecto de parte de CORPONOR, El Contratista de Obra, Interventoría y Representante del Comité de Veeduría

NOMBRE	CARGO/EMPRESA	TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO
ZURISADAY PRADILLA ATUESTA	CONTRATISTA	322 8507948
MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA	INTERVENTORIA	3208499100
JUAN CARLOS BAIBOR	ALCLADE	3252426346
SANDRITH PEÑARANDA GUTIERREZ	SECRETARIA DE PLANEACION	3142993185
JESUS BAUTISTA	VEEDURIA	3112026783
OSCAR JAVIER GRANADOS	VEEDURIA	3219685688

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.

Corponor

SOCIALIZACIÓN PROYECTOS DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA
REUNION INICIAL

CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 de 2024
OBJETO:
"CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

LUGAR : ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARBOLEDAS **FECHA: 4 DE DICIEMBRE DE 2024**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



Corponor

CONTROL DE ASISTENCIA – LISTADO DE PARTICIPANTES
REUNIONES CON COMUNIDADES

ASUNTO: Socialización Obras Construcción de Reservorios. LIC-401-2024

LUGAR Y FECHA: Salazar de las Palmas, Diciembre 3 de 2024

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	VEREDA	PREDIO O ENTIDAD	TELEFONO / CELULAR
1	JESUS ALBERTO BAUTISTA	88178937	Juan Esteban	San Francisco	3112026783
2	Oscar Javier Granados Rey	88236463	Los Morros	La cabaña	3214685688
3	Miguel A. Rojas Rios	5440690	Alto de los sanchez	San Javier	3142661034
4	Arturo Buendia Arias	13239683	Alto de los Sandoval	el Boterito	3214367141
5	ELEAZAR Buendia Tirado	3124159130	Alto de los Sanchez	El desengaño	3124159130
6	Sandrith Peñaranda Gutierrez	1043886454	—	Alcaldia Salazar	3142493185
7	Eddy Belén Garcia pabón	27.805595	Carrizal	la esperanza	3216554945
8	Jose Carlos Bacca.	88179533		Alcalde.	3212426396.
9	Gloria Stella Ortiz	27.805384	Vda Zulia	Predio el Leon	3115529489
10	Marcal Dario Delgado	88179754	Bajo Arenal	El Mason	317.313.9925
11	Analyd Juliana Sanchez Diaz	1090517134		Interventoria,	3208499100.
12	Javier E Trujillo C.	13469231		CORPONOR / Proyectos	3107537332
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

ACTA DE VEEDURÍA – DURANIA

Corponor	**VEEDURÍAS CIUDADANAS** **ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ**	
CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 de 2024 **OBJETO:** **"CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.**	**CONTRATISTA:** **UNIÓN TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024** **R/L. ZURISADAY PRADILLA ATUESTA**	**INTERVENTORÍA:** **UT INTERRESERVORIOS NORTE** **R/L MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA**

FECHA: 5 DE DICIEMBRE 2024

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER

MUNICIPIO: DURANIA

LUGAR: ALCALDIA DE DURANIA

DESARROLLO

El día de hoy se realiza la reunión inicial de socialización del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER" con el fin de conformar las Veedurías Ciudadanas, así como comunicar a la comunidad acerca de las actividades del proyecto. Se presentan los contratistas responsables de la obra y se describen las actividades del proyecto.

Los objetivos del Comité de Veeduría Ciudadana son:

1. Permitir que la información que CORPONOR, El Contrastista de Obra e intervnetoría suministren acerca de la intervención, sea divulgada a la Comunidad

2. Contribuir a que CORPONOR, El Contrastista de Obra y la interventoría, tengan contacto organizado y eficaz con representantes de la comunidad para así evitar desinformación

Las responsabilidades del Comité de Veeduría Ciudadana son:

1. Servir de canal de comunicación entre la comunidad y CORPONOR, El Contrastista de Obra y la interventoría, transmitir la información de avance del proyecto a los diferentes sectores, que a su vez informarán a la población interesada en el proyecto de la comunidad

2. Co-administrar los Servicios de Atención al Ciudadano, con el fin de canalizar las inquietudes de la comunidad

3. Apoyar la realización y presentación de informes de su seguimiento y demás que sean requeridos

4. Colaborar al Contratista de Obra y a la Interventoría, para informar a la ciudadanía de los riesgos de no respetar las medidas de seguridad relacionadas con el proyecto

Los requisitos para participar en el Comité de Veeduría Ciudadana son los siguientes:

* Disponibilidad de tiempo para participar en las reuniones ó comités que se programen durante el desarrollo del proyecto

* Vivir o desarrollar actividades en el sector donde se desarrolla el proyecto

* Tener interés en el desarrollo de su sector y el bienestar colectivo y no particular

* Tener un punto donde se pueda localizar fácilmente por teléfono o correo electrónico

* *Comprometerse a transmitir la información que recibe de manera veraz a la comunidad del avance del proyecto*

CORPONOR, El Contrastista de Obra y la Interventoría, se comprometen a transmitirle información al COMITÉ para su difusión, así como a atender, de manera oportuna a sus integrantes, en los espacios que para ello se determinen.

La comunidad presente, manifiesta su aceptación de los miembros postulados para conformar el Comité de Veeduría Ciudadana, por lo tanto queda conformado por las siguientes personas, y se certifica con el listado anexo.

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.

Corponor	**VEEDURÍAS CIUDADANAS** **ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ**

CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 de 2024
OBJETO:
"CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

LUGAR :MUNICIPIO DE [illegible] . FECHA: 5 DE DICIEMBRE DE 2024

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

El Comité de Veeduría Ciudadana del Proyecto, quedó conformado de la siguiente manera:

	NOMBRE Y APELLIDO:		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.:
1	Luis Hernando Castellanos Melo		13219157
	TELÉFONO: 3115246579	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA: Luis Hernando Castellanos
	NOMBRE Y APELLIDO:		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.:
2	Luis Alejandro Carvajal Solano		13235783
	TELÉFONO: 3124584565	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA: Luis Alejandro Carvajal
	NOMBRE Y APELLIDO:		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.:
3	Guillermo Jose Torres Parra		1956478
	TELÉFONO: 3115357795	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA: Guillermo J Torres P
	TELÉFONO:	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA:

REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

	NOMBRE Y APELLIDO:		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.:
1	Luis Hernando castellanos melo		1321915 7.
	TELÉFONO: 3115246579.	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA: Luis Hernando Castellanos

REGISTRO FOTOGRÁFICO INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

FOTO 1



FOTO 2



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE SANTANDER
NOTARIA UNICA

DECLARACION EXTRAPROCESAL 242

En la cabecera municipal de Durania, Departamento Norte de Santander, Republica de Colombia a los treinta y cinco (05) días del mes de diciembre dos mil veinticuatro (2024), ante mí, ELIDA ROSA QUINTERO ALVAREZ, Notaria Unica del Círculo de Durania, compareció: **ANGELICA BUSTOS SAENZ.**

PRIMERO.- Quien manifestó su deseo de declarar bajo la gravedad del JURAMENTO, en los términos del Decreto 1557 del año de 1989 y dijo: ———— SEGUNDO: GENERALES DE LEY. Me llamo como quedó escrito, mayor de edad, natural de Cúcuta, identificada con la cédula de ciudadanía No. 27.696.636 de Durania, de profesión hogar, Cel: 3124503093, domiciliada en la finca La Calera vereda La Chuspa -Durania N de S., quien manifestó su deseo de declarar bajo la gravedad del juramento y a sabiendas de las implicaciones que acarrea jurar en falso, libre de todo apremio, espontáneamente rindió esta declaración. ..... **TERCERO.- Manifiesto bajo la gravedad del juramento que actuó en nombre propio y que rindo esta declaración libre y espontánea. ———— CUARTO.- Manifiesto que soy poseedora desde hace mas de veinte (20) años del predio LA CALERA, ubicada en la vereda La Chuspa Municipio de Durania N DE S., donde tengo mis cultivos y potreros, y donde tengo mi vivienda, que comparto con mi familia. -- ——— QUINTO. Además declaro que lo poseo con ánimo de señora y dueña en forma quieta y pacíficamente sin que nadie me perturbe la posesión . ——— Esta declaración se hace a petición y solicitud de la interesada.** .....EL declarante está enterado del contenido y en consecuencia firma y coloca huella índice derecho. Se expide original de la presente Acta, a petición, ruego e insistencia de la parte interesada, con advertencia establecida en el Decreto 2150 del 5 de Diciembre de 1995 y Decreto 0019 de 2012, por el cual se suprime o se elimina y reformas regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. Derechos Notariales según Resolución No. 00773 de Enero 26 de 2024, $18.000.oo IVA $3.420.oo.



LA DECLARANTE, - Angelica Bustos Saenz

ANGELICA BUSTOS SAENZ
c.c. 27 696 636

LA NOTARIA,

Elida Rosa Quintero Alvarez

ELIDA ROSA QUINTERO ALVAREZ

AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA PARA DECLARACIÓN EXTRA-PROCESO

COD 2313

En la ciudad de Durania, Departamento de Norte De Santander, República de Colombia, el cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), en la Notaría única de durania del Círculo de Durania, compareció: ANGELICA BUSTOS SAENZ, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 0027696636.

2313-1



Angelica Bustos Saenz

b500ac456f

-------- Firma autógrafa --------

05/12/2024 08:19:17

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Esta Acta se asocia al documento que contiene la siguiente información: PARTE INTERESADA

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DURANIA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

ELIDA ROSA QUINTERO ALVAREZ

Notaria Única del Círculo de Durania , Departamento de Norte De Santander

Consulte este documento en https://notariid.notariasegura.com.co

Número Único de Transacción: b500ac456f, 05/12/2024 08:27:12

ACTA DE SOCIALIZACIÓN – SAN CAYETANO

Corponor	**SOCIALIZACIÓN PROYECTOS DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA** **REUNION INICIAL**

CONTRATO DE OBRA No. LIC -401-2024 **OBJETO:** **CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**	**CONTRATISTA:** **UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024** **R/L: ZURISADAY PRADILLA ATUESTA**	**INTERVENTORÍA:** **UNION TEMPORAL INTERESERVORIOS NORTE** **R/L:MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA**

FECHA: DICIEMBRE 10 DEL 2024	**HORA INCIO: 10:00 PM**	**HORA FIN:**
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER		
MUNICIPIO: SAN CAYETANO		
LUGAR: ALCALDÍA MUNICIPAL		

En el día de hoy se reunieron representantes de la Comunidad, de CORPONOR, representantes de la firma contratista e interventoria con el objeto de socializar las obras de OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

CORPONOR: Melva Yaneth Alvarez Vargas

Subdirectora de Planeación y Fronteras

CORPONOR: Javier Enrique Trujillo Camacho

Profesional Universitario Subdirección de Planeación y Fronteras

Comunidad: Beneficiarios del Proyecto

Representantes del Contratista responsable del proyecto:

Representantes de la Interventoría contratada para el proyecto:

OBJETIVO DEL LA REUNIÓN:

1. Dar inicio a la intervención formalmente ante la comunidad
2. Presentar el proyecto y resolver las inquietudes de los asistentes con relación al mismo
3. Presentar a los reponsables del proyecto y establecer los canales de comunicación para la atención al ciudadano
4. Exponer la estrategia de Veedurías Ciudadanas como el mecanismo de rendición de cuentas y participación ciudadana establecido por CORPONOR.

TEMAS TRATADOS:

Explicar a la comunidad las actividades que hacen parte del objeto del contrato
Duración de la obra
Contratación de mano de obra de la localidad
Alcance del contrato
Presentación de los contratistas e interventoría
Participación de la comunidad

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS ESTABLECIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Dar cumplimiento al objeto del contrato	Firma contratista	Acorde a la duración del mismo
Verificar el cumplimiento del objeto del contrato y obligaciones del contratista	Firma interventoria	Durante la ejecución del contrato
Prestar apoyo y seguimiento para el cumplimiento de las actividades del contrato	Comunidad - Comité de veeduria	Durante la ejecución del contrato

DIRECTORIO DE CONTACTOS:

Personas que participarán en el seguimiento al desarrollo del proyecto, para cualquier tema con relación al proyecto de parte de CORPONOR, El Contratista de Obra, La Interventoría y El Representante del Comité de Veeduría

NOMBRE	CARGO/EMPRESA	TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO
Saday Pradilla	Contratista	322 850 7948
Carmen Parada Jobino	Veeduría	323 30 93 620
Deadys Arenes Salano	Veeduría	310 603 9374
Carlos Enrique Pato Zuleta	Veeduría	320 998 52 46
Santiago Moreno Castaño	Interventoría	321 4925161

Scanned with CamScanner

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.

Corponor

SOCIALIZACIÓN PROYECTOS DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA

LUGAR : SAN CAYETANO **FECHA: 10-12-2024**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



Scanned with CamScanner

Corponor

CONTROL DE ASISTENCIA – LISTADO DE PARTICIPANTES
REUNIONES CON COMUNIDADES

ASUNTO:

LUGAR Y FECHA:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	VEREDA	PREDIO O ENTIDAD	TELEFONO / CELULAR
1	Beatriz Arenas Solano	63535740	La Palma	Alfomante	3106039374
2	Miriam Peña Peres	37176515	urimaco	Finca canaan	3115068216
3	Carmen Felisa Parada urbina	1091966378	Guaduas	Rancho Alegre	3235093625
4	Yasmin Irzaraza Villamizar	60354792	la florida	Siken	3222729919
5	John Javier Aguilar Solano	1094346993	la palma	finca el oasis	3125529980
6	Mario Alvarez lopez	1090471565	Guaduas	los tesoros	3213270214
7	Jose Vicente Suarez Blanco	88288664	La Palma	los cachos Varado	3105604056
8	nubia stella Avarez soto	27818822	la Florida	los tamarindo	3106987515
9	Miguel Alvarez SOTO	5489620	la florida	CHaparral	3213725694
10	Graciela Zuleta Caceres	27696630	Ayacucho	los Alpes-Ayacucho	3203985745
11	Santiago Moreno Castrillon	1233582292	—	Inventoria	3214926161
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Scanned with CamScanner

ACTA DE VEEDURÍA – SAN CAYETANO

Corponor	**VEEDURÍAS CIUDADANAS** **ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ**

CONTRATO DE OBRA No. LIC -401-2024 **OBJETO:** **CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**	**CONTRATISTA:** **UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024** **R/L: ZURISADAY PRADILLA ATUESTA**	**INTERVENTORÍA:** **UNION TEMPORAL INTERESERVORIOS NORTE** **R/L:MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA**

FECHA: DICIEMBRE 10 DEL 2024

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER

MUNICIPIO: SAN CAYETANO

LUGAR: ALCALDÍA MUNICIPAL

DESARROLLO

El día de hoy se realiza la reunión inicial de socialización del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER", con el fin de conformar las Veedurías Ciudadanas, así como comunicar a la comunidad acerca de las actividades del proyecto. Se presentan los contratistas responsables de la obra y se describen las actividades del proyecto.

Los objetivos del Comité de Veeduría Ciudadana son:

1. Permitir que la información que CORPONOR, el Contrastista de Obra ó Interventoria suministren acerca de la intervención, sea divulgada a la Comunidad

2. Contribuir a que CORPONOR, El Contrastista de Obra, la interventoría y la supervisión, tengan contacto organizado y eficaz con representantes de la comunidad para así evitar desinformación

Las responsabilidades del Comité de Veeduría Ciudadana son:

1. Servir de canal de comunicación entre la comunidad y CORPONOR, El Contrastista de Obra, la interventoría y la supervisión; transmitir la información de avance del proyecto a los diferentes sectores, que a su vez informarán a la población interesada en el proyecto de la comunidad

2. Co-administrar los Servicios de Atención al Ciudadano, con el fin de canalizar las inquietudes de la comunidad

3. Apoyar la realización y presentación de informes de su seguimiento y demás que sean requeridos

4. Colaborar al Contratista de Obra y a la Interventoría, para informar a la ciudadanía de los riesgos de no respetar las medidas de seguridad relacionadas con el proyecto

Los requisitos para participar en el Comité de Veeduría Ciudadana son los siguientes:

* Disponibilidad de tiempo para participar en las reuniones ó comités que se programen durante el desarrollo del proyecto

* Vivir o desarrollar actividades en el sector donde se desarrolla el proyecto

* Tener interés en el desarrollo de su sector y el bienestar colectivo y no particular

* Tener un punto donde se pueda localizar fácilmente por teléfono o correo electrónico

* Comprometerse a transmitir la información que recibe de manera veraz a la comunidad del avance del proyecto

CORPONOR, El Contrastista de Obra, la interventoría y la supervisión, se comprometen a transmitirle información al COMITÉ para su difusión, así como a atender, de manera oportuna a sus integrantes, en los espacios que para ello se determinen.

La comunidad presente, manifiesta su aceptación de los miembros postulados para conformar el Comité de Veeduría Ciudadana, por lo tanto queda conformado por las siguientes personas, y se certifica con el listado anexo.

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.

Scanned with CamScanner

Corponor

VEEDURÍAS CIUDADANAS
ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ

CONTRATO DE OBRA No. LIC -401-2024

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

LUGAR :MUNICIPIO DE SAN CAYETANO **FECHA: DICIEMBRE 10 DEL 2024**

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

El Comité de Veeduría Ciudadana del Proyecto, quedó conformado de la siguiente manera:

	NOMBRE Y APELLIDO:		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.:
1	Carmen Felisa Parada Urbina		1091966378
	TELÉFONO: 3233093620	CORREO ELECTRÓNICO: felisa.parada06@gmail.com	FIRMA: Carmen Felisa Parada U.
	NOMBRE Y APELLIDO: Beatriz Arenas Solano		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 63 535 740
2	TELÉFONO: 3106039374	CORREO ELECTRÓNICO: betyca.frank30@gmail.com	FIRMA: Beatriz Aren S.
	NOMBRE Y APELLIDO: Carlos Enrique Pinto Zisalo		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 88261 53
3	TELÉFONO: 3203985245	CORREO ELECTRÓNICO: danisebos1220@gmail.com.	FIRMA:
	TELÉFONO:	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA:

REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

	NOMBRE Y APELLIDO:		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.:
1	Carmen Felisa Parada Urbina		1091966378
	TELÉFONO: 3233093620	CORREO ELECTRÓNICO: Felisa.Parada@gmail.com	FIRMA: Carmen Felisa Parada U.

REGISTRO FOTOGRÁFICO INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

FOTO 1



FOTO 2



Yasmin Izcazo Villamizar cc 60354792
tel 3222729919

culmanperezn@gamil.com.

Scanned with CamScanner

ACTA DE SOCIALIZACIÓN – MUTISCUA

Corponor	**SOCIALIZACIÓN PROYECTOS DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA** **REUNION INICIAL**

CONTRATO DE OBRA No. LIC -401-2024 **OBJETO:** **CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**	**CONTRATISTA:** **UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024** **R/L: ZURISADAY PRADILLA ATUESTA**	**INTERVENTORÍA:** **UNION TEMPORAL INTERESERVORIOS NORTE** **R/L:MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA**

FECHA: DICIEMBRE 11 DEL 2024	**HORA INCIO: 10:00 PM**	**HORA FIN:**
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER		
MUNICIPIO: MUTISCUA		
LUGAR: ALCALDÍA MUNICIPAL		

En el día de hoy se reunieron representantes de la Comunidad, de CORPONOR, representantes de la firma contratista e interventoria con el objeto de socializar las obras de OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

CORPONOR: Melva Yaneth Alvarez Vargas

Subdirectora de Planeación y Fronteras

CORPONOR: Javier Enrique Trujillo Camacho

Profesional Universitario Subdirección de Planeación y Fronteras

Comunidad: Beneficiarios del Proyecto

Representantes del Contratista responsable del proyecto:

Representantes de la Interventoria contratada para el proyecto:

OBJETIVO DEL LA REUNIÓN:

1. Dar inicio a la intervención formalmente ante la comunidad
2. Presentar el proyecto y resolver las inquietudes de los asistentes con relación al mismo
3. Presentar a los reponsables del proyecto y establecer los canales de comunicación para la atención al ciudadano
4. Exponer la estrategia de Veedurías Ciudadanas como el mecanismo de rendición de cuentas y participación ciudadana establecido por CORPONOR.

TEMAS TRATADOS:

Explicar a la comunidad las actividades que hacen parte del objeto del contrato
Duración de la obra
Contratación de mano de obra de la localidad
Alcance del contrato
Presentación de los contratistas e interventoría
Participación de la comunidad

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS ESTABLECIDOS:

COMPROMISO	**RESPONSABLE**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Dar cumplimiento al objeto del contrato	Firma contratista	Acorde a la duración del mismo
Verificar el cumplimiento del objeto del contrato y obligaciones del contratista	Firma interventoria	Durante la ejecución del contrato
Prestar apoyo y seguimiento para el cumplimiento de las actividades del contrato	Comunidad - Comité de veeduria	Durante la ejecución del contrato

DIRECTORIO DE CONTACTOS:

Personas que participarán en el seguimiento al desarrollo del proyecto, para cualquier tema con relación al proyecto de parte de CORPONOR, El Contratista de Obra, La Interventoría y El Representante del Comité de Veeduría

NOMBRE	**CARGO/EMPRESA**	**TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO**
Santiago Mesa Castillo	Interventoria	3214726161
Esperanza Dias Jaimes	Veeduria	3122321812
José alberto Bautista	Veeduría	313 499 2483
Isidro Cadenas	Veeduría	314 393 5056
Javier E Trujillo	Cooperador	310 737 7777
Erday Pradilla	Contratista	322 850 9948

Scanned with CamScanner

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.

Corponor

SOCIALIZACIÓN PROYECTOS DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA

LUGAR : MUTISCUA **FECHA: 11-12-2024**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



Scanned with CamScanner

Corponor

CONTROL DE ASISTENCIA – LISTADO DE PARTICIPANTES
REUNIONES CON COMUNIDADES

ASUNTO:

LUGAR Y FECHA:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	VEREDA	PREDIO O ENTIDAD	TELEFONO / CELULAR
1	Rafael Eduardo Cambaza Cano	1094808508	Tapagua	Rascador	3123159146
2	Alonso Rodriguez	27.751.304	Aventino		3106417
3	Esperanza Diaz Jaimes	60.252.910	San Agustin	El Guichal	3122321812
4	Maxia Graciela Hernandez	37.751418	Sucre	Arenal	3705764
5	Campo Elias Jaimes	5.468765	Sucre	Reposo	3134
6	Wilmer Hernandez suarez	88031523	Sucre	Vano grande 2	3214476444
7	Jose Alberto Barrago	88762315	Sucre	La acuatra	3134992483
8	Jose Libardo Galvez Jaimes	88031576	Sucre	El Recreo	3212106214
9	Humberto Contreras Gamboa	———	Las Mercedes	El Tabano	3143335056
10	Maria Elena Barrago Ramon	1094808737	Tapagua	El arrayan	3223898361
11	Javier E Trujillo Camacho	13.169.231	——	CORPONOR	3107337332
12	Ana Edelmira Sierra Hoyos	27'751.932	El Aventino	Alcaldia Mutiscua	3152467751
13	Yesid Leonardo Cha	88.034.676	Tapaguci	Las Tapias	3204755
14	Pablo Enrique Acevedo Gil	5.435.320	Aventino	El Arrayan	3124122311
15	Eder Bladimir Jaimes Galvez	1094808444	Ospina	la laguna	3204981
16	Henry Ricardo Contreras	1094808307	las mercedes	La Huerta	3214498
17	Santiago Moreno Caballero	1233508292	——	Intervention	3214926
18					
19	Pablo Antonio Peña Barrago	1972140	Las Mercedes	Mercedes	3123508
20					

Scanned with CamScanner

ACTA DE VEEDURÍA – MUTISCUA

Corponor	VEEDURÍAS CIUDADANAS ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ	
CONTRATO DE OBRA No. LIC -401-2024 OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024 R/L: ZURISADAY PRADILLA ATUESTA	INTERVENTORÍA: UNION TEMPORAL INTERESERVORIOS NORTE R/L:MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA

FECHA: DICIEMBRE 11 DEL 2024

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER

MUNICIPIO: MUTISCUA

LUGAR: ALCALDÍA MUNICIPAL

DESARROLLO

El dia de hoy se realiza la reunión inicial de socialización del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER", con el fin de conformar las Veedurías Ciudadanas, así como comunicar a la comunidad acerca de las actividades del proyecto. Se presentan los contratistas responsables de la obra y se describen las actividades del proyecto.

Los objetivos del Comité de Veeduría Ciudadana son:

1. Permitir que la información que CORPONOR, el Contrastista de Obra ó Interventoria suministren acerca de la intervención, sea divulgada a la Comunidad

2. Contribuir a que CORPONOR, El Contrastista de Obra, la interventoría y la supervisión, tengan contacto organizado y eficaz con representantes de la comunidad para así evitar desinformación

Las responsabilidades del Comité de Veeduría Ciudadana son:

1. Servir de canal de comunicación entre la comunidad y CORPONOR, El Contrastista de Obra, la interventoría y la supervisión; transmitir la información de avance del proyecto a los diferentes sectores, que a su vez informarán a la población interesada en el proyecto de la comunidad

2. Co-administrar los Servicios de Atención al Ciudadano, con el fin de canalizar las inquietudes de la comunidad

3. Apoyar la realización y presentación de informes de su seguimiento y demás que sean requeridos

4. Colaborar al Contratista de Obra y a la Interventoría, para informar a la ciudadanía de los riesgos de no respetar las medidas de seguridad relacionadas con el proyecto

Los requisitos para participar en el Comité de Veeduría Ciudadana son los siguientes:

* Disponibilidad de tiempo para participar en las reuniones ó comités que se programen durante el desarrollo del proyecto

* Vivir o desarrollar actividades en el sector donde se desarrolla el proyecto

* Tener interés en el desarrollo de su sector y el bienestar colectivo y no particular

* Tener un punto donde se pueda localizar fácilmente por teléfono o correo electrónico

* Comprometerse a transmitir la información que recibe de manera veraz a la comunidad del avance del proyecto

CORPONOR, El Contrastista de Obra, la interventoría y la supervisión, se comprometen a transmitirle información al COMITÉ para su difusión, así como a atender, de manera oportuna a sus integrantes, en los espacios que para ello se determinen.

La comunidad presente, manifiesta su aceptación de los miembros postulados para conformar el Comité de Veeduría Ciudadana, por lo tanto queda conformado por las siguientes personas, y se certifica con el listado anexo.

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.

Scanned with CamScanner

Corponor

VEEDURÍAS CIUDADANAS
ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ

CONTRATO DE OBRA No. LIC -401-2024

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

LUGAR :MUNICIPIO DE MUTISCUA **FECHA: DICIEMBRE 11 DEL 2024**

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

El Comité de Veeduría Ciudadana del Proyecto, quedó conformado de la siguiente manera:

	NOMBRE Y APELLIDO:	CÉDULA DE CIUDADANÍA No.:
1	Esperanza Diaz Jaimes	60.252.910
	TELÉFONO: 3122321812 / CORREO ELECTRÓNICO: espe28dia2@gmail.com / FIRMA:	
	NOMBRE Y APELLIDO:	CÉDULA DE CIUDADANÍA No.:
2	Jose Alberto Beltrago	88761315
	TELÉFONO: 3134992483 / CORREO ELECTRÓNICO: / FIRMA:	
	NOMBRE Y APELLIDO:	CÉDULA DE CIUDADANÍA No.:
3	Isidro Contreras.	7094808449
	TELÉFONO: 3163735056 / CORREO ELECTRÓNICO: / FIRMA:	
	TELÉFONO: / CORREO ELECTRÓNICO: / FIRMA:	

REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

	NOMBRE Y APELLIDO:	CÉDULA DE CIUDADANÍA No.:
1	Jose Alberto Beltrago	88761315
	TELÉFONO: 3134992483 / CORREO ELECTRÓNICO: / FIRMA:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

FOTO 1



FOTO 2



Scanned with CamScanner

ACTA DE SOCIALIZACIÓN – SILOS

Corponor	**SOCIALIZACIÓN PROYECTOS DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA** **REUNION INICIAL**	
CONTRATO DE OBRA No. LIC -401-2024 **OBJETO:** **CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**	**CONTRATISTA:** **UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024** **R/L: ZURISADAY PRADILLA ATUESTA**	**INTERVENTORÍA:** **UNION TEMPORAL INTERESERVORIOS NORTE** **R/L:MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA**

FECHA: DICIEMBRE 18 DEL 2024	**HORA INCIO: 10:00 PM**	**HORA FIN:**
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER		
MUNICIPIO: SILOS		
LUGAR: ALCALDÍA MUNICIPAL		

En el día de hoy se reunieron representantes de la Comunidad, de CORPONOR, representantes de la firma contratista e interventoria con el objeto de socializar las obras de OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

CORPONOR: Melva Yaneth Alvarez Vargas

Subdirectora de Planeación y Fronteras

CORPONOR: Javier Enrique Trujillo Camacho

Profesional Universitario Subdirección de Planeación y Fronteras

Comunidad: Beneficiarios del Proyecto

Representantes del Contratista responsable del proyecto:

Representantes de la Interventoría contratada para el proyecto:

OBJETIVO DEL LA REUNIÓN:

1. Dar inicio a la intervención formalmente ante la comunidad
2. Presentar el proyecto y resolver las inquietudes de los asistentes con relación al mismo
3. Presentar a los reponsables del proyecto y establecer los canales de comunicación para la atención al ciudadano
4. Exponer la estrategia de Veedurías Ciudadanas como el mecanismo de rendición de cuentas y participación ciudadana establecido por CORPONOR.

TEMAS TRATADOS:

Explicar a la comunidad las actividades que hacen parte del objeto del contrato
Duración de la obra
Contratación de mano de obra de la localidad
Alcance del contrato
Presentación de los contratistas e interventoria
Participación de la comunidad

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS ESTABLECIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Dar cumplimiento al objeto del contrato	Firma contratista	Acorde a la duración del mismo
Verificar el cumplimiento del objeto del contrato y obligaciones del contratista	Firma interventoria	Durante la ejecución del contrato
Prestar apoyo y seguimiento para el cumplimiento de las actividades del contrato	Comunidad - Comité de veeduria	Durante la ejecución del contrato

DIRECTORIO DE CONTACTOS:

Personas que participarán en el seguimiento al desarrollo del proyecto, para cualquier tema con relación al proyecto de parte de CORPONOR, El Contratista de Obra, La Interventoría y El Representante del Comité de Veeduría

NOMBRE	CARGO/EMPRESA	TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO
Wilson Umaña	Representante alcalde	3219696945
Santiago Hoyos	Interventor	3214326161
Javier E Trujillo	Corponor	3109539392
Luis Ernesto Zapata	Veeduría	3168647803
Gloria Hernandez	veeduría	3167496047

Scanned with CamScanner

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.

Corponor

SOCIALIZACIÓN PROYECTOS DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA

LUGAR : SILOS **FECHA: 18-12-2024**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



Scanned with CamScanner

Corponor

CONTROL DE ASISTENCIA – LISTADO DE PARTICIPANTES
REUNIONES CON COMUNIDADES

ASUNTO: CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

LUGAR Y FECHA:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	VEREDA	PREDIO O ENTIDAD	TELEFONO / CELULAR
1	Zoraida gonzalez	27846860	pachacual (aguedina)	El Tunel	3118824764
2	Victor Florez Rodriguez	88760897	Ranchadero	Bentana grande	3224675654
3	Ciro Jaimes Laguado	88'166.007	Ranchadero	Finca el Degredo	3157386730
4	Luis Ernesto capacho C.	8875903	pachacual	Finca el pino	3158642803
5	Elcida Correa pabon	27847079	pachacual	Finca el Cocano	3102899969
6	Florencio Fuentes	5.504.208	Ranchadero	Finca la oyada	3203208049
7	Cristina Delgado	88760977	Ranchadero	Puente Piedra	3188528777
8	Gloria Hernandez	27751791	Aguedina	Finca La union	3157490647
9	William Alfredo Romero Tarazona	88157285	UMATA	Alcaldia silos	3213969645
10	Santiago Moreno Castrillon	1233508297	—	Intervencion	3147266
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Scanned with CamScanner

ACTA DE VEEDURÍA – SILOS

Corponor	VEEDURÍAS CIUDADANAS ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ	
CONTRATO DE OBRA No. LIC -401-2024 **OBJETO:** **CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**	**CONTRATISTA:** **UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024** **R/L: ZURISADAY PRADILLA ATUESTA**	**INTERVENTORÍA:** **UNION TEMPORAL INTERESERVORIOS NORTE** **R/L:MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA**

FECHA: DICIEMBRE 18 DEL 2024

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER

MUNICIPIO: SILOS

LUGAR: ALCALDÍA MUNICIPAL

DESARROLLO

El dia de hoy se realiza la reunión inicial de socialización del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER", con el fin de conformar las Veedurías Ciudadanas, así como comunicar a la comunidad acerca de las actividades del proyecto Se presentan los contratistas responsables de la obra y se describen las actividades del proyecto.

Los objetivos del Comité de Veeduría Ciudadana son:

1. Permitir que la información que CORPONOR, el Contrastista de Obra ó Interventoria suministren acerca de la intervención, sea divulgada a la Comunidad

2. Contribuir a que CORPONOR, El Contrastista de Obra, la interventoría y la supervisión, tengan contacto organizado y eficaz con representantes de la comunidad para así evitar desinformación

Las responsabilidades del Comité de Veeduría Ciudadana son:

1. Servir de canal de comunicación entre la comunidad y CORPONOR, El Contrastista de Obra, la interventoría y la supervisión; transmitir la información de avance del proyecto a los diferentes sectores, que a su vez informarán a la población interesada en el proyecto de la comunidad

2. Co-administrar los Servicios de Atención al Ciudadano, con el fin de canalizar las inquietudes de la comunidad

3. Apoyar la realización y presentación de informes de su seguimiento y demás que sean requeridos

4. Colaborar al Contratista de Obra y a la Interventoría, para informar a la ciudadanía de los riesgos de no respetar las medidas de seguridad relacionadas con el proyecto

Los requisitos para participar en el Comité de Veeduría Ciudadana son los siguientes:

* Disponibilidad de tiempo para participar en las reuniones ó comités que se programen durante el desarrollo del proyecto

* Vivir o desarrollar actividades en el sector donde se desarrolla el proyecto

* Tener interés en el desarrollo de su sector y el bienestar colectivo y no particular

* Tener un punto donde se pueda localizar fácilmente por teléfono o correo electrónico

* Comprometerse a transmitir la información que recibe de manera veraz a la comunidad del avance del proyecto

CORPONOR, El Contrastista de Obra, la interventoría y la supervisión, se comprometen a transmitirle información al COMITÉ para su difusión, así como a atender, de manera oportuna a sus integrantes, en los espacios que para ello se determinen.

La comunidad presente, manifiesta su aceptación de los miembros postulados para conformar el Comité de Veeduría Ciudadana, por lo tanto queda conformado por las siguientes personas, y se certifica con el listado anexo.

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.

Corponor

VEEDURÍAS CIUDADANAS
ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ

CONTRATO DE OBRA No. LIC -401-2024

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

LUGAR :MUNICIPIO DE SILOS — **FECHA: DICIEMBRE 18 DEL 2024**

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

El Comité de Veeduría Ciudadana del Proyecto, quedó conformado de la siguiente manera:

	NOMBRE Y APELLIDO: Victor florez Rodriguez		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 88.160.897
1	TELÉFONO: 3224615654	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA: Victor Florez R
	NOMBRE Y APELLIDO: Ciro Jaimes Laguado		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 88.166.007
2	TELÉFONO: 3157386730	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA: Ciro Jaimes Laguado
	NOMBRE Y APELLIDO: florencio Jaimes Laguado		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 5 504 208
3	TELÉFONO: 3203208049	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA: Florencio Jaimes Laguado
	TELÉFONO:	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA:

REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

	NOMBRE Y APELLIDO: Victor flórez Rodriguez		CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 88.160.897
1	TELÉFONO: 3224615654	CORREO ELECTRÓNICO:	FIRMA: Victor Florez R

REGISTRO FOTOGRÁFICO INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

FOTO 1

FOTO 2

ACTA DE COMITÉ No. 1

ACTA DE COMITÉ DE OBRA O INTERVENTORÍA

MPA-01-F-18, versión 5, 08/07/2024

ACTA DE COMITÉ No. 01

CONTRATO No Y FECHA	LIC410 DE 2024 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2024
TIPO DE CONTRATO	LICITACIÓN PUBLICA
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	18 DE DICIEMBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
ASISTENTES:	Zurisaday Pradilla Atuesta **Contratista** Maira Alejandra Picón García Analyd Julyana Sánchez Diaz **Interventoría** Javier Alexis Becerra Albarracín Javier Enrique Trujillo Camacho **Supervisión**

El presente comité técnico de obra se llevó a cabo de manera conjunta entre la supervisión de CORPONOR, contratista e interventoría, con el objetivo de abordar y profundizar en diversos aspectos relacionados con el proyecto en curso. Durante la sesión se trataron de manera detallada los siguiente temas:

TEMAS A TRATAR:

- Aprobación de la solicitud de prorroga

DESARROLLO:

El 19 de diciembre de 2024, a las 4:00 p.m., se celebró el Comité Técnico de Obra correspondiente al proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".** La reunión contó con la participación de representantes de la interventoría, funcionarios de CORPONOR y el contratista de obra, el objetivo principal de evaluar y discutir la solicitud de contratista, con el fin de garantizar la correcta ejecución del proyecto sin comprometer su calidad ni seguridad.

Durante el desarrollo del comité, se expuso la solicitud del contratista en la que se argumentó que los retrasos en la entrega de materiales esenciales para la ejecución de las actividades del proyecto, tales como las láminas y geomembranas PVC, han generado la necesidad de una

prórroga para garantizar la correcta ejecución del proyecto sin comprometer su calidad ni la seguridad de las obras.

El contratista presentó las justificaciones y documentos correspondientes, incluyendo los oficios emitidos por los proveedores de los materiales que explican las razones de los retrasos y los nuevos plazos de entrega. Además, se discutió el impacto que estos retrasos pueden tener sobre el cronograma original y las alternativas para mitigar los efectos de esta situación.

Durante el Comité Técnico de Obra aprobó la solicitud de prórroga por un (1) mes calendario, teniendo en cuenta las circunstancias presentadas. El contratista se comprometió a ajustar el cronograma de actividades conforme a los nuevos plazos de entrega de los materiales, asegurando que la calidad y seguridad del proyecto no se vean comprometidas.

Finalmente, se acordó realizar una revisión y actualización del cronograma de trabajo, con el compromiso de dar seguimiento a la nueva programación y coordinar con los proveedores para garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos.

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

ZURISADAY PRADILLA ATUESTA
REPRESENTANTE LEGAL
UNIÓN TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024
CONTRATISTA

MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL
UNIÓN TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE
INTERVENTOR

JAVIER ALEXIS BECERRA ALBARRACÍN
SUPERVISOR
CORPONOR

PRORROGA No. 1

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR"
PRORROGA No 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA 412 DE 2024

Entre los suscritos **RAFAEL HUMBERTO CAMACHO CARRILLO**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la Cédula de Ciudadanía Nº 1.090.374.75836 expedida en Cúcuta, quien en su calidad de Director General, nombrado mediante acuerdo N° 021 del 26 de Octubre de 2023 y acta de posesión No.13287 de fecha 18 de Diciembre de 2023, y quien obra en nombre y representación de la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL– CORPONOR**-,entidad corporativa, descentralizada, creada mediante decreto 3450 de 1983 y transformada por la Ley 99 de 1993, quien para efectos del presente contrato se denominará CORPONOR, con NIT 890.505.253-4, por una parte y por la otra **UNIÓN TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE;** Representante Legal MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA, Cedula de ciudadanía No 37.331.288 de Ocaña. INTEGRANTES: **A)** M.A.P.G. INGENIERIÍA CIVIL S.A.S. Representante Legal MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA identificada con Cedula de ciudadanía 37.331.288 de Ocaña, con participación del 60 % **B).** EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS con cedula de ciudadanía 88.283.109 de Ocaña, participación del 15 % .**C)** MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS con cedula de ciudadanía 60.292.980 de Cúcuta, participación del 25 %.quien se denominara **EL CONTRATISTA** hemos convenido celebrar el presente contrato de Interventoría, consignado en las cláusulas que se pactan a continuación, previa las siguientes consideración es **1)** Que, la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental-CORPONOR el 7 de octubre de 2024 se publicó en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOPII el aviso de convocatoria pública, el análisis del sector, los estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones , Disposiciones Generales documentos asociados al Proceso de Concurso de Méritos **No CMA412 -2024 2)** Que, mediante la Resolución No 702 del 17 de octubre de 2024 el director general de CORPONOR ordeno la apertura del proceso de Concurso de Méritos identificado con el No **CMA412-2024**, designó el Comité Asesor para la evaluación de las propuestas y ordeno limitara a Mipyme territorial domicilio Departamento Norte de Santander. **3)** Que, el Veinticuatro (24) de Octubre de 2024, siendo las Nueve de la mañana (09:00 am), fecha y hora límite para la presentación de las propuestas dentro de Concurso de Méritos No **412 de 2024**, se dio apertura de las propuestas a través de la plataforma SECOP II se recibió propuesta por parte de la El 24 de octubre 2024 se realizó el cierre del proceso y apertura de ofertar, abrí los sobres en la plataforma SECOP II, publique la lista de ofertas y publique las ofertas recibida por parte de :**UNIÓN TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE** Representante Legal MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA, Cedula de ciudadanía No 37.331.288 de Ocaña. INTEGRANTES: **1.** M.A.P.G. INGENIERIÍA CIVIL S.A.S. Representante Legal MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA identificada con Cedula de ciudadanía 37.331.288 de Ocaña, con participación del 60 % **2.** EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS con cedula de ciudadanía 88.283.109 de Ocaña, participación del 15 % .**3.** MYRIA DOLORES ARTEAGA CARDENAS con cedula de ciudadanía 60.292.980 de Cúcuta, participación del 25 %. **4)** Que el comité evaluador dentro del período fijado en el cronograma realizó la verificación de la propuesta presentada por la **UNIÓN TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE** Representante Legal MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA, Cedula de ciudadanía No 37.331.288 de Ocaña, fue verificada y habilitada, financiera, jurídica y técnicamente **5)** Que mediante Resolución No 787 del 19 de noviembre de 2024 de adjudico el proceso **CMA412 de 2024**, cuyo objeto es". **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR"
PRORROGA No 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA 412 DE 2024

DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. A la **UNIÓN TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE** Representante Legal MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA, Cedula de ciudadanía No 37.331.288 de Ocaña. Por el valor de **OCHENTA Y TRES MILLONES NUEVE MIL CIENTO VEINTICIETE PESOS MCTE ($83.009.127,00), incluido el valor del IVA**, amparado Amparado por el certificado de Disponibilidad presupuestal No 517 del 3 de octubre de 2024según rubro presupuestal 1700 - 2.3.2.02.02.008.3203.0900-1.A.1.B.2-02 - 24 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. El proceso contractual se enmarca en el PROYECTO 1.1.2 GESTIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO Y USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO. META RELACIONADA 1.1.2.1.1. ALMACENAMIENTO DEL AGUA DE ESCORRENTÍA ORIENTADO A MANTENER LA OFERTA DEL RECURSO HÍDRICO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS QUE REGULAN LA OFERTA HÍDRICA CONSIDERANDO EL AGUA COMO FACTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE BIENESTAR SOCIAL. **6)** Que, el inciso 2 numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, consagra "… *En los contratos de obra pública que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación pública, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista…"*. **7).** Que, dada la diversidad y complejidad de los componentes del objeto de las obras a ejecutarse, y que la entidad no tiene la capacidad para asumir la supervisión de las obras de manera directa, y no cuenta dentro de su personal con el personal de planta suficiente para realizar el seguimiento del referido proyecto de obra, se requiere contratar por parte del CORPONOR las labores de Interventoría respectiva; y propender entre otras, por la moralidad administrativa, tutelar la transparencia de la actividad contractual, y prevenir la ocurrencia de actividades de corrupción, en aplicación del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. **8)** Que en desarrollo del proceso de selección se suscribió el contrato de Interventoría No CMA412-2024 con la **UNIÓN TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE;** Representante Legal MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA, Cedula de ciudadanía No 37.331.288 de Ocaña. **9)** Que el plazo de ejecución del contrato CMA412-2024 es de TREINTA (30) DIAS contados desde el acta de inicio esto es desde el 5 de diciembre de 2024 el cual se encuentra vigente hasta el 4 de enero de 2024. **7)** Que se efectuó la prórroga al contrato No LiC401 de 2024 objeto de interventoría por el termino treinta (30) días POR LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES : **A** Que por solicitud de fecha 17-12-2024, de parte del contratista de obra, UNIÓN TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024, cuyo representante legal es la señora ZURISADAY PRADILLA ATUESTA, quien solicita una prórroga en el marco del contrato de obra No. LIC-410-2024, cuyo objeto corresponde a la "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER" .La solicitud se efectúa debido a diversos factores imprevistos, que han generado inconvenientes afectando el avance del proyecto, lo que requiere una revisión del cronograma de ejecución para asegurar el cumplimiento total del contrato. **B)** Que Se hace énfasis en que los proveedores encargados de suministrar materiales claves para la instalación del reservorio, específicamente las láminas y la geomembrana PVC, han notificado retrasos en la entrega de dichos materiales, impactando la ejecución de las actividades programadas (Se anexa documento JM Multicolores y Peñaloza – Corona). **C)** Que atendiendo a lo anterior, y con el fin de garantizar la correcta ejecución de las actividades contratadas, la UNIÓN TEMPORAL

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR"
PRORROGA No 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA 412 DE 2024

RESERVORIOS DEL NORTE 2024, solicita una prórroga de tiempo de UN (1) MES, para poder atender la totalidad de las labores pendientes, reformulando el cronograma y ajustándolo a las nuevas condiciones. **D)** Que en virtud de lo anterior la entidad considerando que se deben evaluar las condiciones de equilibrio económico del contrato, así como el cumplimiento del objeto del mismo, y verificar la viabilidad de aprobar o no la solicitud efectuada por el contratista de obra, la interventoría del proceso, UNIÓN TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE, representada por la señora MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA, solicita a la entidad mediante comunicación de fecha 18-12-2024, la convocatoria de un comité de obra, con el propósito de socializar la solicitud de prórroga presentada por la UNIÓN TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024.**E** Que en fecha diciembre 18 del 2024 se lleva a cabo un Comité de Obra con participación de la ingeniera MAIRA ALEJANDRA PICÓN, representante legal de la empresa UNIÓN TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE, a cargo de la interventoría; la ingeniera ZURISADAY PRADILLA ATUESTA, Representante Legal de la empresa UNIÓN TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024, contratista de obra y el arquitecto Javier Alexis Becerra Albarracín, supervisor de CORPONOR, con el objeto de evaluar la solicitud de prorroga al contrato de obra No. LIC-410-2024, así como el contrato de interventoría No. CMA 412 DE 2024, atendiendo a la situación anteriormente manifestada. **F.** Que en desarrollo del comité, el contratista de obra presentó las justificaciones y documentos correspondientes, incluyendo los oficios emitidos por los proveedores de los materiales que explican las razones de los retrasos y los nuevos plazos de entrega. Además, se discutió el impacto que estos retrasos pueden tener sobre el cronograma original y las alternativas para mitigar los efectos de esta situación .**G.** Que en virtud de lo anterior, y acorde con lo establecido en el acta de Comité de Obra No. 01 de fecha 18-12-2024, es aprobada la prórroga requerida por el contratista de obra de UN (1) MES más, solicitándose el ajuste del cronograma de actividades conforme a los nuevos plazos de entrega de los materiales, asegurando que la calidad y seguridad del proyecto no se vean comprometidas.**8)** Que Conforme a lo anteriormente expuesto, y de acuerdo a la necesidad de prorrogar en tiempo el Contrato principal, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en la Ley 1474 DE 2011 ART ARTÍCULO 85. Continuidad de la interventoría. Que señala "*Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.***9)** Que de conformidad a los considerandos anteriores se prorroga el contrato en TREINTA (30) DIAS MAS, quedando el plazo de ejecución en ocho SESENTA (60) DIAS . incluidos EL PLAZO INCIAL: TREINTA (30) DIAS y la prórroga de TREINTA (30) DIAS. **10)** Que el valor del contrato de Interventoría **CMA399-2024** corresponde a la suma de **OCHENTA Y TRES MILLONES NUEVE MIL CIENTO VEINTICIETE PESOS MCTE ($83.009.127,00), incluido el valor del IVA**, amparado Amparado por el certificado de Disponibilidad presupuestal No 517 del 3 de octubre de 2024según rubro presupuestal 1700 - 2.3.2.02.02.008.3203.0900-1.A.1.B.2-02 - 24 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. El proceso contractual se enmarca en el PROYECTO 1.1.2 GESTIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO Y USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO. META RELACIONADA 1.1.2.1.1. ALMACENAMIENTO DEL AGUA DE ESCORRENTÍA ORIENTADO A MANTENER LA OFERTA DEL RECURSO HÍDRICO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS QUE REGULAN LA OFERTA HÍDRICA CONSIDERANDO EL AGUA COMO FACTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE BIENESTAR SOCIAL. **11)** Que en los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración. Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR"
PRORROGA No 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA 412 DE 2024

lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80 de 1993, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal .**12)** por las razones anteriormente las partes acuerdan efectuar la prórroga No 1 al contrato No CMA412- de 2024 hasta el 4 de enero de 2025 toda vez que su plazo de ejecución se Encuentra vigente hasta el 4 DE ENERO DE 2025 , cual se regirá por las siguientes cláusulas.: **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL COTRATO:** Efectuar la prórroga No 1 al contrato de interventoría No CMA412-2024 cuyo objeto es**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER",** conforme los estudios previos que justifican prorroga , y los demás documentos que hacen parte integral del mismo que definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del mismo. **CLAUSULA SEGUNDA la CLAUSULA cuarta – LA CLAUSULA TERCERA :PLAZO DE EJECUCION** del contrato principal quedara de la siguiente forma: adiciónese el plazo de ejecución el contrato de interventoría No CMA47412-2024, Qquedando el plazo total de ejecución del contrato en SESENTA (60) DIAS de la siguiente forma: TREINTA (30) DIAS DEL PLAZO INCIAL Y TREINTA (30) DE LA PROROGA., El Plazo que empieza a partir de la fecha de perfeccionamiento del mismo y cumplimiento de los requisitos exigidos para su ejecución. Contados a partir del acta de inicio, previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos para su ejecución. .**CLAUSULA TERCERA : GARANTIAS** Las Garantía única se deberá ampliar conforme a la adición introducida a través del presente documento en cada uno de los amparos establecidos en el contrato principal, le póliza se deberá remitir a CORPONOR en el término de Dos días para su aprobación **CLAUSULA CUARTA PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION**: El presente adicional se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere la expedición **CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS NO MODIFICADAS**:-L as demás cláusulas y estipulaciones contenidas en el contrato de Interventoría No.CMA412-2024 continúan vigentes, en lo que no resulten contrarias al presente adicional

Proyecto: Diana Gutiérrez Castro
Asesora Jurídica externa , Dirección General

Ver Anexo No. 1. *BALANCE FÍSICO FINANCIERO OBRA - INTERVENTORIA*

ANEXO 1. BALANCE FISICO - FINANCIERO DE OBRA E INTERVENTORIA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 - 2024				CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CMA412 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024			PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER						DESDE:	5/12/2024
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024	SUPERVISOR:	JAVIER ALEXIS BECERRA ALBARRACIN	INTERVENTOR:	UNION TEMPORALINTERRESERVORIOS NORTE	INFORME No. 1	HASTA:	30/12/2024

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO						MODIFICACION O ADICIÓN			TOTAL CONTRATADO		INFORME No. 1 05/12/2024 - 26/12/2024		ACUMULADO EJECUTADO		% EJECUTADO	POR EJECUTAR		% POR EJECUTAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR ($)	+/-	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)		CANTIDAD	VALOR ($)	
1	Localización y replanteo manual	m2	6650	$ 4.065,00	$ 27.032.250,00				6.650,00	$ 27.032.250,00	6.650,00	$ 27.032.250,00	6.650,00	$ 27.032.250,00	100%			
2	Limpieza y descapote manual 10 cm, incluye retiro	m2	6650	$ 6.309,00	$ 41.954.850,00				6.650,00	$ 41.954.850,00	6.650,00	$ 41.954.850,00	6.650,00	$ 41.954.850,00	100%			
3	Colchon de arena 5 cm	m3	332,5	$ 251.407,00	$ 83.592.828,00				332,50	$ 83.592.828,00	332,50	$ 83.592.828,00	332,50	$ 83.592.828,00	100%			
4	Suministro e instalación de tanque tipo austrialiano 73100 lt	und	70	$ 11.673.799,00	$ 817.165.930,00				70,00	$ 817.165.930,00	-		-			70,00	$ 817.165.930,00	100%
5	Divulgar y socializar el proyecto a la comunidad y actores involucrados	und	70	$ 24.871,00	$ 1.740.970,00				70,00	$ 1.740.970,00	-		-			70,00	$ 1.740.970,00	100%
COSTO DIRECTO					**$ 971.486.828,00**					**$ 971.486.828,00**		**$ 152.579.928,00**		**$ 152.579.928,00**			**$ 818.906.900,00**	
ADMINISTRACIÓN				20%	$ 194.297.365,60					$ 194.297.365,60		$ 30.515.985,60		$ 30.515.985,60			$ 163.781.380,00	
IMPREVISTOS				1%	$ 9.714.868,28					$ 9.714.868,28		$ 1.525.799,28		$ 1.525.799,28			$ 8.189.069,00	
UTILIDADES				9%	$ 87.433.814,52					$ 87.433.814,52		$ 13.732.193,52		$ 13.732.193,52			$ 73.701.621,00	
IVA sobre utilidad				19%	$ 16.612.424,76					$ 16.612.424,76		$ 2.609.116,77		$ 2.609.116,77			$ 14.003.307,99	
COSTO INDIRECTO					**$ 308.058.432,00**					**$ 308.058.432,00**		**$ 48.383.072,00**		**$ 48.383.095,00**			**$ 259.675.360,00**	
VALOR TOTAL					**$ 1.279.545.260,00**					**$ 1.279.545.260,00**		**$ 200.963.000,00**		**$ 200.963.000,00**			**$ 1.078.582.260,00**	
PORCENTAJE DE AVANCE											**15,71%**		**15,71%**			**84,29%**		

INTERVENTORIA		**$ 69.755.569,00**				**$ 69.755.569,00**		**$ 10.958.000,00**		**$ 10.958.000,00**		**$ 58.797.569,00**	
IVA Interventoria	19%	$ 13.253.558,11		$ -		$ 13.253.558,11		$ 2.082.020,00		$ 2.082.020,00		$ 11.171.538,11	
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO		**$ 83.009.127,00**		**$ -**		**$ 83.009.127,00**		**$ 13.040.020,00**		**$ 13.040.020,00**		**$ 69.969.107,00**	
PORCENTAJE DE AVANCE INTERVENTORIA							**15,71%**		**15,71%**		**84,29%**		

TOTAL PROYECTO :	$ 1.362.554.387,00		$ 1.362.554.387,00	$ 214.003.020,00	$ 214.003.020,00	$ 1.148.551.367,00
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (%) :						

OBSERVACIONES:

DIANA PATRICIA AVELLA VILLAMIZAR
RESIDENTE DE OBRA

MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JESUS ENRIQUE VARGAS
DIRECTOR DE OBRA

MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Anexo. (Bitácora con firma de los residentes de obra e interventoría y su respectivo registro fotográfico. (Dejar constancia de los días en que hace presencia el director de obra y solo se entrega en el informe final la bitácora original)

UNIÓN TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE

BITACORA DE OBRA

Corponor
Cuidamos nuestro mundo

FECHA:	jueves, 5 de diciembre de 2024
INICIO DE ACTIVIDADES:	10:00 a. m.
CLIMA:	Soleado
PERSONAL:	interventoria, contratista, corponor, veeduria y funcionarios de la alcaldía
MAQUINARIA Y/O EQUIPO:	

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se realizo la socializacion en el municipio de durania, en presencia de los funcionarios de corponor, contratista, alcaldia, contratista, beneficiarios e interventoria.

OBSERVACIONES:	No hay
FINALIZAN ACTIVIDADES:	11:00 a. m.

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE INTERVENTORIA

UNIÓN TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE

BITACORA DE OBRA

Corponor
Cuidamos nuestro mundo

FECHA:	viernes, 6 de diciembre de 2024
INICIO DE ACTIVIDADES:	7:00 a. m.
CLIMA:	Soleado
PERSONAL:	Interventoría y contratista
MAQUINARIA Y/O EQUIPO:	

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se realizaron las visitas iniciales a los beneficiaros del municipio de Durania, con fin de conocer el estado del previo dispuesto para la ubicación de los reservorios y atender las dudas de los beneficiarios.

OBSERVACIONES:	No hay
FINALIZAN ACTIVIDADES:	5:00 p. m.

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA:	sábado, 7 de diciembre de 2024
INICIO DE ACTIVIDADES:	7:00 a. m.
CLIMA:	Soleado
PERSONAL:	Interventoría y contratista
MAQUINARIA Y/O EQUIPO:	

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se realizaron las visitas iniciales a los beneficiaros del municipio de Durania, con fin de conocer el estado del previo dispuesto para la ubicación de los reservorios y atender las dudas de los beneficiarios.

OBSERVACIONES:	No hay
FINALIZAN ACTIVIDADES:	12:00 p. m.

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE INTERVENTORIA

UNIÓN TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE

BITACORA DE OBRA

Corponor
Cuidamos nuestro mundo

FECHA:	lunes, 9 de diciembre de 2024
INICIO DE ACTIVIDADES:	7:00 a. m.
CLIMA:	Soleado
PERSONAL:	Interventoría y contratista
MAQUINARIA Y/O EQUIPO:	

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se realizaron las visitas iniciales a los beneficiaros del municipio de Durania, con fin de conocer el estado del previo dispuesto para la ubicación de los reservorios y atender las dudas de los beneficiarios.

OBSERVACIONES:	No hay
FINALIZAN ACTIVIDADES:	5:00 p. m.

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE INTERVENTORIA

UNIÓN TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE

BITACORA DE OBRA

Corponor
Cuidamos nuestro mundo

FECHA:	martes, 10 de diciembre de 2024
INICIO DE ACTIVIDADES:	9:00 a. m.
CLIMA:	Soleado
PERSONAL:	interventoria, contratista, corponor, veeduria y funcionarios de la alcaldía
MAQUINARIA Y/O EQUIPO:	

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se realizo la socializacion en el municipio de San Cayetano, en presencia de los funcionarios de corponor, contratista, alcaldia, contratista, beneficiarios e interventoria.

OBSERVACIONES:	No hay
FINALIZAN ACTIVIDADES:	10:00 a. m.

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE INTERVENTORIA

UNIÓN TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE

BITACORA DE OBRA

Corponor
Cuidamos nuestro mundo

FECHA:	miércoles, 11 de diciembre de 2024
INICIO DE ACTIVIDADES:	10:00 a. m.
CLIMA:	Soleado
PERSONAL:	interventoria, contratista, corponor, veeduria y funcionarios de la alcaldía
MAQUINARIA Y/O EQUIPO:	

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se realizo la socializacion en el municipio de mutiscua, en presencia de los funcionarios de corponor, contratista, alcaldia, contratista, beneficiarios e interventoria.

OBSERVACIONES:	No hay
FINALIZAN ACTIVIDADES:	11:00 a. m.

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA:	jueves, 12 de diciembre de 2024
INICIO DE ACTIVIDADES:	7:00 a. m.
CLIMA:	Soleado
PERSONAL:	Interventoría y contratista
MAQUINARIA Y/O EQUIPO:	

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se realizo seguimiento y supervisión en las actividades de localización y replanteo en la construccion de los reservorios en el municipio de arboledas

OBSERVACIONES:	No hay
FINALIZAN ACTIVIDADES:	5:00 p. m.

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE INTERVENTORIA

UNIÓN TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE

BITACORA DE OBRA

Corponor
Cuidamos nuestro mundo

FECHA:	viernes, 13 de diciembre de 2024
INICIO DE ACTIVIDADES:	7:00 a. m.
CLIMA:	Soleado
PERSONAL:	Interventoría y contratista
MAQUINARIA Y/O EQUIPO:	

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se realizo seguimiento y supervisión en las actividades de localización, replanteo, limpieza y descapote, en la construccion de los reservorios en el municipio de arboledas

OBSERVACIONES:	No hay
FINALIZAN ACTIVIDADES:	5:00 p. m.

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE INTERVENTORIA

UNIÓN TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE

BITACORA DE OBRA

Corponor
Cuidamos nuestro mundo

FECHA:	sábado, 14 de diciembre de 2024
INICIO DE ACTIVIDADES:	7:00 a. m.
CLIMA:	Soleado
PERSONAL:	Interventoría y contratista
MAQUINARIA Y/O EQUIPO:	

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se realizo seguimiento y supervisión en las actividades de colchon de arena 5 cm, en la construccion de los reservorios en el municipio de salazar de las palmas

OBSERVACIONES:	No hay
FINALIZAN ACTIVIDADES:	12:00 p. m.

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE INTERVENTORIA

UNIÓN TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE

BITACORA DE OBRA

Corponor
Cuidamos nuestro mundo

FECHA:	lunes, 16 de diciembre de 2024
INICIO DE ACTIVIDADES:	7:00 a. m.
CLIMA:	Soleado
PERSONAL:	Interventoría y contratista
MAQUINARIA Y/O EQUIPO:	

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se realizaron las visitas iniciales a los beneficiaros del municipio de arboledas, con fin de conocer el estado del previo dispuesto para la ubicación de los reservorios y atender las dudas de los beneficiarios.

OBSERVACIONES:	No hay
FINALIZAN ACTIVIDADES:	5:00 p. m.

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE INTERVENTORIA

UNIÓN TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE

BITACORA DE OBRA

Corponor
Cuidamos nuestro mundo

FECHA:	martes, 17 de diciembre de 2024
INICIO DE ACTIVIDADES:	7:00 a. m.
CLIMA:	Soleado
PERSONAL:	Interventoría y contratista
MAQUINARIA Y/O EQUIPO:	

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se realizaron las visitas iniciales a los beneficiaros del municipio de cucutilla, con fin de conocer el estado del previo dispuesto para la ubicación de los reservorios y atender las dudas de los beneficiarios.

OBSERVACIONES:	No hay
FINALIZAN ACTIVIDADES:	5:00 p. m.

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE INTERVENTORIA

UNIÓN TEMPORAL INTERREGERVORIOS NORTE

BITACORA DE OBRA

Corponor
Cuidamos nuestro mundo

FECHA:	miércoles, 18 de diciembre de 2024
INICIO DE ACTIVIDADES:	10:00 a. m.
CLIMA:	Soleado
PERSONAL:	interventoria, contratista, corponor, veeduria y funcionarios de la alcaldía
MAQUINARIA Y/O EQUIPO:	

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se realizo la socializacion en el municipio de silos, en presencia de los funcionarios de corponor, contratista, alcaldia, contratista, beneficiarios e interventoria.

OBSERVACIONES:	No hay
FINALIZAN ACTIVIDADES:	11:00 a. m.

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE INTERVENTORIA

UNIÓN TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE

BITACORA DE OBRA

Corponor
Cuidamos nuestro mundo

FECHA:	jueves, 19 de diciembre de 2024
INICIO DE ACTIVIDADES:	7:00 a. m.
CLIMA:	Soleado
PERSONAL:	interventoria y contratista
MAQUINARIA Y/O EQUIPO:	

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se realizaron las visitas iniciales a los beneficiaros del municipio de cucutilla, con fin de conocer el estado del previo dispuesto para la ubicación de los reservorios y atender las dudas de los beneficiarios.

OBSERVACIONES:	No hay
FINALIZAN ACTIVIDADES:	5:00 p. m.

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE INTERVENTORIA

UNIÓN TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE

BITACORA DE OBRA

Corponor
Cuidamos nuestro mundo

FECHA:	viernes, 20 de diciembre de 2024
INICIO DE ACTIVIDADES:	7:00 a. m.
CLIMA:	Soleado
PERSONAL:	Interventoria y contratista
MAQUINARIA Y/O EQUIPO:	

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se realizo seguimiento y supervisión en las actividades de localización, replanteo, limpieza y descapote, en la construccion de los reservorios en el municipio de cucutilla

OBSERVACIONES:	No hay
FINALIZAN ACTIVIDADES:	5:00 p. m.

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE INTERVENTORIA

UNIÓN TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE

BITACORA DE OBRA

Corponor
Cuidamos nuestro mundo

FECHA:	sábado, 21 de diciembre de 2024
INICIO DE ACTIVIDADES:	7:00 a. m.
CLIMA:	Soleado
PERSONAL:	contratista e interventoria
MAQUINARIA Y/O EQUIPO:	

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se realizaron las visitas iniciales a los beneficiaros del municipio de silos, con fin de conocer el estado del previo dispuesto para la ubicación de los reservorios y atender las dudas de los beneficiarios.

OBSERVACIONES:	No hay
FINALIZAN ACTIVIDADES:	5:00 p. m.

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE INTERVENTORIA

UNIÓN TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE

BITACORA DE OBRA

Corponor
Cuidamos nuestro mundo

FECHA:	lunes, 23 de diciembre de 2024
INICIO DE ACTIVIDADES:	7:00 a. m.
CLIMA:	Soleado
PERSONAL:	contratista e interventoria
MAQUINARIA Y/O EQUIPO:	

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se realizaron las visitas iniciales a los beneficiaros del municipio de silos, con fin de conocer el estado del previo dispuesto para la ubicación de los reservorios y atender las dudas de los beneficiarios.

OBSERVACIONES:	No hay
FINALIZAN ACTIVIDADES:	5:00 p. m.

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE INTERVENTORIA

UNIÓN TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE

BITACORA DE OBRA

Corponor
Cuidamos nuestro mundo

FECHA:	martes, 24 de diciembre de 2024
INICIO DE ACTIVIDADES:	7:00 a. m.
CLIMA:	Soleado
PERSONAL:	contratista e interventoria
MAQUINARIA Y/O EQUIPO:	

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se realizaron las visitas iniciales a los beneficiaros del municipio de silos, con fin de conocer el estado del previo dispuesto para la ubicación de los reservorios y atender las dudas de los beneficiarios.

OBSERVACIONES:	No hay
FINALIZAN ACTIVIDADES:	5:00 p. m.

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE INTERVENTORIA

UNIÓN TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE

BITACORA DE OBRA

Corponor
Cuidamos nuestro mundo

FECHA:	jueves, 26 de diciembre de 2024
INICIO DE ACTIVIDADES:	7:00 a. m.
CLIMA:	Soleado
PERSONAL:	interventoria y contratista
MAQUINARIA Y/O EQUIPO:	

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se realizaron las visitas iniciales a los beneficiaros del municipio de silos, con fin de conocer el estado del previo dispuesto para la ubicación de los reservorios y atender las dudas de los beneficiarios.

OBSERVACIONES:	No hay
FINALIZAN ACTIVIDADES:	5:00 p. m.

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE INTERVENTORIA

UNIÓN TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE

BITACORA DE OBRA

Corponor
Cuidamos nuestro mundo

FECHA:	viernes, 27 de diciembre de 2024
INICIO DE ACTIVIDADES:	7:00 a. m.
CLIMA:	Soleado
PERSONAL:	interventoria y contratista
MAQUINARIA Y/O EQUIPO:	

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se realizaron las visitas iniciales a los beneficiaros del municipio de silos, con fin de conocer el estado del previo dispuesto para la ubicación de los reservorios y atender las dudas de los beneficiarios.

OBSERVACIONES:	No hay
FINALIZAN ACTIVIDADES:	5:00 p. m.

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA:	sábado, 28 de diciembre de 2024
INICIO DE ACTIVIDADES:	7:00 a. m.
CLIMA:	Soleado
PERSONAL:	contratista e interventoria
MAQUINARIA Y/O EQUIPO:	

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se realizaron las visitas iniciales a los beneficiaros del municipio de silos, con fin de conocer el estado del previo dispuesto para la ubicación de los reservorios y atender las dudas de los beneficiarios.

OBSERVACIONES:	No hay
FINALIZAN ACTIVIDADES:	5:00 p. m.

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE INTERVENTORIA

UNIÓN TEMPORAL INTERREGESERVORIOS NORTE

BITACORA DE OBRA

Corponor
Cuidamos nuestro mundo

FECHA:	lunes, 30 de diciembre de 2024
INICIO DE ACTIVIDADES:	7:00 a. m.
CLIMA:	Soleado
PERSONAL:	contratista e interventoria
MAQUINARIA Y/O EQUIPO:	

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se realizaron las visitas iniciales a los beneficiaros del municipio de silos, con fin de conocer el estado del previo dispuesto para la ubicación de los reservorios y atender las dudas de los beneficiarios.

OBSERVACIONES:	No hay
FINALIZAN ACTIVIDADES:	5:00 p. m.

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE INTERVENTORIA

Ver *Anexo No. 2.* *REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE INTERVENTORIA*

Corponor	**ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA** MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024	

21 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA - 412 -2024

UNIÓN TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**	**INFORME No.**	**1**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**Localización y replanteo manual**	**DESDE:**	**5/12/2024**
		HASTA:	**30/12/2024**



Localización y replanteo manual



Localización y replanteo manual



Localización y replanteo manual



Localización y replanteo manual

Corponor	**ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA** MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024	

21 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA - 412 -2024

UNIÓN TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**	**INFORME No.**	**1**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**Limpieza y descapote manual 10 cm, incluye retiro**	**DESDE:**	**5/12/2024**
		HASTA:	**30/12/2024**



Limpieza y descapote manual 10 cm, incluye retiro



Limpieza y descapote manual 10 cm, incluye retiro



Limpieza y descapote manual 10 cm, incluye retiro



Limpieza y descapote manual 10 cm, incluye retiro

Corponor	**ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA** MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024	

21 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2024			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA - 412 -2024			
UNIÓN TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE			
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**	**INFORME No.**	**1**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**Colchon de arena 5 cm**	**DESDE:**	**5/12/2024**
		HASTA:	**30/12/2024**



Colchon de arena 5 cm



Colchon de arena 5 cm



Colchon de arena 5 cm



Colchon de arena 5 cm

Ver *Anexo No. 3.* *ESTADO FINANCIERO OBRA E INTERVENTORIA*

ANEXO 3. RELACIÓN DE PAGOS OBRA E INTERVENTORIA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 - 2024				CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CMA412 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024				PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER							DESDE:	5/12/2024
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024	SUPERVISOR:	JAVIER ALEXIS BECERRA ALBARRACIN	INTERVENTOR:	LINTERRESE	INFORME No.	1	HASTA:	26/12/2024

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO						MODIFICACION O ADICIÓN			TOTAL CONTRATADO		ACTA PARCIAL No. 1 05/12/2024 - 26/12/2024		ACUMULADO EJECUTADO Y PAGADO EN ACTAS		% PAGADO	POR COBRAR		% POR COBRAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR ($)	+/-	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)		CANTIDAD	VALOR ($)	
1	Localización y replanteo manual	m2	6650	$ 4.065,00	$ 27.032.250,00				6.650,00	$ 27.032.250,00	6.650,00	$ 27.032.250,00	6.650,00	$ 27.032.250,00	100%			
2	Limpieza y descapote manual 10 cm, incluye retiro	m2	6650	$ 6.309,00	$ 41.954.850,00				6.650,00	$ 41.954.850,00	6.650,00	$ 41.954.850,00	6.650,00	$ 41.954.850,00	100%			
3	Colchon de arena 5 cm	m3	332,5	$ 251.407,00	$ 83.592.828,00				332,50	$ 83.592.828,00	332,50	$ 83.592.828,00	332,50	$ 83.592.828,00	100%			
4	Suministro e instalación de tanque tipo austrialiano 73100 lt	und	70	$ 11.673.799,00	$ 817.165.930,00				70,00	$ 817.165.930,00			-			70,00	$ 817.165.930,00	100%
5	Divulgar y socializar el proyecto a la comunidad y actores involucrados	und	70	$ 24.871,00	$ 1.740.970,00				70,00	$ 1.740.970,00			-			70,00	$ 1.740.970,00	100%
COSTO DIRECTO					**$ 971.486.828,00**					**$ 971.486.828,00**		**$ 152.579.928,00**		**$ 152.579.928,00**			**$ 818.906.900,00**	
ADMINISTRACIÓN				20%	194297365,6					194297365,6		30515985,6		30515985,6			163781380	
IMPREVISTOS				1%	9714868,28					9714868,28		1525799,28		1525799,28			8189069	
UTILIDADES				9%	87433814,52					87433814,52		13732193,52		13732193,52			73701621	
IVA sobre utilidad				19%	16612424,76					16612424,76		2609116,769		2609116,769			14003307,99	
COSTO INDIRECTO					**$ 308.058.432,00**					**$ 308.058.432,00**		**$ 48.383.072,00**		**$ 48.383.072,00**			**$ 259.675.360,00**	
VALOR TOTAL					**$ 1.279.545.260,00**					**$ 1.279.545.260,00**		**$ 200.963.000,00**		**$ 200.963.000,00**			**$ 1.078.582.260,00**	
PORCENTAJE DE AVANCE												**15,71%**		**15,71%**			**84,29%**	

INTERVENTORIA			**$ 69.755.569,00**				**$ 69.755.569,00**		**$ 10.958.000,00**		**$ 10.958.000,00**			**$ 58.797.569,00**	
IVA Interventoria	19%		$ 13.253.558,11		$ -		$ 13.253.558,11		$ 2.082.020,00		$ 2.082.020,00			$ 11.171.538,11	
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO			**$ 83.009.127,00**		**$ -**		**$ 83.009.127,00**		**$ 13.040.020,00**		**$ 13.040.020,00**			**$ 69.969.107,00**	
PORCENTAJE DE AVANCE INTERVENTORIA									**15,71%**		**15,71%**			**84,29%**	

AVANCE FÍSICO : 15,71%

OBSERVACIONES:

DIANA PATRICIA AVELLA VILLAMIZAR
RESIDENTE DE OBRA

MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JESUS ENRIQUE VARGAS
DIRECTOR DE OBRA

MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 3. RELACIÓN DE PAGOS OBRA E INTERVENTORIA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No. LIC-401 - 2024				CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CMA412 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024				PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER							DESDE:	5/12/2024
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024	SUPERVISOR:	JAVIER ALEXIS BECERRA ALBARRACIN	INTERVENTOR:	UNIÓN TEMPORALINTERRESERVORIOS NORTE	INFORME No.	1	HASTA:	26/12/2024

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATISTA DE OBRA

Valor inicial del contrato	**$**	**1.279.545.260,00**
Valor Adicional del contrato	**$**	**-**
Valor Total del contrato	**$**	**1.279.545.260,00**

No. Acta	Valor cobrado	Valor Acumulado	Saldo del contrato	% parcial ejecutado	% ejecutado acumulado	Periodo cobrado		Fecha presentación del acta	Comprobante de egreso	Observaciones				
						Desde	Hasta							
1	$ 200.963.000,00	$ 200.963.000,00	$ 1.078.582.260,00	15,71%	15,71%	5/12/2024	30/12/2024	30/12/2024						

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATISTA DE ITERVENTORIA

Valor inicial del contrato	**$**	**83.009.127,00**
Valor Adicional del contrato	**$**	**-**
Valor Total del contrato	**$**	**83.009.127,00**

No. Acta	Valor cobrado	Valor Acumulado	Saldo del contrato	% parcial ejecutado	% ejecutado acumulado	Periodo cobrado		Fecha presentación del acta	Comprobante de egreso	Observaciones				
						Desde	Hasta							
1	$ 13.040.020,00	$ 13.040.020,00	$ 69.969.107,00	15,71%	15,71%	5/12/2024	30/12/2024	30/12/2024						

Diego Fernando Rivera Delgado
RESIDENTE DE OBRA

Kevyn Harley Ceballos Sachica
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Edwin Hernando Trigos Quintana
DIRECTOR DE OBRA

Lidia Shirley Parra Garcia
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Anexo *MPA-01-F-25 - Versión 3 (Lista de verificación del cumplimiento de criterios de seguridad, salud en el trabajo y manejo ambiental en obras públicas).*

LISTA DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MANEJO AMBIENTAL EN OBRAS PUBLICAS

MPA-01-F-25, versión 4, 08/07/2024

Mensualmente se verificará el estado de cumplimiento de los criterios de seguridad, salud en el trabajo y manejo ambiental en las obras públicas ejecutadas por la Corporación.

CONTRATO N° Y FECHA	CMA412-2024 del 25 de noviembre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE
SUPERVISOR	JAVIER ALEXIS BECERRA ALBARRACIN

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

No.	Variable de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro	VERIFICACIÓN				OBSERVACIONES
						Fecha de inspección:	Registro de verificación			
							C	N/C	N/A	
1	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**									
1.1	Afiliación al personal de la obra al Sistema de Seguridad Social (ARL, EPS, PENSIÓN y PARAFISCALES) y pagos correspondientes.	* Todo el personal de la obra debe estar afiliado al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales. * El empleador realizará oportunamente los pagos al Sistema de Seguridad Social. (Nota: Los primeros 5 días de cada mes)	Antes y durante la ejecución de la obra.	Residente de Obra e interventoría	Planillas de afiliación al Sistema de Seguridad Social y Planilla de pagos mensuales de la seguridad social.	5-Dec-24	X			
1.2	Inducción a los trabajadores sobre la exposición a los peligros.	Conocimiento del PLAN DE CONTROL DE PELIGROS Y RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Al ingreso del personal	Residente de Obra e interventoría	Registro de asistencia	5-Dec-24	X			
1.3	Entrega de EPP y capacitación del uso de los mismos.	* Todo el personal de la obra debe estar dotado de EPP que correspondan a la actividad que realizan y capacitarlo en el uso adecuado de los mismos.	Al ingreso y durante la ejecución de la obra.	Residente de Obra e interventoría	Planilla de entrega de EPP / Capacitación del uso de los EPP.	5-Dec-24	X			
1.4	Exámenes de ingreso y retiro	Todo el personal de la obra antes de su ingreso se le realizará Examen de ingreso y al retirarse se le realizará Examen de retiro.	Al ingreso y al retiro de la obra.	Residente de Obra e interventoría	Exámenes de ingreso y Exámenes de retiro.	4-Dec-24	X			
1.5	Reporte e investigación de Accidente de trabajo	Reportar el accidente o incidente inmediatamente suceda al jefe inmediato. Investigar la causa real y las condiciones en que se dio. Nota: La ARL solo reconoce los accidentes que se reporten dentro de las 48 horas siguientes.	Al momento de ocurrir un Accidente de trabajo ó Incidente de trabajo.	Residente de Obra e interventoría	Reporte ante la ARL del Accidente de trabajo y Registro de la investigación del accidente sea a la ARL ó propio de la empresa.	30-Dec-24	X			
1.6	Reporte e investigación de Incidente de trabajo								X	
1.7	Demarcación y señalización de áreas de trabajo	Informar a las personas en general y en especial a los usuarios de las áreas existentes. Una adecuada señalización permitirá disminuir el riesgo de accidentes,	Al inicio y durante la ejecución de la obra.	Residente de Obra e interventoría	Capacitación al personal de la obra y Registro fotográfico.				X	
2	**PLAN DE EMERGENCIA**									
2.1	Capacitación plan de emergencia en caso de evacuación.	Todo el personal debe tener conocimiento de cómo actuar al momento de una emergencia en caso de evacuación.	En la inducción al personal	Ingeniero Residente de obra, y de interventoría	Registro de capacitación				X	
2.2	Ocurrencia de un evento	Diligenciar informe de reporte.	Cuando ocurra el evento.	Residente de Obra	Informe con VoBo de interventoría				X	

No.	Variable de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro	VERIFICACIÓN				OBSERVACIONES
						Fecha de inspección:	Registro de verificación			
							C	N/C	N/A	
3	**PELIGRO A CONTROLAR:**	**POLITRAUMATISMO, GOLPES, CONTUSIONES, CAÍDA DE OBJETOS, ACCIDENTES .**								
3.1	Uso de los elementos de protección personal de acuerdo a la actividad.	* Todo el personal de la obra debe portar adecuadamente los EPP de acuerdo a la actividad que realicen. * Realizar capacitación al personal en el uso de los EPP.	Al ingreso del personal y antes del inicio de la actividad y durante la ejecución de la actividad.	Residente de Obra e interventoría	Planilla entrega de dotación de los EPP por trabajador y Registro de capacitación del uso de los EPP.	5/12/2024	X			
3.2	Autocuidado	Capacitación en higiene postural y manejo de cargas	Al ingreso del personal y antes del inicio de la actividad y durante la ejecución de la actividad.	Residente de Obra e interventoría	Registro de capacitación y registro fotográfico.				X	
4	**PELIGRO A CONTROLAR:**	**MATERIAL PARTICULADO EN SUSPENSIÓN DURANTE OPERACIONES (POLVO POR SOLDADURAS, CORTE DE LADRILLO , CORTE CERÁMICA , DEMOLICIÓN, PARTICULAS DE CEMENTO).**								
4.1	Uso obligatorio del tapabocas, y protección visual.	Todo el personal que realice actividades donde se genere dispersión de partículas, debe usar debidamente el tapabocas y la protección visual.	Permanente	Residente de Obra e interventoría	Registro de capacitación del uso de los EPP y Registro fotográfico.				X	
4.2	Riego de agua sobre superficies polvorientas.	Las superficies con exceso de polvo se le debe hacer riego de agua.	Durante la ejecución de la obra.	Residente de Obra e interventoría	Registro fotográfico.				X	
5	**PELIGRO A CONTROLAR:**	**RIESGO DE ACCIDENTE POR ALMACENAMIENTO INADECUADO Y POR FALTA DE ORDEN Y ASEO.**								
5.1	Almacenamiento inadecuado de materiales en la obra	Disponer adecuadamente los materiales en obra.	Durante la ejecución de la obra.	Residente de Obra e interventoría	Capacitación al almacenista sobre el almacenamiento de materiales / Registro fotográfico.				X	
5.2	Orden y aseo en la obra	Mantener limpio y ordenada la obra.	Periódicamente	Residente de Obra e interventoría	Anotación en la bitácora / Registro fotográfico.				X	
6	**PELIGRO A CONTROLAR:**	**RIESGO ERGONÓMICO POR POSTURAS INADECUADAS Y MANEJO DE CARGAS.**								
6.1	Manejo de buenas posturas y manejo de cargas	* Aplicar la información dada en la capacitaciones referentes al manejo adecuado de cargas y las buenas posturas. * Nota: La carga máxima será de 25 kilogramos de carga compacta; para las mujeres, será de 12,5 kilogramos de carga compacta (Resolución 2400 del 22/05 1979 Articulo 392).	Durante la ejecución de la obra.	Residente de Obra e interventoría	Capacitación al personal de obra en el Manejo adecuado de cargas y posturas.				X	
7	**PELIGRO A CONTROLAR:**	**RIESGO DE TRABAJO EN ALTURA.**								
7.1	Trabajo Seguro en Alturas	* Desarrollar un procedimiento seguro para las actividades en altura, teniendo en cuenta los peligros y el análisis de tareas críticas, con el fin de asegurar la integridad física del personal involucrado en este proceso y otras condiciones que puedan verse afectadas (ambientales, bienes y particulares). * Aplicable para todas las actividades que involucren trabajos en alturas, entendiéndose como toda labor o desplazamiento ejecutado a 1,5 m o más sobre un nivel inferior.	Durante la ejecución de la Actividad.	Residente de Obra e interventoría	Capacitación al personal de obra en el Trabajo en alturas, registro fotográfico				X	

No.	Variable de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro	VERIFICACIÓN				OBSERVACIONES
						Fecha de inspección:	Registro de verificación			
							C	N/C	N/A	
7.2	Capacitación y entrenamiento requerido para trabajos en alturas	Todo Trabajador o Supervisor que está expuesto recibirá inducción y debe evidenciar la certificación respectiva de acuerdo a: Operativo nivel avanzado: actividades de alto riesgo . Operativo nivel medio: labores en alturas asegurado con sistemas de tránsito vertical que no implique desplazamientos horizontales en alturas Operativo nivel básico: trabaje en plataformas de acceso a los sitios de baja alturas protegidas por barandas. Adicionalmente se le darán capacitaciones sobre elementos de protección personal para trabajo en alturas	Antes, durante la actividad	Residente de Obra e interventoría	Certificados del personal de obra y Supervisores que se involucren en trabajos en alturas, Asistencia de charlas de trabajo seguro / Registro Fotográfico				**X**	
8	**PELIGRO A CONTROLAR:**	**MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS CON GRADO DE PELIGROSIDAD**								
8.1	Manejo adecuado de sustancias químicas	* Obligatoriedad en uso de los elementos de protección personal requerido * Adecuado rotulado de elementos químicos y almacenamiento de acuerdo a su peligrosidad. * Las fichas de seguridad de las sustancias deben estar publicadas en sitios visibles. * La disposición final de las sustancias peligrosas debe efectuarse de acuerdo lo dispuesto por la Entidad competente. Nota: cuando aplica	Antes, durante y al finalizar el uso de los productos.	Residente de Obra e interventoría o personal calificado	Fichas de seguridad, Registro fotográfico.				X	

No.	Variable de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro	VERIFICACIÓN				OBSERVACIONES
						Fecha de inspección:	Registro de verificación			
							C	N/C	N/A	
	MANEJO AMBIENTAL									
9	**ASPECTO A CONTROLAR:**	**PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS POR LA EXPOSICIÓN AL RUIDO**								
9.1	Criterios de valoración del ruido	Según la legislación colombiana los valores limites permitidos para el ruido dependerán del tiempo de exposición para ruido continuo y del número de impulsos, para ruidos de impacto. Este valor ha sido especificado por el gobierno colombiano, a través de las resoluciones 8321 de 1983 expedida por el Ministerio de Salud y la 1792 de 1990 expedida por los Ministerios de Salud y de Trabajo y Seguridad Social.	Cuando Aplique	Residente de obra/ Interventoría	Reporte de Decibeles				X	
9.2	Normatividad relacionada con los riesgos derivados dela exposición al ruido	*Proteger a los trabajadores contra los riesgos de ruidos. *Reducir al nivel mas bajo, técnica y razonablemente posible. *Evaluar la exposición de los trabajadores * Realizar control medico auditivo (Audiometría). *Proporcionar equipos de protección (tapones auditivos, tapa oídos). *Acondicionar acústicamente los centros de trabajo. *Analizar y desarrollar un programa de medidas técnicas y organizativas en los puestos de trabajo, en los que el nivel diario equivalente sea superior a 90 dB (A) o el nivel pico supere a los 140 dB y señalizar dichos lugares.	*Señalización *Formato de entrega de Elementos de Protección Personal. *Registro de Exámenes médicos	Residente de obra/ Interventoría	Registro fotográfico y Documentos				X	
10	**ASPECTO A CONTROLAR:**	**GENERACIÓN DE AGUAS SERVIDAS.**								
10.1	Disposición adecuada de las aguas que se generen	Aguas Residuales en Zona Urbana: Disponerla adecuadamente en el alcantarillado Municipal. Aguas Residuales en Zona Rural: Si no se cuenta con alcantarillado, enviarlo a un campo de infiltración alejado de cuerpos de agua.	Semanalmente durante la ejecución de la obra.	Residente de obra/ Interventoría	Registro fotográfico.				X	
10.2	Disposición adecuada de las aguas que se generen por el lavado de la herramienta, maquinaria y equipo	Enviarlo a un campo de infiltración alejado de cuerpos de agua, y el sedimento será tratado como escombro.	Cuando aplique	Residente de obra/ Interventoría	Registro fotográfico.				X	
11	**ASPECTO A CONTROLAR:**	**GENERACIÓN DE RESIDUOS COMUNES, RESIDUOS DE COMIDA, EMPAQUES.**								
11.1	Separación de residuos	Realizar separación de residuos generados y disponerlos adecuadamente dentro de recipientes debidamente marcados, identificando el tipo de residuo almacenado en cada uno de ellos.	Permanente	Residente de obra/ Interventoría	Registro fotográfico				X	
11.2	Almacenamiento de residuos	Almacenar temporalmente los residuos generados en un lugar adecuado para ello: señalizado, demarcado, bajo cubierta, sobre estibas y con condiciones adecuadas de ventilación	Cada que se generen	Residente de obra/ Interventoría	Registro fotográfico				X	
11.3	Disposición final	En zona rural, transportarlo a la zona urbana; para su posterior entrega a la empresa de recolección de basuras.	Cada que se generen	Residente de obra/ Interventoría	Registro fotográfico				X	
12	**ASPECTO A CONTROLAR:**	**GENERACIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS.**								
12.1	Separación de residuos especiales y/o peligrosos	Realizar separación de residuos especiales y/o peligrosos y disponerlos adecuadamente en un lugar de la obra identificado y delimitado.	Cada que se generen	Residente de obra/ Interventoría	Registro fotográfico / Hojas de seguridad.				X	
12.2	Almacenamiento de residuos especiales y/o peligrosos	Almacenar temporalmente los residuos generados dentro de un lugar adecuado para ello: señalizado, demarcado, bajo cubierta, sobre estibas.	Cada que se generen	Residente de obra/ Interventoría	Registro fotográfico				X	

No.	Variable de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro	VERIFICACIÓN				OBSERVACIONES
						Fecha de inspección:	Registro de verificación			
							C	N/C	N/A	
12.3	Disposición final	Entrega a la empresa avalada para la recepción de estos residuos.	Cada que se generen	Residente de obra/ Interventoría	Certificado de entrega de residuos expedido por la entidad encargada.				X	
13	**ASPECTO A CONTROLAR:**	**DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE MOVIMIENTO DE TIERRA Ó ESCOMBROS.**								
13.1	Disposición final de residuos y escombros	Cargue: Al momento del cargue del material se debe señalizar el sitio de cargue donde esta el material y la volqueta. Transporte: Al momento de transportarse el material al sitio de la disposición final, la volqueta se cubrirá completamente con una carpa asegurada a la volqueta, para impedir la dispersión del material. Disposición final: Al momento del descargue el material se dispondrá adecuadamente, y si se requiere se apisonará y compactará. Si el material se deposita en un botadero, este debe estar autorizado por la entidad competente del Municipio.	Cada que se deposite material en la escombrera	Ingeniero Residente de obra, y de interventoría	Registro fotográfico y Comprobante de la escombrera, cuando aplique.				**X**	
14	**ASPECTO A CONTROLAR:**	**USO DE AGREGADOS PÉTREOS**								
14.1	Material utilizado	Utilizar material sólo de sitios autorizados.	Antes de iniciar la extracción del material.	Ingeniero Residente de obra, y de interventoría	Licencia ambiental y/o titulo minero de donde se extraen los materiales (Cuando aplique, dependiendo del impacto)				X	
15	**ASPECTO A CONTROLAR:**	**USO DE AGUA**								
15.1	Uso adecuado del agua	Hacer sensibilización del uso adecuado del agua.	En la inducción al personal y durante la ejecución de la obra	Ingeniero Residente de obra, y de interventoría	Registro de capacitación y Registro fotográfico.				X	
16	**ASPECTO A CONTROLAR:**	**EMERGENCIAS POR DERRAME DE SUSTANCIAS QUIMICAS**								
16.1	Capacitación plan de emergencia en caso de derrame sustancia química.	Todo el personal debe tener conocimiento de cómo actuar al momento de una emergencia en caso de derrame sustancia química.	Cuando aplica (En las inducciones de personal)	Ingeniero Residente de obra, y de interventoría	Registro de capacitación				X	
17	**ASPECTO A CONTROLAR:**	**GENERACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS POR COMBUSTIÓN DE MOTORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO**								
17.1	Mantenimiento de maquinaria y equipo	Que los equipos trabajen de manera aceptable y cuente con los registros de mantenimiento periódicos según su uso	Cada que se requiera	Residente de obra/ Interventoría	Anotación en la bitácora				X	

Anexo *(Informes mensuales HSEQ con sus respectivos anexos al informe solicitados en el formato MPA-01-F28 Versión 2). Para las actividades realizadas por el coordinador de HSEQ de Interventoría; la revisión y aprobación de las actividades e inspecciones realizadas por el contratista de obra.*

INFORME SST

UNIÓN TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CMA412

Del 25 de noviembre de 2024

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

INFORME PARCIAL No. 1 DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE INTERVENTORIA

(05 DE DICIEMBRE DE 2024 – 30 DE DCIEMBRE DE 2024)

INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL UNIÓN TEMPORALINTERRESERVORIOS NORTE

CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024

CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

DICIEMBRE 2024

316 4476533
utinterreservoriosnorte@gmail.com
CALLE 11 #15-59 APTO. 501 EDIFICIO CATALUÑA
BRR. SAN AGUSTÍN, OCAÑA

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 3
2. OBJETIVO 3
2.1 OBJETIVO GENERAL 3
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 3
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
4. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA A DESARROLLAR 6
5. SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 7
5.1 Relación de personal 7
5.2 Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo 8
5.3 Capacitaciones 8
5.4 Entrega de elementos de protección personal y Dotación 8
5.5 Aportes a Seguridad Social 8
5.6 Accidentes e Incidentes de Trabajo 8
5.7 Inspecciones a sitios de trabajo 8
5.8 Evidencia inducción del personal y socialización de la política de seguridad y salud en el trabajo 9
5.9 Informe de las Condiciones de Salud (Exámenes Médicos laborales) 9
5.10 Soportes de afiliación y pago de aportes de los trabajadores al sistema general de seguridad social (EPS-ARL- AFP). 9
5.11 Registro Fotográfico 9
5.12 CONCLUSIONES 10
5.13 RECOMENDACIONES 11
5.14 ANEXO 11

1. INTRODUCCION

El presente documento elaborado por UNION TEMPORAL UNIÓN TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE, contiene el INFORME No.1 DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, correspondiente al periodo del 05 de diciembre al 30 de diciembre de 2024, el cual muestra de manera resumida las diferentes actividades realizadas como parte del Contrato de Interventoría No CMA412 del 25/11/2024, cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**, de acuerdo con el seguimiento técnico, con el fin de supervisar y apoyar el acompañamiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, verificando el desarrollo de los objetivos propuestos en lo contractual.

2. OBJETIVO

2.1 OBJETIVO GENERAL

Verificar el cumplimento e Implementación del sistema de gestión y seguridad en el trabajo, en los diferentes periodos de ejecución de las actividades del contrato de obra No. LIC401-2024 del 24 de noviembre de 2024 de acuerdo al plan de trabajo presentado por el contratista para el desarrollo del proyecto en el componente seguridad y salud en el trabajo.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Garantizar que el proyecto se desarrolle con altos estándares de seguridad, mediante la identificación de peligros y control de los riesgos de las diferentes actividades, así como la implementación de las políticas de seguridad y salud en el trabajo que permitan asegurar la salud y seguridad de los habitantes del área de influencia directa e indirecta del proyecto.

- Asegurar que se proporcionen los recursos técnicos, humanos, tecnológicos y financieros necesarios para hacer una gestión permanente de los riesgos prioritarios del proyecto.

- Verificar que se dé cumplimiento a la normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales de acuerdo con la naturaleza y alcance del contrato, así como de los requisitos establecidos en pliegos contractuales.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto contempla la construcción de SETENTA (70) Reservorios en la zona rural dispersa de los municipios de Mutiscua, Silos, Cucutilla, Arboledas, Durania, Salazar y San Cayetano, como un proyecto orientado a mantener un volumen de agua que supla requerimientos de riego y abrevadero de animales en periodos de déficit de lluvias, ayudando a reducir el uso intensivo de aguas superficiales y subterráneas, a la vez que facilita el aumento de producción agropecuaria.

No	MUNICIPIO	CUENCA	No DE RESERVORIOS
1	Santo Domingo de Silos	Zulia	9
2	Mutiscua		13
3	Cucutilla		9
4	Arboledas		9
5	Salazar de las Palmas		9
6	Durania		12
7	San Cayetano		9
Total Reservorios			**70**

El municipio de Santo Domingo de Silos se encuentra localizado a 123 km de Cúcuta, con temperatura promedio mensual anual corresponde a 12,1 ºC y a una altura de 2.845 metros sobre el nivel del mar, siendo el municipio más alto del Norte de Santander. Gran parte del municipio forma parte del Páramo de Santurbán, fuente hídrica para Santander y Norte de Santander. Una característica sobresaliente de su posición geográfica es la ubicación en el llamado Nudo de Santurbán sobre la cordillera Oriental, lo que le permite poseer una gran extensión de páramos y una oferta hídrica que confluye a las cuencas del Zulia y Orinoco.

El municipio de Mutiscua se encuentra ubicado en la subregión suroccidental del departamento Norte de Santander. Su cabecera municipal dista de la capital del departamento en 102 Km, y a 25 Km del municipio de Pamplona, presenta una altitud promedio de 2.650 msnm y su temperatura es de 14 °C.

El Municipio de Arboledas está ubicado sub-región centro, en las estribaciones de la Cordillera Oriental y perteneciente a los pueblos de occidente del departamento. Se caracteriza por el relieve quebrado con una topografía montañosa que es fuente de múltiples nacientes de agua que dan origen a una considerable cantidad de quebradas que luego conforman el Río Arboledas, afluente del Río Zulia. Posee una temperatura media de 22 °C, una altura sobre el nivel del mar de 946 metros, y se localiza a 82 km de la capital del departamento. Este Municipio está conformado por una cabecera municipal y 5 corregimientos: Castro, Barrientos, Villa sucre, Cinera y El Uvito.

El municipio de Cucutilla se encuentra ubicado en la Provincia Centro del Departamento Norte De Santander. Se destaca su área territorial por poseer extensas zonas de Páramo y Bosque donde se conforman los ríos Zulasquilla y Cucutilla, nacimiento del río Zulia y una amplia zona de Bosque Natural Primario denominada Sisavita. Presenta una temperatura media de 22 °C, y se haya a una distancia de 101 kilómetros de la capital de departamento.


El municipio de Durania se encuentra ubicado en la zona central del departamento Norte de Santander, en la provincia de Ricaurte. De relieve montañoso, se encuentra enclavado en la cordillera oriental. Su cabecera municipal dista de la ciudad de Cúcuta en 47 kilómetros, por carretera pavimentada. Cúcuta, tiene una vía que comunica con al corregimiento de Villa Sucre Municipio de Arboledas. Cuenta con una temperatura promedio 22 °C. El área urbana del municipio de Durania está ubicada a una altura de 950 metros sobre el nivel del mar, con una precipitación promedio anual de 1.300 mm, la distribución de las lluvias es bimodal.

El municipio de Salazar de Las Palmas está compuesto por la Cabecera Municipal, tres (3) Centros Suburbanos y cuarenta y nueve veredas (49) La Cabecera Municipal se encuentra con relación a la Capital del Departamento a una distancia por carretera de 51 Kilómetros, transitando por los Municipios de El Zulia, San Cayetano y Santiago. Se encuentra ubicado en la región central del departamento de Norte de Santander. Su población es de 8964 habitantes a una altitud de 815 metros sobre el nivel del mar y cuenta con una extensión de 480,00 km². Su distribución geográfica es esencialmente montañosa y enclavada en la Cordillera Oriental

El municipio de San Cayetano está situado en la subregión oriental del Departamento de Norte de Santander, perteneciendo al Área Metropolitana de Cúcuta y en la zona de influencia con la República de Venezuela. La altitud media es de 235 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio 28 °C y su distancia a Cúcuta es de 18 km.

La siguiente figura presenta la localización del proyecto.

Imagen 1. Localización de los municipios en el departamento de Norte de Santander.

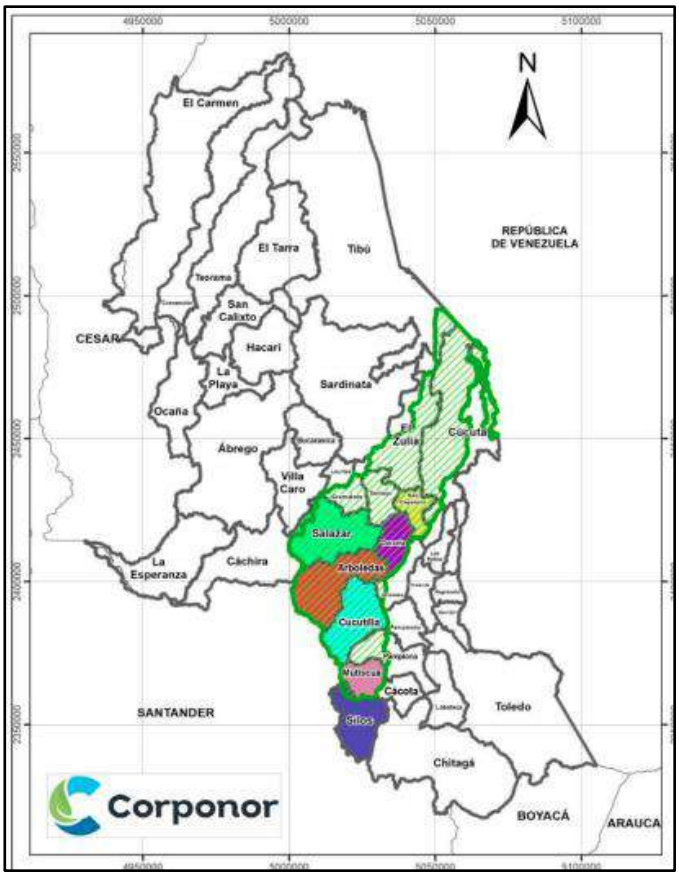

4. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA A DESARROLLAR

CORPONOR implementa un proyecto de construcción de reservorios como estrategia para almacenar agua destinada al uso agropecuario, ayudando a mitigar la escasez hídrica en períodos de déficit de lluvias. Estas estructuras captan agua de la escorrentía superficial y proporcionan un recurso esencial para el riego agrícola y el abrevadero de animales, especialmente en zonas rurales afectadas por la disminución de lluvias y la reducción de los acuíferos. El proyecto busca garantizar la sostenibilidad de las actividades agrícolas y pecuarias frente a las limitaciones climáticas y de fuentes hídricas.

Algunos beneficios identificados con el proyecto son:

- Contar con un elemento estructural que permita almacenar agua de escorrentía para uso múltiple.
- Realizar un uso eficiente y ahorro del agua.
- Mantener reserva de agua para enfrentar periodos de déficit de lluvias.

- Disponibilidad de agua para uso en riego, abrevadero de animales y piscicultura.

5. SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

A continuación, se presenta el seguimiento, verificación y control realizado por la interventoría UNIÓN TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE, a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que viene realizando UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024, en cumplimiento al contrato “CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER”.

Actividades realizadas durante el presente periodo: 05 de diciembre al 30 de diciembre de 2024.

- Inducción de personal
- Entrega de elementos de protección personal
- Exámenes médicos de ingreso
- Proceso de Afiliación
- Inspecciones a sitios de trabajo
- Elección Vigía
- Reporte de Incidentes-accidentes de trabajo y/o enfermedad laboral.

5.1 Relación de personal

Personal Directo

No.	NOMBRE APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO
1	JESUS VARGAS RODRIGUEZ	88.211.813	DIRECTOR DE OBRA	5/12/2024	
2	DIANA AVELLA VILLAMIZAR	60.486.600	RESIDENTE DE OBRA	5/12/2024	
3	LIBARDO CUADROS CUBILLA	1.094.348.026	OBRERO	5/12/2024	

5.2 Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo

El contratista hace entrega del nombramiento del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada el día 20/12/2024 para dar cumplimiento con la resolución 2013 del 1986 del ministerio del trabajo y seguridad social. Ver anexo No. 13. informe del contratista.

5.3 Capacitaciones

Durante este periodo, se evidencia mediante formato de asistencia que el contratista realizó capacitaciones al personal asociado al proyecto. Ver anexo 4. informe del contratista.

No	CAPACITACIONES	FECHA
1	Inducción de SG-SST	05/12/2024
2	Uso de elementos de EPP-Autocuidado	05/12/2024

5.4 Entrega de elementos de protección personal y Dotación

El contratista realiza evidencia escrita y fotográfica de la entrega de los elementos de protección personal y dotación del personal al personal asociado al proyecto. Anexo 3. Informe del contratista.

5.5 Aportes a Seguridad Social

Se presentan planillas de pago de aportes al Sistema integral de Seguridad social del mes de diciembre del 2024 de la UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024. Ver Anexo 12. informe del contratista.

5.6 Accidentes e Incidentes de Trabajo

El contratista hace entrega certificado de accidentalidad expedido por la ARL SURA, donde se demuestra que el número de accidentes de trabajo fueron 0 durante el periodo del siguiente informe. Ver anexo No.10. Informe del contratista.

5.7 Inspecciones a sitios de trabajo

Durante el periodo, el personal encargado ejecuta actividades de inspección de acuerdo con el plan de trabajo. Ver Anexo 5 informe del contratista.

5.8 Evidencia inducción del personal y socialización de la política de seguridad y salud en el trabajo

El contratista hace entrega de la evidencia de la realización de las inducciones y evaluación de las inducciones del personal ante los temas de seguridad y salud en el trabajo del personal. Anexo No. 4. Informe del contratista.

5.9 Informe de las Condiciones de Salud (Exámenes Médicos laborales)

El contratista realiza los exámenes médicos de ingreso en convenio con las IPS MEDCARE DE COLOMBIA S.A.S Y SALUD EMPRESARIAL, y estos adicionales

son socializados a cada uno de los empleados con el fin de notificar su estado de salud actual al momento de ingreso a la empresa. Anexo No.8 y 9. Informe del contratista.

5.10 Soportes de afiliación y pago de aportes de los trabajadores al sistema general de seguridad social (EPS-ARL- AFP).

El contratista realiza la entrega de los soportes de las afiliaciones a salud, pensión, riesgos labores y caja de compensación familiar del personal directo e indirecto asociado al proyecto. Además, hace entrega de la planilla de pago de la seguridad social, del personal de obra para el periodo pensión (2024-12) salud (2025-01). Ver anexo planilla seguridad social en el informe de contratista.

No.	NOMBRE /APELLIDOS	CEDULA	SALUD	PENSIÓN	ARL
1	JESUS VARGAS RODRIGUEZ	88.211.813	Sanitas	Porvenir	Sura
2	DIANA AVELLA VILLAMIZAR	60.486.600	Sanitas	Porvenir	Sura
3	LIBARDO CUADROS CUBILLA	1.094.348.026	Nueva EPS	Porvenir	Sura

5.11 Registro Fotográfico

La contratista anexa en su informe el registro fotográfico de las actividades realizadas durante el periodo relacionado. Interventoría realiza inspecciones a las áreas de trabajo verificando el cumplimiento del componente de seguridad y salud en el trabajo.

INSPECCIONES A SITIOS DE TRABAJO Y SOCIALIZACIONES MUNICIPIOS	
	
VEEDURÍA SAN CAYETANO	SOCIALIZACIÓN MUTISCUA
	
Visita Beneficiario Henry Moncada, Vereda: santa Elena, municipio Durania	Visita Beneficiaria Nidia Caicedo, vereda sepulturas, municipio Durania
	
Socializacion Municipio de Silos	Visitas municipios de Cucutilla y Arboledas

5.12 CONCLUSIONES

Tras la revisión de la documentación presentada y la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la interventoría valida y aprueba el Informe No. 1 presentado por UNION TEMPORAL RESERVORIO 2024. Este informe cumple a cabalidad con los requisitos establecidos en el componente de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

5.13 RECOMENDACIONES

Dar cumplimiento a los requisitos de implementación del SGSST, de acuerdo con a la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.

5.14 ANEXO

ANEXO A. Informe mensual N°1 de salud y seguridad en el trabajo de obra.

Atentamente,

Sin otro particular, Cordialmente,



JANIT TORCOROMA ORTIZ CARRASCAL
Esp. en seguridad y Salud en el Trabajo

ANEXO A.
INFORME MENSUAL N°1 DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE OBRA.

316 4476533
utinterreservoriosnorte@gmail.com
CALLE 11 #15-59 APTO. 501 EDIFICIO CATALUÑA
BRR. SAN AGUSTÍN, OCAÑA

CONTRATO No Y FECHA	LIC401-2024 del 24 de noviembre de 2024	
TIPO DE CONTRATO	OBRA	
SEMANA No:	1 a 4	
FECHA DEL INFORME	DESDE: 05 de diciembre de 2024	HASTA: 30 de diciembre de 2024
FECHA DE ENTREGA DEL INFORMA	30 de diciembre de 2024	
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024 R/L Zurisaday Pradilla Atuesta	
SUPERVISOR CORPONOR	JAVIER ALEXIS BECERRA ALBARRACIN	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Desde el área de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa y en cumplimiento del decreto 1072 de 2015 – Decreto único del sector Trabajo y Resolución 0312 de 2019. Estándares mínimos del SG-SST, UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024, ha realizado las siguientes actividades:

1. INDUCCIÓN DE PERSONAL

En el proceso de inducción de personal el responsable de SG-SST, de la Unión Temporal capacita al personal en las siguientes temáticas:

- Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo
- Socialización de Políticas
  - Política SST
  - Política de Prevención Alcoholismo, Sustancias Psicoactivas y Tabaquismo
  - Política Prevención de acoso laboral
- Socialización de reglamentos
  - Reglamento interno de trabajo
  - Reglamento de higiene y seguridad industrial

- Socialización de Perfiles ocupacionales y responsabilidades generales ante el SG-SST

- Socialización de Funcionamiento del Vigía de S.S.T. y/o COPASST – y convivencia laboral

- Socialización de Metodología de Identificación de peligros y valoración de riesgos GTC-45 y se realiza actividad taller de identificación de peligros y valoración de riesgos, donde se explican cada uno de los riesgos y peligros contemplados en la GTC-45 para determinar los asociados a la labor a desempeñar, según cada cargo.

- Socialización de procedimiento Reportes incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laborales, donde se determinan las responsabilidades tanto de la Unión Temporal como de cada uno de los empleados, se recalca la importancia del reporte oportuno

- Importancia y obligación del uso de Elementos de protección personal – E.P.P.

- Socialización de procedimiento de inspección y se explica la importancia de inspeccionar los sitios de trabajo con el fin de identificar posibles causas de accidentalidad y eliminarlas, o reportar al jefe inmediato para realizar intervención

2. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y ATENCION DE EMERGENCIAS

- Se realiza la entrega de los EPP y dotación correspondiente tales como: Camisa, pantalón, botas, casco y guantes.

- Entrega de botiquín personal para atención de emergencias

3. EXAMENES MEDICOS DE INGRESO

Se realizan los exámenes médicos de ingreso en convenio con las **IPS MEDCARE DE COLOMBIA S.A.S Y SALUD EMPRESARIAL** y estos adicionales son socializados a cada uno de los empleados con el fin de notificar su estado de salud actual al momento de ingreso a la empresa donde se tienen en cuenta.

- Recomendaciones medicas
- Restricciones medicas
- Seguimientos médicos
- Necesidad de incluir en un PVE

Se les hace entrega de la copia del resultado de exámenes médicos con el fin de que el empleado cuente con soporte documental de su estado de salud.

4. PROCESOS DE AFILIACION

Desde el área administrativa se realizan las respectivas afiliaciones a los diferentes subsistemas de salud, se dejan evidencias soporte del proceso de afiliación y se anexa en hoja de vida, las evidencias son:

- Afiliación a ARL - Sura
- Afiliación a EPS - Depende de cada EPS del empleado
- Afiliación a CCF - EL personal se afilia a COMFANORTE
- Afiliación a AFP - Depende de cada AFP del empleado

5. PLAN DE FORMACION

El área de seguridad y salud en el trabajo realizara actividades de medicina preventiva en formación para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedad laboral:

- Uso de los EPP
- Inducción de SG-SST.

6. INSPECCIONES EN SITIOS DE TRABAJO

Se realizaron visitas de inspección a beneficiarios para monitoreo de avances del proyecto, con el fin de validar:

- Uso de los EPP
- Control de avances
- Capacitaciones a personal en puntos de trabajo (charlas)

7. NOMBRAMIENTO DEL VIGIA Y CCL

El día 05 de diciembre de 2024 el responsable del SG-SST cita al personal de la unión temporal por solicitud de gerencia designando como líder a **DIANA PATRICIA AVELLA** identificado con C.C 60.488.600 de Cúcuta quien a partir de la fecha realizará las siguientes funciones:

- Participar de las actividades de promoción, divulgación e información, sobre seguridad y salud en el trabajo entre empleadores y trabajadores, para obtener su participación en el desarrollo de los programas y actividades del SG-SST;
- Actuar como instrumento de vigilancia para el cumplimiento del SG-SST en los lugares de trabajo de la empresa e informar sobre el estado de ejecución de los mismos a las autoridades de seguridad y salud en el trabajo cuando haya deficiencias en su desarrollo;

- Recibir copias, por derecho propio, de las conclusiones sobre inspecciones e investigaciones que realicen las autoridades de seguridad y salud en el trabajo en los sitios de trabajo.
- Proponer a la administración de la empresa o establecimiento de trabajo la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo.
- Proponer y participar en actividades de capacitación en seguridad y salud en los trabajos dirigidos a trabajadores, supervisores y directivos de la empresa
- Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de seguridad y salud en el trabajo en las actividades que éstos adelanten en la empresa y recibir por derecho propio los informes correspondientes.
- Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de seguridad y salud en el trabajo debe realizar la empresa de acuerdo con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes; promover su divulgación y observancia.
- Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y proponer al empleador las medidas correctivas que haya lugar para evitar su ocurrencia. Evaluar los programas que se hayan realizado.
- Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de trabajadores e informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control.
- Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores en la solución de los problemas relativos a la seguridad y salud en el trabajo. Tramitar los reclamos de los trabajadores relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
- Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y enfermedades laborales con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en la Resolución 2013 de 1986.
- Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se desarrollen el cual estará en cualquier momento a disposición del empleador, los trabajadores y las autoridades competentes.
- Las demás funciones que le señalen las normas sobre seguridad y salud en el trabajo.

Quien además la persona anteriormente mencionada además de la función como vigía, realizará las funciones como miembro principal del comité de convivencia laboral.

Teniendo en cuenta que si se realizan procesos de contratación que aumenten la cantidad de empleados de 10 en adelante se realizará proceso de elección para definir miembros designados y miembros elegidos por votación para que hagan parte tanto del comité de convivencia laboral como del COPASST

8. REPORTE DE INCIDENTES - ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O ENFERMEDAD LABORAL

En fecha de levantamiento y corte del presente informe del 05 de diciembre del 2024 al 30 de diciembre de 2024, no se evidencian reportes de incidentes y/o accidentes reportados por el personal activo laboralmente.

ZURISADAY PRADILLA ATUESTA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA
1.	Matriz de riesgo de la obra (Formato propio de la unión temporal o consorcio).		X
2.	Plan de manejo ambiental (Formato propio de la unión temporal o consorcio).		X
3.	Plan de señalización (Formato propio de la unión temporal o consorcio).		X
4.	Plan de emergencia (Formato propio de la unión temporal o consorcio).		X
5.	Novedades de personal de obra (Ver anexo 1).	SI	
6.	Empleos generados de obra (Ver anexo).	SI	
7.	Constancia de entrega de dotación en obras públicas (Ver anexo).	SI	
8.	Capacitación o charla en obras públicas (Ver anexo).	SI	
9.	Formato Inspección de botiquín y camilla en obras públicas (Ver anexo 5).		X
10.	Formato inspección de extintores en obras públicas (Ver anexo 6).		X
11.	Formato inspección de vehículos en obras públicas (Ver anexo 7).		X
12.	Formato inspección de volquetas en obras públicas (Ver anexo 8).		X
13.	Formato inspección de maquinaria pesada y equipos ligeros en obras públicas (ver anexo 9).		X
14.	Formato señalización en obras públicas (ver anexo 10).		X

Nota: los formatos se entregan mensualmente adjuntos a los informes mensuales de obra

REGISTRO FOTOGRAFICO

	
FOTO No.1: Entrega de EPP	FOTO No. 2: Trabajo en terreno

ANEXOS

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

ANEXO N° 1. NOVEDADES

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

Corponor

ANEXO 1. NOVEDADES DE PERSONAL DE OBRA

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.:LIC401-2024 del 24 de noviembre de 2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: CMA412 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA DE OBRA: UNIÓN TEMPORAL RESERVORIOS 2024	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: UNIÓN TEMPORALINTERRESERVORIOS NORTE

CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

MES No.	1	DESDE:	5/12/2024
		HASTA:	30/12/2024

No.	NOMBRE	APELLIDO	C.C.	NOVEDAD			Nº DIAS LABORADOS	DIRECTO	INDIRECTO	SALUD	ARL	PENSIÓN
				ING	RET	INC						
1	Zurisaday	Pradilla	1093785015	X			30		X	Nueva EPS	Sura	Porvenir
2	Jesus	Vergel	88 211 813	X			30	X		Sanitas	Sura	Porvenir
3	Diana	Avella	60.488.600	X			30	X		Sanitas	Sura	Porvenir
4	Libardo	Cuadros	1094348076	X			30	X		Nueva EPS	Sura	Porvenir

Zurisaday Pradilla

ZURISADAY PRADILLA ATUESTA

REPRESENTANTE LEGAL

UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024

ANEXO N° 2. EMPLEOS GENERADOS

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

Corponor

ANEXO 2. EMPLEOS GENERADOS DE OBRA

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.:LIC401-2024 del 24 de noviembre de 2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: CMA412 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: UNIÓN TEMPORALINTERRESERVORIOS NORTE

CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

MES No.	1	DESDE:	5/12/2024
		HASTA:	30/12/2024

No.	CARGO	DIRECTOS	INDIRECTOS
1	REPRESENTANTE LEGAL		1
2	DIRECTOR DE OBRA	1	
3	RESIDENTE DE OBRA	1	
4	OBRERO	1	
	TOTAL	3	1


ZURISADAY PRADILLA

REPRESENTANTE LEGAL

UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024

ANEXO N° 3. ENTREGA DE DOTACIÓN

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

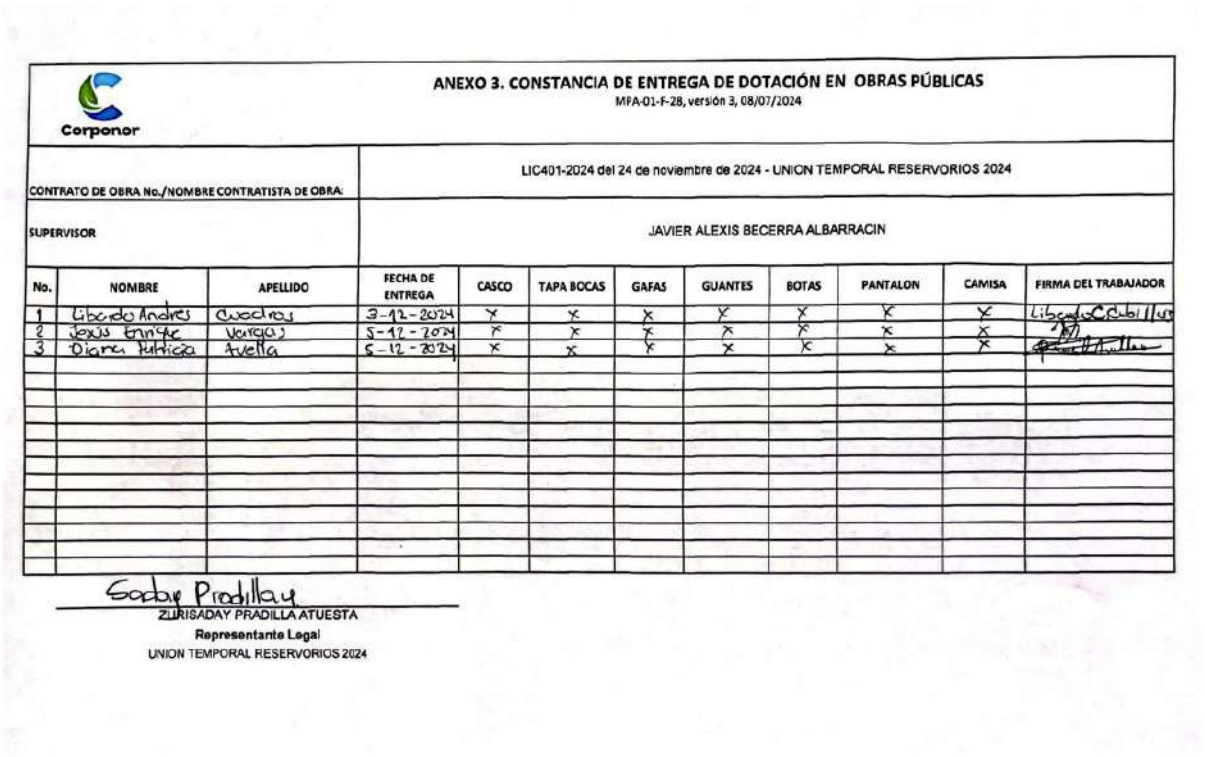

ANEXO 3. CONSTANCIA DE ENTREGA DE DOTACIÓN EN OBRAS PÚBLICAS
MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No./NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	LIC401-2024 del 24 de noviembre de 2024 - UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024
SUPERVISOR	JAVIER ALEXIS BECERRA ALBARRACIN

No.	NOMBRE	APELLIDO	FECHA DE ENTREGA	CASCO	TAPA BOCAS	GAFAS	GUANTES	BOTAS	PANTALON	CAMISA	FIRMA DEL TRABAJADOR
1	Libardo Andres	Cuadros	3-12-2024	X	X	X	X	X	X	X	
2	Jesus Enrique	Noriega	5-12-2024	X	X	X	X	X	X	X	
3	Diana Patricia	Avella	5-12-2024	X	X	X	X	X	X	X	

ZURISADAY PRADILLA ATUESTA
Representante Legal
UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024

ANEXO N° 4. CAPACITACIÓN O CHARLA EN OBRAS PÚBLICAS

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

ANEXO 4. CAPACITACIÓN O CHARLAS EN OBRAS PUBLICAS

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No./NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	LIC401-2024 del 24 de noviembre de 2024 - UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024
SUPERVISOR	JAVIER ALEXIS BECERRA ALBARRACIN
OBJETO DE LA CAPACITACIÓN	Induccion al SG-SST
FECHA DE REALIZACIÓN:	05-12-2024

No.	Nombre	Apellido	Cédula	Firma
1	Libardo Andres	Cuadros	1.04.348.08	
2	Jexis Enrique	Vargas	88. 211. 61	
3	Diana Patricia	Avella	60. 448. 60	

Sabay Pradilla y

ZURISADAY PRADILLA ATUESTA
Representante Legal
UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024

Corponor

ANEXO 4. CAPACITACIÓN O CHARLAS EN OBRAS PUBLICAS

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No./NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	LIC401-2024 del 24 de noviembre de 2024 - UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024
SUPERVISOR	JAVIER ALEXIS BECERRA ALBARRACIN
OBJETO DE LA CAPACITACIÓN	Uso de los EPP
FECHA DE REALIZACIÓN:	05-12-2024

No.	Nombre	Apellido	Cédula	Firma
1	Libardo Andres	Cuadros	1064848026	
2	Jesus Enrique	Vargas	88 211 813	
3	Diana Patricia	Avella	60 448600	

Soplay Pradilla

ZURISADAY PRADILLA ATUESTA
Representante Legal
UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024

ANEXO N° 5.
AFILIACIONES A LA ARL

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

ARL | sura

Medellín, 06 de December de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL NORTE DE SANTANDER		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C60448600	AVELLA VILLAMIZAR DIANA PATRICIA	07/12/2024		1925129q	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 06/12/2024 16:51:56 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.32.118.102, 192.230.104.12, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



ARL | sura

Medellín, 02 de December de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL NORTE DE SANTANDER			Clase: 5		Porcentaje Cotización	6.96 %
C1094348026	CUADROS CUBILLAS LIBARDO ANDRES	03/12/2024		I1584015	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 02/12/2024 08:02:00 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.32.118.102, 192.230.104.12, 172.16.42.57

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

ARL | sura

Medellín, 06 de December de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL NORTE DE SANTANDER		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C88211813	VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE	07/12/2024		181231f2	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos


Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 06/12/2024 16:50:32 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.32.118.102, 192.230.104.12, 172.16.42.57

ANEXO N° 6.
AFILIACIONES A LA EPS

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

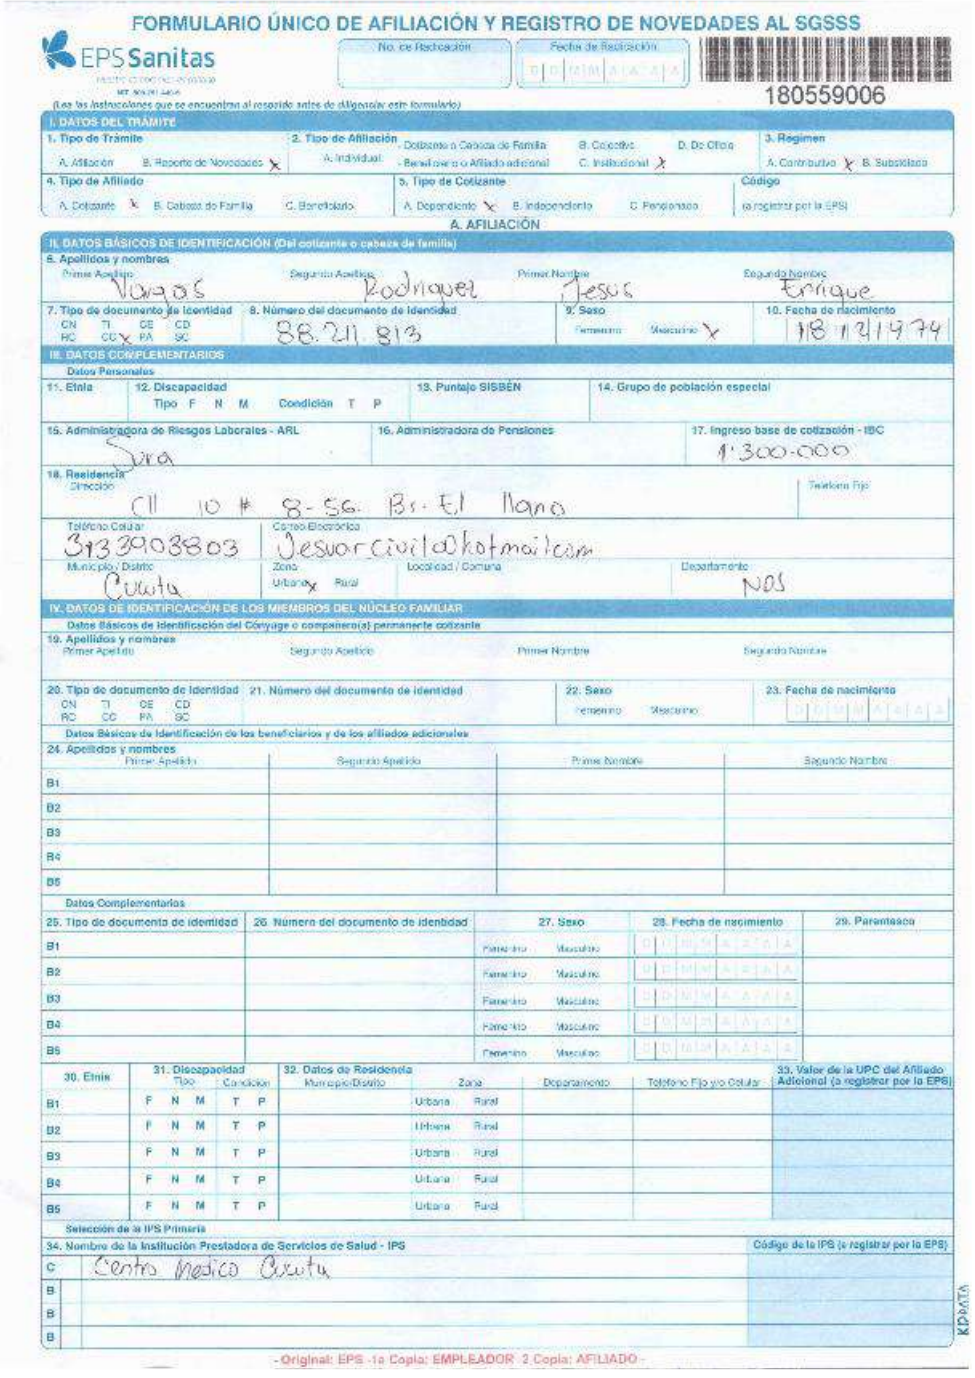

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

EPS Sanitas

No. de Radicación

Fecha de Radicación

180559006

(Lea las instrucciones que se encuentran al respaldo antes de diligenciar este formulario)

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación; B. Reporte de Novedades X
2. Tipo de Afiliación: A. Individual; Cotizante o Cabeza de Familia; Beneficiario o Afiliado adicional; B. Colectivo; C. Institucional X; D. De Oficio
3. Régimen: A. Contributivo X; B. Subsidiado
4. Tipo de Afiliado: A. Cotizante X; B. Cabeza de Familia; C. Beneficiario
5. Tipo de Cotizante: A. Dependiente X; B. Independiente; C. Pensionado
Código (a registrar por la EPS)

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (Del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres
Primer Apellido: Vargas | Segundo Apellido: Rodriguez | Primer Nombre: Jesus | Segundo Nombre: Enrique
7. Tipo de documento de identidad: CN, TI, CE, CD, RC, CC X, PA, SC
8. Número del documento de identidad: 88.211.813
9. Sexo: Femenino, Masculino X
10. Fecha de nacimiento: 18/12/1974

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos Personales

11. Etnia
12. Discapacidad: Tipo F N M; Condición T P
13. Puntaje SISBÉN
14. Grupo de población especial
15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL: Sura
16. Administradora de Pensiones
17. Ingreso base de cotización - IBC: 1'300.000
18. Residencia
Dirección: Cll 10 # 8-56 Bs. El Llano
Teléfono Fijo
Teléfono Celular: 3133908803
Correo Electrónico: Jesvarcivil@hotmail.com
Municipio / Distrito: Cucuta
Zona: Urbana X, Rural
Localidad / Comuna
Departamento: NDS

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos Básicos de identificación del Cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres
Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre
20. Tipo de documento de identidad: CN, TI, CE, CD, RC, CC, PA, SC
21. Número del documento de identidad
22. Sexo: Femenino, Masculino
23. Fecha de nacimiento

Datos Básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres

	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

Datos Complementarios

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo	28. Fecha de nacimiento	29. Parentesco
B1			Femenino Masculino		
B2			Femenino Masculino		
B3			Femenino Masculino		
B4			Femenino Masculino		
B5			Femenino Masculino		

	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F N M; Condición T P	32. Datos de Residencia Municipio/Distrito	Zona	Departamento	Teléfono Fijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del Afiliado Adicional (a registrar por la EPS)
B1		F N M T P		Urbana Rural			
B2		F N M T P		Urbana Rural			
B3		F N M T P		Urbana Rural			
B4		F N M T P		Urbana Rural			
B5		F N M T P		Urbana Rural			


Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C	Centro Medico Cucuta	
B		
B		
B		

KDATA

- Original: EPS -1a Copia: EMPLEADOR 2 Copia: AFILIADO -

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

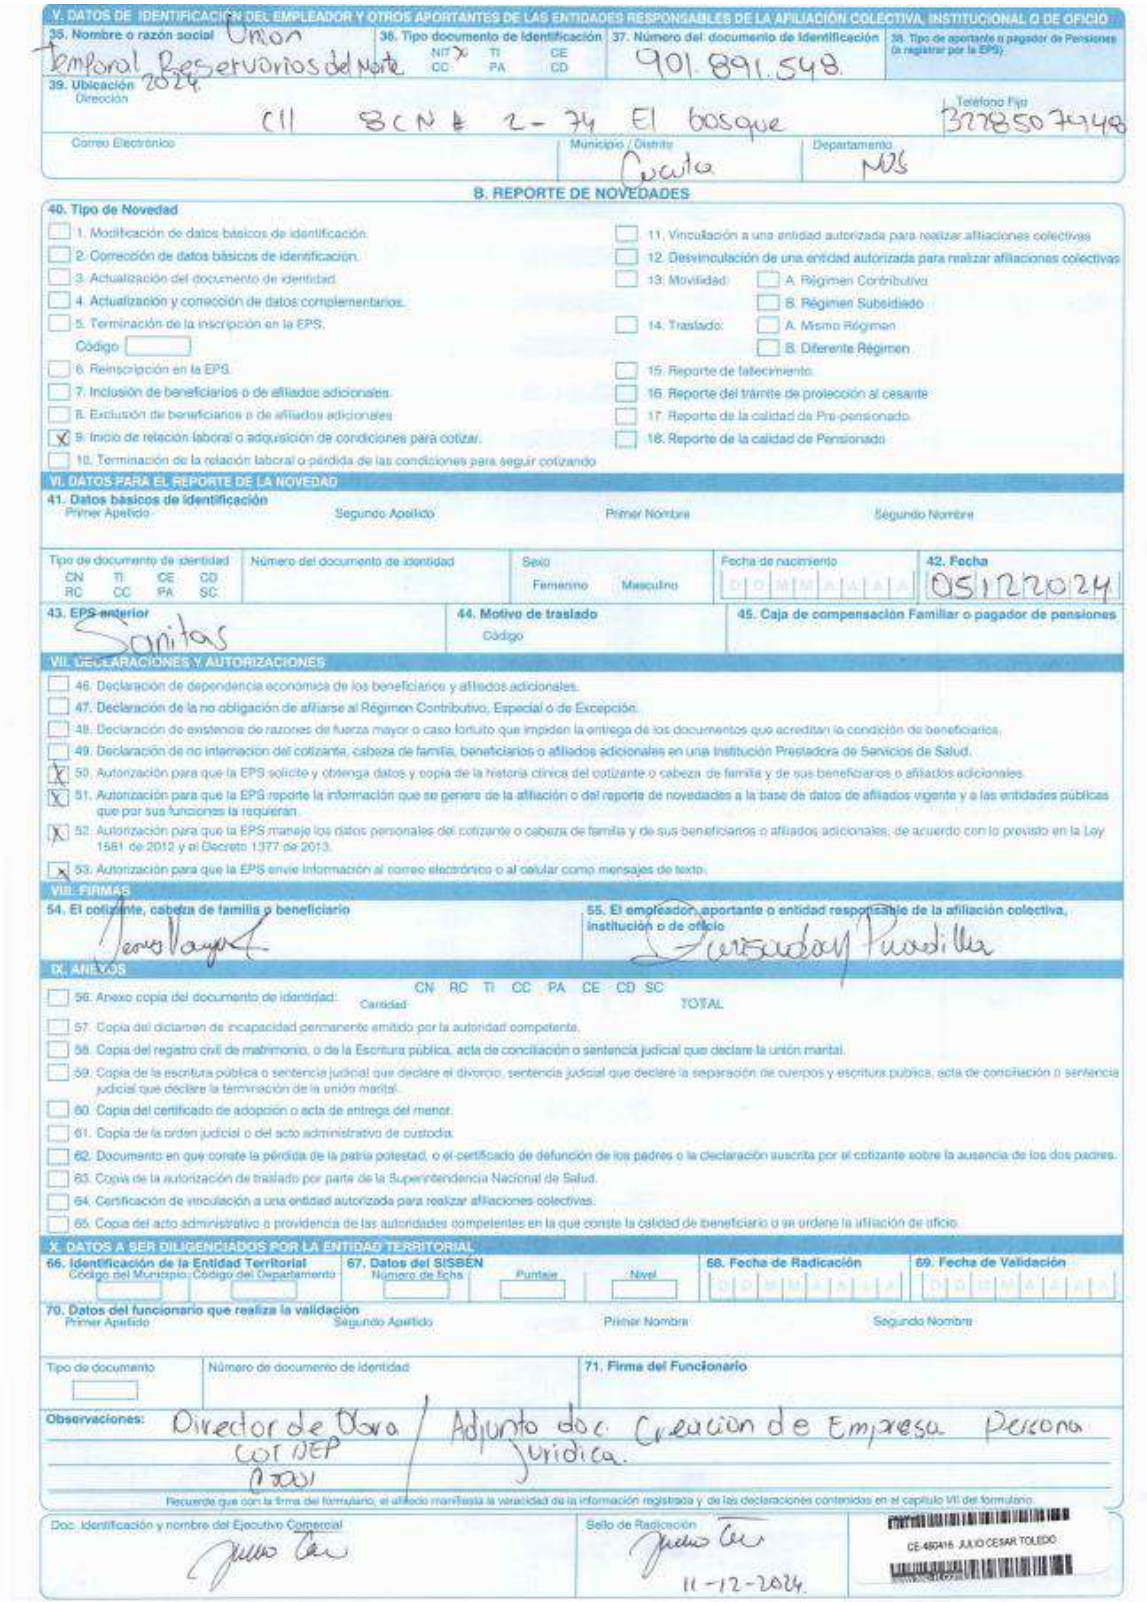

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social: Unión Temporal Reservorios del Norte 2024
36. Tipo documento de Identificación: NIT X | TI | CE | CC | PA | CD
37. Número del documento de Identificación: 901.891.548
38. Tipo de aportante o pagador de Pensiones (a registrar por la EPS):
39. Ubicación — Dirección: Cll 8CN # 2-74 El bosque — Teléfono Fijo: 3278507448
Correo Electrónico — Municipio / Distrito: Cucuta — Departamento: NDS

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad
- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [X] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación — Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad: CN RC TI CC CE PA CD SC | Número del documento de identidad | Sexo: Femenino Masculino | Fecha de nacimiento | 42. Fecha: 05/12/2024

43. EPS anterior: Sanitas | 44. Motivo de traslado — Código | 45. Caja de compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no información del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [X] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [X] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [X] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [X] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario

55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institución o de oficio

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CN RC TI CC PA CE CD SC — Cantidad — TOTAL
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial — Código del Municipio | Código del Departamento
67. Datos del SISBEN — Número de ficha | Puntaje | Nivel
68. Fecha de Radicación
69. Fecha de Validación

70. Datos del funcionario que realiza la validación — Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre

Tipo de documento | Número de documento de identidad | 71. Firma del Funcionario

Observaciones: Director de Obra / Adjunto doc: Creacion de Empresa Persona Juridica. COT DEP 0001

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Doc. Identificación y nombre del Ejecutivo Comercial

Sello de Radicación: 11-12-2024

CE 480416 JULIO CESAR TOLEDO

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

EPS Sanitas

No. de Radicación:

Fecha de Radicación: D D M M A A A A

180555003

(Lea las instrucciones que se encuentran al respaldo antes de diligenciar este formulario)

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación; B. Reporte de Novedades: X
2. Tipo de Afiliación: A. Individual: - Cotizante o Cabeza de Familia; B. Colectiva; D. De Oficio; - Beneficiario o Afiliado adicional; C. Institucional: X
3. Régimen: A. Contributivo; B. Subsidiado: X
4. Tipo de Afiliado: A. Cotizante: X; B. Cabeza de Familia; C. Beneficiario
5. Tipo de Cotizante: A. Dependiente: X; B. Independiente; C. Pensionado
Código (a registrar por la EPS):

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (Del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
Avella	Villamizar	Diana	Patricia

7. Tipo de documento de identidad: CN; TI; CE; CD; RC; CC: X; PA; SC
8. Número del documento de identidad: 60.448 600
9. Sexo: Femenino: X; Masculino
10. Fecha de nacimiento: 04 10 1985

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos Personales

11. Etnia:
12. Discapacidad: Tipo F N M; Condición T P
13. Puntaje SISBÉN:
14. Grupo de población especial:
15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL: Sura
16. Administradora de Pensiones:
17. Ingreso base de cotización - IBC: 1'300.000
18. Residencia
Dirección: Cra 3A # 4-15
Teléfono Fijo:
Teléfono Celular: 3004300394
Correo Electrónico: Jesvar-civil@hotmail.com
Municipio / Distrito: Cúcuta
Zona: Urbana: X; Rural
Localidad / Comuna:
Departamento: NDS

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos Básicos de identificación del Cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

20. Tipo de documento de identidad: CN; TI; CE; CD; RC; CC; PA; SC
21. Número del documento de identidad:
22. Sexo: Femenino; Masculino
23. Fecha de nacimiento: D D M M A A A A

Datos Básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres

	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

Datos Complementarios

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo	28. Fecha de nacimiento	29. Parentesco
B1			Femenino; Masculino	D D M M A A A A	
B2			Femenino; Masculino	D D M M A A A A	
B3			Femenino; Masculino	D D M M A A A A	
B4			Femenino; Masculino	D D M M A A A A	
B5			Femenino; Masculino	D D M M A A A A	

	30. Etnia	31. Discapacidad: Tipo	Condición	32. Datos de Residencia: Municipio/Distrito	Zona	Departamento	Teléfono Fijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del Afiliado Adicional (a registrar por la EPS)
B1		F N M	T P		Urbana Rural			
B2		F N M	T P		Urbana Rural			
B3		F N M	T P		Urbana Rural			
B4		F N M	T P		Urbana Rural			
B5		F N M	T P		Urbana Rural			


Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C	Ong Lasmedis	
B		
B		
B		

KPDATA

- Original: EPS -1a Copia: EMPLEADOR -2 Copia: AFILIADO -

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

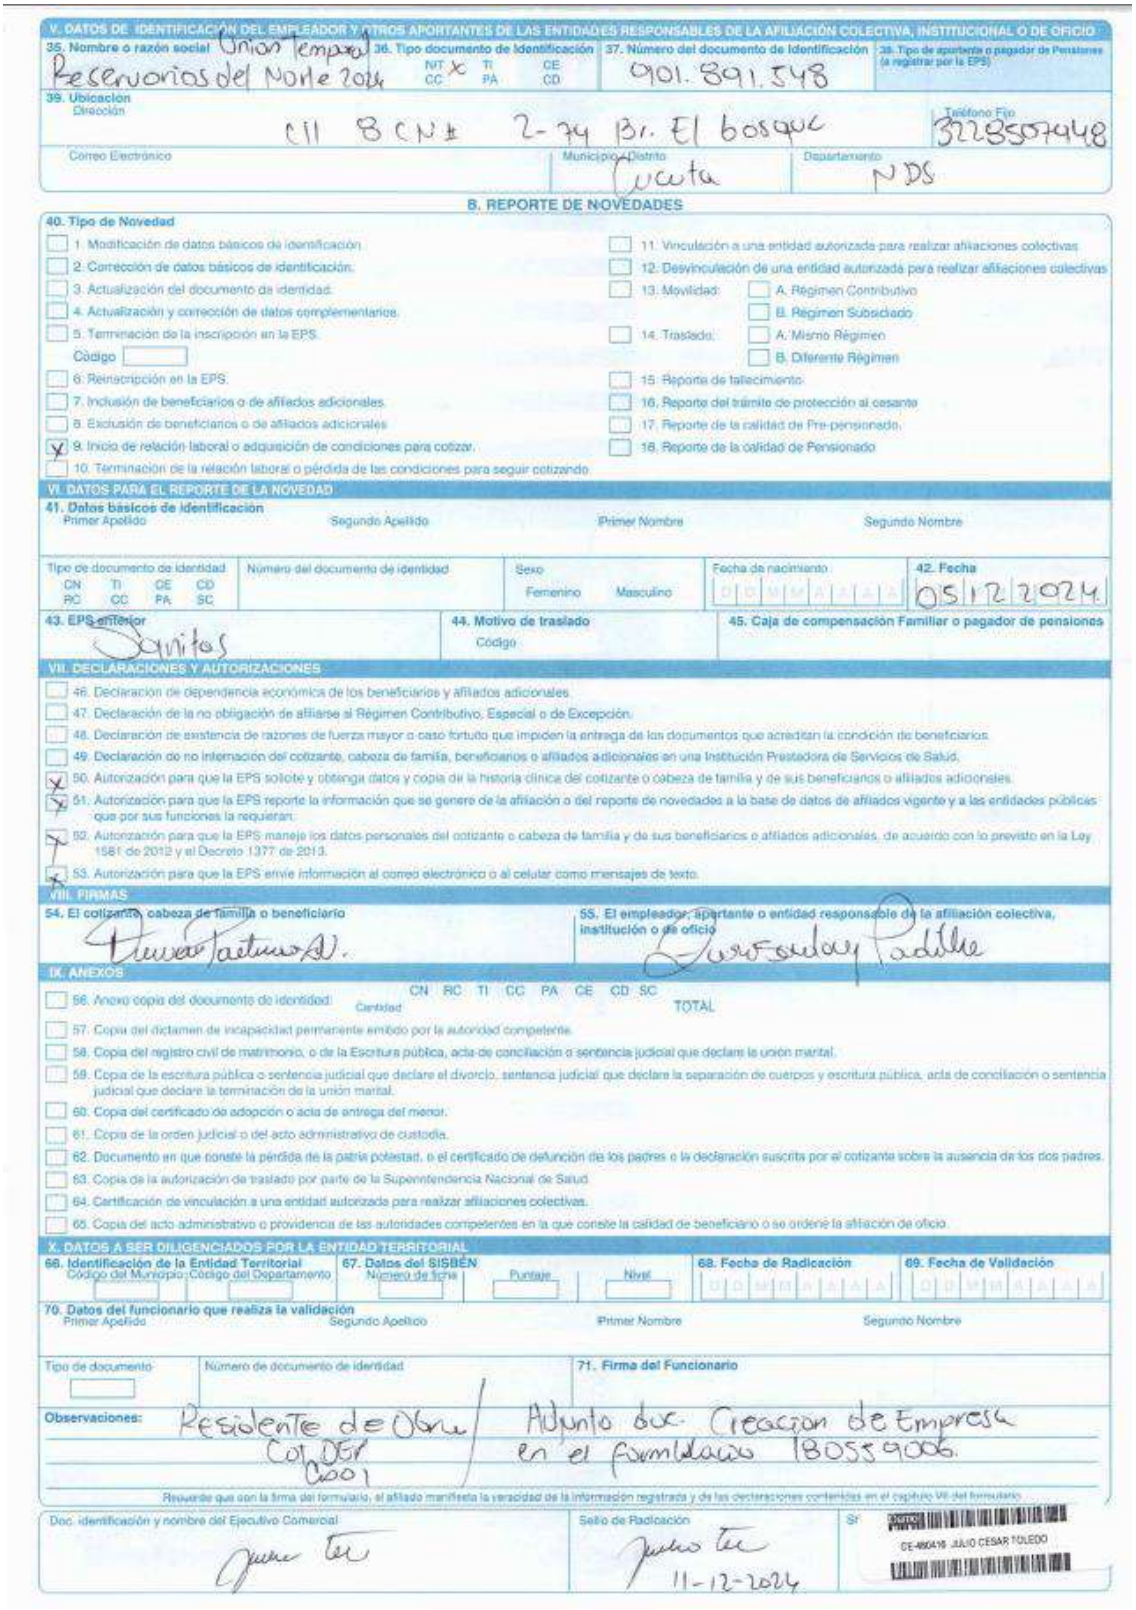

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social: Unión Temporal Reservorios del Norte 2024
36. Tipo documento de Identificación: NIT X CC TI PA CE CD
37. Número del documento de Identificación: 901.891.548
38. Tipo de aportante o pagador de Pensiones (a registrar por la EPS)
39. Ubicación — Dirección: Cll 8 CN # 2-74 Br. El bosque — Teléfono Fijo: 3228507448
Correo Electrónico — Municipio/Distrito: Cucuta — Departamento: NDS

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad
- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS.
  Código
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [X] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación — Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad: CN RC TI CC PA CE CD SC — Número del documento de identidad — Sexo: Femenino Masculino — Fecha de nacimiento (D D M M A A A A)
42. Fecha: 05/12/2024

43. EPS anterior: Sanitas
44. Motivo de traslado — Código
45. Caja de compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no información del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [X] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [X] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [X] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [X] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario
55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institución o de oficio

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad — Cantidad — CN RC TI CC PA CE CD SC — TOTAL
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial — Código del Municipio | Código del Departamento
67. Datos del SISBEN — Número de ficha | Puntaje | Nivel
68. Fecha de Radicación (D D M M A A A A)
69. Fecha de Validación (D D M M A A A A)

70. Datos del funcionario que realiza la validación — Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre


Tipo de documento | Número de documento de identidad | 71. Firma del Funcionario

Observaciones: Residente de Obra / Adjunto doc. Creacion de Empresa en el formulario 1805590O6.
Cot 007

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Doc. identificación y nombre del Ejecutivo Comercial — Sello de Radicación: 11-12-2024 — Sr
CE-490418 JULIO CESAR TOLEDO

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

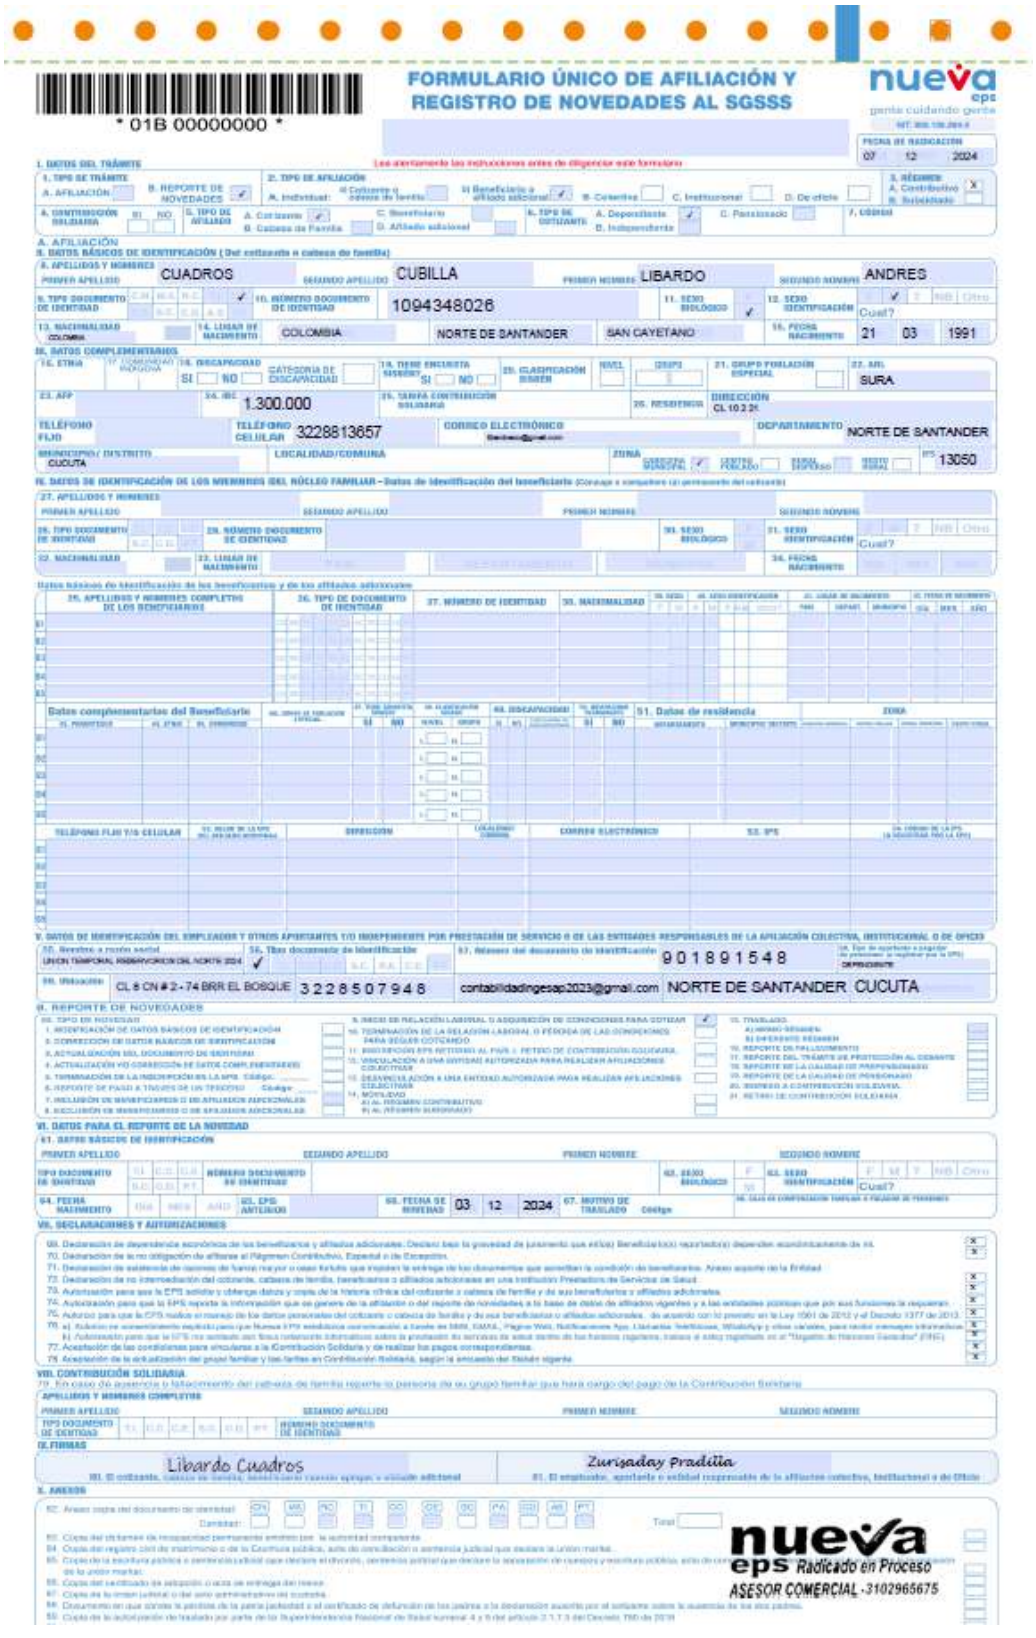

* 01B 00000000 *

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps

FECHA DE RADICACIÓN 07 12 2024

I. DATOS DEL TRÁMITE

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (Del cotizante o cabeza de familia)

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
CUADROS	CUBILLA	LIBARDO	ANDRES

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO BIOLÓGICO	SEXO IDENTIFICACIÓN	FECHA NACIMIENTO
CC	1094348026	M	M	21 03 1991

NACIONALIDAD	LUGAR DE NACIMIENTO		
COLOMBIA	COLOMBIA	NORTE DE SANTANDER	SAN CAYETANO

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

ETNIA	DISCAPACIDAD	TIENE ENCUESTA SISBÉN	CLASIFICACIÓN SISBÉN	GRUPO POBLACIÓN ESPECIAL	ARL
	NO	NO			SURA

AFP	IBC	TARIFA CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA	RESIDENCIA	DIRECCIÓN
	1.300.000			CL 10 2 2E

TELÉFONO FIJO	TELÉFONO CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	DEPARTAMENTO
	3228813657		NORTE DE SANTANDER

MUNICIPIO / DISTRITO	LOCALIDAD/COMUNA	ZONA	PTS
CUCUTA		URBANA ✓ RURAL	13050

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR – Datos de identificación del beneficiario (Consulte e completare (a) permanente del cotizante)

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO BIOLÓGICO	SEXO IDENTIFICACIÓN	FECHA NACIMIENTO

NACIONALIDAD	LUGAR DE NACIMIENTO

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DE LOS BENEFICIARIOS	TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NÚMERO DE IDENTIDAD	NACIONALIDAD	SEXO BIOLÓGICO	SEXO IDENTIFICACIÓN	LUGAR DE NACIMIENTO	TIPO DE NACIMIENTO
01								
02								
03								
04								
05								

Datos complementarios del Beneficiario

	PARENTESCO	ETNIA	DISCAPACIDAD	DATOS DE RESIDENCIA	ZONA
01					
02					
03					
04					
05					

	TELÉFONO FIJO Y/O CELULAR	DIRECCIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	EPS
01				
02				
03				
04				
05				

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES Y/O INDEPENDIENTE POR PRESTACIÓN DE SERVICIO O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

RAZÓN SOCIAL	TIPO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	TIPO DE APORTANTE
UNION TEMPORAL RESERVACION DEL NORTE 2024	NIT ✓	901891548	EMPLEADOR

UBICACIÓN				
CL 8 CN # 2 - 74 BRR EL BOSQUE	3228507948	contabilidadingesap2023@gmail.com	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA

VI. REPORTE DE NOVEDADES

TIPO DE NOVEDAD

1. IDENTIFICACIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN
2. CORRECCIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN
3. ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD
4. ACTUALIZACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE DATOS COMPLEMENTARIOS
5. TERMINACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN LA APS Código:
6. REPORTE DE PAGO A TERCEROS DE UN TRÁMITE Código:
7. INCLUSIÓN DE MIEMBROS/BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES
8. EXCLUSIÓN DE MIEMBROS/BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES
9. INICIO DE RELACIÓN LABORAL O ADQUISICIÓN DE CONDICIONES PARA COTIZAR ✓
10. TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL O PÉRDIDA DE LAS CONDICIONES PARA SEGUIR COTIZANDO
11. INSCRIPCIÓN EPS RETORNO AL PAR O PETICIÓN DE CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA
12. VINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS
13. DESVINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS
14. MOVILIDAD
a) Al RÉGIMEN CONTRIBUTIVO
b) Al RÉGIMEN SUBSIDIADO
15. TRASLADO
a) ENTRE SEDARIS
b) DIFERENTE REGIMEN
16. REPORTE DE FALLECIMIENTO
17. REPORTE DEL TRÁMITE DE PROTECCIÓN AL CESANTE
18. REPORTE DE LA CALIDAD DE PENSIONADO
19. REPORTE DE LA CALIDAD DE PENSIONADO
20. INGRESO A CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA
21. RETIRO DE CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

VII. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

61. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	62. SEXO BIOLÓGICO	63. SEXO IDENTIFICACIÓN

64. FECHA NACIMIENTO	65. EPS ANTERIOR	66. FECHA DE NOVEDAD	67. MOTIVO DE TRASLADO Código	68. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR A PEDIDO DE TRASLADO
DIA MES AÑO		03 12 2024		

VIII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

69. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales. Declaro bajo la gravedad de juramento que estos Beneficiario(s) reportado(s) dependen económicamente de mí. ✓
70. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
71. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios. Anexo soporte de la Entidad.
72. Declaración de no intermediación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
73. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
74. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades, a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones lo requieran.
75. Autorizo para que la EPS realice el manejo de los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
76. a) Autorizo de consentimiento explícito para que Nueva EPS establezca comunicación a través de SMS, EMAIL, Página Web, Notificaciones App, Llamadas Telefónicas, WhatsApp y otros canales, para recibir mensajes informativos.
b) Autorizo para que la EPS no contacte con fines netamente informativos sobre la prestación de servicios de salud dentro de los términos regulares, tratará el sitio registrado en el "Registro de Números Excluidos" (RNE).
77. Aceptación de las condiciones para vincularse a la (Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes.
78. Aceptación de la afiliación del grupo familiar y las faltas en Contribución Solidaria, según la emisión del Estado vigente.

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD

IX. FIRMAS

Libardo Cuadros

80. El cotizante, cabeza de familia, beneficiario mayor de edad, grupo familiar o afiliado adicional

Zurisaday Pradilla

81. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

X. ANEXOS

82. Anexo copia del documento de identidad: CN MS RC TI CC CE PA CD AS PT — Cantidad: — Total

83. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
84. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación de la unión marital.
86. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
87. Copia de la orden judicial o del auto administrativo de custodia.
88. Documento en que conste la petición de la pareja peticionaria y el certificado de defunción de los padres o la declaración ausente por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
89. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud numeral 4 y 5 del artículo 2.1.7.3 del Decreto 780 de 2016

nueva eps Radicado en Proceso

ASESOR COMERCIAL -3102965675

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

Autorización de mensajes de texto. (Circular externa 000016 mayo de 2013)

Yo LIBARDO ANDRES CUADROS CUBILLA identificado (a) con C.C. ✓ T.I. C.E. P.E.
número 1094348026 de SAN CAYETANO certifico que:

1	¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la carta de derechos y deberes del afiliado y del paciente?	SÍ [X] No [ ]
2	¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la carta de desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	SÍ [X] No [ ]
3	¿Leyó el contenido de la carta de derechos y deberes del afiliado y del paciente?	SÍ [X] No [ ]
4	¿Leyó el contenido de la carta de desempeño de la EPS?	SÍ [X] No [ ]
5	¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información, fue asesorado adecuadamente por la EPS?	SÍ [X] No [ ]

Así mismo autorizo a NUEVA EPS, para que envíe información al
teléfono celular No.
y/o correo electrónico.
SÍ [ ] No [X]
Autorizo la entrega de la carta de Derechos y Deberes del Afiliado y carta de Desempeño, en formato electrónico. SÍ [ ] No [ ]
Consulte la carta de derechos y deberes y la carta de desempeño en el micrositio Web https://www.nuevaeps.com.co/carta-derechos-deberes
Evitando impresiones para ser amigable con el planeta SI [ ] NO [ ]

Cordialmente,
Firma: *Libardo Cuadros*
Tipo ID: CC No. ID: 1094348026
Fecha de Solicitud: 07 12 2024
Dirección: CL 10 2 21
Tel: 3228813657 Municipio: CUCUTA
Departamento: NORTE DE SANTANDER
Huella

Afiliado manifiesta que no sabe o no puede firmar, autoriza a:
Firma:
Tipo ID: No. ID:
Fecha (dd/mm/aaaa):
Dirección:
Tel: Municipio:
Departamento:
Huella

Manifiesto con mi firma la aceptación de todas las declaraciones y términos incorporados en este formato y el consentimiento expreso, previo e informado en relación con el tratamiento de mis datos personales que hará NUEVA EPS S.A., en sujeción a la política para el tratamiento de datos personales de la NUEVA EPS S.A.

Autorizaciones

En virtud de la anterior certificación, autorizo expresamente y conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la Ley 527 de 1995, a NUEVA EPS S.A. para que me remita información en forma de mensajes de datos, a través de mecanismos como sms -short message service- , correos electrónicos y redes sociales, relacionada con los servicios de NUEVA EPS S.A. y la carta de derecho de deberes.
Autorizo de manera expresa a NUEVA EPS S.A. y/o a la persona natural o jurídica a quien ésta encargue, para que recolecte, almacene, use, haga circular, actualice o suprima mis datos personales, para acceder a los servicios de la NUEVA EPS S.A. y para el cumplimiento de la carta de derechos y deberes.

Aviso de privacidad

Hago constar expresamente que NUEVA EPS S.A. me informó sobre los siguientes derechos que me asisten como titular de datos personales:

* Acceder los datos personales que hayan sido objeto de tratamiento conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
* Conocer, actualizar y rectificar los datos personales frente al responsable del tratamiento y al encargado del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros datos, en relación con datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos datos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.
* Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento, salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.
* Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, previa solicitud, con respecto del uso que le ha dado a los datos personales.
* Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
* Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el tratamiento el responsable o encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la constitución.

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la política de tratamiento de los datos personales de NUEVA EPS S.A., a través de los siguientes mecanismos que ponemos a su disposición:

Sitio web: www.nuevaeps.co
Régimen Contributivo:
Línea Gratuita: **01 8000 954400**
Línea de atención en Bogotá: **(601) 307 7022**
Régimen Subsidiado:
Línea Gratuita: **01 8000 95 2000**
Línea de atención en Bogotá: **(601) 307 7051**
Oficinas de atención al afiliado de NUEVA EPS S.A.
Conmutador: **(601) 419 3000**
Dirección Administrativa: Carrera 65k No. 46A – 66 Piso 2

Sr.(a) afiliado(a), la información por usted suministrada en este formato, así como la relacionada en el formulario de afiliación y/o demás documentos anexos, serán utilizados por NUEVA EPS S.A. como responsable del tratamiento de la información únicamente para los fines específicos relacionados con la administración y prestación de servicios en salud de Plan Obligatorio de Salud, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 "Hábeas Data"; dicho tratamiento podrá implicar la trasferencia, trasmisión y/o recepción de los datos, y el cual se realizará a través de sí misma, terceros encargados de tratamiento de información o de sus aliados comerciales, para fines comerciales y para la correcta prestación del servicio, de la forma indicada en los Términos y Condiciones de cada uno de sus portales y de la Política de Confidencialidad y Protección de Datos.

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR EL TRABAJADOR INDEPENDIENTE CUYO INGRESO SEA IGUAL O SUPERIOR A 1 SMMLV

ACTIVIDAD ECONÓMICA	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	POSEE VIVIENDA PROPIA	PROMOTOR AGROPECUARIO
			$	SI / NO	SI / NO

Nivel de Escolaridad: Ninguno, Primaria, Básica Primaria, Secundaria, Media académica o clásica (bachillerato básico), Media técnica (bachillerato básico), Normalista, Técnica Profesional, Tecnológica, Profesional, Especialización, Maestría, Doctorado, Último Grado, Apostado
Posición Ocupacional: Patrón/Empleador, Contratista, Trabaja por su Cuenta
Inicio Contrato, Fin Contrato

SEÑOR USUARIO, TRABAJADOR INDEPENDIENTE O CONTRATISTA, RECUERDE REPORTAR LA NOVEDAD DE RETIRO EN LA PLANILLA DE PAGO A PARTIR DEL MOMENTO QUE DECIDA NO CONTINUAR CON LOS SERVICIOS DE SALUD, EL NO HACERLO LE GENERA MORA, LA CUAL TENDRÁ VIGENCIA HASTA EL MOMENTO EN EL QUE REPORTE SU RETIRO AL SISTEMA. DECRETO 806 ART. 07 DE 1998 Y ART. 38 DECRETO 1406 DE 1999.

SÓLO DILIGENCIAR SI ES COTIZANTE INDEPENDIENTE PAGO POR TERCERO — Nombre del Tercero — Tipo de Identificación: NIT, C.C., C.E., P.A., T.I., C.D. — Identificación del Tercero que realiza el Aporte — DV

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR LA EPS

Nombre del ASESOR o PROMOTOR	CÓDIGO ASESOR o PROMOTOR	Nombre de OFICINA	CIUDAD Y FECHA
JESSICA ARANGO	C2180	CÚCUTA	CÚCUTA 07 12 2024

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

ANEXO N° 7.
AFILIACIONES A LA AFP

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.
En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR
NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

LIBARDO ANDRES CUADROS CUBILLA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.094.348.026**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 13 de Diciembre del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.
En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR
NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **88.211.813**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir.**

La presente certificación se expide el 13 de Diciembre del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.
En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR
NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

DIANA PATRICIA AVELLA VILLAMIZAR, identificado(a) con cédula de ciudadanía **60.448.600**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 13 de Diciembre del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

ANEXO N° 8. EXÁMENES DE INGRESO

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

Corponor

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MANEJO AMBIENTAL EN OBRAS PÚBLICAS

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

IPS MEDCARE DE COLOMBIA S.A.S.
Nit. 900257281 - 1
Dirección: AV 2E # 5-35 LA CEIBA
Tel: 5777177 - 5777188 - 5777199

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

Tipo certificación:	Ingreso ⊗	Periódico ○	Retiro ○	Post incapacidad ○	Caso ocupacional ○
	Control ○	Reubicación ○	Ingreso al SVE ○	Trabajo en alturas ○	

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **04/12/2024 08:13:00** Empresa **UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024**

Nombre **JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ**

Cargo **DIRECTOR DE OBRA** Doc. Identidad **CC 88211813**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

1 EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL INGRESO	2	3
4	5	6
7	8	9

EXAMEN DE INGRESO	SI	NO
Sin restricciones para desempeñar el cargo	⊗	○
Aplazado	○	○
Con restricciones para desempeñar el cargo	○	○
Apto para trabajar en alturas	○	○
Apto para trabajar en espacios confinados	○	○
Apto para trabajar con equipos de suministro de aire o auto contenido	○	○
Apto para participar en la brigada	○	○
Apto para el requerimiento del cargo de la empresa o contratista	○	○

EXAMEN PERIÓDICO	SI	NO
Sin restricciones para continuar desempeñando el cargo sin limitaciones	○	○
Con restricciones para continuar desempeñando el cargo	○	○
Requiere reubicación laboral temporal	○	○
Requiere reubicación laboral permanente	○	○
Apto para trabajar en alturas	○	○
Apto para trabajar en espacios confinados	○	○

EXAMEN DE RETIRO	SI	NO
Sospecha de enfermedad profesional	○	○
Secuelas de accidentes de trabajo	○	○
Enfermedad común	○	○

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ○ Auditivo ○ Respiratorio ○ Cardiovascular ○ Psicosocial ○ Ergonómico ○ Otros ○

REMISIÓN	SI ○	NO ⊗	ARL	SI ○	NO ○	EPS	SI ○	NO ○

SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO,USO RESPONSABLE DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, PAUSAS ACTIVAS, HIGIENE POSTURAL,RECOMENDACIONES SOBRE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

DR. RAFAEL NICOLAS GUZMAN PADILLA
MEDICO LABORAL
RM 319293- REG. SO. 1446 (29/04/2021)

RAFAEL GUZMAN PADILLA - ML
Especialidad: SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES
CC: 786882731 RM: 319293-REG.SO.1446

Trabajador: JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ
CC 88211813
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biométrica

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

Corponor

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MANEJO AMBIENTAL EN OBRAS PÚBLICAS

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

I.P.S. MEDCARE DE COLOMBIA S.A.S.

IPS MEDCARE DE COLOMBIA S.A.S.
Nit. 900257281 - 1
Dirección: AV 2E # 5-35 LA CEIBA
Tel: 5777177 - 5777188 - 5777199

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

Tipo certificación:	Ingreso (X)	Periódico ( )	Retiro ( )	Post incapacidad ( )	Caso ocupacional ( )
	Control ( )	Reubicación ( )	Ingreso al SVE ( )	Trabajo en alturas ( )	

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **04/12/2024 09:05:00** Empresa **UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024**

Nombre **DIANA PATRICIA AVELLA VILLAMIZAR**

Cargo **RESIDENTE DE OBRA** Doc. Identidad **CC 60448600**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

1 EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL INGRESO	2	3
4	5	6
7	8	9

EXAMEN DE INGRESO	SI	NO
Sin restricciones para desempeñar el cargo	(X)	( )
Aplazado	( )	( )
Con restricciones para desempeñar el cargo	( )	( )
Apto para trabajar en alturas	( )	( )
Apto para trabajar en espacios confinados	( )	( )
Apto para trabajar con equipos de suministro de aire o auto contenido	( )	( )
Apto para participar en la brigada	( )	( )
Apto para el requerimiento del cargo de la empresa o contratista	( )	( )

EXAMEN PERIÓDICO	SI	NO
Sin restricciones para continuar desempeñando el cargo sin limitaciones	( )	( )
Con restricciones para continuar desempeñando el cargo	( )	( )
Requiere reubicación laboral temporal	( )	( )
Requiere reubicación laboral permanente	( )	( )
Apto para trabajar en alturas	( )	( )
Apto para trabajar en espacios confinados	( )	( )

EXAMEN DE RETIRO	SI	NO
Sospecha de enfermedad profesional	( )	( )
Secuelas de accidentes de trabajo	( )	( )
Enfermedad común	( )	( )

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ( ) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular ( ) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO ( )

SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO,USO RESPONSABLE DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, PAUSAS ACTIVAS, HIGIENE POSTURAL,RECOMENDACIONES SOBRE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

DR. RAFAEL NICOLAS GUZMAN PADILLA
MEDICO LABORAL
RM 319293- REG. SO. 1446 (29/04/2021)

RAFAEL GUZMAN PADILLA - ML
Especialidad: SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES
CC: 786882731 RM: 319293-REG.SO.1446

Trabajador: DIANA PATRICIA AVELLA VILLAMIZAR
CC 60448600
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biométrica

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

Corponor

SALUD EMPRESARIAL IPS S.A.S.
PROFESIONALES EN MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

CERTIFICADO MEDICO LABORAL

LICENCIA S.O. No. 00121

EXAMEN DE INGRESO

ENFASIS OSTEOMUSCULAR

CALLE 3 NO. 1E-09 LA CEIBA Tel. 5711515- CEL 3174037456 NIT 900.443.363-4

FECHA 30/11/2024 **HORA** 10:04:19 **CUCUTA - NORTE DE SANTANDER**



EMPRESA 901891548-4 UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024

NOMBRE LIBARDO ANDRES CUADROS CUBILLA

CC : 1094348026 **DE** SAN CAYETANO

DIRECCION CALLE 29 1E -045 LA CORDIALIDA LOS PATIOS

CELULAR 3228813657 **EDAD** 33 **GENERO** M **RH** B+

CARGO AUXILIAR

AFP PORVENIR **ARL** **EPS** NUEVA EPS

EXAMENES MEDICOS : EXAMEN FÍSICO COMPLETO, TAMIZAJE VISUAL, SISTEMA CARDIOPULMONAR, PRUEBAS DE COORDINACIÓN, EXPLORACIÓN DIRIGIDA POR MANIOBRAS INDIVIDUALES DE CADA EXTREMIDAD Y DE CADA MÚSCULO (CUELLO, HOMBROS, MUÑECA, MANOS, TRONCO, CADERA, RODILLA, TOBILLO, PIES) PRUEBA PARA TÚNEL DEL CARPO, PRUEBA PARA TENDINITIS, TENOSINOVITIS Y TRASTORNOS DE HOMBRO, PRUEBAS DINÁMICAS DE COLUMNA, EXPLORACIÓN DE ARCOS DE MOVILIDAD, REFLEJOS OSTEOTENDINOSOS, EXPLORACIÓN DE ALTERACIONES DE PIEL Y VARICES, EXPLORACIÓN DE HERNIAS.
Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y de acuerdo a la Resolución 2346 de 2007 y la Resolución 1918 de 2009, la

OTROS EXAMENES :

AUDIOMETRIA	NO	**OPTOMETRIA**	NO	**ESPIROMETRIA**	NO	**PSICOLOGIA**	NO
RX TORAX	NO	**RX COLUMNA**	SI	**RX PIES**	NO	**ECOGRAFIA**	NO
C. MOTRIZ	NO	**PSICOSENSOMETRICA**	NO	**ELECTROCARDIOGRAMA**	NO		

LABORATORIO :

CONCEPTO DE APTITUD : SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO

RECOMENDACIONES : USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, HIGIENE POSTURAL, PAUSAS ACTIVAS, ESTILO DE VIDA SALUDABLE, USO DE LENTES CORRECTIVOS

INGRESA AL SVE

CONSTANCIA

Certifico que toda la información suministrada en este documento es verdadera y no oculte información sobre mi estado de salud, enfermedad laboral y/o accidente de trabajo presentados antes de este examen.

Libardo cuadros

ANEXO N° 9. SOCIALIZACIÓN DE EXAMENES

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

UNION TEMPORAL TALUD GRAMALOTE 2024 NIT: 901.691.867-9	GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 1.0
		Fecha: diciembre 2024
	COMUNICADO INTERNO	Página 1 de 1

Fecha	5/12/2024
De	UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024
Para	JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ

Señor(a), **JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ** identificado(a) con CC N° 88.211.813 expedida en CÚCUTA por medio de la presente notificamos su estado de salud y/o recomendaciones a tener en cuenta según resultados de exámenes médicos de INGRESO realizados en **IPS MEDCARE DE COLOMBIA S.A.S**

En los resultados emitidos por la empresa prestadora del servicio el día 04 de diciembre de 2024, se hacen las siguientes observaciones:

- **Resultado:** SIN LIMITACIONES O RESTRICCIONES PARA EL CARGO
- **Recomendación:** USO RESPONSABLE DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, HIGIENE POSTURAL, PAUSAS ACTIVAS, ESTILO DE VIDA SALUDABLE.
- **Restricciones:** N/A
- **PVE:** N/A

Desde el área de SG-SST, de la **UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024,** notifica de su estado de salud y recomendaciones que se deben tener en cuenta para mantener estados de salud adecuados, previniendo de esta manera la ocurrencia de incidentes, accidentes y/o enfermedades laborales.

Agradecemos su atención prestada y el compromiso adquirido al cumplimiento de las recomendaciones pactadas o recibidas.

Nombre	Jesús Enrique Vargas.
Cedula	88. 211.813
Firma	

Atentamente

Zuriaday Pradilla A.

ZURISADAY PRADILLA ATUESTA
Representante Legal

UNION TEMPORAL TALUD GRAMALOTE 2024 NIT: 901.891.007-9	GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 1.0
		Fecha: diciembre 2024
	COMUNICADO INTERNO	Página 1 de 1

Fecha	5/12/2024
De	UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024
Para	DIANA PATRICIA AVELLA VILLAMIZAR

Señor(a), **DIANA PATRICIA AVELLA VILLAMIZAR,** identificado(a) con CC N° 60.448.600 expedida en CÚCUTA por medio de la presente notificamos su estado de salud y/o recomendaciones a tener en cuenta según resultados de exámenes médicos de INGRESO realizados en **IPS MEDCARE DE COLOMBIA S.A.S**

En los resultados emitidos por la empresa prestadora del servicio el día 04 de diciembre de 2024, se hacen las siguientes observaciones:

- **Resultado:** SIN LIMITACIONES O RESTRICCIONES PARA EL CARGO
- **Recomendación:** USO RESPONSABLE DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, HIGIENE POSTURAL, PAUSAS ACTIVAS, ESTILO DE VIDA SALUDABLE.
- **Restricciones:** N/A
- **PVE:** N/A

Desde el área de SG-SST, de la **UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024,** notifica de su estado de salud y recomendaciones que se deben tener en cuenta para mantener estados de salud adecuados, previniendo de esta manera la ocurrencia de incidentes, accidentes y/o enfermedades laborales.

Agradecemos su atención prestada y el compromiso adquirido al cumplimiento de las recomendaciones pactadas o recibidas.

Nombre	Diana Patricia Avella
Cedula	60.448.600
Firma	

Atentamente

ZURISADAY PRADILLA ATUESTA
Representante Legal

UNION TEMPORAL TALUD GRAMALOTE 2024 NIT: 901.891.087-9	GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 1.0
		Fecha: diciembre 2024
	COMUNICADO INTERNO	Página 1 de 1

Fecha	3/12/2024
De	UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024
Para	LIBARDO ANDRES CUADROS

Señor(a), **LIBARDO ANDRES CUADROS CUBILLOS** identificado(a) con CC N° 1.094.348.026 expedida en SAN CAYETANO por medio de la presente notificamos su estado de salud y/o recomendaciones a tener en cuenta según resultados de exámenes médicos de INGRESO realizados en **IPS SALUD EMPRESARIAL**

En los resultados emitidos por la empresa prestadora del servicio el día 30 de noviembre de 2024, se hacen las siguientes observaciones:

- **Resultado:** SIN LIMITACIONES O RESTRICCIONES PARA EL CARGO
- **Recomendación:** USO RESPONSABLE DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, HIGIENE POSTURAL, PAUSAS ACTIVAS, ESTILO DE VIDA SALUDABL, USO DE LENTES CORRECTIVOS
- **Restricciones:** N/A
- **PVE:** N/A

Desde el área de SG-SST, de la **UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024,** notifica de su estado de salud y recomendaciones que se deben tener en cuenta para mantener estados de salud adecuados, previniendo de esta manera la ocurrencia de incidentes, accidentes y/o enfermedades laborales.

Agradecemos su atención prestada y el compromiso adquirido al cumplimiento de las recomendaciones pactadas o recibidas.

Nombre	Libardo Andres Cuadros
Cedula	1094.348.026
Firma	Libardo Andres Cuadros C.

Atentamente

ZURISADAY PRADILLA ATUESTA
Representante Legal

ANEXO N° 10. INDICE DE ACCIDENTABILIDAD

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

ARL | sura

Medellín, 28 de diciembre de 2024

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024, NIT N901891548, no presenta accidentes de trabajo desde el 01 de diciembre de 2024 hasta el 28 de diciembre de 2024.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,

Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente
Dirección IP: 179.32.176.181, 192.230.104.8, 172.16.42.57.

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

ANEXO N° 11. CERTIFICADO DE AFILIACIÓN A LA ARL DE LA U.T.

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

ARL | sura

Medellín, 28 de Diciembre de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la circular externa 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera (título VI, numeral 1.5, literal g), se expide la presente constancia de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales.

Nombre o razón	UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024
Cédula de ciudadanía o Nit	N901891548
Fecha inicio de vigencia	23/11/2024 00:00:00
Fecha fin de vigencia	AFILIADA
Estado	EN COBERTURA
Número de centros de trabajo	1
Número de afiliados dependientes	3
Número de afiliados independientes	0
Número cotizantes en mora:	0
% cotizantes en mora:	0 %
Código de actividad principal	5429001
Clase de riesgo 5	Tasa de riesgo 6.96%

ACTIVIDAD ECONÓMICA: CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN,

"Mora: Es el incumplimiento que se genera cuando existiendo afiliación no se realiza la autoliquidación acompañada del respectivo pago de las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social en los plazos establecidos en las disposiciones legales vigentes.

Entiéndase dentro de este concepto, la mora que registra el empleador respecto de algunos trabajadores a su cargo. Art 6

En el estado de cuenta integral podrás encontrar el resumen y detalle actualizado de tus moras, inexactitudes, recobros de AT, pagos de incapacidades y devoluciones disponibles. Esto dará claridad a las diferencias y la mora que presentas. Para consultar el estado de cuenta integral, ingresa a https://www.arlsura.com da clic en Empresa e inicia sesión y sigue esta ruta: Gestión Administrativa/ Mi Empresa/ Estado de Cuenta/ Estado de Cuenta Integral.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:


Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
Dirección IP: 179.32.176.181, 192.230.104.8,

ANEXO N° 12. PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

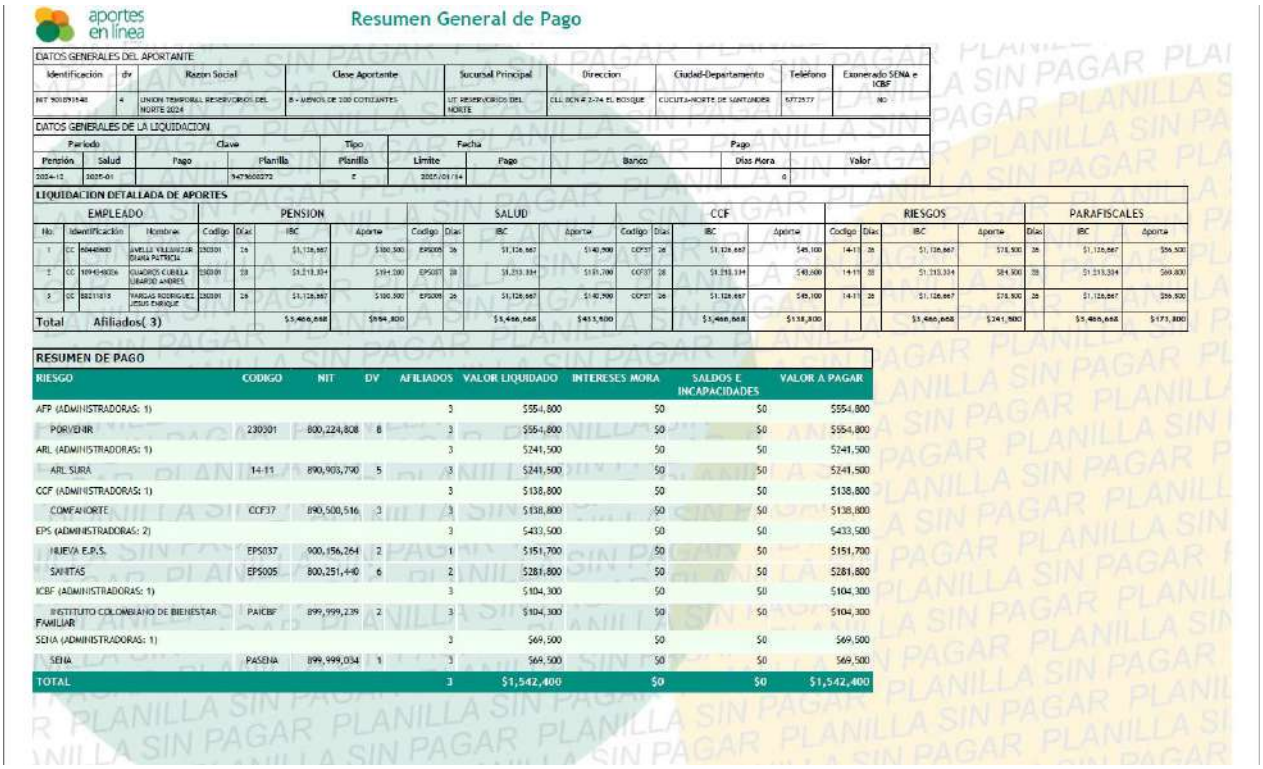

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901091340	4	UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UT RESERVORIOS DEL NORTE	CLL 0CN # 2-74 EL BOSQUE	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5772577	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01		547600272	E	2025/01/14			0	


LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF			RIESGOS				PARAFISCALES		
No	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	60440880	AVELLA VILLAMIZAR DIANA PATRICIA	230301	28	$1,126,667	$180,300	EPS005	28	$1,126,667	$140,900	COF37	28	$1,126,667	$45,100	14-11	28	$1,126,667	$78,900	28	$1,126,667	$56,500
2	CC	1094140026	CUADROS CUBILLA EDUARDO ANDRES	230301	28	$1,233,334	$197,200	EPS037	28	$1,233,334	$123,700	COF37	28	$1,233,334	$49,400	14-11	28	$1,233,334	$86,300	28	$1,233,334	$69,000
3	CC	88211618	VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE	230301	28	$1,126,667	$180,300	EPS005	28	$1,126,667	$140,900	COF37	28	$1,126,667	$45,100	14-11	28	$1,126,667	$78,900	28	$1,126,667	$56,500
Total			Afiliados(3)			$3,486,668	$557,800			$3,486,668	$405,500			$3,486,668	$138,600			$3,486,668	$244,100		$3,486,668	$174,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$554,800	$0	$0	$554,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$554,800	$0	$0	$554,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$241,500	$0	$0	$241,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$241,500	$0	$0	$241,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$138,800	$0	$0	$138,800
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	3	$138,800	$0	$0	$138,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$433,500	$0	$0	$433,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$151,700	$0	$0	$151,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$281,800	$0	$0	$281,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$104,300	$0	$0	$104,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$104,300	$0	$0	$104,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$69,500	$0	$0	$69,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$69,500	$0	$0	$69,500
TOTAL				3	$1,542,400	$0	$0	$1,542,400

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

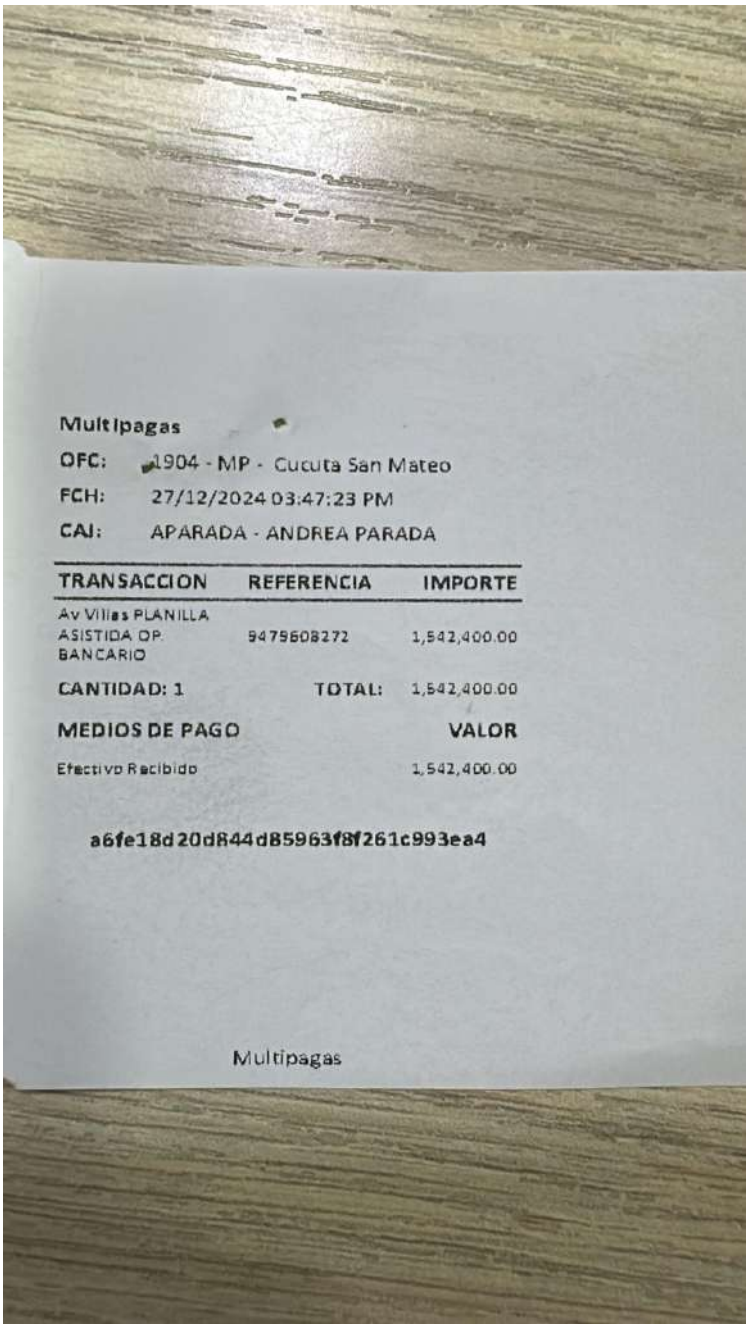

Multipagas

OFC: 1904 - MP - Cucuta San Mateo

FCH: 27/12/2024 03:47:23 PM

CAJ: APARADA - ANDREA PARADA

TRANSACCION	REFERENCIA	IMPORTE
Av Villas PLANILLA ASISTIDA OP. BANCARIO	9479608272	1,542,400.00
CANTIDAD: 1	TOTAL:	1,542,400.00

MEDIOS DE PAGO	VALOR
Efectivo Recibido	1,542,400.00

a6fe18d20d844d85963f8f261c993ea4

Multipagas

ANEXO 13. NOMBRAMIENTO DEL VIGIA

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 1.0
	ACTA DE NOMBRAMIENTO DE VIGIAS Y CCL	Fecha: Diciembre 2024
		Página 1 de 2

El día 05 de diciembre de 2024, en las instalaciones de la **UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2024**, el representante legal **ZURISADAY PRADILLA ATUESTA,** Designa a la señora **DIANA PATRICIA AVELLA** identificado con C.C. 60.488.600 de Cúcuta, como Vigía y Líder del Comité de convivencia laboral.

Recalcando algunas de las funciones:

VIGIA

- Participar de las actividades de promoción, divulgación e información, sobre seguridad y salud en el trabajo entre empleadores y trabajadores, para obtener su participación activa en el desarrollo de los programas y actividades del SG-SST;
- Actuar como instrumento de vigilancia para el cumplimiento del SG-SST en los lugares de trabajo de la empresa e informar sobre el estado de ejecución de los mismos a las autoridades de seguridad y salud en el trabajo cuando haya deficiencias en su desarrollo;
- Recibir copias, por derecho propio, de las conclusiones sobre inspecciones e investigaciones que realicen las autoridades de seguridad y salud en el trabajo en los sitios de trabajo.
- Proponer a la administración de la empresa o establecimiento de trabajo la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo.
- Proponer y participar en actividades de capacitación en seguridad y salud en los trabajos dirigidos a trabajadores, supervisores y directivos de la empresa
- Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de seguridad y salud en el trabajo en las actividades que éstos adelanten en la empresa y recibir por derecho propio los informes correspondientes.
- Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de seguridad y salud en el trabajo debe realizar la empresa de acuerdo con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes; promover su divulgación y observancia.
- Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y proponer al empleador las medidas correctivas que haya lugar para evitar su ocurrencia. Evaluar los programas que se hayan realizado.
- Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de trabajadores e informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control.
- Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores en la solución de los problemas relativos a la seguridad y salud en el trabajo. Tramitar los reclamos de los trabajadores relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
- Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y enfermedades laborales con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en la Resolución 2013 de 1986.
- Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se desarrollen el cual estará en cualquier momento a disposición del empleador, los trabajadores y las autoridades competentes.
- Las demás funciones que le señalen las normas sobre seguridad y salud en el trabajo

UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 1.0
	ACTA DE NOMBRAMIENTO DE VIGIAS Y CCL	Fecha: Diciembre 2024
		Página 2 de 2

CONVIVENCIA LABORAL

- Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.
- Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de la entidad pública o empresa privada.
- Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja.
- Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva
- Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la confidencialidad.
- Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja y verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado.
- En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de Convivencia Laboral, deberá remitir la queja a la Procuraduría General de la Nación, tratándose del sector público. En el sector privado, el Comité informará a la alta dirección de la empresa, cerrará el caso y el trabajador puede presentar la queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez competente.
- Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, así como el informe anual de resultados de la gestión del Comité de Convivencia Laboral y los informes requeridos por los organismos de control.
- Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de Convivencia a las dependencias de gestión del recurso humano y salud ocupacional de las empresas e instituciones públicas y privadas.
- Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta dirección de la entidad pública o empresa privada.

La presente se firma en consideración y aceptación de roles el 05 de diciembre de 2024, de parte de:

ZURISADAY PRADILLA ATUESTA
Representante legal

DIANA PATRICIA AVELLA
Vigía

Anexo. *Control diario del personal de interventoría (Asistencia)*

Corponor

UNIÓN TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE

INTERVENTORIA	
CONTROL DIARIO DE PERSONAL	
CODIGO:	FO-INT-008
FECHA:02/12/24	dic-24
Versión: 1	Pagina 1 de 1

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"

INFORME MENSUAL No:	1	**SECTOR:**	**VEREDA EL MOLINO, ABREGO NORTE DE SANTANDER.**	**FECHA DE ELABORACIÓN:**	30	12	2024	
CONTRATISTA INTERVENTORÍA:	**UNION TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE**			**CONTRATO No.**	**CMA412**			
CONTRATISTA OBRA:	**UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024**			**CONTRATO No.**	**LIC410**			

REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRE	CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA					x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	X	X	X	X	X		x	x		X	X	X		x	
MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA					x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	X	X	X	X	X		x	x		X	X	X		x	
LUIS ALBERTO CARRIEDO ESPINEL	RESIDENTE DE INTERVENTORIA					x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	X	X	X	X	X		x	x		X	X	X		x	
ERIKA MILENA SANABRIA GARCIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA					x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	X	X	X	X	X		x	x		X	X	X		x	
JHONNY HARVEY TAPIAS NAVARRO	CONTADOR					x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	X	X	X	X	X		x	x		X	X	X		x	
SANTIAGO MORENO CASTRILLON	SECRETARIA					x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	X	X	X	X	X		x	x		X	X	X		x	

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre: MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS
Residente de Interventoría

Anexo *(Certificaciones de afiliación al sistema de seguridad social del personal contratado- Pensión)*

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.170.043-7

CERTIFICA QUE:

MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **37.331.288**, se encuentra afiliado(a) al **AL FONDO DE CESANTÍAS PORVENIR**.

La presente certificación se expide el 21 de Diciembre del 2024.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

LUIS ALBERTO CARRIEDO ESPINEL, identificado(a) con cédula de ciudadanía **13.270.332**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 21 de Diciembre del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

ERIKA MILENA SANABRIA GARCIA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.090.987.537**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 21 de Diciembre del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

JHONNY HARVEY TAPIAS NAVARRO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **13.276.265**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 21 de Diciembre del 2024.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

SANTIAGO MORENO CASTRILLON, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.233.508.292**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 21 de Diciembre del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

Anexo *(Certificaciones de afiliación al sistema de seguridad social del personal contratado- ARL)*

Medellín, 10 de December de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de UNION TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL NORTE DE SANTANDER		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C37331288	PICON GARCIA MAIRA ALEJANDRA	11/12/2024		210J126P	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 10/12/2024 17:37:45 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.33.146.1, 192.230.104.11, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 10 de December de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de UNION TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL NORTE DE SANTANDER		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C60292980	ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES	22/12/2024		333E2261	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/12/2024 09:18:21 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.33.158.2, 192.230.104.4, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 10 de December de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de UNION TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL NORTE DE SANTANDER		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C13270332	CARRIEDO ESPINEL LUIS ALBERTO	22/12/2024		H2014717	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/12/2024 09:21:29 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.33.158.2, 192.230.104.4, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 05 de December de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de UNION TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL NORTE DE SANTANDER		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1090987537	SANABRIA GARCIA ERIKA MILENA	22/12/2024		43I13114	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/12/2024 09:25:28 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.33.158.2, 192.230.104.4, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 10 de December de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de UNION TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL NORTE DE SANTANDER		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C13276265	TAPIAS NAVARRO JHONNY HARVEY	22/12/2024		22496227	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/12/2024 09:29:34 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.33.158.2, 192.230.104.4, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 05 de December de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de UNION TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL NORTE DE SANTANDER		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1233508292	MORENO CASTRILLON SANTIAGO	22/12/2024		21037149	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/12/2024 09:28:03 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.33.158.2, 192.230.104.4, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Anexo *(planillas de pago al sistema de seguridad social)*

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901891407	4	UNION TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 2N # 6E -12 QUINTA ORIENTAL	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5491077	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1158700426	9479657044	E	2025/01/03	2024/12/30	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,822,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	60292980	ARTEAGA MYRIAM	X																		0	$0	$0	EPS037	26	$1,990,445	$79,700	CCF36	26	$1,990,445	$79,700	14-11	26	$1,990,445	$138,600	26	$0	$0	Si	$298,000
2	CC	13270332	CARRIEDO LUIS	X																	230301	26	$1,990,445	$318,500	CCFC50	26	$1,990,445	$79,700	CCF36	26	$1,990,445	$79,700	14-11	26	$1,990,445	$138,600	26	$0	$0	Si	$616,500
3	CC	1233508292	MORENO SANTIAGO	X																	230301	26	$1,352,000	$216,400	EPS005	26	$1,352,000	$54,100	CCF36	26	$1,352,000	$54,100	14-11	26	$1,352,000	$94,100	26	$0	$0	Si	$418,700
4	CC	37331288	PICON MAIRA	X																	25-14	26	$1,690,000	$270,400	EPS005	26	$1,690,000	$67,600	CCF36	26	$1,690,000	$67,600	14-11	26	$1,690,000	$117,700	26	$0	$0	Si	$523,300
5	CC	1090987537	SANABRIA ERIKA	X																	230301	26	$1,990,445	$318,500	EPS005	26	$1,990,445	$79,700	CCF36	26	$1,990,445	$79,700	14-11	26	$1,990,445	$138,600	26	$0	$0	Si	$616,500
6	CC	13276265	TAPIAS JHONNY	X																	230301	26	$1,126,667	$180,300	EPS005	26	$1,126,667	$45,100	CCF36	26	$1,126,667	$45,100	14-11	26	$1,126,667	$78,500	26	$0	$0	Si	$349,000
Total	**Afiliados(6)**																						$8,149,557	$1,304,100			$10,140,002	$405,900			$10,140,002	$405,900			$10,140,002	$706,100		$0	$0		$2,822,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901891407	4	UNION TEMPORAL INTERRESERVORIOS NORTE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 2N # 6E -12 QUINTA ORIENTAL	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5491077	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1158700426	9479657044	E	2025/01/03	2024/12/30	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,822,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,304,100	$0	$0	$1,304,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$270,400	$0	$0	$270,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,033,700	$0	$0	$1,033,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$706,100	$0	$0	$706,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$706,100	$0	$0	$706,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$405,900	$0	$0	$405,900
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	6	$405,900	$0	$0	$405,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$405,900	$0	$0	$405,900
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	$79,700	$0	$0	$79,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$79,700	$0	$0	$79,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$246,500	$0	$0	$246,500
TOTAL				6	$2,822,000	$0	$0	$2,822,000
