ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FINAL	FECHA 28/11/2024
CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	26/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 6.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA – CACOM – 6, cancelará al contratista por cumplimiento de las actividades contratadas así:

No. PAGO	VALOR PAGO	PAC
PRIMER PAGO	SEGÚN FACTURACION A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	OCTUBRE
SEGUNDO PAGO	SEGÚN FACTURACION CORTE 31 DE OCTUBRE de 2024	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025

La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal del año 2024.

NOTA 1: Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos:

1. Factura en Original por valor total del contrato.
2. Planilla de los Pagos Parafiscales.
3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales.
4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción.
5. Constancia de publicación de la factura en el SECOP II.
6. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual.

CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	417.332,074,33
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	31 de octubre de 2024
FECHA DE INICIO	12 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/10/2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 6. **(MODIFICACIÓN DE LA FORMA DE PAGO)**
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA – CACOM – 6, cancelará al contratista por cumplimiento de las actividades contratadas así:

No. PAGO	VALOR PAGO	PAC
PRIMER PAGO	SEGÚN FACTURACION A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	NOVIEMBRE
SEGUNDO PAGO	SEGÚN FACTURACION CORTE 15 DE NOVIEMBRE de 2024	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025

La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal del año 2024.

NOTA 1: Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos:

1. Factura en Original por valor total del contrato.
2. Planilla de los Pagos Parafiscales.
3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales.
4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción.
5. Constancia de publicación de la factura en el SECOP II.

	6. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual.
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	15 de noviembre de 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 417.332,074,33**

En Tres Esquinas, Caquetá, el día 28 del mes de noviembre de 2024, el señor **CR. WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO,** en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA** COLOMBIANA y el señor **EDWIN JAVIER PASTOR SILVA** en su condición de contratista; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Actividades de obra descritas en el contrato principal y recibidas a satisfacción	01	Se anexa cuadro de ejecución de actividades de obra (corte 02de obra final) y documentos que soportan lo referenciado.
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS** (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JOSÉ ENRIQUE GARCÍA AVENDAÑO	RESIDENTE DE OBRA	A2242017-1032430856
LEIDY TATIANA BERMÚDEZ CAPERA	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL Y/O SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RESOLUCIÓN No. 9150 de 20 de junio de 2021

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

Incrementa el valor del bien:

SI: X NO: ____ Valor del incremento:

Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:

SI: __X__ NO: ____ Años a incrementar: __3 AÑOS_____

En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:

SI__X__ NO ___

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO	No DE INVENTARIO	ACTIVO FIJO	VALOR
HORNO INCINERADOR NUEVO	800405000000000000599775	163600000576	**$ 242,458,935.89**
		TOTAL, AUMENTO DE VIDA UTIL CORTE 02	**$ 242,458,935.89**

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$417.332,074,33	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ 0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$417.332,074,33	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL - CORTE PARCIAL DE OBRA No. 1 PAC NOVIEMBRE	$ 134,266,483.16	El contratista emitió factura No. FVEC 111 del 23 de octubre de 2024
SEGUNDO PAGO PARCIAL - CORTE PARCIAL DE OBRA No. 2 PAC DICIEMBRE	$ 283,065,591.17	El contratista emitió factura No. FVEC 115 del 27 de noviembre de 2024
SALDO	**$0.00**	

OBSERVACIONES


Al ser el ultimo corte de obra se entregan los siguientes anexos:

- ✓ Planos record en físico y digital
- ✓ Bitácora en físico
- ✓ Balance Final de obra
- ✓ Informe final de obra

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



EDWIN JAVIER PASTOR SILVA
CONTRATISTA



ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
SUPERVISOR



CR. WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO
ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**CACOM-6**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD**
Ordenador del Gasto	**CACOM-6**
No. Contrato	**036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024**
Objeto del contrato	**ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR PARA EL CACOM 6**
Valor inicial del contrato	**$ 417,332,074.33**
Adición	**$ 0.00**
Reducción	**$ 0.00**
Valor final del contrato	**$ 417,332,074.33**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-01-01-001-002-11	10		OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	CONSTRUCCION Y ADECUACION III FASE DEL HORNO INCINERADO (APOYO COFAC - JEMFA)	**$ 348,572,665.78**
02-02-02-005-004-01-2	10		SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	SERVICIOS DE CONSTRUCCION III FASE HORNO INCINERADO (APOYO COFAC - JEMFA)	**$ 68,759,408.55**
TOTAL VIGENCIA **2024**					**$ 417,332,074.33**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 417,332,074.33**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0.00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	NOVIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-001-002-11 REC 10	N/A	CONSTRUCCION Y ADECUACION III FASE DEL HORNO INCINERADO (APOYO COFAC - JEMFA)	**$ 106,113,729.89**	$ 134,266,483.16	$ 242,458,935.89
				02-02-02-005-004-01-2 REC 10	N/A	SERVICIOS DE CONSTRUCCION III FASE HORNO INCINERADO (APOYO COFAC - JEMFA)	**$ 28,152,753.27**		$ 40,606,655.28
1	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-001-002-11 REC 10	N/A	CONSTRUCCION Y ADECUACION III FASE DEL HORNO INCINERADO (APOYO COFAC - JEMFA)	**$ 242,458,935.89**	$ 283,065,591.17	$ 0.00
				02-02-02-005-004-01-2 REC 10	N/A	SERVICIOS DE CONSTRUCCION III FASE HORNO INCINERADO (APOYO COFAC - JEMFA)	**$ 40,606,655.28**		$ 0.00
TOTALES							**$ 417,332,074.33**	**$ 417,332,074.33**	**$ 0.00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. BAUTISTA GARCIADIDSON STIWARD
FECHA	28/11/2024

EDWIN JAVIER PASTOR SILVA

NIT. 80031665 1 Regimen Común

I N G E N I E R O C I V I L

M.P. 25202 - 186430 CND

Factura Electrónica De Venta N°	**FVEC 115**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764082097297 que habilita desde FVEC 113 hasta FVEC 150. Vence 2025-04-24

CLIENTE	LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEREA COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE N°6				
NIT	800141638 5	**TELÉFONO**	608 3136858214 Ext 000	**FORMA DE PAGO**	Credito

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**FECHA FACTURA**	**FECHA VENCIMIENTO**
SOLANO - CAQUETA	Solano	27/11/2024	30/11/2024

POR CONCEPTO DE

VALOR ACTA PARCIAL N° 2 del contrato N° 036-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024 cuyo objeto es: ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N° 6

#$15-01-05-008; Contrato 036-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024; didson.bautista@fac.mil.co

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	*S-010*	Obra Civil AIU *COSTOS DIRECTOS ACTA PARCIAL N° 2 POR CONCEPTO DE ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AERO DE COMBATE N° 6.*	*1,00*	*Und.*	*$281.820.338,51*	*19%*	*$281.820.338,51*

Total Items 1

SUBTOTAL	$281.820.338,51
IVA 19%	$1.245.252,66
TOTAL FACTURA	**$283.065.591,17**

DESCRIPCION	%	VALOR
Administracion	25	$54.616.344,67
Imprevistos	1	$2.184.653,79
Utilidad	3	$6.553.961,36

Valor en Letras

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica


Fecha y Hora de Generacion 27/11/2024 11:44:07


CRA 80 # 8-11 int 4 apt 514 Teléfono 3158959273 Bogota D.C.

Correo Electrónico edwinjavier.pastor@gmail.com

Cuenta de ahorros N° 37226233556 de BANCOLOMBIA

CUFE: 6ed6bd01c109dacf54112ef95a9fb49c8d866387907ae89b322862aa07ec7b3b685349680a91b805ee9741d1c881add3--Expedición:27/11/2024 12:25 PM

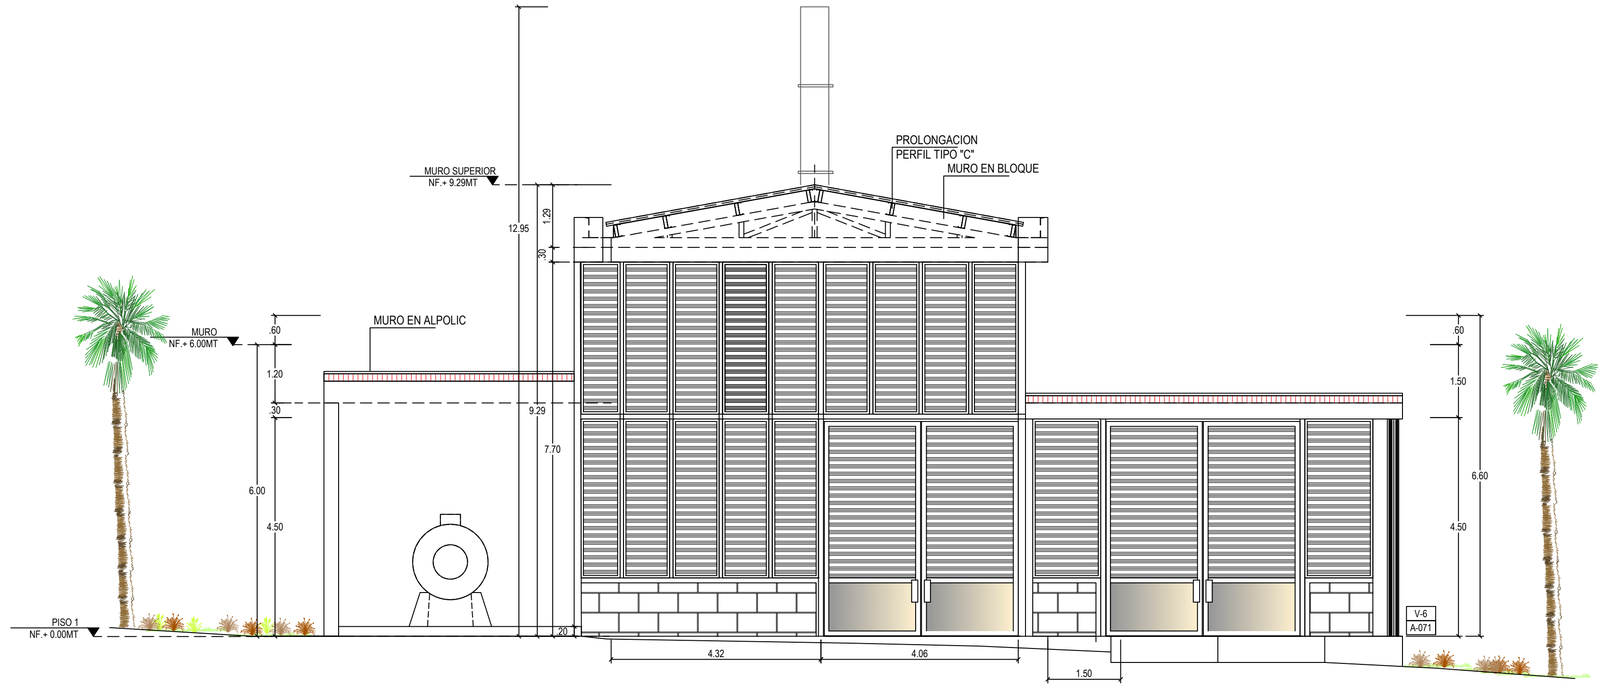

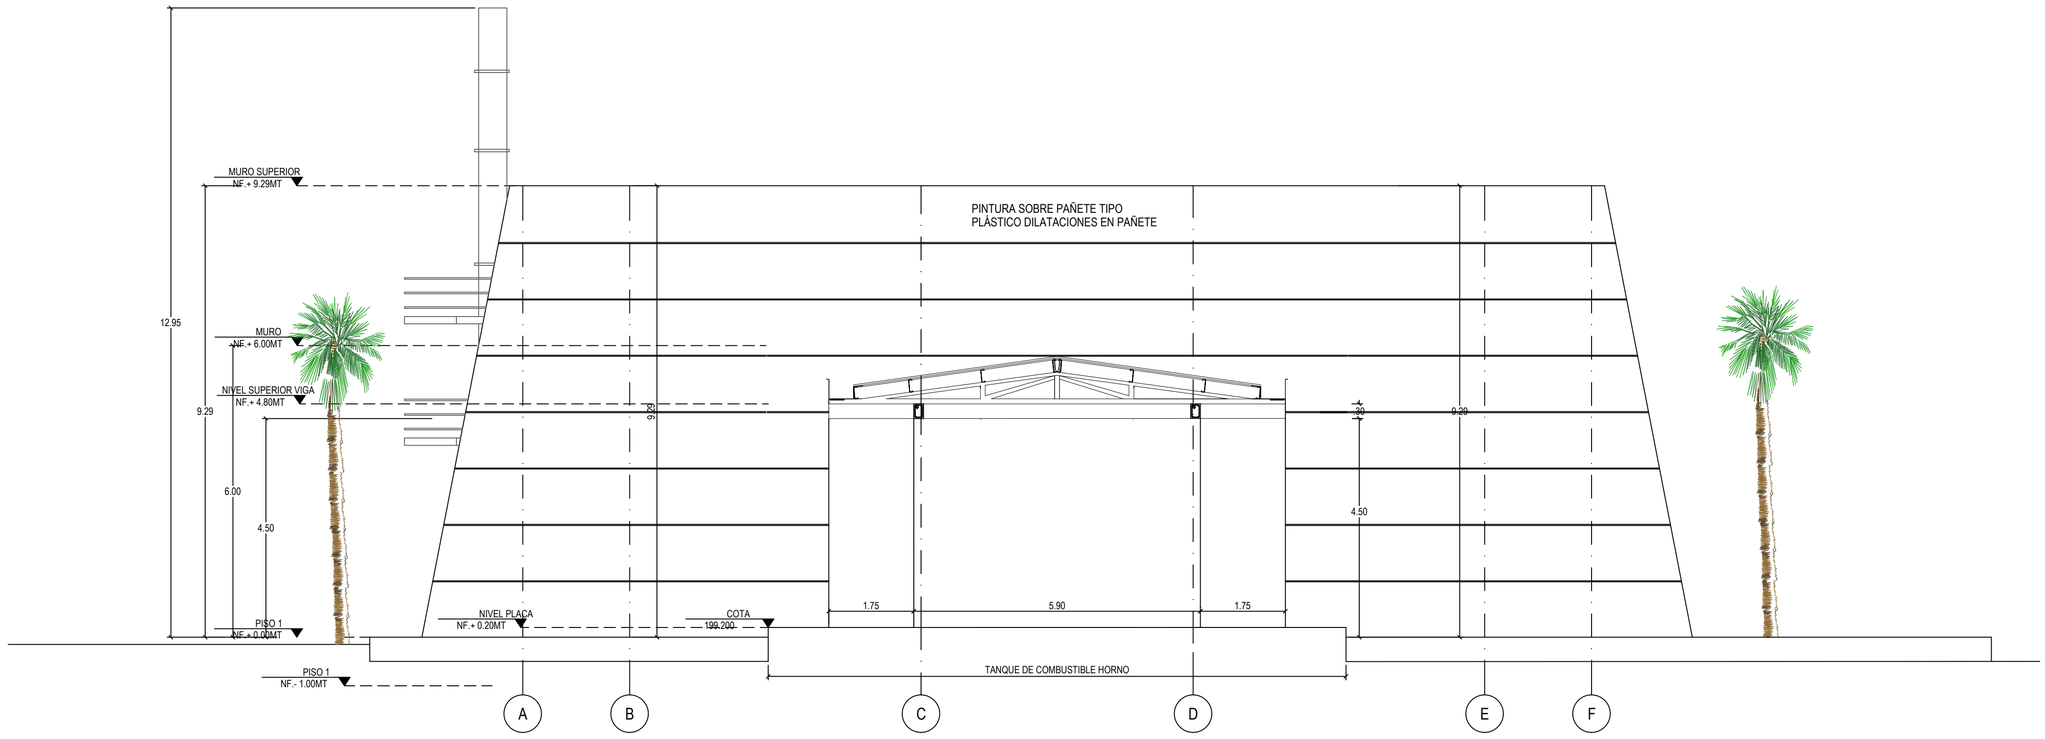

1 FACHADAS
1:75

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA
DIRECCION
DE INFRAESTRUCTURA

UNIDAD O GUARNICION
CACOM-6
TRES ESQUINAS-CAQUETÁ
"Capitán Ernesto Esguerra Cubides"

PROYECTO:
"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SISTEMA INCINERADOR DE RESIDUOS"

REVISIONES:
No. Fecha. Revisiones.
△

OBSERVACIONES:
ACTUALIZACION PLANOS SEGUN LO EJECUTADO DENTRO DEL CONTRATO 036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.

DISEÑO:
AS-D02. MANUEL A. UBAQUE L.
ARQUITECTO ASESOR DIFRA
MAT. N°.2570055361 CND

REVISO:
ST. JONATHAN RODRIGUEZ G.
ARQUITECTO ASESOR DIFRA
Mat. N° A2595014-1053789845 CLD

DIBUJO:
TA.21 ANGELICA RUIZ GOMEZ
DELINEANTE DE ARQ. E ING.

No. PROYECTO:
FAC2019-010

CONTIENE:
A-102-PL

FACHADAS


FECHA:
NOVIEMBRE 2024

FASE: FASE C
VERSION: VERSION 2

ESCALA:
1:75

PLANCHA No:
2 DE 6

Ruta Archivo: c:\users\edu\in\onedrive\documentos\planos\planos recard fac 036.dwg
Impreso por: EDWIN PASTOR en:lun 11 noviembre 2024

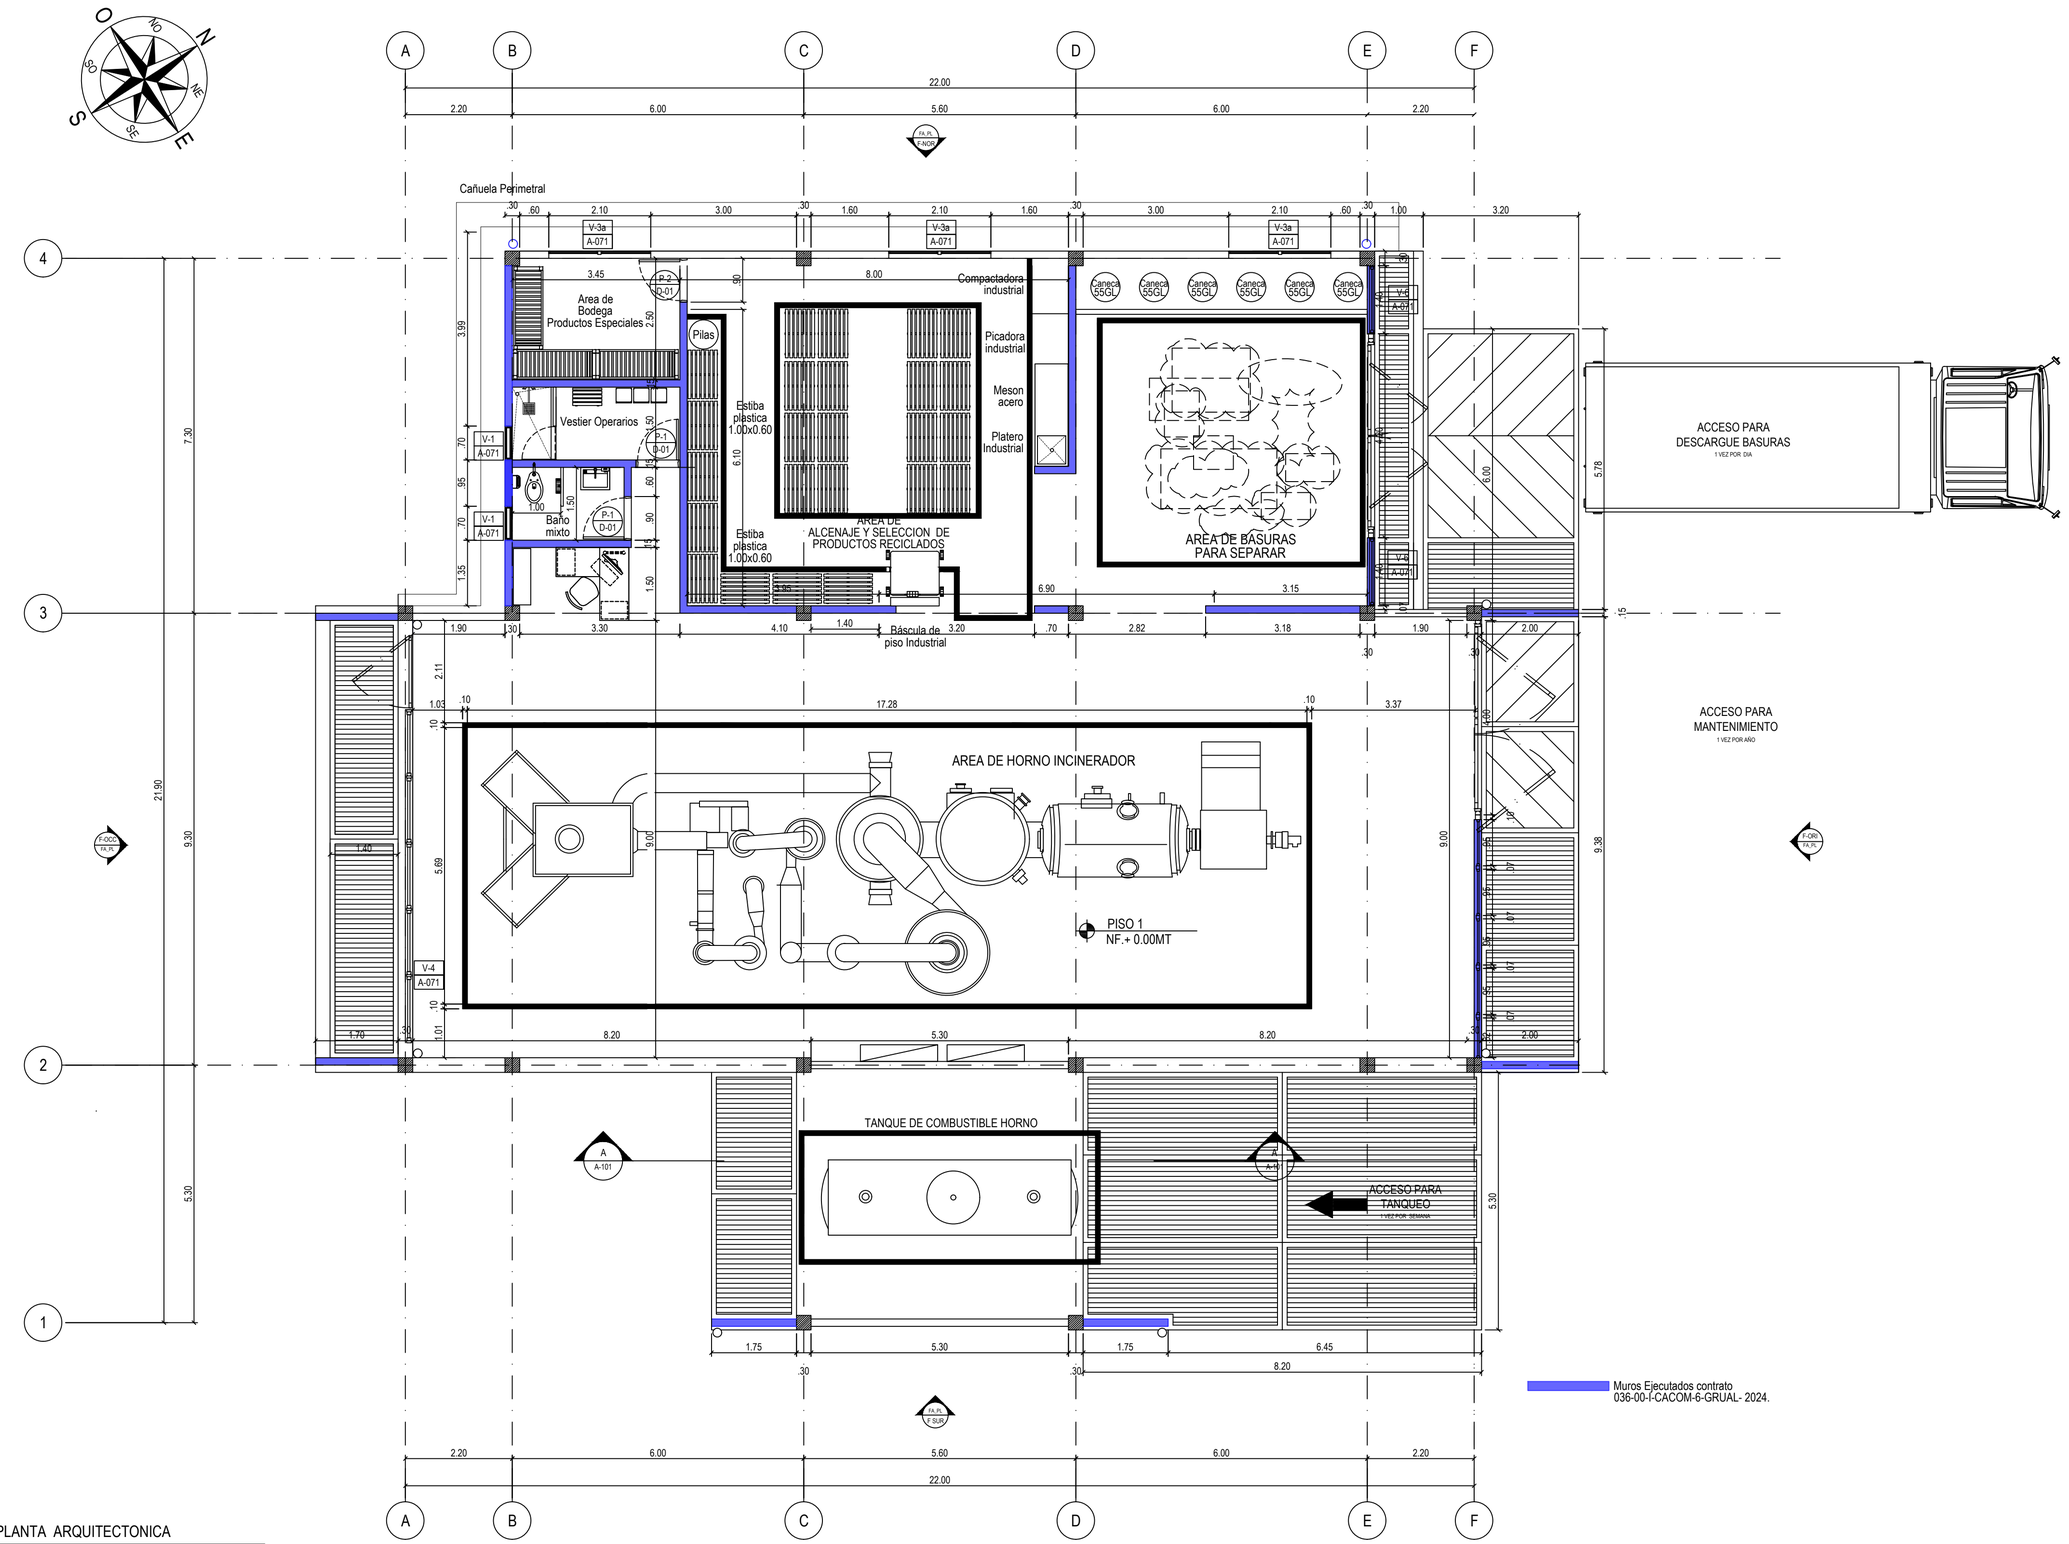

1 PLANTA ARQUITECTONICA
1:75

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA
DIRECCION
DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD O GUARNICION
CACOM-6
TRES ESQUINAS-CAQUETÁ
"Capitán Ernesto Esguerra Cubides"

PROYECTO:

"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SISTEMA INCINERADOR DE RESIDUOS"

REVISIONES:

No.	Fecha.	Revisiones.
△		

OBSERVACIONES:

ACTUALIZACION PLANOS SEGUN LO EJECUTADO DENTRO DEL CONTRATO 036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.

DISEÑO:

AS-D02. MANUEL A. UBAQUE L.
ARQUITECTO ASESOR DIFRA
MAT. N°.2570055361 CND

REVISO:

ST. JONATHAN RODRIGUEZ G.
ARQUITECTO ASESOR DIFRA
Mat. N° A25952014-1053789845 CLD

DIBUJO:

TA.21 ANGELICA RUIZ GOMEZ
DELINEANTE DE ARQ. E ING.

No. PROYECTO:
FAC2019-010

CONTIENE:
A-101-PL


PLANTA ARQUITECTONICA


FECHA:
NOVIEMBRE 2024

FASE:	VERSION:
FASE C	VERSION 2

ESCALA:
1:75

PLANCHA No:
1 DE 6

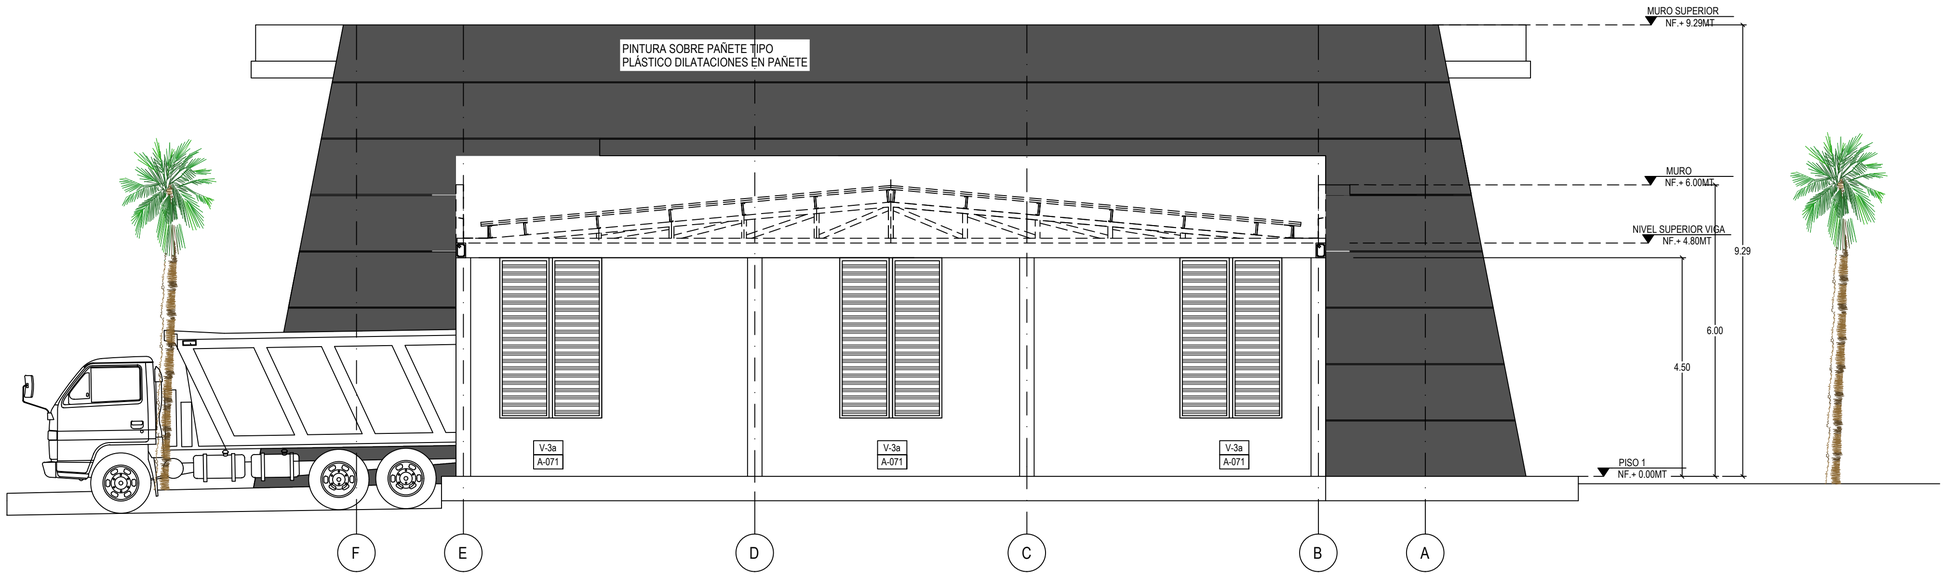

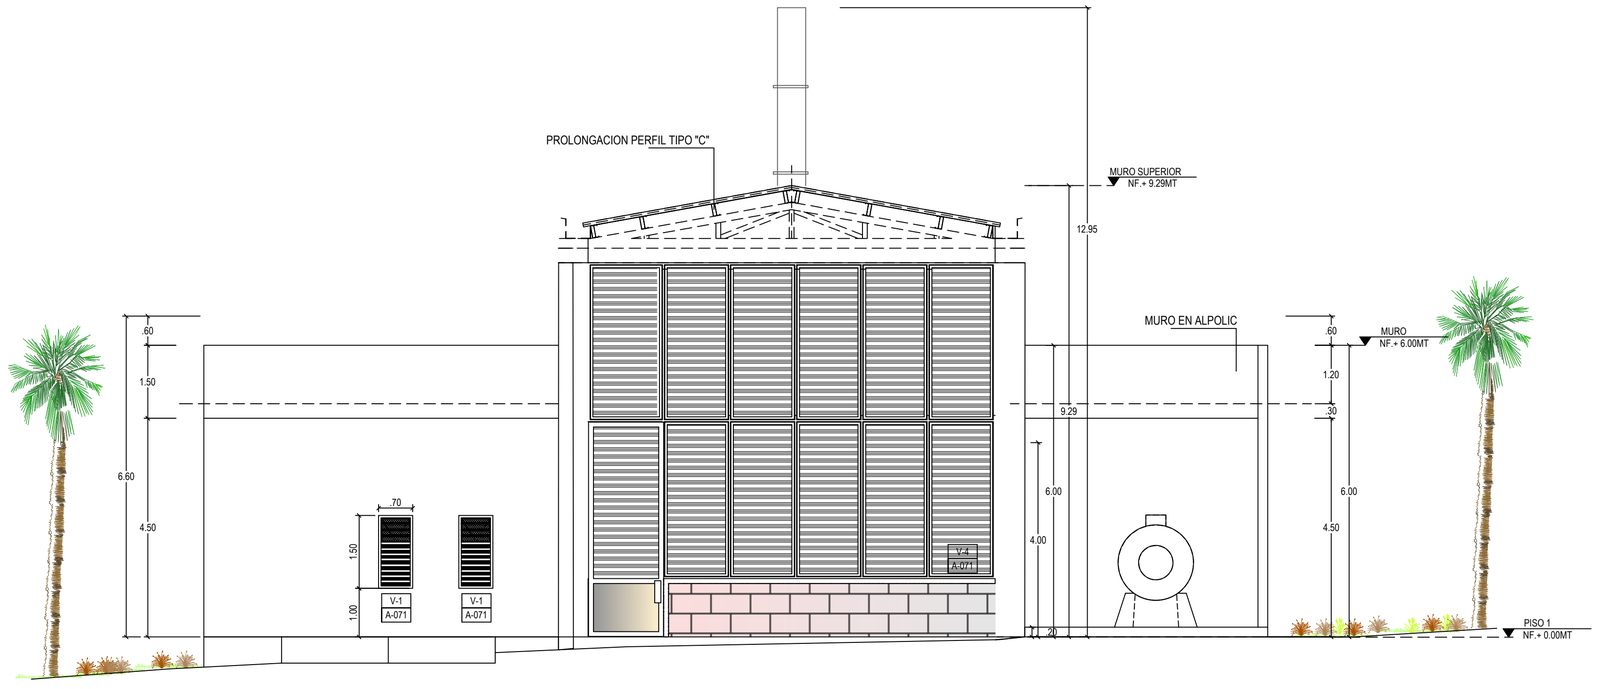

1 FACHADAS
1:75

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA
DIRECCION
DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD O GUARNICION
CACOM-6
TRES ESQUINAS-CAQUETÁ
"Capitán Ernesto Esguerra Cubides"

PROYECTO:
"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SISTEMA INCINERADOR DE RESIDUOS"

REVISIONES:
No. Fecha. Revisiones.
△

OBSERVACIONES:
ACTUALIZACION PLANOS SEGUN LO EJECUTADO DENTRO DEL CONTRATO 036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.

DISEÑO:
AS-D02. MANUEL A. UBAQUE L.
ARQUITECTO ASESOR DIFRA
MAT. Nº.2570055361 CND

REVISO:
ST. JONATHAN RODRIGUEZ G.
ARQUITECTO ASESOR DIFRA
Mat. N° A25952014-1053789845 CLD

DIBUJO:
TA.21 ANGELICA RUIZ GOMEZ
DELINEANTE DE ARQ. E ING.

No. PROYECTO:
FAC2019-010

CONTIENE:
A-103-PL


FACHADAS

FECHA:
NOVIEMBRE 2024

FASE: FASE C
VERSION: VERSION 2

ESCALA:
1:75

PLANCHA No:
3 DE 6

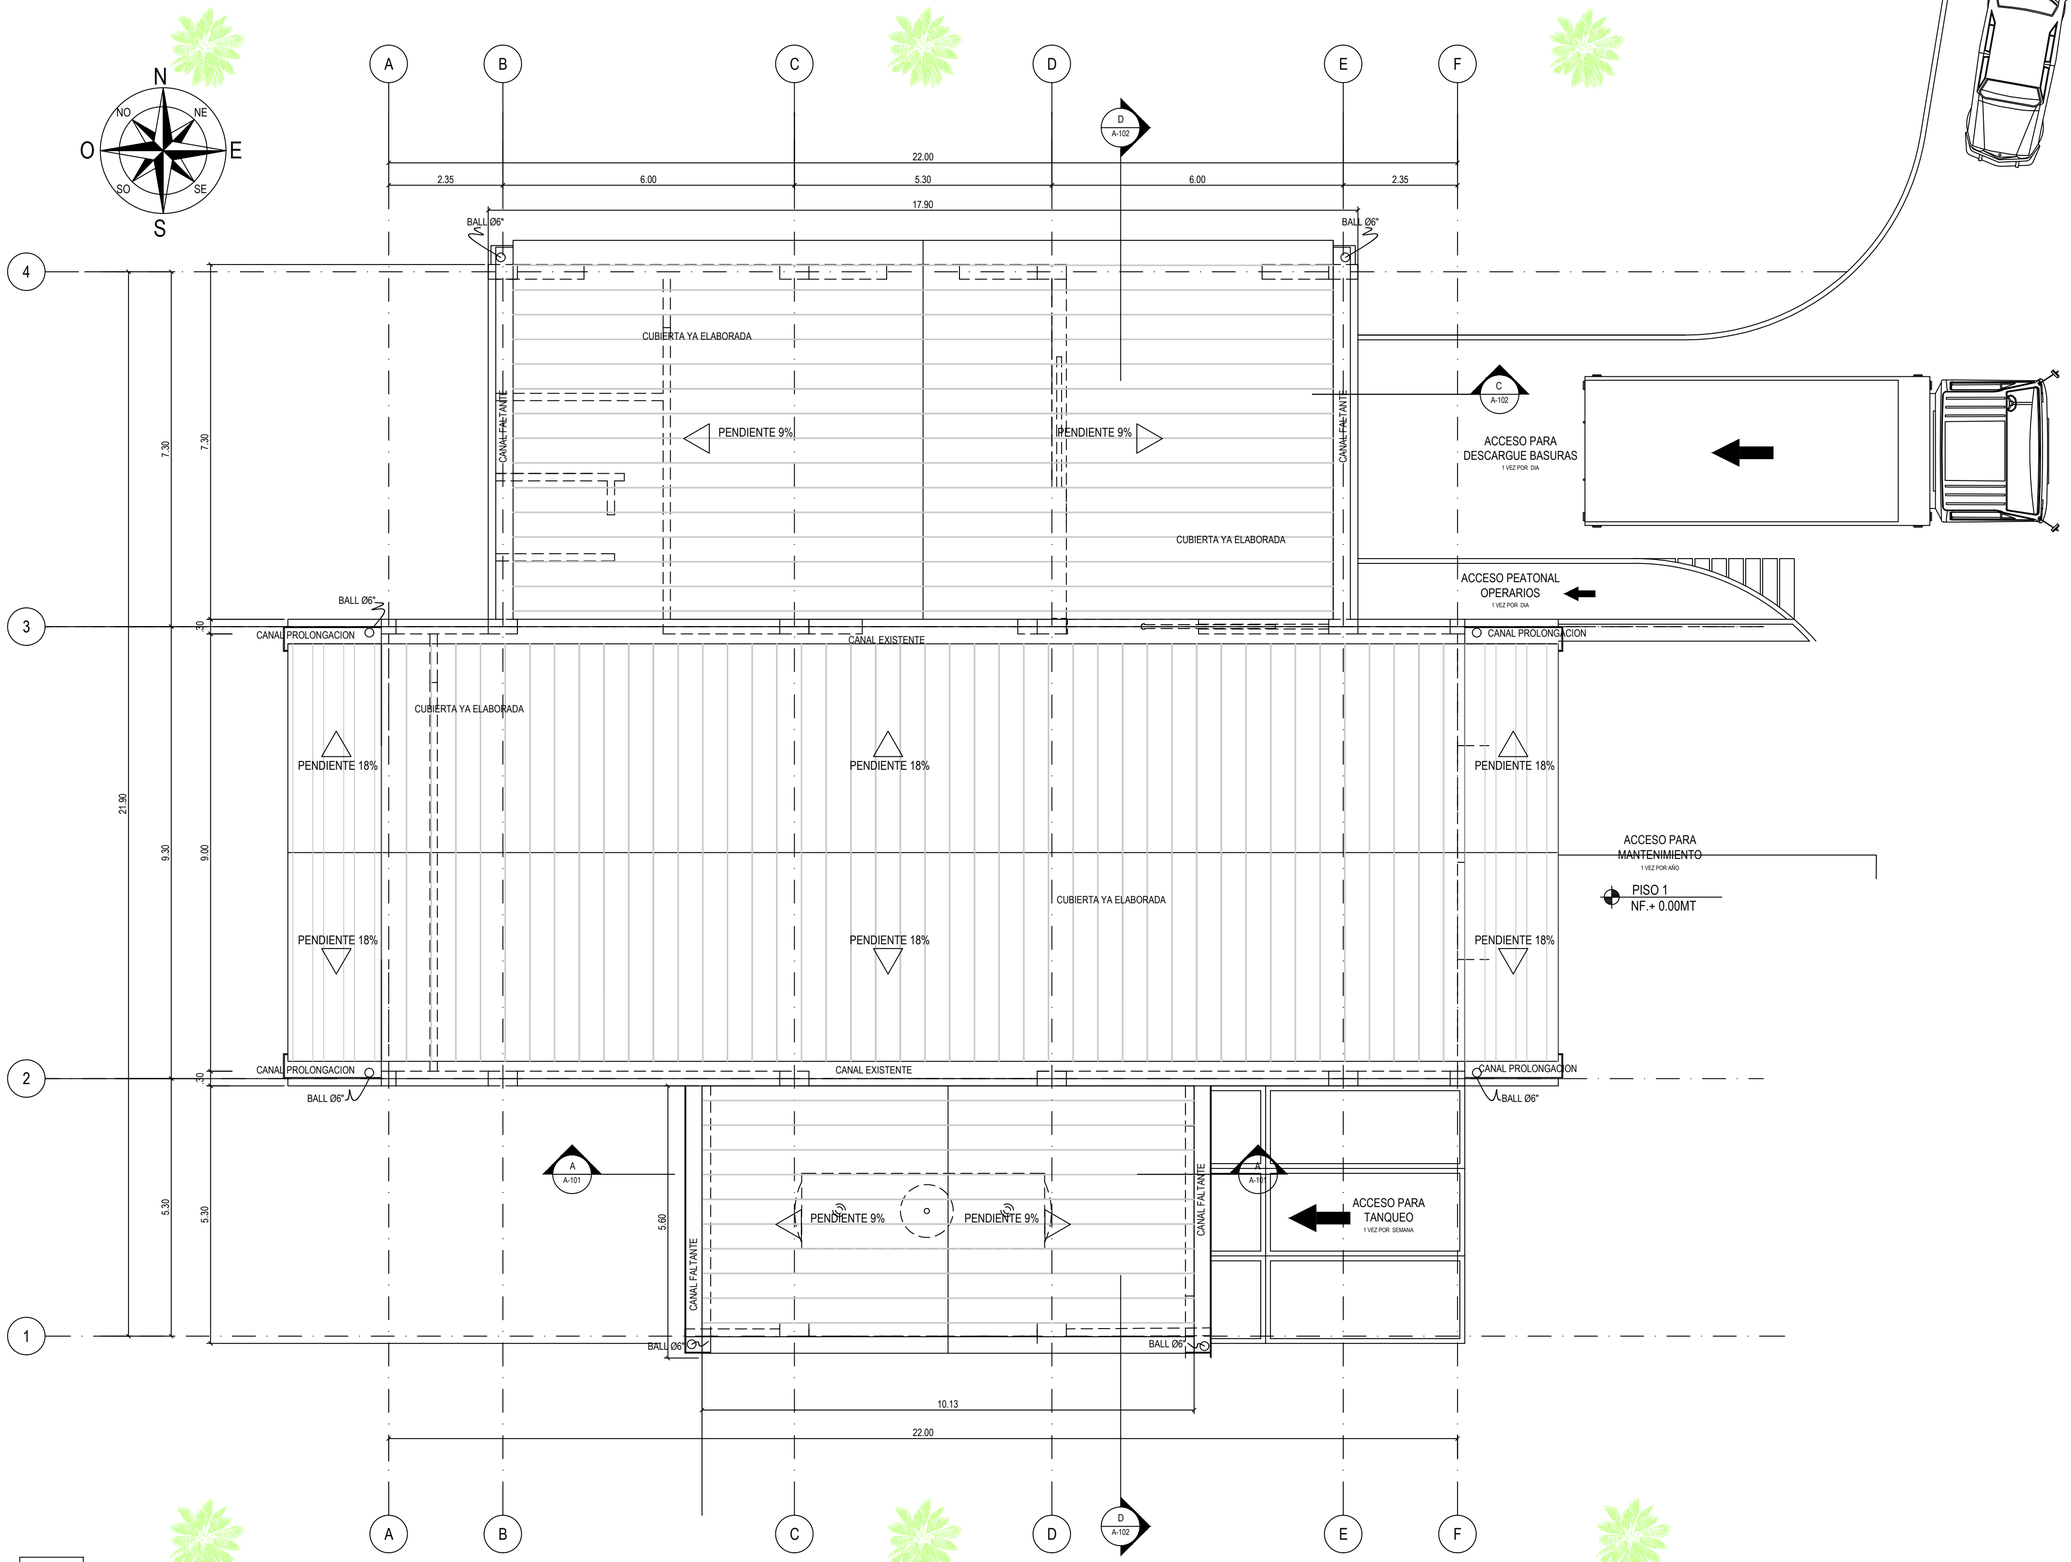

1 PLANTA ARQUITECTONICA DE CUBIERTA
1:75

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA
DIRECCION
DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD O GUARNICION
CACOM-6
TRES ESQUINAS-CAQUETÁ
"Capitán Ernesto Esguerra Cubides"

PROYECTO:
"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SISTEMA INCINERADOR DE RESIDUOS"

REVISIONES:
No. Fecha. Revisiones.

OBSERVACIONES:
ACTUALIZACION PLANOS SEGUN LO EJECUTADO DENTRO DEL CONTRATO 036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.

DISEÑO:
AS-D02. MANUEL A. UBAQUE L.
ARQUITECTO ASESOR DIFRA
MAT. N°.2570055361 CND

REVISO:
ST. JONATHAN RODRIGUEZ G.
ARQUITECTO ASESOR DIFRA
Mat. N° A25952014-1053789845 CLD

DIBUJO:
TA.21 ANGELICA RUIZ GOMEZ
DELINEANTE DE ARQ. E ING.

No. PROYECTO:
FAC2019-010

CONTIENE:
A-104-PL


PLANTA ARQUITECTONICA
DE CUBIERTA

FECHA:
NOVIEMBRE 2024

FASE: FASE C
VERSION: VERSION 2

ESCALA:
1:75

PLANCHA No:
4 DE 6

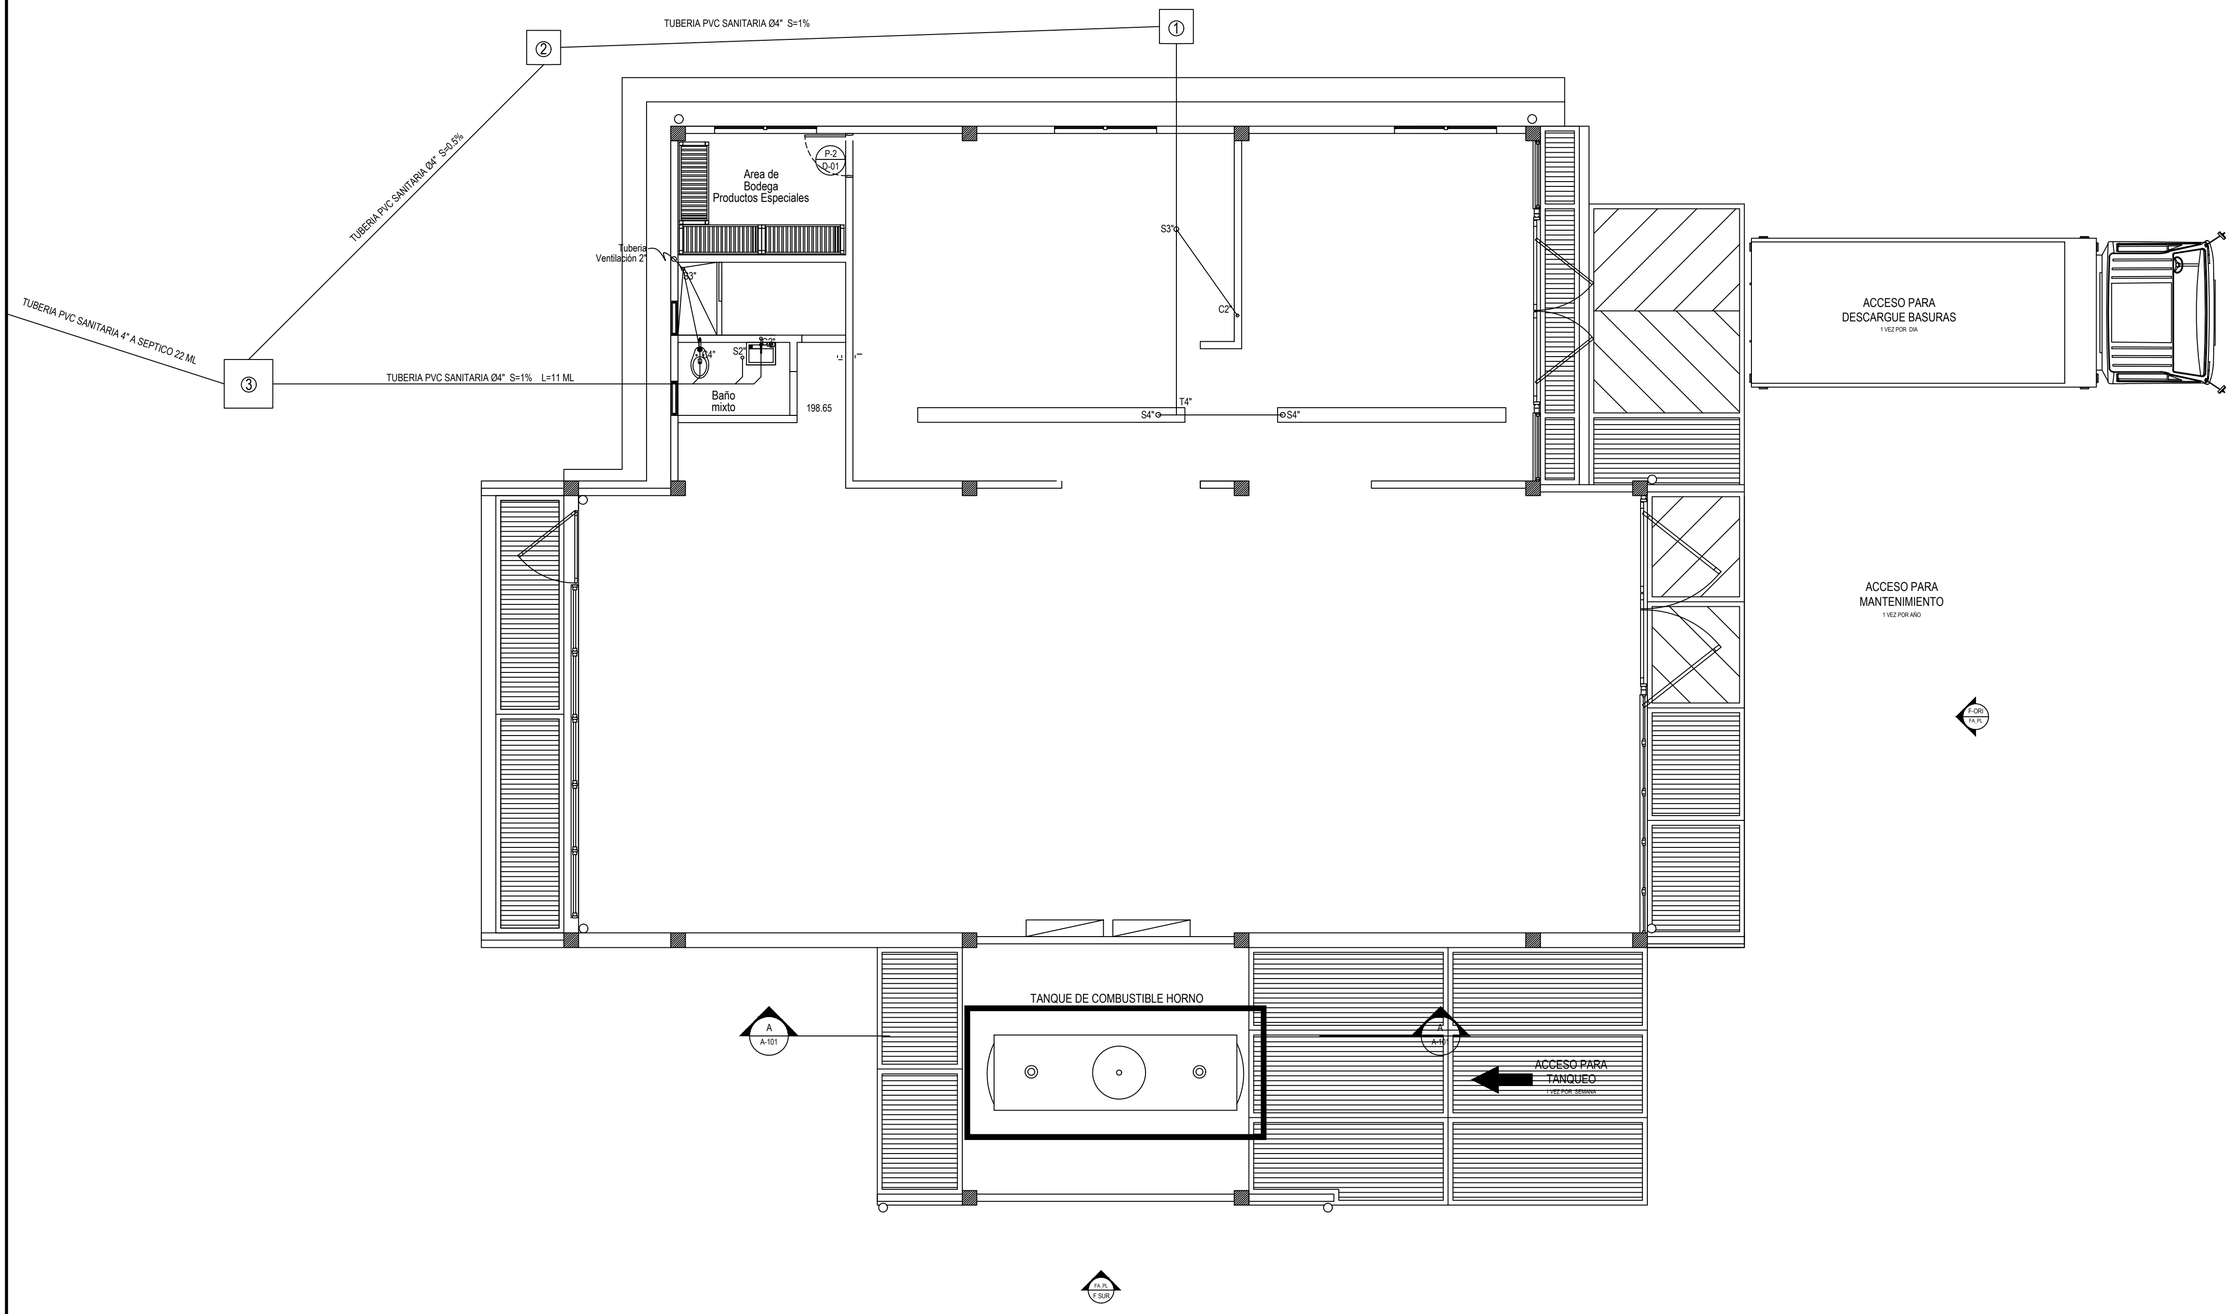

1 PLANTA RED SANITARIA
1:75

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

FUERZA AEREA

DIRECCION
DE INFRAESTRUCTURA

UNIDAD O GUARNICION

CACOM-6
TRES ESQUINAS-CAQUETÁ
"Capitán Ernesto Esguerra Cubides"

PROYECTO:

"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SISTEMA INCINERADOR DE RESIDUOS"

REVISIONES:

No.	Fecha.	Revisiones.
△		

OBSERVACIONES:

ACTUALIZACION PLANOS SEGUN LO EJECUTADO DENTRO DEL CONTRATO 036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.

DISEÑO:

AS-D02. MANUEL A. UBAQUE L.
ARQUITECTO ASESOR DIFRA
MAT. N°.2570055361 CND

REVISO:

ST. JONATHAN RODRIGUEZ G.
ARQUITECTO ASESOR DIFRA
Mat. N° A25952014-1053789845 CLD

DIBUJO:

TA.21 ANGELICA RUIZ GOMEZ
DELINEANTE DE ARQ. E ING.

No. PROYECTO:
FAC2019-010

CONTIENE:
105


PLANTA SANITARIA

FECHA:
NOVIEMBRE 2024

FASE:	VERSION:
FASE C	VERSION 2

ESCALA:
1:75

PLANCHA No:
5 DE 6

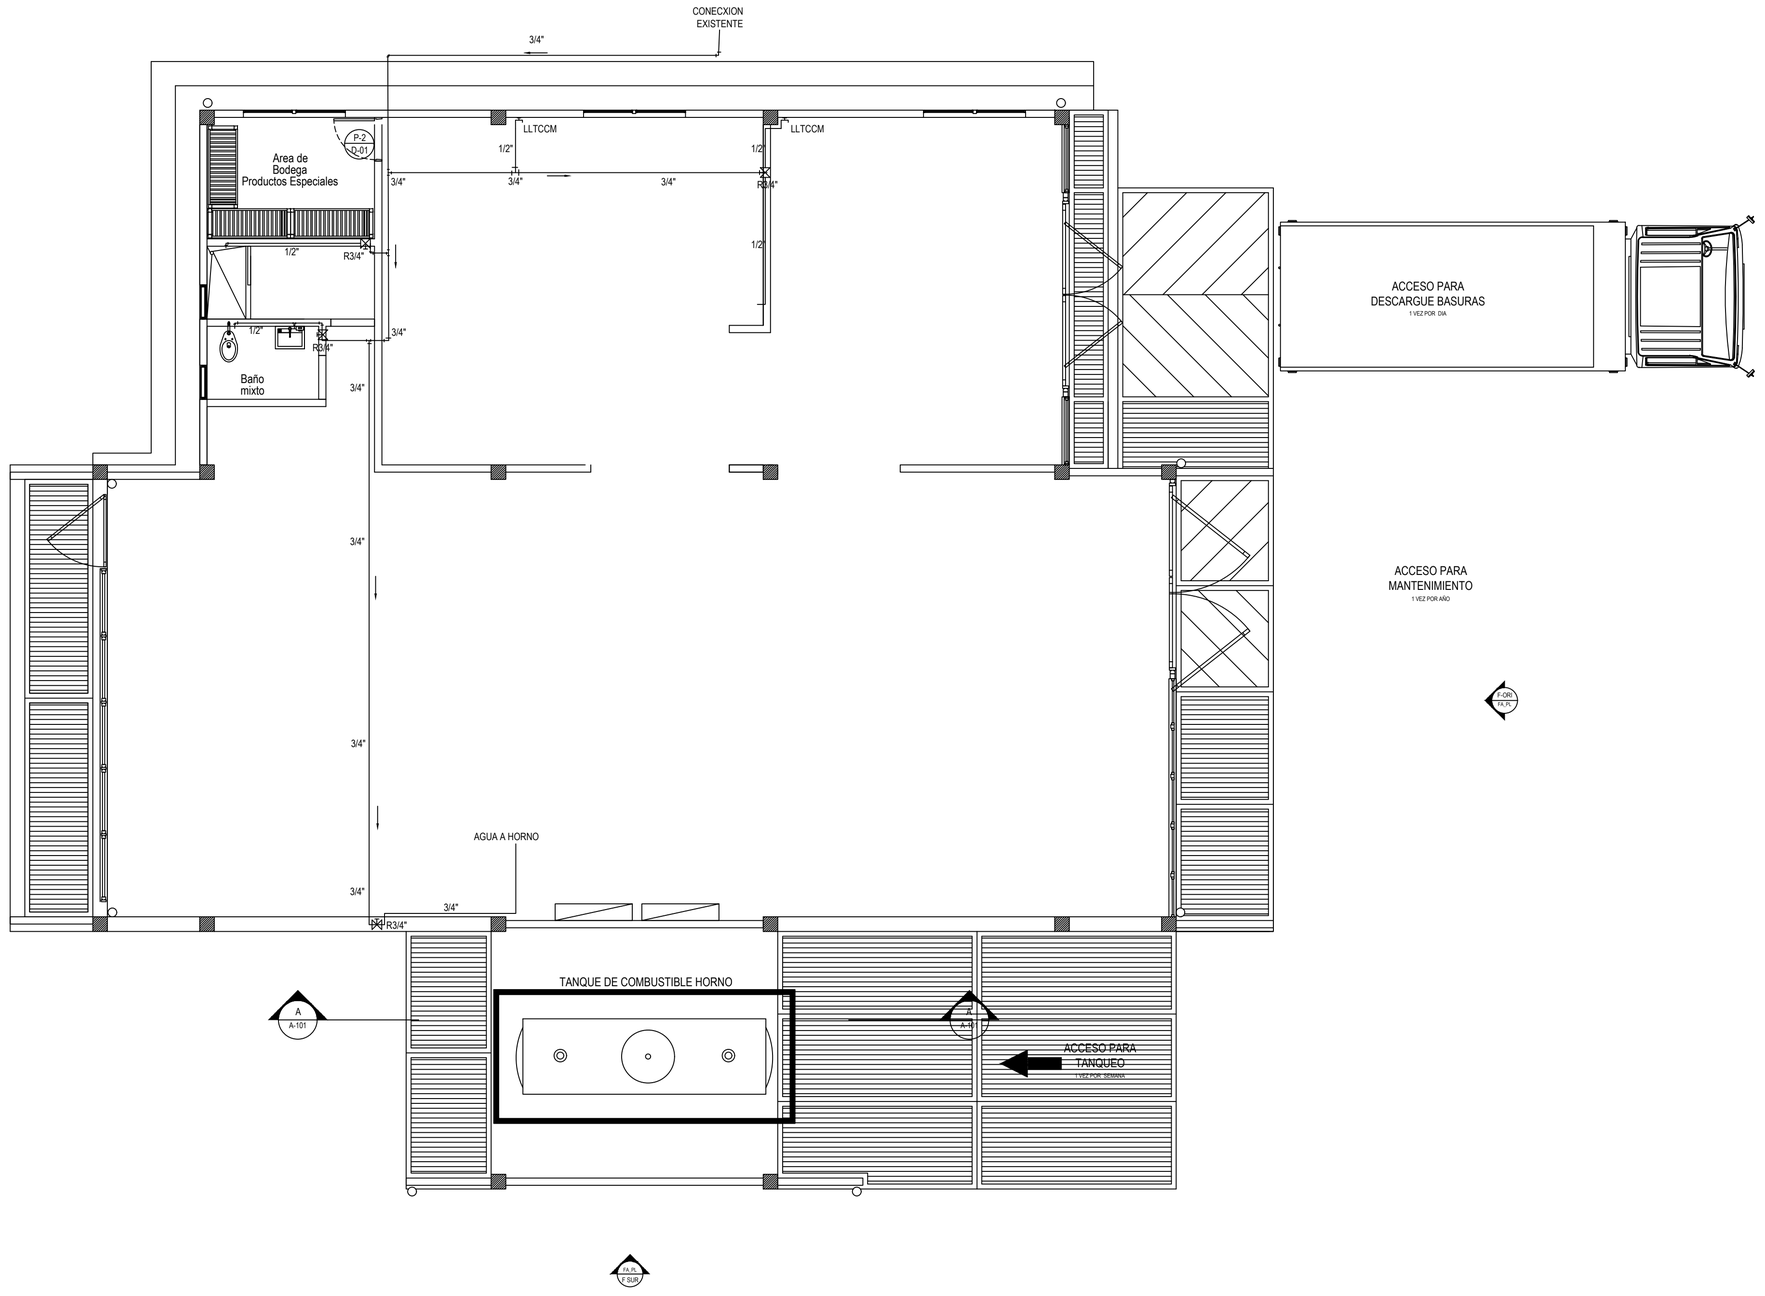

1 PLANTA RED SUMINISTRO AGUA POTABLE
1:75

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

FUERZA AEREA

DIRECCION
DE INFRAESTRUCTURA

UNIDAD O GUARNICION

CACOM-6
TRES ESQUINAS-CAQUETÁ
"Capitán Ernesto Esguerra Cubides"

PROYECTO:

"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SISTEMA INCINERADOR DE RESIDUOS"

REVISIONES:

No.	Fecha.	Revisiones.
△		

OBSERVACIONES:

ACTUALIZACION PLANOS SEGUN LO
EJECUTADO DENTRO DEL CONTRATO
036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.

DISEÑO:

AS-D02. MANUEL A. UBAQUE L.
ARQUITECTO ASESOR DIFRA
MAT. N°.2570055361 CND

REVISO:

ST. JONATHAN RODRIGUEZ G.
ARQUITECTO ASESOR DIFRA
Mat. N° A25952014-1053789845 CLD

DIBUJO:

TA.21 ANGELICA RUIZ GOMEZ
DELINEANTE DE ARQ. E ING.

No. PROYECTO:

FAC2019-010

CONTIENE:

105

PLANTA RED DE
SUMINISTRO AGUA
POTABLE

FECHA:
NOVIEMBRE 2024

FASE:	VERSION:
FASE C	VERSION 2

ESCALA:
1:75

PLANCHA No:
5 DE 6

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-092
	FORMATO BALANCE DE OBRA	Versión	7
		Vigencia	9/08/2024

INFORMACION GENERAL	
FECHA DE BALANCE	16 de noviembre de 2024
CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°6
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD

ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA

No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO			BALANCE A LA FECHA				JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES CANTIDADES		
1	**PRELIMINARES**									
1,1	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m³	67,00	$ 37.858,00	$ 2.536.486,00	44,43	$ 1.682.078,16	- 22,57	MENOR	
1,2	CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA	m3	10,00	$ 272.862,00	$ 2.728.620,00	46,78	$ 12.763.590,81	36,78	MAYOR	
1,3	DEMOLICION DE MUROS CON RETIRO DE ESCOMBROS	m²	30,00	$ 31.608,00	$ 948.240,00	21,29	$ 672.776,28	- 8,72	MENOR	
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**									
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN SEGÚN PLANOS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO DE 0 - 2,00 MTS.	m³	77,00	$ 62.632,00	$ 4.822.664,00	159,26	$ 9.974.863,94	82,26	MAYOR	
3	**CIMENTACION**									
3.1	COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE HASTA ALCANZAR CBR=95% DEL PROCTOR MODIFICADO	m²	70,00	$ 21.933,00	$ 1.535.310,00	105,74	$ 2.319.085,76	35,74	MAYOR	
3.2	RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE PREPARADA CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA REGIÓN (REMONTA) Y CEMENTO AL 6% SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	m³	100,10	$ 181.979,00	$ 18.216.097,90	68,73	$ 12.507.007,22	- 31,37	MENOR	
4	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**									
4,1	CONSTRUCCION DE PLACA MACIZA SOBRE TERRENO EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.25 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M²	70,00	$ 404.453,00	$ 28.311.710,00	107,92	$ 43.646.545,50	37,92	MAYOR	
5,00	**MAMPOSTERIA**									
5,1	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 (0.33X0.115X0.23) MTS. DE PERFORACION VERTICAL, INCLUYE ACERO DE REFUERZO VERTICAL, MORTERO DE RELLENO Y PEGA MAS ANCLAJE A PLACAS CONTRAPISO Y ENTREPISO.	m2	430,00	$ 126.692,00	$ 54.477.560,00	199,22	$ 25.238.946,78	- 230,79	MENOR	
6	**REDES HIDRO SANITARIAS**									
6.1	**REDES SANITARIAS**									
6.1.1	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4"	ml	30,00	$ 40.291,00	$ 1.208.730,00	53,20	$ 2.143.481,20	23,20	MAYOR	
6.1.2	TUBERÍA DE VENTILACIÓN Ø 1 1/2"	ml	8,00	$ 20.862,00	$ 166.896,00	-	$ -	- 8,00	MENOR	
6.1.3	TUBERÍA DE VENTILACIÓN Ø 2"	ml	10,00	$ 28.495,00	$ 284.950,00	3,00	$ 85.485,00	- 7,00	MENOR	
6.1.4	SIFÓN Ø 3X2"	un	1,00	$ 52.549,00	$ 52.549,00	4,00	$ 210.196,00	3,00	MAYOR	
6.1.5	SIFÓN Ø 4X3"	un	4,00	$ 67.652,00	$ 270.608,00	3,00	$ 202.956,00	- 1,00	MENOR	
6.1.6	TAPÓN DE INSPECCIÓN Ø 4"	un	3,00	$ 33.503,00	$ 100.509,00	1,00	$ 33.503,00	- 2,00	MENOR	
6.1.7	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO DE 2.400 LTS	un	1,00	$ 5.588.252,00	$ 5.588.252,00	1,00	$ 5.588.252,00	-	IGUAL	
6.1.8	TUBERIA PERFORADA 2"	ml	30,00	$ 194.668,00	$ 5.840.040,00	31,54	$ 6.140.299,34	1,54	MAYOR	
6.1.9	PRUEBA SANITARIA	un	1,00	$ 131.208,00	$ 131.208,00	2,00	$ 262.416,00	1,00	MAYOR	
6.2	**REDES HIDRUALICAS INTERNAS**									
6.2.1	REGATA PARA INSTALACION DE TUBERIA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE)	ml	75,00	$ 18.491,00	$ 1.386.825,00	95,30	$ 1.762.192,30	20,30	MAYOR	

6.2.2	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1-1/2"	ml	15,00	$ 36.097,00	$ 541.455,00	-	$ -	- 15,00	MENOR	
6.2.3	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 3/4"	ml	50,00	$ 40.347,00	$ 2.017.350,00	33,40	$ 1.347.589,80	- 16,60	MENOR	
6.2.4	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2"	ml	10,00	$ 27.304,00	$ 273.040,00	10,20	$ 278.500,80	0,20	MAYOR	
6.2.5	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"	un	4,00	$ 24.692,00	$ 98.768,00	6,00	$ 148.152,00	2,00	MAYOR	
6.2.6	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 3/4"	un	3,00	$ 59.636,00	$ 178.908,00	5,00	$ 298.180,00	2,00	MAYOR	
6.2.7	LLAVE TERMINAL CON CONEXIÓN PARA MANGUERA	un	3,00	$ 69.478,00	$ 208.434,00	3,00	$ 208.434,00	-	IGUAL	
6.2.8	PRUEBA HIDRÁULICA	un	1,00	$ 131.208,00	$ 131.208,00	1,00	$ 131.208,00	-	IGUAL	
6.2.9	DESINFECCIÓN RED HIDRÁULICA	ml	40,00	$ 5.977,00	$ 239.080,00	43,60	$ 260.597,20	3,60	MAYOR	
6.3	**INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA**									
6.3.1	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1"	ml	20,00	$ 22.894,00	$ 457.880,00	-	$ -	- 20,00	MENOR	
6.3.2	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1"	un	1,00	$ 336.992,00	$ 336.992,00	-	$ -	- 1,00	MENOR	
6.3.3	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1-1/2"	un	1,00	$ 507.675,00	$ 507.675,00	-	$ -	- 1,00	MENOR	
6.3.4	VÁLVULA DE CHEQUE Ø 1"	un	1,00	$ 89.183,00	$ 89.183,00	-	$ -	- 1,00	MENOR	
6.3.5	VÁLVULA DE CHEQUE Ø 1-1/2"	un	1,00	$ 338.928,00	$ 338.928,00	-	$ -	- 1,00	MENOR	
6.3.6	CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø 2 " .	un	1,00	$ 67.955,00	$ 67.955,00	1,00	$ 67.955,00	-	IGUAL	
6.3.7	PRUEBA HIDRÁULICA	un	1,00	$ 232.506,00	$ 232.506,00	-	$ -	- 1,00	MENOR	
6.3.8	DESINFECCIÓN RED HIDRÁULICA	ml	20,00	$ 5.977,00	$ 119.540,00	-	$ -	- 20,00	MENOR	
6.4	**AGUAS LLUVIAS**									
6.4.1	CANAL METALICA CALIBRE 14	ml	34,00	$ 194.853,00	$ 6.625.002,00	33,80	$ 6.586.031,40	- 0,20	MENOR	
6.4.2	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC Ø 6"	ml	26,00	$ 94.874,00	$ 2.466.724,00	38,00	$ 3.605.212,00	12,00	MAYOR	
6.4.3	CANAL AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO DE 21 MPA IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, FORMALETAS	m³	8,00	$ 1.270.247,00	$ 10.161.976,00	-	$ -	- 8,00	MENOR	
6.4.4	REJILLA PARA CÁRCAMO TRAFICO PESADO DE 50X50X15	ml	93,00	$ 149.550,00	$ 13.908.150,00	-	$ -	- 93,00	MENOR	
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**									
7.1.1	TUBERÍA PVC CONDUIT Ø 1/2"	ml	100,00	$ 22.390,00	$ 2.239.000,00	5,00	$ 111.950,00	- 95,00	MENOR	
7.1.2	DUCTERIA TIPO EMT DE 1 X Ø1/2" INCLUYE UNION, CURVAS, TERMINALES, SOPORTES, ANCLAJES, CAJAS DE PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS	ml	70,00	$ 59.122,00	$ 4.138.540,00	-	$ -	- 70,00	MENOR	
7.1.3	ACOMETIDA EN CABLE 3N12 CU AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 CU AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 CU AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	ml	200,00	$ 34.756,00	$ 6.951.200,00	-	$ -	- 200,00	MENOR	
7.1.4	ACOMETIDA EN CABLE 3N10 CU AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N10 CU AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 CU AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	ml	200,00	$ 39.915,00	$ 7.983.000,00	29,82	$ 1.190.261,00	- 170,18	MENOR	
7.1.5	ACOMETIDA EN CABLE 3N12 CU AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 CU AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 CU AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	ml	200,00	$ 34.756,00	$ 6.951.200,00	-	$ -	- 200,00	MENOR	
7.1.6	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, ENCHUFABLES, CUARENTA Y DOS (42) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIE	Und	1,00	$ 2.944.790,00	$ 2.944.790,00	-	$ -	- 1,00	MENOR	
8	**PAÑETES FILOS Y DILATACIONES**									
8,1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	m²	721,78	$ 19.164,00	$ 13.832.277,73	469,59	$ 8.999.270,67	- 252,19	MENOR	
9	**ACABADOS MUROS PINTURA Y ENCHAPES**									
9,1	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIÓNES)	m2	323,38	$ 29.621,00	$ 9.578.724,16	-	$ -	- 323,38	MENOR	
10	**CARPINTERIA ALUMINIO**									
10,1	V-1 VENTANERIA CORREDIZA ALUMINIO SERIE 7038 DE TRES CUERPOS Y VIDRIO DE 5 MM EN FACHADA.	Und	2,00	$ 216.062,00	$ 432.124,00	-	$ -	- 2,00	MENOR	
10,2	VENTANERIA TIPO PERSIANA ALUMINIO SERIE 7038	m²	126,00	$ 216.062,00	$ 27.223.812,00	-	$ -	- 126,00	MENOR	
10,3	PUERTA TIPO PERSIANA ALUMINIO SERIE 7038	m²	45,00	$ 282.470,00	$ 12.711.150,00	-	$ -	- 45,00	MENOR	
11	**CUBIERTA**									

11,1	TEJA EN LAMINA SIN TRASLAPO COLOR (SEGÚN UMA) EXTERIOR Y BLANCO INTERIOR SENCILLA PANEL 2" ANCHO 45CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4)	m2	105,10	$ 266.723,00	$ 28.032.587,30	92,75	$ 24.738.558,25	- 12,35	MENOR	
11,20	FLANCHE EN LÁMINA DE 0,25 ÚTIL POR 2,40ML CAL 26 SEGÚN PLANOS PARA LA CUBIERTA CONTRA MURO INCRUSTADO Y SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE	ml	134,00	$ 49.892,00	$ 6.685.528,00	10,00	$ 498.920,00	- 124,00	MENOR	
11,3	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METÁLICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGÚN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIÉN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE	kg	450,00	$ 26.030,00	$ 11.713.500,00	1.535,79	$ 39.976.639,73	1.085,79	MAYOR	
12	**CERRADURAS**									
12,1	CERRADURA CILINDRICA POMO ALUMINIO ALCOBA	un	2,00	$ 80.533,00	$ 161.066,00	1,00	$ 80.533,00	- 1,00	MENOR	
12,2	CERRADURA YALE DOBLE PASADOR	un	1,00	$ 202.298,00	$ 202.298,00	2,00	$ 404.596,00	1,00	MAYOR	
13	**ASEO GENERAL**									
13,1	LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	m²	762,00	$ 7.357,00	$ 5.606.034,00	803,35	$ 5.910.265,81	41,35	MAYOR	
13,2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m³	22,75	$ 191.319,00	$ 4.352.507,25	-	$ -	- 22,75	MENOR	
13,3	EMPRADIZACIÓN - TIERRA NEGRA Y GRAMA TIPO KIKUYO	m²	100,00	$ 27.427,00	$ 2.742.700,00	-	$ -	- 100,00	MENOR	
NP	**NO PREVISTOS**									
NP1	SUMINISTRO Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI	kg		$ 9.215,46	$ -	2.280,44	$ 21.015.349,35	2.280,44	MAYOR	
NP2	CONCRETO DE 3000 PSI	m3		$ 942.222,53	$ -	7,02	$ 6.616.074,61	7,02	MAYOR	
NP4	REGILLA EN ALUMINIO PARA FACHADA	m2		$ 481.000,00	$ -	71,79	$ 34.532.192,50	71,79	MAYOR	
NP5	PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO PARA FACHADA	m2		$ 975.000,00	$ -	37,85	$ 36.903.750,00	37,85	MAYOR	
NP6	VENTANA FIJA TIPO REGILLA EN ALUMINIO	m2		$ 750.000,00	$ -	2,10	$ 1.575.000,00	2,10	MAYOR	
NP7	CAJA DE INSPECCION 60cmX60cm CON TAPA EN CONCRETO	Und		$ 685.575,47	$ -	2,00	$ 1.371.150,94	2,00	MAYOR	
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 322.090.047,33**		**$ 322.090.047,33**			
ADMINISTRACIÓN				**25,00%**	**$ 80.522.511,83**		**$ 80.522.511,83**			
IMPREVISTOS				**1,00%**	**$ 3.220.900,47**		**$ 3.220.900,47**			
UTILIDADES				**3,00%**	**$ 9.662.701,42**		**$ 9.662.701,42**			
IVA SOBRE UTILIDAD				**19,00%**	**$ 1.835.913,27**		**$ 1.835.913,27**			
				TOTAL	**$ 417.332.074,33**	**SUBTOTAL 1**	**$ 417.332.074,33**			

ACTIVIDADES OBRA NO PREVISTAS (NP) Y/O ADICIONALES (AD) Y/O POR CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN (CE)

No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO			BALANCE A LA FECHA				JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES CANTIDADES		
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
					TOTAL COSTO DIRECTO	**$ -**		**$ -**		
		ADMINISTRACIÓN		**0,00%**	**$ -**			**$ -**		
		IMPREVISTOS		**0,00%**	**$ -**			**$ -**		
		UTILIDADES		**0,00%**	**$ -**			**$ -**		
		IVA SOBRE UTILIDAD		**19,00%**	**$ -**			**$ -**		
				TOTAL	**$ -**	**SUBTOTAL 2**		**$ -**		

ADQUISICIÓN EQUIPOS CON IVA

No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO			BALANCE A LA FECHA				JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES CANTIDADES		
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
					$ -		$ -			
		IVA		19,00%	$ -		$ -			
				TOTAL	$ -	SUBTOTAL 3	$ -			

ADQUISICIÓN EQUIPOS CON IVA NO PREVISTOS (ENP) Y/O ADICIONALES (EAD) Y/O POR CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN (ECE)

No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO			BALANCE A LA FECHA				JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES CANTIDADES		
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
					$ -		$ -			
		IVA		19,00%	$ -		$ -			
				TOTAL	$ -	SUBTOTAL 3	$ -			

ADQUISICIÓN EQUIPOS SIN IVA (SI APLICA)

No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO			BALANCE A LA FECHA				JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES CANTIDADES		
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
				TOTAL	$ -	SUBTOTAL 5	$ -			

ADQUISICIÓN EQUIPOS SIN IVA NO PREVISTOS (ENP) Y/O ADICIONALES (EAD) Y/O POR CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN (ECE)

No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO			BALANCE A LA FECHA				JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES CANTIDADES		
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	

	TOTAL EQUIPOS SIN IVA NO PREVISTOS	**$ -**		**$ -**	
TOTAL CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO		**$ -**	**SUBTOTAL 6**	**$ -**	
	TOTAL CONTRACTUAL (OBRA+EQUIPOS CON IVA+EQUIPOS SIN IVA)	**$ 417.332.074,33**	**TOTAL BALANCE (OBRAS+EQUIPOS +EQUIPOS SIN IVA+ (NP+AD+CE)+ (ENP+EAD+ECE)**	**$ 417.332.074,33**	

Solicita: EDWIN JAVIER PASTOR SILVA Representante Legal Contratista Firma y postfirma	Autorizó: Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma

INFORME FINAL DE OBRA CONTRATO 036-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024.

PERIODO DE EJECUCIÓN

19 DE AGOSTO AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA
Ingeniero Civil EDWIN JAVIER PASTOR SILVA

SUPERVISIÓN DE CONTRATO
Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD

CONTRATANTE
MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA- COMANDO AEREO DE COMBATE No.6.

Cra 38 # 10-90 Lc 20-16 Centro Comercial Puerto Lopez – Bogotá

edwinjavier.pastor@gmail.com Móvil. 315 8959273

1. INTRODUCCIÓN.

La FUERZA AÉREA COLOMBIANA (FAC), por medio del grupo de apoyo crea la necesidad para realizar la adecuación y mantenimiento de las instalaciones del CACOM-6, para mejorar el bienestar de los habitantes que se encuentran en la base militar de Tres Esquinas en el CACOM-6 en el Departamento del Caquetá, municipio de Solano.
El presente informe contiene la descripción de las actividades realizadas en el transcurso de la semana enmarcada en el periodo de tiempo antes descrito, se presenta el porcentaje ejecutado de actividades en este periodo, el porcentaje acumulado y el porcentaje proyectado.

2. OBJETO.

Presentar el avance de las actividades pertinentes al contrato N° **CONTRATO 036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.** indicando cual es respectivo porcentaje de estas, contrastándolo con el porcentaje indicado previamente en el cronograma de actividades, indican cual es el tiempo de ejecución a la fecha de presentado el informe, el tiempo restante de ejecución.

3. LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

El proyecto se desarrolla en la base militar de Tres Esquinas en el CACOM-6, la cual se encuentra localizada en la zona rural del Municipio de Solano, en el Departamento de Caquetá.



4. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

La Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aeroespacial Colombiana, requiere realizar la Adecuación de Infraestructura Tercera fase Horno Incinerador del Comando Aéreo de Combate N° 6.

El Comando Aéreo de Combate No. 6 (CACOM-6), como método de disposición final de los residuos sólidos, utiliza la incineración a través de un Horno Incinerador, a razón, de la ubicación geográfica de la Unidad Militar (Tres Esquinas, Caquetá), esta no cuenta con una empresa recolectora de residuos sólidos, ni otra opción para la disposición final de los mismos.
No obstante, es indispensable continuar la III fase para la adecuación de la infraestructura del Horno incinerador, debido a que se requiere terminar la construcción de muros perimetrales, instalación de portones, rampas de acceso, construcción de muros internos para hacer las divisiones en una zona para la separación de basuras, un área de almacenaje de productos reciclados, una bodega de productos químicos especiales, baño Vestier y oficina para el personal que opera el Horno Incinerador, con sus respectivos mesones, acabados, redes hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, garantizando de esta manera su correcto funcionamiento, conservando así la vida útil de los equipos y dando confort y bienestar al personal que labora en el horno incinerador.

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Contrato De Suministros	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.
Contratista	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA
Número De Identificación	C.C. No. 80.031.665 DE BOGOTÁ
Objeto	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.
Valor Del Contrato	CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 417.332.074,33)
Fecha De Inicio	19 de AGOSTO de 2024
Fecha Estimada De Terminación	31 de OCTUBRE de 2024
Plazo De Ejecución	TRES (03) MESES
Prorroga # 1	QUINCE (15) DÍAS
Fecha Estimada De Terminación	15 de NOVIEMBRE de 2024

% Programado 19 de Agosto al 15 de Noviembre De 2024.	100%
% Ejecutado 19 de Agosto al 15 de Noviembre De 2024.	100%

6. AMPAROS.

CUMPLIMIENTO.

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No	RIESGO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
Compañía Mundial De Seguros	BCH – 1000364425 Anexo 1 Anexo 2	Cumplimiento	26/07/2024	28/02/2025	$ 125.199.622,30
		Prestaciones sociales	26/07/2024	28/02/2025	$ 20.866.603,72
		Estabilidad de la obra	31/10/2024	31/10/2027	$ 208.666.037,17

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No	RIESGO	VALOR ASEGURADO
Compañía Mundial De Seguros	BCH – 100007592 Anexo 1 Anexo 2 Anexo 3	Predios labores y operaciones	$ 260.000.000,00

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

A continuación, se relaciones las actividades y cantidades ejecutadas en el contrato de referencia de acuerdo con las condiciones iniciales y de la inclusión de actividades de acuerdo con el CLAUSULADO ADICIONAL AL PRIMER MODIFICATORIO DEL CONTRATO ELECTRONICO No.036-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 Y EDWIN JAVIER PASTOR SILVA.

1	**PRELIMINARES**		
1,1	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m³	67,00
1,2	CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA	m3	10,00
1,3	DEMOLICION DE MUROS CON RETIRO DE ESCOMBROS	m²	30,00
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**		
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN SEGÚN PLANOS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO DE 0 - 2,00 MTS.	m³	77,00
3	**CIMENTACION**		

3.1	COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE HASTA ALCANZAR CBR=95% DEL PROCTOR MODIFICADO	m²	70,00
3.2	RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE PREPARADA CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA REGIÓN (REMONTA) Y CEMENTO AL 6% SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	m³	100,10
4	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**		
4,1	CONSTRUCCION DE PLACA MACIZA SOBRE TERRENO EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.25 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M²	70,00
5,00	**MAMPOSTERIA**		
5,1	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 (0.33X0.115X0.23) MTS. DE PERFORACION VERTICAL, INCLUYE ACERO DE REFUERZO VERTICAL, MORTERO DE RELLENO Y PEGA MAS ANCLAJE A PLACAS CONTRAPISO Y ENTREPISO.	m2	430,00
6	**REDES HIDRO SANITARIAS**		
6.1	**REDES SANITARIAS**		
6.1.1	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4"	ml	30,00
6.1.2	TUBERÍA DE VENTILACIÓN Ø 1 1/2"	ml	8,00
6.1.3	TUBERÍA DE VENTILACIÓN Ø 2"	ml	10,00
6.1.4	SIFÓN Ø 3X2"	un	1,00
6.1.5	SIFÓN Ø 4X3"	un	4,00
6.1.6	TAPÓN DE INSPECCIÓN Ø 4"	un	3,00
6.1.7	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO DE 2.400 LTS	un	1,00
6.1.8	TUBERIA PERFORADA 2"	ml	30,00
6.1.9	PRUEBA SANITARIA	un	1,00
6.2	**REDES HIDRUALICAS INTERNAS**		
6.2.1	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE)	ml	75,00
6.2.2	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1-1/2"	ml	15,00
6.2.3	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 3/4"	ml	50,00
6.2.4	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2"	ml	10,00
6.2.5	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"	un	4,00
6.2.6	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 3/4"	un	3,00
6.2.7	LLAVE TERMINAL CON CONEXIÓN PARA MANGUERA	un	3,00
6.2.8	PRUEBA HIDRÁULICA	un	1,00
6.2.9	DESINFECCIÓN RED HIDRÁULICA	ml	40,00
6.3	**INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA**		

6.3.1	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1"	ml	20,00
6.3.2	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1"	un	1,00
6.3.3	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1-1/2"	un	1,00
6.3.4	VÁLVULA DE CHEQUE Ø 1"	un	1,00
6.3.5	VÁLVULA DE CHEQUE Ø 1-1/2"	un	1,00
6.3.6	CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø 2 " .	un	1,00
6.3.7	PRUEBA HIDRÁULICA	un	1,00
6.3.8	DESINFECCIÓN RED HIDRÁULICA	ml	20,00
6.4	**AGUAS LLUVIAS**		
6.4.1	CANAL METALICA CALIBRE 14	ml	34,00
6.4.2	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC Ø 6"	ml	26,00
6.4.3	CANAL AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO DE 21 MPA IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	m^3	8,00
6.4.4	REJILLA PARA CÁRCAMO TRAFICO PESADO DE 50X50X15	ml	93,00
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		
7.1.1	TUBERÍA PVC CONDUIT Ø 1/2"	ml	100,00
7.1.2	DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 X Ø1/2" INCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, SOPORTES, ANCLAJES, CAJAS DE PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	ml	70,00
7.1.3	ACOMETIDA EN CABLE 3N12 CU AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 CU AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 CU AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	ml	200,00
7.1.4	ACOMETIDA EN CABLE 3N10 CU AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N10 CU AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 CU AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	ml	200,00
7.1.5	ACOMETIDA EN CABLE 3N12 CU AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 CU AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 CU AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	ml	200,00
7.1.6	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, ENCHUFABLES, CUARENTA Y DOS (42) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIE	Und	1,00
8	**PAÑETES FILOS Y DILATACIONES**		

8,1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	m²	721,78
9	**ACABADOS MUROS PINTURA Y ENCHAPES**		
9,1	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIÓNES)	m2	323,38
10	**CARPINTERIA ALUMINIO**		
10,1	V-1 VENTANERIA CORREDIZA ALUMINIO SERIE 7038 DE TRES CUERPOS Y VIDRIO DE 5 MM EN FACHADA.	Und	2,00
10,2	VENTANERIA TIPO PERSIANA ALUMINIO SERIE 7038	m²	126,00
10,3	PUERTA TIPO PERSIANA ALUMINIO SERIE 7038	m²	45,00
11	**CUBIERTA**		
11,1	TEJA EN LAMINA SIN TRASLAPO COLOR (SEGÚN UMA) EXTERIOR Y BLANCO INTERIOR SENCILLA PANEL 2" ANCHO 45CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4)	m2	105,10
11,20	FLANCHE EN LÁMINA DE 0,25 ÚTIL POR 2,40ML CAL 26 SEGÚN PLANOS PARA LA CUBIERTA CONTRA MURO INCRUSTADO Y SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE	ml	134,00
11,3	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METÁLICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGÚN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIÉN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE	kg	450,00
12	**CERRADURAS**		
12,1	CERRADURA CILINDRICA POMO ALUMINIO ALCOBA	un	2,00
12,2	CERRADURA YALE DOBLE PASADOR	un	1,00
13	**ASEO GENERAL**		
13,1	LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	m²	762,00
13,2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m³	22,75
13,3	EMPRADIZACIÓN - TIERRA NEGRA Y GRAMA TIPO KIKUYO	m²	100,00
NP	**NO PREVISTOS**		
NP1	SUMINISTRO Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI	kg	2.280,44
NP2	CONCRETO DE 3000 PSI	m3	7,02
NP4	REGILLA EN ALUMINIO PARA FACHADA	m2	71,79
NP5	PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO PARA FACHADA	m2	37,85
NP6	VENTANA FIJA TIPO REGILLA EN ALUMINIO	m2	2,10
NP7	CAJA DE INSPECCION 60cmX60cm CON TAPA EN CONCRETO	Und	2,00

8. AVANCE DE OBRA.

De acuerdo con las actividades realizadas en el periodo contemplado para el presente informe, se presentan a continuación los respectivos porcentajes correspondientes al avance ejecutado.

- Avance Programado Acumulado: 100%
- Avance Ejecutado Acumulado: 100%

8.1 CAUSAS DE LOS RETRASOS DE OBRA

a) Los tiempos empleados para los estudios de seguridad que realiza el CACOM 6 para el ingreso del personal de trabajadores, lo cual tomo entre 15 y 20 días para su autorización.

b) Las factores climáticos (sequia) de los meses de Agosto, septiembre y la primera mitad del mes de Octubre, que no eran favorables para la navegabilidad del rio; por lo tanto se presentan retrasos en la llegada de materiales.

c) Dificultad del transporte interno de materiales al interior de la unidad militar desde el puerto fluvial hasta el sitio de obra, debido a la falta de disponibilidad de maquinaria de la base.

d) La autorización y tramite por parte del supervisor del contrato y de la entidad, de las nuevas actividades NO CONTRACTUALES, las cuales en algunos casos antecedían la ejecución de ítems contractuales.

e) Los periodos de lluvia en es la segunda mitad del mes de octubre, lo cual genera retraso debido a que se ponía en riesgo las actividades de trabajo en alturas y de ornamentación en fachada.

f) Se presentan actividades no contractuales, que son necesarias para la realización de actividades establecidas en el contrato, debido a la esbeltes de los muros de bloque se hace necesario construir elementos de confinamiento como viguetas, las cuales no se establecen contractualmente, a su vez estos elementos deben llevar acero de refuerzo para su correcto funcionamiento, esta actividad tampoco se establece en el presupuesto, pero se presenta como ítem no previsto

9. NOVEDADES DURANTE LA EJECUCIÓN.

Durante la ejecución se le informo al supervisor del contrato las diferentes novedades de obra, las cuales quedaron plasmadas, y concertadas para el avance de la obra, como constancia de esto quedan (05) cinco actas de obra o de comité realizadas.

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación, se presenta registro fotográfico de cada uno de los ítems ejecutados

11. ANEXOS

A. PLANOS

Teniendo en cuenta que el CACOM 6 entrego al contratista los planos de diseño del Horno de incineración, me permito entregar actualización de los planos de acuerdo con lo construido en obra, cabe resaltar que el contratista no intervino en el diseño y cálculo de las diferentes redes o estructura, por lo tanto el alcance de los plano que se entregan es únicamente localización de los elementos construidos.

1. Planta Arquitectónica
2. Fachada Principal Y Lateral Izquierda
3. Fachada Posterior Y Lateral Derecha
4. Planta De Cubiertas
5. Red De Suministro
6. Red Sanitaria

B. INSTRUCTIVO DE RECOMENDACIONES Y MANTENIMIENTO

Se adjunta las recomendaciones básicas necesarias para la conservación y el buen funcionamiento de los diferentes elementos, con el fin de ser incluido en los planes de mantenimiento del CACOM 6**.**

Cordialmente;

EDWIN JAVIER PASTOR SILVA
Ingeniero Civil.
C.C./ Nit 80.031.665 de Bogota
Contratista

1	**PRELIMINARES**	
1,1	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m³





1,2	CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA	m3





1,3	DEMOLICION DE MUROS CON RETIRO DE ESCOMBROS	m²





2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN SEGÚN PLANOS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO DE 0 - 2,00 MTS.	m³






3	**CIMENTACION**	
3.1	COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE HASTA ALCANZAR CBR=95% DEL PROCTOR MODIFICADO	m²





3.2	RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE PREPARADA CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA REGIÓN (REMONTA) Y CEMENTO AL 6% SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	m³



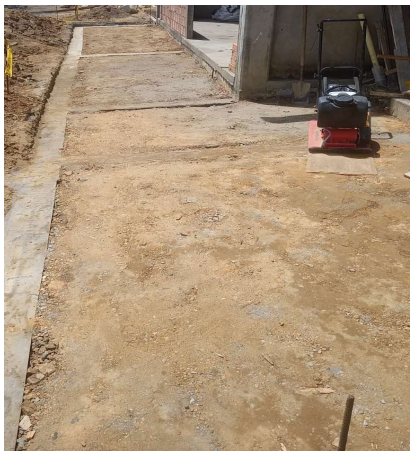

4	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**	
4,1	CONSTRUCCION DE PLACA MACIZA SOBRE TERRENO EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.25 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M²





5,00	**MAMPOSTERIA**	
5,1	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 (0.33X0.115X0.23) MTS. DE PERFORACION VERTICAL, INCLUYE ACERO DE REFUERZO VERTICAL, MORTERO DE RELLENO Y PEGA MAS ANCLAJE A PLACAS CONTRAPISO Y ENTREPISO.	m2





6	**REDES HIDRO SANITARIAS**	
6.1	**REDES SANITARIAS**	
6.1.1	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4"	ml





6.1.3	TUBERÍA DE VENTILACIÓN Ø 2"	ml



6.1.4	SIFÓN Ø 3X2"	un





6.1.5	SIFÓN Ø 4X3"	un





6.1.6	TAPÓN DE INSPECCIÓN Ø 4"	un



6.1.7	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO DE 2.400 LTS	un





6.1.8	TUBERIA PERFORADA 2"	ml






6.1.9	PRUEBA SANITARIA	un





6.2	**REDES HIDRUALICAS INTERNAS**	
6.2.1	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE)	ml



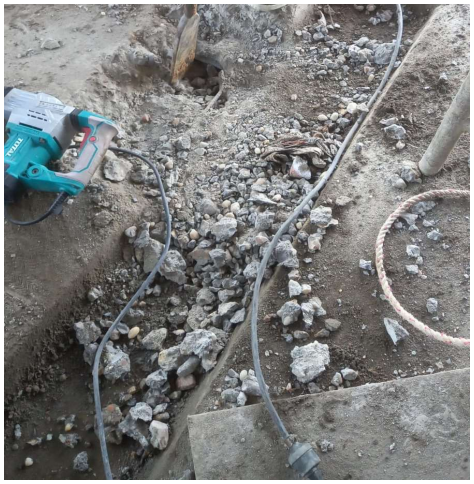

6.2.3	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 3/4"	ml





6.2.4	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2"	ml





6.2.5	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"	un





6.2.6	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 3/4"	un





6.2.7	LLAVE TERMINAL CON CONEXIÓN PARA MANGUERA	un



6.2.8	PRUEBA HIDRÁULICA	un





6.2.9	DESINFECCIÓN RED HIDRÁULICA	ml





6.3	**INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA**	
6.3.6	CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø 2 " .	un





6.4	**AGUAS LLUVIAS**	
6.4.1	CANAL METALICA CALIBRE 14	ml






6.4.2	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC Ø 6"	ml






7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	
7.1.1	TUBERÍA PVC CONDUIT Ø 1/2	ml



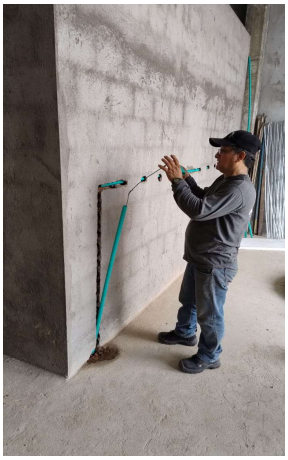

7.1.4	ACOMETIDA EN CABLE 3N10 CU AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N10 CU AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 CU AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	ml



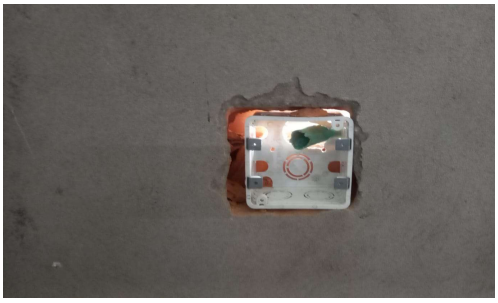

8	**PAÑETES FILOS Y DILATACIONES**	
8,1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	m²






11	**CUBIERTA**	
11,1	TEJA EN LAMINA SIN TRASLAPO COLOR (SEGÚN UMA) EXTERIOR Y BLANCO INTERIOR SENCILLA PANEL 2" ANCHO 45CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4)	m2





11,20	FLANCHE EN LÁMINA DE 0,25 ÚTIL POR 2,40ML CAL 26 SEGÚN PLANOS PARA LA CUBIERTA CONTRA MURO INCRUSTADO Y SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE	ml

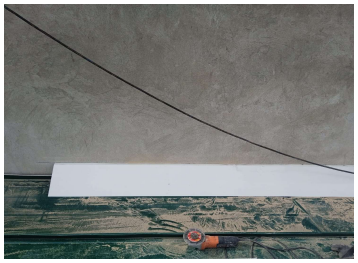



11,3	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METÁLICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGÚN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIÉN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE	kg





12	**CERRADURAS**	
12,1	CERRADURA CILINDRICA POMO ALUMINIO ALCOBA	un





12,2	CERRADURA YALE DOBLE PASADOR	un





13	**ASEO GENERAL**	
13,1	LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	m²



NP	**NO PREVISTOS**	
NP1	SUMINISTRO Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI	kg





NP2	CONCRETO DE 3000 PSI	m3





NP4	REGILLA EN ALUMINIO PARA FACHADA	m2





NP5	PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO PARA FACHADA	m2





NP6	VENTANA FIJA TIPO REGILLA EN ALUMINIO	m2





NP7	CAJA DE INSPECCION 60cmX60cm CON TAPA EN CONCRETO	Und





PERSONAL ACTIVO EJECUCION CONTRATO 036 OCTUBRE

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO
JOSE ENRIQUE AVENDAÑO	1032430856	RESIDENTE DE OBRA
LEIDY TATIANA BERMUDEZ	1075226026	SISO
JAIRO CUBILLOS CORREA	17653951	MAESTRO GENERAL
BRAYAN ENRIQUE BENAVIDES TAFUR	1119581648	OFICIAL DE CONSTRUCCION
JOSE YEISON VELASQUEZ GUTIERREZ	1119585850	OFICIAL DE CONSTRUCCION
HELI RENTERIA NARANJO	1118363244	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
RUBIEL ALBERTO MONSALBE CERON	1117504189	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
ALEXANDER RINCON PINILLA	1117504189	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
GUSTAVO ALEXIS STERLING MENDOZA	1119584461	ORNAMENTADOR
JADER ANTONIO SANCHEZ VANEGAS	1117821669	AYUDANTE DE CONSTRUCCION

ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
SUPERVISOR

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Bogotá, Noviembre de 2024

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA
COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6

Respetados señores:

FRANCISCO ANTONIO MONTAÑA FORERO identificado con cedula de ciudadanía número 79.641.648 de Bogotá, y tarjeta profesional N° 153205-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contador de EDWIN JAVIER PASTOR SILVA identificada con Nit 80.031.665 -1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, hace saber, que ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje ;la anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad del juramento, indicamos que la sociedad se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 15 días del mes de Noviembre de 2024.

EDWIN JAVIER PASTOR SILVA
C.C / NIT: 80.031.665 – 1

FRANCISCO ANTONIO MONTAÑA
C.C. 79.641.648 de Bogota
TP. 153205-T

Cra 38 # 10-90 Lc 20-16 Centro Comercial Puerto Lopez – Bogotá

edwinjavier.pastor@gmail.com Móvil. 315 8959273

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F20299D4ECF5BC25

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FRANCISCO ANTONIO MONTAÑA FORERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79641648 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 153205-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

153295-T



FRANCISCO ANTONIO
MONTAÑA FORERO
C.C. 79641548

RESOLUCION INSCRIPCION 283 FECHA 23/09/2010

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 163628

FIRMA DEL TITULAR 78468

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80031665		PASTOR SILVA EDWIN JAVIER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CARRERA 38 # 10-90 Lc 20-16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5205438	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	954678174	9474534826	E	2024/10/16	2024/10/02	BANCOLOMBIA	0	$2,167,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA (1 Afiliados)						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$104,400		$0	$0
Centro de Trabajo: BOGOTÁ (1 Afiliados)						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$104,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$104,400		$0	$0
1	CC	1012411111	QUINTERO KATHERINE	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS008	30	$1,500,000	$60,000	CCF21	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CAQUETA (2 Afiliados)						$5,500,000	$880,000			$5,500,000	$220,000			$5,500,000	$220,000			$5,500,000	$382,800		$0	$0
Centro de Trabajo: INPEC (2 Afiliados)						$5,500,000	$880,000			$5,500,000	$220,000			$5,500,000	$220,000			$5,500,000	$382,800		$0	$0
Ciudad: SOLANO Depto: CAQUETA (2 Afiliados)						$5,500,000	$880,000			$5,500,000	$220,000			$5,500,000	$220,000			$5,500,000	$382,800		$0	$0
2	CC	1075226026	BERMUDEZ LEIDY	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF13	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
3	CC	1032430856	GARCIA JOSE	231001	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF13	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(3)**					$7,000,000	$1,120,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$487,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80031665		PASTOR SILVA EDWIN JAVIER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CARRERA 38 # 10-90 Lc 20-16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5205438	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	954678174	9474534826	E	2024/10/16	2024/10/02	BANCOLOMBIA	0	$2,167,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$1,120,000	$0	$0	$1,120,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$480,000	$0	$0	$480,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$640,000	$0	$0	$640,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$487,200	$0	$0	$487,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$487,200	$0	$0	$487,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$280,000	$0	$0	$280,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$60,000	$0	$0	$60,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	$220,000	$0	$0	$220,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$280,000	$0	$0	$280,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$60,000	$0	$0	$60,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$220,000	$0	$0	$220,000
TOTAL				**3**	**$2,167,200**	**$0**	**$0**	**$2,167,200**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80031665		PASTOR SILVA EDWIN JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 38 # 10-90 Local 2016	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5205438	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	954652759	9474532106	I	2024/10/16	2024/10/02	BANCOLOMBIA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	80031665 PASTOR EDWIN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80031665		PASTOR SILVA EDWIN JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 38 # 10-90 Local 2016	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5205438	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	954652759	9474532106	I	2024/10/16	2024/10/02	BANCOLOMBIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$0**	**$0**	**$377,300**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80031665		PASTOR SILVA EDWIN JAVIER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CARRERA 38 # 10-90 Lc 20-16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5205438	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1036552787	9477094196	E	2024/11/19	2024/11/08	BANCOLOMBIA	0	$1,264,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA (1 Afiliados)						$750,000	$120,000			$750,000	$30,000			$750,000	$30,000			$750,000	$52,200		$0	$0
Centro de Trabajo: BOGOTÁ (1 Afiliados)						$750,000	$120,000			$750,000	$30,000			$750,000	$30,000			$750,000	$52,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$750,000	$120,000			$750,000	$30,000			$750,000	$30,000			$750,000	$52,200		$0	$0
1	CC	1012411111	QUINTERO KATHERINE	230301	15	$750,000	$120,000	EPS008	15	$750,000	$30,000	CCF21	15	$750,000	$30,000	14-23	15	$750,000	$52,200	15	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CAQUETA (2 Afiliados)						$3,333,334	$533,400			$3,333,334	$133,400			$3,333,334	$133,400			$3,333,334	$232,100		$0	$0
Centro de Trabajo: INPEC (2 Afiliados)						$3,333,334	$533,400			$3,333,334	$133,400			$3,333,334	$133,400			$3,333,334	$232,100		$0	$0
Ciudad: SOLANO Depto: CAQUETA (2 Afiliados)						$3,333,334	$533,400			$3,333,334	$133,400			$3,333,334	$133,400			$3,333,334	$232,100		$0	$0
2	CC	1075226026	BERMUDEZ LEIDY	230301	4	$333,334	$53,400	EPS037	4	$333,334	$13,400	CCF13	4	$333,334	$13,400	14-23	4	$333,334	$23,300	4	$0	$0
3	CC	1032430856	GARCIA JOSE	231001	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF13	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(3)**			$4,083,334	$653,400			$4,083,334	$163,400			$4,083,334	$163,400			$4,083,334	$284,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80031665		PASTOR SILVA EDWIN JAVIER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CARRERA 38 # 10-90 Lc 20-16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5205438	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1036552787	9477094196	E	2024/11/19	2024/11/08	BANCOLOMBIA	0	$1,264,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$653,400	$0	$0	$653,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$480,000	$0	$0	$480,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$173,400	$0	$0	$173,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$284,300	$0	$0	$284,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$284,300	$0	$0	$284,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$163,400	$0	$0	$163,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$30,000	$0	$0	$30,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	$133,400	$0	$0	$133,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$163,400	$0	$0	$163,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$30,000	$0	$0	$30,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$133,400	$0	$0	$133,400
TOTAL				3	$1,264,500	$0	$0	$1,264,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80031665		PASTOR SILVA EDWIN JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 38 # 10-90 Local 2016	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5205438	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1036546583	9476748670	I	2024/11/19	2024/11/08	BANCOLOMBIA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	80031665 PASTOR EDWIN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80031665		PASTOR SILVA EDWIN JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 38 # 10-90 Local 2016	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5205438	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1036546583	9476748670	I	2024/11/19	2024/11/08	BANCOLOMBIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$0**	**$0**	**$377,300**

Florencia, 14 de noviembre de 2024

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEREA COLOMBIANA
CACOM-6

Ref. Contrato: 036-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

OBJETO: ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N.6

Me permito certificar que la empresa SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS HABITARE S.A.S. identificada con cedula 1.117.539.515 expedida en Florencia, ha sido la empresa designada para ejecutar los trabajos correspondientes a la mano de obra del contrato N. 036-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024; objeto: ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N.6.

Se suscribe este documento a los 14 dias del mes de noviembre de 2024.

Atentamente,

MADITH LORENA SANCHEZ MORENO
Rep. Legal

Calle 24 N.1B-65 B. Las Américas
Tel. 3227587370
Email: solucionesconstructivash@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901604990
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS HABITARE SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CALLE 24 N 1 B 65 BARRIO AMERICAS	TELÉFONO:	4379130
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de proyectos de servicio público.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	20 - 036
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO PLANILLA:			**5166503844**	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		9						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/10/31		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		0810315450		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	3	$ 624.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.100	$ 0	$ 624.000	$ 4.100	$ 628.100
SUBTOTALES:										**$ 624.000**	**$ 4.100**	**$ 628.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 700	$ 0	$ 104.000	$ 700	$ 0	$ 104.700
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 52.000	$ 400	$ 0	$ 52.400
SUBTOTALES:													**$ 156.000**	**$ 1.100**	**$ 0**	**$ 157.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 271.500	$ 271.500	$ 1.800	$ 0	$ 273.300
SUBTOTALES:									**$ 271.500**	**$ 1.800**	**$ 0**	**$ 273.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF13	CCF13-COMFACA	3	$ 156.000	$ 1.100	$ 157.100
SUBTOTALES:			**$ 156.000**	**$ 1.100**	**$ 157.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																							PENSIÓN									SALUD						ARP								CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																															
1	CC 1116913306	GASCA CASAMACHIN JOHN FREDY	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF13-COMFACA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1119581648	BENAVIDES TAFUR BRAYAN ENRIQUE	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF13-COMFACA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1119585850	VELASQUEZ GUTIERREZ JOSE YEISON	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF13-COMFACA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 1.215.600**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901604990
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS HABITARE SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CALLE 24 N 1 B 65 BARRIO AMERICAS	TELÉFONO:	4379130
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de proyectos de servicio público.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	16 - HORNO 036
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7945178064**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	15						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1032891936		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	$ 215.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 0	$ 215.000	$ 2.300	$ 217.300
230301	230301-PORVENIR	4	$ 490.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 0	$ 490.700	$ 5.300	$ 496.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 194.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 0	$ 194.200	$ 2.100	$ 196.300
SUBTOTALES:										**$ 899.900**	**$ 9.700**	**$ 909.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 72.900	$ 0	$ 800	$ 0	$ 72.900	$ 800	$ 0	$ 73.700
MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 100	$ 0	$ 1.800	$ 100	$ 0	$ 1.900
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 50.400	$ 0	$ 600	$ 0	$ 50.400	$ 600	$ 0	$ 51.000
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 88.400	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 88.400	$ 1.000	$ 0	$ 89.400
SUBTOTALES:													**$ 213.500**	**$ 2.500**	**$ 0**	**$ 216.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 371.400	$ 371.400	$ 4.000	$ 0	$ 375.400
SUBTOTALES:									**$ 371.400**	**$ 4.000**	**$ 0**	**$ 375.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF13	CCF13-COMFACA	7	$ 213.500	$ 2.300	$ 215.800
SUBTOTALES:			**$ 213.500**	**$ 2.300**	**$ 215.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES						
																										PENSIÓN										SALUD						ARP																				
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901604990
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS HABITARE SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CALLE 24 N 1 B 65 BARRIO AMERICAS	TELÉFONO:	4379130
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de proyectos de servicio público.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	16 - HORNO 036
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7945178064**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	15				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1032891936

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																	
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																																																			ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 1122726985	CUELLAR CASTRO CRISTIAN ALBERTO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		14															230301-PORVENIR	14	$ 606.667	$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 97.100	EPS037-NUEVA EPS	14	$ 606.667	$ 24.300	$ 0	$ 24.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14	$ 606.667		$ 42.300	14	$ 606.667	CCF13-COMFACA	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 17653951	CUBILLOS CORREA JAIRO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	03																25-14 COLPENSIONES	28	$ 1.213.334	$ 194.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 194.200	EPS037-NUEVA EPS	28	$ 1.213.334	$ 48.600	$ 0	$ 48.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 1.213.334		$ 84.500	28	$ 1.213.334	CCF13-COMFACA	$ 48.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 1.716.800**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901604990
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS HABITARE SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CALLE 24 N 1 B 65 BARRIO AMERICAS	TELÉFONO:	4379130
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de proyectos de servicio público.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	16 - HORNO 036
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7949043831**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/12			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1045084315

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
230201	230201- PROTECCION	1	$ 111.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 111.000	$ 0	$ 111.000
230301	230301-PORVENIR	8	$ 1.518.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.518.500	$ 0	$ 1.518.500
SUBTOTALES:										**$ 1.837.500**	**$ 0**	**$ 1.837.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 156.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156.000	$ 0	$ 0	$ 156.000
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 251.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 251.500	$ 0	$ 0	$ 251.500
SUBTOTALES:													**$ 459.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 459.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10		$ 0	$ 0		$ 0	$ 799.600	$ 799.600	$ 0	$ 0	$ 799.600
SUBTOTALES:									**$ 799.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 799.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF13	CCF13-COMFACA	10	$ 459.500	$ 0	$ 459.500
SUBTOTALES:			**$ 459.500**	**$ 0**	**$ 459.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901604990
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS HABITARE SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CALLE 24 N 1 B 65 BARRIO AMERICAS	TELÉFONO:	4379130
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de proyectos de servicio público.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	16 - HORNO 036
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7949043831**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/11/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1045084315

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-092
	FORMATO BALANCE DE OBRA	Versión	7
		Vigencia	9/08/2024

INFORMACION GENERAL	
FECHA DE BALANCE	16 de noviembre de 2024
CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°6
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD

ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA

No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO			BALANCE A LA FECHA				JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES CANTIDADES		
1	**PRELIMINARES**									
1,1	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m³	67,00	$ 37.858,00	$ 2.536.486,00	66,56	$ 2.519.868,13	- 0,44	MENOR	
1,2	CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA	m3	10,00	$ 272.862,00	$ 2.728.620,00	46,78	$ 12.763.590,81	36,78	MAYOR	
1,3	DEMOLICION DE MUROS CON RETIRO DE ESCOMBROS	m²	30,00	$ 31.608,00	$ 948.240,00	21,29	$ 672.776,28	- 8,72	MENOR	
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**									
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN SEGÚN PLANOS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO DE 0 - 2,00 MTS.	m³	77,00	$ 62.632,00	$ 4.822.664,00	183,94	$ 11.520.336,98	106,94	MAYOR	
3	**CIMENTACION**									
3.1	COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE HASTA ALCANZAR CBR=95% DEL PROCTOR MODIFICADO	m²	70,00	$ 21.933,00	$ 1.535.310,00	123,38	$ 2.706.033,67	53,38	MAYOR	
3.2	RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE PREPARADA CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA REGIÓN (REMONTA) Y CEMENTO AL 6% SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	m³	100,10	$ 181.979,00	$ 18.216.097,90	72,87	$ 13.260.687,63	- 27,23	MENOR	
4	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**									
4,1	CONSTRUCCION DE PLACA MACIZA SOBRE TERRENO EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.25 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M²	70,00	$ 404.453,00	$ 28.311.710,00	107,92	$ 43.646.545,50	37,92	MAYOR	
5,00	**MAMPOSTERIA**									
5,1	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 (0.33X0.115X0.23) MTS. DE PERFORACION VERTICAL, INCLUYE ACERO DE REFUERZO VERTICAL, MORTERO DE RELLENO Y PEGA MAS ANCLAJE A PLACAS CONTRAPISO Y ENTREPISO.	m2	430,00	$ 126.692,00	$ 54.477.560,00	199,22	$ 25.238.946,78	- 230,79	MENOR	
6	**REDES HIDRO SANITARIAS**									
6.1	**REDES SANITARIAS**									
6.1.1	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4"	ml	30,00	$ 40.291,00	$ 1.208.730,00	53,20	$ 2.143.481,20	23,20	MAYOR	
6.1.2	TUBERÍA DE VENTILACIÓN Ø 1 1/2"	ml	8,00	$ 20.862,00	$ 166.896,00	-	$ -	- 8,00	MENOR	
6.1.3	TUBERÍA DE VENTILACIÓN Ø 2"	ml	10,00	$ 28.495,00	$ 284.950,00	3,00	$ 85.485,00	- 7,00	MENOR	
6.1.4	SIFÓN Ø 3X2"	un	1,00	$ 52.549,00	$ 52.549,00	4,00	$ 210.196,00	3,00	MAYOR	
6.1.5	SIFÓN Ø 4X3"	un	4,00	$ 67.652,00	$ 270.608,00	3,00	$ 202.956,00	- 1,00	MENOR	
6.1.6	TAPÓN DE INSPECCIÓN Ø 4"	un	3,00	$ 33.503,00	$ 100.509,00	1,00	$ 33.503,00	- 2,00	MENOR	
6.1.7	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO DE 2.400 LTS	un	1,00	$ 5.588.252,00	$ 5.588.252,00	1,00	$ 5.588.252,00	-	IGUAL	
6.1.8	TUBERIA PERFORADA 2"	ml	30,00	$ 194.668,00	$ 5.840.040,00	31,54	$ 6.140.299,34	1,54	MAYOR	
6.1.9	PRUEBA SANITARIA	un	1,00	$ 131.208,00	$ 131.208,00	2,00	$ 262.416,00	1,00	MAYOR	
6.2	**REDES HIDRUALICAS INTERNAS**									
6.2.1	REGATA PARA INSTALACION DE TUBERIA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE)	ml	75,00	$ 18.491,00	$ 1.386.825,00	95,30	$ 1.762.192,30	20,30	MAYOR	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-092
	FORMATO BALANCE DE OBRA	Versión	7
		Vigencia	9/08/2024

INFORMACION GENERAL	
FECHA DE BALANCE	16 de noviembre de 2024
CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°6
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD

ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA

No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO			BALANCE A LA FECHA				JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES CANTIDADES		
6.2.2	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1-1/2"	ml	15,00	$ 36.097,00	$ 541.455,00	-	$ -	- 15,00	MENOR	
6.2.3	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 3/4"	ml	50,00	$ 40.347,00	$ 2.017.350,00	33,40	$ 1.347.589,80	- 16,60	MENOR	
6.2.4	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2"	ml	10,00	$ 27.304,00	$ 273.040,00	10,20	$ 278.500,80	0,20	MAYOR	
6.2.5	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"	un	4,00	$ 24.692,00	$ 98.768,00	6,00	$ 148.152,00	2,00	MAYOR	
6.2.6	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 3/4"	un	3,00	$ 59.636,00	$ 178.908,00	5,00	$ 298.180,00	2,00	MAYOR	
6.2.7	LLAVE TERMINAL CON CONEXIÓN PARA MANGUERA	un	3,00	$ 69.478,00	$ 208.434,00	3,00	$ 208.434,00	-	IGUAL	
6.2.8	PRUEBA HIDRÁULICA	un	1,00	$ 131.208,00	$ 131.208,00	1,00	$ 131.208,00	-	IGUAL	
6.2.9	DESINFECCIÓN RED HIDRÁULICA	ml	40,00	$ 5.977,00	$ 239.080,00	43,60	$ 260.597,20	3,60	MAYOR	
6.3	**INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA**									
6.3.1	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1"	ml	20,00	$ 22.894,00	$ 457.880,00	-	$ -	- 20,00	MENOR	
6.3.2	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1"	un	1,00	$ 336.992,00	$ 336.992,00	-	$ -	- 1,00	MENOR	
6.3.3	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1-1/2"	un	1,00	$ 507.675,00	$ 507.675,00	-	$ -	- 1,00	MENOR	
6.3.4	VÁLVULA DE CHEQUE Ø 1"	un	1,00	$ 89.183,00	$ 89.183,00	-	$ -	- 1,00	MENOR	
6.3.5	VÁLVULA DE CHEQUE Ø 1-1/2"	un	1,00	$ 338.928,00	$ 338.928,00	-	$ -	- 1,00	MENOR	
6.3.6	CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø 2 " .	un	1,00	$ 67.955,00	$ 67.955,00	1,00	$ 67.955,00	-	IGUAL	
6.3.7	PRUEBA HIDRÁULICA	un	1,00	$ 232.506,00	$ 232.506,00	-	$ -	- 1,00	MENOR	
6.3.8	DESINFECCIÓN RED HIDRÁULICA	ml	20,00	$ 5.977,00	$ 119.540,00	-	$ -	- 20,00	MENOR	
6.4	**AGUAS LLUVIAS**									
6.4.1	CANAL METALICA CALIBRE 14	ml	34,00	$ 194.853,00	$ 6.625.002,00	33,80	$ 6.586.031,40	- 0,20	MENOR	
6.4.2	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC Ø 6"	ml	26,00	$ 94.874,00	$ 2.466.724,00	38,00	$ 3.605.212,00	12,00	MAYOR	
6.4.3	CANAL AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO DE 21 MPA IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, FORMALETAS	m³	8,00	$ 1.270.247,00	$ 10.161.976,00	-	$ -	- 8,00	MENOR	
6.4.4	REJILLA PARA CÁRCAMO TRAFICO PESADO DE 50X50X15	ml	93,00	$ 149.550,00	$ 13.908.150,00	-	$ -	- 93,00	MENOR	
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**									
7.1.1	TUBERÍA PVC CONDUIT Ø 1/2"	ml	100,00	$ 22.390,00	$ 2.239.000,00	5,00	$ 111.950,00	- 95,00	MENOR	
7.1.2	DUCTERIA TIPO EMT DE 1 X Ø1/2" INCLUYE UNION, CURVAS, TERMINALES, SOPORTES, ANCLAJES, CAJAS DE PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS	ml	70,00	$ 59.122,00	$ 4.138.540,00	-	$ -	- 70,00	MENOR	
7.1.3	ACOMETIDA EN CABLE 3N12 CU AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 CU AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 CU AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	ml	200,00	$ 34.756,00	$ 6.951.200,00	-	$ -	- 200,00	MENOR	
7.1.4	ACOMETIDA EN CABLE 3N10 CU AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N10 CU AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 CU AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	ml	200,00	$ 39.915,00	$ 7.983.000,00	29,82	$ 1.190.261,00	- 170,18	MENOR	
7.1.5	ACOMETIDA EN CABLE 3N12 CU AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 CU AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 CU AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	ml	200,00	$ 34.756,00	$ 6.951.200,00	-	$ -	- 200,00	MENOR	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-092
	FORMATO BALANCE DE OBRA	Versión	7
		Vigencia	9/08/2024

INFORMACION GENERAL	
FECHA DE BALANCE	16 de noviembre de 2024
CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°6
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD

ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA

No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO			BALANCE A LA FECHA				JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES CANTIDADES		
7.1.6	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, ENCHUFABLES, CUARENTA Y DOS (42) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIE	Und	1,00	$ 2.944.790,00	$ 2.944.790,00	-	$ -	- 1,00	MENOR	
8	**PAÑETES FILOS Y DILATACIONES**									
8,1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	m²	721,78	$ 19.164,00	$ 13.832.277,73	469,59	$ 8.999.270,67	- 252,19	MENOR	
9	**ACABADOS MUROS PINTURA Y ENCHAPES**									
9,1	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIÓNES)	m2	323,38	$ 29.621,00	$ 9.578.724,16	-	$ -	- 323,38	MENOR	
10	**CARPINTERIA ALUMINIO**									
10,1	V-1 VENTANERIA CORREDIZA ALUMINIO SERIE 7038 DE TRES CUERPOS Y VIDRIO DE 5 MM EN FACHADA.	Und	2,00	$ 216.062,00	$ 432.124,00	-	$ -	- 2,00	MENOR	
10,2	VENTANERIA TIPO PERSIANA ALUMINIO SERIE 7038	m²	126,00	$ 216.062,00	$ 27.223.812,00	-	$ -	- 126,00	MENOR	
10,3	PUERTA TIPO PERSIANA ALUMINIO SERIE 7038	m²	45,00	$ 282.470,00	$ 12.711.150,00	-	$ -	- 45,00	MENOR	
11	**CUBIERTA**									
11,1	TEJA EN LAMINA SIN TRASLAPO COLOR (SEGÚN UMA) EXTERIOR Y BLANCO INTERIOR SENCILLA PANEL 2" ANCHO 45CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4)	m2	105,10	$ 266.723,00	$ 28.032.587,30	88,25	$ 23.538.304,75	- 16,85	MENOR	
11,20	FLANCHE EN LÁMINA DE 0,25 ÚTIL POR 2,40ML CAL 26 SEGÚN PLANOS PARA LA CUBIERTA CONTRA MURO INCRUSTADO Y SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE	ml	134,00	$ 49.892,00	$ 6.685.528,00	10,00	$ 498.920,00	- 124,00	MENOR	
11,3	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METÁLICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGÚN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIÉN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE	kg	450,00	$ 26.030,00	$ 11.713.500,00	1.410,93	$ 36.726.429,81	960,93	MAYOR	
12	**CERRADURAS**									
12,1	CERRADURA CILINDRICA POMO ALUMINIO ALCOBA	un	2,00	$ 80.533,00	$ 161.066,00	1,00	$ 80.533,00	- 1,00	MENOR	
12,2	CERRADURA YALE DOBLE PASADOR	un	1,00	$ 202.298,00	$ 202.298,00	2,00	$ 404.596,00	1,00	MAYOR	
13	**ASEO GENERAL**									
13,1	LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	m²	762,00	$ 7.357,00	$ 5.606.034,00	935,35	$ 6.881.389,81	173,35	MAYOR	
13,2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m³	22,75	$ 191.319,00	$ 4.352.507,25	-	$ -	- 22,75	MENOR	
13,3	EMPRADIZACIÓN - TIERRA NEGRA Y GRAMA TIPO KIKUYO	m²	100,00	$ 27.427,00	$ 2.742.700,00	100,00	$ 2.742.700,00	-	IGUAL	
NP	**NO PREVISTOS**									
NP1	SUMINISTRO Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI	kg		$ 9.215,46	$ -	1.977,99	$ 18.228.097,43	1.977,99	MAYOR	
NP2	CONCRETO DE 3000 PSI	m3		$ 942.222,53	$ -	7,02	$ 6.616.074,61	7,02	MAYOR	
NP4	REGILLA EN ALUMINIO PARA FACHADA	m2		$ 481.000,00	$ -	71,79	$ 34.532.192,50	71,79	MAYOR	
NP5	PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO PARA FACHADA	m2		$ 975.000,00	$ -	37,85	$ 36.903.750,00	37,85	MAYOR	
NP6	VENTANA FIJA TIPO REGILLA EN ALUMINIO	m2		$ 750.000,00	$ -	2,10	$ 1.575.000,00	2,10	MAYOR	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-092
	FORMATO BALANCE DE OBRA	Versión	7
		Vigencia	9/08/2024

INFORMACION GENERAL	
FECHA DE BALANCE	16 de noviembre de 2024
CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°6
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD

ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA

No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO			BALANCE A LA FECHA				JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES CANTIDADES		
NP7	CAJA DE INSPECCION 60cmX60cm CON TAPA EN CONCRETO	Und		$ 685.575,47	$ -	2,00	$ 1.371.150,94	2,00	MAYOR	
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 322.090.047,33		$ 322.090.047,33			
ADMINISTRACIÓN				25,00%	$ 80.522.511,83		$ 80.522.511,83			
IMPREVISTOS				1,00%	$ 3.220.900,47		$ 3.220.900,47			
UTILIDADES				3,00%	$ 9.662.701,42		$ 9.662.701,42			
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 1.835.913,27		$ 1.835.913,27			
				TOTAL	$ 417.332.074,33	SUBTOTAL 1	$ 417.332.074,33			

ACTIVIDADES OBRA NO PREVISTAS (NP) Y/O ADICIONALES (AD) Y/O POR CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN (CE)

No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO			BALANCE A LA FECHA				JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES CANTIDADES		
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ -		$ -			
		ADMINISTRACIÓN		0,00%	$ -		$ -			
		IMPREVISTOS		0,00%	$ -		$ -			
		UTILIDADES		0,00%	$ -		$ -			
		IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%	$ -		$ -			
				TOTAL	$ -	SUBTOTAL 2	$ -			

ADQUISICIÓN EQUIPOS CON IVA

No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO			BALANCE A LA FECHA				JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES CANTIDADES		
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-092
	FORMATO BALANCE DE OBRA	Versión	7
		Vigencia	9/08/2024

INFORMACION GENERAL	
FECHA DE BALANCE	16 de noviembre de 2024
CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°6
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD

ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA

No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO			BALANCE A LA FECHA			JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
					$ -		$ -		
				IVA 19,00%	$ -		$ -		
				TOTAL	$ -	SUBTOTAL 3	$ -		

ADQUISICIÓN EQUIPOS CON IVA NO PREVISTOS (ENP) Y/O ADICIONALES (EAD) Y/O POR CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN (ECE)

No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO			BALANCE A LA FECHA				JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES CANTIDADES		
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
					$ -		$ -			
				IVA 19,00%	$ -		$ -			
				TOTAL	$ -	SUBTOTAL 3	$ -			

ADQUISICIÓN EQUIPOS SIN IVA (SI APLICA)

No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO			BALANCE A LA FECHA				JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES CANTIDADES		
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
					TOTAL $ -		SUBTOTAL 5 $ -			

ADQUISICIÓN EQUIPOS SIN IVA NO PREVISTOS (ENP) Y/O ADICIONALES (EAD) Y/O POR CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN (ECE)

No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO			BALANCE A LA FECHA				JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES CANTIDADES		
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-092
	FORMATO BALANCE DE OBRA	Versión	7
		Vigencia	9/08/2024

INFORMACION GENERAL	
FECHA DE BALANCE	16 de noviembre de 2024
CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°6
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD

ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA

No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO			BALANCE A LA FECHA				JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES CANTIDADES		
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
				TOTAL EQUIPOS SIN IVA NO PREVISTOS	**$ -**		**$ -**			
	TOTAL CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO				**$ -**	**SUBTOTAL 6**	**$ -**			
				TOTAL CONTRACTUAL (OBRA+EQUIPOS CON IVA+EQUIPOS SIN IVA)	**$ 417.332.074,33**	**TOTAL BALANCE (OBRAS+EQUIPOS +EQUIPOS SIN IVA+ (NP+AD+CE)+ (ENP+EAD+ECE)**	**$ 417.332.074,33**			

Solicita: EDWIN JAVIER PASTOR SILVA Representante Legal Contratista Firma y postfirma	Autorizó: Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	GA-JELOG-FR-101
	FORMATO CORTE PARCIAL - FINAL DE OBRA	5
		24/11/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°6
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
FECHA DE CORTE	16 de noviembre de 2024
CORTE DE OBRA No.	CORTE # 2

OBRA																							
			PRESUPUESTO CONTRACTUAL			BALANCE A LA FECHA			OBRA EJECUTADA											OBRA POR EJECUTAR			
No.ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR REAL	CORTE 1 (DEL 19 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024)			CORTE 2 (DEL 28 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024)			PRESENTE CORTE (DEL 28 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024)			SALDO					
									CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR			
1	**PRELIMINARES**																						
1.1	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m³	67.00	$ 37,858.00	$ 2,536,486.00	-0.44	66.56	$ 2,519,868.13	-	$ -	0.0%	***66.5610***	***$ 2,519,868.13***	*100.0%*	66.56	$ 2,519,868.13	99.3%	-	$ -	0.00%			
1.2	CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA	m3	10.00	$ 272,862.00	$ 2,728,620.00	36.78	46.78	$ 12,763,590.81	-	$ -	0.0%	***46.7767***	***$ 12,763,590.81***	*100.0%*	46.78	$ 12,763,590.81	467.8%	-	$ -	0.00%			
1.3	DEMOLICION DE MUROS CON RETIRO DE ESCOMBROS	m³	30.00	$ 31,608.00	$ 948,240.00	-8.72	21.29	$ 672,776.28	*21.29*	$ *672,776.28*	100.0%	-	$ -	*0.0%*	-	$ -	0.0%	-	$ -	0.00%			
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**		-																				
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN SEGÚN PLANOS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO DE 0 - 2,00 MTS.	m³	77.00	$ 62,632.00	$ 4,822,664.00	106.94	183.94	$ 11,520,336.98	*99.45*	$ *6,228,963.78*	54.1%	***84.4835***	***$ 5,291,373.20***	*45.9%*	84.48	$ 5,291,373.20	109.7%	-	$ -	0.00%			
3	**CIMENTACION**																						
3.1	COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE HASTA ALCANZAR CBR=95% DEL PROCTOR MODIFICADO	m²	70.00	$ 21,933.00	$ 1,535,310.00	53.38	123.38	$ 2,706,033.67	*105.74*	$ *2,319,085.76*	85.7%	***17.6423***	***$ 386,947.91***	*14.3%*	17.64	$ 386,947.91	25.2%	-	$ -	0.00%			
3.2	RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE PREPARADA CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA REGIÓN (REMONTA) Y CEMENTO AL 6% SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	m³	100.10	$ 181,979.00	$ 18,216,097.90	-27.23	72.87	$ 13,260,687.63	*68.73*	$ *12,507,007.22*	94.3%	***4.1416***	***$ 753,680.41***	*5.7%*	4.14	$ 753,680.41	4.1%	-	$ -	0.00%			
4	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**																						
4.1	CONSTRUCCION DE PLACA MACIZA SOBRE TERRENO EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.25 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M³	70.00	$ 404,453.00	$ 28,311,710.00	37.92	107.92	$ 43,646,545.50	*66.78*	$ *27,007,349.08*	61.9%	***41.1400***	***$ 16,639,196.42***	*38.1%*	41.14	$ 16,639,196.42	58.8%	-	$ -	0.00%			
5.00	**MAMPOSTERIA**																						
5.1	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 (0.33X0.115X0.23) MTS. DE PERFORACION VERTICAL, INCLUYE ACERO DE REFUERZO VERTICAL, MORTERO DE RELLENO Y PEGA MAS ANCLAJE A PLACAS CONTRAPISO Y ENTREPISO.	m2	430.00	$ 126,692.00	$ 54,477,560.00	-230.79	199.22	$ 25,238,946.78	*134.95*	$ *17,096,451.94*	67.7%	***64.2700***	***$ 8,142,494.84***	*32.3%*	64.27	$ 8,142,494.84	14.9%	-	$ -	0.00%			
6.00	**REDES HIDRO SANITARIAS**																						
6.1	**REDES SANITARIAS**																						
6.1.1	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4"	ml	30.00	$ 40,291.00	$ 1,208,730.00	23.20	53.20	$ 2,143,481.20	-	$ -	0.0%	***53.2000***	***$ 2,143,481.20***	*100.0%*	53.20	$ 2,143,481.20	177.3%	-	$ -	0.00%			
6.1.2	TUBERÍA DE VENTILACIÓN Ø 1 1/2"	ml	8.00	$ 20,862.00	$ 166,896.00	-8.00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0.0%	-	$ -				
6.1.3	TUBERÍA DE VENTILACIÓN Ø 2"	ml	10.00	$ 28,495.00	$ 284,950.00	-7.00	3.00	$ 85,485.00	*3.00*	$ *85,485.00*	100.0%	-	$ -	*0.0%*	-	$ -	0.0%	-	$ -	0.00%			
6.1.4	SIFÓN Ø 3X2"	un	1.00	$ 52,549.00	$ 52,549.00	3.00	4.00	$ 210,196.00	*4.00*	$ *210,196.00*	100.0%	-	$ -	*0.0%*	-	$ -	0.0%	-	$ -	0.00%			
6.1.5	SIFÓN Ø 4X3"	un	4.00	$ 67,652.00	$ 270,608.00	-1.00	3.00	$ 202,956.00	*3.00*	$ *202,956.00*	100.0%	-	$ -	*0.0%*	-	$ -	0.0%	-	$ -	0.00%			
6.1.6	TAPÓN DE INSPECCIÓN Ø 4"	un	3.00	$ 33,503.00	$ 100,509.00	-2.00	1.00	$ 33,503.00	*1.00*	$ *33,503.00*	100.0%	-	$ -	*0.0%*	-	$ -	0.0%	-	$ -	0.00%			
6.1.7	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO DE 2.400 LTS	un	1.00	$ 5,588,252.00	$ 5,588,252.00	-	1.00	$ 5,588,252.00	-	$ -	0.0%	***1.0000***	***$ 5,588,252.00***	*100.0%*	1.00	$ 5,588,252.00	100.0%	-	$ -	0.00%			
6.1.8	TUBERIA PERFORADA 2"	ml	30.00	$ 194,668.00	$ 5,840,040.00	1.54	31.54	$ 6,140,299.34	-	$ -	0.0%	***31.5424***	***$ 6,140,299.34***	*100.0%*	31.54	$ 6,140,299.34	105.1%	-	$ -	0.00%			
6.1.9	PRUEBA SANITARIA	un	1.00	$ 131,208.00	$ 131,208.00	1.00	2.00	$ 262,416.00	-	$ -	0.0%	***2.0000***	***$ 262,416.00***	*100.0%*	2.00	$ 262,416.00	200.0%	-	$ -	0.00%			
6.2	**REDES HIDRUALICAS INTERNAS**																						
6.2.1	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE)	ml	75.00	$ 18,491.00	$ 1,386,825.00	20.30	95.30	$ 1,762,192.30	*28.60*	$ *528,842.60*	30.0%	***66.7000***	***$ 1,233,349.70***	*70.0%*	66.70	$ 1,233,349.70	88.9%	-	$ -	0.00%			
6.2.2	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1-1/2"	ml	15.00	$ 36,097.00	$ 541,455.00	-15.00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0.0%	-	$ -				
6.2.3	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 3/4"	ml	50.00	$ 40,347.00	$ 2,017,350.00	-16.60	33.40	$ 1,347,589.80	*18.40*	$ *742,384.80*	55.1%	***15.0000***	***$ 605,205.00***	*44.9%*	15.00	$ 605,205.00	30.0%	-	$ -	0.00%			
6.2.4	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2"	ml	10.00	$ 27,304.00	$ 273,040.00	0.20	10.20	$ 278,500.80	*10.20*	$ *278,500.80*	100.0%	-	$ -	*0.0%*	-	$ -	0.0%	-	$ -	0.00%			
6.2.5	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"	un	4.00	$ 24,692.00	$ 98,768.00	2.00	6.00	$ 148,152.00	*5.00*	$ *123,460.00*	83.3%	***1.0000***	***$ 24,692.00***	*16.7%*	1.00	$ 24,692.00	25.0%	-	$ -	0.00%			
6.2.6	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 3/4"	un	3.00	$ 59,636.00	$ 178,908.00	2.00	5.00	$ 298,180.00	*4.00*	$ *238,544.00*	80.0%	***1.0000***	***$ 59,636.00***	*20.0%*	1.00	$ 59,636.00	33.3%	-	$ -	0.00%			
6.2.7	LLAVE TERMINAL CON CONEXIÓN PARA MANGUERA	un	3.00	$ 69,478.00	$ 208,434.00	-	3.00	$ 208,434.00	-	$ -	0.0%	***3.0000***	***$ 208,434.00***	*100.0%*	3.00	$ 208,434.00	100.0%	-	$ -	0.00%			
6.2.8	PRUEBA HIDRÁULICA	un	1.00	$ 131,208.00	$ 131,208.00	-	1.00	$ 131,208.00	-	$ -	0.0%	***1.0000***	***$ 131,208.00***	*100.0%*	1.00	$ 131,208.00	100.0%	-	$ -	0.00%			
6.2.9	DESINFECCIÓN RED HIDRÁULICA	ml	40.00	$ 5,977.00	$ 239,080.00	3.60	43.60	$ 260,597.20	-	$ -	0.0%	***43.6000***	***$ 260,597.20***	*100.0%*	43.60	$ 260,597.20	109.0%	-	$ -	0.00%			
6.3	**INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA**																						
6.3.1	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1"	ml	20.00	$ 22,894.00	$ 457,880.00	-20.00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0.0%	-	$ -				
6.3.2	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1"	un	1.00	$ 336,992.00	$ 336,992.00	-1.00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0.0%	-	$ -				
6.3.3	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1-1/2"	un	1.00	$ 507,675.00	$ 507,675.00	-1.00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0.0%	-	$ -				
6.3.4	VÁLVULA DE CHEQUE Ø 1"	un	1.00	$ 89,183.00	$ 89,183.00	-1.00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0.0%	-	$ -				
6.3.5	VÁLVULA DE CHEQUE Ø 1-1/2"	un	1.00	$ 338,928.00	$ 338,928.00	-1.00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0.0%	-	$ -				
6.3.6	CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø 2 " .	un	1.00	$ 67,955.00	$ 67,955.00	-	1.00	$ 67,955.00	-	$ -	0.0%	***1.0000***	***$ 67,955.00***	*100.0%*	1.00	$ 67,955.00	100.0%	-	$ -	0.00%			
6.3.7	PRUEBA HIDRÁULICA	un	1.00	$ 232,506.00	$ 232,506.00	-1.00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0.0%	-	$ -				
6.3.8	DESINFECCIÓN RED HIDRÁULICA	ml	20.00	$ 5,977.00	$ 119,540.00	-20.00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0.0%	-	$ -				
6.4	**AGUAS LLUVIAS**																						
6.4.1	CANAL METALICA CALIBRE 14	ml	34.00	$ 194,853.00	$ 6,625,002.00	-0.20	33.80	$ 6,586,031.40	-	$ -	0.0%	***33.8000***	***$ 6,586,031.40***	*100.0%*	33.80	$ 6,586,031.40	99.4%	-	$ -	0.00%			

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	GA-JELOG-FR-101
	FORMATO CORTE PARCIAL - FINAL DE OBRA	5
		24/11/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°6
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
FECHA DE CORTE	16 de noviembre de 2024
CORTE DE OBRA No.	CORTE # 2

OBRA																							
			PRESUPUESTO CONTRACTUAL			BALANCE A LA FECHA			OBRA EJECUTADA										OBRA POR EJECUTAR			
No.ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR REAL	CORTE 1 (DEL 19 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024)			CORTE 2 (DEL 28 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024)			PRESENTE CORTE (DEL 28 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024)			SALDO				
									CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR	
6.4.2	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC Ø 6"	ml	26.00	$ 94,874.00	$ 2,466,724.00	12.00	38.00	$ 3,605,212.00	-	$ -	0.0%	***38.0000***	***$ 3,605,212.00***	*100.0%*	38.00	$ 3,605,212.00	146.2%	-	$ -	0.00%	
6.4.3	CANAL AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO DE 21 MPA IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	m²	8.00	$ 1,270,247.00	$ 10,161,976.00	-8.00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0.0%	-	$ -		
6.4.4	REJILLA PARA CÁRCAMO TRAFICO PESADO DE 50X50X15	ml	93.00	$ 149,550.00	$ 13,908,150.00	-93.00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0.0%	-	$ -		
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**																						
7.1.1	TUBERÍA PVC CONDUIT Ø 1/2"	ml	100.00	$ 22,390.00	$ 2,239,000.00	-95.00	5.00	$ 111,950.00	-	$ -	0.0%	***5.0000***	***$ 111,950.00***	*100.0%*	5.00	$ 111,950.00	5.0%	-	$ -	0.00%	
7.1.2	DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 X Ø1/2" INCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, SOPORTES, ANCLAJES, CAJAS DE PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	ml	70.00	$ 59,122.00	$ 4,138,540.00	-70.00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0.0%	-	$ -		
7.1.3	ACOMETIDA EN CABLE 3N12 CU AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 CU AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 CU AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXION, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	ml	200.00	$ 34,756.00	$ 6,951,200.00	-200.00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0.0%	-	$ -		
7.1.4	ACOMETIDA EN CABLE 3N10 CU AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N10 CU AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 CU AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	ml	200.00	$ 39,915.00	$ 7,983,000.00	-170.18	29.82	$ 1,190,261.00	-	$ -	0.0%	***29.8199***	***$ 1,190,261.00***	*100.0%*	29.82	$ 1,190,261.00	14.9%	-	$ -	0.00%	
7.1.5	ACOMETIDA EN CABLE 3N12 CU AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 CU AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 CU AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	ml	200.00	$ 34,756.00	$ 6,951,200.00	-200.00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0.0%	-	$ -		
7.1.6	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, ENCHUFABLES, CUARENTA Y DOS (42) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAME	Und	1.00	$ 2,944,790.00	$ 2,944,790.00	-1.00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0.0%	-	$ -		
8	**PANETES FILOS Y DILATACIONES**																						
8.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	m²	721.78	$ 19,164.00	$ 13,832,277.73	-252.19	469.59	$ 8,999,270.67	-	$ -	0.0%	***469.5925***	***$ 8,999,270.67***	*100.0%*	469.59	$ 8,999,270.67	65.1%	-	$ -	0.00%	
9	**ACABADOS MUROS PINTURA Y ENCHAPES**					-																	
9.1	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIÓNES)	m2	323.38	$ 29,621.00	$ 9,578,724.16	-323.38	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0.0%	-	$ -		
10	**CARPINTERIA ALUMINIO**																						
10.1	V-1 VENTANERIA CORREDIZA ALUMINIO SERIE 7038 DE TRES CUERPOS Y VIDRIO DE 5 MM EN FACHADA.	Und	2.00	$ 216,062.00	$ 432,124.00	-2.00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0.0%	-	$ -		
10.2	VENTANERIA TIPO PERSIANA ALUMINIO SERIE 7038	m²	126.00	$ 216,062.00	$ 27,223,812.00	-126.00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0.0%	-	$ -		
10.3	PUERTA TIPO PERSIANA ALUMINIO SERIE 7038	m²	45.00	$ 282,470.00	$ 12,711,150.00	-45.00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0.0%	-	$ -		
11	**CUBIERTA**																						
11.1	TEJA EN LAMINA SIN TRASLAPO COLOR (SEGÚN UMA) EXTERIOR Y BLANCO INTERIOR SENCILLA PANEL 2" ANCHO 45CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4)	m2	105.10	$ 266,723.00	$ 28,032,587.30	-16.85	88.25	$ 23,538,304.75	-	$ -	0.0%	***88.2500***	***$ 23,538,304.75***	*100.0%*	88.25	$ 23,538,304.75	84.0%	-	$ -	0.00%	
11.20	FLANCHE EN LÁMINA DE 0,25 ÚTIL POR 2.40ML CAL 26 SEGÚN PLANOS PARA LA CUBIERTA CONTRA MURO INCRUSTADO Y SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE	ml	134.00	$ 49,892.00	$ 6,685,528.00	-124.00	10.00	$ 498,920.00	-	$ -	0.0%	***10.0000***	***$ 498,920.00***	*100.0%*	10.00	$ 498,920.00	7.5%	-	$ -	0.00%	
11.3	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METÁLICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGÚN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIÉN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE	kg	450.00	$ 26,030.00	$ 11,713,500.00	960.93	1,410.93	$ 36,726,429.81	*644.98*	*$ 16,788,699.25*	45.7%	***765.9520***	***$ 19,937,730.56***	*54.3%*	765.95	$ 19,937,730.56	170.2%	-	$ -	0.00%	
12	**CERRADURAS**																						
12.1	CERRADURA CILINDRICA POMO ALUMINIO ALCOBA	un	2.00	$ 80,533.00	$ 161,066.00	-1.00	1.00	$ 80,533.00	-	$ -	0.0%	***1.0000***	***$ 80,533.00***	*100.0%*	1.00	$ 80,533.00	50.0%	-	$ -	0.00%	
12.2	CERRADURA YALE DOBLE PASADOR	un	1.00	$ 202,298.00	$ 202,298.00	1.00	2.00	$ 404,596.00	-	$ -	0.0%	***2.0000***	***$ 404,596.00***	*100.0%*	2.00	$ 404,596.00	200.0%	-	$ -	0.00%	
13	**ASEO GENERAL**																						
13.1	LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	m²	762.00	$ 7,357.00	$ 5,606,034.00	173.35	935.35	$ 6,881,389.81	-	$ -	0.0%	***935.3527***	***$ 6,881,389.81***	*100.0%*	935.35	$ 6,881,389.81	122.7%	-	$ -	0.00%	
13.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m²	22.75	$ 191,319.00	$ 4,352,507.25	-22.75	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0.0%	-	$ -		
13.3	EMPRADIZACIÓN - TIERRA NEGRA Y GRAMA TIPO KIKUYO	m²	100.00	$ 27,427.00	$ 2,742,700.00	-	100.00	$ 2,742,700.00	-	$ -	0.0%	***100.0000***	***$ 2,742,700.00***	*100.0%*	100.00	$ 2,742,700.00	100.0%	-	$ -	0.00%	
NP	**NO PREVISTOS**																						

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	GA-JELOG-FR-101
	FORMATO CORTE PARCIAL - FINAL DE OBRA	5
		24/11/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°6
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
FECHA DE CORTE	16 de noviembre de 2024
CORTE DE OBRA No.	CORTE # 2

OBRA

No.ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			BALANCE A LA FECHA			OBRA EJECUTADA									OBRA POR EJECUTAR		
									CORTE 1 *(DEL 19 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024)*			CORTE 2 (DEL 28 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024)			PRESENTE CORTE (DEL 28 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024)			SALDO		
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR REAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
NP1	SUMINISTRO Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI	kg	-	$ 9,215.46	$ -	1,977.99	1,977.99	$ 18,228,097.43	*1,382.62*	*$ 12,741,508.79*	69.9%	***595.3679***	***$ 5,486,588.64***	*30.1%*	595.37	$ 5,486,588.64		-	$ -	0.00%
NP2	CONCRETO DE 3000 PSI	m3	-	$ 942,222.53	$ -	7.02	7.02	$ 6,616,074.61	*6.18*	*$ 5,818,954.35*	88.0%	***0.8460***	***$ 797,120.26***	*12.0%*	0.85	$ 797,120.26		-	$ -	0.00%
NP4	REGILLA EN ALUMINIO PARA FACHADA	m2	-	$ 481,000.00	$ -	71.79	71.79	$ 34,532,192.50	-	$ -	0.0%	***71.7925***	***$ 34,532,192.50***	*100.0%*	71.79	$ 34,532,192.50		-	$ -	0.00%
NP5	PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO PARA FACHADA	m2	-	$ 975,000.00	$ -	37.85	37.85	$ 36,903,750.00	-	$ -	0.0%	***37.8500***	***$ 36,903,750.00***	*100.0%*	37.85	$ 36,903,750.00		-	$ -	0.00%
NP6	VENTANA FIJA TIPO REGILLA EN ALUMINIO	m2	-	$ 750,000.00	$ -	2.10	2.10	$ 1,575,000.00	-	$ -	0.0%	***2.1000***	***$ 1,575,000.00***	*100.0%*	2.10	$ 1,575,000.00		-	$ -	0.00%
NP7	CAJA DE INSPECCION 60cmX60cm CON TAPA EN CONCRETO	Und	-	$ 685,575.47	$ -	2.00	2.00	$ 1,371,150.94	-	$ -	0.0%	***2.0000***	***$ 1,371,150.94***	*100.0%*	2.00	$ 1,371,150.94		-	$ -	0.00%
					$ -	-	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -		-	$ -	
					$ -	-	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -		-	$ -	
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA					**$ 322,090,047.33**			**$ 322,090,047.33**		**$ 103,624,668.64**			**$ 218,465,378.69**			**$ 218,465,378.69**			**$ -**	
ADMINISTRACIÓN				25.00%	**$ 80,522,511.83**		25.00%	**$ 80,522,511.83**	25.00%	**$ 25,906,167.16**		25.00%	**$ 54,616,344.67**		25.00%	**$ 54,616,344.67**		25.00%	**$ -**	
IMPREVISTOS				1.00%	**$ 3,220,900.47**		1.00%	**$ 3,220,900.47**	1.00%	**$ 1,036,246.69**		1.00%	**$ 2,184,653.79**		1.00%	**$ 2,184,653.79**		1.00%	**$ -**	
UTILIDADES				3.00%	**$ 9,662,701.42**		3.00%	**$ 9,662,701.42**	3.00%	**$ 3,108,740.06**		3.00%	**$ 6,553,961.36**		3.00%	**$ 6,553,961.36**		3.00%	**$ -**	
IVA SOBRE UTILIDAD				19.00%	**$ 1,835,913.27**		19.00%	**$ 1,835,913.27**	19.00%	**$ 590,660.61**		19.00%	**$ 1,245,252.66**		19.00%	**$ 1,245,252.66**		19.00%	**$ -**	
VALOR TOTAL OBRA CONTRACTUAL					**$ 417,332,074.33**		**SUBTOTAL 1**	**$ 417,332,074.33**	**SUBTOTAL 2**	**$ 134,266,483.16**	**32.17%**	**SUBTOTAL 3**	**$ 283,065,591.17**	**67.83%**	**SUBTOTAL 4**	**$ 283,065,591.17**	**67.83%**	**SUBTOTAL 5**	**$ -**	**0.00%**

EQUIPOS

No.	DESCRIPCION EQUIPO	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			BALANCE A LA FECHA			EQUIPOS ENTREGADOS									EQUIPOS POR ENTREGAR		
									CORTE 1 (FECHA)			CORTE 2 (FECHA)			PRESENTE CORTE			SALDO		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
			-	$ -	$ -	-	-	$ -		$ -			$ -			$ -		-	$ -	
			-	$ -	$ -		-	$ -		$ -			$ -			$ -		-	$ -	
TOTAL COSTO DIRECTO EQUIPOS					**$ -**			**$ -**		**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**	
IVA		**19.00%**			**$ -**			**$ -**		**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**	
SUBTOTALES EQUIPOS					**$ -**			**$ -**		**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**	
TOTALES (OBRA + EQUIPOS) CONTRACTUAL					**$ 417,332,074.33**		**SUBTOTAL 1**	**$417,332,074**	**SUBTOTAL 2**	**$ 134,266,483.16**	**32.17%**	**SUBTOTAL 3**	**$ 283,065,591.17**	**67.83%**	**SUBTOTAL 4**	**$ 283,065,591.17**	**67.83%**	**SUBTOTAL 5**	**$ -**	**0.00%**

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

% ANTICIPO	VALOR ANTICIPO				% AMORTIZADO CORTE 1	VALOR AMORTIZADO CORTE 1	% AMORTIZADO CORTE 2	VALOR AMORTIZADO CORTE 2	% A AMORTIZAR PRESENTE CORTE	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE CORTE	
0.00%	$ -				0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	

Solicita:

Representante Legal Contratista: EDWIN JAVIER PASTOR SILVA
Firma y postfirma

Autoriza:

Representante Legal Supervisor: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y postfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.		
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM Nº	NP1	UND:	KG
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI		
CORTE Nº:	2	FECHA :	16 de noviembre de 2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud	Cant Varillas	kg / ml			
	Placa fachada horno long	9,90	12,0	0,994		1	118,09
	Placa fachada horno transv	2,30	50,0	0,994		1	114,31
	Traslapo placa fachada horno	0,60	12,0	0,994		1	7,16
	Rampa fachada zona administrativa long	5,50	17,0	0,994		1	92,94
	Rampa fachada zona administrativa transv	3,30	28,0	0,994		1	91,85
	Traslapo rampa zona administrativa	0,60	17,0	0,994		1	10,14
	Placa fachada zona administrativa long	0,80	28,0	0,994		1	22,27
	Placa fachada zona administrativa transv	5,50	4,0	0,994		1	21,87
	Refuerzo placa sifones carcamo	1,00	10,0	0,994		2	19,88
	Viguetas muros segados	9,01	2,0	0,994		4	71,65
	Fleje Vigueta muros segados	0,25	45,1	0,560		4	25,23
							0,00
						TOTAL	595,37

Elaboró::

Residente de Obra: Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Supervisor: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.		
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM Nº	NP2	UND:	M3
DESCRIPCIÓN ÍTEM	CONCRETO DE 3000 PSI		
CORTE Nº:	2	FECHA :	16 de noviembre de 2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Viguetas mamposteria Sesgada	0,15	9,4	0,15		4	0,85
							-
							-
						TOTAL	0,85

Elaboró::

Residente de Obra: Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Supervisor: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.		
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM Nº	NP4	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	REGILLA EN ALUMINIO PARA FACHADA		
CORTE Nº:	2	FECHA :	16 de noviembre de 2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Fachada zona administrativa frontal V-6	1,41		3,25		2	9,17
	Fachada oriental zona administrativa V-3a	1,05		3,25		6	20,48
	Fachada principal horno incinerador V-5	0,95		3,20		8	24,32
	Fachada principal horno incinerador V-5b	0,95		3,25		4	12,35
	Fachada principal horno incinerador V-5a	0,85		3,25		1	2,76
	Fachada principal horno incinerador V-5c	0,85		3,20		1	2,72
							-
						TOTAL	71,79

Elaboró::

Residente de Obra: Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Supervisor: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.		
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM Nº	NP5	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO PARA FACHADA		
CORTE Nº:	2	FECHA :	16 de noviembre de 2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Fachada horno	2,00		4,45		2	17,80
	Fachada zona administrativa	2,00		4,45		2	17,80
	Acceso bodega	0,90		2,5		1	2,25
							-
							-
							-
							-
						TOTAL	37,85

Elaboró::

Residente de Obra: Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Supervisor: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.		
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM Nº	NP6	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	VENTANA FIJA TIPO REGILLA EN ALUMINIO		
CORTE Nº:	2	FECHA :	16 de noviembre de 2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Baño zona administrativa	0,70		1,5		2	2,10
							-
							-
							-
							-
							-
							-
						TOTAL	2,10

Elaboró::

Residente de Obra: Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Supervisor: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.		
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM Nº	NP7	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	CAJA DE INSPECCION 60cmX60cm CON TAPA EN CONCRETO		
CORTE Nº:	2	FECHA :	16 de noviembre de 2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Zona exterior					2	2,00
							-
							-
							-
							-
							-
							-
						TOTAL	2,00

Elaboró::

Residente de Obra: Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Supervisor: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.		
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM Nº	1,1	UND:	M3
DESCRIPCIÓN ÍTEM	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN		
CORTE Nº:	2	FECHA :	16 de noviembre de 2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Pozo Septico	2,20	4,05	1,08		1	9,62
	Cajas de inspeccion	1,00	1,00	0,68		2	1,36
	Campo de infiltracion	0,75	31,54	0,55		1	13,01
	caja de inspeccion A a B	0,75	15,00	0,68		1	7,65
	caja de inspeccion B a existente	0,75	5,00	0,68		1	2,55
	caja existente a pozo septico	0,75	22,00	0,68		1	11,22
	Frente zona administrativa	0,80	7,00	0,20		1	1,12
	Frente zona administrativa vehiculos	3,00	5,20	0,20		1	3,12
	Frente al horno	2,00	9,60	0,20		1	3,84
	Frente al tanq combustible	5,30	8,20	0,20		1	8,69
	Posterior Tanque combustible	5,30	1,75	0,20		1	1,86
	Posterior al horno	1,40	9,00	0,20		1	2,52
							-
						TOTAL	66,56

Elaboró::

Residente de Obra Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Residente de Interventoría: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.		
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM Nº	1,2	UND:	M3
DESCRIPCIÓN ÍTEM	CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA		
CORTE Nº:	2	FECHA :	16 de noviembre de 2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Pozo Septico	2,00	4,00	1,10		1	8,80
	Cajas de inspeccion	1,00	1,00	0,70		2	1,40
	Campo de infiltracion	0,75	31,54	0,40		1	9,46
	caja de inspeccion A a B	0,75	15,00	0,70		1	7,88
	caja de inspeccion B a existente	0,75	5,00	0,70		1	2,63
	caja existente a pozo septico	0,75	22,00	0,70		1	11,55
	Sifones carcamos	1,20	1,20	1,30		2	3,74
	Descole red sanitaria carcamos	1,00	1,10	1,20		1	1,32
						TOTAL	46,78

Elaboró::

Residente de Obra Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Residente de Interventoría: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	**036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.**
OBJETO DEL CONTRATO	**ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.**
CONTRATISTA	**EDWIN JAVIER PASTOR SILVA**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD**

ÍTEM Nº	2,1	UND:	M3
DESCRIPCIÓN ÍTEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN SEGÚN PLANOS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO DE 0 - 2,00 MTS.		
CORTE Nº:	**2**	FECHA :	**16 de noviembre de 2024**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Pozo Septico	2,00	4,00	1,30		1	10,40
	Cajas de inspeccion	1,00	1,00	0,90		2	1,80
	Campo de infiltracion	0,75	31,54	0,60		1	14,19
	caja de inspeccion A a B	0,75	15,00	0,90		1	10,13
	caja de inspeccion B a existente	0,75	5,00	0,90		1	3,38
	caja existente a pozo septico	0,75	22,00	0,90		1	14,85
	Sifones carcamos	1,20	1,20	1,30		2	3,74
	Descole red sanitaria carcamos	1,00	1,10	1,20		1	1,32
	Sobre ancho Frente a horno	0,59	30,00	0,20		1	3,53
	Frente zona administrativa	0,80	7,00	0,20		1	1,12
	Frente zona administrativa vehiculos	3,00	5,20	0,20		1	3,12
	Frente al horno	2,00	9,60	0,20		1	3,84
	Frente al tanq combustible	5,30	8,20	0,20		1	8,69
	Posterior Tanque combustible	5,30	1,75	0,20		1	1,86
	Posterior al horno	1,40	9,00	0,20		1	2,52
							-
						TOTAL	**84,48**

Elaboró::

Residente de Obra Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Residente de Interventoría: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.		
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM Nº	3,1	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE HASTA ALCANZAR CBR=95% DEL PROCTOR MODIFICADO		
CORTE Nº:	2	FECHA :	16 de noviembre de 2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Sobre ancho Frente a horno	0,59	30,00			1	17,64
						TOTAL	17,64227024

Elaboró::

Residente de Obra: Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Supervisor: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTI	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.
OBJET O	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD

ÍTEM Nº	3,2	UND:	M3
DESCRIPCIÓN ÍTEM	RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE PREPARADA CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA REGIÓN (REMONTA) Y CEMENTO AL 6% SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN		
CORTE Nº:	2	FECHA :	16 de noviembre de 2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Sobre ancho Frente a horno	0,59	30,00	0,20		1	3,53
	Viga de cimentacion taq combustible	0,25	5,30	0,05		3	0,20
		0,25	8,20	0,05		1	0,10
		0,25	1,75	0,05		1	0,02
	Viga de cimentacion zona administrativa	0,25	3,00	0,05		1	0,04
		0,25	7,00	0,05		1	0,09
	Viga de cimentacion frente a horno	0,25	2,00	0,05		2	0,05
		0,25	9,20	0,05		1	0,12
						TOTAL	4,14

Elaboró::

Residente de Obra: Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Supervisor: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.		
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM Nº	4,1	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	CONSTRUCCION DE PLACA MACIZA SOBRE TERRENO EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.25 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO		
CORTE Nº:	2	FECHA :	16 de noviembre de 2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Frente zona administrativa	7,00	0,5			1	3,50
	Frente zona administrativa vehiculos	3,20	5,20			1	16,64
	Frente al horno	2,00	9,60			1	19,20
	Placa sifones carcamos A	1,00	0,90			1	0,90
	Placa sifones carcamos B	1,00	0,90			1	0,90
							-
						TOTAL	41,14

Elaboró::

Residente de Obra Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Residente de Interventoría: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	**036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.**
OBJETO DEL CONTRATO	**ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.**
CONTRATISTA	**EDWIN JAVIER PASTOR SILVA**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD**

ÍTEM Nº	5,1	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 (0.33X0.115X0.23) MTS. DE PERFORACION VERTICAL, INCLUYE ACERO DE REFUERZO VERTICAL, MORTERO DE RELLENO Y PEGA MAS ANCLAJE A PLACAS CONTRAPISO Y ENTREPISO.		
CORTE Nº:	**2**	FECHA :	**16 de noviembre de 2024**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Fachadas muros sesgados	1,00		9,30		4	37,20
	Fachada tanque combustible	1,75		4,26		2	14,91
	Culatas fachadas parte superior	1,90		3,20		2	12,16
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**64,27**

Elaboró::

Residente de Obra Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Residente de Interventoria: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.		
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM Nº	6.1.1	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4"		
CORTE Nº:	2	FECHA :	16 de noviembre de 2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Tuberia sanitari 4" baño		3,00			1	3,00
	Tuberia sanitaria 4" caja de inspeccion A a B		15,00			1	15,00
	Tuberia sanitaria 4" caja de inspeccion B a existente		5,00			1	5,00
	Tuberia sanitaria 4" caja existente a pozo septico		22,00			1	22,00
	Carcamos		2,50			2	5,00
	Tuberia Pozo septico distribucion a campo infiltracion		1,6			2	3,20
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	53,20

Elaboró::

Residente de Obra Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Residente de Interventoría: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.		
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM Nº	6.1.7	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO DE 2.400 LTS		
CORTE Nº:	2	FECHA :	16 de noviembre de 2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Sistema septico					1	1,00
							-
							-
							-
							-
							-
							-
	TOTAL						1,00

Elaboró::

Residente de Obra Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Residente de Interventoría: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.		
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM Nº	6.1.8	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	TUBERIA PERFORADA 2"		
CORTE Nº:	2	FECHA :	16 de noviembre de 2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Campo de infiltracion		31,54			1	31,54
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
						TOTAL	31,54

Elaboró::

Residente de Obra Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Residente de Interventoría: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.		
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM Nº	6.1.9	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PRUEBA SANITARIA		
CORTE Nº:	2	FECHA :	16 de noviembre de 2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Prueba red sanitaria					2	2,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	2,00

Elaboró::

Residente de Obra Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Residente de Interventoría: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.		
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM Nº	6.2.1	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE)		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30 de septiembre de 2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Red sanitaria		15,00			1	15,00
	Araña bateria de baños		1,80			10	18,00
	Sifones carcamos		1,20			26	31,20
	Tuberia lavaplatos		2,5			1	2,50
							-
							-
							-
							-
							-
					TOTAL		66,70

Elaboró::

Residente de Obra Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Residente de Interventoría: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.		
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM Nº	6.2.3	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 3/4"		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30 de septiembre de 2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Distribucion interna de area administrativa a horno		15,00			1,00	15,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	15,00

Elaboró::

Residente de Obra Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Residente de Interventoría: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.		
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM Nº	6.2.5	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30 de septiembre de 2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Horno					1	1,00
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
						TOTAL	1,00

Elaboró::

Residente de Obra Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Residente de Interventoría: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.		
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM Nº	6.2.6	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 3/4"		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30 de septiembre de 2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Horno					1	1,00
							-
							-
							-
							-
							-
							-
						TOTAL	1,00

Elaboró::

Residente de Obra Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Residente de Interventoría: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.		
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM Nº	6.2.7	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	LLAVE TERMINAL CON CONEXIÓN PARA MANGUERA		
CORTE Nº:	2	FECHA :	16 de noviembre de 2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Punto de acopio					1	1,00
	Horno					1	1,00
	Zona exterior					1	1,00
							-
							-
							-
							-
							-
						TOTAL	3,00

Elaboró::

Residente de Obra Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Residente de Interventoría: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.		
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM Nº	6.2.8	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PRUEBA HIDRÁULICA		
CORTE Nº:	2	FECHA :	16 de noviembre de 2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	prueba hidraulica					1	1,00
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
						TOTAL	1,00

Elaboró::

Residente de Obra Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Residente de Interventoría: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.		
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM Nº	6.2.9	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESINFECCIÓN RED HIDRÁULICA		
CORTE Nº:	2	FECHA :	16 de noviembre de 2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Red de suministro		43,60			1	43,60
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
					TOTAL		43,60

Elaboró::

Residente de Obra Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Residente de Interventoría: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.		
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM Nº	6.3.6	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø 2 " .		
CORTE Nº:	2	FECHA :	16 de noviembre de 2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Conexión a red existente					1	1,00
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
						TOTAL	1,00

Elaboró::


Residente de Obra Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Residente de Interventoría: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.		
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM Nº	6.4.1	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANAL METALICA CALIBRE 14		
CORTE Nº:	2	FECHA :	16 de noviembre de 2024

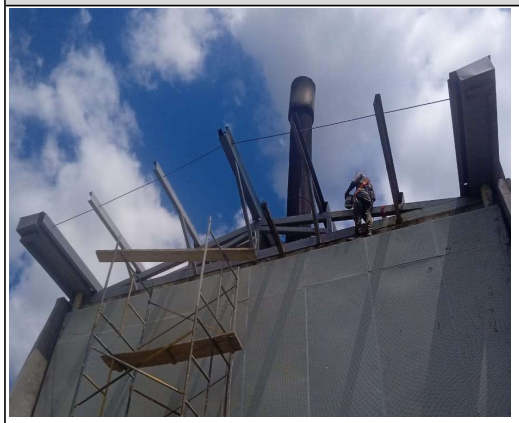PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Fachada zona administrativa		7,00			2	14,00
	Fachada Horno		2,30			4	9,20
	Cubierta tanque combustible		5,30			2	10,60
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
	TOTAL						33,80

Elaboró::

Residente de Obra Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Residente de Interventoría: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.		
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM Nº	6.4.2	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC Ø 6"		
CORTE Nº:	2	FECHA :	16 de noviembre de 2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Cubierta tanque combustible		5,00			2	10,00
	Cubierta zona administrativa		5,00			2	10,00
	cubierta horno fachada principal		9,00			2	18,00
					TOTAL		38,00

Elaboró::

Residente de Obra Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Escriba el texto aquí

Residente de Interventoría: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N 6		
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM Nº	7.1.1	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	TUBERÍA PVC CONDUIT Ø 1/2"		
CORTE Nº:	22	FECHA :	16 de noviembre de 2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Red interna		5,00			1	5,00
							-
							-
							-
							-
							-
							-
						TOTAL	5,00

Elaboró:: Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Residente de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N 6
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD

ÍTEM Nº	7.1.4	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ACOMETIDA EN CABLE 3N10 CU AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N10 CU AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 CU AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.		
CORTE Nº:	2	FECHA :	16 de noviembre de 2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Red interna		29,82			1	29,82
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
						TOTAL	29,82

Elaboró::	VoBo:
Residente de Obra Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO Firma y Posfirma	Residente de Interventoría: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	**036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.**
OBJETO DEL CONTRATO	**ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE**
CONTRATISTA	**EDWIN JAVIER PASTOR SILVA**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD**

ÍTEM Nº	8.1	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"		
CORTE Nº:	**2**	FECHA :	**16 de noviembre de 2024**





PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENT	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Fachada posterior zona administrativa	7,00		4,46		2	62,44
	Ventanas fachada posterior	0,70		1,50		-2	-2,10
	Interno oficinas	7,31		3,00		2	43,86
	Puerta acceso oficinas	0,90		2,50		-1	-2,25
	Divisorio zona adm-bodega	4,30		3,00		2	25,80
	Acceso baño	1,50		3,00		2	9,00
	Puerta Acceso baño	0,90		2,50		-1	-2,25
	Antepecho Fachada zona adminitrativa	1,50		1,20		4	7,20
	Antepecho Fachada horno	4,32		1,20		2	10,37
	Divisorio deposito bodegaje	3,45		3,00		2	20,70
	Divisorio baño-Vestier	3,45		3,00		2	20,70
	Puerta Divisorio baño-Vestier	0,90		2,50		-1	-2,25
	Baño hacia horno	2,45		3,00		2	14,70
	Divisorio zona adm-horno	2,30		4,46		2	20,52
	Divisorio zona adm-horno ejes C-D	5,30		4,46		2	47,28
	Vano Divisorio zona adm-horno C-D	2,50		3,00		-1	-7,50
	Divisorio zona adm-horno ejes D-E	5,85		4,46		2	52,18
	Vano Divisorio zona adm-horno D-E	2,85		3,00		-1	-8,55
	Divisorio zona adm-bodega	0,90		3,00		2	5,40
	Fachadas muros sesgados	1,00		9,30		8	74,40
	Fachada tanque combustible	1,75		4,26		4	29,82
	Culatas fachadas parte superior	1,90		3,20		4	24,32
	Carteras ventanas facahada lateral	0,45	10,7			3	14,45
	Carteras puertas internas	0,15	21,55			1	3,23
	Carteras ventanas internas	0,15	8,80			1	1,32
	Carteras Antepecho Fachada zona adm	0,15	2,70			1	0,41
	Carteras Antepecho Fachada horno	0,15	5,52			1	0,83
	Cartera muros segados	0,15	9,30			4	5,58
							0,00
						TOTAL	**469,59**

Elaboró::


Residente de Obra Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Residente de Interventoría: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.		
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM Nº	11.1	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	TEJA EN LAMINA SIN TRASLAPO COLOR (SEGÚN UMA) EXTERIOR Y BLANCO INTERIOR SENCILLA PANEL 2" ANCHO 45CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4)		
CORTE Nº:	2	FECHA :	16 de noviembre de 2024

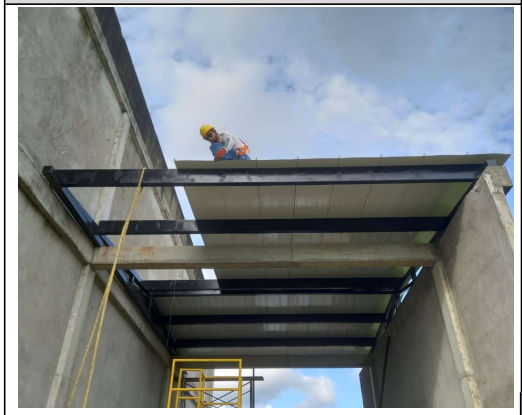PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Tanque de combustible	5,50	4,75			2	52,25
	Prolongacion horno	2,00	4,50			4	36,00
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
					TOTAL		88,25

Elaboró::

Residente de Obra Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Residente de Interventoría: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.		
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM Nº	11.2	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	FLANCHE EN LÁMINA DE 0,25 ÚTIL POR 2,40ML CAL 26 SEGÚN PLANOS PARA LA CUBIERTA CONTRA MURO INCRUSTADO Y SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE		
CORTE Nº:	2	FECHA :	16 de noviembre de 2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Tanque de combustible		10,00			1	10,00
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
						TOTAL	10,00

Elaboró::

Residente de Obra Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Residente de Interventoría: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.		
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM Nº	11.3	UND:	KG
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METÁLICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGÚN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIÉN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE		
CORTE Nº:	2	FECHA :	16 de noviembre de 2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	kg /ml			
	CORRECCION DE PESO Refuerzo interno tanq de combustible tubo 70x70x2,5mm		3,70	0,77		2	5,70
	Prolongacion correas horno perfil en C 220x80x2,5mm		3,00	7,97		14	334,74
	Refuerzo puerta horno 100x100x2,5mm		8,00	7,71		1	61,68
			9,20	7,71		1	70,93
	Refuerzo regillas horno 70x70x2,5mm		3,40	5,36		6	109,34
			3,30	5,36		3	53,06
	Refuerzo puerta zona adm 100x100x2,5mm		4,50	7,71		2	69,39
	Estructura fachada lateral 70x70x2,5mm		3,80	5,36		3	61,10
						TOTAL	765,95

Elaboró::

Residente de Obra Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Residente de Interventoria: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.		
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM Nº	12.1	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	CERRADURA CILINDRICA POMO ALUMINIO ALCOBA		
CORTE Nº:	2	FECHA :	16 de noviembre de 2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	puerta del deposito					1	1,00
							-
							-
							-
							-
							-
							-
					TOTAL		1,00

Elaboró::

Residente de Obra Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Residente de Interventoría: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.		
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM Nº	12.2	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	CERRADURA YALE DOBLE PASADOR		
CORTE Nº:	2	FECHA :	16 de noviembre de 2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Puerta Horno					1	1,00
	Puerta zona administrativa					1	1,00
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
						TOTAL	2,00

Elaboró::

Residente de Obra Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Residente de Interventoría: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.		
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM Nº	13.1	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR		
CORTE Nº:	2	FECHA :	16 de noviembre de 2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Zona horno	9,38	22,00			1	206,36
	Zona administrativa	8,70	17,90			1	155,73
	Tanque combustible	6	17			1	102,00
	Zona placas concreto	17,67	4			1	70,68
	Red sanitaria y pozo septico	45	5,969			1	268,58
	Perimetro obra	3	22			2	132,00
							-
							-
							-
							-
						TOTAL	935,35

Elaboró::

Residente de Obra Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Residente de Interventoría: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024.		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.		
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM Nº	13.3	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	EMPRADIZACIÓN - TIERRA NEGRA Y GRAMA TIPO KIKUYO		
CORTE Nº:	2	FECHA :	16 de noviembre de 2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Perimetro horno	1,00	22,00			2	44,00
	Perimetro septico	4,00	6,00			1	24,00
	Sobre campo infiltracion	1	32			1	32,00
							-
							-
							-
						TOTAL	100,00

Elaboró::

Residente de Obra Arquitecto JOSE ENRIQUE GARCIA AVENDAÑO
Firma y Posfirma

VoBo:

Residente de Interventoría: Subteniente BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Firma y Posfirma

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14981795261

(415)7707212489984(8020) 000001498179526 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 3 1 6 6 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 0 3 1 6 6 5	1 9 9 9 0 9 2 9

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PASTOR	SILVA	EDWIN	JAVIER

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 38 10 90 LC 20 16 CC PUERTO LOPEZ

42. Correo electrónico: auxiliar.edwinpastor@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 5 2 0 5 4 3 8	3 1 5 8 9 5 9 2 7 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	2 0 0 9 0 6 1 0	4 2 9 0	2 0 0 9 0 6 1 0		4 9 2 3	4 3 9 0	2 1 4 2	0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	2	2	4	2	4	8	5	2														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 03 - 01 / 15 : 08: 14

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PASTOR SILVA EDWIN JAVIER

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500505398

CONTRATO: 4600238618

PROVEEDOR DE SERVICIOS	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	04.12.2024
CONTRATO No.			
UNIDAD RECEPTORA	5006 CACOM 6		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500505398, contrato interno 4600238618 de fecha 04.12.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500505398	00010	1002167329	MTTO HORNO AF				242458.935,89
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	242458.935,89

OBSERVACIONES

FACTURA ELECTRONICA FVEC 115

SEGUNDO PAGO PARCIAL CONTRATO 036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024

ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.

AUMENTO VALOR ACTIVO FIJO HORNO

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500505401

CONTRATO: 4600238618

PROVEEDOR DE SERVICIOS	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	04.12.2024
CONTRATO No.			
UNIDAD RECEPTORA	5006 CACOM 6		
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500505401, contrato interno 4600238618 de fecha 04.12.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500505401	00010	1002167340	MTTO HORNO GASTO				32.807.441,26
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	32.807.441,26

OBSERVACIONES

FACTURA ELECTRONICA FVEC 115

SEGUNDO PAGO FINAL CONTRATO 036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024

ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.

GASTO

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500505401

CONTRATO: 4600238618

PROVEEDOR DE SERVICIOS	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	04.12.2024
CONTRATO No.			
UNIDAD RECEPTORA	5006 CACOM 6		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500505401, contrato interno 4600238618 de fecha 04.12.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500505401	00020	1002167344	MTTO HORNO AIU				7.799.214,02
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	7.799.214,02

OBSERVACIONES

FACTURA ELECTRONICA FVEC 115

SEGUNDO PAGO PARCIAL CONTRATO 036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024

ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.

FIRMAS

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkyramos	Kendy Yorely Ramos Espejo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-04-11:23 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	169624	**Fecha Registro:**	2024-12-04	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Contrato de Obra		**Nro. Compromiso:**	87824	**Nro. Cdp:**	8524
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	242.458.935,89	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	242.458.935,89	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	80031665	**Razón Social:**	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FACT FVEC 115	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
17	FACTURA
29	ACTA DE AVANCE DE OBRA

Objeto.:	SEGUNDO PAGO FINAL CONTRATO 036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024 ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.

RAMOS ESPEJO KENDY YORELY

Firmado digitalmente por RAMOS ESPEJO KENDY YORELY
Fecha: 2024.12.04 11:24:34 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkyramos	Kendy Yorely Ramos Espejo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-04-11:27 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	169724	**Fecha Registro:**	2024-12-04	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Contrato de Obra		**Nro. Compromiso:**	87824	**Nro. Cdp:**	8524
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	39.361.402,62	**Valor Iva:**	1.245.252,66		**Valor Total:**	40.606.655,28	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	80031665	**Razón Social:**	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FACT FVEC 115	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
29	ACTA DE AVANCE DE OBRA

Objeto.:	SEGUNDO PAGO FINAL CONTRATO 036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024 ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.

RAMOS ESPEJO KENDY YORELY

Firmado digitalmente por RAMOS ESPEJO KENDY YORELY
Fecha: 2024.12.04 11:28:58 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
