Corporación por el Ambiente y Desarrollo Social Sostenible de la Orinoquía

COAMDESOR

¡Emprendimiento por el bienestar de la región!

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3



CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS No. 627 DE 2023

APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

ARAUCA, OCTUBRE 28 DE 2024

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3

PERIODO:
DEL PRIMERO (01) AL CINCO (05) DE JUNIO DE 2024 Y DEL CUATRO (04) AL VEINTIOCHO (28) DE OCTUBRE DE 2024



CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIO No. 627 DE 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL
R/ YARLE PATRICIA CÁRDENAS LIDUEÑEZ

OBJETO: APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 001 DE 2024

CONTRATISTA: CORPORACIÓN POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA "COAMDESOR"
R/ JULIE ANDREA PÉREZ VILLAMIL

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO "APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

SUPERVISOR: FRANCISCO JAVIER MENDOZA NIÑO
RESOLUCIÓN No. 762 DE 2024

ARAUCA, OCTUBRE DE 2024

TABLA CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 7

1. ASPECTOS PRECONTRACTUALES 8

1.1. PROCESO DE SELECCIÓN 8
1.2. CELEBRACIÓN DEL CONTRATO 8
1.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 8
1.3.1. NECESIDAD POR SATISFACER 8
1.3.2. PROBLEMA CENTRAL 9
1.3.3. ALTERNATIVA DE LA SOLUCIÓN 9
1.4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 9
1.5. FUENTE DE FINANCIACIÓN 10
1.6. ALCANCE 10
1.7. ACTIVIDADES 10

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 14

2.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 14
2.1.1. INFORME CONTRACTUAL 14
2.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO 15
2.2.1. PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN 15
2.2.2. PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO 15
2.2.3. PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No.1 16
2.3. IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES 16
2.4. ACTOS ADMINISTRATIVOS 16
2.5. ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO 17
2.6. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 18
2.7. CONTROL SOCIAL DEL PROYECTO 19
2.7.1. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO EN ARAUCA 19
2.7.2. CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA CIUDADANA 20
2.8. VINCULACIÓN DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES 20
2.8.1. INTEGRANTES DEL CONSORCIO 20
2.8.2. PERSONAL VINCULADO 21

3. ASPECTOS TÉCNICOS 23

3.1. CONDICIONES CONTRACTUALES 23
3.2. CANTIDADES EJECUTADAS 25
3.2.1. COMPONENTE 1. APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPESINA JOSÉ ANTONIO GALÁN ZORRO 28
3.2.2. COMPONENTE 2. APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA 35
3.2.3. COMPONENTE 3. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EMPRESARIAL 39

3.3. AVANCE DEL CONTRATO 42
3.3.1. AVANCE FÍSICO 42
3.3.2. AVANCE DEL PLAZO CONTRACTUAL 43
3.4. PROGRAMACIÓN DEL CONTRATO 43
3.4.1. PROGRAMACIÓN INICIAL DEL CONTRATO 43
3.4.2. REPROGRAMACIÓN SEGÚN ACTA DE REINICIO No. 1 44
3.5. ASPECTOS FINANCIEROS 45
3.5.1. MANEJO DEL ANTICIPO 45
3.5.2. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO 45
3.5.3. APERTURA DE CUENTA BANCARIA – CONTRATO FIDUCIARIO 45
3.5.4. ESTADO DEL CONTRATO FIDUCIARIO 46

4. ASPECTOS CONTRACTUALES - INTERVENTORÍA 48

4.1.1. ALCANCE 48
4.1.2. INTERVENTORÍA TÉCNICA 48
4.1.3. INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA 48
4.1.4. INTERVENTORÍA FINANCIERA 48
4.1.5. RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DEL SUPERVISOR 49
4.2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO 50
4.3. GARANTÍAS DEL CONTRATO 51
4.3.1. PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN 51
4.3.2. PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO 52
4.3.3. PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 Y REINICIO No. 1 52
4.4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 53
4.4.1. ACTOS ADMINISTRATIVOS 53
4.4.2. VINCULACIÓN DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES 53
4.4.3. EQUIPOS DE INTERVENTORÍA 54
4.5. ASPECTOS TÉCNICOS 56
4.5.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA 56
4.5.2. AVANCE DE EJECUCIÓN DE INTERVENTORÍA 64
4.5.3. AVANCE FÍSICO 65
4.5.4. AVANCE DEL PLAZO CONTRACTUAL 65
4.5.5. AVANCE FINANCIERO 65
4.6. ASPECTOS FINANCIEROS 66
4.6.1. MANEJO DEL ANTICIPO. 66
4.6.2. APERTURA DE CUENTA BANCARIA 67
4.7. CONCLUSIONES 68

5. ANEXOS 69

LISTADO DE IMÁGENES

Imagen 1.- Localización del proyecto 10

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Componentes Generales del proyecto. 11
Tabla 2. Información general del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023. 14
Tabla 3. Póliza de Cumplimiento del contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023. 15
Tabla 4. Póliza Según Acta de Inicio del contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023. 15
Tabla 5. Póliza Según Acta de suspensión y reinicio No.1 del contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023. 16
Tabla 6. Actos Administrativos del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023. 16
Tabla 7. Relación de actas de comité. 17
Tabla 8. Relación de correspondencia enviada en medio físico por la Interventoría del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023. 18
Tabla 9. Relación de correspondencia recibido en medio físico por la Interventoría del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023. 18
Tabla 10. Relación de pagos de seguridad social del mes de marzo 2024 empresas consorciadas 20
Tabla 11. Relación de pagos de seguridad social del mes de abril 2024 empresas consorciadas 20
Tabla 12. Relación de pagos de seguridad social del mes de mayo 2024 empresas consorciadas 20
Tabla 13. Relación de pagos de seguridad social del mes de junio 2024 empresas consorciadas. 20
Tabla 14. Relación de pagos de seguridad social del mes de Octubre 2024 empresas consorciadas. 20
Tabla 15. Relación de personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023. 21
Tabla 16. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627de 2023 21
Tabla 17. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023 21
Tabla 18. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023 21
Tabla 19. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023 22
Tabla 20. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627de 2023 22
Tabla 21. Condiciones Iniciales del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023. 23
Tabla 22. Cantidades Ejecutadas del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023. 25
Tabla 23. Avance del Ítem 1.1. 28
Tabla 24. Avance del Ítem 1.2. 28
Tabla 25. Avance del Ítem 1.3. 29
Tabla 26. Avance del Ítem 1.4. 29
Tabla 27. Avance del Ítem 1.5. 30
Tabla 28. Avance del Ítem 1.6. 30
Tabla 29. Avance del Ítem 1.7. 30
Tabla 30. Avance del Ítem 1.8. 31
Tabla 31. Avance del Ítem 1.9. 31
Tabla 32. Avance del Ítem 1.10 32
Tabla 33. Avance del Ítem 1.11 32
Tabla 34. Avance del Ítem 1.12 33

Tabla 35. Avance del Ítem 1.13 33
Tabla 36. Avance del Ítem 1.14 33
Tabla 37. Avance del Ítem 1.15 34
Tabla 38. Avance del Ítem 1.16 34
Tabla 39. Avance del Ítem 1.17 35
Tabla 40. Avance del Ítem 2.1 35
Tabla 41. Avance del Ítem 2.2 35
Tabla 42. Avance del Ítem 2.3 36
Tabla 43. Avance del Ítem 2.4 36
Tabla 44. Avance del Ítem 2.5 37
Tabla 45. Avance del Ítem 2.6 37
Tabla 46. Avance del Ítem 2.7 38
Tabla 47. Avance del Ítem 2.8 38
Tabla 48. Avance del Ítem 2.9 39
Tabla 49. Avance del ítem 3.1 contrato 627 de 2023 40
Tabla 50. Avance del ítem 3.2 contrato 627 de 2023 41
Tabla 51. Avance del ítem 3.3 contrato 627 de 2023 42
Tabla 52. Porcentaje de avance del plazo contractual - Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023. 43
Tabla 53. Porcentaje de avance Programado Vs Ejecutado del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023. 43
Tabla 54. Porcentaje de avance Reprogramado Vs Porcentaje avance Ejecutado Reprogramación 44
Tabla 55. Plan de inversión de anticipo - Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023. 45
Tabla 56. Ordenes de operación del anticipo principal y adicional de valor y plazo 46
Tabla 57. Información contractual – Contrato de Interventoría No. 001 de 2024 50
Tabla 58. Condiciones contractuales iniciales del contrato de Interventoría No. 001 de 2024 51
Tabla 59. Pólizas iniciales del contrato de Interventoría No. 001 de 2024 52
Tabla 60. Pólizas Según Acta de Inicio del contrato de Interventoría No. 001 de 2024 52
Tabla 61. Pólizas Según Acta de Suspensión No. 1 y reinicio No. 1 del contrato de Interventoría No. 001 de 2024 52
Tabla 62. Actos administrativos – Contrato de Interventoría No. 001 de 2024 53
Tabla 63. Relación de Personal profesional del contrato de Interventoría No. 001 de 2024 53
Tabla 64. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato Interventoría No. 002 de 2024 54
Tabla 65. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023 54
Tabla 66. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023 54
Tabla 67. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023 54
Tabla 68. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023 54
Tabla 69. Avance de ejecución financiera – Contrato de Interventoría No. 001 de 2024 64
Tabla 70. Porcentaje de avance del plazo contractual - Contrato de Interventoría No. 001 de 2024. 65

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al Informe técnico, administrativo y financiero de la ejecución del contrato de Prestaciones de Servicios No. 627 de 2023 denominado **"APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA".**

Dentro del presente documento se relacionan las actividades ejecutadas por el **CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL** en marco del contrato de prestaciones de servicios No. 627 de 2023 celebrado entre EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL R/ YARLE PATRICIA CÁRDENAS LIDUEÑEZ, identificado con NIT No. 901.784.517-8, cuyo objeto es "APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA". El componente técnico del informe contiene la descripción completa de las actividades ejecutadas y el avance en términos físicos-financieros, el componente financiero contiene la información financiera (registro presupuestal, plan de inversión de anticipo, fiducia etc.) y el componente administrativo contienen la información contractual, pólizas, actas de comité y cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social, hojas de vida y vinculación de personal.

El presente informe es realizado por la **CORPORACIÓN POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA "COAMDESOR"**, en cumplimiento de sus obligaciones de seguimiento y control a las actividades ejecutadas por la firma contratista, la cual presenta un avance de ejecución acumulado del 87,08% el cual comprende el periodo de ejecución del primero (01) al cinco (05) de junio de 2024 y del cuatro (04) al veintiocho (28) de octubre de 2024.

1. ASPECTOS PRECONTRACTUALES

1.1. PROCESO DE SELECCIÓN

El Departamento de Arauca adelantó el proceso de selección mediante la modalidad de licitación LP-07-06-2023 de conformidad con lo establecido en la Ley 80/93, numeral 1 del art. 2 de la ley 1150 de 2007, art 14 y 15 del decreto 2474 de 2008 y demás normatividad concordante, para lo cual la Gerencia de Contratación realizó oportunamente las publicaciones pertinentes en la página WEB www.contratos.gov.co, Departamento de Arauca, llevándose a cabo el cierre del proceso de selección de acuerdo al cronograma y realizando la respectiva evaluación de las ofertas presentadas por los proponentes por parte del Comité Evaluador. Una vez se llevó a cabo las evaluaciones jurídicas, técnica y financiera de las propuestas y se estableció el orden de elegibilidad, se procedió a adjudicar el contrato al **CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL con Nit. 901784517-8**, representado por el señor **YARLE PATRICIA CÁRDENAS LIDUEÑEZ** mediante Resolución 4587 del 27 de diciembre de 2023.

1.2. CELEBRACIÓN DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el proceso de selección, se procedió a la suscripción del **Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023** el día 27 de diciembre de 2023 entre el **DEPARTAMENTO DE ARAUCA** y el **CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL R/L YARLE PATRICIA CÁRDENAS LIDUEÑEZ**, el cual tiene por **objeto "APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA",** con un plazo de ejecución de CUATRO (04) meses y un valor de $ 1.390.000.000,00.

1.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.3.1. NECESIDAD POR SATISFACER

La demanda de alimentos y productos agrícolas en el departamento de Arauca ha sufrido grandes cambios así precedentes, debido a los grandes flujos migratorios de personas desde la hermana república de Venezuela y otros departamentos del país, el aumento del ingreso per cápita esta situación está generando cambios en la creciente demanda de productos agrícolas.

Así mismo y de acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario de las 12.129 unidades de producción agropecuaria UPAS que registra el Departamento de Arauca, 7.450 UPAS son de vocación pecuarias y 4.679 agrícolas.

De acuerdo con el Consejo Departamental de Competitividad, el Departamento de Arauca cuenta con cinco (5) cadenas productivas identificadas que corresponden a: La cadena de plátano, la cadena de cacao-chocolate, la cadena de carne - leche, la cadena forestal y la cadena de turismo. No obstante, existen otras actividades de importancia para la región que contribuyen al desarrollo económico del departamento y la generación de ingresos a nivel rural; entre dichas actividades se encuentran la avicultura, la porcicultura, la apicultura, los cultivos tradicionales como plátano.

El Departamento de Arauca, aporta al Producto Interno Bruto nacional un 0,51%, siendo el sector agropecuario el segundo región importante después de minas y canteras, es por ello que el Departamento de Arauca ha realizado esfuerzos en mejorar la producción y la asistencia técnica en las cadenas productivas priorizadas como: Ganadería, Cacao, Plátano, turismo y Forestal; así mismo ha realizado esfuerzos en seguridad alimentaria con proyectos de asistencia técnica en especies menores como cría de cerdos, gallinas ponedoras, producción de miel, entre otras.

Sin embargo, estos sistemas o procesos de producción agropecuaria son sostenibles cuando son económicamente rentables, capaces de generar ingresos suficientes que permiten a las familias rurales alcanzar sus propias metas de bienestar. Pero, para ello se deben trabajar en el desarrollo de habilidades que le permita al productor reducir la gran brecha en lo que se produce y lo que se logra comercializar debido a la baja apropiación de conocimientos y habilidades para saber negociar y conseguir clientes para poder sacar los productos de la región.

1.3.2. PROBLEMA CENTRAL

Para el Departamento de Arauca, se refleja un total de 60 asociaciones que presentan dificultades en el proceso de comercialización debido a la falta de asistencia técnica socio empresarial y la falta de apoyo en maquinarias y herramientas, Esto según datos estadísticos suministrados por el Departamento de prosperidad Social (DPS). Con el desarrollo del proyecto, se contempla apoyar 2 asociaciones para el mejoramiento de los procesos de producción y fortalecimiento a la comercialización de los productos.

1.3.3. ALTERNATIVA DE LA SOLUCIÓN

La alternativa de solución planteada tiene como objetivo Mejorar la productividad y competitividad de las asociaciones del sector agroindustrial de los municipios de Saravena y Arauquita del Departamento de Arauca, con el propósito de impulsar las cadenas productivas, contribuir a aumentar el nivel de producción, aprovechamiento y transformación de materias primas para potencializar el sector de la misma manera generar la reactivación económica y la generación de Ingresos Para ello y teniendo en cuenta las funciones y competencias de cada entidad.

El desarrollo de agroindustrias competitivas es crucial para generar oportunidades de empleo e ingresos en el departamento de Arauca. Contribuye, además, a mejorar la calidad de los productos agrícolas y su demanda. Las agroindustrias tienen el potencial de generar empleo para la población rural, no sólo a nivel agrícola, sino también en actividades fuera de la explotación como manipulación, envasado, procesamiento, transporte y comercialización de productos alimentarios y agrícolas.

1.4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Los trabajos se ejecutarán en el municipio de Saravena y Arauquita, del Departamento de Arauca.

INFORME DE INTERVENTORIA No. 3

Imagen 1.- Localización del proyecto



Fuente: Google Earth

1.5. FUENTE DE FINANCIACIÓN

Los recursos de financiación para realizar el proyecto "APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA" se harán con la Fuente de Financiación: ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS-SSF-Bienio 2023-2024, suscrito entre el Departamento de Arauca y el CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL.

1.6. ALCANCE

La alternativa de solución planteada tiene como objetivo Mejorar la productividad y competitividad de las asociaciones del sector agroindustrial de los municipios de Saravena y Arauquita del Departamento de Arauca, con el propósito de impulsar las cadenas productivas, contribuir a aumentar el nivel de producción, aprovechamiento y transformación de materias primas para potencializar el sector de la misma manera generar la reactivación económica y la generación de ingresos Para ello y teniendo en cuenta las funciones y competencias de cada entidad, se ha sugerido desarrollar las siguientes actividades y componentes:

- Componente 1. Fortalecimiento de las capacidades empresariales para la gestión y mejoramiento de la productividad de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro.
- Componente 2. Fortalecimiento de las capacidades empresariales para la gestión y mejoramiento de la productividad de la Cooperativa Procesadora De Cacao Del Oriente La Delicia
- Componente 3. Acompañamiento y seguimiento empresarial

1.7. ACTIVIDADES

De acuerdo con la estructura del proyecto el contratista realizara la ejecución de las siguientes actividades:

INFORME DE INTERVENTORIA No. 3

Tabla 1. Componentes Generales del proyecto.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
COMPONENTE 1. APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPESINA JOSÉ ANTONIO GALÁN ZORRO				
1.1	MANGUERA REFORZADA DE 1" 3 CAPAS ROLLO DE 100MTCALIBRE 80	10	$ 933.400,00	$ 9.334.000,00
1.2	CARRETILLA ANTI-PINCHAZO. TIPO CARRETILLA. MODELO VERSÁTIL, CAPACIDAD DE LEVANTE 5 FT. CARACTERÍSTICAS. CARRETILLA DE TOLVA DE 5 FT, MATERIAL DE LA TOLVA METÁLICA, RIN METÁLICO, RUDA ANTI-PINCHAZO	10	$ 1.000.000,00	$ 10.000.000,00
1.3	BALANZA BASCULA DE 500KG ELÉCTRICA DE PEDESTAL: BALANZA 500KG, MEDIDAS PLATAFORMA 50X60CM APROX. TABLERO DOBLE VISOR COLOR NÚMEROS: ROJO, RECARGABLE 8 A 10 HORAS CONTINUAS, PLEGABLE Y PORTÁTIL INCLUYE: 1. BALANZA PLATAFORMA, 1. INDICADOR, 1. CARGADOR,4 PATAS PARA LA PLATAFORMA	2	$ 2.445.000,00	$ 4.890.000,00
1.4	TRITURADORA DE PIEDRA 2 METROS CÚBICOS HORA: TRITURADORA DE PIEDRA DE 3 TONELADAS HORA CON MOTOR TRIFÁSICO O DIÉSEL, DE 10 CABALLOS NOBSE	1	$ 95.000.000,00	$ 95.000.000,00
1.5	TRITURADORA INDUSTRIAL PARA RESIDUOS SÓLIDOS: PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS CON REVERSIÓN AUTOMÁTICA, CON SISTEMA AVANZADO DE PROTECCIÓN DE RODAMIENTOS: MÚLTIPLES OBSTÁCULOS DE LABERINTO MECÁNICO Y SELLOS CONVENCIONALES, Y ASEGURANDO LA MÁXIMA FIABILIDAD EN LÍNEA, EFICIENCIA DE TRITURACIÓN EN LOS EJES ROTATORIOS DE CONTRAPESO QUE AUMENTEN LA EFICIENCIA DE LA ACCIÓN DE CORTE Y ROTURA, DE SISTEMA DE CONDUCCIÓN ELECTROMECÁNICA DE BAJA VELOCIDAD Y ALTO CON ROBUSTO DISEÑO DE CÁMARA DE CORTE. FUNCIONAMIENTO NO BALÍSTICO Y DE BAJO RUIDO Y NO CREAR POLVO NI PARTÍCULAS VOLADORAS, CON PROTECTORES DE GOLPES GRAVES EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DEL COJÍN, CON CORTADOR DE ALTA ALEACIÓN CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA UNA VIDA EXTRA-LARGA, ANTICORROSIVO Y RESISTENTE AL DESGASTE. RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS NSK, EJES DE CORTE HEXAGONALES DISEÑADOS PARA UNA MAYOR DURABILIDAD, DE 500KG	1	$ 108.116.000,00	$ 108.116.000,00
1.6	CANECA PLÁSTICA DE 55 GALONES CON TAPA Y ARO DE SEGURIDAD: ALTURA 90 CM DIÁMETRO O ANCHO 60 CM MATERIAL: POLIETILENO ORIGINAL DE ALTA DENSIDAD	38	$ 711.500,00	$ 27.037.000,00
1.7	MEDIDOR DE PLANTAS 5 EN 1, TEMPERATURA DE PH DEL SUELO. PROBADOR DE SUELO 5 EN 1: PUEDE MEDIR EL VALOR DE PH DEL SUELO (3,0 A 9,5, 10 NIVELES), INTENSIDAD DE MEDIDOR DE PLANTAS 5 EN 1, TEMPERATURA DE PH DEL SUELO. PROBADOR DE SUELO 5 EN 1: PUEDE MEDIR EL VALOR DE PH DEL SUELO (3,0 A 9,5, 10 NIVELES), INTENSIDAD DE LA LUZ SOLAR (9 NIVELES), HUMEDAD (5 NIVELES), HUMEDAD (20% -99%) Y TEMPERATURA DEL SUELO.	4	$ 700.000,00	$ 2.800.000,00
1.8	ZARANDA CLASIFICADORA 2 Y 3 NIVELES: ZARANDA CLASIFICADORA DE MATERIALES MALLA 100, 50 .05	1	$ 103.445.000,00	$103.445.000,00
1.9	CERRADORA DE SACOS Y COSTALES + HILO NUEVA: VOLTAJE: 110V AC, CORRIENTE: 0.73ª, PODER: 90 VOLTIOS FRECUENCIA: 50/60HZ, VELOCIDAD: 1100 RPM, ANCHO MÁXIMO DE LA BOLSA A COSER:: 0.16 PULGADAS (4MM), ESPACIO ENTRE PUNTADAS: 0.27 PULGADAS -0.33 PULGADAS (7-8.5MM), TAMAÑO DE LA MÁQUINA: 14.25 PULGADAS (361 MM) (L) X 9.25 PULGADAS (234 MM) (W) X 12 PULGADAS (304 MM)(H), PESO DE LA MÁQUINA: 12 LBS. (5.5 KG), TAMAÑO DE LA CAJA: 16 PULGADAS (406.4 MM)(L) X 11 PULGADAS (279.4 MM)(W) X 13 PULGADAS (330.2 MM)(H). DETALLES TÉCNICOS: 1. COSTURA PUNTO DE CADENA DE HILO ÚNICO 2. RANGO DE PUNTADA (MM) 6.5 (FIJO) 3. REVOLUCIÓN (RPM) 1250 4. AGUJA DN X 1 # 25 5. HILO (VINILO, SINTÉTICO O ALGODÓN) 20/6 6. MATERIAL DEL BOLSO QUE SE CERRARÁ EL PAPEL DE KRAFT, PP / PE, PAÑO TEJIDO, ALGODÓN, YUTE DE LA ARPILLERA 7. MOTOR DE ACCIONAMIENTO 90 W 8.FUENTE DE ALIMENTACIÓN 110, 220 O 240 V A.C 9.PESO NETO (KG) 5.9 KG. ACCESORIOS ESTÁNDAR; AGUJAS DN X 1 # 25 10PCS, HILO	2	$ 1.823.000,00	$3.646.000,00

INFORME DE INTERVENTORIA No. 3

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	DE VINILO EN 20/6 1 ROLLO, ARBUSTOS DEL MOTOR 2PCS, DESTORNILLADOR 1PCS, PINZAS 1PCS, LLAVE HEXAGONAL 1PCS, ENGRASADOR 1PCS			
1.10	GRANULADOR DE FERTILIZANTE ORGÁNICO: PRODUCTIVIDAD HASTA 3.000 KG POR HORA, DIMENSIONES DEL GRANULADOR; LONGITUD 4.5 METROS, DIÁMETRO 820 MM. FORMA DE PELLETS ESFÉRICA. TAMAÑO DE GRÁNULOS DE 2 A 8 MM DE DIÁMETRO, CONSUMO 75 KW. FUENTE DE ALIMENTACIÓN 380V	1	$ 369.000.000,00	$ 369.000.000,00
1.11	ESCRITORIO METÁLICO OPERATIVO 73X120X60CM: CARACTERÍSTICAS; 3 FRENTES DE GAVETA EN LÁMINA COL ROLLED CALIBRE 24. TAPA SUPERIOR EN AGLOMERADO DE 25 MM, ENCHAPADO EN FÓRMICA, CON CANTO FORRADO EN BOCEL DE PVC. GAVETA SUPERIOR CON CHAPA. LARGO 60 CENTÍMETROS, ANCHO 73 CM, PROFUNDIDAD 150 CENTÍMETROS ALTO 150 CENTÍMETROS	1	$ 1.933.300,00	$ 1.933.300,00
1.12	ARCHIVADOR 4 GAVETAS METÁLICO. ELABORADO EN LÁMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 22, RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, CORREDERAS INDEPENDIENTES FULL EXTENSIÓN, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA Y CHAPA DE ACCIÓN CON LLAVE. MEDIDAS134X47CMX60CM	1	$ 3.090.000,00	$ 3.090.000,00
1.13	SILLA ESCRITORIO CON BRAZOS Y RESPALDO NEGRA: MATERIAL CUERO SINTÉTICO, ANCHO 65 CENTÍMETROS ALTO 120, MATERIAL ESTRUCTURA METAL, ESPUMA, NYLON, POLIPROPILENO CAPACIDAD (RESISTENCIA - CARGA MÁXIMA) 120 KG GIRA 360 GRADOS, MEDIDAS 124X51X52	1	$ 2.112.000,00	$ 2.112.000,00
1.14	SILLA OFICINA INTERLOCUTORA ESCRITORIO ESTRUCTURA NEGRA PLAS: ESPALDA Y ASIENTO: EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. ESTRUCTURA: METÁLICA EN TUBO RECTANGULAR 30X15 CON AMARRES EN EL ASIENTO EN TUBO REDONDO 5/8 CALIBRE 18. RECUBRIMIENTO: PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA. TAPONES: ELÍPTICOS PLÁSTICOS NEGROS. MEDIDAS 82.5cmx42.5cmx47.5cm	2	$ 212.000,00	$ 424.000,00
1.15	LOCKER METÁLICO 9 PUESTOS AZUL DE 180X93X30 CM: LOCKER CON MÓDULOS DE DIFERENTES NÚMEROS DE CASILLAS DE UN CUERPO Y VARIOS COMPARTIMIENTOS VERTICALES CON PUERTAS Y SEGUROS PARA CANDADO. ZAPATERA Y MANIJAS PLÁSTICAS EN POLIPROPILENO. LAS PUERTAS DEL LOCKER POSEE CELOSÍAS QUE PERMITEN LA CIRCULACIÓN DE AIRE, SUPERFICIE TERMINADA COMPLETAMENTE LISA, SISTEMA DE SEGURIDAD SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE USO. EL LOCKER ESTÁ APOYADO SOBRE SISTEMA RÍGIDO, BISAGRAS DESARMABLES ÚNICAMENTE CON LA PUERTA ABIERTA.	1	$ 2.780.000,00	$ 2.780.000,00
1.16	COMPUTADOR DE ESCRITORIO, DISCO DURO 1 TB, DDR4 4GB, NO DVD, MONITOR 18,5 E1916HV LINUX (7PF82)	1	$ 5.300.000,00	$ 5.300.000,00
1.17	IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIÓN: IMPRIME, ESCANEA Y HACE COPIAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: INYECCIÓN DE TINTA. TIENE ENTRADA USB. CUENTA CON 2 BANDEJAS. CAPACIDAD MÁXIMA DE 130 HOJAS. SOPORTA PAPEL TAMAÑO A4, OFICIO, OFICIO MÉXICO, OFICIO 9, FOLIO, EJECUTIVO, MEDIA CARTA, A6, CARTA, FOTO 10 X 15 CM, SOBRE N10, 215.9 X 1.200 MM, FOTO 13 X 18 CM, FOTO 16:9, SOBRE PERSONALIZADO (54 X 86 MM - 215.9 X 1.200 MM). INCLUYE ACCESORIOS. PRÁCTICA Y FUNCIONAL TANTO PARA USO PERSONAL COMO PROFESIONAL	1	$ 2.066.700,00	$ 2.066.700,00
COMPONENTE 2. APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA				
2.1	REFINADOR DE PIEDRAS A MÁQUINA, CAPACIDAD DE 120 KG BACHE, POTENCIA INSTALADA: 3,5 KW	1	$ 74.450.000,00	$ 74.450.000,00
2.2	ELEVADOR DE CANGILONES DE 3 MTRS	1	$ 95.560.000,00	$ 95.560.000,00
2.3	PLANTA ELÉCTRICA DIÉSEL CABINADA: POTENCIA STAND BY 25KVA, POTENCIA PRIME 22KVA, POTENCIA NOMINAL 20KW HASTA 1000, FACTOR DE POTENCIA 0.8, CORRIENTE NOMINAL 164A/82A/47.5A, NÚMERO DE FASES 3 FRECUENCIA NOMINAL 60HZ, POTENCIA MÁXIMA DEL MOTOR 35hp, SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO (12 VOLTIOS), CAPACIDAD DE ACEITE EN EL CARTER 8L, CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 50L, PESO NETO 680Kg Y PESO BRUTO 700Kg.	1	$ 81.112.000,00	$ 81.112.000,00

INFORME DE INTERVENTORIA No. 3

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, FRECUENCÍMETRO Y HORÓMETRO.			
2.4	MOLDE EN POLICARBONATO PARA CHOCOLATE DE MESA 180GR: UNA BARRA POR 180 GRAMOS (250 CC) APROX. CON 10 DIVISIONES. BRILLO PERFECTO Y UNIFORMIDAD EN TUS PRODUCTOS	300	$ 84.500,00	$ 25.350.000,00
2.5	BÁSCULA PLEGABLE 300 KILOS ACERO INOXIDABLE: BRAZO DE DOBLAR ES IDEAL PARA SU TRABAJO Y TRANSPORTE. INDICADOR EN ACERO INOXIDABLE. CAPA ANTIDESLIZANTE. MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL. TECLADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO PULSADOR. TECLAS CON TONO AL OPRIMIR. INDICADOR LED ROJO AJUSTABLE A 3 TONOS DE BRILLO. PATAS AJUSTABLES NIVELADORAS. INCLUYE ADAPTADOR 6V. CELDA CON PROTECTOR FLUIDOS Y HUMEDAD. IDEAL PARA CUARTOS FRÍOS O MANEJO DE LÍQUIDOS. CON BANDEJA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE RESISTENTE AL TRABAJO COTIDIANO Y COMERCIAL, CON UN ANCHO DE 40CM X UN LARGO DE 50CM	2	$ 1.467.000,00	$ 2.934.000,00
2.6	BANDA TRANSPORTADORA DE 5 METROS: ESTRUCTURA Y BASE EN ACERO INOX. SUMINISTRO DE CORRIENTE 110 VOL. AC. 60 HZ. BANDA EN LONA TIPO SIN FIN, VULCANIZADA SIN FIN COLOR BLANCO, ANCHO DE LA BANDA TRANSPORTADORA 30 CMS, LARGO DE LA BANDA TRANSPORTADORA 5 MTRS, DOS GUÍAS AL COMIENZO DE LA BANDA CON ANCHO Y ALTURA VARIABLE PARA COLOCAR EL PRODUCTO. ALTURA DE TRABAJO 90 CMS. VELOCIDAD DE TRANSPORTE VARIABLE DE 3 A 6 MTRS/MIN. RODACHINAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, Y SISTEMA DE FRENO A LAS MISMAS, PESO MÁXIMO DE TRANSPORTE 15 KG. PESO APROX. DE TODO EL CONJUNTO 90 KG.	1	$ 75.903.000,00	$ 75.903.000,00
2.7	TÚNEL DE ENFRIAMIENTO DE CHOCOLATE SS DE ALTO RENDIMIENTO DE 280MM DE ANCHO; FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO, GRADO AUTOMÁTICO SEMIAUTOMÁTICO, APLICACIÓN CARAMELO – CHOCOLATE LONGITUD 4.2 M. ANCHO DEL CINTURÓN 280MM.	1	$ 79.667.000,00	$ 79.667.000,00
2.8	MÁQUINA AUTOMÁTICA DE MOLDEO DE CHOCOLATE DE LA MÁQUINA DEL DEPOSITANTE DE LA BARRA DE CHOCOLATE DE UN TIRO. COMPONENTES PRINCIPALES PLC, MOTOR, COJINETE, CAJA DE CAMBIOS, MOTOR, RECIPIENTE A PRESIÓN. ESTA MÁQUINA DEPOSITADORA DE CHOCOLATE TOTALMENTE AUTOMÁTICA CON SERVICONTROL ESTÁ EQUIPADA CON UN SERVOMOTOR DE MARCA INTERNACIONAL Y ESTÁ CONTROLADA POR UN SISTEMA PLC. ESTA MÁQUINA DEPOSITADORA PUEDE FABRICAR TIPOS DE PRODUCTOS DE CHOCOLATE, COMO CHOCOLATE ESFÉRICO, CHOCOLATE CON TROZOS, CHOCOLATE PARA SÁNDWICH, CHOCOLATE CON GOTAS DE AGUA, ETC.	1	$ 53.050.000,00	$ 53.050.000,00
2.9	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LICOR DE CHOCOLATE: EQUIPADO CON TEMPERATURA NOMINAL (TEMPERATURA AJUSTABLE) SE UTILIZA PARA ALMACENAR EL BIEN MOLIDO PASTA DE CHOCOLATE A TRAVÉS DE AGITACIÓN PARA CUMPLIR CON DESGASIFICACIÓN DE DESODORIZACIÓN DE 500 LTR	1	$ 79.000.000,00	$ 79.000.000,00
	COMPONENTE 3. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EMPRESARIAL			
3.1	ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL Y SEGUIMIENTO AL FORTALECIMIENTO ENTREGADO A LA ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPESINA JOSÉ ANTONIO GALÁN ZORRO Y COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA.	4	$ 6.000.000,00	$ 24.000.000,00
3.2	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO OPERATIVO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPESINA JOSÉ ANTONIO GALÁN ZORRO.	4	$ 6.000.000,00	$ 24.000.000,00
3.3	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO OPERATIVO DE LA COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA.	4	$ 6.000.000,00	$ 24.000.000,00
			TOTAL	$ 1.390.000.000,00

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

2.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

2.1.1. INFORME CONTRACTUAL

Tabla 2. Información general del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023.

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE ARAUCA
INTERVENTOR EXTERNO:	CORPORACIÓN POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA "COAMDESOR" R/ JULIE ANDREA PÉREZ VILLAMIL
SUPERVISOR:	FRANCISCO JAVIER MENDOZA NIÑO RESOLUCIÓN No. 762 DE 2024
CONTRATO No.:	627 de 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA:	CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL R/ YARLE PATRICIA CÁRDENAS LIDUEÑEZ
NIT. No:	901.784.517-8
VALOR DEL CONTRATO:	$ 1.390.000.000,00
PLAZO CONTRACTUAL:	CUATRO (04) MESES
VALOR DEL ANTICIPO 50%:	$ 695.000.000,00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	SGR202324-00366 del 15 de noviembre de 2023 por $1.399.431.000,00, fuente de financiación ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS-SSF-Bienio 2023-2024.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	SGR202324-00358 del 28 de diciembre de 2023 por $1.390.000.000,00, fuente de financiación ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS-SSF-Bienio 2023-2024.
FECHA INICIO:	20 de marzo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	20 de julio de 2024
FECHA DE SUSPENSION No. 1:	06 de junio de 2024
FECHA DE PRORROGA No. 1 DE LA SUSPENSION No. 1:	06 de agosto de 2024
FECHA DE PRORROGA No. 2 DE LA SUSPENSION No. 1:	06 de septiembre de 2024
FECHA DE REINICIO No. 1:	04 de octubre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	17 de noviembre de 2024
PERIODO DEL INFORME	
FECHA DE CORTE DEL INFORME:	Desde el primero (01) al cinco (05) de junio de 2024 y del cuatro (04) al veintiocho (28) de octubre de 2024.

2.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO

2.2.1. PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN

Las pólizas iniciales fueron expedidas el 27 de diciembre de 2023 por la aseguradora "solidaria de Colombia", tomadas por el CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL y como beneficiario el DEPARTAMENTO DE ARAUCA. Dicha póliza fue aprobada por la gerencia de contratación, mediante certificación firmada por el Gerente de Contratación Lupita Granado Chaparro el 28 de diciembre de 2023.

Tabla 3. Póliza de Cumplimiento del contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023.

ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	NOMBRE / TIPO DE PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA PÓLIZA	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA
ANEXO 0	27 DE DICIEMBRE DE 2023	CUMPLIMIENTO	SOLIDARIA DE COLOMBIA	475-47-994000063661	27/12/2023	27/10/2024	$278.000.000
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO			27/12/2023	27/10/2024	$695.000.000
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			27/12/2023	27/04/2027	$208.500.000
		CALIDAD DEL SERVICIO			27/12/2023	27/04/2025	$278.000.000
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS			27/12/2023	27/10/2024	$139.000.000
	27 DE DICIEMBRE DE 2023	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		475-47-994000011044	27/12/2023	28/04/2024	$232.000.000

2.2.2. PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO

La póliza fue expedida el 21 de marzo de 2024 por la aseguradora "solidaria de Colombia", tomadas por el CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL y como beneficiario el DEPARTAMENTO DE ARAUCA. APROBACIÓN. Dicha póliza fue aprobada por la gerencia de contratación, mediante certificación firmada por el Gerente de Contratación Luz Liliana Marchena Pinzón el 11 de abril de 2024.

Tabla 4. Póliza Según Acta de Inicio del contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023.

ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	NOMBRE / TIPO DE PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA PÓLIZA	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA
ANEXO 1	21 DE MARZO DE 2024	CUMPLIMIENTO	SOLIDARIA DE COLOMBIA	475-47-994000063661	20/03/2024	20/01/2025	$278.000.000
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO			20/03/2024	20/01/2025	$695.000.000
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			20/03/2024	21/07/2027	$208.500.000
		CALIDAD DEL SERVICIO			20/03/2024	21/07/2025	$278.000.000
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS			20/03/2024	20/01/2021	$139.000.000
	21 DE MARZO DE 2024	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		475-47-994000011044	28/04/2024	22/07/2024	$260.000.000

2.2.3. PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No.1

La póliza fue expedida el 07 de octubre de 2024 por la aseguradora "solidaria de Colombia", tomadas por el CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL y como beneficiario el DEPARTAMENTO DE ARAUCA. APROBACIÓN. Dicha póliza fue aprobada por la gerencia de contratación, mediante certificación firmada por el Gerente de Contratación Luz Liliana Marchena Pinzón el 28 de octubre de 2024.

Tabla 5. Póliza Según Acta de suspensión y reinicio No.1 del contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023.

ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	NOMBRE / TIPO DE PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA PÓLIZA	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA
ANEXO 2	07 DE OCTUBRE DE 2024	CUMPLIMIENTO	SOLIDARIA DE COLOMBIA	475-47-994000063661	20/03/2024	22/05/2025	$278.000.000
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO			20/03/2024	22/05/2025	$695.000.000
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			20/03/2024	20/11/2027	$208.500.000
		CALIDAD DEL SERVICIO			20/03/2024	20/11/2025	$278.000.000
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS			20/03/2024	20/05/2021	$139.000.000
	07 DE OCTUBRE DE 2024	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		475-47-994000011044	28/04/2024	21/11/2024	$260.000.000

Anexo 1. Pólizas del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023

2.3. IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES

No se impuso multas o sanciones al contratista.

2.4. ACTOS ADMINISTRATIVOS

Durante la ejecución del contrato de Prestación de servicios, se suscribieron los siguientes actos administrativos:

Tabla 6. Actos Administrativos del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023.

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
27/27/2023	Contrato	Suscripción del contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023	YARLE PATRICIA CÁRDENAS LIDUEÑEZ WILINTON RODRÍGUEZ BENAVIDEZ
20/03/2024	Acta de inicio	Suscripción del acta de inicio del contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023	YARLE PATRICIA CÁRDENAS LIDUEÑEZ JULIE ANDREA PÉREZ VILLAMIL
06/06/2024	Acta de suspensión No. 1	Adecuación de las instalaciones locativas de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro y la cooperativa procesadora de cacao la delicia.	Carlos Octavio Sarmiento Granados – SDAS, Yarle Patricia Cárdenas Lidueñez - contratista, Julie Andrea Pérez Villamil - interventora.
06/08/2024	Acta de prorroga No.1 de la suspensión No. 1	Se prorroga la suspensión No. 1 en razón a que a la fecha no han sido superados los motivos que generaron dicha suspensión.	Carlos Octavio Sarmiento Granados – SDAS, Yarle Patricia Cárdenas Lidueñez - contratista, Julie Andrea Pérez Villamil - interventora.

INFORME DE INTERVENTORIA No. 3

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
06/09/2024	Acta de prorroga No.2 de la suspensión No. 1	En razón a que se mantienen sin superar las condiciones que generaron la suspensión.	Carlos Octavio Sarmiento Granados – SDAS, Yarle Patricia Cárdenas Lidueñez - contratista, Julie Andrea Pérez Villamil - interventora.
04/10/2024	Acta de reinicio No. 1	Se superan los motivos que mantenían suspendidas las actividades del proyecto.	Carlos Octavio Sarmiento Granados – SDAS, Yarle Patricia Cárdenas Lidueñez - contratista, Julie Andrea Pérez Villamil - interventora.

Anexo 2. Actos administrativos del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023

2.5. ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO

En la ejecución del proyecto hasta la fecha de este informe, se han realizado las siguientes actas de comité técnico entre las partes:

Tabla 7. Relación de actas de comité.

FECHA	No. DE ACTA DE COMITÉ	TEMAS TRATADOS	PARTICIPANTES DEL COMITÉ
18/04/2024	001	Revisión de especificaciones técnicas del proyecto, socialización de fichas técnicas construidas por contratista y aprobadas por interventoría con las especificaciones detalladas de cada quipo o elementos a comprar para someterlas a revisión de las asociaciones en comités de compras.	Yarle Cárdenas - Julie Pérez - Sandra franco - Francisco Mendoza
19/04/2024	002	Revisión de especificaciones técnicas del proyecto, socialización de fichas técnicas construidas por contratista y aprobadas por interventoría con las especificaciones detalladas de cada quipo o elementos a comprar para someterlas a revisión de las asociaciones en comités de compras. Asociaciones solicitan tener en cuenta algunas características adicionales y se da la definición de fechas para desarrollo de comités de compras.	Yarle Cárdenas - Julie Pérez - Omar Lombana - Sonia López - Joana pinzón - Eleazar Jaimes
30/04/2024	003	Visita de verificación de avance en la ejecución de compromisos de socialización de COOPROCOR LA DELICIA LTDA.	Yarle Cárdenas - Sandra franco - Francisco Mendoza – Jorge Giraldo – Gabriel Contreras – Jeferson Laguado – María Camila bolaños – Zulay Núñez.
02/05/2024	004	Visita técnica a la asociación Asonalca, revisión final de información para recolección de información y proceder al proceso de compra	Yarle Cárdenas - Sandra franco - Francisco Mendoza –Dairo Ortiz – Joana Pinzón - Dixon Torres – Eleazar Jaimes – Julie Pérez.
08/05/2024	005	Comité de compras No. 1, donde se aprueba 13 fichas técnicas de la asociación Asonalca y 5 fichas técnicas de Cooprocor, previa revisión y aprobación por la interventoría.	Yarle Cárdenas - Julie Pérez - Sonia López - Joana pinzón – Héctor Martínez – Eduardo Sogamoso.
31/05/2024	006	Comité de compras No. 2, donde se aprueba 4 fichas técnicas de la asociación Asonalca y 4 fichas técnicas de Cooprocor, previa revisión y aprobación por la interventoría.	Yarle Cárdenas – José Ramon Gómez – Jorge Giraldo – Gabriel Contreras – Julie Pérez– Joana pinzón - María Camila bolaños – Zulay Núñez
06/06/2024	007	Comité técnico donde se analizan los inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto, motivos por los cuales se solicita la suspensión del contrato.	Yarle Cárdenas – Julie Andrea Pérez Villamil- francisco Javier Mendoza Niño – Sandra franco– Zulay Núñez.
26/07/2024	008	Verificación de avance en adecuación de infraestructura.	Yarle Cárdenas - Julie Pérez Villamil - Joana pinzón - María Camila bolaños
05/09/2024	009	Comité de verificación de avance en adecuación eléctrica y locativas	Julie Pérez Villamil - Joana pinzón - María Camila bolaños
01/10/2024	010	Comité de verificación de avance en adecuación eléctrica y locativas	Yarle Cárdenas - Julie Pérez Villamil - Joana pinzón - María Camila bolaños

Anexo 3. Actas de comité

INFORME DE INTERVENTORIA No. 3

2.6. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Durante la ejecución del contrato de Prestación de servicios se envió la siguiente correspondencia entre la Interventoría, el contratista y el DEPARTAMENTO DE ARAUCA:

Tabla 8. Relación de correspondencia enviada en medio físico por la Interventoría del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023.

Fecha	Remitente	Destinatario	Descripción
26/03/2024	COAMDESOR	Consorcio Transformación Agroindustrial	Solicitud De Información
09/04/2024	COAMDESOR	Consorcio Transformación Agroindustrial	Solicitud De Fichas Técnicas
09/04/2024	COAMDESOR	Consorcio Transformación Agroindustrial. Cooprocar La Delicia Ltda. Asonalca	Invitación A Comité Técnico
10/04/2024	COAMDESOR	Consorcio Transformación Agroindustrial COOPROCOR LA DELICIAS ASONALCA Francisco Mendoza – Supervisor	Invitación a comité técnico
16/04/2024	COAMDESOR	Consorcio Transformación Agroindustrial COOPROCOR LA DELICIAS ASONALCA Francisco Mendoza – Supervisor	Reprogramación de comité técnico
03/05/2024	COAMDESOR	Consorcio Transformación Agroindustrial	Solicitud de planillas de pago de seguridad social.
10/05/2024	COAMDESOR	Francisco Mendoza – Supervisor	Entrega de informe de ejecución No. 1
27/05/2024	COAMDESOR	Consorcio Transformación Agroindustrial COOPROCOR LA DELICIAS ASONALCA	Invitación a comité de compras No. 2
29/05/2024	COAMDESOR	Consorcio Transformación Agroindustrial	Solicitud de información
29/05/2024	COAMDESOR	Consorcio Transformación Agroindustrial	Solicitud de suspensión de plazo contractual
30/05/2024	COAMDESOR	Francisco Mendoza – Supervisor	Traslado de solicitud de certificación de equipos.
31/05/2024	COAMDESOR	Francisco Mendoza – Supervisor	Solicitud de comité técnico
17/06/2024	COAMDESOR	Francisco Mendoza – Supervisor	Entrega de plan de choque y reprogramación
10/07/2024	COAMDESOR	Francisco Mendoza – Supervisor	Remisión de informe mensual No. 1 con ajustes solicitados por la supervisión del proyecto.
12/07/2024	COAMDESOR	Francisco Mendoza – Supervisor	Remisión de informe mensual No. 2 con ajustes solicitados por la supervisión del proyecto.
05/09/2024	COAMDESOR	Francisco Mendoza – Supervisor	Traslado de solicitud de prorroga No. 2 a la suspensión No. 1 del plazo contractual.

Anexo 4. Correspondencia enviada

Tabla 9. Relación de correspondencia recibido en medio físico por la Interventoría del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023.

Fecha	Remitente	Destinatario	Descripción
05/04/2024	CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL	COAMDESOR	Solicitud de información según oficio OFCAG-001-24-26032024
11/04/2024	CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL	COAMDESOR	Según oficio remitido OFCAG-001-24-09042024, Entrega de fichas técnicas para revisión y aprobación
23/04/2024	CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL	COAMDESOR	Solicitud de desembolso 1 y 2
25/04/2024	CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL	COAMDESOR	Solicitud de desembolso 3
15/05/2024	CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL	COAMDESOR	Solicitud de desembolso orden de operación 4 FIDUCIARIO BOGOTÁ
27/05/2024	CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL	COAMDESOR	Solicitud de certificación de cumplimiento de los elementos eléctricos.
28/05/2024	CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL	COAMDESOR	Solicitud de suspensión del plazo contractual
10/07/2024	CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL	COAMDESOR	Entrega de informe No. 1 con sus respectivos anexos.

INFORME DE INTERVENTORIA No. 3

Fecha	Remitente	Destinatario	Descripción
04/09/2024	CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL	COAMDESOR	Solicitud de prorroga No. 2 de la suspensión No. 2.
30/09/2024	CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL	COAMDESOR	Solicitud de evaluación de condiciones para el reincido del contrato de la referencian y mesa técnica.

Anexo 5. Correspondencia recibida

2.7. CONTROL SOCIAL DEL PROYECTO

2.7.1. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO EN ARAUCA

El día veintidós (22) de marzo de 2023, se realizó la socialización del proyecto "APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA", en las instalaciones de la secretaria de agricultura de la gobernación de Arauca, previa convocatoria realizada por la SUPERVISIÓN a través de correo electrónico del día 19 de marzo de 2024, en el cual se invita a la cooperativa y asociación beneficiada.

En dicha reunión participaron representantes de la asociación ASONALCA y de la cooperativa COOPROCOR LA DELICIA, Interventoría y la supervisión del proyecto, a quienes se les dio a conocer el alcance físico y financiero del contrato exponiendo cada uno de componentes de el mismo y el plazo de ejecución del mismo; de igual forma se atendieron las observaciones e inquietudes de los participantes y se presentó algunos de los profesionales que van a estar frente a la ejecución del proyecto por parte del contratista, la Interventoría y la supervisión del DEPARTAMENTO DE ARAUCA.





Adicional la unidad ejecutora enfatizó en la importancia de revisar cuidadosamente la ubicación de estos equipos, dado que son especializados, y asegurarse de que la infraestructura de las asociaciones sea adecuada para su instalación. En este sentido, solicitó a la interventoría realizar las visitas técnicas correspondientes para verificar esta condición, enfatizando que es crucial no solo entregar los equipos, sino garantizar su correcta instalación. Se acordó como compromiso realizar estas visitas técnicas para asegurar el adecuado acondicionamiento durante la entrega.

Los representantes de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro y la Cooperativa Procesadora de Cacao del Oriente La Delicia expresaron su agradecimiento por el apoyo recibido para mejorar su capacidad productiva mediante la entrega de equipos industrializados. Indicaron que

comprenden claramente los requisitos de infraestructura, incluidos los aspectos eléctricos necesarios para la correcta puesta en funcionamiento de los equipos y se comprometieron a llevar a cabo un levantamiento inicial de la infraestructura de la empresa, con el apoyo del equipo de profesionales de la empresa contratista, para identificar las necesidades de infraestructura y, en particular, los requisitos eléctricos de los equipos. Posteriormente, coordinarán con la junta de cada asociación para buscar los recursos necesarios para efectuar las adecuaciones recomendadas por el equipo técnico.

2.7.2. CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA CIUDADANA

A la fecha del presente informe no se ha realizado conformación de veeduría, No obstante, los representantes de la asociación ASONALCA y de la cooperativa COOPROCOR LA DELICIA han ejercido vigilancia y control de cada una de las actividades que se han venido ejecutando.

2.8. VINCULACIÓN DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

El contratista vinculó el personal requerido para la administración y ejecución de los trabajos de acuerdo con el alcance del contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023.

2.8.1. INTEGRANTES DEL CONSORCIO

Se presenta las panillas de pago de cada uno de los integrantes del CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL.

Tabla 10. Relación de pagos de seguridad social del mes de marzo 2024 empresas consorciadas

EMPRESA	NIT	PLANILLA	FECHA DE PAGO
INGCONSU GROUP SAS	901503327-0	9465565655	05/04/2024
FENIBAL ANDRÉS ZULUAGA QUINTERO	80.094.351	9464378467	18/03/2024

Tabla 11. Relación de pagos de seguridad social del mes de abril 2024 empresas consorciadas

EMPRESA	NIT	PLANILLA	FECHA DE PAGO
INGCONSU GROUP SAS	901503327-0	9466977886	10/05/2024
FENIBAL ANDRÉS ZULUAGA QUINTERO	80.094.351	9464887535	09/05/2024

Tabla 12. Relación de pagos de seguridad social del mes de mayo 2024 empresas consorciadas

EMPRESA	NIT	PLANILLA	FECHA DE PAGO
INGCONSU GROUP SAS	901503327-0	9467508774	12/06/2024
FENIBAL ANDRÉS ZULUAGA QUINTERO	80.094.351	9467888315	11/06/2024

Tabla 13. Relación de pagos de seguridad social del mes de junio 2024 empresas consorciadas.

EMPRESA	NIT	PLANILLA	FECHA DE PAGO
INGCONSU GROUP SAS	901503327-0	9469752895	17/07/2024
FENIBAL ANDRÉS ZULUAGA QUINTERO	80.094.351	9468883390	24/06/2024

Tabla 14. Relación de pagos de seguridad social del mes de Octubre 2024 empresas consorciadas.

EMPRESA	NIT	PLANILLA	FECHA DE PAGO
INGCONSU GROUP SAS	901503327-0	9477250131	13/11/2024
FENIBAL ANDRÉS ZULUAGA QUINTERO	80094351-4	9474511323	06/11/2024

INFORME DE INTERVENTORIA No. 3

2.8.2. PERSONAL VINCULADO

A continuación, se relaciona el personal vinculado, cabe resaltar que los profesionales presentados en la propuesta de licitación son: Renan Moreno como Director del Proyecto y Julio Robin como administrador de empresas especialista en gerencia de empresas agropecuarias.

Tabla 15. Relación de personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023.

DATOS GENERALES					
No.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO
1	CÁRDENAS	LIDUEÑEZ	YARLE PATRICIA	1.116.792.298	REPRESENTANTE
2	LÓPEZ	MORENO	RENAN	17.588.795	DIRECTOR DEL PROYECTO
3	CORTES	GÓMEZ	LUZ YANNID	68.293.453	ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
4	CASTRO	VERA	GABRIEL ALONSO	1.098.611.653	ESPECIALISTA EN ALIMENTOS
5	ROBIN	RODIL	JULIO ENRIQUE	17.588.787	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS ESPECIALISTA EN GERENCIA DE EMPRESAS AGROPECUARIAS.

A continuación, se relaciona el personal administrativo del contratista y las planillas de pago correspondientes al periodo del presente informe:

Tabla 16. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627de 2023

MES: MARZO DE 2024											
DATOS GENERALES						AFILIADO A				No PLANILLA	FECHA DE PAGO
No.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALUD	PENSIÓN	CCF	RIESGO		
1	CÁRDENAS	LIDUEÑEZ	YARLE PATRICIA	1.116.792.298	REPRESENTANTE	SANITAS S.A	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	9465565655	12/04/2024
2	LÓPEZ	MORENO	RENAN	17.588.795	COORDINADOR DEL PROYECTO	SANITAS S.A	PORVENIR	COMFIAR	POSITIVA	7919210537	16/04/2024
3	CORTES	GÓMEZ	LUZ YANNID	68.293.453	ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL.	SANITAS S.A	COLPENSIONES	X	POSITIVA	7917397982 7936993375	15/04/2024 06/08/2024
4	CASTRO	VERA	GABRIEL ALONSO	1.098.611.653	ESPECIALISTA EN ALIMENTOS	SANITAS S.A	PORVENIR	X	SURA	79475752	14/08/2024
5	ROBIN	RODIL	JULIO ENRIQUE	17.588.787	ESPECIALISTA EN GERENCIA AGROPECUARIA	SANITAS S.A	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	75621100	18/03/2024

Tabla 17. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023

MES: ABRIL DE 2024											
DATOS GENERALES						AFILIADO A				No PLANILLA	FECHA DE PAGO
No.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALUD	PENSIÓN	CCF	RIESGO		
1	CÁRDENAS	LIDUEÑEZ	YARLE PATRICIA	1.116.792.298	REPRESENTANTE	SANITAS S.A	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	9466977886	10/05/2024
2	LÓPEZ	MORENO	RENAN	17.588.795	COORDINADOR DEL PROYECTO	SANITAS S.A	PORVENIR	COMFIAR	POSITIVA	1743396927	14/05/2024
3	CORTES	GÓMEZ	LUZ YANNID	68.293.453	ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL.	SANITAS S.A	COLPENSIONES	X	POSITIVA	7923260050 7928957289	07/05/2024 05/06/2024
4	CASTRO	VERA	GABRIEL ALONSO	1.098.611.653	ESPECIALISTA EN ALIMENTOS	SANITAS S.A	PORVENIR	X	SURA	625455518	07/05/2024
5	ROBIN	RODIL	JULIO ENRIQUE	17.588.787	ESPECIALISTA EN GERENCIA AGROPECUARIA	SANITAS S.A	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	76332554	19/04/2024

Tabla 18. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023

MES: MAYO DE 2024											
DATOS GENERALES						AFILIADO A				No PLANILLA	FECHA DE PAGO
No.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALUD	PENSIÓN	CCF	RIESGO		
1	CÁRDENAS	LIDUEÑEZ	YARLE PATRICIA	1.116.792.298	REPRESENTANTE	SANITAS S.A	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	9467508774	12/06/2024

2	LÓPEZ	MORENO	RENAN	17.588.795	COORDINADOR DEL PROYECTO	SANITAS S.A	PORVENIR	COMFIAR	POSITIVA	7931833515	26/06/2024
3	CORTES	GÓMEZ	LUZ YANNID	68.293.453	ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL.	SANITAS S.A	COLPENSIONES	X	POSITIVA	7925714687	13/06/2024
4	CASTRO	VERA	GABRIEL ALONSO	1.098.611.653	ESPECIALISTA EN ALIMENTOS	SANITAS S.A	PORVENIR	X	SURA	77586154	04/06/2024
5	ROBIN	RODIL	JULIO ENRIQUE	17.588.787	ESPECIALISTA EN GERENCIA AGROPECUARIA	SANITAS S.A	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	77167327	17/05/2024

Tabla 19. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023

MES: JUNIO DE 2024											
DATOS GENERALES						AFILIADO A				No PLANILLA	FECHA DE PAGO
No.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALUD	PENSIÓN	CCF	RIESGO		
1	CÁRDENAS	LIDUEÑEZ	YARLE PATRICIA	1.116.792.298	REPRESENTANTE	SANITAS S.A	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	9470020589	17/07/2024
2	LÓPEZ	MORENO	RENAN	17.588.795	COORDINADOR DEL PROYECTO	SANITAS S.A	PORVENIR	COMFIAR	POSITIVA	7931838721	11/07/2024
3	CORTES	GÓMEZ	LUZ YANNID	68.293.453	ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL.	SANITAS S.A	COLPENSIONES	X	POSITIVA	7930477235	10/07/2024
4	CASTRO	VERA	GABRIEL ALONSO	1.098.611.653	ESPECIALISTA EN ALIMENTOS	SANITAS S.A	PORVENIR	X	SURA	78334392	02/07/2024
5	ROBIN	RODIL	JULIO ENRIQUE	17.588.787	ESPECIALISTA EN GERENCIA AGROPECUARIA	SANITAS S.A	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	77948715	17/06/2024

Tabla 20. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627de 2023

MES: OCTUBRE DE 2024											
DATOS GENERALES						AFILIADO A				No PLANILLA	FECHA DE PAGO
No.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALUD	PENSIÓN	CCF	RIESGO		
1	CÁRDENAS	LIDUEÑEZ	YARLE PATRICIA	1.116.792.298	REPRESENTANTE	SANITAS S.A	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA		17/07/2024
2	LÓPEZ	MORENO	RENAN	17.588.795	COORDINADOR DEL PROYECTO	SANITAS S.A	PORVENIR	COMFIAR	POSITIVA		11/07/2024
3	CORTES	GÓMEZ	LUZ YANNID	68.293.453	ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL.	SANITAS S.A	COLPENSIONES	-------	POSITIVA		10/07/2024
4	CASTRO	VERA	GABRIEL ALONSO	1.098.611.653	ESPECIALISTA EN ALIMENTOS	SANITAS S.A	PORVENIR	-------	SURA		02/07/2024
5	ROBIN	RODIL	JULIO ENRIQUE	17.588.787	ESPECIALISTA EN GERENCIA AGROPECUARIA	SANITAS S.A	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	81148744	23/10/2024

Anexo 6. Planillas de seguridad social del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023

INFORME DE INTERVENTORIA No. 3

3. ASPECTOS TÉCNICOS

3.1. CONDICIONES CONTRACTUALES

El contrato de prestaciones de servicios suscrito por el DEPARTAMENTO DE ARAUCA y la firma contratista CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL, contempla las siguientes actividades a desarrollar dentro del plazo contractual establecido de cuatro (04) meses.

Tabla 21. Condiciones Iniciales del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023.

CONDICIONES CONTRACTUALES					
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO IMPUESTOS INCLUIDOS	VALOR TOTAL
COMPONENTE 1. APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPESINA JOSÉ ANTONIO GALÁN ZORRO					
1.1	MANGUERA REFORZADA DE 1" 3 CAPAS ROLLO DE 100MTCALIBRE 80	UNIDAD	10	$ 933.400,00	$ 9.334.000,00
1.2	CARRETILLA ANTI-PINCHAZO. TIPO CARRETILLA. MODELO VERSÁTIL, CAPACIDAD DE LEVANTE 5 FT. CARACTERÍSTICAS. CARRETILLA DE TOLVA DE 5 FT, MATERIAL DE LA TOLVA METÁLICA, RIN METÁLICO, RUDA ANTI-PINCHAZO	UNIDAD	10	$ 1.000.000,00	$ 10.000.000,00
1.3	BALANZA BASCULA DE 500KG ELÉCTRICA DE PEDESTAL: BALANZA 500KG, MEDIDAS PLATAFORMA 50X60CM APROX. TABLERO DOBLE VISOR COLOR NÚMEROS: ROJO, RECARGABLE 8 A 10 HORAS CONTINUAS, PLEGABLE Y PORTÁTIL INCLUYE: 1. BALANZA PLATAFORMA, 1. INDICADOR, 1. CARGADOR,4 PATAS PARA LA PLATAFORMA	UNIDAD	2	$ 2.445.000,00	$ 4.890.000,00
1.4	TRITURADORA DE PIEDRA 2 METROS CÚBICOS HORA: TRITURADORA DE PIEDRA DE 3 TONELADAS HORA CON MOTOR TRIFÁSICO O DIÉSEL, DE 10 CABALLOS NOBSE	UNIDAD	1	$ 95.000.000,00	$ 95.000.000,00
1.5	TRITURADORA INDUSTRIAL PARA RESIDUOS SÓLIDOS: PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS CON REVERSIÓN AUTOMÁTICA, CON SISTEMA AVANZADO DE PROTECCIÓN DE RODAMIENTOS: MÚLTIPLES OBSTÁCULOS DE LABERINTO MECÁNICO Y SELLOS CONVENCIONALES, Y ASEGURANDO LA MÁXIMA FIABILIDAD EN LÍNEA, EFICIENCIA DE TRITURACIÓN EN LOS EJES ROTATORIOS DE CONTRAPESO QUE AUMENTEN LA EFICIENCIA DE LA ACCIÓN DE CORTE Y ROTURA, DE SISTEMA DE CONDUCCIÓN ELECTROMECÁNICA DE BAJA VELOCIDAD Y ALTO CON ROBUSTO DISEÑO DE CÁMARA DE CORTE. FUNCIONAMIENTO NO BALÍSTICO Y DE BAJO RUIDO Y NO CREAR POLVO NI PARTÍCULAS VOLADORAS, CON PROTECTORES DE GOLPES GRAVES EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DEL COJÍN, CON CORTADOR DE ALTA ALEACIÓN CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA UNA VIDA EXTRA- LARGA, ANTICORROSIVO Y RESISTENTE AL DESGASTE. RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS NSK, EJES DE CORTE HEXAGONALES DISEÑADOS PARA UNA MAYOR DURABILIDAD, DE 500KG	UNIDAD	1	$ 108.116.000,00	$ 108.116.000,00
1.6	CANECA PLÁSTICA DE 55 GALONES CON TAPA Y ARO DE SEGURIDAD: ALTURA 90 CM DIÁMETRO O ANCHO 60 CM MATERIAL: POLIETILENO ORIGINAL DE ALTA DENSIDAD	UNIDAD	38	$ 711.500,00	$ 27.037.000,00
1.7	MEDIDOR DE PLANTAS 5 EN 1, TEMPERATURA DE PH DEL SUELO. PROBADOR DE SUELO 5 EN 1: PUEDE MEDIR EL VALOR DE PH DEL SUELO (3,0 A 9,5, 10 NIVELES), INTENSIDAD DE MEDIDOR DE PLANTAS 5 EN 1, TEMPERATURA DE PH DEL SUELO. PROBADOR DE SUELO 5 EN 1: PUEDE MEDIR EL VALOR DE PH DEL SUELO (3,0 A 9,5, 10 NIVELES), INTENSIDAD DE LA LUZ SOLAR (9 NIVELES), HUMEDAD (5 NIVELES), HUMEDAD (20%-99%) Y TEMPERATURA DEL SUELO.	UNIDAD	4	$ 700.000,00	$ 2.800.000,00
1.8	ZARANDA CLASIFICADORA 2 Y 3 NIVELES: ZARANDA CLASIFICADORA DE MATERIALES MALLA 100, 50 .05	UNIDAD	1	$ 103.445.000,00	$ 103.445.000,00
1.9	CERRADORA DE SACOS Y COSTALES + HILO NUEVA: VOLTAJE: 110V AC, CORRIENTE: 0.73ª, PODER: 90 VOLTIOS FRECUENCIA: 50/60HZ, VELOCIDAD: 1100 RPM, ANCHO MÁXIMO DE LA BOLSA A COSER:: 0.16 PULGADAS (4MM), ESPACIO ENTRE PUNTADAS: 0.27 PULGADAS -0.33 PULGADAS (7-8.5MM), TAMAÑO DE LA MÁQUINA: 14.25 PULGADAS (361 MM) (L) X 9.25 PULGADAS (234 MM) (W) X 12 PULGADAS (304 MM)(H), PESO DE LA MÁQUINA: 12 LBS. (5.5 KG), TAMAÑO DE LA CAJA: 16 PULGADAS (406.4 MM)(L) X 11 PULGADAS (279.4 MM)(W) X 13 PULGADAS (330.2 MM)(H). DETALLES TÉCNICOS: 1. COSTURA PUNTO DE CADENA DE HILO ÚNICO 2. RANGO DE PUNTADA (MM) 6.5 (FIJO) 3. REVOLUCIÓN (RPM) 1250 4. AGUJA DN X 1 # 25 5. HILO (VINILÓN, SINTÉTICO O ALGODÓN) 20/6 6. MATERIAL DEL BOLSO QUE SE CERRARÁ EL PAPEL DE KRAFT, PP / PE, PAÑO TEJIDO, ALGODÓN, YUTE DE LA ARPILLERA 7. MOTOR DE ACCIONAMIENTO 90 W 8.FUENTE DE ALIMENTACIÓN 110, 220 O 240 V A.C 9.PESO NETO (KG) 5.9 KG. ACCESORIOS ESTANDAR; AGUJAS DN X 1 # 25 10PCS, HILO DE VINILO EN 20/6 1 ROLLO, ARBUSTOS DEL MOTOR 2PCS, DESTORNILLADOR 1PCS, PINZAS 1PCS, LLAVE HEXAGONAL 1PCS, ENGRASADOR 1PCS	UNIDAD	2	$ 1.823.000,00	$ 3.646.000,00
1.10	GRANULADOR DE FERTILIZANTE ORGÁNICO: PRODUCTIVIDAD HASTA 3.000 KG POR HORA, DIMENSIONES DEL GRANULADOR; LONGUITUD 4.5 METROS, DIÁMETRO 820 MM. FORMA DE PELLETS ESFÉRICA. TAMAÑO DE GRANULOS DE 2 A 8 MM DE DIÁMETRO, CONSUMO 75 KW. FUENTE DE ALIMENTACIÓN 380V	UNIDAD	1	$ 369.000.000,00	$ 369.000.000,00
1.11	ESCRITORIO METÁLICO OPERATIVO 73X120X60CM: CARACTERÍSTICAS; 3 FRENTES DE GAVETA EN LÁMINA COL ROLLED CALIBRE 24. TAPA SUPERIOR EN AGLOMERADO DE 25 MM, ENCHAPADO EN FÓRMICA, CON CANTO FORRADO EN BOCEL DE PVC. GAVETA SUPERIOR CON CHAPA. LARGO 60 CENTÍMETROS, ANCHO 73 CM, PROFUNDIDAD 150 CENTÍMETROS ALTO 150 CENTÍMETROS	UNIDAD	1	$ 1.933.300,00	$ 1.933.300,00
1.12	ARCHIVADOR 4 GAVETAS METÁLICO. ELABORADO EN LÁMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 22, RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, CORREDERAS INDEPENDIENTES FULL EXTENSIÓN, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA Y CHAPA DE ACCIÓN CON LLAVE MEDIDAS134X47CMX60CM	UNIDAD	1	$ 3.090.000,00	$ 3.090.000,00

INFORME DE INTERVENTORIA No. 3

CONDICIONES CONTRACTUALES					
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO IMPUESTOS INCLUIDOS	VALOR TOTAL
1.13	SILLA ESCRITORIO CON BRAZOS Y RESPALDO NEGRA: MATERIAL CUERO SINTÉTICO, ANCHO 65 CENTÍMETROS ALTO 120, MATERIAL ESTRUCTURA METAL, ESPUMA, NYLON, POLIPROPILENO CAPACIDAD (RESISTENCIA - CARGA MÁXIMA) 120 KG GIRA 360 GRADOS, MEDIDAS 124X51X52	UNIDAD	1	$ 2.112.000,00	$ 2.112.000,00
1.14	SILLA OFICINA INTERLOCUTORA ESCRITORIO ESTRUCTURA NEGRA PLAS: ESPALDA Y ASIENTO: EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. ESTRUCTURA: METÁLICA EN TUBO RECTANGULAR 30X15 CON AMARRES EN EL ASIENTO EN TUBO REDONDO 5/8 CALIBRE 18. RECUBRIMIENTO: PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA. TAPONES: ELÍPTICOS PLÁSTICOS NEGROS. MEDIDAS 82.5cmx42.5cmx47.5cm	UNIDAD	2	$ 212.000,00	$ 424.000,00
1.15	LOCKER METÁLICO 9 PUESTOS AZUL DE 180X93X30 CM: LOCKER CON MÓDULOS DE DIFERENTES NÚMEROS DE CASILLAS DE UN CUERPO Y VARIOS COMPARTIMIENTOS VERTICALES CON PUERTAS Y SEGUROS PARA CANDADO. ZAPATERA Y MANIJAS PLÁSTICAS EN POLIPROPILENO. LAS PUERTAS DEL LOCKER POSEE CELOSÍAS QUE PERMITEN LA CIRCULACIÓN DE AIRE, SUPERFICIE TERMINADA COMPLETAMENTE LISA, SISTEMA DE SEGURIDAD SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE USO. EL LOCKER ESTÁ APOYADO SOBRE SISTEMA RÍGIDO, BISAGRAS DESARMABLES ÚNICAMENTE CON LA PUERTA ABIERTA.	UNIDAD	1	$ 2.780.000,00	$ 2.780.000,00
1.16	COMPUTADOR DE ESCRITORIO, DISCO DURO 1 TB, DDR4 4GB, NO DVD, MONITOR 18,5 E1916HV LINUX (7PF82)	UNIDAD	1	$ 5.300.000,00	$ 5.300.000,00
1.17	IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIÓN: IMPRIME, ESCANEA Y HACE COPIAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: INYECCIÓN DE TINTA. TIENE ENTRADA USB. CUENTA CON 2 BANDEJAS. CAPACIDAD MÁXIMA DE 130 HOJAS. SOPORTA PAPEL TAMAÑO A4, OFICIO, OFICIO MÉXICO, OFICIO 9, FOLIO, EJECUTIVO, MEDIA CARTA, A6, CARTA, FOTO 10 X 15 CM, SOBRE N10, 215.9 X 1.200 MM, FOTO 13 X 18 CM, FOTO 16:9, SOBRE PERSONALIZADO (54 X 86 MM - 215.9 X 1.200 MM). INCLUYE ACCESORIOS. PRÁCTICA Y FUNCIONAL TANTO PARA USO PERSONAL COMO PROFESIONAL	UNIDAD	1	$ 2.066.700,00	$ 2.066.700,00
				SUB TOTAL COMPONENTE 1	$ 750.974.000,00
COMPONENTE 2. APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA					
2,1	REFINADOR DE PIEDRAS A MÁQUINA, CAPACIDAD DE 120 KG BACHE, POTENCIA INSTALADA: 3,5 KW	UNIDAD	1	$ 74.450.000,00	$ 74.450.000,00
2,2	ELEVADOR DE CANGILONES DE 3 MTRS	UNIDAD	1	$ 95.560.000,00	$ 95.560.000,00
2,3	PLANTA ELÉCTRICA DIÉSEL CABINADA: POTENCIA STAND BY 25KVA, POTENCIA PRIME 22KVA, POTENCIA NOMINAL 20KW HASTA 1000, FACTOR DE POTENCIA 0.8, CORRIENTE NOMINAL 164A/82A/47.5A, NÚMERO DE FASES 3 FRECUENCIA NOMINAL 60HZ, POTENCIA MÁXIMA DEL MOTOR 35hp, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO (12 VOLTIOS), CAPACIDAD DE ACEITE EN EL CARTER 8L, CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 50L, PESO NETO 680Kg Y PESO BRUTO 700Kg. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: VOLTÍMETRO, AMPERIMETRO, FRECUENCÍMETRO Y HORÓMETRO.	UNIDAD	1	$ 81.112.000,00	$ 81.112.000,00
2,4	MOLDE EN POLICARBONATO PARA CHOCOLATE DE MESA 180GR: UNA BARRA POR 180 GRAMOS (250 CC) APROX. CON 10 DIVISIONES. BRILLO PERFECTO Y UNIFORMIDAD EN TUS PRODUCTOS	UNIDAD	300	$ 84.500,00	$ 25.350.000,00
2,5	BÁSCULA PLEGABLE 300 KILOS ACERO INOXIDABLE: BRAZO DE DOBLAR ES IDEAL PARA SU TRABAJO Y TRANSPORTE. INDICADOR EN ACERO INOXIDABLE. CAPA ANTIDESLIZANTE. MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL. TECLADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO PULSADOR. TECLAS CON TONO AL OPRIMIR. INDICADOR LED ROJO AJUSTABLE A 3 TONOS DE BRILLO. PATAS AJUSTABLES NIVELADORAS. INCLUYE ADAPTADOR 6V. CELDA CON PROTECTOR FLUIDOS Y HUMEDAD. IDEAL PARA CUARTOS FRÍOS O MANEJO DE LÍQUIDOS. CON BANDEJA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE RESISTENTE AL TRABAJO COTIDIANO Y COMERCIAL, CON UN ANCHO DE 40CM X UN LARGO DE 50CM	UNIDAD	2	$ 1.467.000,00	$ 2.934.000,00
2,6	BANDA TRANSPORTADORA DE 5 METROS: ESTRUCTURA Y BASE EN ACERO INOX. SUMINISTRO DE CORRIENTE 110 VOL. AC. 60 HZ. BANDA EN LONA TIPO SIN FIN, VULCANIZADA SIN FIN COLOR BLANCO, ANCHO DE LA BANDA TRANSPORTADORA 30 CMS, LARGO DE LA BANDA TRANSPORTADORA 5 MTRS, DOS GUÍAS AL COMIENZO DE LA BANDA CON ANCHO Y ALTURA VARIABLE PARA COLOCAR EL PRODUCTO. ALTURA DE TRABAJO 90 CMS. VELOCIDAD DE TRANSPORTE VARIABLE DE 3 A 6 MTRS/MIN. RODACHINAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, Y SISTEMA DE FRENO A LAS MISMAS, PESO MÁXIMO DE TRANSPORTE 15 KG. PESO APROX. DE TODO EL CONJUNTO 90 KG.	UNIDAD	1	$ 75.903.000,00	$ 75.903.000,00
2,7	TÚNEL DE ENFRIAMIENTO DE CHOCOLATE SS DE ALTO RENDIMIENTO DE 280MM DE ANCHO; FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO, GRADO AUTOMATICO SEMIAUTOMÁTICO, APLICACIÓN CARAMELO – CHOCOLATE LONGITUD 4.2 M. ANCHO DEL CINTURÓN 280MM.	UNIDAD	1	$ 79.667.000,00	$ 79.667.000,00
2,8	MÁQUINA AUTOMÁTICA DE MOLDEO DE CHOCOLATE DE LA MÁQUINA DEL DEPOSITANTE DE LA BARRA DE CHOCOLATE DE UN TIRO. COMPONENTES PRINCIPALES PLC, MOTOR, COJINETE, CAJA DE CAMBIOS, MOTOR, RECIPIENTEA PRESIÓN. ESTA MÁQUINA DEPOSITADORA DE CHOCOLATE TOTALMENTE AUTOMÁTICA CON SERVOCONTROL ESTÁ EQUIPADA CON UN SERVOMOTOR DE MARCA INTERNACIONAL Y ESTÁ CONTROLADA POR UN SISTEMA PLC. ESTA MÁQUINA DEPOSITADORA PUEDE FABRICAR TIPOS DE PRODUCTOS DE CHOCOLATE, COMO CHOCOLATE ESFÉRICO, CHOCOLATE CON TROZOS, CHOCOLATE PARA SÁNDWICH, CHOCOLATE CON GOTAS DE AGUA, ETC.	UNIDAD	1	$ 53.050.000,00	$ 53.050.000,00
2,9	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LICOR DE CHOCOLATE: EQUIPADO CON TEMPERATURA NOMINAL (TEMPERATURA AJUSTABLE) SE UTILIZA PARA ALMACENAR EL BIEN MOLIDO PASTA DE CHOCOLATE A TRAVÉS DE AGITACIÓN PARA CUMPLIR CON DESGASIFICACIÓN DE DESODORIZACIÓN DE 500 LTR	UNIDAD	1	$ 79.000.000,00	$ 79.000.000,00
				SUB TOTAL COMPONENTE 2	$ 567.026.000,00
COMPONENTE 3. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EMPRESARIAL					

INFORME DE INTERVENTORIA No. 3

CONDICIONES CONTRACTUALES					
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO IMPUESTOS INCLUIDOS	VALOR TOTAL
3.1	ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL Y SEGUIMIENTO AL FORTALECIMIENTO ENTREGADO A LA ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPESINA JOSÉ ANTONIO GALÁN ZORRO Y COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA,	MES	4	$ 6.000.000,00	$ 24.000.000,00
3.2	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO OPERATIVO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPESINA JOSÉ ANTONIO GALÁN ZORRO.	MES	4	$ 6.000.000,00	$ 24.000.000,00
3.3	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO OPERATIVO DE LA COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA.	MES	4	$ 6.000.000,00	$ 24.000.000,00
				VALOR TOTAL	$ 1.390.000.000,0

3.2. CANTIDADES EJECUTADAS

Las cantidades ejecutadas en el desarrollo del contrato de prestación de servicios No. 627 de 2023:

Tabla 22. Cantidades Ejecutadas del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023.

CANTIDADES CONTRACTUALES					CANTIDADES EJECUTADAS		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VALOR	VALOR TOTAL	CANTID EJECUTADA	VALOR PARCIAL	%
1.1	MANGUERA REFORZADA DE 1" 3 CAPAS ROLLO DE 100MTCALIBRE 80	10	$ 933.400,00	$ 9.334.000,00	10	$ 9.334.000,00	100%
1.2	CARRETILLA ANTI-PINCHAZO. TIPO CARRETILLA. MODELO VERSÁTIL, CAPACIDAD DE LEVANTE 5 FT. CARACTERÍSTICAS. CARRETILLA DE TOLVA DE 5 FT, MATERIAL DE LA TOLVA METÁLICA, RIN METÁLICO, RUDA ANTI-PINCHAZO	10	$1.000.000,00	$ 10.000.000,00	10	$ 10.000.000,00	100%
1.3	BALANZA BASCULA DE 500KG ELÉCTRICA DE PEDESTAL: BALANZA 500KG, MEDIDAS PLATAFORMA 50X60CM APROX. TABLERO DOBLE VISOR COLOR NÚMEROS: ROJO, RECARGABLE 8 A 10 HORAS CONTINUAS, PLEGABLE Y PORTÁTIL INCLUYE: 1. BALANZA PLATAFORMA, 1. INDICADOR, 1. CARGADOR,4 PATAS PARA LA PLATAFORMA	2	$ 2.445.000,00	$ 4.890.000,00	2	$ 4.890.000,00	100%
1.4	TRITURADORA DE PIEDRA 2 METROS CÚBICOS HORA: TRITURADORA DE PIEDRA DE 3 TONELADAS HORA CON MOTOR TRIFÁSICO O DIÉSEL, DE 10 CABALLOS NOBSE	1	$95.000.000,00	$ 95.000.000,00	0,5	$ 47.500.000,00	50%
1.5	TRITURADORA INDUSTRIAL PARA RESIDUOS SÓLIDOS: PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS CON REVERSIÓN AUTOMÁTICA, CON SISTEMA AVANZADO DE PROTECCIÓN DE RODAMIENTOS: MÚLTIPLES OBSTÁCULOS DE LABERINTO MECÁNICO Y SELLOS CONVENCIONALES, Y ASEGURANDO LA MÁXIMA FIABILIDAD EN LÍNEA, EFICIENCIA DE TRITURACIÓN EN LOS EJES ROTATORIOS DE CONTRAPESO QUE AUMENTEN LA EFICIENCIA DE LA ACCIÓN DE CORTE Y ROTURA, DE SISTEMA DE CONDUCCIÓN ELECTROMECÁNICA DE BAJA VELOCIDAD Y ALTO CON ROBUSTO DISEÑO DE CÁMARA DE CORTE. FUNCIONAMIENTO NO BALÍSTICO Y DE BAJO RUIDO Y NO CREAR POLVO NI PARTÍCULAS VOLADORAS, CON PROTECTORES DE GOLPES GRAVES EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DEL COJÍN, CON CORTADOR DE ALTA ALEACIÓN CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA UNA VIDA EXTRA-LARGA, ANTICORROSIVO Y RESISTENTE AL DESGASTE. RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS NSK, EJES DE CORTE HEXAGONALES DISEÑADOS PARA UNA MAYOR DURABILIDAD, DE 500KG	1	$108.116.000,0	$ 108.116.000,00	0,5	$ 54.058.000,00	50%
1.6	CANECA PLÁSTICA DE 55 GALONES CON TAPA Y ARO DE SEGURIDAD: ALTURA 90 CM DIÁMETRO O ANCHO 60 CM MATERIAL: POLIETILENO ORIGINAL DE ALTA DENSIDAD	38	$ 711.500,00	$ 27.037.000,00	38	$ 27.037.000,00	100%
1.7	MEDIDOR DE PLANTAS 5 EN 1, TEMPERATURA DE PH DEL SUELO. PROBADOR DE SUELO 5 EN 1: PUEDE MEDIR EL VALOR DE PH DEL SUELO (3,0 A 9,5, 10 NIVELES), INTENSIDAD DE MEDIDOR DE PLANTAS 5 EN 1, TEMPERATURA DE PH DEL SUELO. PROBADOR DE SUELO 5 EN 1: PUEDE MEDIR EL VALOR DE PH DEL SUELO (3,0 A 9,5, 10 NIVELES), INTENSIDAD DE LA LUZ SOLAR (9 NIVELES), HUMEDAD (5 NIVELES), HUMEDAD (20% -99%) Y TEMPERATURA DEL SUELO.	4	$ 700.000,00	$ 2.800.000,00	4	$ 2.800.000,00	100%
1.8	ZARANDA CLASIFICADORA 2 Y 3 NIVELES: ZARANDA CLASIFICADORA DE MATERIALES MALLA 100, 50 .05	1	$103.445.000,0	$ 103.445.000,00	0,5	$ 51.722.500,00	50%
1.9	CERRADORA DE SACOS Y COSTALES + HILO NUEVA: VOLTAJE: 110V AC, CORRIENTE: 0.73ª, PODER: 90 VOLTIOS FRECUENCIA: 50/60HZ, VELOCIDAD: 1100 RPM, ANCHO MÁXIMO DE LA BOLSA A COSER:: 0.16 PULGADAS (4MM), ESPACIO ENTRE PUNTADAS: 0.27 PULGADAS -0.33 PULGADAS (7-8.5MM), TAMAÑO DE LA	2	$ 1.823.000,00	$ 3.646.000,00	2	$ 3.646.000,00	100%

INFORME DE INTERVENTORIA No. 3

CANTIDADES CONTRACTUALES					CANTIDADES EJECUTADAS		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VALOR	VALOR TOTAL	CANTID EJECUTADA	VALOR PARCIAL	%
	MÁQUINA: 14.25 PULGADAS (361 MM) (L) X 9.25 PULGADAS (234 MM) (W) X 12 PULGADAS (304 MM)(H), PESO DE LA MÁQUINA: 12 LBS. (5.5 KG), TAMAÑO DE LA CAJA: 16 PULGADAS (406.4 MM)(L) X 11 PULGADAS (279.4 MM)(W) X 13 PULGADAS (330.2 MM)(H). DETALLES TÉCNICOS: 1. COSTURA PUNTO DE CADENA DE HILO ÚNICO 2. RANGO DE PUNTADA (MM) 6.5 (FIJO) 3. REVOLUCIÓN (RPM) 1250 4. AGUJA DN X 1 # 25 5. HILO (VINILÓN, SINTÉTICO O ALGODÓN) 20/6 6. MATERIAL DEL BOLSO QUE SE CERRARÁ EL PAPEL DE KRAFT, PP / PE, PAÑO TEJIDO, ALGODÓN, YUTE DE LA ARPILLERA 7. MOTOR DE ACCIONAMIENTO 90 W 8.FUENTE DE ALIMENTACIÓN 110, 220 O 240 V A.C 9.PESO NETO (KG) 5.9 KG. ACCESORIOS ESTANDAR; AGUJAS DN X 1 # 25 10PCS, HILO DE VINILO EN 20/6 1 ROLLO, ARBUSTOS DEL MOTOR 2PCS, DESTORNILLADOR 1PCS, PINZAS 1PCS, LLAVE HEXAGONAL 1PCS, ENGRASADOR 1PCS						
1.10	GRANULADOR DE FERTILIZANTE ORGÁNICO: PRODUCTIVIDAD HASTA 3.000 KG POR HORA, DIMENSIONES DEL GRANULADOR; LONGUITUD 4.5 METROS, DIÁMETRO 820 MM. FORMA DE PELLETS ESFÉRICA. TAMAÑO DE GRANULOS DE 2 A 8 MM DE DIÁMETRO, CONSUMO 75 KW. FUENTE DE ALIMENTACIÓN 380V	1	$369.000.000,0	$ 369.000.000,00	0,5	$ 184.500.000,00	50%
1.11	ESCRITORIO METÁLICO OPERATIVO 73X120X60CM: CARACTERÍSTICAS; 3 FRENTES DE GAVETA EN LÁMINA COL ROLLED CALIBRE 24. TAPA SUPERIOR EN AGLOMERADO DE 25 MM, ENCHAPADO EN FÓRMICA, CON CANTO FORRADO EN BOCEL DE PVC. GAVETA SUPERIOR CON CHAPA. LARGO 60 CENTÍMETROS, ANCHO 73 CM, PROFUNDIDAD 150 CENTÍMETROS ALTO 150 CENTÍMETROS	1	$ 1.933.300,00	$ 1.933.300,00	1	$ 1.933.300,00	100%
1.12	ARCHIVADOR 4 GAVETAS METÁLICO. ELABORADO EN LÁMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 22, RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, CORREDERAS INDEPENDIENTES FULL EXTENSIÓN, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA Y CHAPA DE ACCIÓN CON LLAVE. MEDIDAS134X47CMX60CM	1	$ 3.090.000,00	$ 3.090.000,00	1	$ 3.090.000,00	100%
1.13	SILLA ESCRITORIO CON BRAZOS Y RESPALDO NEGRA: MATERIAL CUERO SINTÉTICO, ANCHO 65 CENTÍMETROS ALTO 120, MATERIAL ESTRUCTURA METAL, ESPUMA, NYLON, POLIPROPILENO CAPACIDAD (RESISTENCIA - CARGA MÁXIMA) 120 KG GIRA 360 GRADOS, MEDIDAS 124X51X52	1	$ 2.112.000,00	$ 2.112.000,00	1	$ 2.112.000,00	100%
1.14	SILLA OFICINA INTERLOCUTORA ESCRITORIO ESTRUCTURA NEGRA PLAS: ESPALDA Y ASIENTO: EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. ESTRUCTURA: METÁLICA EN TUBO RECTANGULAR 30X15 CON AMARRES EN EL ASIENTO EN TUBO REDONDO 5/8 CALIBRE 18. RECUBRIMIENTO: PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA. TAPONES: ELÍPTICOS PLÁSTICOS NEGROS. MEDIDAS 82.5cmx42.5cmx47.5cm	2	$ 212.000,00	$ 424.000,00	2	$ 424.000,00	100%
1.15	LOCKER METÁLICO 9 PUESTOS AZUL DE 180X93X30 CM: LOCKER CON MÓDULOS DE DIFERENTES NÚMEROS DE CASILLAS DE UN CUERPO Y VARIOS COMPARTIMIENTOS VERTICALES CON PUERTAS Y SEGUROS PARA CANDADO. ZAPATERA Y MANIJAS PLÁSTICAS EN POLIPROPILENO. LAS PUERTAS DEL LOCKER POSEE CELOSÍAS QUE PERMITEN LA CIRCULACIÓN DE AIRE, SUPERFICIE TERMINADA COMPLETAMENTE LISA, SISTEMA DE SEGURIDAD SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE USO. EL LOCKER ESTÁ APOYADO SOBRE SISTEMA RÍGIDO, BISAGRAS DESARMABLES ÚNICAMENTE CON LA PUERTA ABIERTA.	1	$ 2.780.000,00	$ 2.780.000,00	1	$ 2.780.000,00	100%
1.16	COMPUTADOR DE ESCRITORIO, DISCO DURO 1 TB, DDR4 4GB, NO DVD, MONITOR 18,5 E1916HV LINUX (7PF82)	1	$ 5.300.000,00	$ 5.300.000,00	1	$ 5.300.000,00	100%
1.17	IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIÓN: IMPRIME, ESCANEA Y HACE COPIAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: INYECCIÓN DE TINTA. TIENE ENTRADA USB. CUENTA CON 2 BANDEJAS. CAPACIDAD MÁXIMA DE 130 HOJAS. SOPORTA PAPEL TAMAÑO A4, OFICIO, OFICIO MÉXICO, OFICIO 9, FOLIO, EJECUTIVO, MEDIA CARTA, A6, CARTA, FOTO 10 X 15 CM, SOBRE N10, 215.9 X 1.200 MM, FOTO 13 X 18 CM, FOTO 16:9, SOBRE PERSONALIZADO (54 X 86 MM - 215.9 X 1.200 MM). INCLUYE ACCESORIOS. PRÁCTICA Y FUNCIONAL TANTO PARA USO PERSONAL COMO PROFESIONAL	1	$ 2.066.700,00	$ 2.066.700,00	1	$ 2.066.700,00	100%
2.1	REFINADOR DE PIEDRAS A MÁQUINA, CAPACIDAD DE 120 KG BACHE, POTENCIA INSTALADA: 3,5 KW	1	$ 74.450.000,00	$ 74.450.000,00	1	$ 74.450.000,00	100%
2.2	ELEVADOR DE CANGILONES DE 3 MTRS	1	$ 95.560.000,00	$ 95.560.000,00	1	$ 95.560.000,00	100%
2.3	PLANTA ELÉCTRICA DIÉSEL CABINADA: POTENCIA STAND BY 25KVA, POTENCIA PRIME 22KVA, POTENCIA NOMINAL 20KW HASTA 1000, FACTOR DE POTENCIA 0.8, CORRIENTE NOMINAL 164A/82A/47.5A, NÚMERO DE FASES 3 FRECUENCIA NOMINAL 60HZ, POTENCIA MÁXIMA DEL MOTOR 35hp, SISTEMA DE	1	$ 81.112.000,00	$ 81.112.000,00	1	$ 81.112.000,00	100%

INFORME DE INTERVENTORIA No. 3

CANTIDADES CONTRACTUALES					CANTIDADES EJECUTADAS		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VALOR	VALOR TOTAL	CANTID EJECUTADA	VALOR PARCIAL	%
	ARRANQUE ELECTRICO (12 VOLTIOS), CAPACIDAD DE ACEITE EN EL CARTER 8L, CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 50L, PESO NETO 680Kg Y PESO BRUTO 700Kg. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: VOLTÍMETRO, AMPERIMETRO, FRECUENCÍMETRO Y HORÓMETRO.						
2.4	MOLDE EN POLICARBONATO PARA CHOCOLATE DE MESA 180GR: UNA BARRA POR 180 GRAMOS (250 CC) APROX. CON 10 DIVISIONES. BRILLO PERFECTO Y UNIFORMIDAD EN TUS PRODUCTOS	300	$ 84.500,00	$ 25.350.000,00	300	$ 25.350.000,00	100%
2.5	BÁSCULA PLEGABLE 300 KILOS ACERO INOXIDABLE: BRAZO DE DOBLAR ES IDEAL PARA SU TRABAJO Y TRANSPORTE. INDICADOR EN ACERO INOXIDABLE. CAPA ANTIDESLIZANTE. MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL. TECLADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO PULSADOR. TECLAS CON TONO AL OPRIMIR. INDICADOR LED ROJO AJUSTABLE A 3 TONOS DE BRILLO. PATAS AJUSTABLES NIVELADORAS. INCLUYE ADAPTADOR 6V. CELDA CON PROTECTOR FLUIDOS Y HUMEDAD. IDEAL PARA CUARTOS FRÍOS O MANEJO DE LÍQUIDOS. CON BANDEJA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE RESISTENTE AL TRABAJO COTIDIANO Y COMERCIAL, CON UN ANCHO DE 40CM X UN LARGO DE 50CM	2	$ 1.467.000,00	$ 2.934.000,00	2	$ 2.934.000,00	100%
2.6	BANDA TRANSPORTADORA DE 5 METROS: ESTRUCTURA Y BASE EN ACERO INOX. SUMINISTRO DE CORRIENTE 110 VOL. AC. 60 HZ. BANDA EN LONA TIPO SIN FIN, VULCANIZADA SIN FIN COLOR BLANCO, ANCHO DE LA BANDA TRANSPORTADORA 30 CMS, LARGO DE LA BANDA TRANSPORTADORA 5 MTRS, DOS GUÍAS AL COMIENZO DE LA BANDA CON ANCHO Y ALTURA VARIABLE PARA COLOCAR EL PRODUCTO. ALTURA DE TRABAJO 90 CMS. VELOCIDAD DE TRANSPORTE VARIABLE DE 3 A 6 MTRS/MIN. RODACHINAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, Y SISTEMA DE FRENO A LAS MISMAS, PESO MÁXIMO DE TRANSPORTE 15 KG. PESO APROX. DE TODO EL CONJUNTO 90 KG. UNIDAD 1 $ 75.903.000,00 $ 75.903.000,00 2,7 TÚNEL DE ENFRIAMIENTO	1	$ 75.903.000,00	$ 75.903.000,00	1	$ 75.903.000,00	100%
2.7	TÚNEL DE ENFRIAMIENTO DE CHOCOLATE SS DE ALTO RENDIMIENTO DE 280MM DE ANCHO; FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO, GRADO AUTOMATICO SEMIAUTOMÁTICO, APLICACIÓN CARAMELO – CHOCOLATE LONGITUD 4.2 M. ANCHO DEL CINTURÓN 280MM.	1	$ 79.667.000,00	$ 79.667.000,00	0,3	$ 23.900.100,00	30%
2.8	MÁQUINA AUTOMÁTICA DE MOLDEO DE CHOCOLATE DE LA MÁQUINA DEL DEPOSITANTE DE LA BARRA DE CHOCOLATE DE UN TIRO. COMPONENTES PRINCIPALES PLC, MOTOR, COJINETE, CAJA DE CAMBIOS, MOTOR, RECIPIENTE A PRESIÓN. ESTA MÁQUINA DEPOSITADORA DE CHOCOLATE TOTALMENTE AUTOMÁTICA CON SERVOCONTROL ESTÁ EQUIPADA CON UN SERVOMOTOR DE MARCA INTERNACIONAL Y ESTÁ CONTROLADA POR UN SISTEMA PLC. ESTA MÁQUINA DEPOSITADORA PUEDE FABRICAR TIPOS DE PRODUCTOS DE CHOCOLATE, COMO CHOCOLATE ESFÉRICO, CHOCOLATE CON TROZOS, CHOCOLATE PARA SÁNDWICH, CHOCOLATE CON GOTAS DE AGUA, ETC..	1	$ 53.050.000,00	$ 53.050.000,00	0,3	$ 15.915.000,00	30%
2.9	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LICOR DE CHOCOLATE: EQUIPADO CON TEMPERATURA NOMINAL (TEMPERATURA AJUSTABLE) SE UTILIZA PARA ALMACENAR EL BIEN MOLIDO PASTA DE CHOCOLATE A TRAVÉS DE AGITACIÓN PARA CUMPLIR CON DESGASIFICACIÓN DE DESODORIZACIÓN DE 500 LTR	1	$ 79.000.000,00	$ 79.000.000,00	1	$ 79.000.000,00	100%
3.1	ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL Y SEGUIMIENTO AL FORTALECIMIENTO ENTREGADO MEDIANTE UN PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, ECONOMISTA, CONTADOR O PROFESIONES AFINES	4	$ 6.000.000,00	$24.000.000,00	3	$ 18.000.000,00	75%
3.2	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO OPERATIVO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPECINA JOSÉ ANTONIO GALÁN ZORRO MEDIANTE UN PROFESIONAL EN INGENIERIA AGROINDUSTRIAL, AGROINDUSTRIALES Y PROFESIONES AFINES	4	$ 6.000.000,00	$ 24.000.000,00	3	$ 18.000.000,00	75%
3.3	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO OPERATIVO DE LA COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA EN INGENIERIA AGROINDUSTRIAL, AGROINDUSTRIALES Y PROFESIONES AFINES	4	$ 6.000.000,00	$ 24.000.000,00	3	$ 18.000.000,00	75%

INFORME DE INTERVENTORIA No. 3

Teniendo en cuenta que se concertó con el CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL, ponderar un 30% de avance a los equipos con avance en su proceso de fabricación y un 50% de avance en los equipos que finalizaban fabricación (ítems 1.4, 1.5, 1.8, 1.19, 2.7 y 2.8), interventoría realizo visita a los talleres de fabricantes – proveedores, logrando evidenciar dicho avance en estos ítems, calculando **un avance técnico general** del contrato en ejecución por el CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL, con corte al 28 de octubre de 2024.

A continuación, se describen las actividades ejecutadas por el Consorcio Transformación Agroindustrial y verificadas por la interventoría externa para el periodo comprendido entre primero (01) al cinco (05) de junio de 2024 y del cuatro (04) al veintiocho (28) de octubre de 2024:

3.2.1. COMPONENTE 1. APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPESINA JOSÉ ANTONIO GALÁN ZORRO

Tabla 23. Avance del Ítem 1.1.

ACTIVIDAD:		MANGUERA REFORZADA DE 1" 3 CAPAS ROLLO DE 100MTCALIBRE 80		
ÍTEM: 1.1			UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:		10	Cantidad Ejecutada:	10
Cantidad Programada:		10	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:		00%





Tabla 24. Avance del Ítem 1.2.

ACTIVIDAD:	CARRETILLA ANTI-PINCHAZO. TIPO CARRETILLA. MODELO VERSÁTIL, CAPACIDAD DE LEVANTE 5 FT.		
ÍTEM: 1.2		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	10	Cantidad Ejecutada:	10
Cantidad Programada:	10	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	00%

INFORME DE INTERVENTORIA No. 3

ACTIVIDAD:	CARRETILLA ANTI-PINCHAZO. TIPO CARRETILLA. MODELO VERSÁTIL, CAPACIDAD DE LEVANTE 5 FT.
ÍTEM: 1.2	UNIDAD: UNIDAD



Tabla 25. Avance del Ítem 1.3.

ACTIVIDAD:	BALANZA BASCULA DE 500KG ELÉCTRICA DE PEDESTAL		
ÍTEM: 1.3		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	02	Cantidad Ejecutada:	02
Cantidad Programada:	02	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	00%





Tabla 26. Avance del Ítem 1.4.

ACTIVIDAD:	TRITURADORA DE PIEDRA 2 METROS CÚBICOS HORA:		
ÍTEM: 1.4		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	01	Cantidad Ejecutada:	0,80
Cantidad Programada:	01	Cantidad por Ejecutar	0,20
% Avance	80%	%Por Ejecutar:	20%





Tabla 27. Avance del Ítem 1.5

ACTIVIDAD:	TRITURADORA INDUSTRIAL PARA RESIDUOS SÓLIDOS: PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS CON REVERSIÓN AUTOMÁTICA,		
ÍTEM: 1.5		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	01	Cantidad Ejecutada:	0,80
Cantidad Programada:	01	Cantidad por Ejecutar	0,20
% Avance	80%	%Por Ejecutar:	20%




Tabla 28. Avance del Ítem 1.6

ACTIVIDAD:	CANECA PLÁSTICA DE 55 GALONES CON TAPA Y ARO DE SEGURIDAD		
ÍTEM: 1.6		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	38	Cantidad Ejecutada:	38
Cantidad Programada:	38	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	00%



Tabla 29. Avance del Ítem 1.7

ACTIVIDAD:	MEDIDOR DE PLANTAS 5 EN 1, TEMPERATURA DE PH DEL SUELO		
ÍTEM: 1.7		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	04	Cantidad Ejecutada:	04
Cantidad Programada:	04	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	00%

INFORME DE INTERVENTORIA No. 3

ACTIVIDAD:	MEDIDOR DE PLANTAS 5 EN 1, TEMPERATURA DE PH DEL SUELO
ÍTEM: 1.7	UNIDAD: UNIDAD



Tabla 30. Avance del Ítem 1.8

ACTIVIDAD:	ZARANDA CLASIFICADORA 2 Y 3 NIVELES: ZARANDA CLASIFICADORA DE MATERIALES MALLA 100, 50 .05		
ÍTEM: 1.8		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	01	Cantidad Ejecutada:	0,80
Cantidad Programada:	01	Cantidad por Ejecutar	0,20
% Avance	80%	%Por Ejecutar:	20%

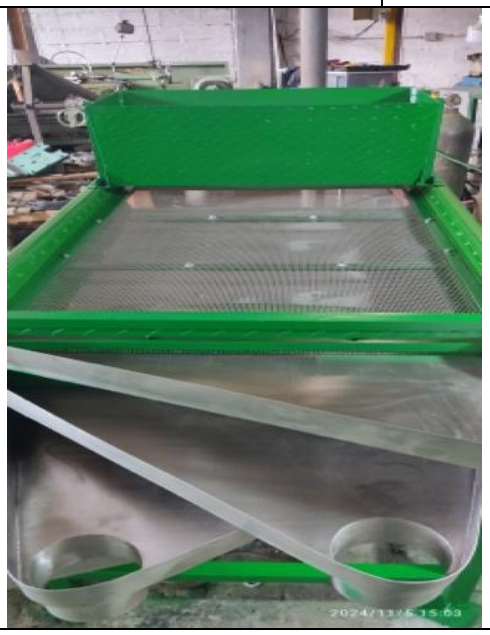




Tabla 31. Avance del Ítem 1.9

ACTIVIDAD:	CERRADORA DE SACOS Y COSTALES + HILO NUEVA		
ÍTEM: 1.9		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	02	Cantidad Ejecutada:	02
Cantidad Programada:	02	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	00%

INFORME DE INTERVENTORIA No. 3

ACTIVIDAD:	CERRADORA DE SACOS Y COSTALES + HILO NUEVA
ÍTEM: 1.9	UNIDAD: UNIDAD





Tabla 32. Avance del Ítem 1.10

ACTIVIDAD:	GRANULADOR DE FERTILIZANTE ORGÁNICO: PRODUCTIVIDAD HASTA 3.000 KG POR HORA		
ÍTEM: 1.10		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	01	Cantidad Ejecutada:	0,80
Cantidad Programada:	01	Cantidad por Ejecutar	0,20
% Avance	80%	%Por Ejecutar:	20%





Tabla 33. Avance del Ítem 1.11

ACTIVIDAD:	ESCRITORIO METÁLICO OPERATIVO 73X120X60CM		
ÍTEM: 1.11		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	01	Cantidad Ejecutada:	01
Cantidad Programada:	01	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	00%



INFORME DE INTERVENTORIA No. 3

Tabla 34. Avance del Ítem 1.12

ACTIVIDAD:	ARCHIVADOR 4 GAVETAS METÁLICO		
ÍTEM: 1.12		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	01	Cantidad Ejecutada:	01
Cantidad Programada:	01	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	00%





Tabla 35. Avance del Ítem 1.13

ACTIVIDAD:	SILLA ESCRITORIO CON BRAZOS Y RESPALDO NEGRA		
ÍTEM: 1.13		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	01	Cantidad Ejecutada:	01
Cantidad Programada:	01	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	00%





Tabla 36. Avance del Ítem 1.14

ACTIVIDAD:	SILLA OFICINA INTERLOCUTORA ESCRITORIO ESTRUCTURA NEGRA PLAS		
ÍTEM: 1.14		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	02	Cantidad Ejecutada:	02
Cantidad Programada:	02	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	00%

INFORME DE INTERVENTORIA No. 3

ACTIVIDAD:	SILLA OFICINA INTERLOCUTORA ESCRITORIO ESTRUCTURA NEGRA PLAS
ÍTEM: 1.14	UNIDAD: UNIDAD





Tabla 37. Avance del Ítem 1.15

ACTIVIDAD:	LOCKER METÁLICO 9 PUESTOS AZUL DE 180X93X30 CM			
ÍTEM: 1.15			UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	01		Cantidad Ejecutada:	01
Cantidad Programada:	01		Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%		%Por Ejecutar:	00%





Tabla 38. Avance del Ítem 1.16

ACTIVIDAD:	COMPUTADOR DE ESCRITORIO, DISCO DURO		
ÍTEM: 1.16		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	01	Cantidad Ejecutada:	01
Cantidad Programada:	01	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	00%



INFORME DE INTERVENTORIA No. 3

Tabla 39. Avance del Ítem 1.17

ACTIVIDAD:	IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIÓN: IMPRIME, ESCANEA Y HACE COPIAS.		
ÍTEM: 1.17		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	01	Cantidad Ejecutada:	01
Cantidad Programada:	01	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	00%



3.2.2. COMPONENTE 2. APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA

Tabla 40. Avance del Ítem 2.1

ACTIVIDAD:	REFINADOR DE PIEDRAS A MÁQUINA, CAPACIDAD DE 120 KG BACHE.		
ÍTEM: 2.1		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	01	Cantidad Ejecutada:	01
Cantidad Programada:	01	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	00%





Tabla 41. Avance del Ítem 2.2

ACTIVIDAD:	ELEVADOR DE CANGILONES DE 3 MTRS		
ÍTEM: 2.2		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	01	Cantidad Ejecutada:	01
Cantidad Programada:	01	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	00%

INFORME DE INTERVENTORIA No. 3

ACTIVIDAD:	ELEVADOR DE CANGILONES DE 3 MTRS
ÍTEM: 2.2	UNIDAD: UNIDAD





Tabla 42. Avance del Ítem 2.3

ACTIVIDAD:	PLANTA ELÉCTRICA DIÉSEL CABINADA: POTENCIA STAND BY 25KVA		
ÍTEM: 2.3		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	01	Cantidad Ejecutada:	01
Cantidad Programada:	01	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	00%





Tabla 43. Avance del Ítem 2.4

ACTIVIDAD:	MOLDE EN POLICARBONATO PARA CHOCOLATE DE MESA 180GR		
ÍTEM: 2.4		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	300	Cantidad Ejecutada:	300
Cantidad Programada:	300	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	00%

INFORME DE INTERVENTORIA No. 3

ACTIVIDAD:	MOLDE EN POLICARBONATO PARA CHOCOLATE DE MESA 180GR
ÍTEM: 2.4	UNIDAD: UNIDAD



Tabla 44. Avance del Ítem 2.5

ACTIVIDAD:	BÁSCULA PLEGABLE 300 KILOS ACERO INOXIDABLE		
ÍTEM: 2.5		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	02	Cantidad Ejecutada:	02
Cantidad Programada:	02	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	00%



Tabla 45. Avance del Ítem 2.6

ACTIVIDAD:	BANDA TRANSPORTADORA DE 5 METROS		
ÍTEM: 2.6		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	01	Cantidad Ejecutada:	01
Cantidad Programada:	01	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	00%

INFORME DE INTERVENTORIA No. 3

ACTIVIDAD:	BANDA TRANSPORTADORA DE 5 METROS
ÍTEM: 2.6	UNIDAD: UNIDAD





Tabla 46. Avance del Ítem 2.7

ACTIVIDAD:	TÚNEL DE ENFRIAMIENTO DE CHOCOLATE SS DE ALTO RENDIMIENTO DE 280MM DE ANCHO		
ÍTEM: 2.7		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	01	Cantidad Ejecutada:	0,80
Cantidad Programada:	01	Cantidad por Ejecutar	0,20
% Avance	80%	%Por Ejecutar:	20%





Tabla 47. Avance del Ítem 2.8

ACTIVIDAD:	MÁQUINA AUTOMÁTICA DE MOLDEO DE CHOCOLATE DE LA MÁQUINA DEL DEPOSITANTE DE LA BARRA DE CHOCOLATE DE UN TIRO.		
ÍTEM: 2.8		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	01	Cantidad Ejecutada:	0,80
Cantidad Programada:	01	Cantidad por Ejecutar	0,20
% Avance	80%	%Por Ejecutar:	20%


INFORME DE INTERVENTORIA No. 3

ACTIVIDAD:	MÁQUINA AUTOMÁTICA DE MOLDEO DE CHOCOLATE DE LA MÁQUINA DEL DEPOSITANTE DE LA BARRA DE CHOCOLATE DE UN TIRO.
ÍTEM: 2.8	UNIDAD: UNIDAD




Tabla 48. Avance del Ítem 2.9

ACTIVIDAD:	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LICOR DE CHOCOLATE		
ÍTEM: 2.9		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	01	Cantidad Ejecutada:	01
Cantidad Programada:	01	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	00%

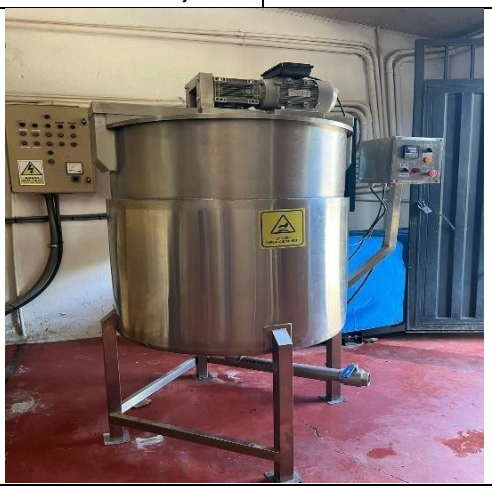Anexo 7. Informe del contratista.

3.2.3. COMPONENTE 3. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EMPRESARIAL

Ítem 3.1. ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL Y SEGUIMIENTO AL FORTALECIMIENTO A LA ASOCIACION NACIONAL CAMPESINA JOSE ANTONIO GALAN ZORRO Y COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA.

Durante el periodo de ejecución del presente informe la profesional Luz Yannid Cortés Gómez abordaron los siguientes temas:

- **INTELIGENCIA EMOCIONAL:** Habilidades Para Reconocer, Regular Y Comprenderlas Emociones En El Emprendedor Y Los Demas.


INFORME DE INTERVENTORIA No. 3

- **PLANEACIÓN ESTRATÉGICA:** Trabajo Con Base En Objetivos Para Obtención De Resultados.
- **PLAN DE ACCIÓN:** Plan De Acción Fechas Detalladas A (2 Años), Plan De Acción Fechas Detalladas A (3-5 Años).

Unas recomendaciones para el grupo directivo Asociación Nacional campesina José Antonio Galán Zorro Asonalca Municipio de Saravena, respecto a la importancia de hacer planes de acción es importante porque dan.

CLARIDAD Y ENFOQUE: Definen los objetivos de la asociación, establecen las estrategias para alcanzarlos y asignan responsabilidades a cada miembro. Esto evita la dispersión de esfuerzos y garantiza que todos trabajen hacia un mismo fin.
COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN: Facilitan la coordinación entre los diferentes miembros de la asociación, asegurando que cada acción se realice en el momento adecuado y de manera eficiente.
MEDICIÓN DEL PROGRESO: Permiten establecer indicadores de desempeño para evaluar el avance de los proyectos y realizar ajustes si es necesario. Esto garantiza que la asociación esté siempre en el camino correcto.
TOMA DE DECISIONES: Sirven como base para la toma de decisiones, ya que proporcionan información relevante sobre la situación actual de la asociación y las posibles alternativas futuras.

Tabla 49. Avance del ítem 3.1 contrato 627 de 2023

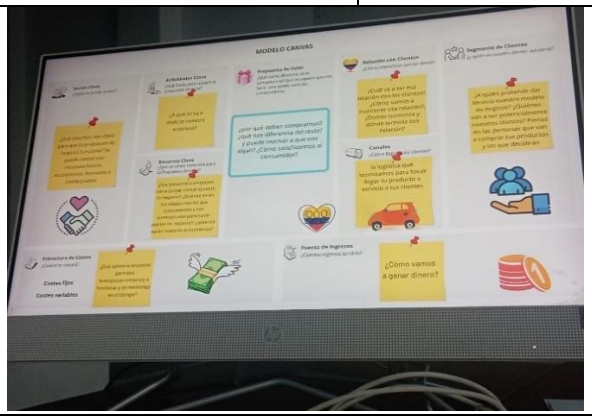ACTIVIDAD:	Acompañamiento empresarial seguimiento al fortalecimiento entregado a la asociación nacional campesina José Antonio galán zorro y cooperativa procesadora de cacao del oriente la delicia.		
ÍTEM: 3.1		UNIDAD: MES	
Cantidad Contractual Vigente:	4	Cantidad Ejecutada:	3
Cantidad Programada:	3	Cantidad por Ejecutar	2
% Avance	75%	%Por Ejecutar:	25%
			

Ítem 3.2 ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO OPERATIVO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPESINA JOSÉ ANTONIO GALÁN ZORRO.

El profesional encargado de ejecutar esta actividad fue JULIO ENRIQUE, Este enfoque integral busca no solo impartir conocimientos teóricos, sino también fortalecer habilidades prácticas y estratégicas entre los beneficiarios, con el objetivo de potenciar su capacidad de adaptación y competitividad en el mercado.

las siguientes actividades desarrolladas en el marco del fortalecimiento realizado en las siguientes actividades:

- Propuesta de organización y funcionamiento de la biofábrica, elementos de dotación, maquinaria y materias primas que permitirán establecer la operación de la planta de producción de los Bioinsumos.
- Documento protocolos de producción o fichas técnicas para la producción de los Bioinsumos en la biofábrica.
- Flujo del proceso de producción de la biofábrica, requerimientos en maquinaria y equipos para iniciar la producción.
- Evaluación de impacto del proceso de capacitación.

Tabla 50. Avance del ítem 3.2 contrato 627 de 2023

ACTIVIDAD:	Acompañamiento técnico para el fortalecimiento del proceso operativo de la asociación nacional campesina José Antonio galán zorro.		
ÍTEM: 3.2		UNIDAD: MES	
Cantidad Contractual Vigente:	4	Cantidad Ejecutada:	3
Cantidad Programada:	3	Cantidad por Ejecutar	2
% Avance	75%	%Por Ejecutar:	25%
			


Ítem 3.3 ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO OPERATIVO DE LA COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA.

El profesional encargado de desarrollar las actividades del componente 3.3 fue Gabriel Alonso Castro Vera, ha desarrollado un proceso de fortalecimiento en soporte técnico mejorando las capacidades técnicas en el conocimiento y manejo de la maquinaria de transformación lo que permitirá solucionar cuellos de botella que se presenten de una manera más ágil generando una rápida respuesta y menores impactos en la producción por detención de operaciones.

Además de la revisión de los aspectos de producción en planta y procesos operativos, el profesional ha colaborado estrechamente con los equipos de la cooperativa para identificar áreas de oportunidad y proponer soluciones específicas que promuevan la eficiencia y la calidad en la cadena de producción. Mediante un análisis meticuloso de los flujos de trabajo y la capacidad de los recursos, ha diseñado estrategias que no solo optimizan los tiempos de producción, sino que también fortalecen los estándares de seguridad y cumplimiento normativo. Su enfoque integrador y su capacidad para

coordinar la implementación de nuevas tecnologías aseguran que los objetivos de mejora continua sean alcanzados de manera efectiva, consolidando así la posición competitiva de la cooperativa en el mercado.

Tabla 51. Avance del ítem 3.3 contrato 627 de 2023

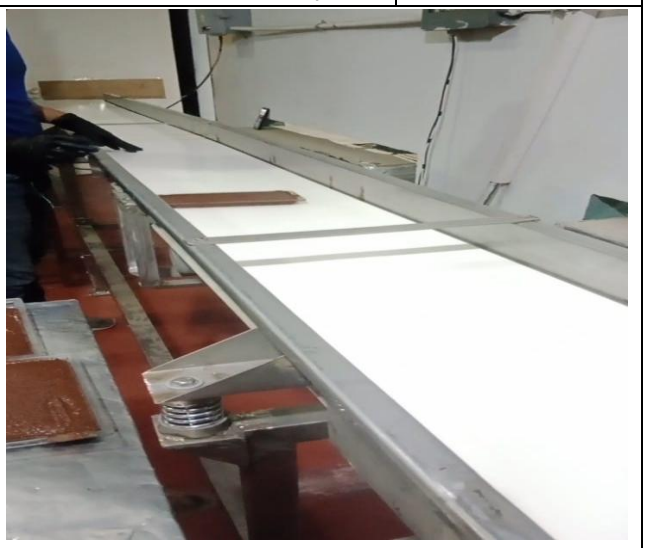ACTIVIDAD:	Acompañamiento técnico para el fortalecimiento del proceso operativo de la cooperativa procesadora de cacao del oriente la delicia.		
ÍTEM: 3.3		UNIDAD: MES	
Cantidad Contractual Vigente:	4	Cantidad Ejecutada:	3
Cantidad Programada:	3	Cantidad por Ejecutar	1
% Avance	75%	%Por Ejecutar:	25%
			


Anexo 8. Informes de ejecución de los profesionales.

3.3. AVANCE DEL CONTRATO

3.3.1. AVANCE FÍSICO

De acuerdo con los avances evidenciados, las cantidades ejecutadas del contrato y soportes presentados por el contratista principal se lleva un avance técnico acumulado del proyecto de un 87,08%.

Gráfica 1. Avance Físico del contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023.

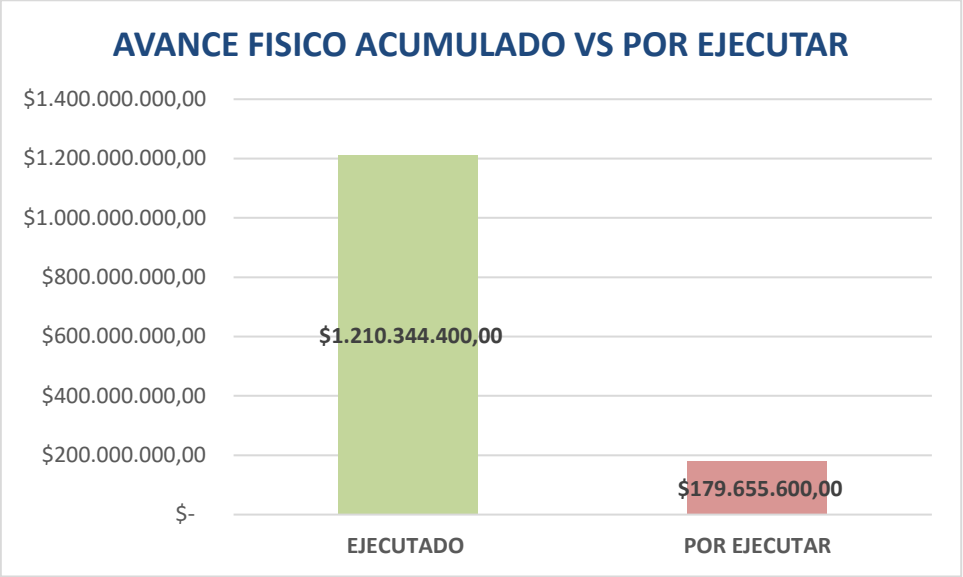

La gráfica 1 muestra que se ha ejecutado un total de MIL DOCIENTOS DIEZ MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($1.210.344.400,00) M/TE el cual equivale un 87,08% del contrato de prestación de servicios Nº 627 de 2023.

3.3.2. AVANCE DEL PLAZO CONTRACTUAL

Con respecto al plazo contractual, de los cuatro (04) meses establecidos en el contrato, ha transcurrido el 87,08% del plazo contractual.

Tabla 52. Porcentaje de avance del plazo contractual - Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023.

PLAZO CONTRACTUAL INICIAL	CUATRO (04) MESES
PLAZO EJECUTADO	TRES (03) MESES Y DOCE (12) DÍAS
PLAZO POR EJECUTAR	VEINTE (20) DÍAS
% PLAZO EJECUTADO	87,08%

3.4. PROGRAMACIÓN DEL CONTRATO

3.4.1. PROGRAMACIÓN INICIAL DEL CONTRATO

Para el control de la programación del contrato principal, el contratista presentó a la interventoría el cronograma de trabajo con cada uno de los ítems a ejecutar, con el cual se hace el seguimiento mensual al avance en la ejecución de todas las actividades y del contrato en general. A continuación, se presenta la siguiente tabla con los datos programados según programación inicial y actividades ejecutadas con corte.


Tabla 53. Porcentaje de avance Programado Vs Ejecutado del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023.

MES	FECHA DEL INFORME		PROGRAMADO		EJECUTADO	
	DESDE	HASTA	MES	ACOMULADO	MES	ACOMULADO
MES 1	20/03/24	19/04/24	1.29%	1,29%	1.77%	1,77%

MES 2	20/04/24	19/05/24	48,71%	50,00%	47,36%	49,13%
MES 3	20/05/24	19/06/24	48,71%	98,71%	37,95%	87,08%
MES 4	20/06/24	20/07/24	1,29%	100%	0%	

De acuerdo con las cantidades ejecutadas en el mes 3, se presenta un avance de ejecución mensual del 37,95%. La programación para ejecutar en este periodo comprende del 87,08% mensual. Cabe resaltar que este avance representa el porcentaje de los equipos tanto ingresado almacén Departamental, como los equipos con anticipo para la fabricación de los mismo.

Gráfica 2. Avance físico mensual programado Vs Ejecutado del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023.

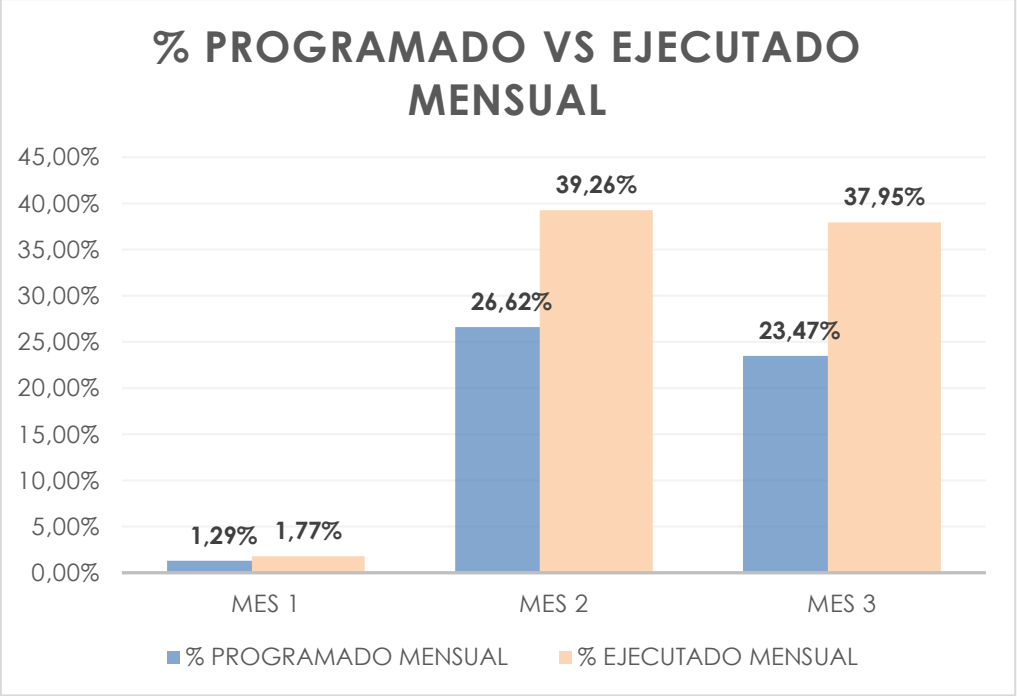

Para el periodo del informe mes 3 se ejecutó en el mes 37,95% Vs lo programado 48,71% de acuerdo a la programación inicial.

3.4.2. REPROGRAMACIÓN SEGÚN ACTA DE REINICIO No. 1

Una vez suscrita el acta de reinicio No. 1, el CONSORCIO TRANFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL presento a interventoría externa la reprogramación del contrato, de la cual se tiene el siguiente análisis.

Tabla 54. Porcentaje de avance Reprogramado Vs Porcentaje avance Ejecutado Reprogramación

MES	FECHA DEL INFORME		PROGRAMADO		EJECUTADO	
	DESDE	HASTA	MES	ACOMULADO	MES	ACOMULADO
MES 1	20/03/24	19/04/24	1.29%	1.29%	1.77%	1,77%
MES 2	20/04/24	19/05/24	26,62%	27,91%	47,37%	49,14%
MES 3	20/05/24 04/10/24	06/06/24 18/10/24	61,24%	89,16%	37,94%	87.08%
MES 4	19/10/24	18/11/24	10,85%	100%		

3.5. ASPECTOS FINANCIEROS

3.5.1. MANEJO DEL ANTICIPO

Según la cláusula DECIMA SÉPTIMA "VALOR Y FORMA DE PAGO": El DEPARTAMENTO DE ARAUCA pagará el valor del contrato, previa presentación de la Orden de Pago debidamente soportada, así: 1) Hasta un ochenta por ciento (80%) del valor del Contrato, se pagará mediante presentación de Actas parciales, formuladas por el contratista de acuerdo con las actividades ejecutadas y aceptadas por la interventoría y satisfacción del Departamento. Los documentos para pago son los establecidos en la lista de chequeo para trámite de acta parcial aprobada por la oficina de calidad del Departamento de Arauca. 2) El veinte por veinte (20%) restante del valor total, previo recibo a Satisfacción y suscripción del Acta de Liquidación del contrato y su correspondiente aprobación por parte del DEPARTAMENTO DE ARAUCA. Los documentos para pago son los establecidos en la lista de chequeo para trámite de liquidación aprobada por la oficina de calidad del Departamento de Arauca. PARÁGRAFO: El Departamento concederá al contratista un anticipo de hasta un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total del contrato, una vez se haya perfeccionado y legalizado, el contrato y se halle aprobada la garantía que lo ampare y se surtan los trámites previos para su reconocimiento y posterior desembolso, dicho valor deberá amortizarse en cada acta parcial tramitada por el mismo porcentaje del que fue entregado. El contratista constituirá fiducia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011.

Valor Del Contrato:	$1.390.000.000,00
Porcentaje Del Anticipo:	50%
Valor Del Anticipo:	$ 695.000.000,00

3.5.2. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

El plan de Inversión del Anticipo fue aprobado por la interventoría, a continuación, se relacionan los rubros aprobados:

Tabla 55. Plan de inversión de anticipo - Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023.

DESCRIPCIÓN	% ANTICIPO RECURSOS PROPIOS	VALOR ANTICIPO RECURSOS PROPIOS
COMPONENTE: 1 APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPESINA JOSÉ ANTONIO GALÁN ZORRO	54%	$375.487.000,00
COMPONENTE 2: APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA	41%	$ 283.513.000,00
COMPONENTE 3: ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EMPRESARIAL	5%	$ 36.000.000,00
TOTALES	100%	$ 695.000.000,00

3.5.3. APERTURA DE CUENTA BANCARIA – CONTRATO FIDUCIARIO

De acuerdo con la minuta del contrato y tipo de proceso, el CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL, hizo entrega de la certificación del contrato fiduciario:

INFORME DE INTERVENTORIA No. 3

Entidad Bancaria:	Banco De Bogotá
Contrato Fiduciario No.	3-1-119139
Fecha De Apertura.	26-02-2024
Cuenta Bancaria No.:	000219337
Tipo De Cuenta:	Ahorro
Titular:	Fidubgota S.A-C.C.A Fidugob
Valor Del Anticipo:	$695.000.000,00
Valor Consignado A La Fiducia:	$695.000.000,00
Valor Desembolsado Al Contratista:	$695.000.000,00

3.5.4. ESTADO DEL CONTRATO FIDUCIARIO

El **CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL** conformo el fideicomiso. No. 3-1-119139, el día 21 de febrero de 2024, el cual administro los recursos del anticipo, por la compañía FIDUBOGOTA S.A- C.C.A. FIDUGOB. Para el periodo del presente informe los rendimientos por concepto de anticipo ya fueron consignados.

Tabla 56. Ordenes de operación del anticipo principal y adicional de valor y plazo

Fecha Radicado	No. Orden De Operación	Valor Del Desembolso	Beneficiario	Estado
23/04/2024	1	$ 7.250.000,00	LUZ YANNID CORTEZ GÓMEZ	Aprobada
24/04/2024	2	$ 375.487.000,00	CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL	Aprobada
26/04/2024	3	$ 283.513.000,00	CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL	Aprobada
16/05/2024	4	$28.750.000,00	CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL	Aprobada

Así las cosas, el estado actual del contrato fiduciario 3-1-119139 es el siguiente:

Entidad Bancaria:	Banco De Bogotá
Contrato Fiduciario No.	3-1-119139
Fecha De Apertura.	21-02-2024
Cuenta Bancaria No.:	137527701
Tipo De Cuenta:	Ahorro
Titular:	Consorcio Transformación Agroindustrial
Fecha de Apertura	28-12-2023
Valor Consignado A La Fiducia:	$695.000.000,00
Valor Desembolsado Al Contratista:	$695.000.000,00
Fecha de Liquidación Fiducia:	23/08/2024
Valor rendimientos financieros:	$ 2.330.577,00
Valor rendimientos consignados:	$ 2.330.577,00
Fecha consignación rendimientos financieros:	20/06/2024

Anexo 9. Certificado de ingreso de rendimientos contrato No. 627 de 2023.

4. ASPECTOS CONTRACTUALES - INTERVENTORÍA

4.1.1. ALCANCE

De acuerdo con los parámetros previstos para la realización de los contratos establecidos en los pliegos de condiciones de la convocatoria a los procesos de selección que adelanta LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE DEPARTAMENTAL, para realizar el proyecto "APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA", se requiere de mecanismos efectivos que garanticen el control y la optimización de los recursos a invertir.

Es imprescindible establecer durante el desarrollo de las obras elementos que permitan manejar todas las variables que se puedan presentar adoptando dispositivos de juicio que permitan ejecutar las mismas en condiciones óptimas de administración de recursos y manejo financiero de acuerdo con la naturaleza. El control como tal, es una herramienta indispensable para poder garantizar de manera permanente el buen desarrollo de estas obras asegurando el cumplimiento del objeto contractual y sirviendo como termómetro para la toma de decisiones ante situaciones imprevisibles presentes en el desarrollo de cualquier proyecto.

Teniendo en cuenta encontró en mención requiere de un control permanente donde se garantice el cumplimiento de los objetivos administrativos, técnicos y financieros identificados en el contrato de prestación de servicios No. 627 de 2023, la GOBERNACIÓN DE ARAUCA celebró el contrato 001 DE 2024, con la CORPORACIÓN POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA “COAMDESOR” para tal fin.

4.1.2. INTERVENTORÍA TÉCNICA

A través del contrato de interventoría No. 001 de 2024, le correspondió a la Interventoría COAMDESOR hacer control de calidad y especificaciones técnicas y demás condiciones fiadas en el contrato para el recibo satisfactorio de los bienes y servicios contratados.

4.1.3. INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA

La Interventoría realizara el control y vigilancia del personal, equipos y recursos que son utilizados para la ejecución del proyecto por parte del Contratista, exigir el cumplimiento de las leyes en cuanto a la incorporación del personal a los Sistemas de Seguridad Social, mantener actualizado el archivo único del contrato principal, servir como coordinador entre el departamento y el contratista en cuanto a trámites administrativos.

4.1.4. INTERVENTORÍA FINANCIERA

La interventoría realizara el control al plan de gastos o inversión mensual del contrato principal, aprobara, revisara y comprobara, los soportes de gastos (facturas), comprobantes de egreso, documentos equivalentes y demás, que estén bien elaborados; efectuando un seguimiento permanente a los costos del proyecto lo cual incluye contrataciones y ejecuciones de cada uno.

Asimismo, el contrato de Interventoría No. 001 de 2024, cuenta con anticipo.

4.1.5. RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DEL SUPERVISOR

Mediante la resolución No. 762 del veintidós (22) de marzo de 2024, fue designado como Supervisor del contrato de Interventoría, a FRANCISCO JAVIER MENDOZA NIÑO, funcionario de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Sostenible Departamental, para que verifique la ejecución y cumplimiento de este.

INFORME DE INTERVENTORIA No. 3

4.2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Tabla 57. Información contractual – Contrato de Interventoría No. 001 de 2024

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No:	001 DE 2024
CONTRATISTA:	CORPORACIÓN POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA "COAMDESOR"
REPRESENTANTE LEGAL:	R/L. JULIE ANDREA PÉREZ VILLAMIL
NIT. No:	NIT 900.199.755-1
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO "APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
VALOR INICIAL:	$ 70.686.000,00
VALOR ANTICIPO CONTRATO PRINCIPAL 40%:	$ 28.274.400,00
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	19 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE INICIO:	20 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	20 DE JULIO DE 2024
FECHA DE SUSPENSION No. 1:	06 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE PRORROGA No. 1 DE LA SUSPENSION No. 1:	06 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE PRORROGA No. 2 DE LA SUSPENSION No. 1:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO No. 1:	04 DE OCTUBRE DE 2024
SUPERVISOR:	FRANCISCO JAVIER MENDOZA NIÑO
PERIODO DEL INFORME	
FECHA DE CORTE DEL INFORME:	DESDE EL VEINTE (20) DE MARZO DEL 2024 AL CINCO (05) DE JUNIO Y DEL CUATRO (04) AL DIESIES (16) DE OCTUBRE DE 2024.
DÍAS TRANSCURRIDOS:	TRES (03) MESES

El contrato de Interventoría No. 001 DE 2024, cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO "APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA", se contrató con las cantidades de la propuesta siguiente:

INFORME DE INTERVENTORIA No. 3

Tabla 58. Condiciones contractuales iniciales del contrato de Interventoría No. 001 de 2024

1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)						
CARGO / OFICIO/PROFESIÓN	CANTIDAD	SALARIO MES	No. MESES	DEDICACIÓN	VALOR BÁSICO = (BxCxD)	VALOR PARCIAL =(G)
	A	B	C	D		G
PERSONAL PROFESIONAL						
PROFESIONAL CON TITULO DE PREGRADO EN EL ÁREA DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN O PRODUCCIÓN BIOTECNOLÓGICA CON POSGRADO. CON 80 MESES DE EXPERIENCIA MAS COMO PROFESIONAL EN INTERVENTORÍA.	1	$ 4.000.000,00	4	100%	$ 16.000.000,00	$ 16.000.000,00
					SUBTOTAL, COSTOS PROFESIONAL	$ 16.000.000,00
					FACTOR MULTIPLICADOR	2,1
					TOTAL, COSTOS PROFESIONAL	$ 33.600.000,00
2. OTROS COSTOS DIRECTOS (B)						
CONCEPTO	MES	VALOR MENSUAL	No. MESES	DEDICACIÓN	VALOR BÁSICO = (BxCxD)	VALOR PARCIAL =(G)
	A	B	C	D		G
COSTOS APOYO LOGÍSTICO Y TRANSPORTE						
APOYO DE UN TÉCNICO ADMINISTRATIVO	MES	$ 1.500.000,00	4	100%	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00
APOYO LOGÍSTICO Y TRANSPORTE A MUNICIPIOS PARA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.	UNIDAD	$ 4.200.000,00	4	100%	$ 16.800.000,00	$ 16.800.000,00
COSTOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTACIÓN Y PAPELERÍA.						
ELABORACIÓN Y EDICIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN	UNIDAD	$ 750.000,00	4	100%	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00
					SUBTOTAL, OTROS COSTOS DIRECTOS=B	$ 25.800.000,00
					SUBTOTAL (A+B)=C	$ 59.400.000,00
					IVA 19%	$ 11.286.000,00
					VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA	$ 70.686.000,00

4.3. GARANTÍAS DEL CONTRATO

De acuerdo con el Contrato de Interventoría No. 001 DE 2024, se suscribió con la compañía ASEGURADORA SOLIDARIA. Las siguientes garantías teniendo en cuenta los amparos en valor y plazo estipulado en la minuta contractual en el fragmento de garantías del Contrato así:

4.3.1. PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN

Las pólizas iniciales fueron expedidas el día 01 de febrero de 2024 por la compañía ASEGURADORA SOLIDARIA tomada por la CORPORACIÓN POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA “COAMDESOR” y con beneficiario a el DEPARTAMENTO DE ARAUCA. Dicha póliza fue aprobada por la gerencia de contratación, mediante certificación firmada por el Gerente de Contratación Liliana Vivas Parada el 19 de febrero de 2024.

A continuación, se detalla la información de la Pólizas Iniciales:

Tabla 59. Pólizas iniciales del contrato de Interventoría No. 001 de 2024

Anexo	Fecha Expedición	Nombre / Tipo de Póliza	Entidad Aseguradora	Numero de la Póliza	Desde	Hasta	Suma Asegurada
0	01 de febrero De 2024	Cumplimiento	Aseguradora Solidaria de Colombia	475-47-994000064110	01/02/2024	01/12/2024	$17.137.200
		Anticipo			01/02/2024	01/12/2024	$28.274.400
		Pago De Salarios, Prestaciones Sociales			01/02/2024	01/06/2027	$10.602.900
		Calidad Del Servicio			01/02/2024	01/06/2025	$14.137.200

4.3.2. PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO

Las pólizas según acta de inicio fueron expedidas el día 21 de marzo de 2024 por la compañía ASEGURADORA SOLIDARIA tomada por la CORPORACIÓN POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA "COAMDESOR" y con beneficiario a el DEPARTAMENTO DE ARAUCA. Dicha póliza fue aprobada por la gerencia de contratación, mediante certificación firmada por el Gerente de Contratación Luz Liliana Marchen a Pinzón el 02 de abril de 2024. A continuación, se detalla la información de la Pólizas según acta de inicio:

Tabla 60. Pólizas Según Acta de Inicio del contrato de Interventoría No. 001 de 2024

Anexo	Fecha Expedición	Nombre / Tipo De Póliza	Entidad Aseguradora	Numero De La Póliza	Desde	Hasta	Suma Asegurada
1	21 de marzo de 2024	Cumplimiento	Aseguradora Solidaria de Colombia	475-47-994000064110	20/03/2024	20/02/2025	$17.137.200
		Anticipo			20/03/2024	20/02/2025	$28.274.400
		Pago De Salarios, Prestaciones Sociales			20/03/2024	20/07/2027	$10.602.900
		Calidad Del Servicio			20/03/2024	20/07/2025	$14.137.200

4.3.3. PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 Y REINICIO No. 1

Las pólizas según acta de suspensión No. 01 de fecha 06 de junio de 2024, prorroga No. 01 a la suspensión No. 01 de fecha 06 de agosto de 2024, prorroga No. 02 a la suspensión No. 01 de fecha 06 de septiembre de 2024 y acta de reinicio No. 01 de fecha 04 de octubre de 2024, expedidas el día 07 de octubre de 2024 por la compañía ASEGURADORA SOLIDARIA tomada por la CORPORACIÓN POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA "COAMDESOR" y como beneficiario el DEPARTAMENTO DE ARAUCA. Dicha póliza fue aprobada por la gerencia de contratación, mediante certificación firmada por el Gerente de Contratación Luz Liliana Marchen a Pinzón el 17 de Octubre de 2024. A continuación, se detalla la información de la Pólizas según acta de suspensión No. 1 y reinicio No. 1:

Tabla 61. Pólizas Según Acta de Suspensión No. 1 y reinicio No. 1 del contrato de Interventoría No. 001 de 2024

Anexo	Fecha Expedición	Nombre / Tipo De Póliza	Entidad Aseguradora	Numero De La Póliza	Desde	Hasta	Suma Asegurada
2	07 de octubre de 2024	Cumplimiento	Aseguradora Solidaria de Colombia	475-47-994000064110	20/03/2024	22/06/2025	$17.137.200
		Anticipo			20/03/2024	22/06/2025	$28.274.400
		Pago De Salarios, Prestaciones Sociales			20/03/2024	19/11/2027	$10.602.900
		Calidad Del Servicio			20/03/2024	19/11/2025	$14.137.200

Anexo 10. Pólizas del Contrato de Interventoría No. 001 de 2024

4.4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.4.1. ACTOS ADMINISTRATIVOS

La firma interventora CORPORACIÓN POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA "COAMDESOR", inició las actividades el día 20 de marzo de 2024, una vez suministrada, revisada y aprobada la documentación requerida para suscribir Acta de Inicio, al acto se presentaron los supervisores del contrato FRANCISCO JAVIER MENDOZA NIÑO, funcionario de la Gobernación del Departamento de Arauca.

Tabla 62. Actos administrativos – Contrato de Interventoría No. 001 de 2024

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	CONCEPTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITO POR
31 DE ENERO DE 2024	CONTRATO	CONTRATO	RENSON JESÚS MARTÍNEZ PRADA JULIE ANDREA PÉREZ VILLAMIL
20 DE MARZO DE 2024	ACTA INICIO	ACTA DE INICIO	CARLOS OCTAVIO SARMIENTO GRANADOS JULIE ANDREA PÉREZ VILLAMIL
06 DE JUNIO DE 2024	SUSPENSIÓN	ACTA DE SUSPENSION No. 1	CARLOS OCTAVIO SARMIENTO GRANADOS JULIE ANDREA PÉREZ VILLAMIL FRANCISCO MENDOZA NIÑO
06 DE AGOSTO DE 2024	PRORROGA	ACTA DE PRORROGA No. 1 DE LA SUSPENSION No. 1	CARLOS OCTAVIO SARMIENTO GRANADOS JULIE ANDREA PÉREZ VILLAMIL FRANCISCO MENDOZA NIÑO
06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	PRORROGA	ACTA DE PRORROGA No. 2 DE LA SUSPENSION No. 1	CARLOS OCTAVIO SARMIENTO GRANADOS JULIE ANDREA PÉREZ VILLAMIL
04 DE OCTUBRE DE 2024	REINICIO	ACTA DE REINICIO No. 1	CARLOS OCTAVIO SARMIENTO GRANADOS JULIE ANDREA PÉREZ VILLAMIL FRANCISCO MENDOZA NIÑO

Anexo 11. Actos administrativos del contrato de interventoría No. 001 de 2024

4.4.2. VINCULACIÓN DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

Las actividades de la Interventoría son desarrolladas por el personal propuesto de acuerdo con las necesidades del proyecto, debido a la magnitud y complejidad de los trabajos del personal que labora según lo indicado en el contrato de interventoría. La firma contratista CORPORACIÓN POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA "COAMDESOR" cuenta con el personal profesional que se encuentra en la propuesta, según lo ofertado en el concurso de méritos SM-07-01-2022.

A continuación, se presenta el personal profesional empleado en la ejecución del contrato de interventoría No. 001 de 2024:

Tabla 63. Relación de Personal profesional del contrato de Interventoría No. 001 de 2024

NOMBRE	C.C No.	CARGO	SALARIO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	DÍAS LABORADOS
JULIE ANDREA PÉREZ VILLAMIL	37.391.228	ING. EN PRODUCCION BIOTECNOLOGICA	$4.000.000	20/03/2024		90

INFORME DE INTERVENTORIA No. 3

LIDIAN ZULAY NUÑEZ CABARCAS	1.116.782.383	APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	$1.500.000	20/03/2024		90

A continuación, se relaciona el personal técnico y administrativo del contratista y las planillas de pago correspondientes al periodo del presente informe:

Tabla 64. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato Interventoría No. 002 de 2024

MES: MARZO DE 2024											
DATOS GENERALES						AFILIADO A				No PLANILLA	FECHA DE PAGO
No.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALUD	PENSIÓN	CCF	RIESGO		
1	PÉREZ	VILLAMIL	JULIE ANDREA	37.391.228	ING. EN PRODUCCIÓN BIOTECNOLÓGICA	SANITAS S.A	PORVENIR	COMFIAR	POSITIVA	9465431112	09/04/2024
2	NÚÑEZ	CABARCAS	LIDIAN ZULAY	1.116.782.383	COORDINADOR DEL PROYECTO	NUEVA EPS	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	9465456299	09/04/2024

Tabla 65. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023

MES: ABRIL DE 2024											
DATOS GENERALES						AFILIADO A				No PLANILLA	FECHA DE PAGO
No.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALUD	PENSIÓN	CCF	RIESGO		
1	PÉREZ	VILLAMIL	JULIE ANDREA	37.391.228	ING. EN PRODUCCIÓN BIOTECNOLÓGICA	SANITAS S.A	PORVENIR	COMFIAR	POSITIVA	9466979067	10/05/2024
2	NÚÑEZ	CABARCAS	LIDIAN ZULAY	1.116.782.383	COORDINADOR DEL PROYECTO	NUEVA EPS	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	9466979067	10/05/2024

Tabla 66. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023

MES: MAYO DE 2024											
DATOS GENERALES						AFILIADO A				No PLANILLA	FECHA DE PAGO
No.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALUD	PENSIÓN	CCF	RIESGO		
1	PÉREZ	VILLAMIL	JULIE ANDREA	37.391.228	ING. EN PRODUCCIÓN BIOTECNOLÓGICA	SANITAS S.A	PORVENIR	COMFIAR	POSITIVA	9468346961	12/06/2024
2	NÚÑEZ	CABARCAS	LIDIAN ZULAY	1.116.782.383	COORDINADOR DEL PROYECTO	NUEVA EPS	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	9468346961	12/06/2024

Tabla 67. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023

MES: JUNIO DE 2024											
DATOS GENERALES						AFILIADO A				No PLANILLA	FECHA DE PAGO
No.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALUD	PENSIÓN	CCF	RIESGO		
1	PÉREZ	VILLAMIL	JULIE ANDREA	37.391.228	ING. EN PRODUCCIÓN BIOTECNOLÓGICA	SANITAS S.A	PORVENIR	COMFIAR	POSITIVA	9469752711	17/072024
2	NÚÑEZ	CABARCAS	LIDIAN ZULAY	1.116.782.383	COORDINADOR DEL PROYECTO	NUEVA EPS	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	9469752711	17/07/2024

Tabla 68. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023

MES: OCTUBRE DE 2024											
DATOS GENERALES						AFILIADO A				No PLANILLA	FECHA DE PAGO
No.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALUD	PENSIÓN	CCF	RIESGO		
1	PÉREZ	VILLAMIL	JULIE ANDREA	37.391.228	ING. EN PRODUCCIÓN BIOTECNOLÓGICA	SANITAS S.A	PORVENIR	COMFIAR	POSITIVA	9477006216	07/11/2024
2	NÚÑEZ	CABARCAS	LIDIAN ZULAY	1.116.782.383	COORDINADOR DEL PROYECTO	NUEVA EPS	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	9477006216	07/11/2024

Anexo 12. Planillas de seguridad social del contrato de interventoría 001 de 2024

4.4.3. EQUIPOS DE INTERVENTORÍA

INFORME DE INTERVENTORIA No. 3

La firma Interventora, CORPORACIÓN POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA "COAMDESOR", para la coordinación, supervisión y control de las actividades objeto del Contrato, dispuso de recursos técnicos como mobiliario de oficina, unidades de cómputo, fotografía, transporte para movilizarse a los municipios y los elementos necesarios utilizados durante la ejecución del contrato.

Elaboración y edición de informes mensuales de ejecución:

- Oficina: Se cuenta con una oficina en el municipio de Arauca, cuya dirección es carrera 23 No. 21-34 barrio 7 de agosto, en esta oficina se desempeñarán todas las funciones inherentes a la ejecución del contrato, se realiza la coordinación de los trabajos, se atiende a la comunidad y se lleva un archivo físico de los informes, registros y documentos generados en la ejecución del Contrato.
- Equipos de oficina: El equipo de oficina cuenta con Computador, impresoras y fotocopiadora, equipos de oficina utilizados para la edición y presentación de informes de interventoría, cortes parciales del proyecto, informes mensuales, informes ejecutivos, comités, etc.
- Cámara Digital: Equipo de oficina utilizado para dejar registro fotográfico que evidencie las actividades ejecutadas por los contratistas etc.



Fuente: Propia

Apoyo logístico y transporte a Municipios para verificación de cumplimiento de la actividad:

En este apoyo se dispone de una camioneta tipo doble cabina para la movilización del personal de interventoría en la verificaciones y cumplimiento de las activades ejecutadas del contrato principal Nº 627 de 2023, en los Municipios de Arauquita y Saravena con las siguientes características:

PLACA: JOL626 **LINEA: DUSTER OROCH** **MODELO:2021**



4.5. ASPECTOS TÉCNICOS

4.5.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA

Dentro de las obligaciones como interventoría se realiza un acompañamiento y seguimiento a las actividades ejecutadas del contrato principal 627 de 2023, cuyo objeto principal es "APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

En el Componente 1: APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPESINA JOSÉ ANTONIO GALÁN ZORRO, la interventoría ha realizado acompañamiento, seguimiento técnico y evaluación de las actividades realizadas durante la ejecución del proyecto, ha realizado verificación y aprobación de las fichas técnicas presentadas por el contratista en las cuales ha complementado las características aportadas en las especificaciones técnicas, dado que estas eran muy generales, mejorando así la comprensión de las mismas; finalizada dicha actividad se ha realizado compra de los equipos; de igual forma se participó en la entrega de los suministros y equipos.

Imagen: Revisión y socialización de la ficha técnicas





Fuente: Propia

Imagen: Entrega de equipos a la Asociación Asonalca



Fuente: Propia

En el componente 2. APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD DE LA COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA, tras el acompañamiento y verificación de las actividades efectuadas por parte del contratista en la finalización de las fichas, se hizo entrega de los equipos y suministros (Elevador de cangilones, planta eléctrica, molde de policarbonato, bascula, tanque de almacenamiento); Esta interventoría constato el cumplimiento de esa entrega parcial, a continuación se ilustra mediante fotografías:

Imagen: Entrega de equipos a la Asociación Asonalca





Fuente: Propia

La interventoría ha citado o participado de los siguientes comités técnicos con el objetivo de desarrollar herramientas encaminadas a la adecuada ejecución del contrato:

Comité Técnico Nº1:

Fecha:	18 de abril de 2024, en la ciudad de Arauca
Temas:	Revisión de especificaciones técnicas del proyecto, socialización de fichas técnicas construidas por contratista y aprobadas por interventoría con las especificaciones detalladas de cada quipo o elementos a comprar previo a someterlas a revisión de las asociaciones en comités de compras.
Asistentes:	Francisco Mendoza- Supervisor Sandra Franco- Apoyo a la supervisión Julie Pérez- Interventoría externa Yarle Cárdenas- Contratista
Resumen:	Se presenta a la supervisión las fichas técnicas construidas por el contratista y revisadas por la interventoría, de cada uno de los equipos y maquinaria a suministrar a los beneficiarios del proyecto. Se presentan por la supervisión apreciaciones o sugerencia para tener en cuenta a la hora de realizar la socialización en el plan de compras.
Compromisos:	El contratista se compromete a analizar y tener en cuenta las recomendaciones emitidas por la supervisión para algunos equipos o maquinaria, previo a la socialización con las asociaciones.
Evidencia:	

COMITÉ TECNICO Nº2:

Fecha:	19 de abril de 2024, en la ciudad de Saravena
Temas:	Revisión de las fichas técnicas de cada uno de los ítems

INFORME DE INTERVENTORIA No. 3

Asistentes:	Julie Pérez- Interventoría externa Zulay Núñez- Apoyo interventoría Yarle Cárdenas- Contratista Joana Pinzón- R/L Asonalca Omar Lombana- Asesor de Asonalca Sonia López- Asesora de Asonalca Eleazer Jaimes- Técnico de Asonalca Camila Bolaños- R/L Cooprocor
Resumen:	Revisión de especificaciones técnicas del proyecto, socialización o presentación de fichas técnicas construidas por contratista y aprobadas por interventoría, las cuales contienen las especificaciones detalladas de cada quipo o elementos a comprar para posteriormente someterlas a aprobación de las asociaciones en comités de compras. Asociaciones solicitan tener en cuenta algunas características adicionales y se da la definición de fechas para desarrollo de comités de compras.
Compromisos:	El contratista analizará con interventoría las apreciaciones presentadas a algunos elementos del suministro, siempre garantizando las especificaciones técnicas del estudio previo. Contratista e interventoría consolidaran la versión final definitiva de las fichas técnicas y convocaran a las asociaciones a plan de compras en las fechas que estas agendan como disponibles.
Evidencia:	

COMITÉ TECNICO Nº3:

Fecha:	30 de abril de 2024, en la ciudad de Arauquita
Temas:	Visita de verificación de avance en la ejecución de compromisos de socialización de COOPROCOR LA DELICIA LTDA.
Asistentes:	Francisco Mendoza- Supervisor Sandra Franco- Apoyo a la supervisión Zulay Núñez- Apoyo interventoría Yarle Cárdenas- Contratista Gabriel Castro- Profesional de Apoyo Contratista Jeferson Laguado- Apoyo Contratista Joana Pinzón- R/L Asonalca Camila Bolaños- R/L Cooprocor
Resumen:	La representante Legal Camila Bolaños, realiza un recorrido por las instalaciones del área de producción, donde explica las funciones y características de cada uno de los equipos, mientras el equipo contratista toma apunte de todos los datos claves para complementar los ajustes de características de los equipos a suministrar en vista que algunas especificaciones técnicas de algunos equipos son muy generales
Compromisos:	Para algunos equipos es necesario realizar adecuaciones eléctricas para instalación de equipos y locativas como es el caso de la caseta para la instalación de la planta eléctrica, para ello la representante legal Camila Bolaños ratifica el compromiso adquirido en la socialización de realizar las adecuaciones pertinente para el funcionamiento del mismo, pese a gestionar los recurso para tal fin.
Evidencia:	

INFORME DE INTERVENTORIA No. 3

Comité Técnico Nº4:

Fecha:	02 de mayo de 2024, en instalaciones de Asonalca- Saravena
Temas:	Recolección final de información para proceder con la compra de los equipos requeridos para esta asociación.
Asistentes:	Francisco Mendoza- Supervisor Sandra Franco- Apoyo a la supervisión Zulay Núñez- Apoyo Interventoría externa Yarle Cárdenas- Contratista Joana Pinzón- Representante Legal Eleazer James- Técnico Asonalca Dixon Torres- Técnico Asonalca Dairo Ortiz- Técnico Asonalca
Resumen:	Se evalúa los procesos de producción realizados en la planta para obtener información crucial y datos exactos para el proceso de compra de los equipos a suministrar a la asociación nacional campesina José Antonio galán zorro
Compromisos:	El contratista e interventoría se compromete a presentar las fichas técnicas para aprobación de compras proyectada para el 08 de mayo del presente año
Evidencias:	 

Comité Técnico Nº5:

Fecha:	08 de mayo de 2024, Sala juntas COAMDESOR- Arauca
Temas:	Comité de compras número 01
Asistentes:	Julie Pérez- Interventoría externa Yarle Cárdenas- Contratista Joana Pinzón- Representante Legal de Asonalca Héctor Martínez- Delegado Asonalca Sonia López- Asesora Asonalca Eduardo- Asesor de Asonalca
Resumen:	Revisado uno a uno las fichas para compra, se concluye por los asistentes y la representante legal de Asonalca, que los 13 ítem (manguera, carretilla, bascula, canecas plástica, medidor 5 en 1, cerrador de sacos, escritorio, archivador, silla escritorio, silla interlocutora, locker, computador, e impresora) cuyas especificaciones técnicas fueron constatadas por la interventoría, cumple con las recomendaciones efectuadas y por ende se da su aprobación en el presente comité de

	compras; para el caso de la cooperativa Cooprocor se aprueban 5 ítem (elevador de cangilones, planta eléctrica, molde policarbonato, bascula, tanque almacenamiento) para el proceso de compa
Compromisos:	Iniciar el proceso de compras, ingresos a almacén y entrega de equipos aprobados, por parte de interventoría y contratista Analizar los últimos detalles para el proceso de compra de los equipos industriales, por parte de interventoría y contratista

Comité Técnico Nº6:

Fecha:	31 de mayo de 2024, Sala junta ECAAAS - Saravena
Temas:	Comité de compras número 2
Asistentes:	Zulay Núñez- Apoyo Interventoría externa Yarle Cárdenas- Contratista Ramon Gómez- Profesional del Contratista Gabriel Castro- Profesional del Contratista Joana Pinzón- Representante Legal Asonalca Camila Bolaños- Representante Legal Cooprocor
Resumen:	Se menciona los equipos aprobados finales para el proceso de compra para la asociación asonalca cuatro (04) ítems cumpliendo con las especificaciones técnicas exigidas por el contrato (Trituradora de piedra, trituradora industrial, zaranda clasificadora y granulador fertilizante). Para la cooperativa Cooprocor en Arauquita se aprueba para el inicio de fabricación de cuatro (04) ítems cumpliendo con las especificaciones técnicas los cuales son: (Refinador de piedra, banda transportadora, túnel enfriamiento, máquina de moldeo de chocolate)
Compromisos:	Iniciar el proceso de compras, ingresos a almacén y entrega de equipos aprobados, por parte de interventoría y contratista
Evidencias:	

Comité Técnico Nº7:

Fecha:	06 de junio de 2024, secretaria de desarrollo agropecuario y sostenible.
Temas:	Acta de suspensión Nº 1
Asistentes:	Zulay Núñez- Apoyo Interventoría externa Yarle Cárdenas- Contratista Francisco Mendoza- Supervisor Sandra Franco- Apoyo a la supervisión Julie Pérez- Interventoría externa
Resumen:	El motivo de la reunión es exponer la solicitud de suspensión, los cuales han sido validados por la interventoría, para su revisión por parte de la supervisión, se pretende evaluar conjuntamente entre las partes la procedencia o no del trámite de suscripción del acta de suspensión Nº 1
Compromisos:	Proceder a la suscripción el acta de suspensión de actividades y plazo de los contratos Nº 627 de 2023 Y 001 de 2024 Revisar y aprobar plan de choque y reprogramación previo a suscripción del acta de inicio

Comité Técnico Nº8:

Fecha:	26 de julio de 2024, sala de juntas ECAAS

INFORME DE INTERVENTORIA No. 3

Temas:	Comité de verificación de avance en adecuaciones de infraestructura
Asistentes:	Yarle Cárdenas- Contratista Julie Pérez- Interventoría externa Joana Pinzón- Representante Legal Asonalca Camila Bolaños- Representante Legal Cooprocor
Resumen:	Las asociaciones han avanzado en los planos y el presupuesto para las adecuaciones de infraestructura, los beneficiarios reitera el compromiso y solicitan un plazo adicional para completar con el 100% de las adecuaciones de infraestructura. Se evidencia la necesidad que el consorcio agroindustrial solicite una prórroga de la suspensión Nº 1 a la invertentoria; donde los beneficiarios proponen un plazo prudente hasta de dos (02) meses necesarios para completar los trabajos de adecuaciones
Compromisos:	Finalización de las adecuaciones pertinentes por parte de los beneficiarios Suscripción de la prórroga Nº 1 a la suspensión 1
Evidencias:	 

Comité Técnico Nº 9:

Fecha:	05 de septiembre de 2024, instalaciones de Cooprocor y Asonalca
Temas:	Comité de verificación de avance en adecuaciones eléctricas y locativas por parte de la interventoría
Asistentes:	Julie Pérez- Interventoría externa Joana Pinzón- Representante Legal Asonalca Camila Bolaños- Representante Legal Cooprocor
Resumen:	Se realiza la verificación de los avance y los compromisos pactados anteriormente donde la Cooperativa las Delicias enseña los avance adelantados en la parte de puntos eléctricos ; se proyecta un cronograma, de igual forma se plasma el cronograma de compromiso para cumplir en los tiempos pactados, tal como se evidencia en el acta de comité técnico N 9
Compromisos:	Finalización de las adecuaciones pertinentes entre el 09/09/2024 al 28/09/2024 para la cooperativa Cooprocor en Arauquita Finalización de las adecuaciones pertinentes entre el 09/09/2024 al 05/10/2024 para la Asociación Asonalca en Saravena
Evidencias:	 

INFORME DE INTERVENTORIA No. 3

Comité Técnico Nº 10:

Fecha:	01 de Octubre de 2024, instalaciones de Cooprocor y Asonalca
Temas:	Comité de verificación de avance en adecuaciones eléctricas y locativas
Asistentes:	Julie Pérez- Interventoría externa Yarle Cárdenas- Contratista Joana Pinzón- Representante Legal Asonalca Camila Bolaños- Representante Legal Cooprocor
Resumen:	El objetivo de la reunión es verificar los compromisos pactadas en el cual la Cooperativa Delicias, finaliza las adecuaciones eléctricas, la construcción de la caseta y la acomedida eléctrica para la planta. En la asociación Asonalca, se está realizando el encerramiento perimetral, evidenciando la disponibilidad de insumos y materiales para la construcción, así como el personal contratado (mano de obra) se indica que entre el 05 al 11 de octubre se espera completar todos los arreglos correspondientes.
Compromisos:	Suscripción del acta de reinicio de actividades Cumplimiento del cronograma de trabajo propuesto en el presente comité una vez reiniciada las actividades
Evidencias:	 

A continuación, se presenta los avances de las adecuaciones locativas de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro

Imagen: Adecuaciones locativas en la Asociación Asonalca en Saravena





Fuente: Propia

Esta interventoría ha realizado el seguimiento a cada ítem del contrato de la minuta, el cual aprueba el avance ejecutado acumulado del contrato principal del 87,08%.

4.5.2. AVANCE DE EJECUCIÓN DE INTERVENTORÍA

El avance de ejecución del contrato de interventoría No. 001 de 2024, se registra en la siguiente tabla "Avance de Ejecución Financiera", indica el (75%) de prestación de servicios, para un valor de CINCUENTA Y TRES MILLONES CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS M/L. ($ 53.014.500,00), correspondiente a la programación del gasto durante la ejecución del proyecto en función a la coordinación, fiscalización, supervisión y control a las actividades realizadas en el contrato de prestación de servicios No. 001 de 2024.

Tabla 69. Avance de ejecución financiera – Contrato de Interventoría No. 001 de 2024


1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)						
CARGO / OFICIO/PROFESIÓN	CANTIDAD	SALARIO MES	No. MESES	DEDICACIÓN	VALOR BÁSICO = (BxCxD)	VALOR PARCIAL =(G)
	A	B	C	D		G
PERSONAL PROFESIONAL						
PROFESIONAL CON TITULO DE PREGRADO EN EL ÁREA DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN O PRODUCCIÓN BIOTECNOLÓGICA CON POSGRADO. CON 80 MESES DE EXPERIENCIA O MAS COMO PROFESIONAL EN INTERVENTORÍA.	1	$4.000.000,0	3	100%	$12.000.000	$12.000.000
SUBTOTAL, COSTOS PROFESIONAL						$12.000.000
FACTOR MULTIPLICADOR						2,1
TOTAL, COSTOS PROFESIONAL						$25.200.000,0
2. OTROS COSTOS DIRECTOS (B)						
CONCEPTO	MES	VALOR MENSUAL	No. MESES	DEDICACIÓN	VALOR BASICO = (BxCxD)	VALOR PARCIAL =(G)
	A	B	C	D		G
COSTOS APOYO LOGÍSTICO Y TRANSPORTE						
APOYO DE UN TÉCNICO ADMINISTRATIVO	MES	$1.500.000,0	3	100%	$4.500.000	$ 4.500.000
APOYO LOGÍSTICO Y TRANSPORTE A MUNICIPIOS PARA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.	UNIDAD	$4.200.000,0	3	100%	$12.600.000	$12.600.000

COSTOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTACIÓN Y PAPELERÍA.						
ELABORACIÓN Y EDICIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN	UNIDAD	$ 750.000,00	3	100%	$2.250.000	$2.250.000
SUBTOTAL, OTROS COSTOS DIRECTOS=B						$19.350.000,0
SUBTOTAL (A+B)=C						$44.550.000,0
IVA 19%						$ 8.464.500,00
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA						$53.014.500,0

4.5.3. AVANCE FÍSICO

De acuerdo con los avances evidenciados, las cantidades ejecutadas del contrato y soportes presentados el avance físico del contrato de interventoría externa ejecutado por COAMDESOR equivale a un 75%.

Gráfica 3. Vr. Contractual vs Vr. Ejecutado – Contrato de Interventoría No. 001 de 2024

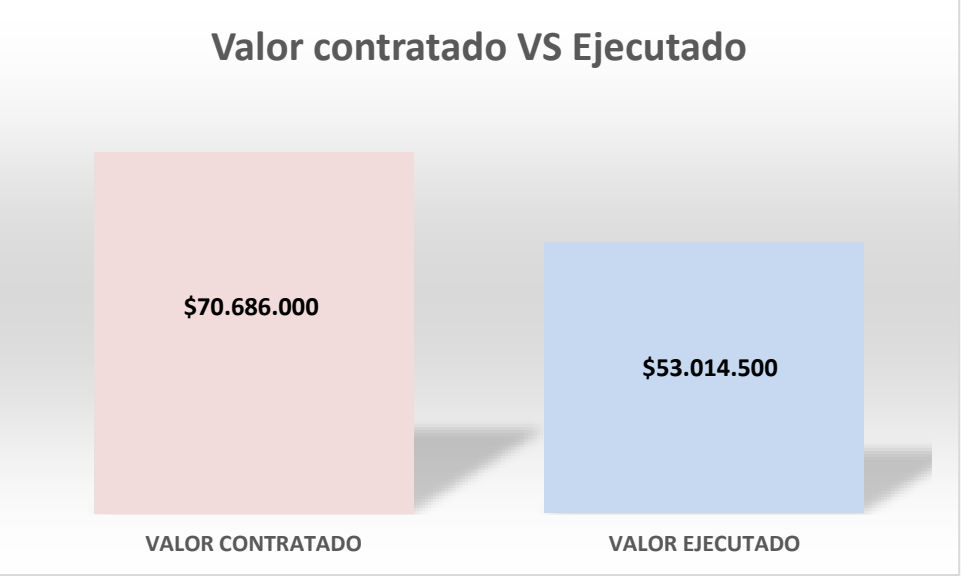

4.5.4. AVANCE DEL PLAZO CONTRACTUAL

Con respecto al plazo contractual, de los cuatro (04) meses establecidos en el contrato, ha transcurrido el 75% del plazo contractual.

Tabla 70. Porcentaje de avance del plazo contractual - Contrato de Interventoría No. 001 de 2024.

PLAZO CONTRACTUAL INICIAL	CUATRO (04) MESES
PLAZO EJECUTADO	TRES (03) MESES
PLAZO POR EJECUTAR	UN (01) MES
% PLAZO EJECUTADO	75%

4.5.5. AVANCE FINANCIERO

Teniendo en cuenta que el contratista de interventoría **COAMDESOR** no ha realizado cobro de actas parciales a la fecha, el avance financiero del contrato de interventoría No. 001 de 2024 es de un 50% equivalente al anticipo desembolsado.

4.6. ASPECTOS FINANCIEROS

El DEPARTAMENTO DE ARAUCA pagará el valor del contrato, previa presentación de la Orden de Pago debidamente soportada, así:

a) Hasta un NOVENTA (90%) del valor total del contrato, se pagará mediante presentación de Actas parciales, formuladas por el Contratista de acuerdo con las actividades ejecutadas y aceptadas por la Supervisión designado por el DEPARTAMENTO.

Los documentos para pago son los establecidos en la lista de chequeo para trámite de acta parcial aprobada por la oficina de calidad del Departamento de Arauca.

b) El pago del DIEZ (10%) restante del valor total se hará efectivo con la presentación del acta de recibo final y la suscripción del acta de liquidación del contrato y su correspondiente aprobación por parte del DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Para suscripción del acta de liquidación se requiere la presentación y aprobación por parte del supervisor y la gerencia de contratación de todos los documentos establecidos en la lista de chequeo para trámites de liquidación aprobada por la oficina de calidad del Departamento de Arauca.

MANEJO DEL ANTICIPO

4.6.1. MANEJO DEL ANTICIPO.

El Departamento de Arauca entregará hasta un CUARENTA por ciento (40%) del valor total del contrato, por concepto de Anticipo.

La iniciación de las labores o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditados en ningún caso, al giro del anticipo por parte del DEPARTAMENTO DE ARAUCA, el cual entenderá haber adjudicado al contrato a un proponente que ha acreditado tener la capacidad económica, financiera y técnica necesaria para ejecutarla cumplidamente.

Cuando el proceso o el contrato resultante del mismo sean diferentes a los casos establecidos en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, el manejo de los recursos entregados al contratista a título de anticipo, deberá realizarse en cuenta conjunta, a nombre del contrato suscrito. Estos recursos serán manejados entre el supervisor o interventor y el contratista. El contratista deberá abrir una cuenta corriente o de ahorros para este fin.

Para el cobro del anticipo el contratista deberá presentar la orden de iniciación, deberán estar satisfechos los requisitos de ejecución del contrato, deberá estar aprobada la garantía única de cumplimiento por el funcionario competente del DEPARTAMENTO DE ARAUCA y la solicitud de registro presupuestal.

Una vez constituida y aprobada la garantía única, el anticipo se entregará al contratista luego de la presentación por parte del mismo de los respectivos documentos.

Los rendimientos que llegaren a producir los recursos así entregados, pertenecerán al tesoro departamental. El contratista deberá presentar el plan de inversión del anticipo, para revisión y aprobación de la Entidad contratante. Los dineros del anticipo no podrán destinarse a fines distintos que los de ejecución de los trabajos y de los aquí contemplados.

Estos dineros tienen la condición de fondos públicos hasta el momento que sean amortizados mediante la ejecución de las actividades contratadas, momento hasta el cual su mal manejo, el cambio de destinación o su apropiación darán lugar a las responsabilidades penales correspondientes.

El supervisor del contrato verificará y dará el visto bueno de la relación de gastos, los cuales deben ser consistentes con el plan de inversión del anticipo aprobado. De encontrarse evidencia de uso indebido del anticipo, el supervisor del contrato remitirá la documentación soporte y solicitud debidamente motivada a Solicitando de manera expresa hacer efectiva la póliza de buen manejo del anticipo pactado en el contrato. Los rendimientos financieros que genere la cuenta abierta para tal fin, se consignaran a favor del DEPARTAMENTO DE ARAUCA, mediante coordinación con la tesorería departamental, previa certificación del banco.

Una vez ejecutado el monto total del anticipo, y el contratista haya entregado los informes requeridos para demostrar el buen manejo del mismo y las consignaciones de la totalidad de los rendimientos financieros ante la tesorería departamental, se procederá a la cancelación de la cuenta bancaria por parte del contratista, previo visto bueno del supervisor.

Es de resaltar, que la Administración Departamental no aceptara registros que tengas enmendaduras, que no sean legibles o sin firma de los responsables. Por lo que cada soporte en condiciones deficientes hará que no se proceda el pago respectivo.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 70.686.000,00
PORCENTAJE DEL ANTICIPO:	40%
VALOR DEL ANTICIPO:	$ 28.274.400,00

4.6.2. APERTURA DE CUENTA BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA:	BOGOTÁ
CUENTA DE AHORROS No.:	137530135
ESTADO DE LA CUENTA:	ACTIVA
VALOR DEL ANTICIPO:	$ 28.274.400,00

4.7. CONCLUSIONES

De acuerdo con la ejecución del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023 cuyo objeto es: "APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA" se puede resaltar lo siguiente:

- Se ha llevado a cabo estricto control, y seguimiento a cada una de las actividades que ha ido ejecutando el CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL, en cumplimiento de la ejecución del contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023.

- Producto de la ejecución de las actividades del contrato de Prestación de servicios, y de la determinación de cantidades ejecutadas por la interventoría, se puede aseverar que la fecha del presente informe el contratista ha tenido los siguientes rendimientos o avances en el proyecto:

Avance Técnico:	87,08%
Avance Financiero:	50%
Avance en tiempo - plazo:	75,00%

De acuerdo con las actividades efectuadas por COAMDESOR cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO "APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA", en la ejecución del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023, se puede concluir lo siguiente:

- La interventoría verificó que, dentro de los parámetros técnicos requeridos, el contratista cumpliera con las especificaciones técnicas generales del Contrato, garantizando así, la calidad del proyecto, producto del objeto contractual.

- De acuerdo con la prestación de servicios del Contrato de Interventoría No. 001 de 2024, se presentan los siguientes avances: Avance en tiempo (75%), Avance físico (75%) y avance financiero (50%).

5. ANEXOS

Anexo 1. Pólizas del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023
Anexo 2. Actos administrativos del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023
Anexo 3. Actas de comité
Anexo 4. Correspondencia enviada
Anexo 5. Correspondencia recibida
Anexo 6. Planillas de seguridad social del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023
Anexo 7. Informe del contratista.
Anexo 8. Informes de ejecución de los profesionales.
Anexo 9. Certificado de ingreso de rendimientos contrato No. 627 de 2023.
Anexo 10. Pólizas del Contrato de Interventoría No. 001 de 2024
Anexo 11. Actos administrativos del contrato de interventoría No. 001 de 2024
Anexo 12. Planillas de seguridad social del contrato de interventoría 001 de 2024

Aprobación del Informe:

Elaboró:

ZULAY NUÑEZ CABARCAS
Técnica – Especialista Interventoría
Apoyo de Interventoría

Revisó y Aprobó:

JULIE ANDREA PÉREZ VILLAMIL
Ingeniera de Producción
Profesional de Interventoría
Representante Legal COAMDESOR
