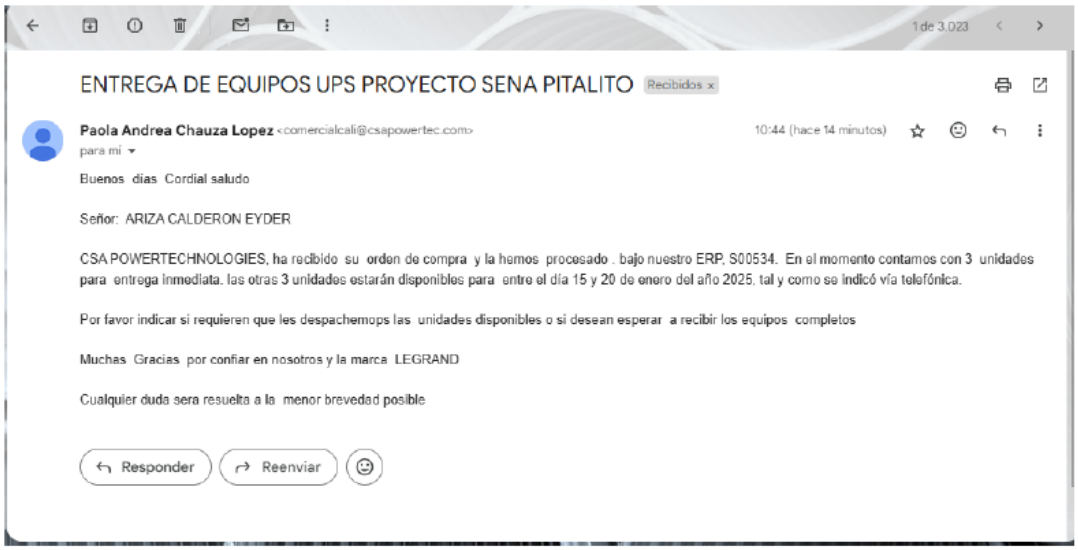
ACTA No. 001			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Solicitud de prorroga y adición de elementos al contrato número **CO1.PCCNTR .7119265** que tiene por objeto: "Contratar la Compraventa de equipos de telecomunicaciones y redes para modernización de ambientes del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano".			
CIUDAD Y FECHA:	Pitalito, 24 de diciembre del 2024	**HORA INICIO:** 08:00 a.m.	**HORA FIN:** 10:00 a.m.
LUGAR Y/O ENLACE:	Sala de instructores SENA – Sede Comercio y servicios	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano Regional Huila	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Verificación del aumento del presupuesto al contrato CO1.PCCNTR .7119265 2. Justificación de los elementos por adicionar. 3. Listar los elementos requeridos por adicionar. 4. Verificación de la solicitud de prorroga en tiempo al contrato CO1.PCCNTR .7119265 5. Justificación con base en lo soportado por el contratista para la prórroga en tiempo.			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Adicionar elementos al proceso de compra, instalación y configuración que tiene por objeto: Contratar la Compraventa de equipos de telecomunicaciones y redes para modernización de ambientes del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, como también determinar el estado actual del contrato, frente al proceso de compra de los elementos como del proceso de importación para cumplir en las fechas establecidas y la posibilidad de prorrogar según las dificultades expuestas por el contratista.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			

Se reúnen el supervisor del contrato Alexander Chaux Nieto, el apoyo en la supervisión Marcos Ramos Martínez y el contratista Eyder Ariza Calderón del contrato **CO1.PCCNTR .7119265**, para revisar el contrato cuyo objeto es: "Contratar la Compraventa de equipos de telecomunicaciones y redes para modernización de ambientes del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano".

El día 20 de diciembre de 2024 se recibe por parte del contratista un correo donde anexa un documento en PDF, solicitando de manera formal prorroga en tiempo en 60 días calendario al contrato **CO1.PCCNTR .7119265,** donde el ítem 6 Transceiver Module de 10GBASE, fecha probable de entrega está para el 7 de enero 2025 y el ítem 8 (UPS LEGRAND DAKER), el distribuidor directo de este producto en Colombia tiene para entrega inmediata 3 productos, para las otras UPS faltantes estaría para el 20 de enero de 2025 (anexa pantallazo correo).



ENTREGA DE EQUIPOS UPS PROYECTO SENA PITALITO Recibidos x

Paola Andrea Chauza Lopez <comercialcali@csapowertec.com> 10:44 (hace 14 minutos)
para mí

Buenos dias Cordial saludo

Señor: ARIZA CALDERON EYDER

CSA POWERTECHNOLOGIES, ha recibido su orden de compra y la hemos procesado . bajo nuestro ERP, S00534. En el momento contamos con 3 unidades para entrega Inmediata. las otras 3 unidades estarán disponibles para entre el día 15 y 20 de enero del año 2025, tal y como se indicó vía telefónica.

Por favor indicar si requieren que les despachemops las unidades disponibles o si desean esperar a recibir los equipos completos

Muchas Gracias por confiar en nosotros y la marca LEGRAND

Cualquier duda sera resuelta a la menor brevedad posible

Responder Reenviar



Detalles del Pedido

Estado: Para enviar

Este pedido se enviará en **11 días**. Si se retrasa el envío, se emitirá tu reembolso automáticamente.

Tienda oficial keepLiNK

Fecha de entrega estimada: 29 dic, 2024-7 ene, 2025

KeepLink-módulo transceptor óptico SFP + 10GBASE-...
KP-XM2D-85-LC03
COP159.673,54 x6

Añadir a la cesta

Subtotal COP958.041,24

Se le envía un correo al contratista indicándole que si es posible tener un documento del proceso de compra de los elementos del contrato. El día 23 de diciembre se recibe respuesta por parte del contratista donde adjunta una cotización realizada con número No**. OF-2024-BIB0-1218-24.** El contratista indica que el inconveniente está en los elementos ítem 6 e ítem 8 por el proceso de importación, los otros elementos del contrato se consiguen en Colombia.

Se aclara que el contrato tiene un componente de instalación, configuración y capacitación, se analiza junto con el contratista y el apoyo a la supervisión una de las obligaciones que dice:

Elaborar juntamente con el Supervisor del Contrato asignado por el SENA el cronograma de trabajo para coordinar las fechas de entrega de los equipos, instalación y configuración de estos en el Centro en el horario requerido según la necesidad.

Con base en el anterior párrafo se tiene que este proceso de instalación puede tomar varios días debido a que el SENA cuenta con 2 MDF y 6 IDF donde se deben instalar los siwtch, y router, sin contar con la instalación de los 17 AP indoor y 6 AP outdoor en sitio, dispositivos que deben quedar configurados e instalados según la necesidad de seguridad, transmisión exigida por el SENA y con la capacitación de los equipos activos de red por parte del contratista.

El otro aspecto que se analiza es la adición al contrato **CO1.PCCNTR .7119265**, tomando en cuenta el **CDP 12524**, con un valor de $ 130.000.000, de cuyo proceso de selección en la etapa precontractual fue adjudicado $113.532.600, quedando un excedente de $16.467.400, el cual se destinará a la compraventa de equipos de telecomunicaciones y redes para modernización de ambientes del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano.

Para dar cumplimiento a los objetivos de la modernización de ambientes de formación, que conlleven al continuo mejoramiento de la formación profesional integral del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, se requiere adquirir herramientas y equipos adicionales esenciales que permitan el desarrollo de actividades en función con la misión institucional.

Los equipos tecnológicos por adquirir resultan cruciales para la modernización de ambientes de formación y el desarrollo de las prácticas de formación en los diversos programas que se ofrecen en nuestro centro.

De acuerdo con lo anterior, se requiere de la adición de los siguientes elementos al contrato CO1.PCCNTR .7119265:

Ref. Articulo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario Estudio de mercado	Precio unitario proponente	Precio Total Proponente
1	43223100	Switch PoE Administrable en la Nube de Capa 2 Gigabit de 52 puertos, 48 puertos Gigabit PoE+ y 4 SFP, 370W - Garantía de 3 años. El equipo se debe entregar instalado y configurado El equipo se debe entregar instalado y configurado y 2 horas de capacitación	2	Unidad	4.847.078	3.847.000	7.694.000

6	43223100	Transceiver Module de 10GBASE- SR SFP+ 850-nm 300-m DOM Duplex LC MMF Optical - IEEE 10GBASE- SR se debe entregar instalado	2	Unidad	962.238	800.000	1.600.000
3	43223100	Acces Point Wi-Fi 6 para Interior, se Instala en Techo o Pared, hasta 512 Usuarios y 1.7 Gbps, Doble Banda 802.11ax MU-MIMO 2x2 - Garantía de 3 años. El equipo se debe entregar instalado y configurado El equipo se debe entregar instalado y configurado y 2 horas de capacitación	3	Unidad	957.614	820.600	2.461.800
4	43223100	Acces Point Wi-Fi 6 para exterior 360°, IP 68, doble banda 802.11ac wave2, 1267 Mbps, 2 puertos GE, hasta 512 usuarios, Garantía de 3 años. El equipo se debe entregar instalado y configurado El equipo se debe entregar instalado y configurado y 2 horas de capacitación	1	Unidad	865.100	805.000	805.000
7	43223100	CABLE CATEGORIA 5E PREMIUM, DE EXTERIORES U/UTP 100MHZ 1G, 24AWG, COLOR NEGRO DOBLE CHAQUETA PROTECCIÓN UV CAJA X 305 METROS 100% COBRE - NO ALEACIONES	1	Unidad	3.111.500	3.000.000	3.000.000
10	43223100	Conector RJ-45 Categoría 6	86	Unidad	9.750	9.000	774.000
						TOTAL >>>	**16.334.800**

Total, del contrato = Valor inicial + Valor adición = $ 113.532.600 + $ 16.334,800 = $ 129.867.400

CONCLUSIONES

1.- La disponibilidad presupuestaria del del CDP del contrato CO1.PCCNTR .7119265 es de $16.467.400 m/cte.

2.- Es necesario ejecutar el excedente disponible de $16.467.400 m/cte. para la adquisición de equipos de telecomunicaciones y redes para modernización de ambientes del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano.

3.- El valor total del contrato con la adición queda en la suma de $129.867.400 m/cte.

4.- El supervisor del contrato avala la adición y solicita al ordenador del gasto su proporcionaba.



5. El contratista está de acuerdo la adición.

6.- Se evidencia que el contratista ha realizado la compra de los elementos del contrato y está a la espera que se abra el proceso de logística a nivel internacional.

7.- Es necesario extender el tiempo del contrato por 60 días calendario para la entrega integral de los elementos en cuanto a instalación, configuración y capacitación del personal seleccionado.

8.- Se justifica la solicitud realizada por parte del contratista y el supervisor del contrato ve muy viable esta solicitud por la justificación que expone y los documentos que anexa a este proceso.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS			
ACTIVIDAD /DECISIÓN	**FECHA**	**RESPONSABLES**	**FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL**
Enviar Acta de solicitud de prorroga y adición al contrato ***CO1.PCCNTR .7119265***	24 de diciembre del 2024	Supervisor del contrato Alexander Chaux Nieto	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES				
NOMBRE	**DEPENDENCIA/ EMPRESA**	**APRUEBA (SI/NO)**	**OBSERVACIÓN**	**FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL**
Alexander Chaux Nieto	Supervisor del contrato / SENA	SI		
Marcos Ramos Martínez	Apoyo a la gestión / SENA	SI		
Eyder Ariza Calderón	EAC Soluciones Informáticas	SI		
De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.				
ANEXOS Documentos enviados por el contratista				

Santiago de Cali, 18 de diciembre de 2024

Señores:
AYC SOLUCIONES INFORMATICAS
Atn. Ing. EYDER ARIZA
COLOMBIA

REF. Cotización No. OF-2024-BIB0-1218-24

Cordial Saludo:

En atención a la gentil solicitud realizada, de acuerdo al cuadro enviado para los equipos que serán implantados en la regional del Sena en Pitalito Huila para la adecuación de la red de datos , **BIBO SOLUTIONS S.A.S.** presenta su propuesta técnico-económica**.**

BIBO SOLUTIONS S.A.S. Diseña soluciones a la medida brindando las herramientas necesarias para satisfacer las necesidades Tecnológicas con la mejor tecnología de punta para el procesamiento de datos, virtualización, elementos de transmisión de Voz, Datos y Video, telefonía IP, Infraestructura de cableado, ajustándose ante todo con excelencia calidad y buen servicio.

Esperamos tener el gusto de atenderlo e incluirlo dentro de nuestro selecto grupo de clientes.

Cordialmente,

ENRIQUE GORDILLO A.
CTO
BIBO SOLUTIONS S.A.S
Tel: (572) 6666884 - Móvil: 300-6519882
Skype:gordilloe
Carrera 39 No 14 C-33 4
Cali, Colombia

1. PROPUESTA ECONÓMICA.

ITEM	MARCA	DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS	CANT.	VALOR TOT
1	RUJIIE	Switch PoE Administrable en la Nube de Capa 2 Gigabit de 52 puertos, 48 puertos Gigabit PoE+ y 4 SFP, 370W - Garabtia de 3 años	6	$ 16.341.176
2	RUJIIE	Router de alto rendimiento con gestión en la nube - 3 10/100/1000 Base-T 3 10/100/1000/2500 Base-T 2 SFP de 10 G/1 G Base-X (puerto LAN7/WAN8 compatible con 2,5 G) -Cliente PPPoE, cliente DHCP, IP estática, compatibilidad total con IPv4 e IPv6 -Bloqueo de aplicaciones (política basada en el tiempo/basada enla IP/basada en usuarios)Filtrado de sitios web (política basada en el tiempo / IP/basada en usuarios) - Garantia de 3 años	2	$ 4.028.235
3	RUJIIE	Acceso Wi-Fi 6 para Interior, se Instala en Techo o Pared, hasta 512 Usuarios y 1.7 Gbps, Doble Banda 802.11ax MU-MIMO 2x2 - Garantia de 3 años	14	$ 8.493.333
4	RUJIIE	Punto de acceso Wi-Fi 6 para exterior 360°, IP 68, doble banda 802.11ac wave2, 1267 Mbps, 2 puertos GE, hasta 110 usuarios,	5	$ 4.888.235
5	RUJIIE	10GBASE-SR SFP+ 850-nm 300-m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module - IEEE 10GBASE-SR	6	$ 1.860.000
6	SER-PROF	Configuaicion Basica de 27 equipos Routers, WI-FI - incluye maximo 3 vlan enrutadas, actualizaciones de firnmware, enrolamiento de administracion en cloud, enrutamiento hasta dos service provider - Garantia de Post instaalcion de 20 dias remoto	1	$ 13.764.433
7	SER-PROF	Capacitaciòn de equipos configurados un dia para las tecnologias de routing, switching y WI.FI	1	$ 4.432.990
				$ 53.808.403
				$ 10.223.597
				$ 64.032.000

2. CONDICIONES COMERCIALES:

- Oferta válida por 15 días calendario.
- La forma de Pago para los equipos : Contado
- La forma de pago para la instalación documentación y capacitaciones de: 50% de anticipo y 50% al finalizar
- Se deberá emitir una orden de compra a nombre de BIBO SOLUTIONS S.A.S., NIT. 900858550-7.
- Cualquier cambio de especificaciones técnicas y alcance a la presente oferta por parte del cliente, implicará la revocación de esta oferta y, en consecuencia, los precios y demás condiciones deberán ser plasmados en una nueva oferta.
- Termino de entrega 5 días **SALVO PREVIA VENTA** con orden de compra y pago de los equipos
- Cualquier cambio en la presente propuesta puede variar los valores estipulados.
- Cuenta de ahorros a nombre de **BIBO SOLUTIONS SAS No- 83645289326**
