	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/12/2024 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☑ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 3883-2023 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: ANILIO ABADIA SERNA (Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA LA SANCHEZ – GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3920-2023 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: NICOLÁS RAFAEL REDONDO MOLINA

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: Hasta el 31 de diciembre del 2023 (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/12/2023 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A		

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
Prórroga uno (1) 2023	29/12/2023	1/01/2024	15/07/2024
Prórroga dos (2) 2023	19/07/2024	22/07/2024	31/08/2024
Prórroga trés (3) 2024	1/11/2024	1/11/2024	15/12/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
Suspensión No.1		12/07/2024	12/07/2024	18/07/2024	19/07/2024
Suspensión No.2		30/08/2024	30/08/2024	29/09/2024	30/09/2024
	1	30/09/2024	30/09/2024	14/10/2024	15/10/2024
Suspensión No.3		16/10/2024	16/10/2024	31/10/2024	1/11/2024
Suspensión No.4		12/12/2024	12/12/2024	25/12/2024	26/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/12/2024
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 1.486.393.548,00 **50% EN SMMLV:** $ 640,69
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
N/A			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.486.393.548,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Para alcanzar completamente los objetivos físicos propuestos y garantizar que las obras a realizar brinden un servicio óptimo a la comunidad, se requiere prorrogar hasta el 28 de febrero de 2025 y sustitución presupuestal por valor de $ 350,000,000, amparado con el CDP No. 212524 de fecha 11 de diciembre de 2024, del contrato de obra No. 3883 del 2023, conforme a lo expuesto por el contratista ANILIO ABADIA SERNA y la Interventoría NICOLÁS RAFAEL REDONDO MOLINA, quienes respaldan la petición de extensión, de acuerdo a lo expresado en los comunicado RD 115 del 13 de diciembre de 2024 del contratista y el comunicado **INTER CHOCÓ 214-2024** deL 13 de diciembre de la interventoría, presentando el siguiente requerimiento bajo las siguientes justificaciones:

Solicitud de prorroga al contrato No. 3883 de 2023:
Los recientes episodios de lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos de tierra han causado un severo efecto en la región del Chocó, especialmente en la zona cercana al lugar de trabajo en el municipio del Carmen de Atrato. Las precipitaciones constantes han saturado el suelo y han incrementado significativamente el peligro de deslizamientos,lo que no solo dificulta las labores de construcción de las obras programadas, sino que también pone en riesgo la seguridad de los trabajadores.

Los impactos de la ola invernal han causado que las principales rutas de acceso al lugar de la obra se encuentren inaccesibles en diversas áreas, impactando seriamente la logística del proyecto. El cierre de estos caminos ha obstaculizado el traslado de materiales, maquinaria de gran tamaño y personal, provocando la interrupción de las actividades por varios días. Pese a los intentos de coordinar con las autoridades locales y restablecer el acceso, las condiciones meteorológicas desfavorables continúan obstaculizando la circulación.

Debido a las razones previamente expuestas, no es posible dar cumplimiento con la ejecución de obras al 100% durante el plazo actual del contrato. Por lo tanto, se pide extender el contrato hasta el 28 defebrero de 2025, periodo requerido para alcanzar la meta física del proyecto.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 13/12/2024

(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☑ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA No. 3883 de 2023

Contrato de Obra: 3883-2023
Objeto: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA SANCHEZ – GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.
Contratista de obra: ANILIO ABADIA SERNA
Municipio de Carmen de Atrato
Vía: La Sánchez – Guaduas con Código Invias 44449
Fecha de inicio: 15/12/2023
Ejecutado:76,40% Programado:100%
Estado actual: Suspendido
Fecha de Terminación Inicial: 31/12/2023
Fecha de Terminación Actual: Hasta el 15 de noviembre de 2024
Suspensión #1: del 12 de julio al 18 de julio de 2024
Fecha de reinicio #1: 19 de julio de 2024.
Fecha de Terminación Actual: Hasta el 31 de agosto de 2024
Suspensión #2: del 30 de agosto al 29 de septiembre de 2024
Fecha de reinicio #2: 30 de septiembre de 2024.
Ampliación a la suspensión #2: 30 de septiembre
Fecha de reinicio: 15 de octubre de 2024.
Suspensión #3: del 16 de octubre al 31 de octubre de 2024
Fecha de reinicio: 1 de noviembre de 2024
Suspensión #4: del 12 de diciembre al 25 de diciembre de 2024
Fecha de Terminación Actual: Hasta el 29 de diciembre de 2024

A la fecha el contratista de obra (ANILIO ABADIA SERNA) se encuentran pendientes la terminación de las siguientes actividades:

ESTADO DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 3883 DE 2023			
LOCALIZACIÓN	**TIPO DE OBRA**	**TERMINADO O EN EJECUCIÓN**	**ACTIVIDAD**
Km 2 +342	MURO CONCRETOREFORZADO	TERMINADO	
Km 2 +775	MURO CONCRETOREFORZADO	TERMINADO	
Km 3+137	MURO CONCRETO + BOXCOULVERT	TERMINADO	
K5+473	BOX COULVERT	EN EJECUCION	Desencofrado mitad Box Coulvert- SE REALIZA EL RELLENO DEL BOX COULVERT.
K5+915	MURO CONTENCION+ALCANTARILLA	EN EJECUCION	Instalación de materia filtrante para muro de contencion. RELLENO PARA MURO DE CONTENCION E INSTALACION DE 4 TUBOS D=36". Falta TERMINAR DE construir alcantarilla D=36".
Km 6+036		TERMINADA	
Km 7+795.	MURO ACOMPAÑAMIENTO+ ALCANTARILLA	EN EJECUCION	Fundida caja alcantarilla D=36". Terminado muro de contención de acompañamiento,se realiza una placa para evacuar el agua.
Km 17+918	BOX COULVERT	TERMINADO	
Km 17+436	BOX COULVERT	EN EJECUCION	Presenta relleno de la margen derecha y excavación de la margen izquierda.
Km 15+500	ALCANTARILLA	TERMINADA	
Km 5+411	MURO DE CONTENCION	EN EJECUCION	Se realiza el encofrado del vastago del muro, luego se realiza la Fundida para vástago del muro y desencofrado, se realiza colocacion De geotextil y material filtrante, se realiza el relleno del muro.
Km 12+239	BATEA Y MURO DE ACOMPAÑAMIENTO	TERMINADA	
Km 16+744	ALCANTARILLA	TERMINADA	
Km 15+579	ALCANTARILLA	TERMINADA	
Km 15+885	ALCANTARILLA	TERMINADA	
Km 15+952	ALCANTARILLA	TERMINADA	

Por lo tanto se presenta Cronograma de Actividades para el plazo solicitado,



A continuación se presenta el resumen finaciero concerniente a la ejecución de obras

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA						
ACTA PARCIAL DE OBRA No.	**MES**	**No. DE RADICACIÓN Y FECHA**	**VALOR BASICO**	**VALOR IVA**	**VALOR TOTAL**	**AMORTIZACIÓN ANTICIPO**
1	dic-23		0	0	0	0
2	ene-24		0	0	0	0
3	feb-24		0	0	0	0
4	mar-24		0	0	0	0
5	abr-24	15936 del 16/11/2024	97.406.588,00	711.817,33	98.118.405,33	39.247.362,00
6	may-24	15937 del 16/11/2024	65.072.591,00	475.530,48	65.548.121,48	26.219.248,00
7	jun-24	15996 del 16/11/2024	416.485.217,00	3.043.545,78	419.528.762,78	209.764.382,00
8	jul-24	16010 del 16/11/2024	267.996.345,00	1.958.215,60	269.954.560,60	175.450.966,00
9	ago-24	16010 del 16/11/2024	279.476.101,00	2.955.786,89	282.431.887,89	169.318.042,00
TOTAL			**1.126.436.842,00**	**9.144.896,08**	**1.135.581.738,08**	**620.000.000,00**

En virtud de lo anterior, y considerando que el contrato en mención se encuentra con actividades constructivas pendientes para cumplir con su objeto, resulta indispensable proceder con una prórroga de este hasta el 28 de febrero de 2025, con el fin de permitir la culminación de las obras.

Es importante destacar que el contrato en cuestión cuenta con recursos de reserva presupuestal, los cuales deben ser utilizados de manera eficiente y oportuna para garantizar la culminación satisfactoria de las actividades programadas. En este sentido, y dado que las obras pendientes son de suma relevancia para el cumplimiento íntegro del objeto contractual, se hace necesario sustituir el valor de 350.000.000,00 que permita cubrir el valor de los trabajos pendientes de ejecución.

Para este fin, es preciso realizar la sustitución de recursos presupuestales, por valor de $350.000.000,00 para asegurar la disponibilidad financiera necesaria para la ejecución de las actividades pendientes. Dicho valor se encuentra respaldado por el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal número 212524 de fecha 11 de diciembre de 2024, el cual garantiza que la cantidad solicitada está debidamente autorizada y disponible dentro del marco presupuestal aprobado.

Por lo tanto, con el fin de dar cumplimiento total al objeto del contrato, se solicita formalmente la sustitución de estos recursos, así como la prórroga mencionada, asegurando de este modo la continuidad del proyecto sin interrupciones y garantizando la correcta ejecución de las obras comprometidas.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/12/2024 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☑ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Con la presente prórroga y sustitución se desarrollarán todas las actividades concernientes a la ejecución del contrato de obra 3883-2023 en el municipio de Carmen de Atrato, con el fin de continuar con las obras en sus aspectos técnicos y administrativos y en todos sus componentes físicos y financieros. Por lo que se solicita una prórroga hasta el 28 de febrero de 2025 y sustitución, el cual mantendrá las condiciones contractuales pactadas con el fin de garantizar la debida ejecución de la obra y cumplir con las metas físicas inicialmente programadas, para el frente de trabajo en el municipio de Carmen de Atrato en el Departamento de Chocó.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		**Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____**	**Valor solicitado**	**Valor actualizado presente solicitud**
Descripción	**Valor inicial**			
EXPLANACIONES	$ 7.526.511,00	$ -	**$ -**	**$ 7.526.511,00**
AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES	$ 119.397.348,00		**$ -**	**$ 119.397.348,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJE	$ 1.139.364.776,00		**$ -**	**$ 1.139.364.776,00**
TOTAL BASICO DE OBRAS (A)	**$ 1.266.288.635,00**	$ -	**$ -**	**$ 1.266.288.635,00**
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 88.304.295,00	$ -	**$ 34.296.127,00**	**$ 122.600.422,00**
SUB TOTAL OBRAS (C) = A+B	**$ 1.354.592.930**	$ -	**$ 34.296.127,00**	**$ 1.388.889.057,00**
PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)	$ 70.886.897,00	$ -	**$ -**	**$ 70.886.897,00**
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E)	$ 2.000.000,00	$ -	**$ (2.000.000,00)**	**$ -**
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E	**$ 1.427.479.827,00**	$ -	**$ 32.296.127,00**	**$ 1.459.775.954,00**
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)	$ 10.431.583,00	$ -	**$ 236.011,00**	**$ 10.667.594,00**
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G	**$ 1.437.911.410,00**	$ -	**$ 32.532.138,00**	**$ 1.470.443.548,00**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (I)	$ 5.000.000,00	$ -	**$ -**	**$ 5.000.000,00**
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (J)	$ 950.000,00	$ -	**$ -**	**$ 950.000,00**
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (K) = I + J	**$ 5.950.000,00**	$ -	**$ -**	**$ 5.950.000,00**
GESTIÓN SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (L)	$ 42.532.138,00	$ -	**$ (32.532.138,00)**	**$ 10.000.000,00**
VALOR TOTAL = H + K + L	$ 1.486.393.548			**$ 1.486.393.548,00**
Valor Total	**$ 1.486.393.548**		**$ -**	**$ 1.486.393.548,00**

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de Agosto (mes anterior a la presente solicitud) de 2024 (año) la obra presenta un avance físico ejecutado del 76,40% (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)
contra el avance programado del 100%.
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: $ 1.486.393.548,00
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Ejecutada acumulada: $ 1.135.551.738
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ 1.135.551.738
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: $ 620.000.000,00 (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ 620.000.000 (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: Noviembre (mes anterior a la presente solicitud) de 2024 (año) $ 1.135.551.738

Último mes facturado: AGOSTO 2024 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 350.841.810
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

No se ha dado inicio a proceso de sanciones.

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

Se considera viable la solicitud de prórroga del contrato, hasta el 28 de febrero de 2025 y sustitución por valor de $ 350,000,000, con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual del contrato de obra No. 3883 de 2023. Por lo anterior se solicita ampliar el plazo vigente del contrato y con ello garantizar la ejecución a satisfacción de las obras,

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/12/2024
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☑ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

TÉCNICA:

Se considera viable la solicitud de Prórroga del contrato de obra 3883 de 2023 hasta el 28 de febrero de 2025, toda vez que el plazo contractual vigente es insuficiente para ejecutar la construcción de las obras de mejoramiento y mantenimiento, así como la modificación del parágrafo en la CLAUSULA SEPTIMA: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL mediante la sustitución de recursos de reserva presupuestal por valor de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 350.000.000).

Lo anterior con la finalidad de garantizar la ejecución de las obras del contrato de obra que corresponden a la construcción estructuras hidráulicas y de contención en los sitios críticos del corredor vial municipio de Carmen de Atrato.

JURÍDICA:

Se considera viable jurídicamente la presente prórroga y modificación, con fundamento en el estatuto general de contratación de la administración pública.

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

La presente solicitud de Prórroga y modificación no requieren recursos adicionales.

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

A la fecha del registro presupuestal 1195523 de fecha 24-10-2023 del contrato de obra se encuentran comprometidos $ 1.486.393.548,00, de los cuales se ha girado el anticipo por valor de $ 620.000.000,00 y se encuentran en cuentas por pagar las actas parciales 5 a 9 que ascienden a un valor acumulado de $ 1.135.551.738,08. Por lo anterior se pretende sustituir por el valor de $ 350.000.000, una vez se apruebe la modificación de la CLAUSULA SEPTIMA: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL. Cabe aclarar que el trámite de sustitución solicitado se encuentra respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 212524 del 12 de diciembre de 2024.

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)

N/A

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)

N/A

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)

Oficio RD. 115 del 13 de diciembre de 2024, presentado por el Contratista ANILIO ABADIA SERNA solicitando prórroga hasta el 28 de febrero de 2025 y sustitución de recursos
Oficios INTER CHOCO-2014-2024 de fecha 13 de diciembre de 2024. avalando la solicitud de prorroga y sustitución,

Notas:

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.

2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.

3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.

4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma
Nombre:ANILIO ABADIA SERNA
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.:25202-26068 CND

Firma
Nombre:NICOLAS RAFAEL REDONDO MOLINA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.:08202-09853 ATL

Vo.Bo.Firma
Nombre:JANNIER SALAS QUEJADA
Supervisor del Contrato de Interventoría

Vo.Bo.Firma
Nombre:JANNIER SALAS QUEJADA
Director Territorial (E)

Vo.Bo.Firma
Nombre:CARLOS ERNESTO PARRA ACOSTA
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: ANGIE LIZETH SEPULVEDA
Abogado Unidad Ejecutora

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

ACEVEDO
CASTRO
OSCAR
RODOLFO

Firma
Nombre:OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:25202-59853 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

13 de diciembre del 2024

RD. 115

Ingeniero:
NICOLAS REDONDO MOLINA
Director de Interventoría
nicolasredondom@live.com
Valledupar

REF.: Contrato 3883 de 2023 cuyo objeto es "Mantenimiento y Mejoramiento de la vía terciaria la Sánchez- Guaduas código INVIAS 44449 en el Municipio del Carmen de Atrato Departamento del Chocó.

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA N°4 Y SUSTITUCION DE RECURSOS DEL

CONTRATO DE OBRA 3883.

Cordial saludo,

En atención a nuestras responsabilidades contractuales y el adecuado seguimiento y cumplimiento del objeto principal, derivados del contrato No. 3883-2023, protegido por la Ley 80 de 1993 y el Decreto reglamentario 1082 de 2015, me dirijo a usted con el propósito de pedir una prórroga hasta el 28 de febrero de 2025 y sustitucion de recursos por valor de $ 350.000.000, considerando las siguientes circunstancias:

1. **ANTECEDENTES DEL PROYECTO**

- Prórroga 1: Hasta el 15 de julio de 2024.

Causas: darle cumplimiento al objeto contractual del contrato.

- Suspensión 1: Desde el 12 de julio hasta el 18 de julio de 2024.
- Prórroga 2: Hasta el 31 de agosto de 2024. Causas: Fuertes lluvias y deslizamientos

en la región, generando retrasos en las obras.

- Suspensión 2: Desde el 30 de agosto hasta el 29 de septiembre de 2024. Causas**:** Los cambios climáticos representados en fuertes lluvias localizadas en la zona del proyecto, estas no han permitido el normal desarrollo de ejecución de las obras.
- Ampliación 1 a la suspensión 2: Desde el 30 de septiembre hasta el 14 de octubre de 2024. Causas: persistencia de las condiciones climáticas adversas que motivaron la suspensión inicial, siendo necesario extender este periodo para garantizar la adecuada preservación de los recursos asignados al contrato.

- Suspensión 3: Desde el 16 de octubre hasta el 31 de octubre de 2024. Causas: los cambios climáticos representados en fuertes lluvias localizadas en la zona del proyecto, no han permitido el normal desarrollo de ejecución de las obras, originando la suspensión de las actividades durante periodos prolongados las cuales ha afectado el rendimiento de la ejecución de los cronogramas establecidos para su correcto y normal desarrollo programado de la obra.

- Prórroga 3: Hasta el 15 de diciembre de 2024. Causas: alto impacto de las lluvias prolongadas en la región, se vio afectada la capacidad para llevar a cabo los trabajos de manera adecuada y conforme a los plazos estipulados.

- Suspensión 4: Desde el 10 de diciembre hasta el 25 de diciembre de 2024. Causas: Desde el inicio de las lluvias intensas, la región se ha visto amenazada por deslizamientos e inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Atrato y otros afluentes, evitando el desplazamiento de equipos, personal técnico, escases de materiales y dificultades en el traslado de estos a la zona del proyecto. Todas estas situaciones originan la suspensión de las actividades durante periodos prolongados las cuales ha afectado el rendimiento de la ejecución de los cronogramas establecidos para el correcto y normal desarrollo de las obras.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA.

Cierre de vías principales de acceso.

Durante el periodo de construcción la ola invernal ha impactado significativamente la región, todos esto ha generado que las vías de acceso a la obra sufran frecuentes cierres debido a los múltiples deslizamientos, dificultando el desplazamiento libre de vehículos y personas, afectando la logística del proyecto, especialmente en el transporte de materiales y la llegada de los trabajadores al lugar de trabajo.

La ola invernal ha interrumpido las rutas de distribución de materiales esenciales, como agregados, cemento y otros insumos necesarios para las obras de la vía terciaria. Debido a los bloqueos de carreteras, desbordamientos del río Atrato y otros afluentes, los proveedores no han logrado suministrar los materiales en el plazo previsto ni en las cantidades requeridas.

La escases de materiales ha retrasado considerablemente el progreso de los trabajos en el proyecto.

Impactos en el cronograma de trabajo.

La repercusión de la ola invernal en el cronograma de actividades previsto para la culminación del de las obras, se ha visto afectado por eventos inesperados, generando retrasos significativos, aumentando los riesgos para la seguridad del personal y dificultan la ejecución de la meta física del proyecto.

2. SOLICITUD.

En virtud de lo anterior, solicitamos una prórroga hasta el 28 de febrero del 2025 y sustitucion de recursos, con el fin de finalizar las obras conforme a los términos del contr ato, asegurando la seguridad de las estructuras en construcción y la seguridad de los trabajadores.

Esta extensión permitirá cumplir con los compromisos contractuales, una vez las condiciones climáticas y de acceso hayan mejorado.

Reiteramos nuestro compromiso con la realización de las obras en el camino terciario de Sánchez- Guaduas. Pese a que los fenómenos climáticos han alterado el progreso de estas, seguiremos trabajando para cumplir con los objetivos establecidos en el contrato, garantizando siempre niveles de calidad y protección.

Como soporte de la presente solicitud se adjunta:

- Boletín de condiciones Hidrometeorológicas (IDEAM) del presente año.

Agradezco su amable atención al presente comunicado quedando en espera a su pronta respuesta a la solicitud.

Atentamente,


ANILIO ABADIA SERNA
CONTRATISTA

Boletín de Condiciones Hidrometeorológicas Actuales, Alertas y Pronósticos (BCH)

Área Hidrográfica del Caribe

IDEAM

Actualización: 19 de noviembre de 2024 00:00 HLC

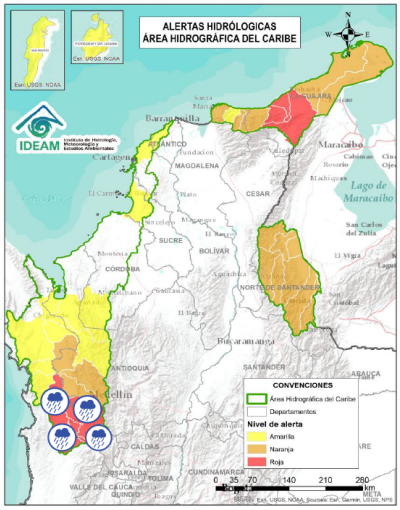


Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Atrato - Darién	Cuenca alta del río Atrato	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca alta del río Atrato y sus afluentes. Se recomienda especial atención en los municipios de El Carmen de Atrato, Lloró, Bagadó, Cértegui, Quibdó y Unión Panamericana (Animas). **Nota:** Se reportan inundaciones en el municipio de El Carmen – Chocó (08/11/2024).
⚠	Atrato - Darién	Cuenca del río Andágueda	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Andágueda y sus aportantes. Se recomienda especial atención en los municipios de Bagadó y Cértegui (Chocó). **Nota**: Se reportaron desbordamiento de ríos en el municipio de Lloró (Chocó) (09/11/2024).
⚠	Atrato - Darién	Cuenca del río Quito	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Quito. Especial atención en los municipios de Cantón de San Pablo, Unión Panamericana, Cértegui, Río Quito y Atrato (Chocó). **Nota:** Inundaciones en el municipio de Río Quito, corregimiento de La soledad, por desbordamiento de los ríos Quito y Atrato (09/11/2024).
⚠	Atrato - Darién	Cuenca del río Cabi	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Cabi entre otros directos al río Atrato y creciente súbita del río Atrato en el municipio de Quibdó. Especial atención en los municipios de Atrato y Quibdó (Chocó). **Notas: 1)** Desbordamiento del río Atrato, generando inundación en el corregimiento de Doña Josefa, del municipio de Atrato – Chocó (08/11/2024) **2)** Inundaciones en zonas rural y urbana del municipio de Quibdó (Chocó) (08/11/2024).
⚠	Atrato - Darién	Cuenca del río Bebaramá	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Bebaramá y otros Directos Atrato (md). **Nota:** Reporte de inundaciones del río Beraramá afectando el corregimiento del Llano Bebaramá del municipio del medio Atrato, Chocó (08/11/2024).
⚠	Atrato - Darién	Cuenca media río Atrato	Probabilidad de crecientes súbitas en la SZH Directos al Atrato entre los ríos Quito y Bojayá (mi), especialmente los ríos Beté y Tangui, en la zona rural del municipio Medio Atrato. Se recomienda especial atención en el río Atrato a la altura de Vigía de Fuerte (Antioquia).

Link: https://www.ideam.gov.co/sala-de-prensa/boletines/Bolet%C3%ADn-de-Condiciones-Hidrometeorol%C3%B3gicas-Actuales%2C-Alertas-y-Pron%C3%B3sticos-%28BCH%29?page=1

Pronóstico de la Amenaza por Deslizamientos de Tierra

REGIÓN PACÍFICO

IDEAM

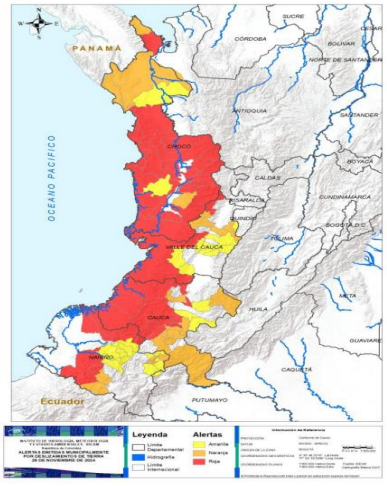


ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
⚠	CAUCA : Argelia, Balboa, Buenos Aires, El Tambo, Guapi, López De Micay, Patía, Piendamó - Tunía, Rosas, Timbiquí, Timbío. CHOCÓ : Alto Baudó, Bagadó, Bahía Solano, Bajo Baudó, Bojayá, Condoto, Cértegui, El Cantón Del San Pablo, El Carmen De Atrato, El Litoral Del San Juan, Istmina, Lloró, Medio Atrato, Nuquí, Quibdó, Río Iró, Río Quito, San José Del Palmar, Sipí, Tadó, Unguía. NARIÑO : Barbacoas, El Charco, Leiva, Ricaurte, Santa Bárbara. VALLE DEL CAUCA : Buenaventura, Calima, El Cairo, El Águila, Jamundí, Riofrío, Versalles.
⚠	CAUCA : Almaguer, Bolívar, La Sierra, La Vega, Morales, Piamonte, Páez, Santa Rosa, Sotará Paispamba, Sucre. CHOCÓ : Acandí, Juradó, Nóvita, Riosucio. NARIÑO : Albán, Arboleda, Belén, Cumbal, La Cruz, Mallama, San Pedro De Cartago. VALLE DEL CAUCA : Bolívar, Bugalagrande, El Dovio, Sevilla.
⚠	CAUCA : Popayán, Puracé, Silvia. CHOCÓ : Carmen Del Darién, Medio Baudó. NARIÑO : Buesaco, Colón, Cumbitara, El Rosario, El Tablón De Gómez, La Llanada, La Unión, Los Andes, Policarpa, Samaniego, San Bernardo, San Pablo. VALLE DEL CAUCA : Caicedonia, Cali, Dagua, Ginebra, Guacarí, Guadalajara De Buga, Tuluá, Yotoco.

Link: https://www.ideam.gov.co/sala-de-prensa/boletines/Informe-T%C3%A9cnico-Diario-de-Condiciones-Hidrometeorol%C3%B3gicas%2C-Alertas-y-Pron%C3%B3sticos-%28ITD%29?desde=2024-11-19&hasta=2024-11-29&items_per_page=20

Área Hidrográfica del Caribe

IDEAM

Actualización: 02 de diciembre de 2024 12:00 HLC

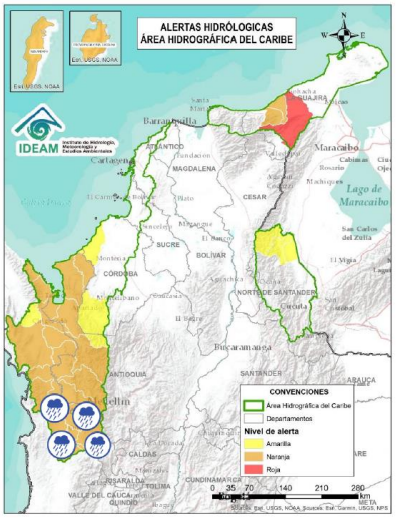


Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Atrato - Darién	Cuenca alta del río Atrato	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca alta del río Atrato y sus afluentes. Se recomienda especial atención en los municipios de El Carmen de Atrato, Lloró, Bagadó, Cértegui, Quibdó y Unión Panamericana (Animas).
	Atrato - Darién	Cuenca del río Andágueda	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Andágueda y sus aportantes. Se recomienda especial atención en los municipios de Bagadó y Cértegui (Chocó).
	Atrato - Darién	Cuenca del río Quito	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Quito. Especial atención en los municipios de Cantón de San Pablo, Unión Panamericana, Cértegui, Río Quito y Atrato (Chocó).
	Atrato - Darién	Cuenca del río Cabi	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Cabi entre otros directos al río Atrato y creciente súbita del río Atrato en el municipio de Quibdó. Especial atención en los municipios de Atrato y Quibdó (Chocó).
	Atrato - Darién	Cuenca del río Bebaramá	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Bebaramá y otros Directos Atrato (md).
	Atrato - Darién	Cuenca media río Atrato	Probabilidad de crecientes súbitas en la SZH Directos al Atrato entre los ríos Quito y Bojayá (mi), especialmente los ríos Beté y Tangui, en la zona rural del municipio Medio Atrato. Se recomienda especial atención en el río Atrato a la altura de Vigía de Fuerte (Antioquia).

Área Hidrográfica del Caribe

IDEAM

Actualización: 03 de diciembre de 2024 12:00 HLC

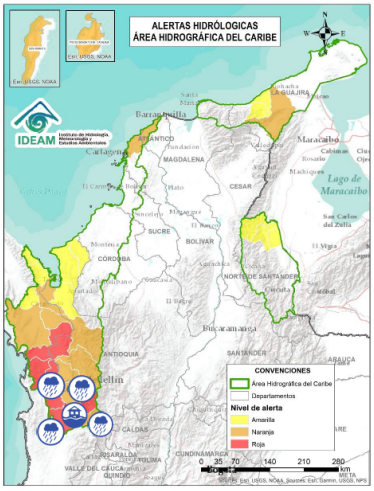


Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Atrato - Darién	Cuenca alta del río Atrato	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca alta del río Atrato y sus afluentes. Se recomienda especial atención en los municipios de El Carmen de Atrato, Lloró, Bagadó, Cértegui, Quibdó y Unión Panamericana (Animas). **Nota:** Desbordamiento del río Atrato a la altura del corregimiento de Boraudo – Lloró (Chocó) (02/12/2024).
	Atrato - Darién	Cuenca del río Andágueda	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Andágueda y sus aportantes. Se recomienda especial atención en los municipios de Bagadó y Cértegui (Chocó).
	Atrato - Darién	Cuenca del río Quito	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Quito. Especial atención en los municipios de Cantón de San Pablo, Unión Panamericana, Cértegui, Río Quito y Atrato (Chocó).
	Atrato - Darién	Cuenca del río Cabi	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Cabi entre otros directos al río Atrato y creciente súbita del río Atrato en el municipio de Quibdó. Especial atención en los municipios de Atrato y Quibdó (Chocó). **Nota:** Desbordamiento de los ríos Cabí, Guayabal, Icho, Gaudalupe y Atrato en la cabecera municipal de Quibdó, Chocó. (01/12/2024)
	Atrato - Darién	Cuenca del río Bebaramá	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Bebaramá y otros Directos Atrato (md). **Nota:** Se reportan inundaciones en el sector de Tutunendo - Quibdó (Chocó) (02/12/2024).
	Atrato - Darién	Cuenca media río Atrato	Probabilidad de crecientes súbitas en la SZH Directos al Atrato entre los ríos Quito y Bojayá (mi), especialmente los ríos Beté y Tangui, en la zona rural del municipio Medio Atrato. Se recomienda especial atención en el río Atrato a la altura de Vigía de Fuerte (Antioquia).
	Atrato - Darién	Cuenca Media del Atrato	Probabilidad de crecientes súbitas en la SZH de los directos al Atrato entre Bebaramá y Murrí (md). Se recomienda especial atención en el municipio del Medio Atrato (Chocó).

Link:https://www.ideam.gov.co/sala-de-prensa/boletines/Informe-T%C3%A9cnico-Diario-de-Condiciones-Hidrometeorol%C3%B3gicas%2C-Alertas-y-Pron%C3%B3sticos-%28ITD%29?desde=2024-12-02&hasta=2024-12-10&items_per_page=20

Área Hidrográfica del Caribe

IDEAM

Actualización: 06 de diciembre de 2024 12:00 HLC

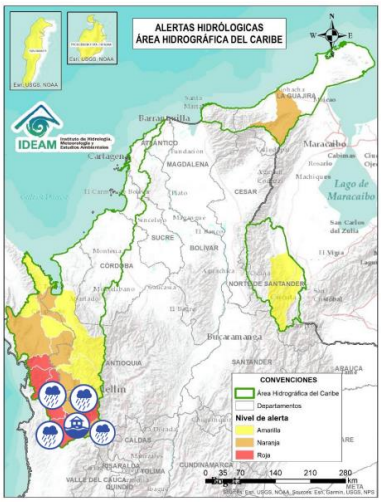


Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Atrato - Darién	Cuenca alta del río Atrato	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca alta del río Atrato y sus afluentes. Se recomienda especial atención en los municipios de El Carmen de Atrato, Lloró, Bagadó, Cértegui, Quibdó y Unión Panamericana (Animas). **Nota:** Desbordamiento del río Atrato a la altura del corregimiento de Boraudo – Lloró (Chocó) (02/12/2024).
⚠	Atrato - Darién	Cuenca del río Andágueda	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Andágueda y sus aportantes. Se recomienda especial atención en los municipios de Bagadó y Cértegui (Chocó).
⚠	Atrato - Darién	Cuenca del río Quito	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Quito. Especial atención en los municipios de Cantón de San Pablo, Unión Panamericana, Cértegui, Río Quito y Atrato (Chocó).
⚠	Atrato - Darién	Cuenca del río Cabi	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Cabi entre otros directos al río Atrato y creciente súbita del río Atrato en el municipio de Quibdó. Especial atención en los municipios de Atrato y Quibdó (Chocó). **Nota:** Desbordamiento de los ríos Cabí, Guayabal, Icho, Gaudalupe y Atrato en la cabecera municipal de Quibdó, Chocó. (01/12/2024)
⚠	Atrato - Darién	Cuenca del río Bebaramá	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Bebaramá y otros Directos Atrato (md). **Nota:** Se reportan inundaciones en el sector de Tutunendo - Quibdó (Chocó) (02/12/2024).
⚠	Atrato - Darién	Cuenca media río Atrato	Probabilidad de crecientes súbitas en la SZH Directos al Atrato entre los ríos Quito y Bojayá (mi), especialmente los ríos Beté y Tanguí, en la zona rural del municipio Medio Atrato. Se recomienda especial atención en el río Atrato a la altura de Vigía de Fuerte (Antioquia).

Pronóstico de la Amenaza por Deslizamientos de Tierra

REGIÓN PACÍFICO

IDEAM

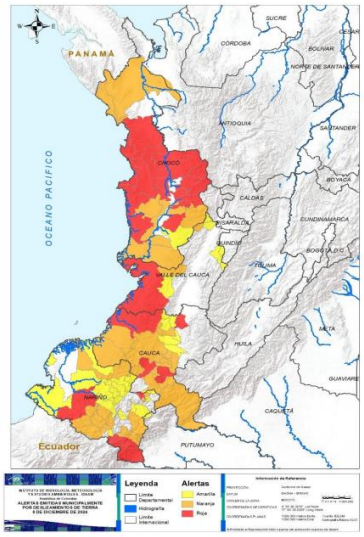


ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
⚠	CAUCA : Almaguer, La Vega, López De Micay, Patía, Santander De Quilichao. CHOCÓ : Alto Baudó, Bagadó, Bahía Solano, Bajo Baudó, Bojayá, Cértegui, El Cantón Del San Pablo, El Carmen De Atrato, Lloró, Medio Atrato, Nuquí, Nóvita, Quibdó, Río Iró, Río Quito, Tadó. NARIÑO : Barbacoas, Córdoba, Ipiales, La Unión, Potosí. VALLE DEL CAUCA : Buenaventura.
⚠	CAUCA : Argelia, Balboa, Bolívar, El Tambo, Guapi, La Sierra, Morales, Piamonte, Rosas, San Sebastián, Santa Rosa, Sotará Paispamba, Sucre, Timbiquí, Timbío. CHOCÓ : Condoto, El Litoral Del San Juan, Istmina, Juradó, Medio Baudó, Riosucio, San José Del Palmar. NARIÑO : Colón, Cumbal, El Charco, Funes, Guachucal, Mallama, Pasto, Puerres, Ricaurte, San Pedro De Cartago, Santacruz, Sapuyes, Túquerres. VALLE DEL CAUCA : Calima, El Cairo.
⚠	CAUCA : Buenos Aires, Cajibío, Florencia, Piendamó - Tunía, Popayán, Suárez. CHOCÓ : Sipí. NARIÑO : Belén, Buesaco, Chachagüí, Consacá, Cumbitara, El Rosario, La Llanada, Leiva, Los Andes, Magüí, Policarpa, Providencia, Pupiales, Samaniego, San Andrés De Tumaco, San Bernardo, San Pablo, Sandoná, Santa Bárbara. VALLE DEL CAUCA : Ansermanuevo, Caicedonia, Dagua, El Águila, Sevilla.

Link: https://www.ideam.gov.co/sala-de-prensa/boletines/Informe-T%C3%A9cnico-Diario-de-Condiciones-Hidrometeorol%C3%B3gicas%2C-Alertas-y-Pron%C3%B3sticos-%28ITD%29?desde=2024-12-02&hasta=2024-12-10&items_per_page=20

Área Hidrográfica del Caribe

IDEAM

Actualización: 12 de diciembre de 2024 12:00 HLC

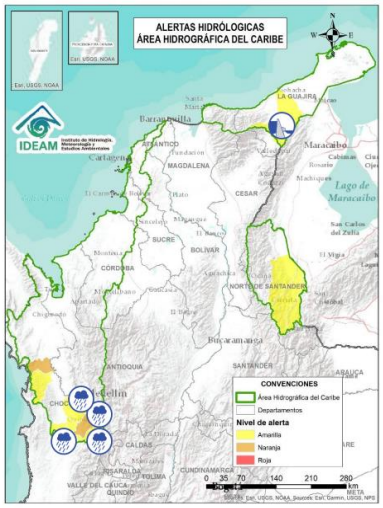


Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Atrato - Darién	Cuenca alta del río Atrato	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca alta del río Atrato y sus afluentes. Se recomienda especial atención en los municipios de El Carmen de Atrato, Lloró, Bagadó, Cértegui, Quibdó y Unión Panamericana (Animas).
⚠	Atrato - Darién	Cuenca del río Andágueda	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Andágueda y sus aportantes. Se recomienda especial atención en los municipios de Bagadó y Cértegui (Chocó).
⚠	Atrato - Darién	Cuenca del río Quito	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Quito. Especial atención en los municipios de Cantón de San Pablo, Unión Panamericana, Cértegui, Río Quito y Atrato (Chocó).
⚠	Atrato - Darién	Cuenca del río Bojayá	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Bojayá y sus afluentes. Especial atención en el municipio de Bojayá (Chocó).
⚠	Atrato – Darién	Cuenca del río Napipí – río Opogadó	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Napipí – río Opogadó y sus aportantes.
⚠	Atrato - Darién	Cuenca del río Cabi	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Cabi entre otros directos al río Atrato, así como en el río Atrato en su recorrido por el municipio de Quibdó. Especial atención en los municipios de Atrato y Quibdó (Chocó).
⚠	Atrato - Darién	Cuenca del río Bebaramá	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Bebaramá y otros Directos Atrato (md).

Pronóstico de la Amenaza por Deslizamientos de Tierra

REGIÓN PACÍFICO

IDEAM

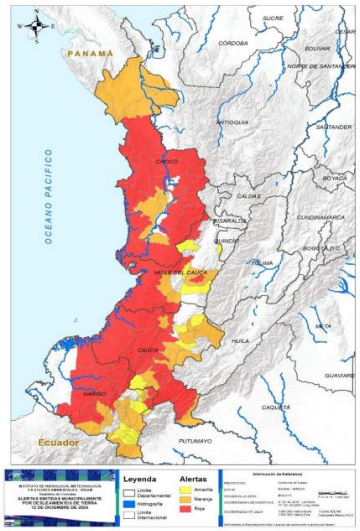

ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
⚠	CAUCA : Almaguer, Argelia, Balboa, Buenos Aires, Cajibío, El Tambo, Guapi, La Vega, López De Micay, Morales, Patía, Rosas, San Sebastián, Santa Rosa, Sucre, Timbiquí. CHOCÓ : Alto Baudó, Bagadó, Bahía Solano, Bajo Baudó, Bojayá, Condoto, Cértegui, El Carmen De Atrato, El Litoral Del San Juan, Lloró, Medio Atrato, Nuquí, Nóvita, Quibdó, Río Iró, Río Quito, San José Del Palmar, Sipí, Tadó. NARIÑO : Barbacoas, Cumbitara, El Charco, El Rosario, El Tablón De Gómez, La Cruz, La Llanada, Leiva, Los Andes, Magüí, Mallama, Policarpa, Ricaurte, Samaniego, San Pablo, Santa Bárbara. VALLE DEL CAUCA : Buenaventura, Calima, El Cairo, El Dovio, El Águila, Ginebra, Jamundí, Riofrío, Versalles.
⚠	CAUCA : Bolívar, Jambaló, La Sierra, Piamonte, Popayán, Puracé, Páez, Silvia, Sotará Paispamba, Suárez, Timbío. CHOCÓ : Carmen Del Darién, El Cantón Del San Pablo, Istmina, Juradó, Medio Baudó, Riosucio. NARIÑO : Albán, Belén, Colón, Consacá, Cumbal, El Tambo, Guachucal, Ipiales, La Florida, Linares, Nariño, Pasto, San Bernardo, San Pedro De Cartago, Sandoná, Santacruz, Sapuyes, Tangua, Túquerres, Yacuanquer. VALLE DEL CAUCA : Cali, Dagua, El Cerrito, Guacarí, Guadalajara De Buga.
⚠	CAUCA : Caldono, Florencia, Mercaderes, Toribío, Totoró. NARIÑO : Arboleda, Buesaco, Chachagüí, Córdoba, Funes, La Unión, Potosí, Puerres. VALLE DEL CAUCA : Bolívar, Caicedonia, Palmira, Yotoco.

Link:https://www.ideam.gov.co/sala-de-prensa/boletines/Informe-T%C3%A9cnico-Diario-de-Condiciones-Hidrometeorol%C3%B3gicas%2C-Alertas-y-Pron%C3%B3sticos-%28ITD%29?desde=2024-12-08&hasta=2024-12-16&items_per_page=20

NICOLAS RAFAEL REDONDO MOLINA
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN VIAS
Y TRANSPORTES

INTER CHOCO 214-2024

Valledupar, diciembre 13 de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CHOCO
Atn. Ing. JANNIER SALAS QUEJADA
SUPERVISOR INTERVENTORIA
jsalas@invias.gov.co
QUIBDO-CHOCO

REF: CONTRATO No. 3920 de 2023, cuyo Objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA LA SANCHEZ – GUADUAS CON CODIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ."

Asunto: CONCEPTO DE INTERVENTORIA SOBRE PRÓRROGA #4 HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 Y SUSTITUCION AL CONTRATO DE OBRA N°3883 de 2023.

Cordial saludo;

Teniendo en cuenta el comunicado RD.115 del 13 de diciembre de 2024 radicado por el contratista ANILIO ABADIA SERNA, en donde presenta las JUSTIFICACIONES PARA SOLICITUD DE PRÓRROGA#4 Y SUSTITUCION del CONTRATO DE OBRA 3883-2023 con un p lazo hasta el 28 de febrero de 2025, requeridos para la culminación del objeto contractual, procedemos a emitir concepto, previas las siguientes consideraciones a saber:

El Contratista de obra, presenta lo siguiente:

1. **JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA.**

Cierre de vías principales de acceso.

Durante el periodo de construcción la ola invernal ha impactado significativamente la región, todos esto ha generado que las vías de acceso a la obra sufran frecuentes cierres debido a los múltiples deslizamientos, dificultando el desplazamiento libre de vehículos y personas, afectando la logística del proyecto, especialmente en el transporte de materiales y la llegada de los trabajadores al lugar de trabajo.

La ola invernal ha interrumpido las rutas de distribución de materiales esenciales, como agregados, cemento y otros insumos necesarios para las obras de la vía terciaria. Debido a los bloqueos de carreteras, desbordamientos del río Atrato y otros afluentes, los proveedores no han logrado suministrar los materiales en el plazo previsto ni en las cantidades requeridas.

La escasez de materiales ha retrasado considerablemente el progreso de los trabajos en el proyecto.

Calle 14 No. 17-46 Int. 15
Email: nicolasredondom@live.com
Cel: 313 5751982
Valledupar

NICOLAS RAFAEL REDONDO MOLINA
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN VIAS
Y TRANSPORTES

Impactos en el cronograma de trabajo.

La repercusión de la ola invernal en el cronograma de actividades previsto para la culminación del de las obras, se ha visto afectado por eventos inesperados, generando retrasos significativos, aumentando los riesgos para la seguridad del personal y dificultan la ejecución de la meta física del proyecto.

2. SOLICITUD.

En virtud de lo anterior, solicitamos una prórroga hasta el 28 de febrero del 2025 y sustitucion, con el fin de finalizar las obras conforme a los términos del contrato, asegurando la seguridad de las estructuras en construcción y la seguridad de los trabajadores.

Esta extensión permitirá cumplir con los compromisos contractuales, una vez las condiciones climáticas y de acceso hayan mejorado.

Reiteramos nuestro compromiso con la realización de las obras en el camino terciario de Sánchez- Guaduas. Pese a que los fenómenos climáticos han alterado el progreso de estas, seguiremos trabajando para cumplir con los objetivos establecidos en el contrato, garantizando siempre niveles de calidad y protección.

Como soporte de la presente solicitud se adjunta:

 Boletín de condiciones Hidrometeorológicas (IDEAM) del presente año.

Agradezco su amable atención al presente comunicado quedando en espera a su pronta respuesta a la solicitud.

La Interventoría, considera viable la solicitud de prórroga del contrato, hasta el 28 de febrero de 2024, con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual del contrato de obra No. 3883 de 2023. Por lo anterior, se solicita ampliar el plazo vigente del contrato y con ello garantizar la ejecución a satisfacción de las obras, el recibo y liquidación del contrato de obra que conlleva a poder realizar las actuaciones administrativas de recibo y liquidación del contrato de obra.

Por lo anterior, se avala la solicitud de una prórroga, hasta el 28 de febrero de 2024, para terminar con la ejecución de la obra y cumplir con las metas físicas establecidas inicialmente.

Se anexan los siguientes documentos:


- Formato MEPI-MN1-IN-12-FR-1 - SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA.

- Comunicado RD.115- SOLICITUD DE PRÓRROGA N°4 DEL CONTRATO DE OBRA 3883.

Calle 14 No. 17-46 Int. 15
Email: nicolasredondom@live.com
Cel: 313 5751982
Valledupar

NICOLAS RAFAEL REDONDO MOLINA
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN VIAS
Y TRANSPORTES

Atentamente,



NICOLAS RAFAEL REDONDO MOLINA
C.C. 12.719.145 de Valledupar
INTERVENTOR

C.C. ANILIO ABADIA SERNA CONTRATISTA (anilioas@gmail.com)
Carlos Ernesto Parra Acosta - Gestor Técnico de Proyecto - (cparra@invias.gov.co)
Felipe Alejandro González Zafra <fagonzalez@invias.gov.co>

Calle 14 No. 17-46 Int. 15
Email: nicolasredondom@live.com
Cel: 313 5751982
Valledupar

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

No. De Contrato y/o Convenio: 3883 de 2023

Objeto "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA SANCHEZ – GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ"

Se marca con una (X)

	ACTUALIZADO	
APLICATIVO	**SI**	**NO APLICA**
SECOP:	X	
SICO:	X	
SEPRO:	X	
CIFRA:		x
GESPROY:		X

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

Dado en Bogotá, a los 13 días del mes de diciembre del año 2024.

ACEVEDO
CASTRO OSCAR
RODOLFO

Nombre**: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO**
Ordenador del Pago
Subdirección: Vias Regionales
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Nombre: **MONICA MARITZA BENAVIDES G.**
Lider Coordinación
Subdirección: Vias Regionales
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Nombre: **CARLOS ERNESTO PARRA ACOSTA.**
Apoyo a la supervisión
Subdirección Vías Regionales

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Oficina Asesora Jurídica

FICHA TECNICA

Número de Contrato: 3883 **Fecha:** 17 de octubre de 2023

Contratista: ANILIO ABADIA SERNA

Objeto: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA SANCHEZ ¿ GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

PROCESO DE SELECCION

No Proceso:

Res Adj:

Fecha:

Secuencia	Documento	Observaciones
1	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ESTUDIOS PREVIOS
2	PLIEGO DE CONDICIONES	DOCUMENTO BASE O PLIEGOS TIPO DEFINIDOS
3	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ANEXO TECNICO
4	OFICIO	RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN N° 3404 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023
5	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	CARTA PRESENTACIÓN OFERTA LICITACIÓN
6	FORMULARIO REGISTRO UNICO TRIBUTARIO-RUT	REGISTO UNICO TRIBUTARIO
7	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ANTECEDENTES UNIFICADOS
8	CERTIFICACION BANCARIA	CERTIFICACIÓN BANCARIA CUENTA DE AHORROS N° 007892012838 DEL BANCO SCOTIABANK COLPATRIA
9	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	PRESUPUESTO OFICIAL
10	CERTIFICADO DISP. PRESUPUESTAL	N°98023 DEL 28/04/23
11	REGISTRO PRESUPUESTAL	N°1195523 DEL 2023-10-24
12	OFICIO	RESOLUCIÓN 4033 DEL 09-11-2023 DESIGNACIÓN GESTOR DE PROYECTO JONATHAN ANTONIO PARRA MURCIA
13	OFICIO	2023S-VBOG-019569 SOLICITUD DE DOCUMENTOS PARA INICIO DE CONTRATO DE OBRA
14	ORDEN DE INICIACION	2023S-VBOG-028967 ORDEN DE INICIO 3883-2023
15	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	N° 14-44-101195827 DE SEGUROS DEL ESTADO
16	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	AUTORIZACIÓN PAGO ANTICIPO
17	ACTA DE APROBACION DE LA GARANTIA	ACTA DE APROBACIÓN DEL ANEXO 6 DE LA PÓLIZA No. 14-44-101195827, QUE AMPARA LA ORDEN DE INICIO Y LA PRÓRROGA No. 1

18	ACTA DE APROBACION DE LA GARANTIA	ACTA DE APROBACIÓN DEL ANEXO 7 DE LA PÓLIZA No. 14-44-101195827, QUE AMPARA LA SUSPENSIÓN No. 1 Y LA PRÓRROGA No. 1 (INCLUYE PÓLIZA)
19	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	RADICADO 2024E-VUVRAZ-074208 - INFORME DE ENTREGA PROYECTO CARMEN DE ATRATO
20	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1 - DICIEMBRE 2023 CON RADICADO 15936 DEL 16/11/2024
21	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2 - ENERO 2024 CON RADICADO 15936 DEL 16/11/2024
22	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3 - FEBRERO 2024 CON RADICADO 15936 DEL 16/11/2024
23	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 4 - MARZO CON RADICADO 15936 DEL 16/11/2024
24	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 5 - ABRIL 2024 CON RADICADO 15936 DEL 16/11/2024
25	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 6 - MAYO 2024 CON RADICADO 15937 DEL 16/11/2024
26	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 - JUNIO 2024 CON RADICADO 15996 DEL 16/11/2024
27	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 8 - JULIO 2024 CON RADICADO 16010 DEL 16/11/2024
28	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 9 - AGOSTO 2024 CON RADICADO 16011 DEL 17/11/2024
29	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	RADICADO INTER CHOCO 187-2024 - INCUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA 3883-2023
30	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	RADICADO INTER CHOCÓ 188-2024 - RESPUESTA COMUNICADO RD 110 (PLAN DE CONTINGENCIA)

TOTAL ANEXOS	30

Contrato - Información general

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5438844
Número del Contrato	3883-2023
Versión del contrato	7
Objeto del contrato:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA SANCHEZ - GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.
Tipo	Obra
Fecha de inicio del contrato:	15/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	2 días de tiempo transcurrido *(15/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(●) Sí ( ) No
Estado de contrato	Suspendido
Liquidación	(●) Sí ( ) No
Fecha de inicio de liquidación	16 días de tiempo transcurrido *(2/12/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de liquidación	1/06/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones ambientales	( ) Sí (●) No
Obligaciones pos consumo	( ) Sí (●) No
Reversión	( ) Sí (●) No

Identificación Entidad contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

Información del Proveedor contratista

ANILIO ABADIA SERNA

COLOMBIA, Quibdó

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta
ANILIO ABADIA SERNA	COLPATRIA	Ahorros

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ANILIO ABADIA SERNA* ***Fecha de aprobación:*** *13/10/2023 8:23:24 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Paola Andrea Roa Mora* ***Fecha de aprobación:*** *17/10/2023 9:59:03 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato firmado: CO1_PCCNTR_5438844_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_5438844_En ejecución

Información del objeto

Tipo de proceso	Licitación pública (Obra pública)

Número del proceso	LP-DEO-SVR-052-2023 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))
Título del proceso	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA LA SANCHEZ - GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO (Fase de Selección (Presentación de ofertas
Descripción	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA LA SANCHEZ - GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO
Duración del contrato	213 (Días)
Unidad de contratación	Subdirección de Vías Regionales
Título de la oferta	INVIAS 052
Tipo	Obra
Cuantía del contrato	1.486.393.548 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo:	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2029
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	No	Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Opciones de entrega	A definir
El contrato puede ser prorrogado	○ Sí ○ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	◉ Sí ○ No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	○ Sí ◉ No			
Seriedad de la oferta	◉ Sí ○ No			
	◉ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10		
Cumplimiento	◉ Sí ○ No			
☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
	◉ % del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	11/10/2023 2:00:00 PM *((UTC-05:*
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/03/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:*
☑ Cumplimiento del contrato				
	◉ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	11/10/2023 2:00:00 PM *((UTC-05:*
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/03/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:*
☑ Pago de salarios				
	◉ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11/10/2023 2:00:00 PM *((UTC-05:*
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/08/2028 11:59:00 PM *((UTC-0*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	◉ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	11/10/2023 2:00:00 PM *((UTC-05:*
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/08/2029 11:59:00 PM *((UTC-0*
☑ Otro:		Calidad de la revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los estud		

	◉ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	11/10/2023 2:00:00 PM *((UTC-05:*
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/08/2029 11:59:00 PM *((UTC-0*
Responsabilidad civil extra contractual	◉ Sí ○ No			
	◉ No. de SMMLV	300		
Fecha límite para entrega de garantías:	16/10/2023 2:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	30/07/2024 6:06:42 PM *((UTC-05.*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha
CO1.WRT.14848405	Responsabilidad civil extra contractual ⚠	Contrato de seguro	2.021.127.111,3 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	28/08 *Lima,*
CO1.WRT.14706799	Responsabilidad civil extra contractual ⚠	Contrato de seguro	2.021.127.111,3 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	28/08 *Lima,*
CO1.WRT.13254817	Responsabilidad civil extra contractual ⚠	Contrato de seguro	1.979.127.111,3 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	28/08 *Lima,*
CO1.WRT.13413727	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	2.021.127.111,3 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	28/08 *Lima,*
CO1.WRT.12622059	Seriedad de la oferta		155.000.000 COP	-	24/12 *Lima,*

1 2 »

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Efectivo

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Comentario:

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 25 G No. 73B-90

Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá

País COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá

Dirección: Calle 25 G No. 73B-90

Código postal: 110931

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos ('')
Latitud:	0	0	0
Longitud:	0	0	0

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección
1	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA SANCHEZ – GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE (DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

Bienes y Servicios

1 CO1.PCCNTR.5438844

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio u
1	72103300	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA LA SANCHEZ - GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO	1,00	UN	1.550.000.000,00	1.486.393.5

Documentos del proveedor

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento
CTO 3883 DE 2023 - LP-DEO-SVR-052-2023 ok ok.pdf	CTO 3883 DE 2023 - LP-DEO-SVR-052-2023 ok ok.pdf
Antecedentes unidos.pdf	Antecedentes unidos.pdf
Policía Nacional de Colombia.pdf	Policía Nacional de Colombia.pdf
Doc pre unidos.pdf	Doc pre unidos.pdf
2023I-VBOG-012803 distribucion de recursos.pdf	2023I-VBOG-012803 distribucion de recursos.pdf
Correo de fecha 11 de octubre del 2023 estructuracion.pdf	Correo de fecha 11 de octubre del 2023 estructuracion.pdf
Formulario 1 - Presupuesto oficial correccion arimetica.xlsx	Formulario 1 - Presupuesto oficial correccion arimetica.xlsx
Doc cta unidos.pdf	Doc cta unidos.pdf
MODIFICACION 1 PRORROGA 1 CTO 3883 - 2023 (2).pdf	MODIFICACION 1 PRORROGA 1 CTO 3883 - 2023 (2).pdf
1. MINUTA PRORROGA 2 - CONTRATO 3883 DE 2023 -VERSIÓN FINAL.pdf	1. MINUTA PRORROGA 2 - CONTRATO 3883 DE 2023 -VE

¿Documentos del Contrato están firmados por ambas partes? ○ Sí ◉ No

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Paola Andrea Roa Mora **Tipo de documento** Cédula de Ciudadanía **Número de documento**

Supervisor **Tipo de documento** **Número de documento**

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento
Ordenador del Gasto	Paola Andrea Roa Mora	17/10/2023 9:59:03 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ○ Sí ◉ No

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	1.486.393.548
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
	0

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)

Total 1.486.393.548

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año
2019011000005	2023

Entidad Estatal registrada en el SIIF Sí No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 24-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad
98023	CDP	Generado	1.550.000.000 COP	1.486.393.548 COP	24-02-00

Saldo de CDP 1.550.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 1.486.393.548 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 11/10/2023 1:40 PM

Compromiso presupuestal de gastos

⚠ **Hay códigos de compromiso dónde el valor total de la facturas es menos que el valor de compromiso. Por favor verifique si necesita libera**

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a li
1195523	Presupuestal (CDP)	24/10/2023 12:00 AM	Generado	1.486.393.548 COP	1.486.393.548 COP	

Saldo de compromisos CDP 1.486.393.548 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 1.486.393.548 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 15/12/2023 11:56 AM

Ejecución del Contrato

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento
2.1.1 VALIDACIÓN CUMPLIMIENTO ANEXO 3 ACTA DE INICIO.pdf	2.1.1 VALIDACIÓN CUMPLIMIENTO ANEXO 3 ACTA DE INICIO.p
2.1.2 VALIDACIÓN CUMPLIMIENTO ANEXO 4 ACTA DE INICIO.pdf	2.1.2 VALIDACIÓN CUMPLIMIENTO ANEXO 4 ACTA DE INICIO.p
2.2.1 VALIDACIÓN RCE ANEXO 2 ACTA DE INICIO.pdf	2.2.1 VALIDACIÓN RCE ANEXO 2 ACTA DE INICIO.pdf

2.2.2 VALIDACIÓN RCE ANEXO 3 ACTA DE INICIO.pdf	2.2.2 VALIDACIÓN RCE ANEXO 3 ACTA DE INICIO.pdf
2023S-VBOG-028967 Orden de Inicio 3883-2023.pdf	2023S-VBOG-028967 Orden de Inicio 3883-2023.pdf
3.2.1 VALIDACIÓN CUMPLIMIENTO ANEXO 5 PRORROGA 1.pdf	3.2.1 VALIDACIÓN CUMPLIMIENTO ANEXO 5 PRORROGA 1.pdf
3.3.1 VALIDACION RCE ANEXO 4 PRORROGA 1.pdf	3.3.1 VALIDACION RCE ANEXO 4 PRORROGA 1.pdf
AAG_CTO 3883 DE 2023_OI-P1_V.02.pdf	AAG_CTO 3883 DE 2023_OI-P1_V.02.pdf
AAG_CTO 3883 DE 2023_S1-P2.pdf	AAG_CTO 3883 DE 2023_S1-P2.pdf
Acta de Suspensión No. 1 3883-2023..pdf	Acta de Suspensión No. 1 3883-2023..pdf
Acta de Suspensión No. 1 Contrato No. 3920-2023.pdf	Acta de Suspensión No. 1 Contrato No. 3920-2023.pdf
Poliza Orden de inicio y Prórroga 1.pdf	Poliza Orden de inicio y Prórroga 1.pdf
REG N°1195523 DEL 2023-10-24.pdf	REG N°1195523 DEL 2023-10-24.pdf
RESOLUCIÓN 4033 DEL 09-11-2023 DESIGNACIÓN GESTOR DE PROYECTO JONATHAN ANTONIO PARRA MURCIA.pdf	RESOLUCIÓN 4033 DEL 09-11-2023 DESIGNACIÓN GESTOR DE JONATHAN ANTONIO PARRA MURCIA.pdf

Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato


Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Es
CO1.CTRMOD.17630030	Suspender el contrato	11/12/2024 6:41 PM *(UTC -5 horas)*	12/12/2024 6:12 PM *(UTC -5 horas)*	Pu
CO1.CTRMOD.17121566	Modificar el contrato	1/11/2024 4:01 PM *(UTC -5 horas)*	1/11/2024 5:47 PM *(UTC -5 horas)*	Pu
CO1.CTRMOD.17117364	Modificar el contrato	1/11/2024 9:55 AM *(UTC -5 horas)*	1/11/2024 10:36 AM *(UTC -5 horas)*	Pu
CO1.CTRMOD.17115344	Reactivar el contrato	1/11/2024 8:31 AM *(UTC -5 horas)*	1/11/2024 9:55 AM *(UTC -5 horas)*	Pu
CO1.CTRMOD.16956455	Suspender el contrato	16/10/2024 7:44 PM *(UTC -5 horas)*	16/10/2024 8:44 PM *(UTC -5 horas)*	Pu
CO1.CTRMOD.16938476	Modificar el contrato	15/10/2024 3:11 PM *(UTC -5 horas)*	15/10/2024 3:41 PM *(UTC -5 horas)*	Pu
CO1.CTRMOD.16934145	Reactivar el contrato	15/10/2024 10:19 AM *(UTC -5 horas)*	15/10/2024 3:10 PM *(UTC -5 horas)*	Pu
CO1.CTRMOD.16825111	Suspender el contrato	30/09/2024 10:54 PM *(UTC -5 horas)*	30/09/2024 11:23 PM *(UTC -5 horas)*	Pu
CO1.CTRMOD.16817011	Reactivar el contrato	30/09/2024 10:30 AM *(UTC -5 horas)*	30/09/2024 10:52 PM *(UTC -5 horas)*	Pu
CO1.CTRMOD.16552932	Suspender el contrato	30/08/2024 8:01 PM *(UTC -5 horas)*	30/08/2024 9:09 PM *(UTC -5 horas)*	Pu
CO1.CTRMOD.16185162	Modificar el contrato	22/07/2024 6:21 PM *(UTC -5 horas)*	22/07/2024 8:26 PM *(UTC -5 horas)*	Pu
CO1.CTRMOD.16159554	Modificar el contrato	18/07/2024 9:34 PM *(UTC -5 horas)*	18/07/2024 10:12 PM *(UTC -5 horas)*	Pu
CO1.CTRMOD.14279515	Modificar el contrato	28/12/2023 11:43 PM *(UTC -5 horas)*	29/12/2023 6:02 PM *(UTC -5 horas)*	Pu

Incumplimientos

Incumplimientos del contrato

Tipo	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Valor

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

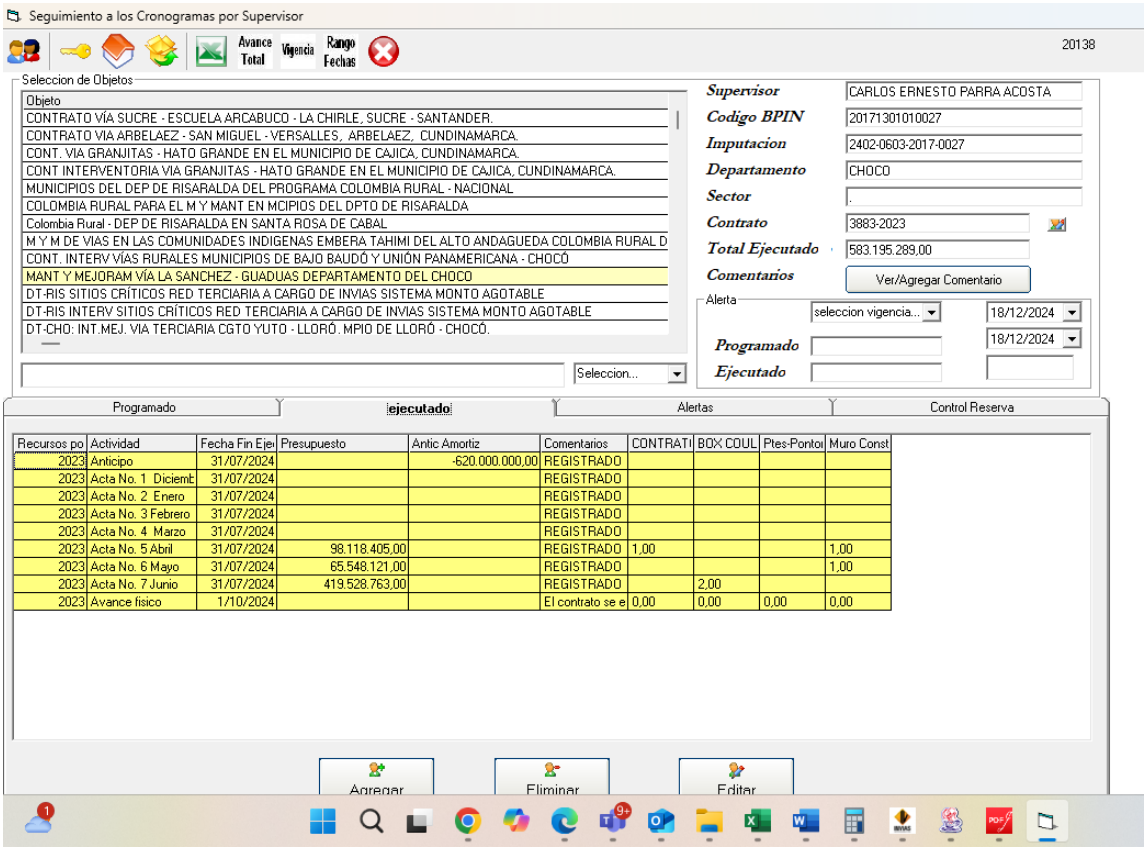
Seguimiento a los Cronogramas por Supervisor
Avance Total
Vigencia
Rango Fechas
20138
Seleccion de Objetos
Objeto
CONTRATO VÍA SUCRE - ESCUELA ARCABUCO - LA CHIRLE, SUCRE - SANTANDER.
CONTRATO VIA ARBELAEZ - SAN MIGUEL - VERSALLES, ARBELAEZ, CUNDINAMARCA.
CONT. VIA GRANJITAS - HATO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE CAJICA, CUNDINAMARCA.
CONT INTERVENTORIA VIA GRANJITAS - HATO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE CAJICA, CUNDINAMARCA.
MUNICIPIOS DEL DEP DE RISARALDA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
COLOMBIA RURAL PARA EL M Y MANT EN MCIPIOS DEL DPTO DE RISARALDA
Colombia Rural - DEP DE RISARALDA EN SANTA ROSA DE CABAL
M Y M DE VIAS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS EMBERA TAHIMI DEL ALTO ANDAGUEDA COLOMBIA RURAL D
CONT. INTERV VÍAS RURALES MUNICIPIOS DE BAJO BAUDÓ Y UNIÓN PANAMERICANA - CHOCÓ
MANT Y MEJORAM VÍA LA SANCHEZ - GUADUAS DEPARTAMENTO DEL CHOCO
DT-RIS SITIOS CRÍTICOS RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS SISTEMA MONTO AGOTABLE
DT-RIS INTERV SITIOS CRÍTICOS RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS SISTEMA MONTO AGOTABLE
DT-CHO: INT.MEJ. VIA TERCIARIA CGTO YUTO - LLORÓ. MPIO DE LLORÓ - CHOCÓ.
Seleccion...
Supervisor
CARLOS ERNESTO PARRA ACOSTA
Codigo BPIN
20171301010027
Imputacion
2402-0603-2017-0027
Departamento
CHOCO
Sector
Contrato
3883-2023
Total Ejecutado
583.195.289,00
Comentarios
Ver/Agregar Comentario
Alerta
seleccion vigencia...
18/12/2024
18/12/2024
Programado
Ejecutado
Programado
ejecutado
Alertas
Control Reserva
Recursos po
Actividad
Fecha Fin Eje
Presupuesto
Antic Amortiz
Comentarios
CONTRATI
BOX COUL
Ptes-Pontor
Muro Const
2023 Anticipo 31/07/2024 -620.000.000,00 REGISTRADO
2023 Acta No. 1 Diciemb 31/07/2024 REGISTRADO
2023 Acta No. 2 Enero 31/07/2024 REGISTRADO
2023 Acta No. 3 Febrero 31/07/2024 REGISTRADO
2023 Acta No. 4 Marzo 31/07/2024 REGISTRADO
2023 Acta No. 5 Abril 31/07/2024 98.118.405,00 REGISTRADO 1,00 1,00
2023 Acta No. 6 Mayo 31/07/2024 65.548.121,00 REGISTRADO 1,00
2023 Acta No. 7 Junio 31/07/2024 419.528.763,00 REGISTRADO 2,00
2023 Avance fisico 1/10/2024 El contrato se e 0,00 0,00 0,00 0,00
Agregar
Eliminar
Editar
