CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 9
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 10
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 12

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	**23001227 02 H3**
Nombre del Contratista:	**UT PORTAL AEROCIVIL 2023**
Periodo informe:	**01 al 31 de diciembre de 2024**
Nombre de Supervisor:	**Andres Felipe Molina Barrios – Martha Cecilia Cantor Mendoza**
Nombre del Interventor:	**No Aplica**
Área perteneciente:	**Grupo Soluciones de Información y Gestión del Dato**

2. OBJETO DEL CONTRATO

DISEÑAR, CONSTRUIR Y PONER Y EN FUNCIONAMIENTO NUEVOS PORTALES (EXTRANET E INTRANET) PARA LA ENTIDAD (VF) Lote No. 2 DISEÑAR, CONSTRUIR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PORTAL DE EXTRANET

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: 01 al 31 de diciembre de 2024

OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO	UBICACIÓN DE SOPORTES (
Al cumplimiento del contrato de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Condiciones, en sus Adendas, Anexos Técnicos: 1. Estudios Previos, 2. Especificaciones Técnicas, 3. Matriz de Riesgos, Formatos Técnicos del Proceso de licitación pública número 23001227 H3 de 2023, la propuesta general publicada del 26 de diciembre de 2023, la Resolución de adjudicación No. 00291 del 19 de febrero de 2024 y a lo previsto en el presente contrato y demás documentos que hagan parte integral del mismo.	1. Se ha dado cumplimiento	S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET
Monitorear y gestionar los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidas en el Formato 9 – Matriz de Riesgos	A la fecha se ha identificado el riesgo de: Mayores tiempos en la ejecución del contrato que van más allá de los plazos previstos en el cronograma. Con el riesgo materializado el contratista el día 04 de diciembre de 2024, elevó solicitud de prórroga del plazo de ejecución del contrato por 3 meses hasta el 16 de marzo de 2025. Solicitud que fue llevada al comité ordinario 141 de contratación del 10 de diciembre de 2024, la cual fue aprobada	Modificatorio 02 del contrato. El cual se encuentra ubicado en la siguiente ruta: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Contrato\Modificatorio02

Prestar los servicios pactados para el cumplimiento del contrato, con personal técnico especializado, el cual deberá estar bajo su permanente subordinación o dependencia	Se ha dado cumplimiento teniendo en cuenta el equipo del trabajo presentado para ejecutar el contrato.	S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET
Desarrollar las actividades del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo Técnico, en el lugar y plazos establecidos en el presente contrato	Se ha venido dando cumplimiento.	
Dar a conocer a LA AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.	No se ha presentado.	
Cumplir con el plan de garantías ofertadas	A la fecha no se han presentado eventos para hacer efectivas las garantías.	
Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso de Licitación Pública No. 23001227 H3 de 2023	No se ha presentado ningún caso relacionado con lo descrito en la obligación.	

Constituir y mantener vigentes las garantías, en los plazos y montos establecidos en el presente Contrato.	Las garantías suscritas están vigentes y fueron aprobadas por la entidad. Con los modificatorios 01 y 02 las garantías fueron debidamente actualizadas, están vigentes y aprobadas por la entidad	En la siguiente ruta se encuentran los documentos de las garantías y la aprobación de estas. S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Contrato
Coordinar con el Supervisor, la gestión y respuesta a requerimientos recibidos de autoridades administrativas u órganos o instancias de control. Una vez el Contratista reciba el requerimiento deberá remitirlo de inmediato a la Aerocivil y a la supervisión con el fin de que la entidad responda directamente al peticionario con oportunidad, veracidad y dentro de los marcos legales vigentes	No se ha presentado ningún requerimiento relacionado con lo descrito en la obligación.	
Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa de la Aerocivil, información que NO sea considerada pública, tales como la relativa a documentos que se encuentren en construcción que contengan información preliminar y no definitiva	No se ha presentado ningún caso relacionado con lo descrito en la obligación.	
Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y dar aviso de tales	El contratista no ha reportado ningún caso relacionado con lo descrito en la obligación.	

circunstancias a la Aerocivil y a las autoridades competentes.		
Asumir, por su cuenta y riesgo, todos los costos directos, indirectos, el pago de salarios, honorarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal, que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y todos los gastos necesarios para la ejecución del presente contrato.	No se han reportado eventos relacionados con el incumplimiento por parte del contratista de la obligación descrita.	
Tener disponible y vincular para la ejecución del presente contrato el equipo, los elementos, herramientas y el personal requerido para su cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, adendas, anexos, apéndices y demás documentos que integran el presente contrato.	Se ha dado cumplimiento por parte del contratista.	
Atender las instrucciones del supervisor de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución, en las	Se han atendido las instrucciones de la supervisoría por parte del contratista, bajo la coordinación del Gerente del Proyecto.	

condiciones y términos establecidos en el mismo.		
Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” y demás normas vigentes de higiene y salud y seguridad en el trabajo. Será responsabilidad del consultor tanto la vinculación del personal como cualquier contingencia que con referencia a dicho personal se pueda presentar durante la ejecución del contrato.	No se han reportado ningún evento relacionado con el incumplimiento de la obligación descrita.	
Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes durante la ejecución del objeto contractual. El Contratista deberá dotar a sus empleados de los elementos de seguridad industrial y de protección personal necesarios para la ejecución de las labores propias del contrato	No aplica para el objeto de este contrato.	
Obtener las aprobaciones por parte del supervisor o quien haga sus veces, dentro del plazo de ejecución del	Se ha dado cumplimiento.	

contrato.		
Suscribir – conjuntamente con la Aerocivil – las actas y los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación del presente contrato	Se suscribió el Acta de inicio del contrato Se suscribió Acta de recibo parcial 01 Se suscribió Acta de recibo parcial 02 Se suscribió Acta de recibo parcial 03	S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas formales
Presentar a la Aerocivil todos los controles, informes, formatos, actas y demás documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en este contrato, documentos del proceso, Manuales y Procedimientos vigentes durante la ejecución del presente contrato.	Se ha cumplido	S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\
Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten las circunstancias establecidas en la cláusula correspondiente, previo cumplimiento del procedimiento fijado en la ley.	No se han presentado eventos relacionados.	
Pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando ésta se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicación de la normatividad vigente.	No se han presentado eventos relacionados.	

Las demás que se encuentran contenidas en el numeral 2 de las Especificaciones Técnicas y/o Estudios Previos del proceso de licitación Pública No. 23001227 H3 de 2023.	Se han venido desarrollando las actividades conforme las etapas definidas en el proyecto – del formato 8 Especificaciones técnicas.	S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

ACTIVIDAD ACORDE CRONOGRAMA	ESTADO EJECUCIÓN	OBSERVACIÓN	FECHA APROBACIÓN
Entregable 1 Documento del Plan de gestión del Proyecto	Entregado	Documento generado por el contratista, revisado por Aerocivil	09/05/2024
Entregable 2 Cronograma Detallado	Entregado	Documento generado por el contratista, revisado por Aerocivil	09/05/2024
Entregable 3 Project Charter	Entregado	Documento generado por el contratista, revisado por Aerocivil	09/05/2024
Entregable 4 Documento con el diseño de la arquitectura de la solución y configuración del CMS v1.0	Entregado	Documento generado por el contratista y revisado por Aerocivil	14/05/2024
Entregable 5 Documento de diagramación y diseño gráfico propuesto y el aprobado. V1.0	Entregado	El contratista ha presentado propuesta del diseño gráfico del home del portal del CEA aprobado 21 junio de 2024. Diseño gráfico Sede Electrónica aprobado 10 jul. 2024.	10/07/2024
Entregable 9 Documento Plan de pruebas v1.0	Entregado	Documento generado por parte del contratista y revisado por Aerocivil	23/05/2024
Entregable 15 Documento de estrategia y plan de gestión del cambio v1.0	Entregado	Documento generado por parte del contratista y revisado por Aerocivil	23/05/2024
Documento de desarrollos seguros OWASP	Entregado	Documento generado por parte del contratista y revisado por Aerocivil	23/05/2024
Documento plan de recuperación de desastres v1.0	Entregado	Documento generado por parte del contratista y revisado por Aerocivil	23/05/2024
Entregable 6. Acta de construcción del portal, conforme a lo señalado en el ítem 4	Entregado	Acta generada por el contratista, revisada y firmada por las partes.	27/11/2024

ACTIVIDAD ACORDE CRONOGRAMA	ESTADO EJECUCIÓN	OBSERVACIÓN	FECHA APROBACIÓN
Entregable 7. Acta de migración de contenido, conforme a lo señalado en el ítem 6.	Entregado	Acta generada por el contratista, revisada y firmada por las partes.	27/11/2024
Entregable 8. Acta de recibo desarrollos efectuados y horas consumidas.	Entregado	Acta generada por el contratista, revisada y firmada por las partes.	27/11/2024
Entregable 10. Documento de ejecución y resultado de las pruebas	Entregado	Acta generada por el contratista, revisada y firmada por las partes.	27/11/2024

Avance global desarrollos aprobados:
Planeado: 78%
Real: 79%.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO

No aplica.

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

- El día 06 de diciembre de 2024 se realiza reunión de seguimiento 019 del contrato. Se genera acta 019 de la reunión de seguimiento la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de seguimiento\Definitivas
- El día 10 de diciembre de 2024, se realiza reunión para verificación módulo buscador de normas y propuesta de conceptos jurídicos - nueva sede electrónica. Se genera acta de reunión 070 la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de reunion\Definitivas
- El día 11 de diciembre de 2024, se realiza reunión presentación por parte del contratista wireframe micrositio "Centro del Pensamiento" - nueva sede electrónica. Se genera acta de reunión 071 la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de reunion\Definitivas
- El día 17 de diciembre de 2024 se realiza reunión de seguimiento 020 del contrato. Se genera acta 020 de la reunión de seguimiento la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la

entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de seguimiento\Definitivas

- El día 13 de diciembre de 2024, se realiza reunión de presentación desarrollo Mapa Interactivo de Gestión de Proyectos. Se genera acta de reunión 072 la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de reunion\Definitivas
- El día 17 de diciembre de 2024, se realiza reunión de trabajo presentación propuesta de wirframe portal niños/niñas. Se genera acta de reunión 073 la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de reunion\Definitivas
- El día 20 de diciembre se realiza reunión de seguimiento 021 del contrato. Se genera acta 021 de la reunión de seguimiento la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de seguimiento\Definitivas
- El día 27 de diciembre se realiza reunión de seguimiento 022 del contrato. Se genera acta 022 de la reunión de seguimiento la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de seguimiento\Definitivas

2 OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI
2	Tipo de riesgo	Operacional
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	Mayores tiempos en la ejecución
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	Prórroga del plazo de ejecución del contrato 3 meses.
5	¿Fue oportuna la mitigación?	SI
OBSERVACIONES: El plazo de ejecución del contrato se prorrogó hasta el 16 de marzo de 2025.		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
X	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**
Entre el 23/12/2023 y el 18/04/2024	

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
	X
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	**PUBLICACIÓN EN SECOP II**	
	SI	**NO**
1	X	
2	X	
3	X	
4	X	
5	X	
6	X	
7	X	

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
8	X	

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

3 PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Valor del contrato: **$2.782.998.775,00 INCLUIDO IVA 19%**
Valor pagado del total del contrato: $1.338.083.775
Avance presupuestal: 48%

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Después de realizar una replanificación del cronograma cambia el porcentaje de avance global:
Avance planeado: **40%**
Avance real: **53%**

Nombre de tarea	% comp	Duración	Comienzo	Fin	Prec	% Esperado
Aerocivil 23001227 02 H3 DE 2023_V2.0	40%	109,5 días	lun 7/10/24	jue 13/03/25		53%
Portal CEA	18%	95 días	lun 7/10/24	jue 20/02/25		61%
Migración	18%	95 días	lun 7/10/24	jue 20/02/25		61%
Pruebas funcionales	92%	86 días	mar 15/10/24	vie 14/02/25		62%
Gobierno del portal CEA	0%	10 días	lun 23/12/24	lun 6/01/25		60%
Despliegue a producción CEA	0%	15,5 días	lun 16/12/24	mar 7/01/25		71%
Portal EXTRANET	42%	109,5 días	lun 7/10/24	jue 13/03/25		53%
Micrositios - Migración	46%	106 días	lun 7/10/24	vie 7/03/25		55%
Sede electrónica	9%	49 días	lun 16/12/24	vie 21/02/25		22%
Otros contenidos a migrar	32%	59 días	vie 22/11/24	jue 13/02/25		46%
Chatbot IA	61%	84 días	lun 7/10/24	mié 5/02/25		69%
Transferencia de conocimiento Extranet	0%	8,25 días	lun 24/02/25	jue 6/03/25		0%
Gobierno de sede electrónica	0%	7 días	lun 24/02/25	mar 4/03/25		0%
Despliegue a producción Extranet	0%	8,5 días	lun 3/03/25	jue 13/03/25		0%
Cierre	0%	0 días	jue 13/03/25	jue 13/03/25		0%

Se adjunta informe de avance presentado por el contratista.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

Firmado digitalmente por ANDRES FELIPE MOLINA BARRIOS
Fecha: 2025.01.27 12:08:13 -05'00'

ANDRES FELIPE MOLINA BARRIOS
93.406.002
SUPERVISOR

Firmado digitalmente por MARTHA CECILIA CANTOR MENDOZA
Fecha: 2025.01.27 12:04:05 -05'00'

MARTHA CECILIA CANTOR MENDOZA
21.015.375
SUPERVISORA

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.

Informe de Avance

Fecha del informe: 07 de enero de 2024

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – AEROCIVIL

OBJETO: "DISEÑAR, CONSTRUIR Y PONER Y EN FUNCIONAMIENTO NUEVOS PORTALES (EXTRANET E INTRANET) PARA LA ENTIDAD (VF) Lote No. 2 DISEÑAR, CONSTRUIR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PORTAL DE EXTRANET."

Número del contrato	No 23001227 02 H3 DE 2023
Plazo de ejecución	16 de marzo de 2025
Gerente del proyecto	Camilo Alberto Valencia cvalencia@nexura.com 57-524 04 44

El presente informe contiene el avance que se ha presentado durante el mes de diciembre del 2024. Cabe resaltar que en este mes se realiza una adición de tiempo la cual amplia la fecha fin del proyecto para el 16 de marzo de 2025, esto conlleva a realizar una replanificación del cronograma ampliando plazos de actividades.

Avance Global Sede Electrónica

40%


Avance real

53%

Avance planeado

13%

Desfase

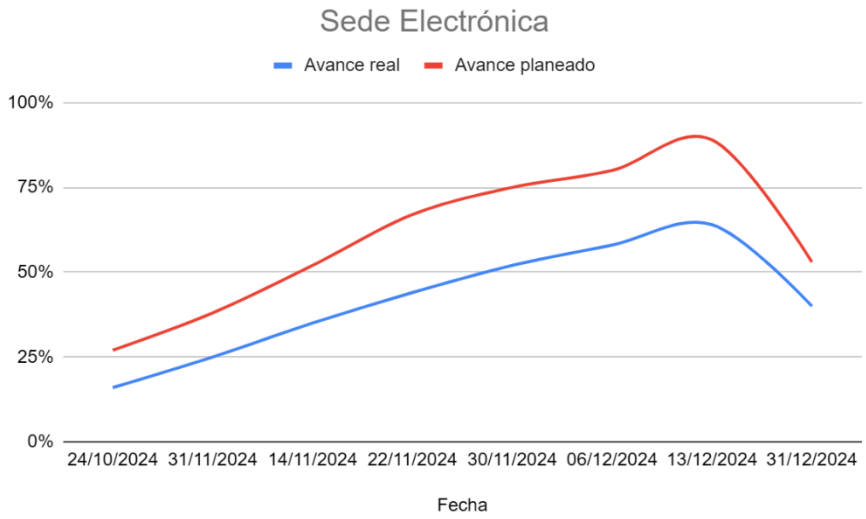

Para lograr el avance del 40% una vez realizada la replanificación del proyecto, se han realizado las siguientes actividades que cubren lo realizado para el portal del Centro de Estudios, Sede electrónica y migración.

Portal Centro de Estudios Aeronáuticos

- Ajustes de diseño
- Ajustes de nuevos contenidos enviados por el CEA

Hitos pendientes con retrasos	% Avance
Migración	99%
Diseño	99%
Despliegue a producción	23%
Gestión del cambio	90%
Gobierno de portal	50%

De acuerdo al cuadro anterior es importante indicar que los ajustes realizados se encuentran en el dominio de preproducción del portal del CEA https://preproduccion-cea.nexura.com/, esto fue notificado al área encargada para que puedan ser validados y nos den la aprobación

Tareas finales por ejecutar

- Aprobación de ajustes de diseño
- Preparación de ambientes productivos
- Gestión del cambio
- Realizar pruebas de seguridad y funcionales en los entornos productivos
- Actualización final de información nueva
- Direccionamiento DNS a nuevo servidor y portal

Portal Sede electrónica

- Ajustes wireframe de centro de pensamiento aeronáutico
- Ajustes del wireframe menú participa
- Ajuste de logos menú portal sede electrónica
- Elaboración de animación autoridad aeronáutica
- Elaboración de wireframe del portal de niños
- Montaje de publicaciones especiales de servicios aeroportuario y a la navegación aérea
- Entrenamiento de chatbot
- Montaje de menú participa
- Montaje de plantilla aeropuerto
- Montaje de publicaciones especiales de servicios aeroportuario y a la navegación aérea

- Reentrenamiento Chatbot
- Presentación de mockup portal de niños
- Presentación mapa de proyectos
- Migración de contenidos nuevo portal de sede electrónica

A continuación, se presentan los porcentajes de avance que se tienen por hitos principales:

Hitos pendientes con retrasos	% Avance
Diseño	95%
Migración	95%
Arquitectura de contenidos	60%
Portal de niños y niñas	40%
Chatbot	92%
Despliegue a producción	0%
Gestión del cambio	0%
Gobierno de portal	0%

Tareas finales por ejecutar

- Migración de contenidos restantes
- Validación de contenidos migrados
- Validación de nuevos desarrollos
- Preparación de ambientes productivos
- Realizar pruebas de seguridad y funcionales en los entornos productivos
- Actualización final de información nueva
- Implementar la gestión del cambio
- Implementar el gobierno del portal
- Direccionamiento DNS a nuevo servidor y portal

Avance Global Desarrollos Aprobados

49%


Avance real

57%

Avance planeado

8%

Desfase

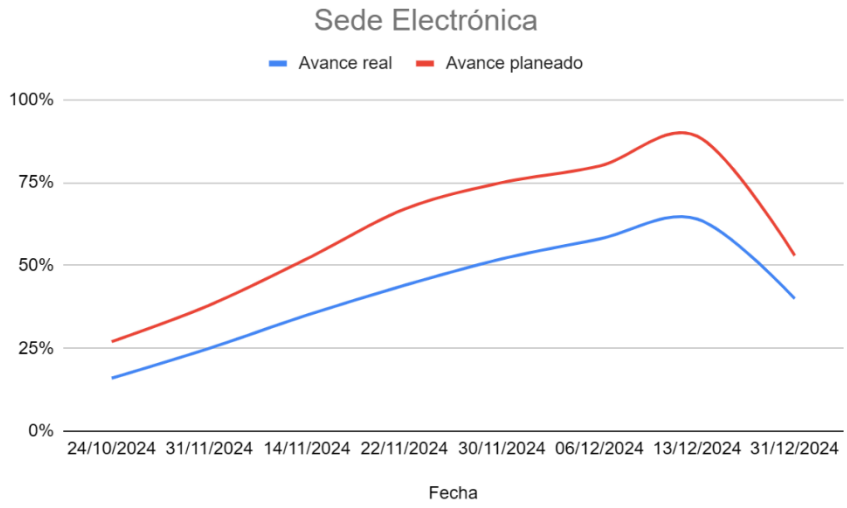

Para lograr el avance del 49% una vez ampliadas las fechas del nuevo cronograma se han realizado las siguientes actividades de desarrollo:

- Ajustes solicitados
  - Ajustes solicitados
  - Investigación interna de accidentes
  - Entrega de documento técnico APIS de información
  - Ajuste consulta meteorológica
  - Avance en desarrollos
- Ajustes del mapa catálogo de aeropuertos
  - Ajustes del mapa catálogo de aeropuertos
- Aseguramiento de calidad
  - Examen de evaluación de seguridad y salud en el trabajo
  - Formularios locales comerciales
  - Módulo jurisprudencia
- Listos para presentación
  - Mapa interactivo de proyectos
- Validación por parte de Aerocivil

- Conceptos jurídicos
- Buscador de normas

Avances de desarrollos

Aerocivil 23001227 02 H3 DE 2023_V2.0	49%
Horas de desarrollo	49%
Examen de evaluación de Seguridad y Salud en el trabajo, certificado de resultado del exámen, módulo de gestión de evaluaciones y del banco de preguntas	16%
Mapa interactivo gestion de proyectos	22%
Mapa Catálogo de Aeropuertos	14%
Módulo de gestión interna para la expedición de la certificación de accidentalidad	49%
Conceptos jurídicos	46%
Listado de accidentes e incidentes	63%
Módulo jurisprudencia	51%
Formulario locales comerciales en Aeropuerto	84%
Formulario posibles casos de corrupción	71%
Consulta de información Meteorológica	74%
Consulta de licencias de Personal Aeronáutico	74%
Consulta de certificados médicos de personal aeronáutico	96%
Consulta de chequeos de vuelo de personal aeronáutico	96%
Consulta de empresas aéreas	96%
Consulta de matrículas de aeronaves	96%
Actualización listas de verificación y listas de NOTAM válidos	96%
Busquedas avanzadas, con filtros (Módulo Normatividad)	74%
Formulario para comentarios a proyectos de norma	74%

Este informe contiene el detalle después de haber realizado la replanificación de las actividades las cuales tenían un retraso considerable. Cabe resaltar que en los dos cronogramas se disminuyo el avance que se presento en el mes de noviembre, esto se debe a nuevas actividades que ingresaron en la planeación del cronograma y que anteriormente no estaban, tanto para la sede electrónica como nuevos desarrollos.

Agradezco toda la atención prestada, seguiremos trabajando para tener una finalización a tiempo.

Atentamente,

Camilo Alberto Valencia
Gerente de proyecto
Cel: 320 5545613
UT PORTAL AEROCIVIL 2023

---Fin de Documento---
