

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	**PROCESO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG JUNTO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015**	**149 días**	**mié 29/05/24**	**lun 23/12/24**	
2	**ETAPA 1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE AVANCE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG), ARMONIZADO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015**	**58 días**	**mié 29/05/24**	**vie 16/08/24**	
3	Plan de Trabajo, en donde se determinen las actividades necesarias para adelantar el proceso de actualización, implementación y mejora continua del MIPG y del Sistema de Gestión de Calidad, en articulación con la Norma ISO	10 días	mié 29/05/24	mar 11/06/24	
4	Socialización y comunicación al equipo de directivos y demás personal de las áreas del CONSERVATORIO DEL TOLIMA la visión y la estrategia de cambio, a partir del desarrollo de las actividades definidas en el Plan de Trabajo.	1 día	mar 11/06/24	mar 11/06/24	
5	Análisis de la situación actual del CONSERVATORIO DEL TOLIMA, frente a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG versión 05 y su articulación con el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.	30 días	lun 3/06/24	vie 12/07/24	
6	Consolidación, análisis y documentación del Plan de Mejoramiento, resultante del reporte de información en la Plataforma del Formulario Único de Reporte de Avances en la Gestión FURAG, correspondiente a la vigencia 2023	20 días	lun 22/07/24	vie 16/08/24	
7	**ETAPA 2. ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015**	**46 días**	**mié 10/07/24**	**mié 11/09/24**	
8	Análisis del estado actual de los diferentes documentos que componen el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG versión 05 y el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 del CONSERVATORIO DEL TOLIMA, según lo establecido en la normatividad vigente	15 días	mié 10/07/24	mar 30/07/24	



Proyecto: PMI Conservatorio
Fecha: mar 9/07/24


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
9	Actualizar los documentos que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, como son: Políticas, Planes, Mapa de Procesos, Manuales, Mapas de Riesgos, Normogramas, Indicadores, Caracterizaciones	46 días	mié 10/07/24	mié 11/09/24	
10	Documentos 1er. Nivel	35 días	mié 10/07/24	mar 27/08/24	
11	Políticas	5 días	mié 10/07/24	mar 16/07/24	
12	Mapa de procesos	5 días	mié 10/07/24	mar 16/07/24	
13	Planes	15 días	mié 17/07/24	mar 6/08/24	11
14	Manuales	15 días	mié 7/08/24	mar 27/08/24	13
15	Documentos 2o. Nivel:	31 días	mié 17/07/24	mié 28/08/24	
16	Normogramas	10 días	mié 17/07/24	mar 30/07/24	12
17	Mapas de Riesgos	20 días	jue 1/08/24	mié 28/08/24	16
18	Caracterizaciones de Procesos	20 días	jue 1/08/24	mié 28/08/24	
19	Indicadores de gestión	10 días	mié 31/07/24	mar 13/08/24	16
20	Documentos 3er. Nivel:	30 días	jue 1/08/24	mié 11/09/24	
21	Procedimientos	30 días	jue 1/08/24	mié 11/09/24	19
22	Instructivos, guías	15 días	jue 1/08/24	mié 21/08/24	21
23	Formatos	15 días	jue 1/08/24	mié 21/08/24	22
24	**ETAPA 3. ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) Y AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015**	**137 días**	**jue 13/06/24**	**vie 20/12/24**	
25	Seguimiento, medición y el análisis de los procesos identificados en la etapa de actualización de la documentación del Modelo MIPG y del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015	20 días	mié 7/08/24	mar 3/09/24	

Proyecto: PMI Conservatorio
Fecha: mar 9/07/24




Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
26	a. Indicadores de Gestión (Fichas técnicas, medición, acciones de mejora)	15 días	mié 14/08/24	mar 3/09/24	19
27	b. Plan de Gestión de Cambio	8 días	mié 7/08/24	vie 16/08/24	13
28	c. Evidencias del Control de Salidas y/o Productos No Conformes	8 días	lun 19/08/24	mié 28/08/24	27
29	Verificación del Sistema.	77 días	jue 13/06/24	vie 27/09/24	
30	a. Auditorías internas	6 días	jue 13/06/24	jue 20/06/24	
31	b. Acciones Correctivas y de Mejora, resultantes de los procesos de mejora continua de la Institución	8 días	lun 15/07/24	mié 24/07/24	
32	c. Revisión por la Dirección	3 días	mié 7/08/24	vie 9/08/24	
33	d. Auditorías Externas	15 días	lun 9/09/24	vie 27/09/24	
34	Mejora contínua del SGC y MIPG	60 días	lun 30/09/24	vie 20/12/24	33
35	**ETAPA 4. AFIANZAMIENTO DEL COMPROMISO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DEL CAMBIO**	**138 días**	**jue 13/06/24**	**lun 23/12/24**	
36	**Jornadas de sensibilización, socialización y capacitación requeridas para la apropiación del proceso de implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001**	**138 días**	**jue 13/06/24**	**lun 23/12/24**	
37	Sensibilización general sobre la importancia de MIPG y el SGC ISO 9001:2015 para una efectiva gestión pública.	1 día	jue 18/07/24	jue 18/07/24	
38	**Preparación Auditorías Internas de Calidad**	22 días	jue 13/06/24	vie 12/07/24	
39	Alistamiento Auditorías	1 día	jue 13/06/24	jue 13/06/24	
40	Redacción de hallazgos	1 día	jue 20/06/24	jue 20/06/24	
41	Revisión de Informes de Auditoría	1 día	vie 12/07/24	vie 12/07/24	
42	**La Ruta de la Mejora Continua**	16 días	jue 25/07/24	jue 15/08/24	
43	Acciones Correctivas y de Mejora	1 día	jue 25/07/24	jue 25/07/24	


Proyecto: PMI Conservatorio
Fecha: mar 9/07/24



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
44	Control de salidas no conformes y gestión del cambio	1 día	jue 15/08/24	jue 15/08/24	
45	**Socialización de los ajustes a los documentos que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG el SGC ISO 9001:2015**	4 días	mar 27/08/24	vie 30/08/24	
46	Sesión 01	1 día	mar 27/08/24	mar 27/08/24	
47	Sesión 02	1 día	vie 30/08/24	vie 30/08/24	
48	**Preparación Auditorías Externas de Calidad**	2 días	jue 5/09/24	vie 6/09/24	
49	**Aspectos claves para la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015**	**1 día**	**jue 17/10/24**	**jue 17/10/24**	
50	Sesión 01	1 día	jue 17/10/24	jue 17/10/24	
51	Sesión 02	1 día	jue 21/11/24	jue 21/11/24	
52	Sesión 03	1 día	jue 19/12/24	jue 19/12/24	
53	Cierre de actividades	1 día	lun 23/12/24	lun 23/12/24	


Proyecto: PMI Conservatorio
Fecha: mar 9/07/24



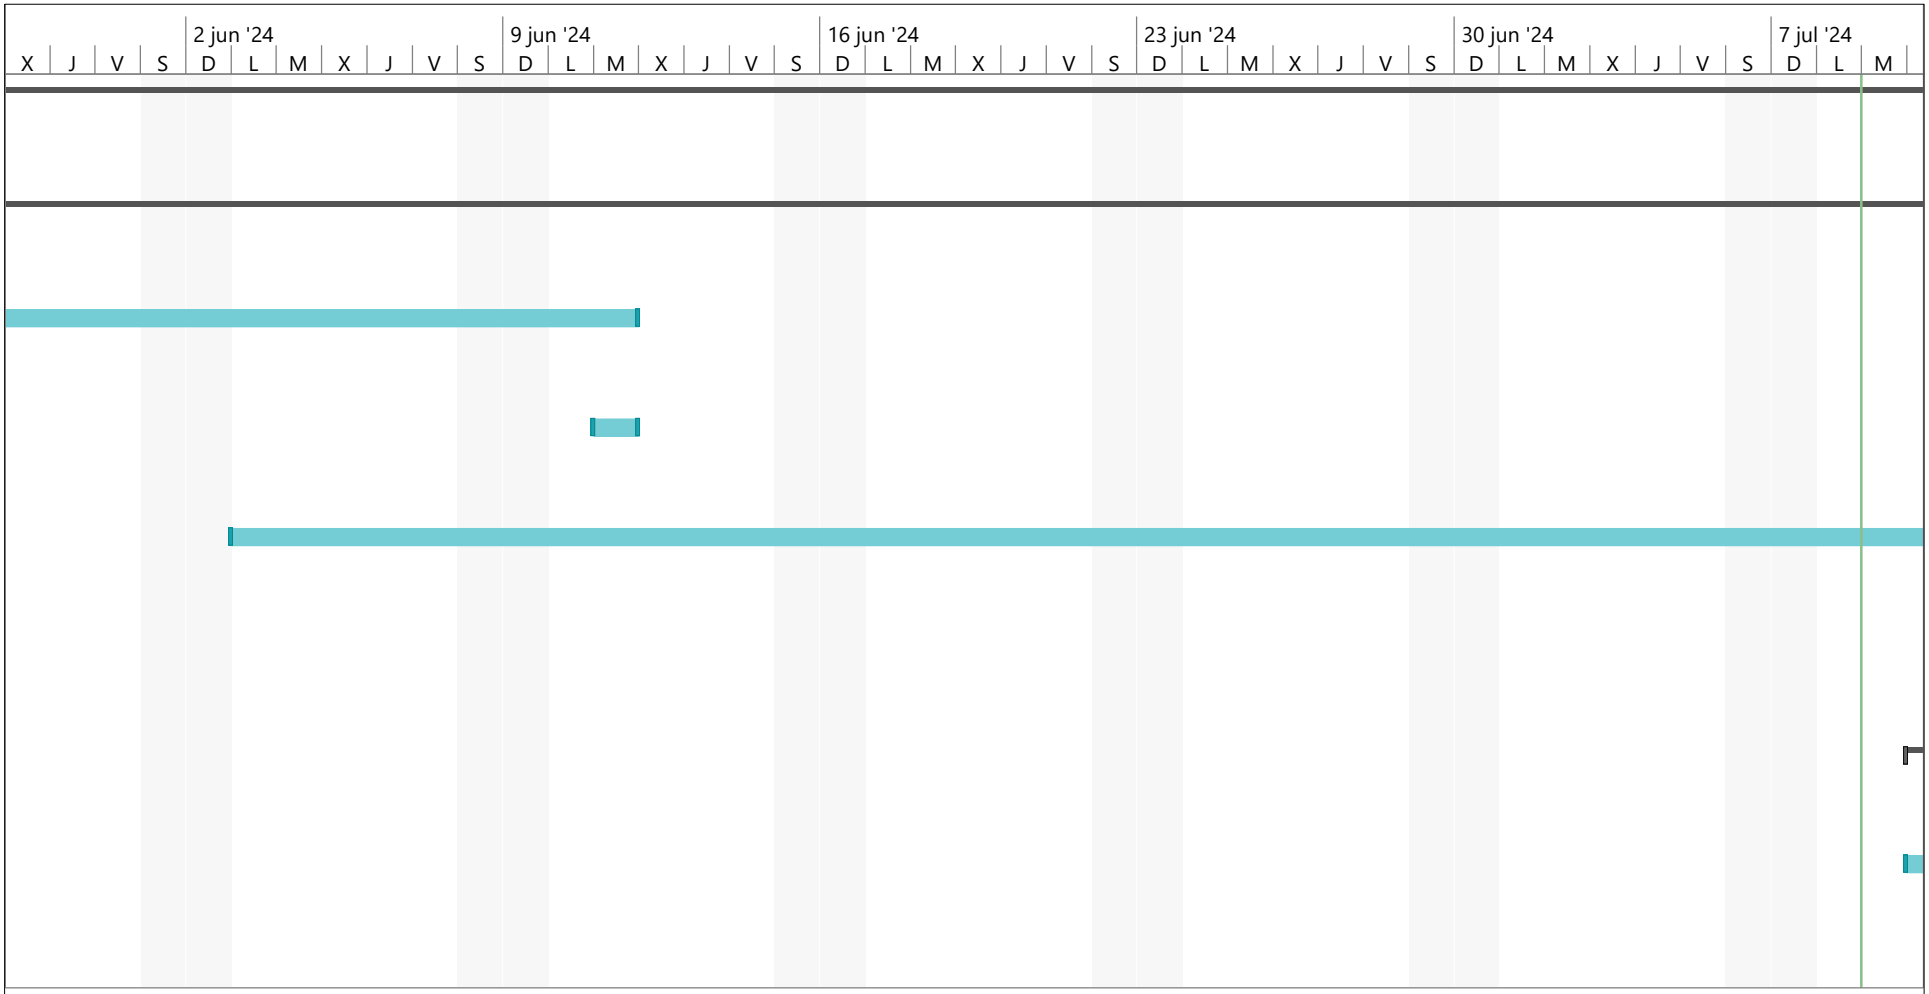


Proyecto: PMI Conservatorio
Fecha: mar 9/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

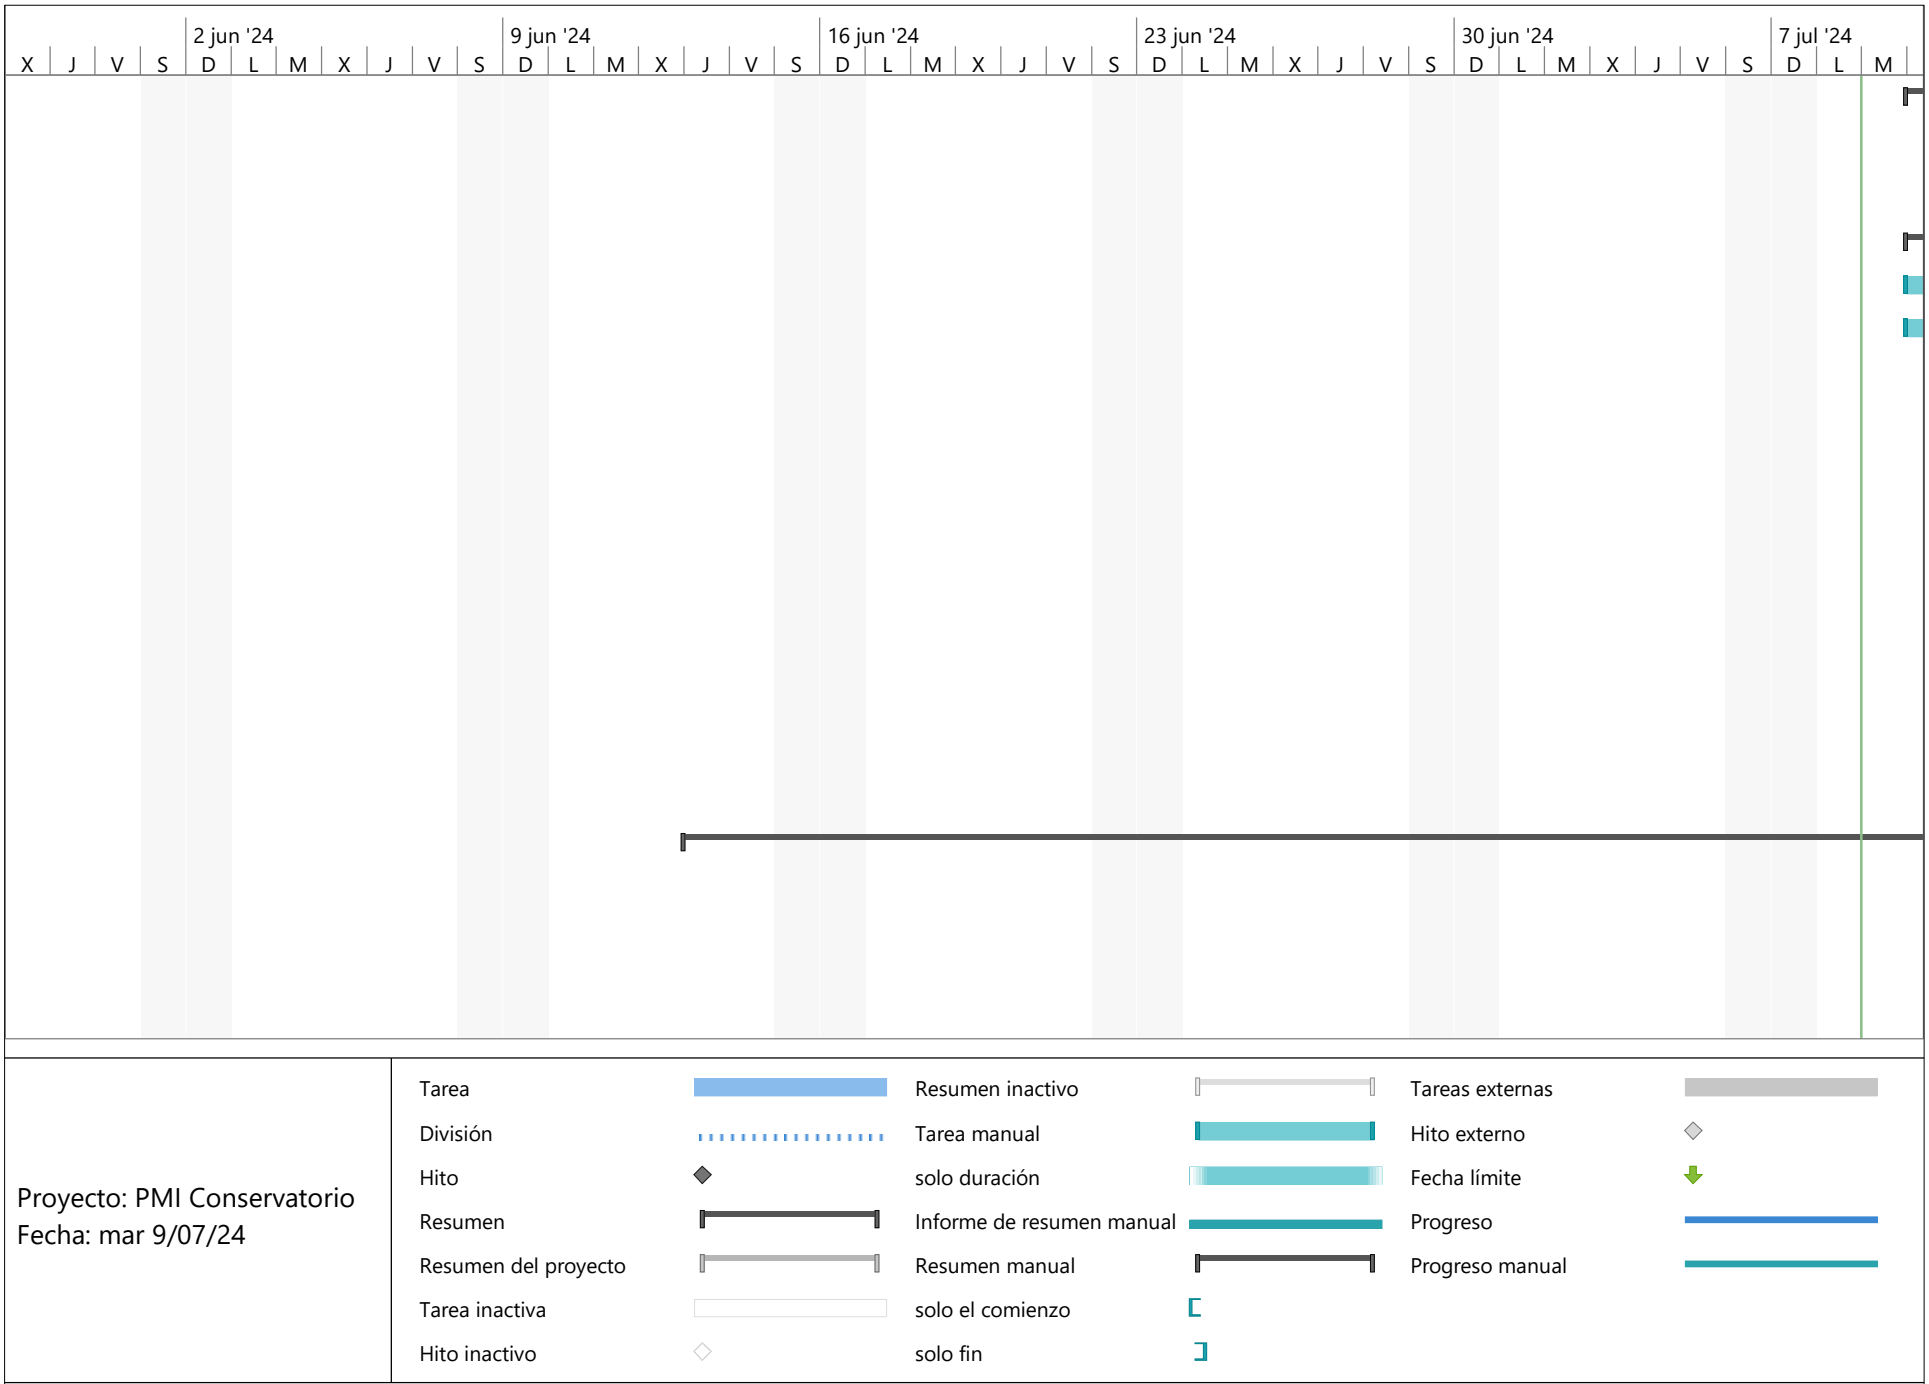


Proyecto: PMI Conservatorio
Fecha: mar 9/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

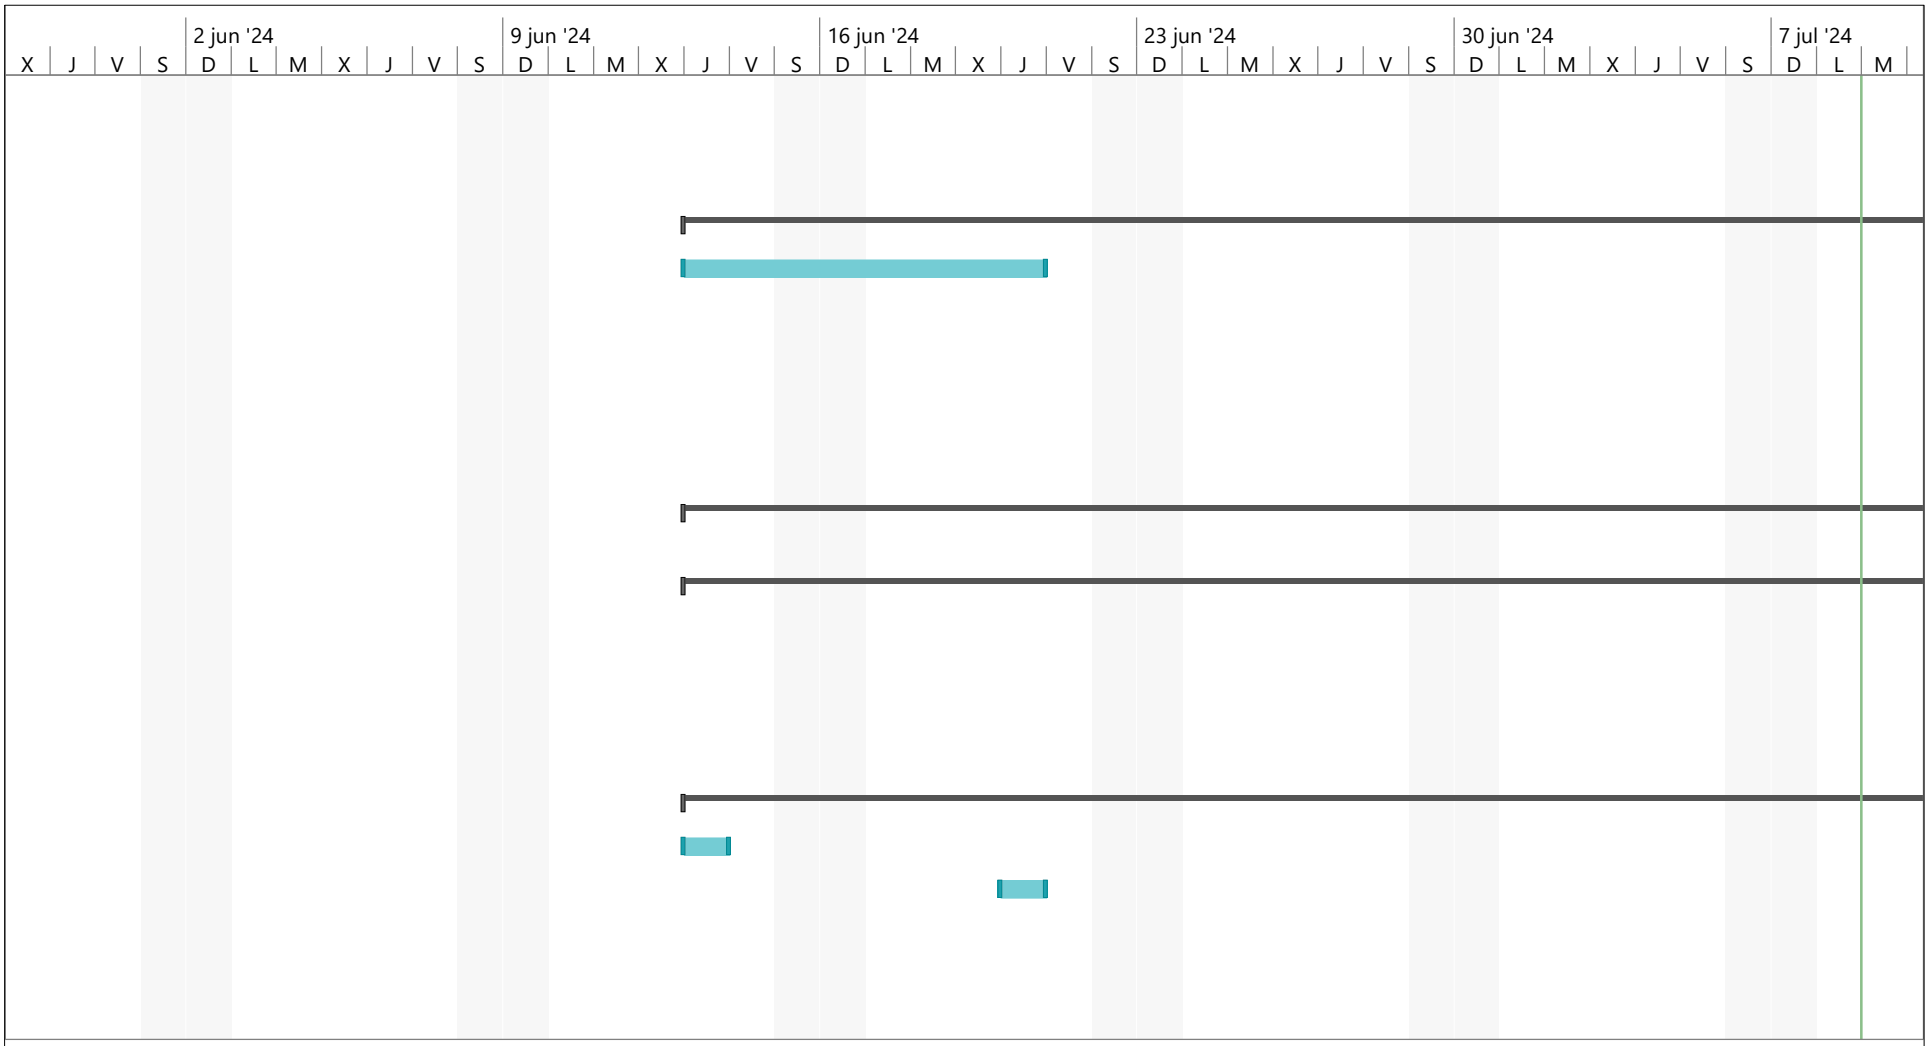


Proyecto: PMI Conservatorio
Fecha: mar 9/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

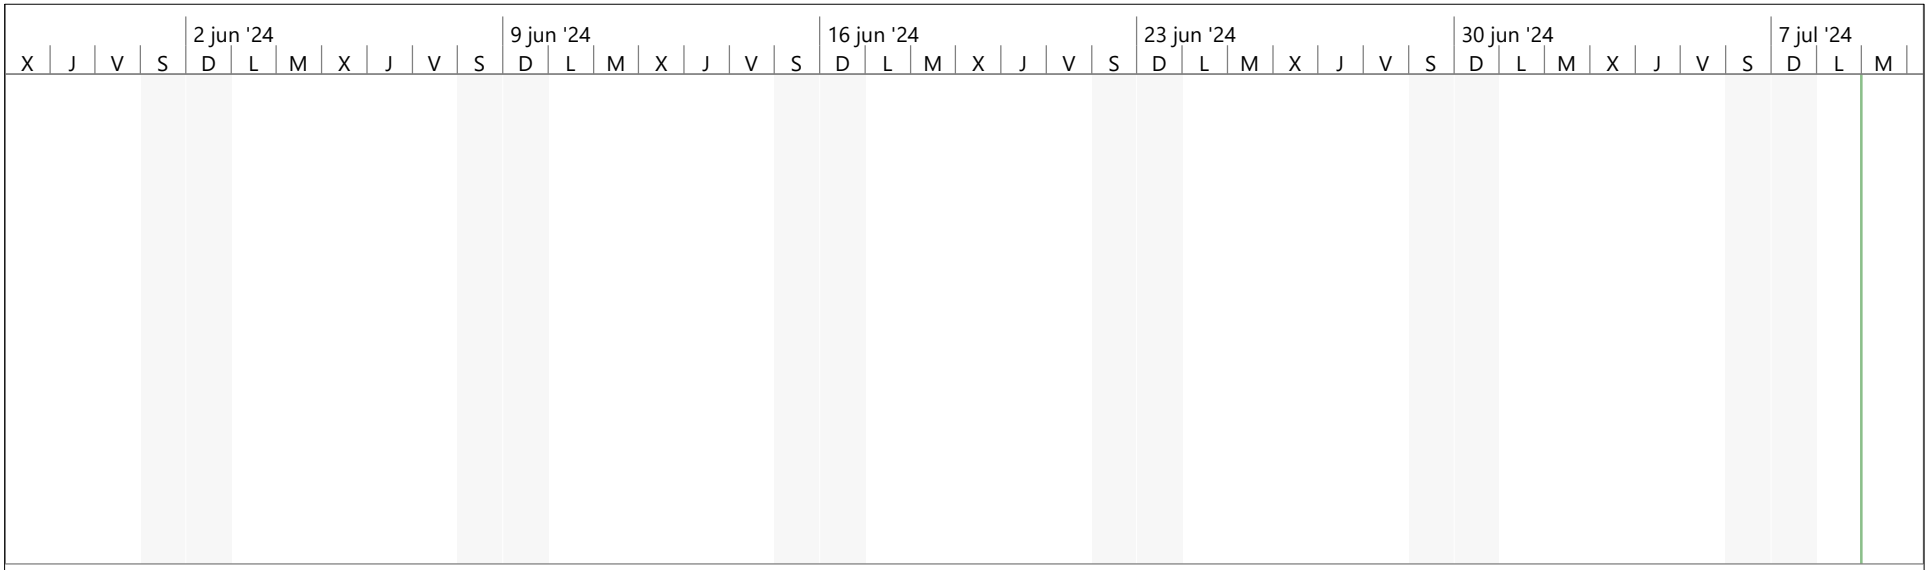


Proyecto: PMI Conservatorio
Fecha: mar 9/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

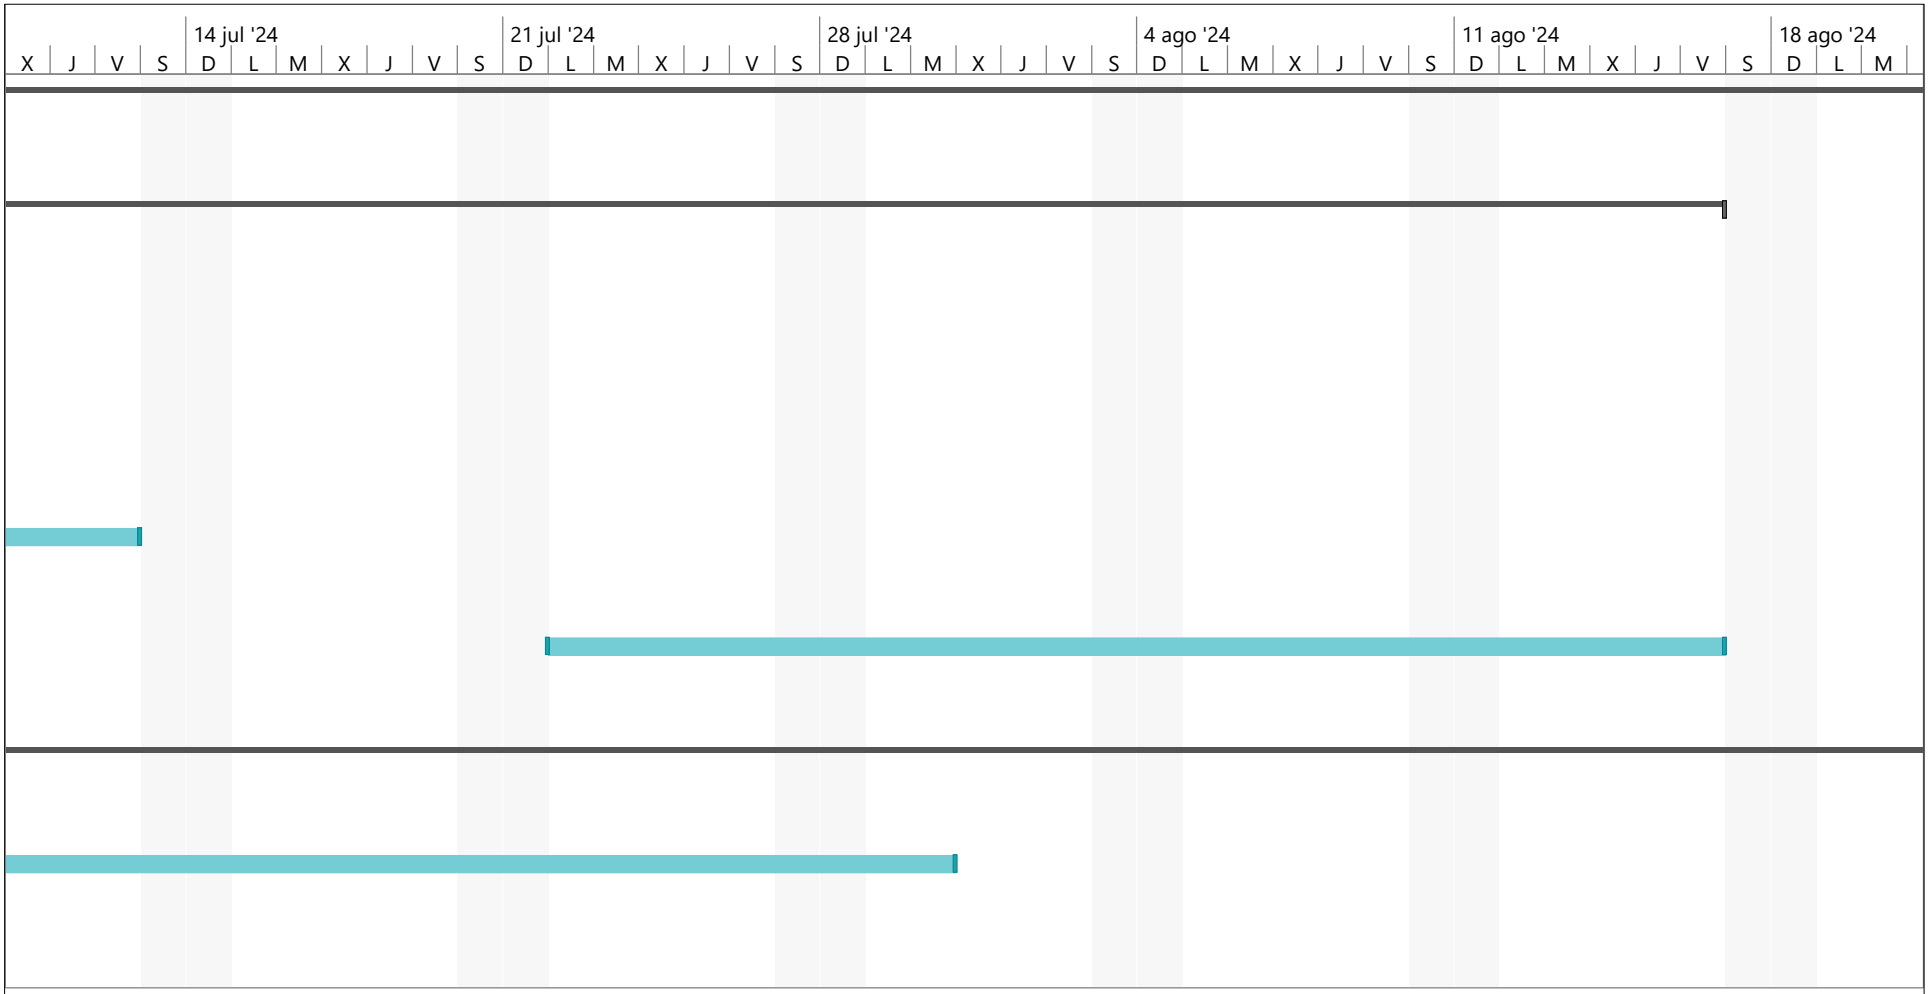


Proyecto: PMI Conservatorio
Fecha: mar 9/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

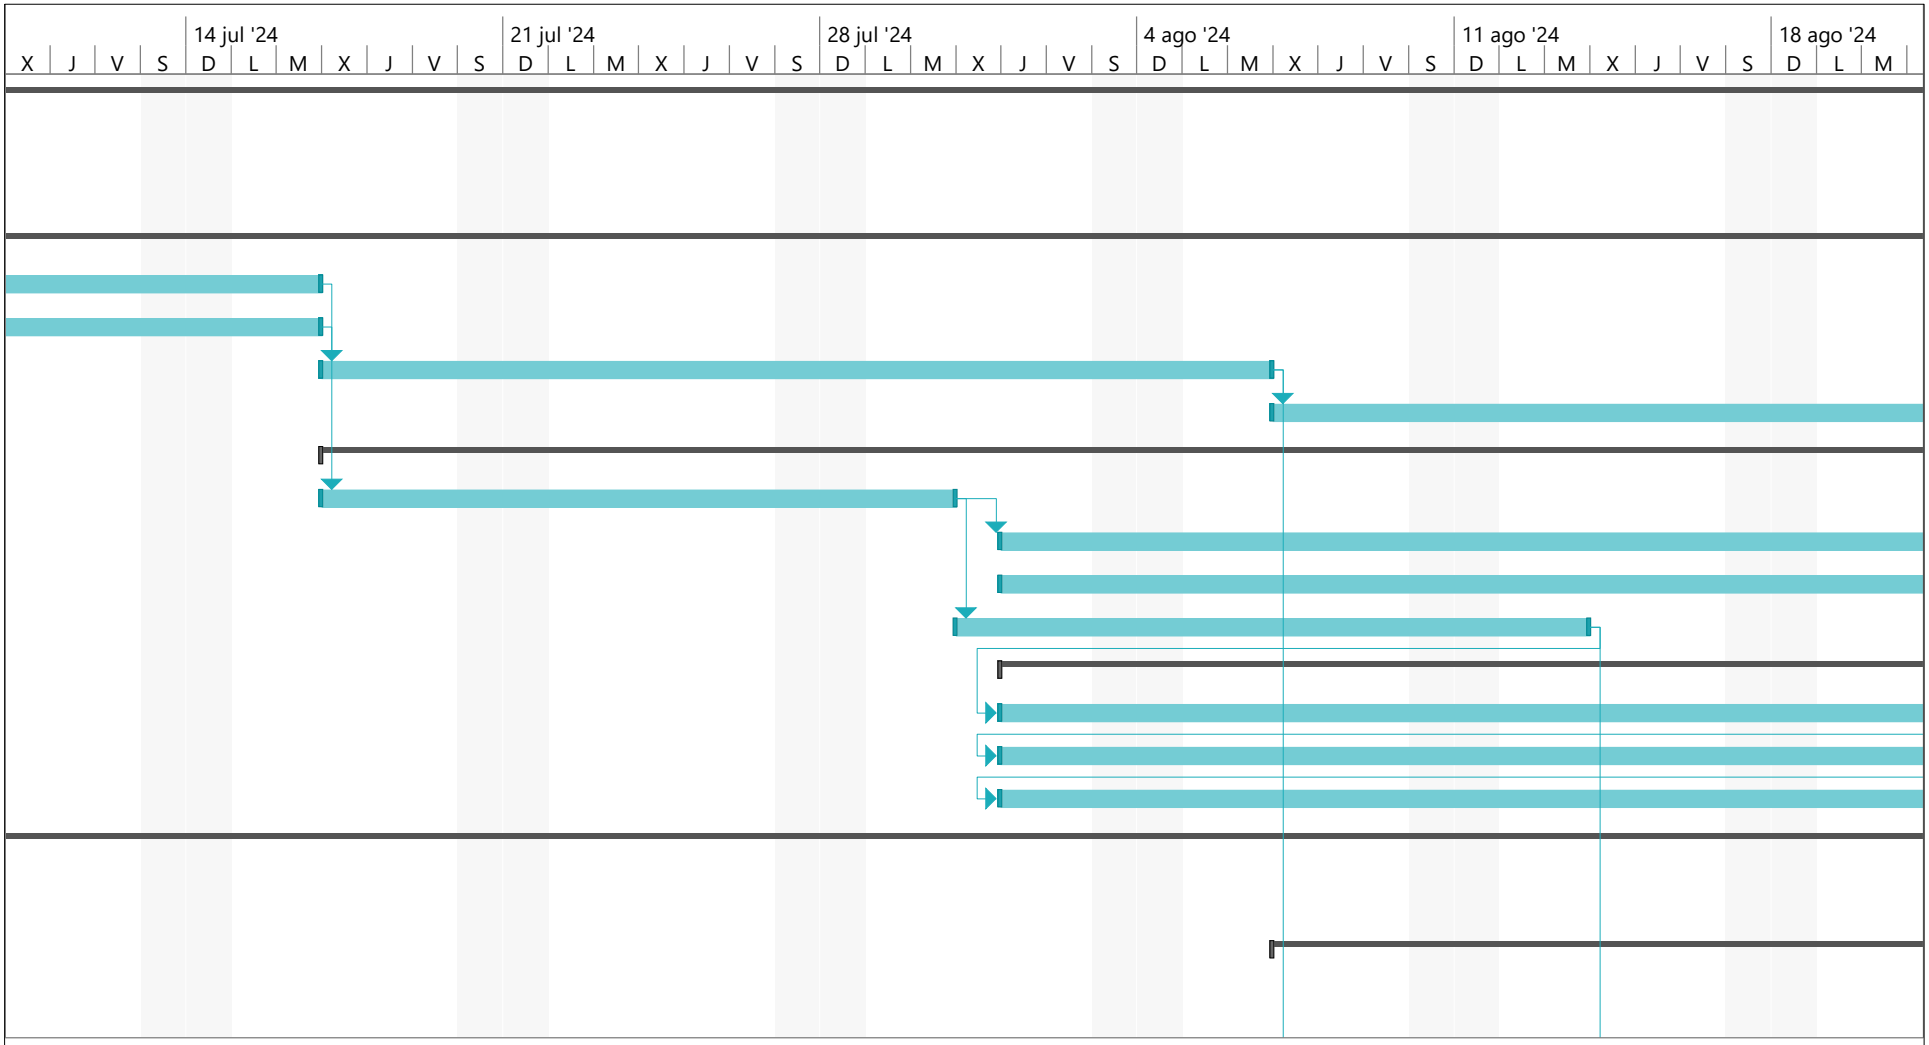


Proyecto: PMI Conservatorio
Fecha: mar 9/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

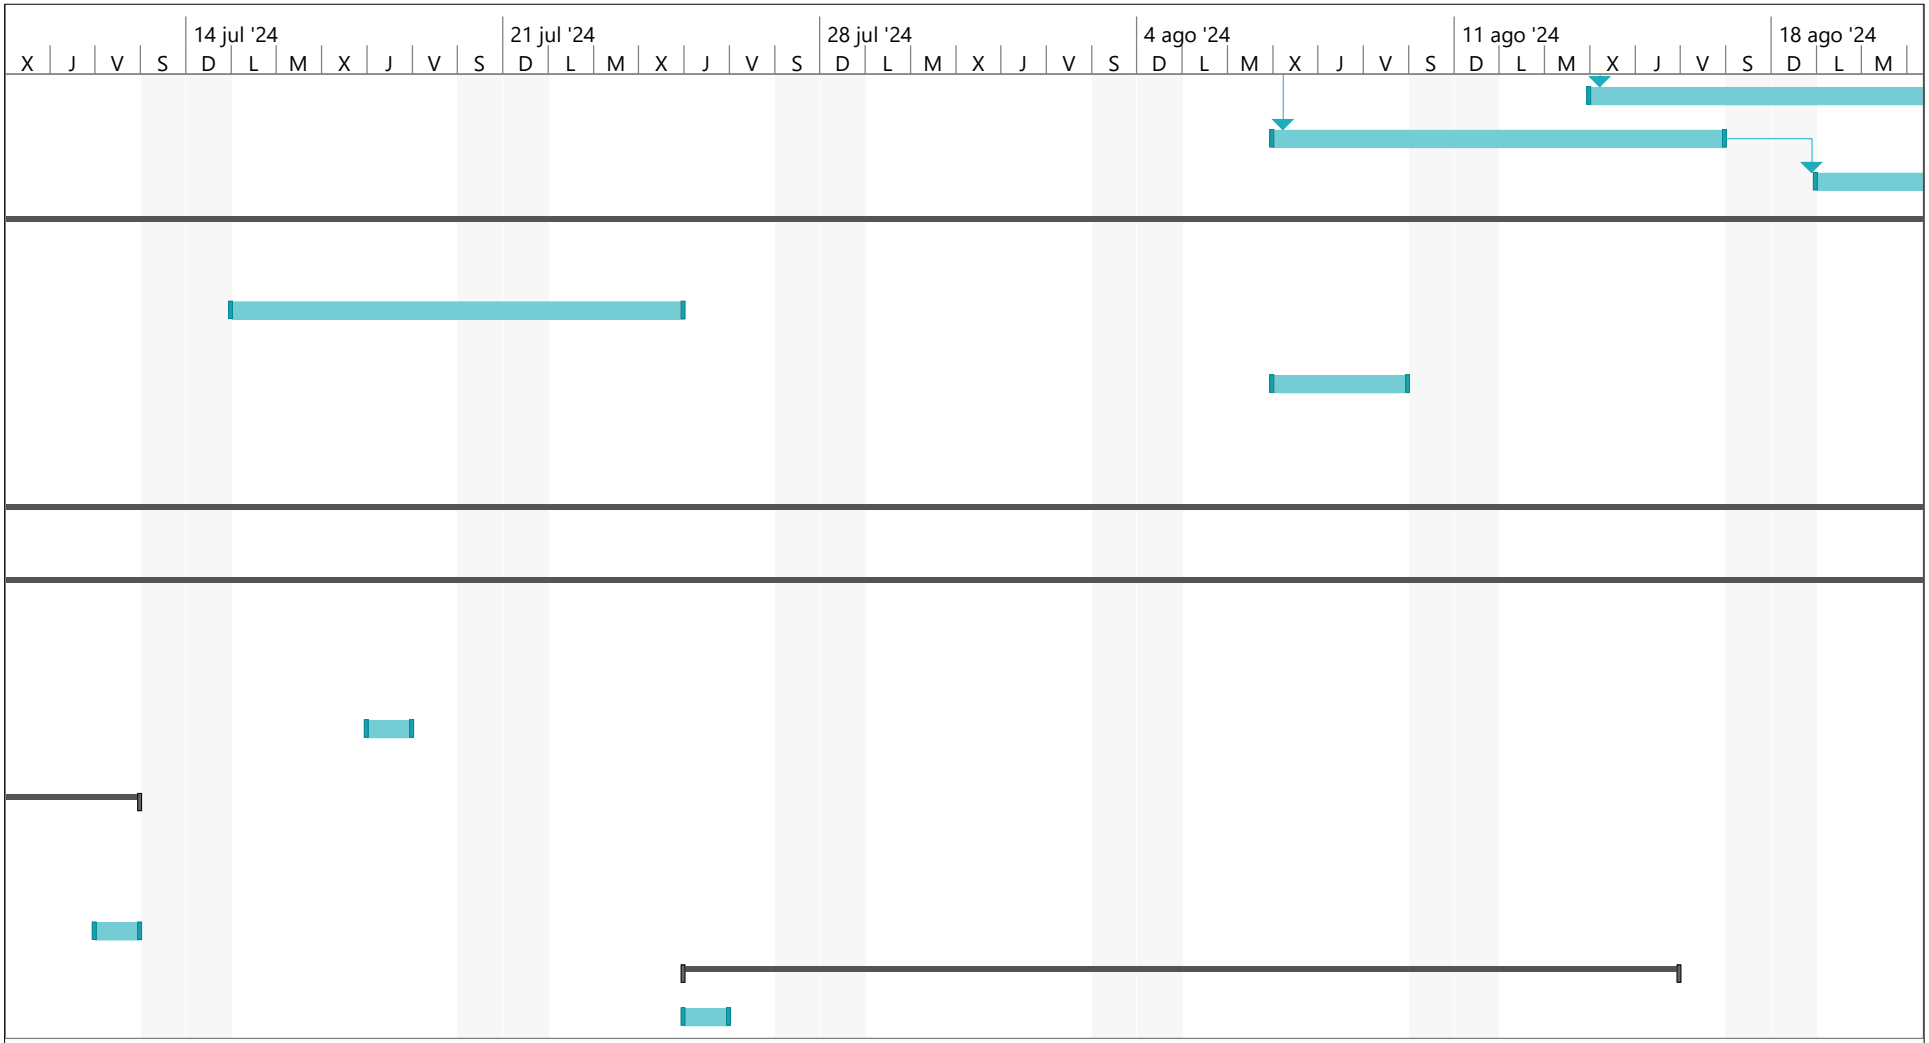


Proyecto: PMI Conservatorio
Fecha: mar 9/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

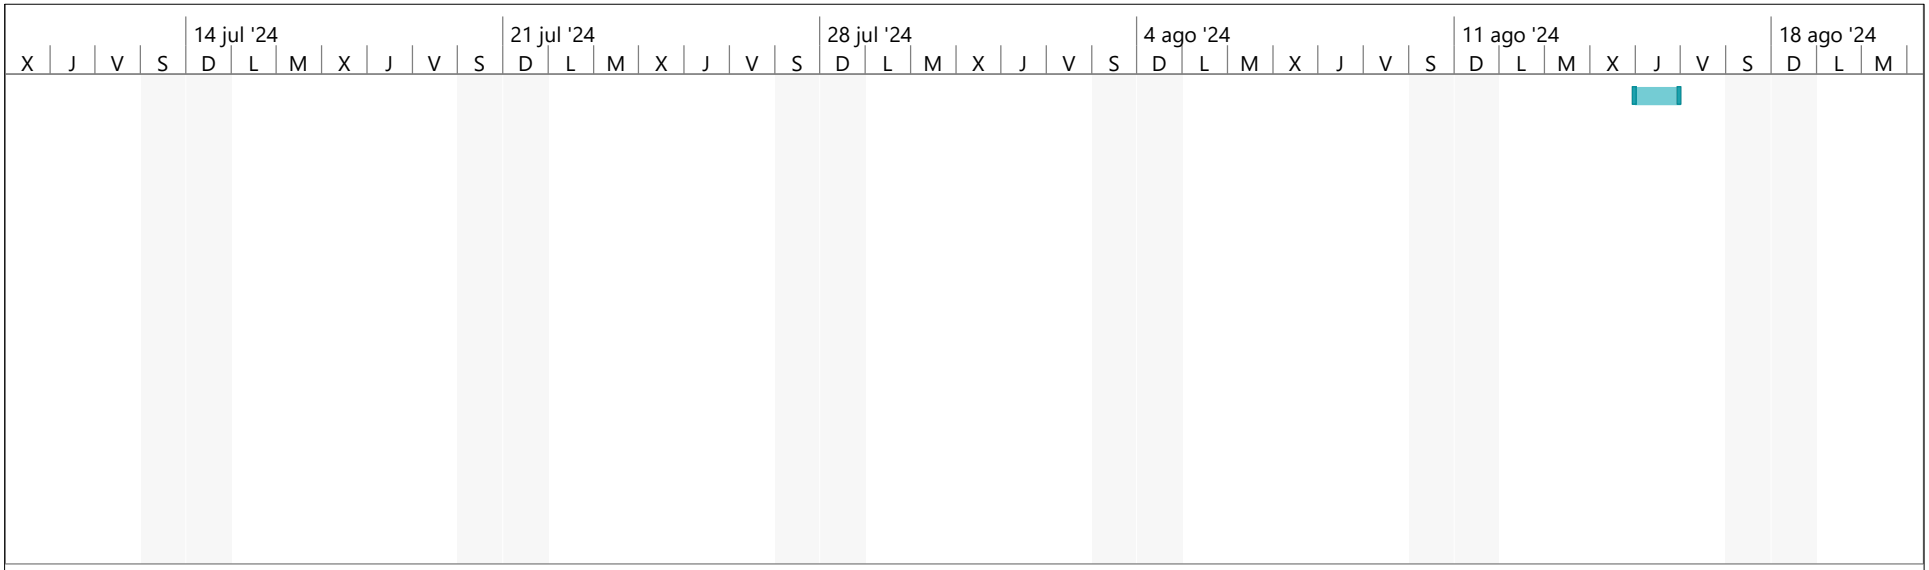


Proyecto: PMI Conservatorio
Fecha: mar 9/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

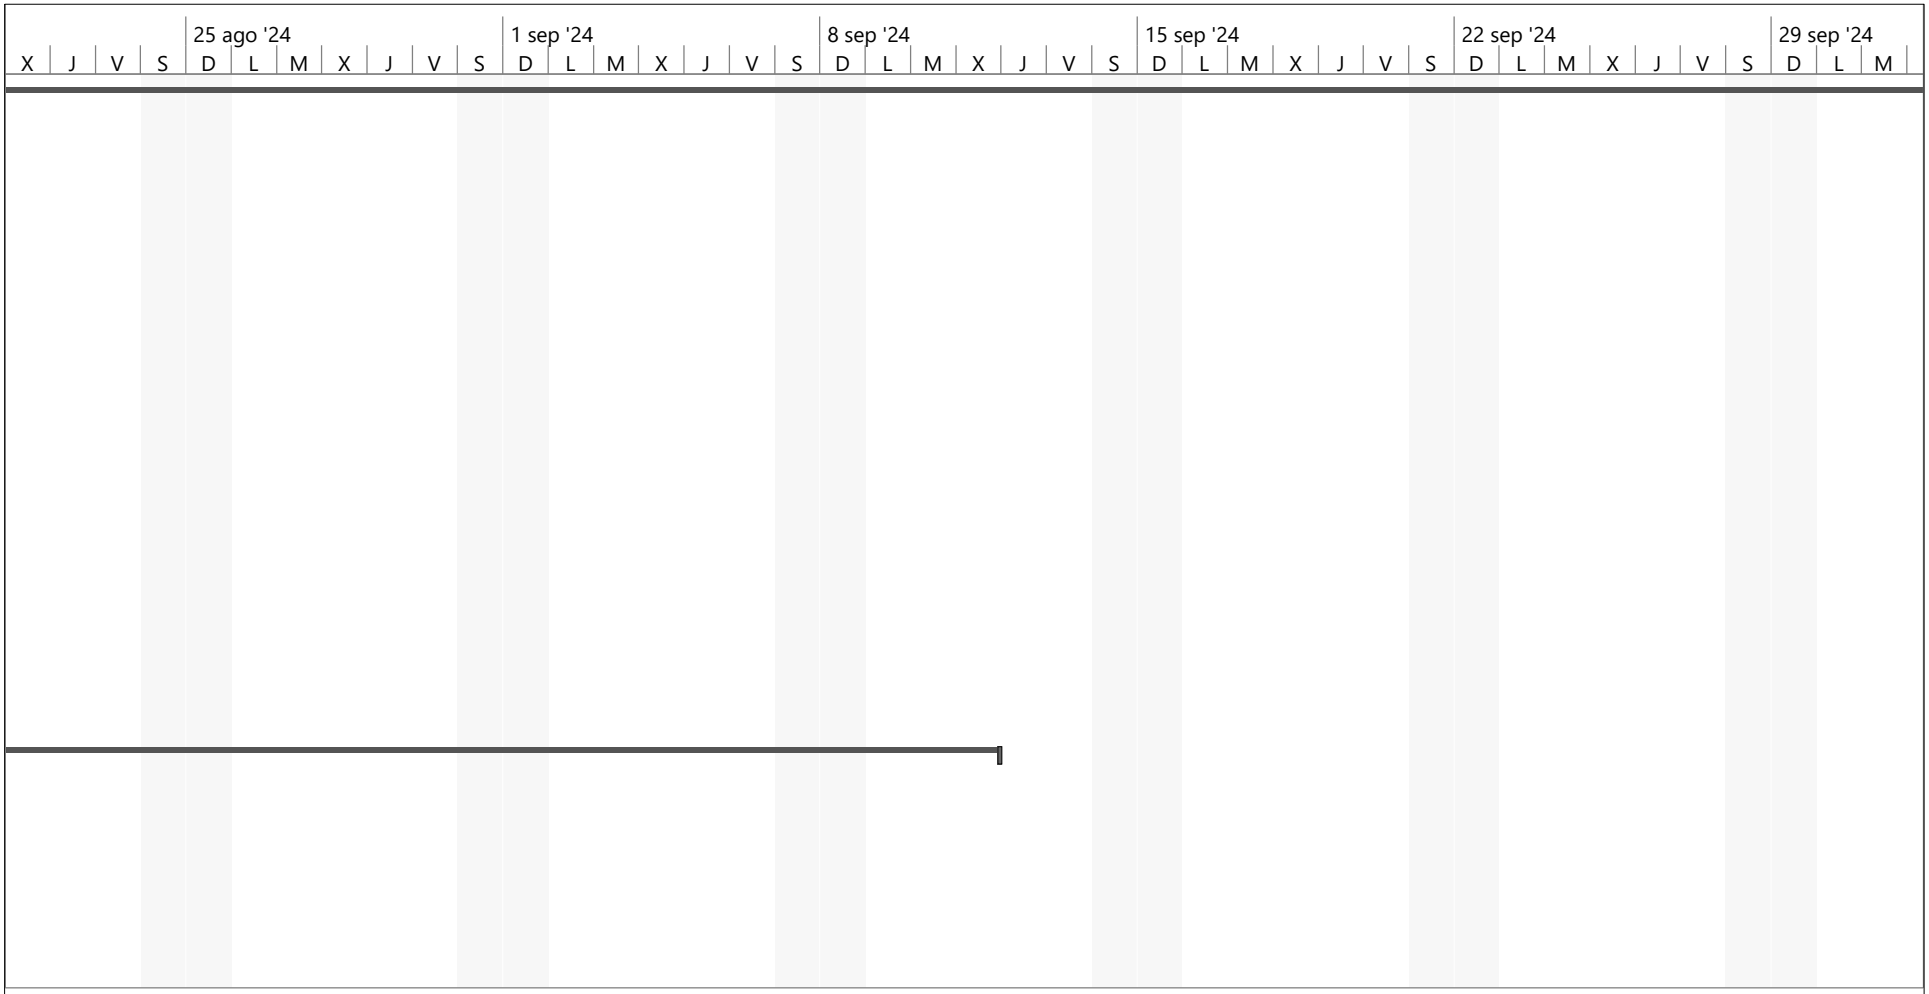


Proyecto: PMI Conservatorio
Fecha: mar 9/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

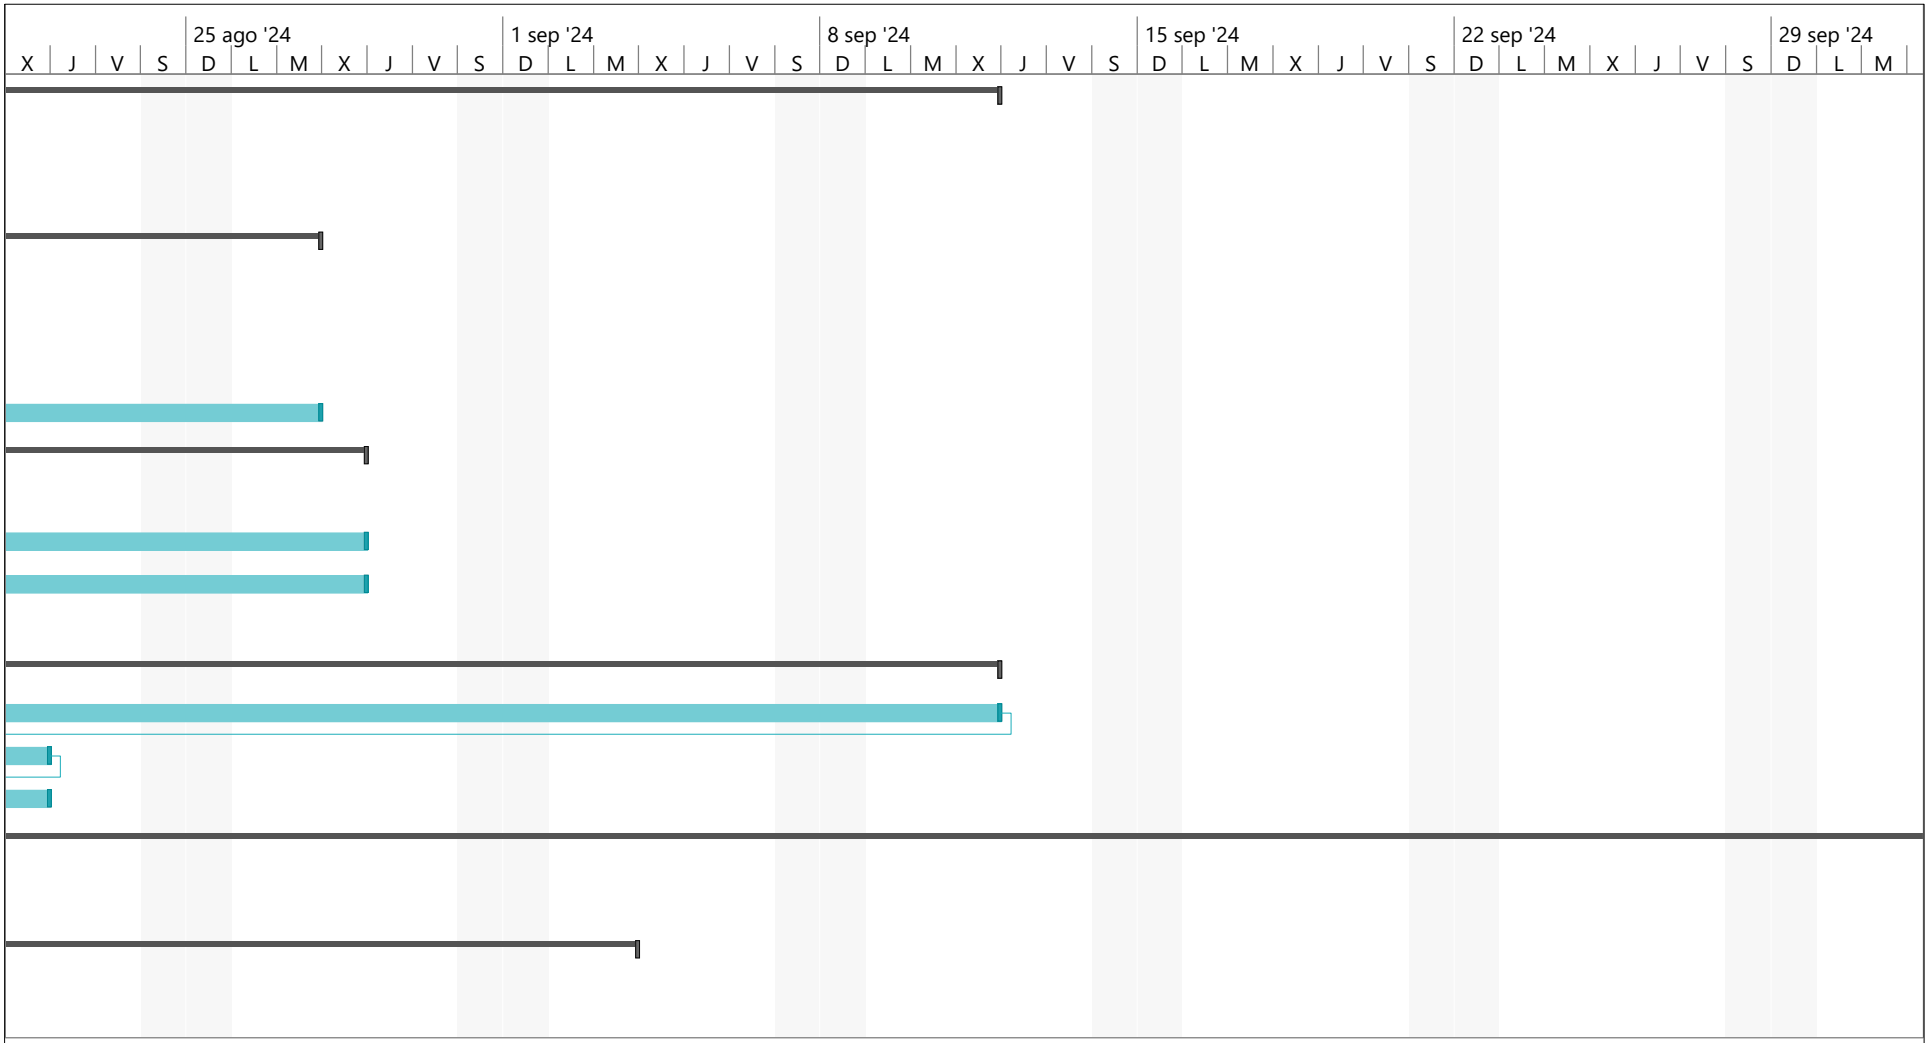


Proyecto: PMI Conservatorio
Fecha: mar 9/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

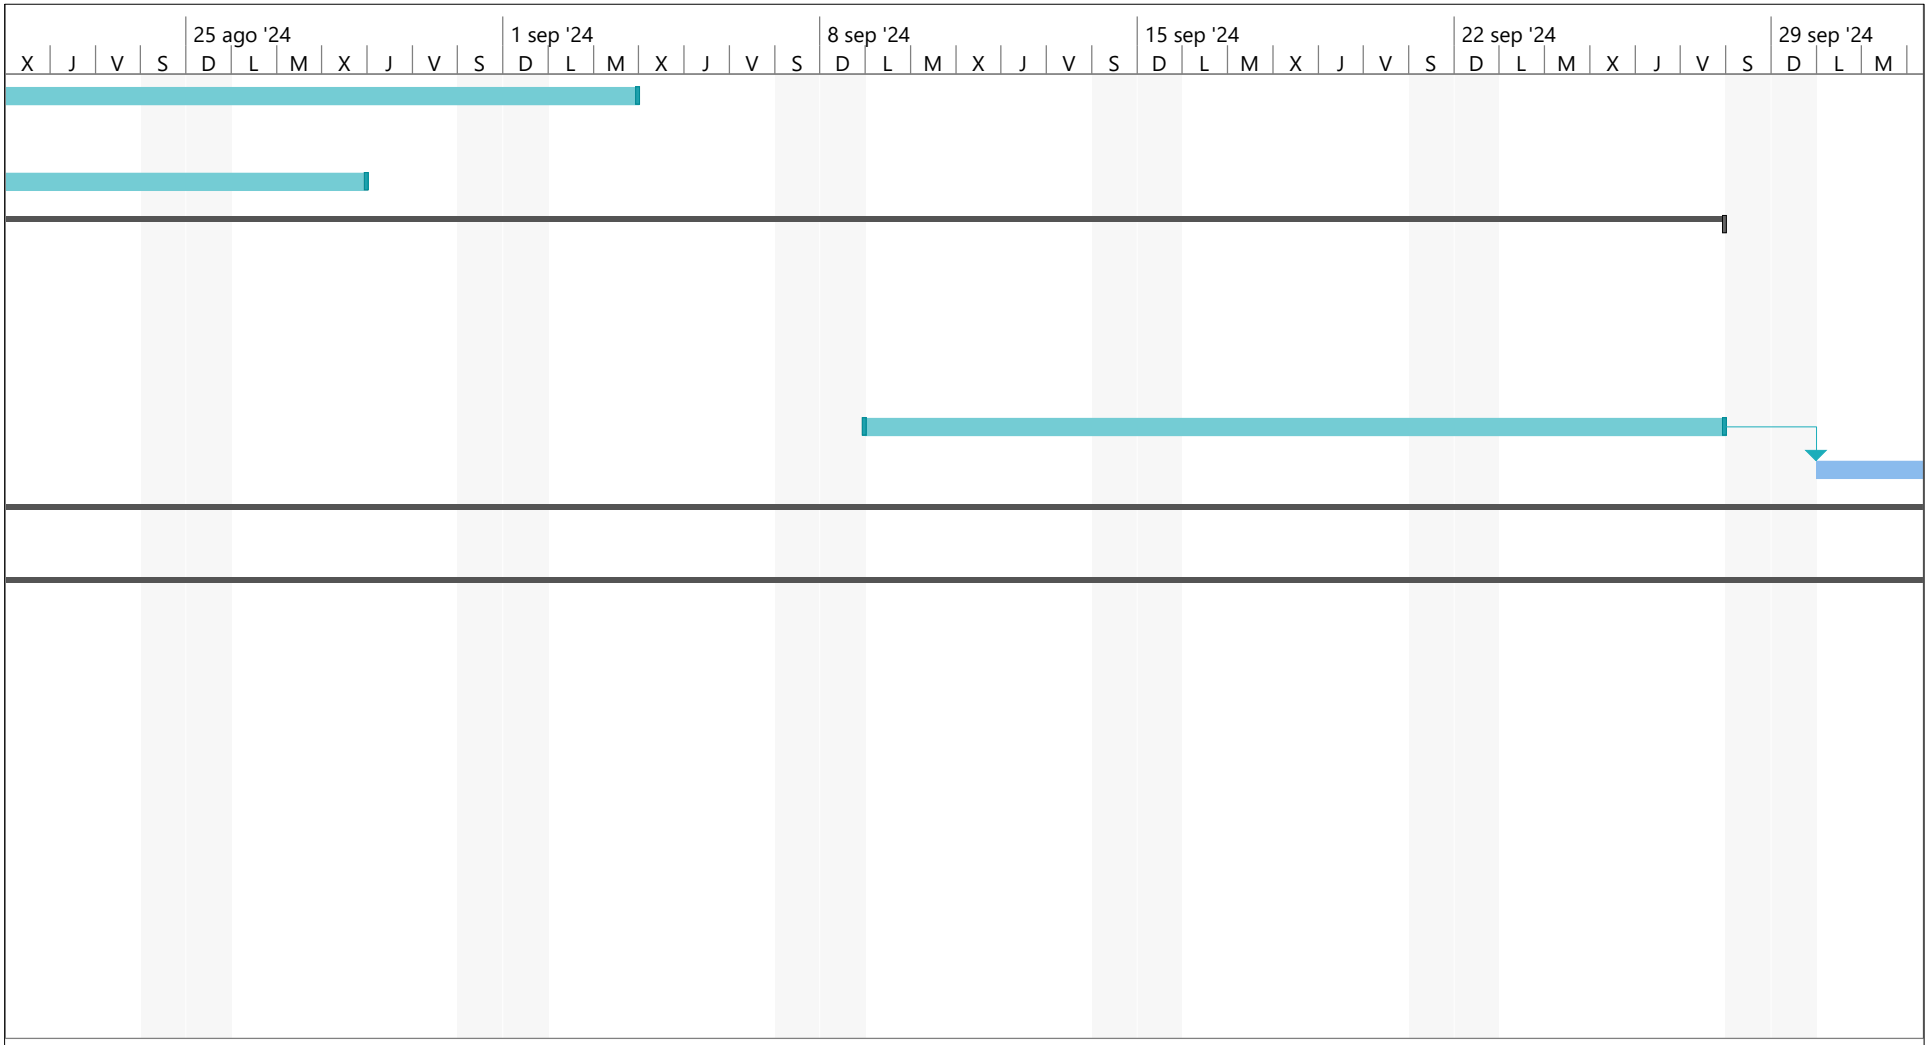

Proyecto: PMI Conservatorio
Fecha: mar 9/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

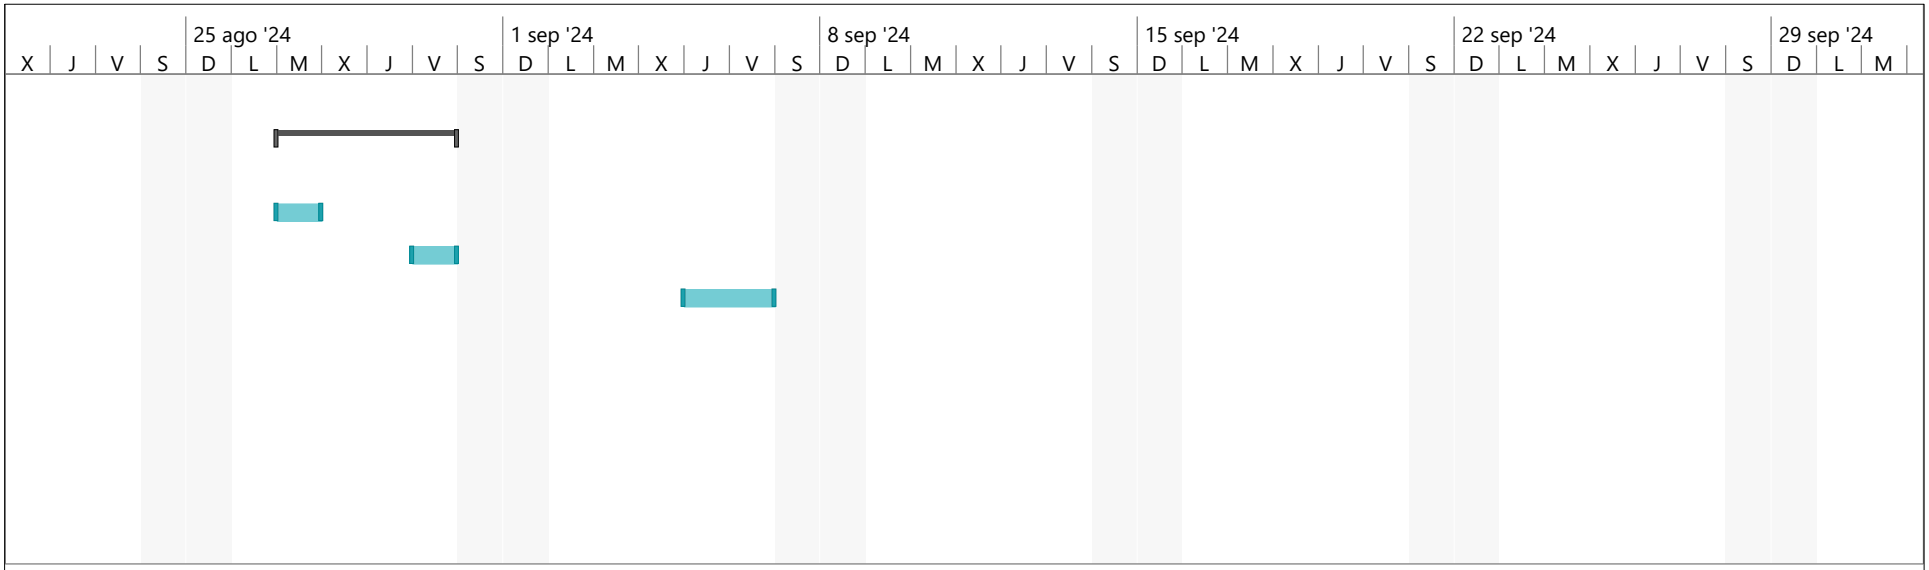


Proyecto: PMI Conservatorio
Fecha: mar 9/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: PMI Conservatorio
Fecha: mar 9/07/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

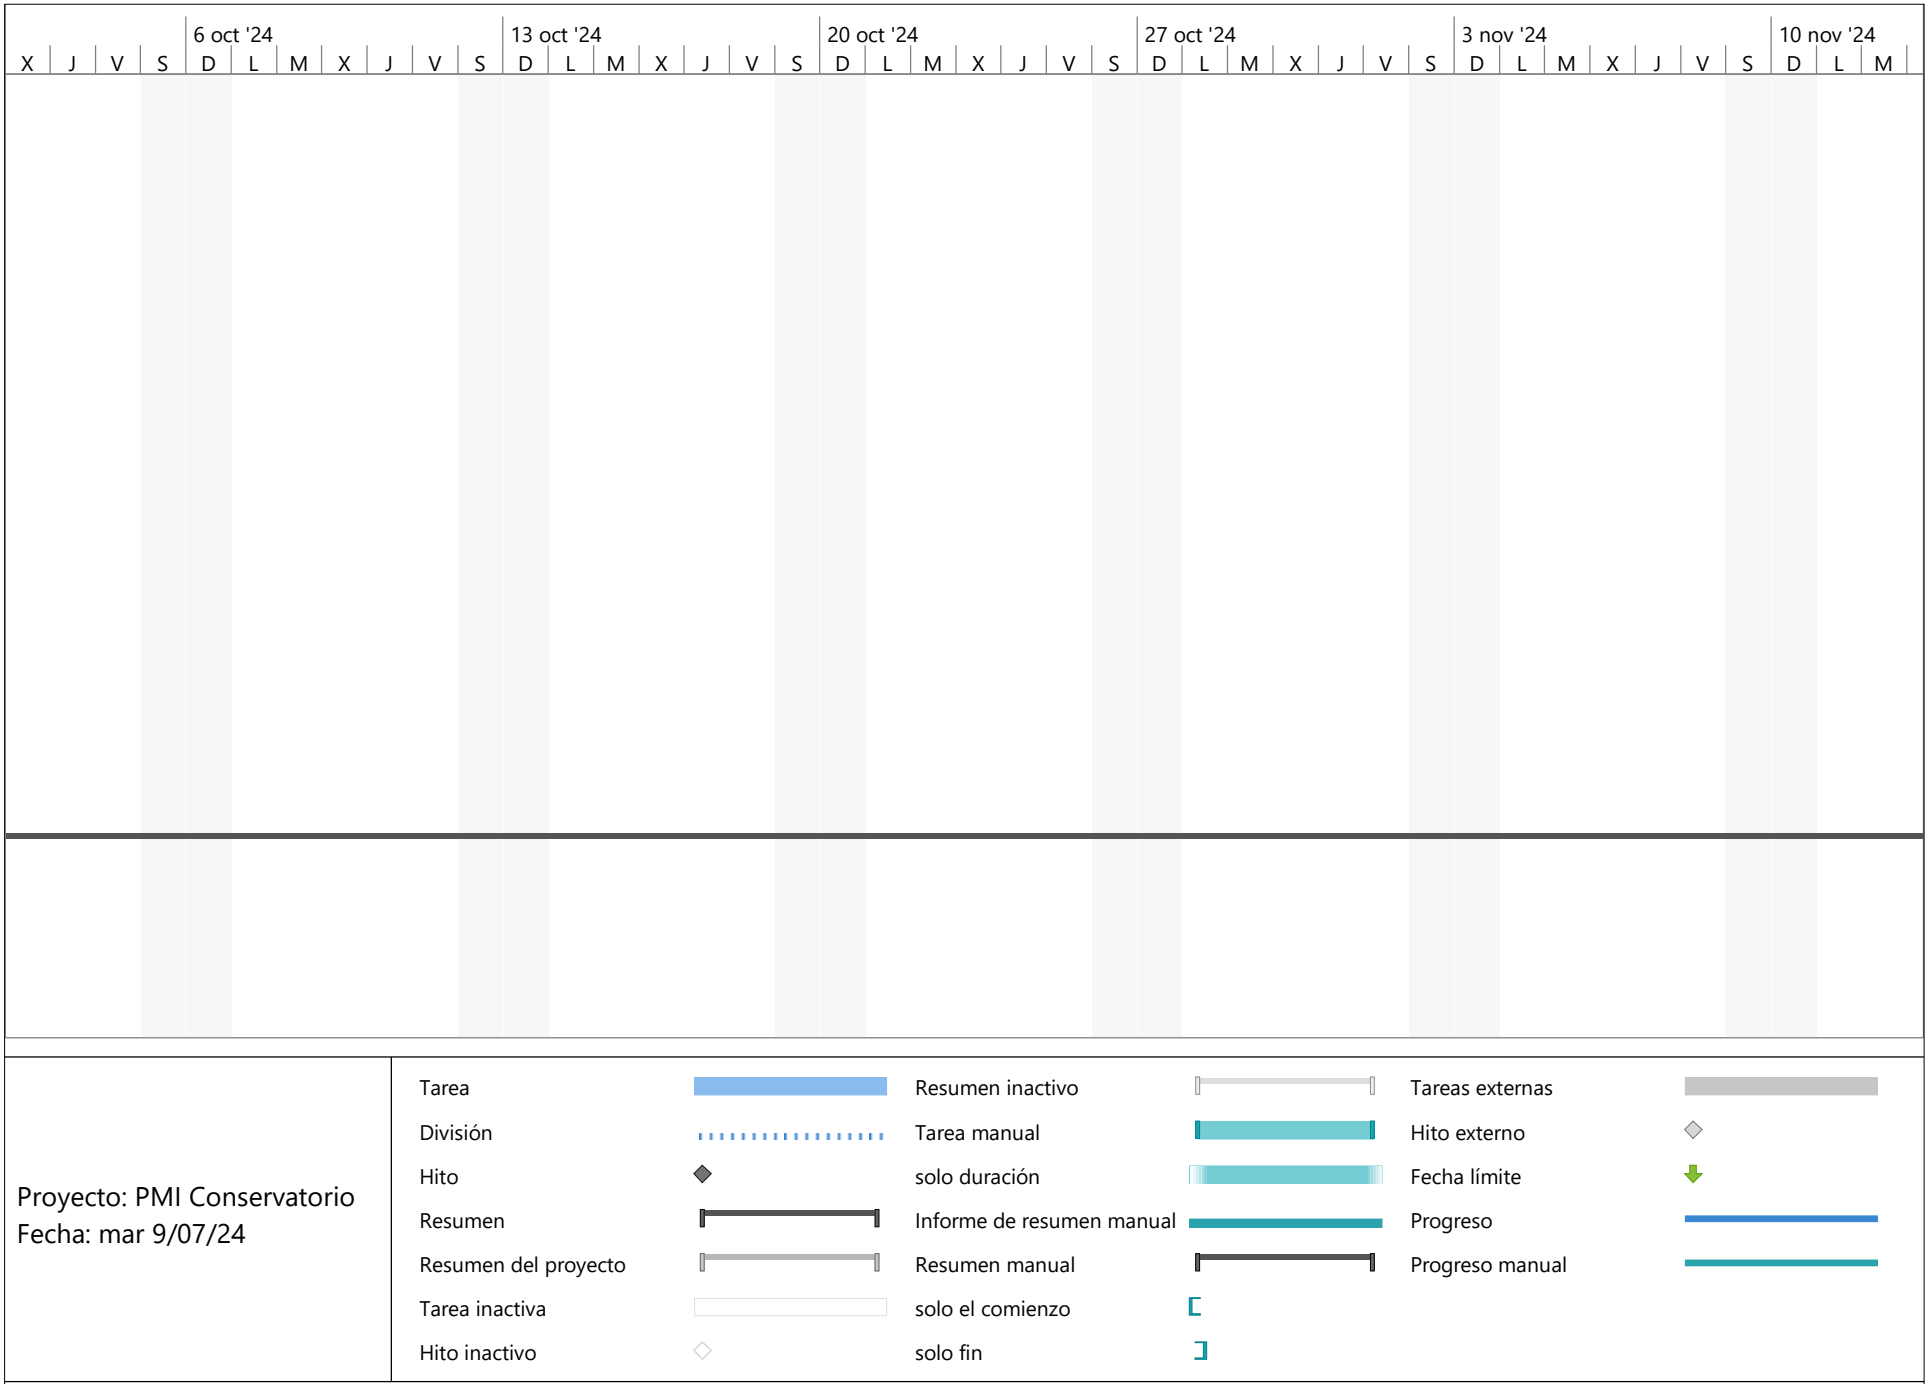


Proyecto: PMI Conservatorio
Fecha: mar 9/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

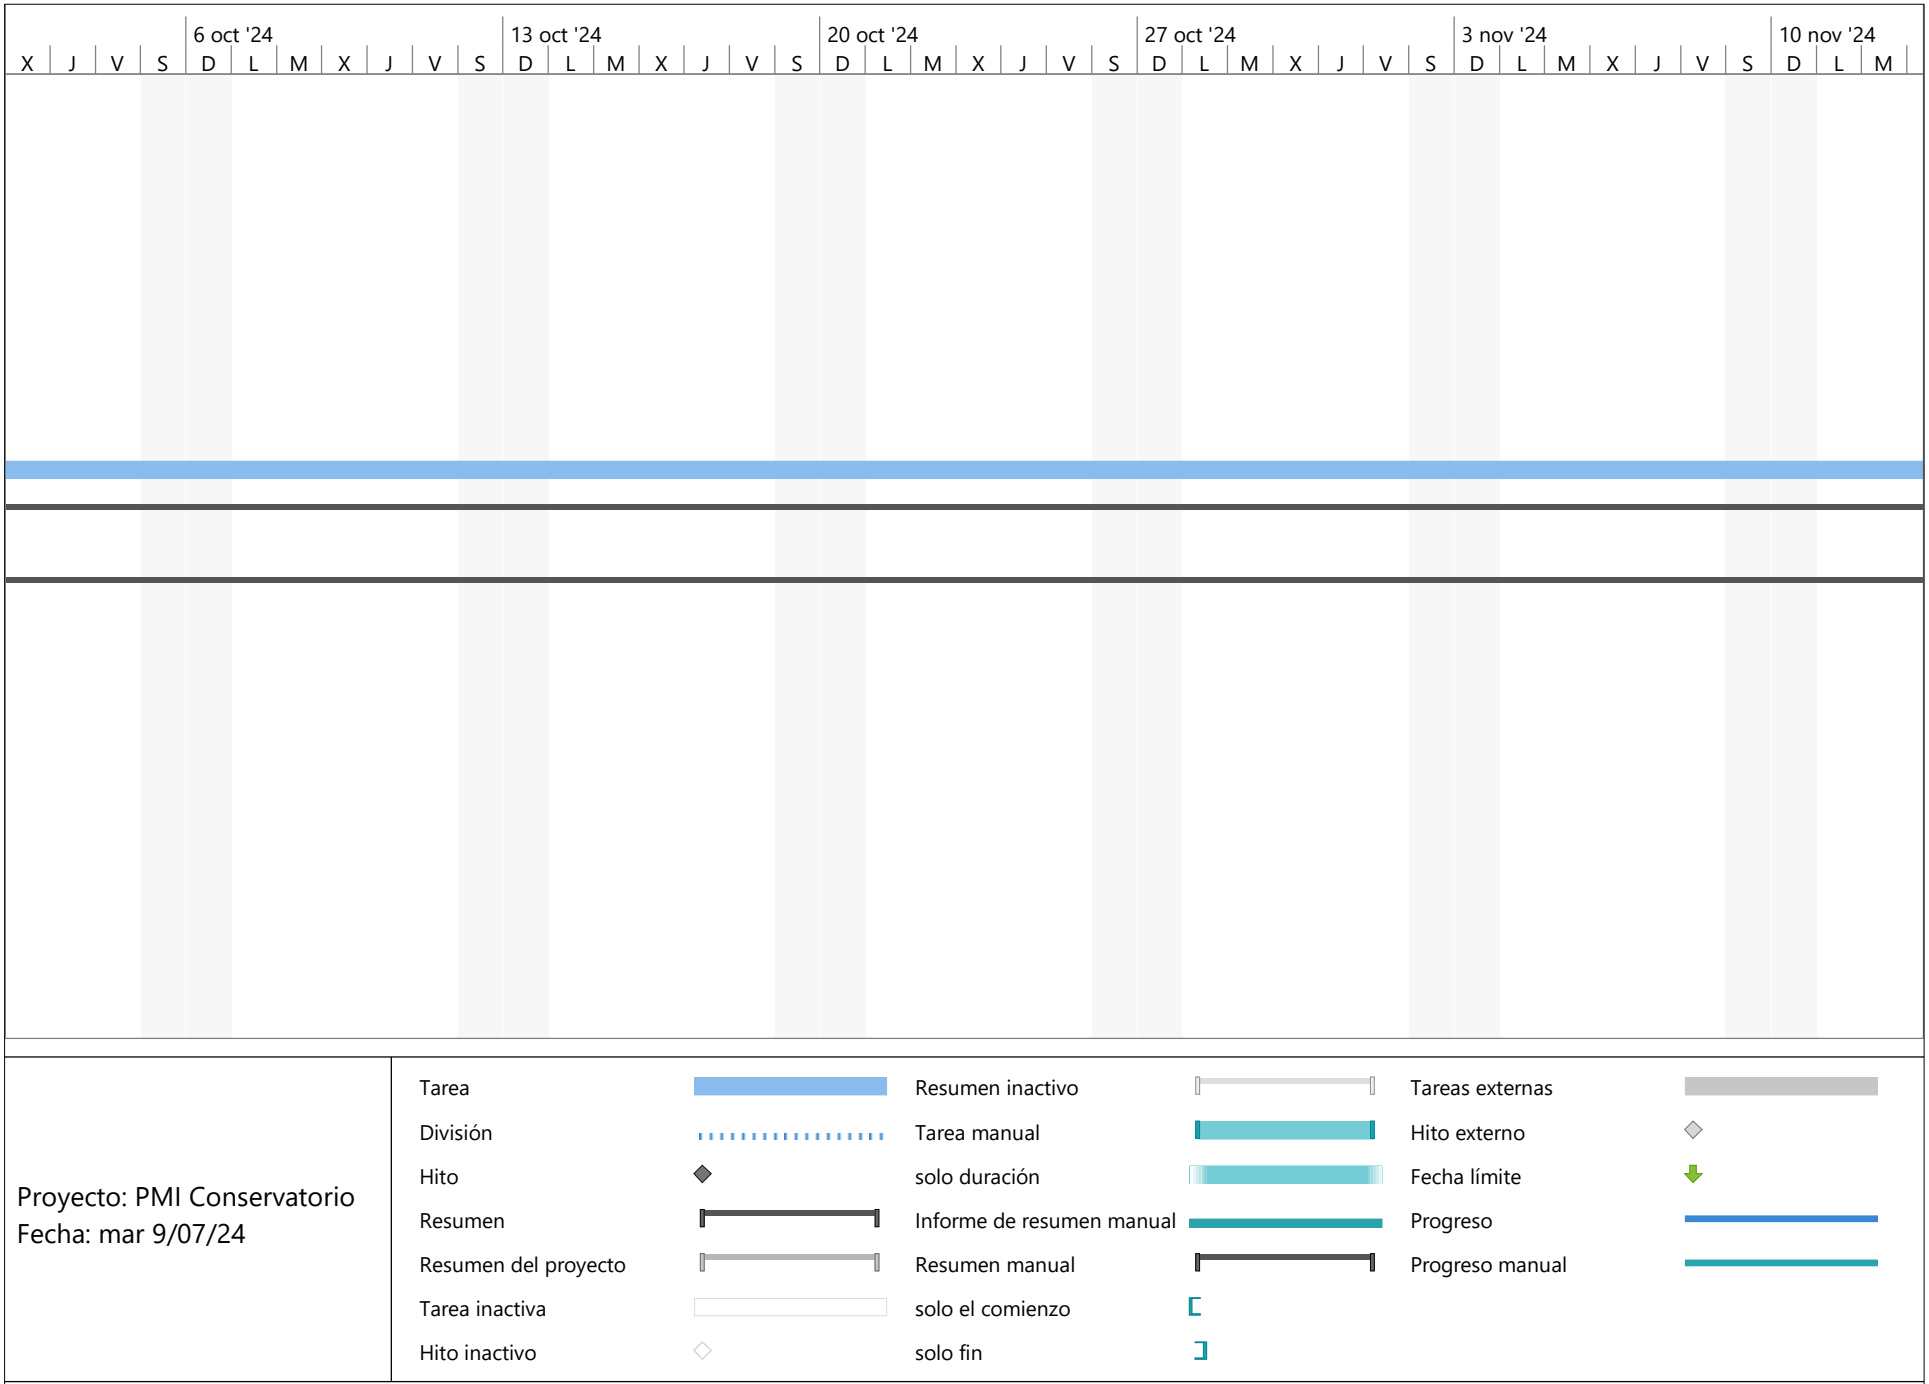


Proyecto: PMI Conservatorio
Fecha: mar 9/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

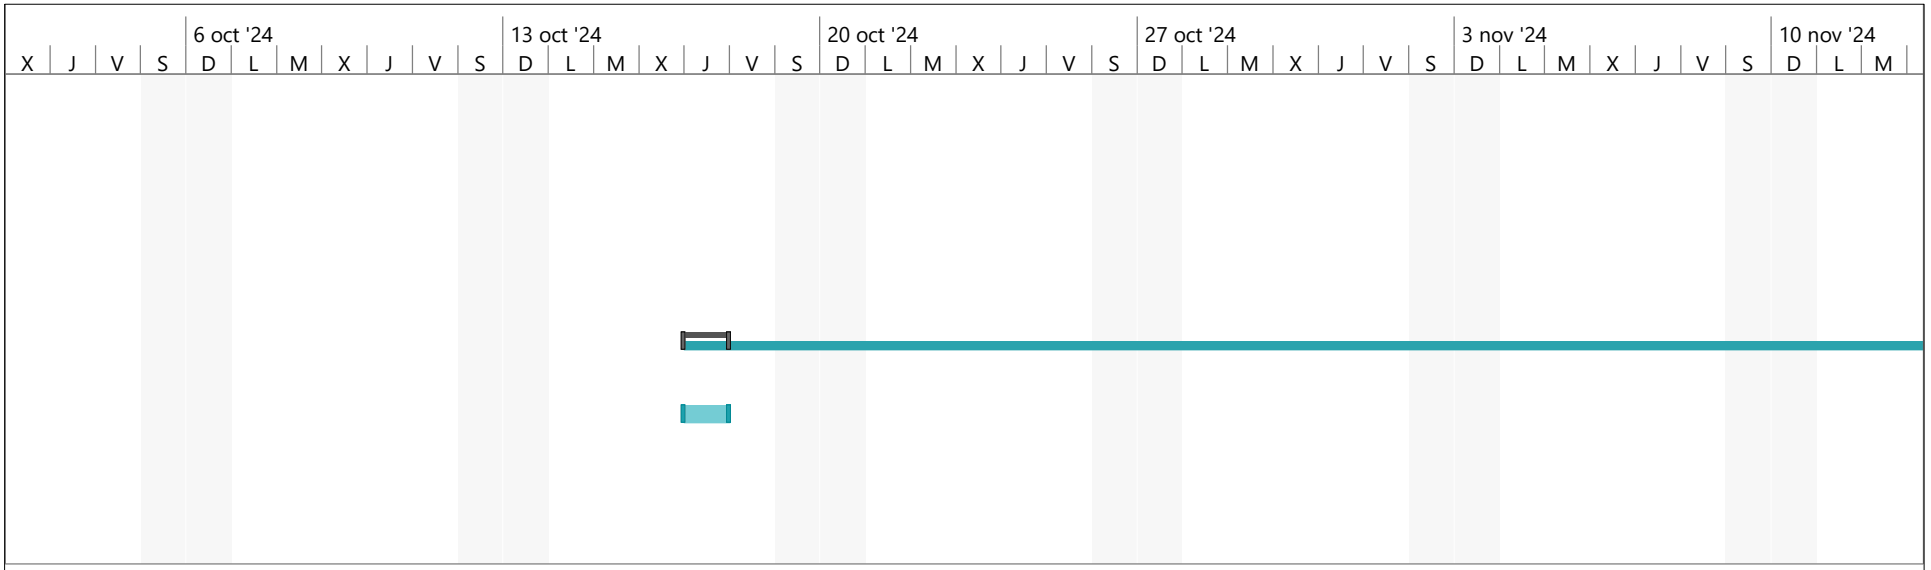


Proyecto: PMI Conservatorio
Fecha: mar 9/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

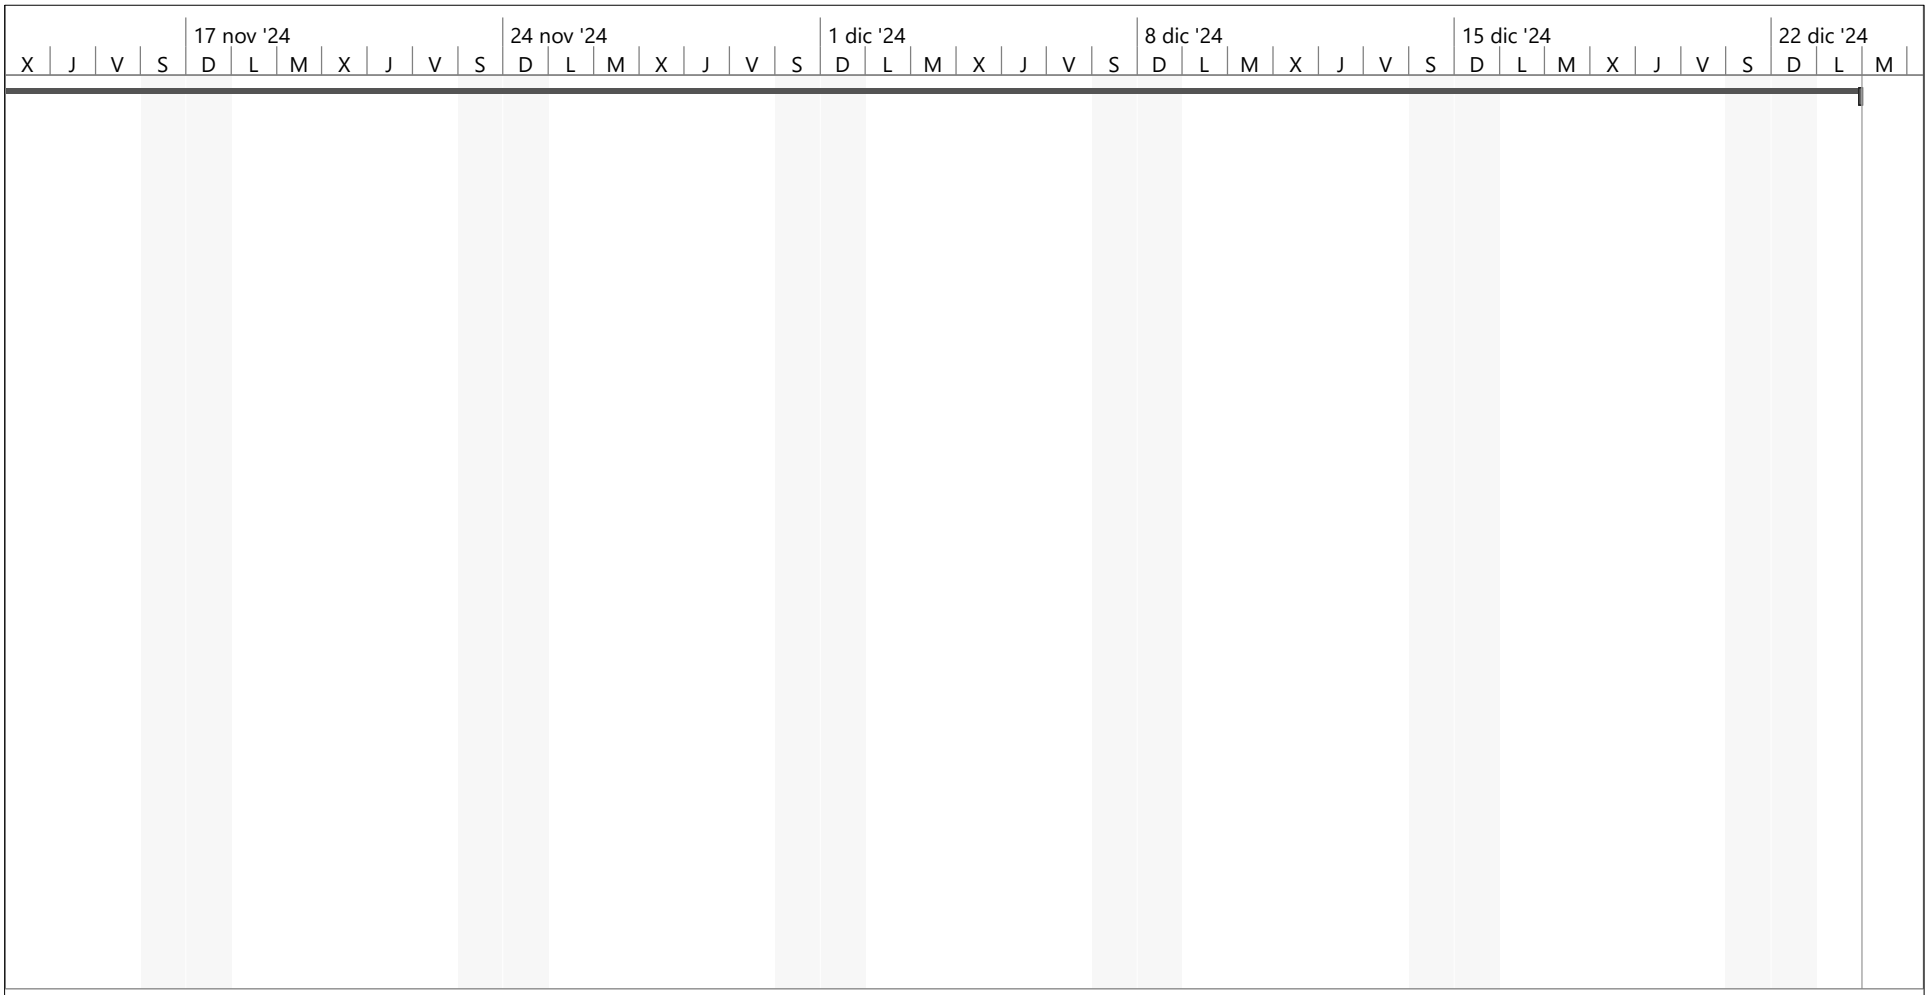


Proyecto: PMI Conservatorio
Fecha: mar 9/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

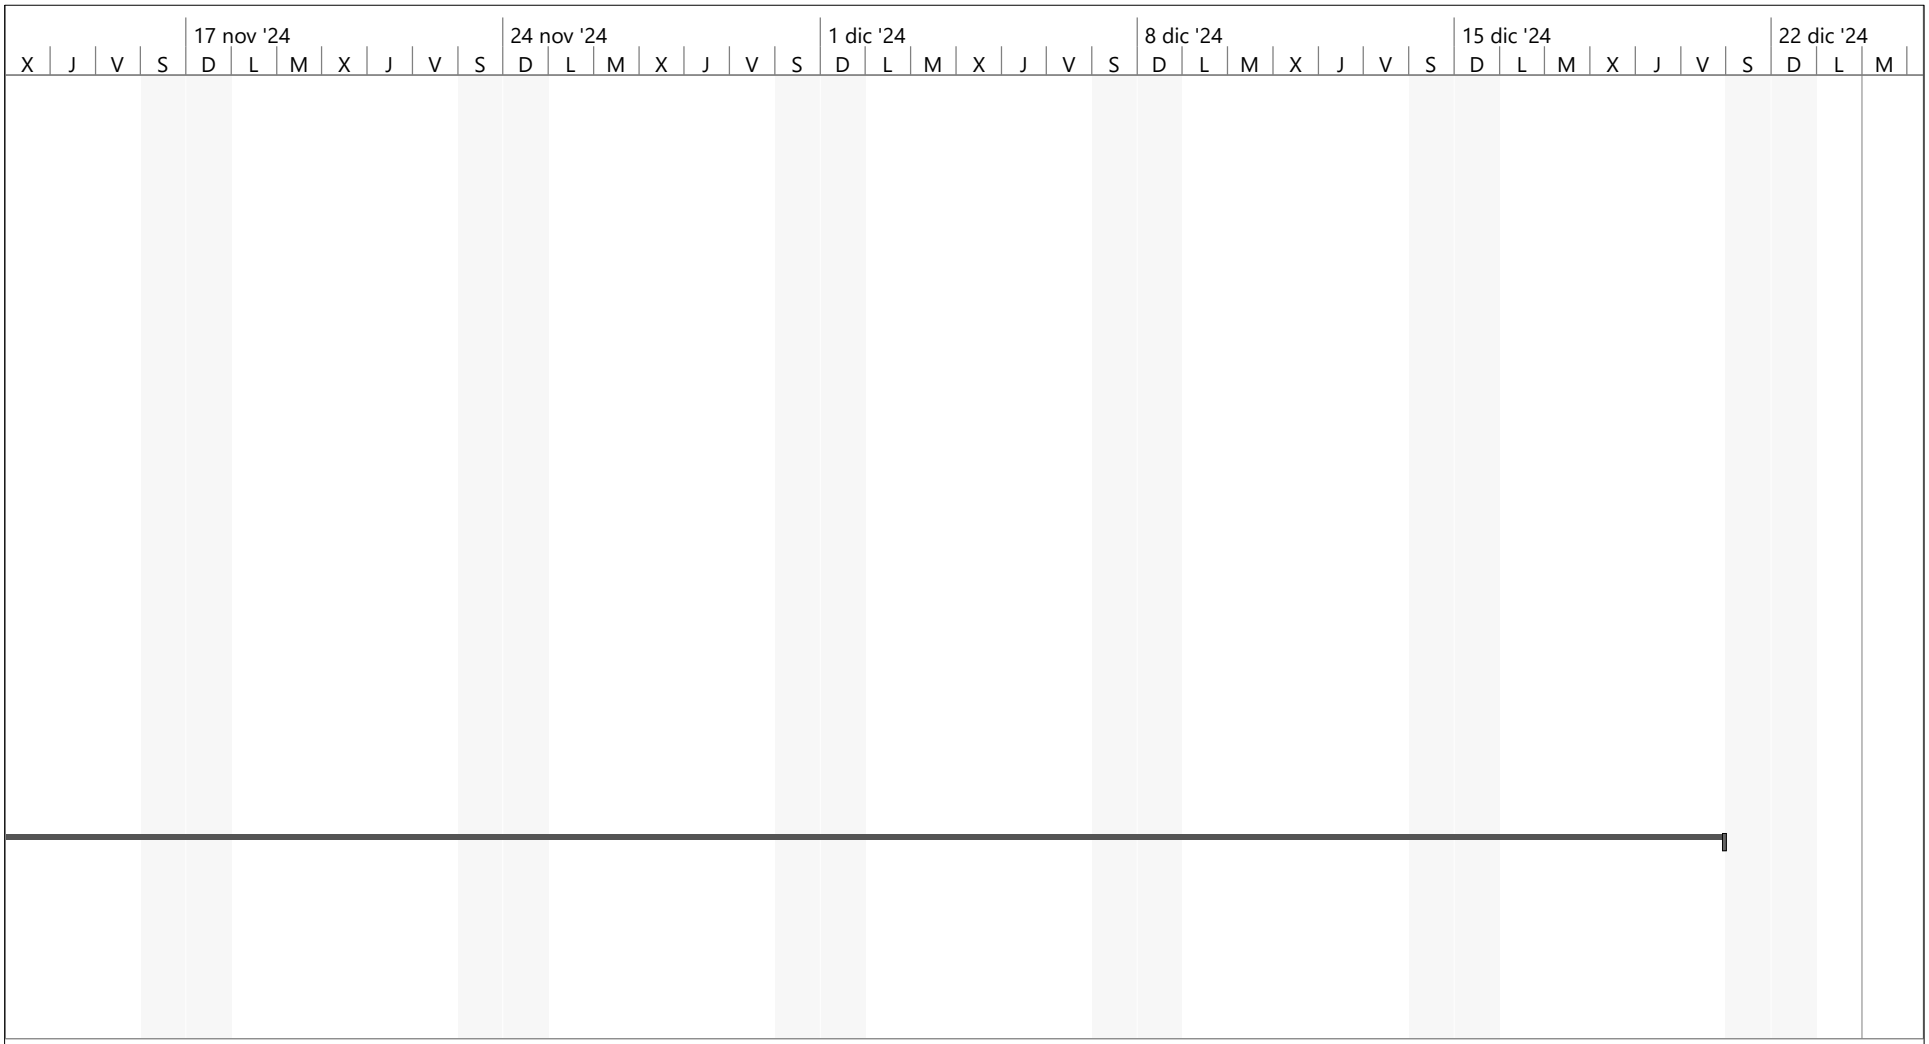


Proyecto: PMI Conservatorio
Fecha: mar 9/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

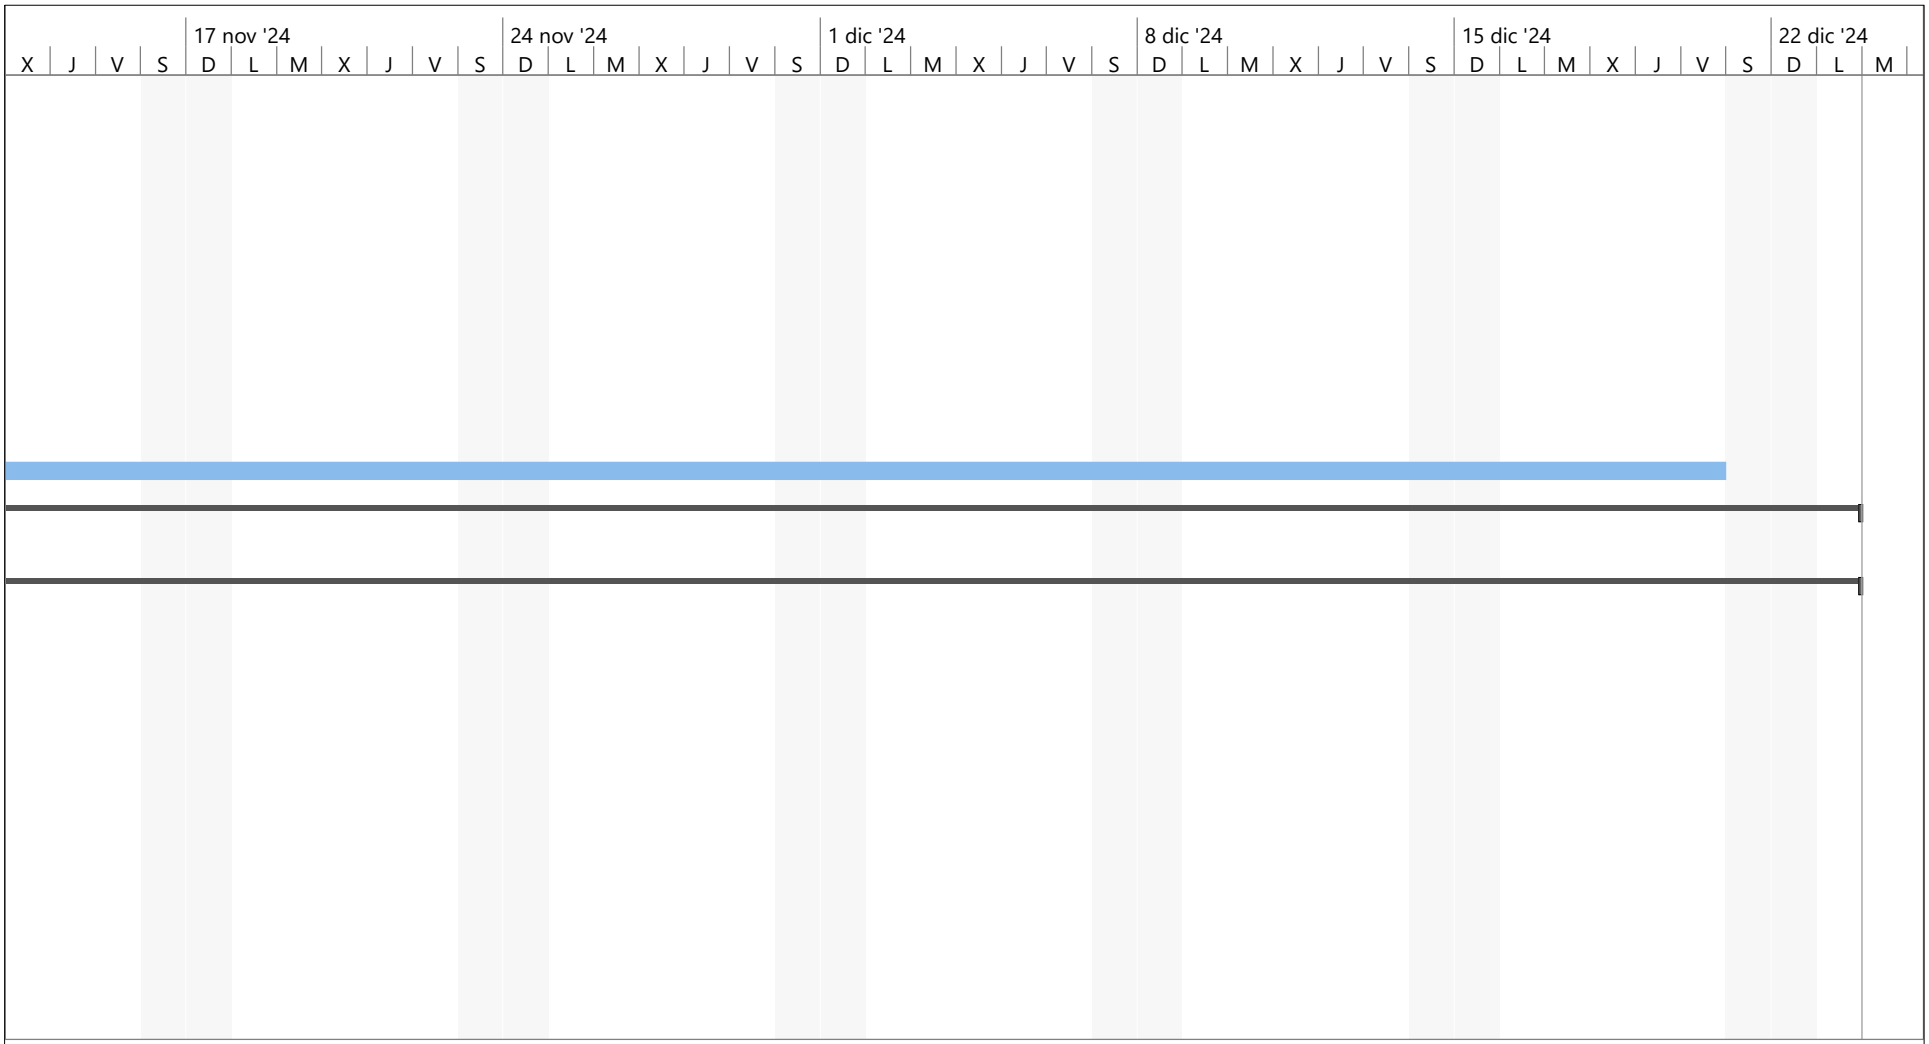

Proyecto: PMI Conservatorio
Fecha: mar 9/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

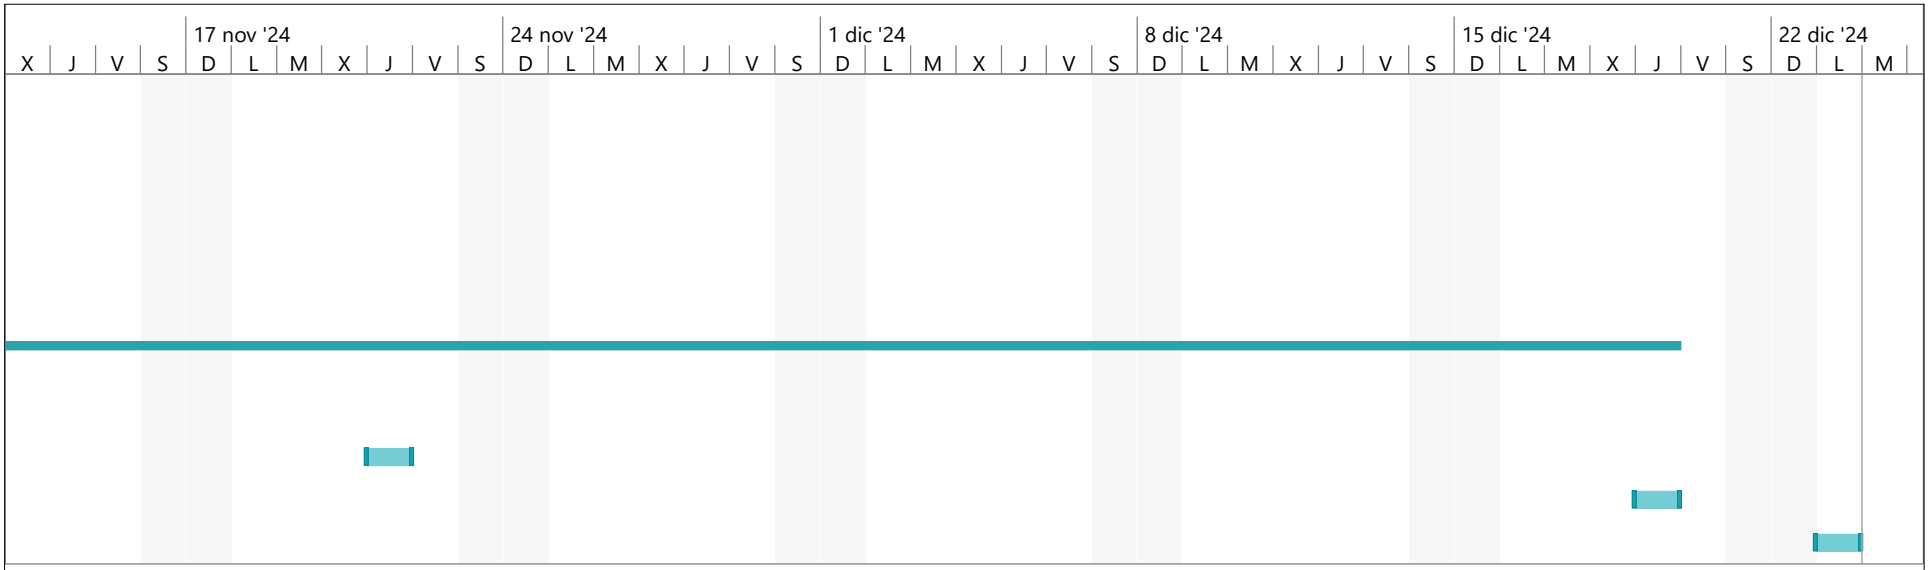

Proyecto: PMI Conservatorio
Fecha: mar 9/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			
