
ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
1		ADQUIRIR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS METEOROLÓGICOS MICROSTEP-MIS A NIVEL NACIONAL	56 days	Tue 24/09/24	Tue 10/12/24
2		Adjudicación del contrato	0 days	Wed 25/09/24	Wed 25/09/24
3		**Orden de pedido de los sensores y módulos**	**41 days**	**Wed 25/09/24**	**Wed 20/11/24**
4		Formalización de la orden de	5 days	Wed 25/09/24	Tue 1/10/24
5		Tramites de pago y	4 days	Wed 2/10/24	Mon 7/10/24
6		Inicio de la fabricación de los sensores y módulos	0 days	Mon 7/10/24	Mon 7/10/24
7		Finalización de la fabricación	30 days	Tue 8/10/24	Mon 18/11/24
8		**Firma del acta de inicio**	**5 days**	**Fri 4/10/24**	**Thu 10/10/24**
9		Firma del acta de inicio	0 days	Fri 4/10/24	Fri 4/10/24
10		Entrega de cronográma de actividades	5 days	Fri 4/10/24	Thu 10/10/24
11		**Pruebas de los sensores y módulos en la**	**6 days**	**Fri 1/11/24**	**Fri 8/11/24**
12		Inicio de las pruebas	0 days	Tue 22/10/24	Tue 22/10/24
13		Proceso de testing y reportes de	6 days	Fri 1/11/24	Fri 8/11/24
14		Finalización de las pruebas	0 days	Fri 8/11/24	Fri 8/11/24
15		**Despacho de los sensores y módulos al país**	**11 days**	**Thu 14/11/24**	**Thu 28/11/24**
16		Proceso de embalaje de los sensores y módulos	1 day	Thu 14/11/24	Thu 14/11/24
17		Entrega a la empresa de transporte e inicio del	10 days	Fri 15/11/24	Thu 28/11/24
18		**Importación y nacionalización**	**16 days**	**Mon 18/11/24**	**Mon 9/12/24**
19		Entrega de documentación al operador de logística	0 days	Mon 18/11/24	Mon 18/11/24
20		Inspección de la mercancía y categorización	4 days	Fri 29/11/24	Wed 4/12/24
21		Proceso administrativo y pago de	3 days	Thu 5/12/24	Mon 9/12/24
22		Recepción final del contrato	0 days	Mon 9/12/24	Mon 9/12/24

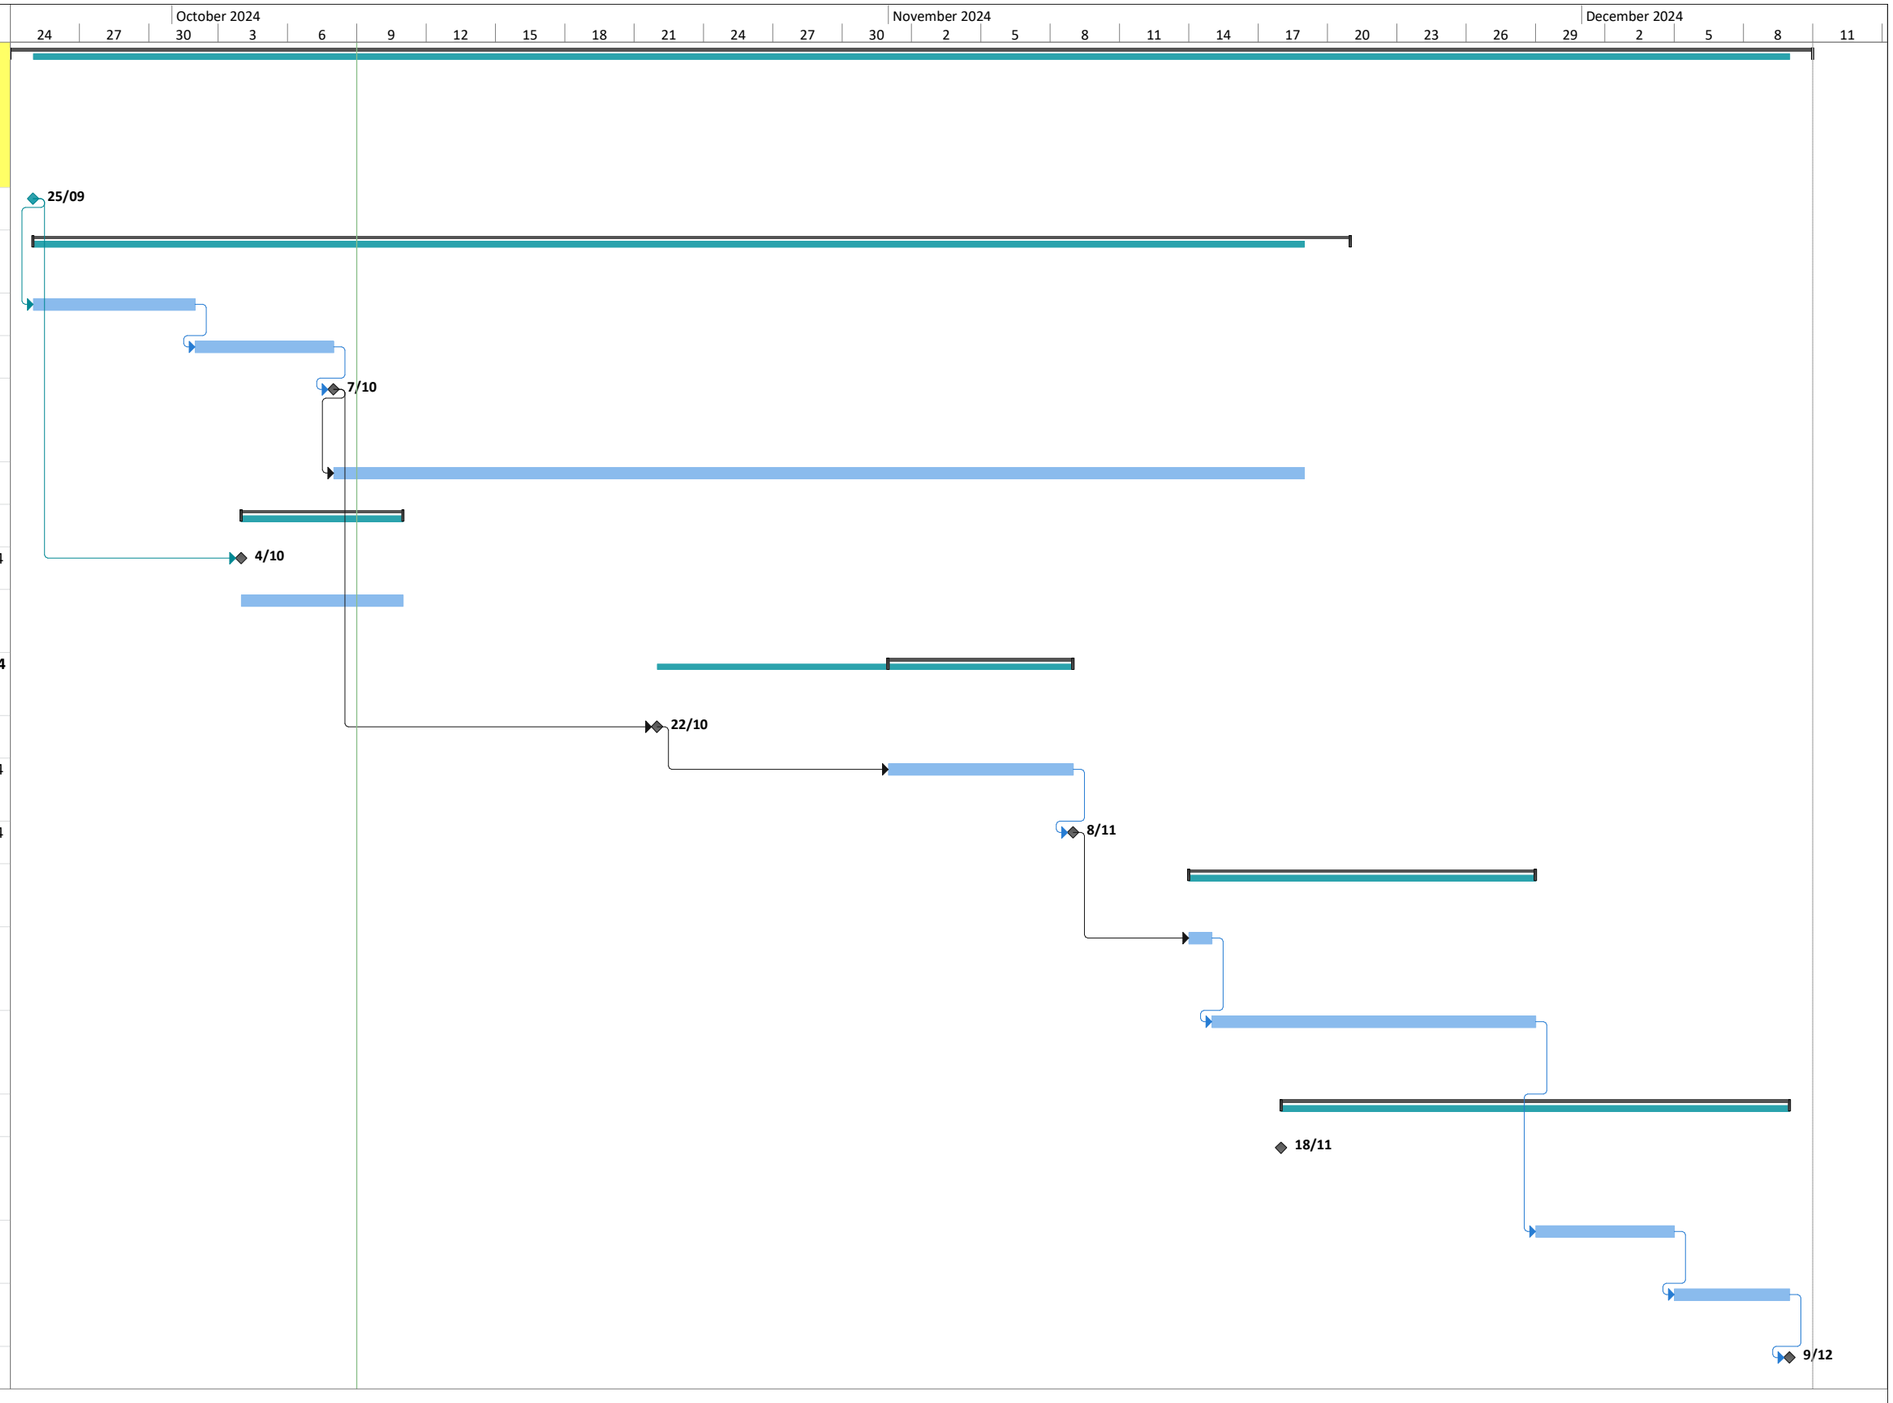

Project: Adquirir repuestos para el mantenimiento de los sistemas meteorológicos MicroStep-MIS a nivel nacional

Task	External Milestone	Manual Summary Rollup	Path Successor Summary Task	Critical Split			
Split	Inactive Task	Manual Summary	Path Successor Normal Task	Baseline			
Milestone	Inactive Milestone	Start-only	Path Driving Predecessor Milestone Task	Baseline Milestone			
Summary	Inactive Summary	Finish-only	Path Driving Predecessor Summary Task	Baseline Summary			
Project Summary	Manual Task	Deadline	Path Driving Predecessor Normal Task	Progress			
External Tasks	Duration-only	Path Successor Milestone Task	Critical	Manual Progress			
