
# INFORME MENSUAL 2


INFORME EJECUTIVO DE OBRA

INFORME MENSUAL N° 2

"CONTRATO DE OBRA No. 267 de 2023"

CUYO OBJETO ES: "CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

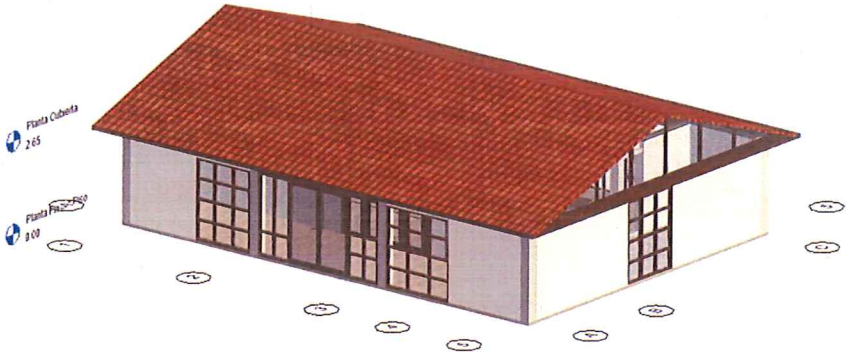

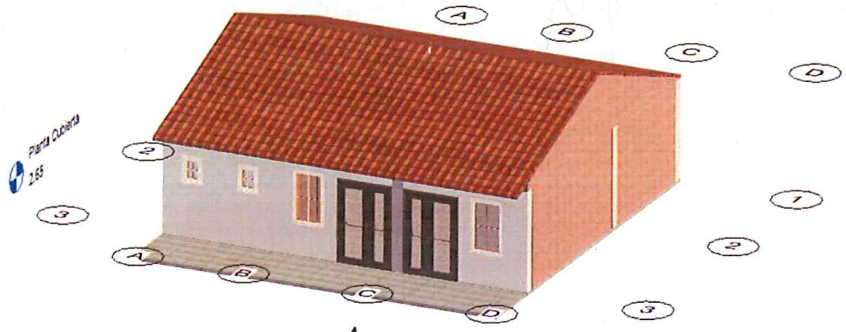

IMOES S.A.S

MARIA FERNANDA MORENO TRIANA

REPRESENTANTE LEGAL

TUNJA- BOYACÁ, MARZO 2023.

| CONTROL DE CAMBIOS | | |
|---|---|---|
| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS |
| 1 | 05/03/2024 | Remisión Inicial IMOES S.A.S, R/L. María Fernanda Moreno Triana para Revisión y comentarios de Interventoría. |

| ELABORACIÓN<br>Rodolfo Alberto Buitrago Medina | REVISIÓN<br>María Fernanda Moreno Triana | APROBACIÓN<br>Interventoría |
|---|---|---|
| Rodolfo Alberto Buitrago Medina<br>**Director de Obra.** | María Fernanda Moreno Triana<br>**Representante Legal.** | Laura Lizeth Leche Tapias<br>**Interventoría.** |

## TABLA DE CONTENIDO


1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN ..... 4
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO ..... 5
   - 2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. ..... 5
   - 2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ..... 7
3. GENERALIDADES DEL CONTRATO. ..... 8
   - 3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO: ..... 8
   - 3.2. ASPECTOS CONTRACTUALES – ACTAS SUSCRITAS ..... 9
   - 3.3. ASPECTOS FINANCIEROS ..... 9
   - 3.4. PERSONAL DEL PROYECTO: ..... 9
   - 3.4.1. Personal Autorizado por el Cliente ..... 9
   - 3.4.2. Personal del Contratista. ..... 9
4. ACTIVIDADES ..... 10
   - 4.1. ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA A EJECUTAR. ..... 10
   - 4.2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN. ..... 15
   - 4.3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS A LA FECHA. ..... 16
   - 4.4. REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES. ..... 31
   - 4.5. COMPONENTE AMBIENTAL – SST - SOCIAL. ..... 31
5. RELACIÓN DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA. ..... 31
6. RECOMENDACIONES. ..... 32
7. CONCLUSIONES ..... 32


## LISTA DE ANEXOS

1. APROBACIÓN POLIZAS
2. DOCUMENTOS CONTRACTUALES

## 1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

El Municipio de Villa de Leyva es una entidad descentralizada territorialmente, dotada de autonomía fiscal y administrativa, que tiene como función prestar los servicios que determine la ley, construir las obras que demanden el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y las que por virtud de la constitución y la ley le sean asignadas.

Conforme a lo anterior, y dando aplicación al Artículo 315 de la Constitución Política, es obligación del Alcalde Municipal dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo, así como dar cumplimiento a su plan de gobierno mediante la ejecución de planes, programas y proyectos que materialicen las metas propuestas dentro del plan de desarrollo vigente.

El Municipio de Villa de Leyva a través de la Secretaría de Infraestructura y Obras Físicas y Secretaria de Contratación en cumplimiento de lo estipulado en la Ley 80 de 1993 dio inicio al proceso de contratación y ordenó la apertura del mismo mediante Resolución No. 565 del 09 de noviembre de 2023.

Posteriormente mediante resolución No. 603 del 05 de diciembre de 2023, se Adjudicó el Proceso al Proponente **IMOES S.A.S**, representada legalmente por MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA. Y con esto se perfección el Contrato de Obra No. 259 de 2023 cuyo objeto es "**CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**".

El día Veintisiete (27) de diciembre de 2023 se suscribió acta de inicio del contrato.

El día Veintiocho (28) de diciembre de 2023 se suscribió acta de Suspensión No. 1.

El día veintisiete (27) de enero de 2024 se suscribió el acta de Reinicio No. 1.

El día Cinco (05) de marzo de 2024 se suscribió acta de Suspensión No. 2.

El contrato se Reinició el veintisiete (27) de enero de 2024, y teniendo en cuenta que el plazo inicial del contrato correspondía hasta el 31 de diciembre de 2023, se suscribió Prórroga No. 01 al Contrato de Obra No. 267 de 2023, por un plazo total de ciento cincuenta (150) días.


Por lo anteriormente expuesto, se presenta informe Mensual No.2 correspondiente al periodo de ejecución del (27) de enero al (05) de marzo de 2024.

# 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

## 2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El municipio de Villa de Leyva es un municipio colombiano, ubicado en la provincia de Ricaurte, del Departamento de Boyacá. El territorio del municipio se halla sobre el altiplano cundiboyacense y dista 37 km de Tunja, la capital del departamento. Cuenta con un área total de 121 km² y su temperatura media oscila entre 15 y 20 °C. Las precipitaciones son abundantes y regulares. A su vez, la altitud media del municipio es de 2000 y 3200 m.s.n.m. (ver Figura 1). Mapa de localización, Figura 2 Localización, Figura 3. Localización Proyecto).

Figura 1. Localización del Municipio dentro del Departamento

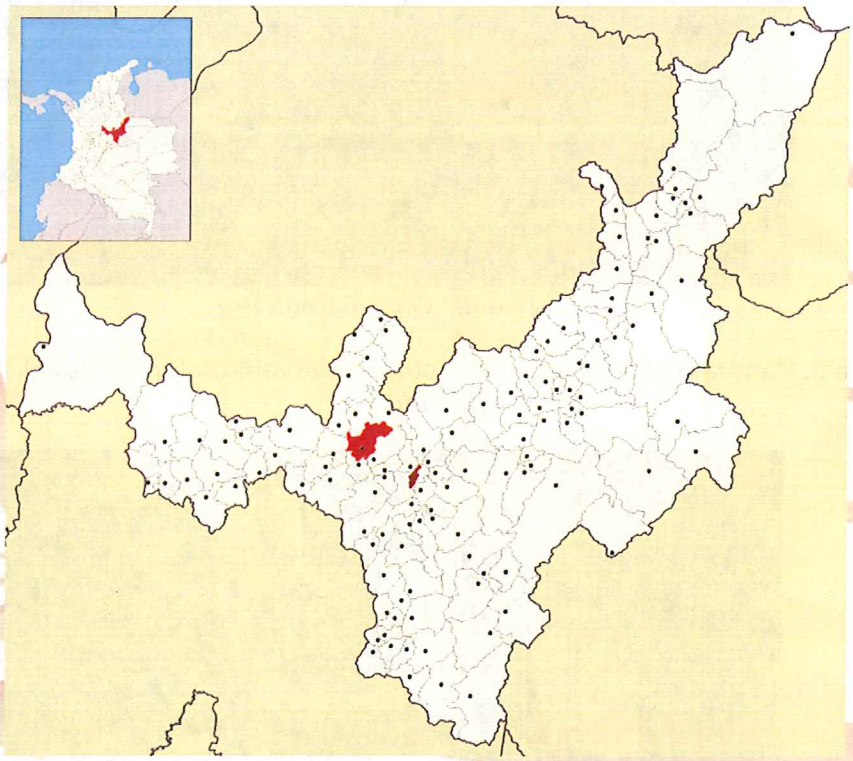

Fuente: Propia

Figura 2. Panorámica satelital del sector a intervenir salón comunal sector cañuelas.




Fuente: Google Earth Pro

Figura 3. Panorámica satelital del sector a intervenir salón comunal sector Santander.




Fuente: Google Earth Pro

Coordenadas del proyecto:

| UBICACIÓN | LONGITUD | LATITUD |
|---|---|---|
| SALON COMUNAL CAÑUELAS | 73°34'10.95" | 5°38'7.24" |
| SALON COMUNAL SANTANDER | 73°31'47.78" | 5°38'4.11" |

## 2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Con el presente contrato se realizará la construcción de salones comunales en el municipio de villa de Leyva, departamento de Boyacá, dicho proyecto se desarrollara con estricta adhesión a las normativas de construcción como la NSR-10 y la norma técnica Colombiana, se realizara bajo la modalidad llave en mano, se llevara a cabo en 2 fases principales, la fase I contempla estudios y diseños de los salones comunales a intervenir, en esta fase se realizara levantamiento topográfico, estudio de suelos, diseños arquitectónicos, diseños estructurales, diseños hidráulicos, diseños sanitarios, diseños eléctricos y posteriormente a la aprobación de la fase I, se inicia la fase 2 la cual se encarga de la ejecución de la obra, donde se plasmaran todo lo que se realizó en la fase I; dicho proyecto beneficiara a la comunidad creando un espacio físico para reuniones, eventos comunitarios y actividades sociales, para tener un sitio apropiado para llevar a cabo reuniones de diversos tipos, tales como: asambleas comunitarias, sesiones educativas o encuentros para debatir temas relevantes, de la misma manera incentivar las actividades culturales y hacer tener un crecimiento en el enriquecimiento cultural y la promoción del sentido de identidad de la comunidad, y así poder realizar celebraciones de festivales, talleres, presentaciones artísticas y otras manifestaciones culturales.

Las obras programadas se efectuarán en cumplimiento a los lineamientos técnicos definidos por la Entidad Contratante Alcaldía Municipal de Villa de Leyva-Boyacá, para tal fin se cuenta con las siguientes fases para la ejecución del proyecto.

- **FASE I-ESTUDIOS Y DISEÑOS**
- **FASE II-EJECUCIÓN DE OBRA**

En cumplimiento a la necesidad y los documentos técnicos, se desarrolla el Contrato de Obra No. **267 del 2023** cuyo objeto es el "**CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.**", este proyecto tiene como finalidad realizar los estudios y diseños de salones comunales y de la misma manera la ejecución de los mismos.

## 3. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

### 3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

Tabla 1. Información General del Contrato.

| | |
|---|---|
| CONTRATO | No. 267 del 2023 |
| OBJETO CONTRATO: | "CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ." |
| VALOR DEL CONTRATO: | QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS ($591.458.422,16) |
| PORCENTAJE DEL ANTICIPO: | 0 % |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO, PREVIO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO |
| FECHA DE INICIO: | 27 DE DICIEMBRE 2023 |
| PLAZO INICIAL | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| PRORROGA N°. 1 | CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO, UNA VEZ FINALIZADO EL PLAZO INICIAL DEL CONTRATO |
| PLAZO TOTAL | CIENTO CINCUENTA Y CINCO (155) DÍAS CALENDARIO |
| FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1 | 28 DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| FECHA DE REINICIO No.1 | 27 DE ENERO DEL 2024 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2 | 05 DE MARZO DE 2024 |
| CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA<br>NIT: 891.801.268-7 |
| % DE AVANCE DEL PROYECTO | 1.82 % |
| VALOR EJECUTADO A LA FECHA: | **$ 10.751.650,00** |
| CONTRATISTA: | IMOES S.A.S<br>NIT: 900.518.247-1<br>R/L: MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA |
| INTERVENTOR: | LAINSCO INGENIERIA S.A.S<br>NIT N. 900.602.469-9<br>R/L. ING. LAURA IZETH LACHE TAPIAS |

6.2 ASPECTOS CONTRACTUALES – ACTAS SUSCRITAS

- Acta de Inicio con fecha del 27 de diciembre del 2023.
- Acta de Suspensión N°1 del 28 de diciembre del 2023.
- Acta de Reinicio N°1 del 27 de enero del 2024.
- Acta de Suspensión N°2 del 05 de marzo de 2024.

### 3.3. ASPECTOS FINANCIEROS

- El contrato 267 de 2023, No conto con anticipo para su ejecución.

Tabla 2. Aspectos Financieros del Contrato

| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO | VALOR EJECUTADO DURANTE EL PERIODO | VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR |
|---|---|---|
| $ 591.458.422,16 | $ 10.751.650,00 | $ 580.706.772,16 |

### 3.4. PERSONAL DEL PROYECTO:

Durante el período del presente informe, cada una de las entidades contó con un equipo de personas que se relaciona a continuación:

#### 3.4.1. Personal Autorizado por el Cliente

**Personal de la Alcaldía de Villa de Leyva.**
(Supervisión de los contratos)

| CARGO | NOMBRE |
|---|---|
| Supervisor Contrato de Obra | Nelson Alberto Carvajal Reina |

**Personal de Interventoría**
(Interventoría del Contrato de Obra)

| CARGO | NOMBRE |
|---|---|
| Interventoría de la obra | Ing. Laura Lizeth Lache Tapias |

#### 3.4.2. Personal del Contratista.

ORGANIGRAMA DE OBRA




Personal de contrato de obra 267 de 20023.

Tabla 3. Personal Contratista de Obra

| N. | NOMBRE COMPLETO | CEDULA | CARGO |
|---|---|---|---|
| 1 | RODOLFO ALBERTO BUITRAGO MEDINA | 1.049.614.172 | DIRECTOR DE OBRA |
| 2 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA | 1.049.609.995 | RESIDENTE DE OBRA |
| 3 | JEIMY ALEXANDRA REYES VARGAS | 1.049.608.109 | ARQUITECTA |
| 4 | JULIÁN FELIPE BUSTAMANTE CAMARGO | 7.182.495 | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA |
| 5 | YEISON GILBERTO SANCHEZ SANCHEZ | 1.053.334.805 | TOPOGRAFO |

## 4. ACTIVIDADES.

### 4.1. ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA A EJECUTAR.

Tabla 4. Actividades y Cantidades de Obra a ejecutar Según Contrato inicial

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANTIDAD | VR UNIT INC FID | V.TOTAL |
| A | CONSTATACION DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO. | | | | |
| | CONSTATACION DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO DE DOS SALONES COMUNALES TIPO Y TRÁMITES PARA OBTENCIÓN DE LICENCIAS | UN | 2.00 | $ 500,000.00 | 1,000,000.00 |
| SUB TOTAL VALOR CONSTATACION DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PRYECTO | | | | | $ 1,000,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CONDICIONES ORIGINALES | | | | |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANTIDAD | VR UNIT INC FID | V.TOTAL |
| | IVA 19% | | | | $ 190,000.00 |
| | VALOR TOTAL CONSTATACION DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO | | | | $ 1,190,000.00 |
| B | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SALONES COMUNALES TIPO. | | | | |
| 1.1 | Levantamiento topografico, cartera y memoria descriptiva para dos (2) lotes. | UND. | 2.00 | $ 1,100,000.00 | 2,200,000.00 |
| 1.2 | Estudios de suelos y geotecnia para diseño de cimentaciones y otros , para dos salones comunales | UND. | 2.00 | $ 1,800,000.00 | 3,600,000.00 |
| 1.3 | Diseño arquitectonico de salon comunal tipo (149 M2) para dos salones comunales. | M2 | 298.00 | $ 7,500.00 | 2,235,000.00 |
| 1.4 | Diseños estructurales (149 M2) para salon comunal tipo, para dos salones comunales | M2 | 298.00 | $ 10,000.00 | 2,980,000.00 |
| 1.5 | Diseños electricos (149 M2) para salon comunal tipo para dos salones comunales. | M2 | 298.00 | $ 6,000.00 | 1,788,000.00 |
| 1.6 | Diseños Hidrosanitarios(149 M2) para salon comunal tipo para dos salones comunales. | M2 | 298.00 | $ 6,000.00 | 1,788,000.00 |
| 1.7 | Presupuesto, programacion, cantidades de obra y especificaciones de construccion para dos salones comunales | UN | 2.00 | $ 700,000.00 | 1,400,000.00 |
| | SUB TOTAL VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SALONES COMUNALES TIPO | | | | $ 15,991,000.00 |
| | IVA 19% | | | | $ 3,038,290.00 |
| | VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SALONES COMUNALES TIPO | | | | $ 19,029,290.00 |
| C | CONSTRUCCION SALON COMUNAL TIPO | | | | |
| 1 | PRELIMINARES | | | | |
| 1.1 | Localizacion y replanteo de obra arquitectonica | M2 | 149.00 | $ 6,371.00 | 949,279.00 |
| 1.2 | Excavacion de cortes, canales y prestamos en material comun a maquina, incluye cargue y acarreo libre de 5KM | M3 | 44.20 | $ 19,792.00 | 874,806.00 |
| 1.3 | Demolicion de edificacion infraestructura existente hasta un piso de altura | M2 | 130.00 | $ 45,795.00 | 5,953,350.00 |
| 2 | CIMENTACIÓN | | | | |
| 2.1 | Excavacion manual en material comun (incluye retiro) | M3 | 29.30 | $ 51,943.00 | 1,521,930.00 |
| 2.2 | Concreto ciclopeo 14 MPA (2000 PSI) relacion 60C/40P | M3 | 3.00 | $ 472,207.00 | 1,416,621.00 |
| 2.3 | Concreto de zapatas 21 MPA- 3000PSI | M3 | 5.20 | $ 857,158.00 | 4,457,222.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CONDICIONES ORIGINALES | | | | |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANTIDAD | VR UNIT INC FID | V.TOTAL |
| 2.4 | Concreto de viga de amarre 21.1 MPA | M3 | 11.02 | $ 851,417.00 | 9,382,615.00 |
| 2.5 | Suministro y figurada de acero 60000 PSI 420 Mpa | KG | 1,392.00 | $ 7,002.00 | 9,746,784.00 |
| 2.6 | Cajas de inspeccion de 80*80 cn ladrillo | UN | 3.00 | $ 480,785.00 | 1,442,355.00 |
| 2.7 | Suministro e instalacion de tuberia de alcantarillado PVC D=4" | ML | 30.00 | $ 29,162.00 | 874,860.00 |
| 3 | ESTRUCTURAS | | | | |
| 3.10 | Columnas en concreto 21 MPA(3000 PSI), altura mayor a 3 metros-formaleta madera | M3 | 3.77 | $ 1,270,282.00 | 4,788,963.00 |
| 3.2 | Viga de amarre sobre muro 21 MPA-(3000PSI) | M3 | 4.42 | $ 1,070,182.00 | 4,730,204.00 |
| 3.3 | Suministro y figurada de acero 60000 PSI 420 Mpa | KG | 1,097.97 | $ 7,002.00 | 7,687,986.00 |
| 3.4 | Placa maciza 21 MPA-(3000 PSI) E= 0.10MTS | M2 | 2.25 | $ 285,260.00 | 641,835.00 |
| 4 | MAMPOSTERIA Y PAÑETES | | | | |
| 4.1 | Muro en bloque No. 5 E= 0.12 MTS | M2 | 264.00 | $ 51,834.00 | 13,684,176.00 |
| 4.2 | Alfagia ladrillo prensado tipo maguncia | ML | 16.00 | $ 47,506.00 | 760,096.00 |
| 4.3 | Mesones en concreto A=0.60 mts. 17.5 MPA-(2500PSI)INC. REFUERZO | M2 | 6.70 | $ 180,411.00 | 1,208,754.00 |
| 4.4 | Filos y dilataciones en pañetes | ML | 200.00 | $ 9,852.00 | 1,970,400.00 |
| 4.5 | Pañete liso muros 1:4 | M2 | 170.00 | $ 25,187.00 | 4,281,790.00 |
| 5 | INSTALACAIONES HIDRAULICAS, ELECTRICAS Y SANITARIAS. | | | | |
| 5.1. | Suministro e instalacion de acometida 2" X 1/2" incluye tuberia PF + UAD 1/2", registro de corte, collar derivacion y accesorios complementarios para su conexión | UN | 1.00 | $ 120,308.00 | 120,308.00 |
| 5.2 | Suministro e instalacion de red suministro tuberia PVC-P 1/2" RDE 9 | ML | 30.00 | $ 12,850.00 | 385,500.00 |
| 5.3 | Punto agua fria PVC-P 1/2" Paral de techo | UN | 5.00 | $ 113,974.00 | 569,870.00 |
| 5.4 | Suministro e instalacion de tanque elevado PVC 1000 LTS incluye accesorios | UN | 1.00 | $ 574,527.00 | 574,527.00 |
| 5.5 | Suministro e instalacion de bajantes de agua lluvia PVC3 | ML | 30.00 | $ 47,314.00 | 1,419,420.00 |
| 5.6 | Suministro e instalacion cortina roscado RED-WHITE 1/2" | UN | 3.00 | $ 46,565.00 | 139,695.00 |
| 5.7 | Punto de desagues PVC 3" Y 4" | UN | 7.00 | $ 112,957.00 | 790,699.00 |

Imoes s.a.s.
INGENIERÍA, MONTAJES, OBRAS, ESTRUCTURAS Y SERVICIOS

CONDICIONES ORIGINALES

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANTIDAD | VR UNIT INC FID | V.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.8 | Acometida aerea 10ML PVC | UN | 1.00 | $ 313,207.00 | 313,207.00 |
| 5.9 | Salida de lampara toma PVC completa | UN | 28.00 | $ 172,645.00 | 4,834,060.00 |
| 5.10 | Tierra tablero general (varilla cooper well) | UN | 1.00 | $ 543,372.00 | 543,372.00 |
| 5.11 | suministro e instalacion panel led sobreponer 60*60 48W | UN | 18.00 | $ 97,637.00 | 1,757,466.00 |
| 5.12 | Suministro e instalacion de tablero parcial 12 circuitos | UN | 1.00 | $ 359,610.00 | 359,610.00 |
| 6 | PINTURA Y ENCHAPES | | | | |
| 6.1 | Esmalte lamina llena tres manos | M2 | 23.00 | $ 16,684.00 | 383,732.00 |
| 6.2 | Esmalte lamina lineal tres manos | ML | 260.00 | $ 7,359.00 | 1,913,340.00 |
| 6.3 | Pintura fachada en vinilo para exteriores | M2 | 100.00 | $ 17,576.00 | 1,757,600.00 |
| 6.4 | Suministro e instalacion de piso SOSCO o similar 4*4*3 | UN | 3.00 | $ 25,750.00 | 77,250.00 |
| 6.5 | Remate bocel aluminio "WINGS" | ML | 30.00 | $ 11,374.00 | 341,220.00 |
| 6.6 | Suministro e instalacion de enchape porcelana OLIMPIA o similar 20*20 | M2 | 49.00 | $ 76,346.00 | 3,740,954.00 |
| 6.7 | Suministro e instalacion de incrustaciones 3 piezas en porcelana color blanco. | Jgo | 2.00 | $ 78,188.00 | 156,376.00 |
| 7 | PISOS | | | | |
| 7.1 | Base en material de afirmado compactado | M3 | 72.00 | $ 73,747.00 | 5,309,784.00 |
| 7.2 | Placa base en concreto E: 0.10 2500PSI | M2 | 149.00 | $ 82,398.00 | 12,277,302.00 |
| 7.3 | Refuerzos malla electrosoldada H-257 | Kg | 165.80 | $ 7,936.00 | 1,315,789.00 |
| 7.4 | Suministro e instalacion de tableta pescadero o tipo cucuta 0.3*0.3*0.017mtr | M2 | 310.00 | $ 89,421.00 | 27,720,510.00 |
| 7.5 | Suministro e instalacion de guardaescobas baldosin | ML | 34.50 | $ 59,446.00 | 2,050,887.00 |
| 8 | CUBIERTA | | | | |
| 8.1 | Suministro e instalacion perfileria metalica para estructuras de cuierta, dimensiones y calibre según diseño | KG | 1,500.00 | $ 17,135.00 | 25,702,500.00 |
| 8.2 | Suministro e instalacion teja fibrocemento numero 6 | M2 | 200.00 | $ 58,231.00 | 11,646,200.00 |
| 8.3 | suministro e instalacion teja de barro sobre etenrnit | M2 | 200.00 | $ 87,933.00 | 17,586,600.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CONDICIONES ORIGINALES | | | | |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANTIDAD | VR UNIT INC FID | V.TOTAL |
| 9 | CARPINTERIA METALICA Y APARATOS | | | | |
| 9.1 | Suministro e instalacion ventamina lamina CAL. 18 con vidrio incluye anticorrosivo | M2 | 40.30 | $ 238,795.00 | 9,623,439.00 |
| 9.2 | Suministro e instalacion puerta lamina CAL 18 incluye anticorrosivo | M2 | 11.30 | $ 211,628.00 | 2,391,396.00 |
| 9.3 | Suministro e instalacion marco lamina CAL 18 incluye anticorrosivo | UN | 2.00 | $ 128,653.00 | 257,306.00 |
| 9.4 | Suministro e instalacio reja bancaria incluye anticorrosivo | M2 | 32.00 | $ 126,759.00 | 4,056,288.00 |
| 9.5 | Vidrio 5mm | M2 | 0.00 | $ 63,964.00 | - |
| 9.6 | Cerradura entrada doble cilindro | UN | 2.00 | $ 136,131.00 | 272,262.00 |
| 9.7 | Division para baños en aluminio y acrilico 0.05mm. | M2 | 5.00 | $ 240,729.00 | 1,203,645.00 |
| 9.8 | Suministro e instalacion sanitario avanti plus blanco, lavamanos con pedestal, sanitario, griferia y incrustaciones | UN | 2.00 | $ 592,964.00 | 1,185,928.00 |
| 10 | OBRAS EXTERIORES | | | | |
| 10.1 | Localizacion y replenteo obra arquitectonica | M2 | 48.00 | $ 6,371.00 | 305,808.00 |
| 10.2 | Excavacion manual en material comun (incluye acarreo) | M3 | 30.00 | $ 51,943.00 | 1,558,290.00 |
| 10.3 | Placa base en concreto E:0.10 2500 PSI | M2 | 20.00 | $ 82,398.00 | 1,647,960.00 |
| 10.4 | Refuerzo malla electrosoldad H:257 | KG | 60.00 | $ 7,936.00 | 476,160.00 |
| 11 | OBRAS COMPLEMENTARIAS. | | | | |
| 11.1 | Localizacion y replenteo obra arquitectonica | M2 | 0.00 | $ 6,371.00 | - |
| 11.2 | Excavacion manual en material comun (incluye acarreo) | M3 | 0.00 | $ 51,943.00 | - |
| 11.3 | Solado concreto espesor E:0.07MTS 14MPA (2000PSI) | M2 | 0.00 | $ 44,574.00 | - |
| 11.4 | Concreto viga de amarre 21.1 MPA, seccion rectangular | M3 | 0.00 | $ 829,581.00 | - |
| 11.5 | Columnas en concreto 21 MPA-(3000 PSI) altura menor a tres metros | M3 | 0.00 | $ 1,198,077.00 | - |
| 11.6 | Suministro y figurada de acero 60000 PSI 420 Mpa | KG | 0.00 | $ 7,002.00 | - |
| 11.7 | Muro tolete comun E=0.12m (contrapasos graderias) | M2 | 0.00 | $ 80,547.00 | - |
| 11.8 | Pañete liso muros1:4 | M2 | 0.00 | $ 25,187.00 | - |

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANTIDAD | VR UNIT INC FID | V.TOTAL |
| 11.9 | Losa maciza cimiento concrero 21 MPA-3000 PSI H=10cm( placa graderias) | M2 | 0.00 | $ 101,450.00 | - |
| 11.1 | Base en material de afirmado compactado | M3 | 0.00 | $ 73,747.00 | - |
| 11.12 | Refuerzo malla electrosoldad H:257 | KG | 0.00 | $ 7,936.00 | - |
| 11.13 | Suministro e instalacion perfileria metalica para estructuras de cubierta, dimensiones y calibre según diseño | KG | 0.00 | $ 17,135.00 | - |
| 11.14 | Suministro e instalacion de teja termoacustica tipo trapezoidal a 360 | M2 | 0.00 | $ 58,231.00 | - |
| VALOR COSTOS DIRECTOS UN (01) SALON COMUNAL TIPO | | | | | $ 223,140,286.00 |
| CANTIDAD DE SALONES COMUNALES A CONSTRUIR | | | | | 2.00 |
| VALOR COSTOS DIRECTOS DOS (02) SALONES COMUNALES | | | | | $ 446,280,572.00 |
| ADMINISTRACIÓN = 20% | | | | | $ 89,256,114.40 |
| IMPREVISTOS = 5% | | | | | $ 22,314,028.60 |
| UTILIDAD = 3% | | | | | $ 13,388,417.16 |
| VALOR TOTAL DE CONSTRUCCIÓN 2 SALONES + A.I.U. | | | | | $ 571,239,132.16 |
| VALOR TOTAL CONSTATACION DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DE LA OBRA | | | | | $ 1,190,000.00 |
| VALOR TOTAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SALONES COMUNALES TIPO | | | | | $ 19,029,290.00 |
| VALOR TOTAL | | | | | 591,458,422.16 |

## 4.2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN.

Tabla 5. Avance Acumulado a la fecha de corte en %.

| FECHA DE CORTE | % EJECUTADO ACUMULADO |
|---|---|
| 05/03/2024 | 1.82 % |


Tabla 6. Avance Acumulado a la fecha de corte en $.

| FECHA DE CORTE | $ EJECUTADO ACUMULADO |
|---|---|
| 05/03/2024 | $ 10.751.650,00 |

## 4.3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS A LA FECHA.


En este periodo se realizaron levantamientos topográficos, estudio de suelos y diseños arquitectónicos, los cuales fueron presentados a la supervisión para su posterior aprobación y así poder continuar y completar lo que compete a la fase I del proyecto de la construcción salones comunales en el municipio de villa de Leyva, en los sectores cañuela y Santander.

Figura 4. Levantamiento topográfico sector cañuelas

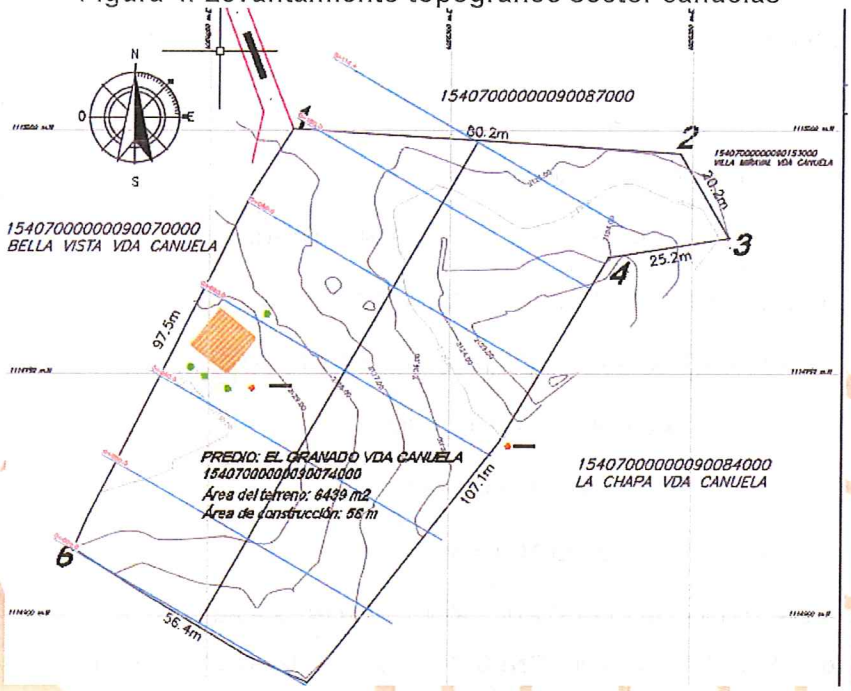



Fuente: Estudio.

Figura 5. 3D salón comunal sector cañuelas.

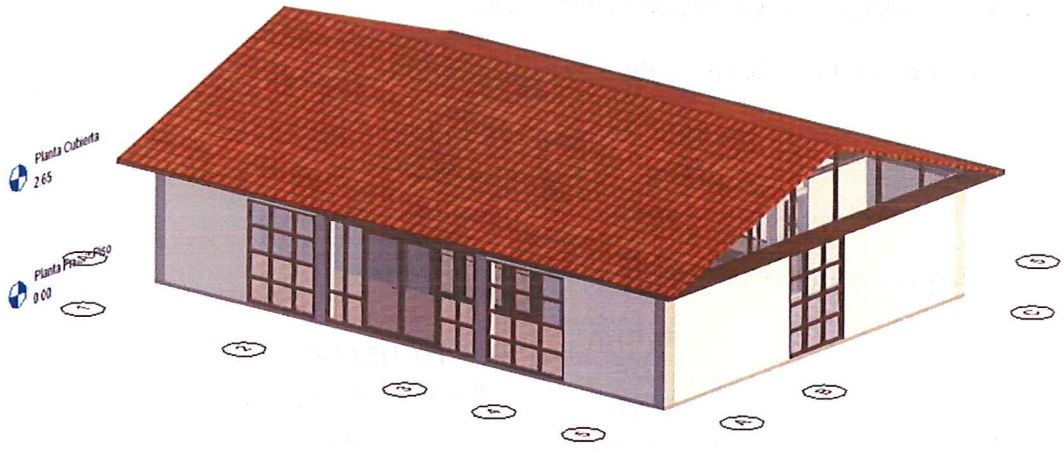



Fuente: Estudio.

Figura 6. Planta piso 1 salón comunal sector cañuelas.

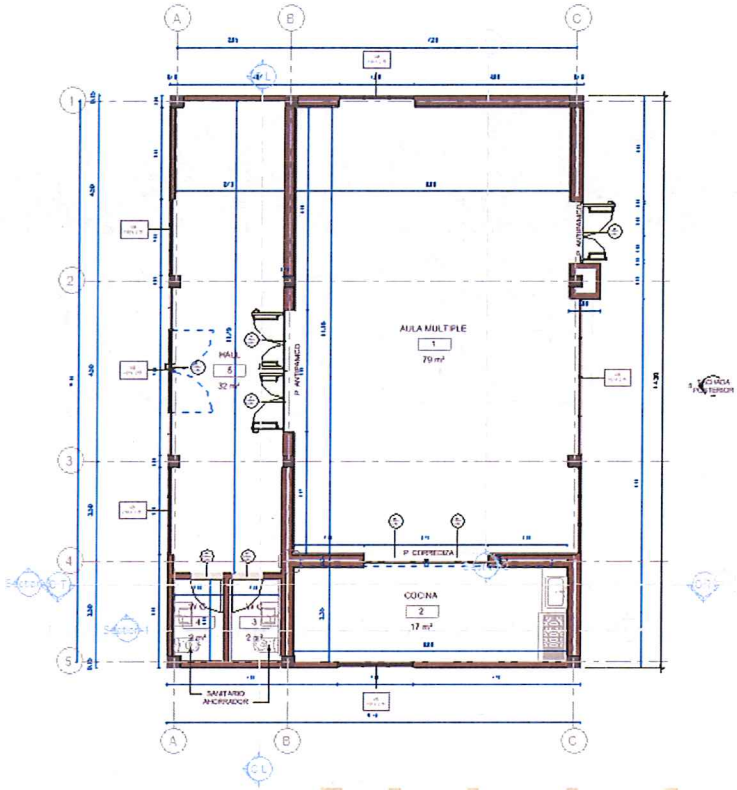



Fuente: Estudio.

Figura 7. Fachada principal salón comunal sector cañuelas.

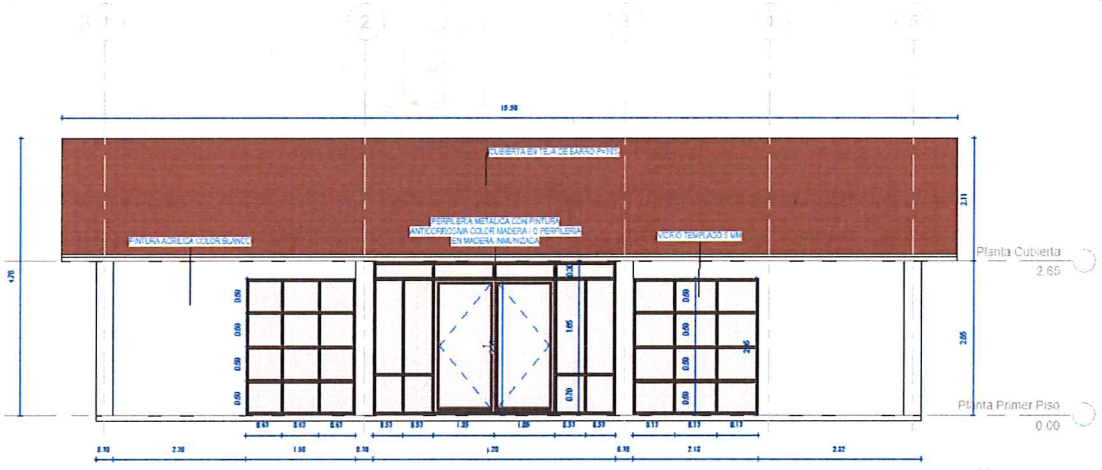



Fuente: Estudio.

Figura 8. Fachada posterior salón comunal sector cañuelas.

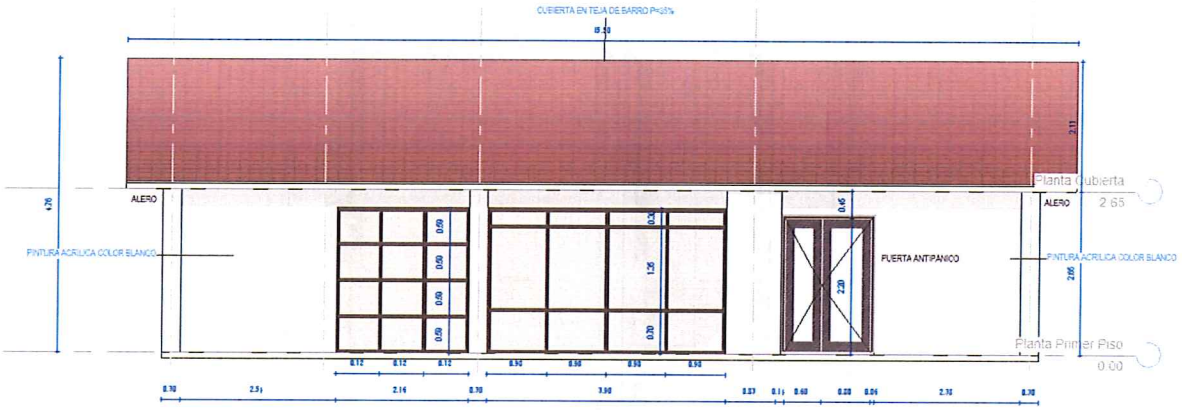



Fuente: Estudio.

Figura 9. Fachada Derecha salón comunal sector cañuelas.

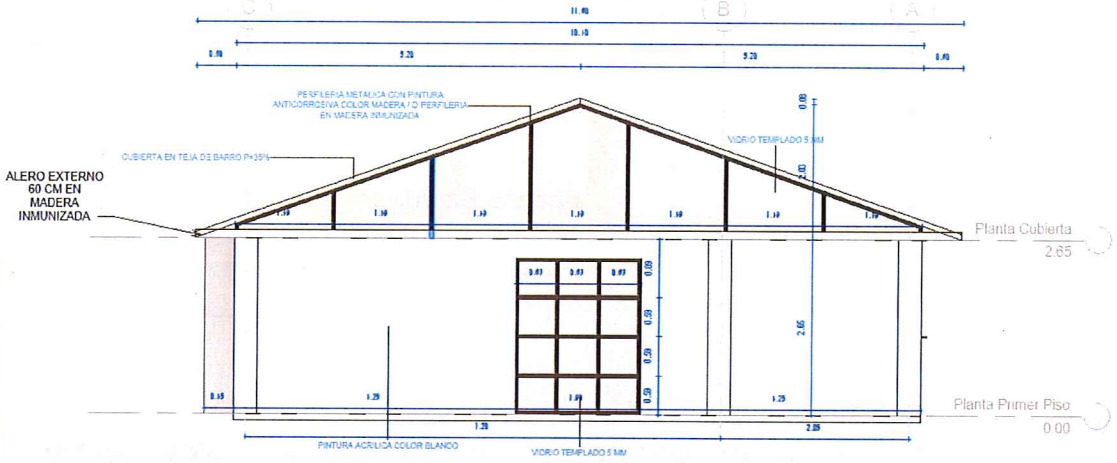


Fuente: Estudio.

Figura 10. Fachada Izquierda salón comunal sector cañuelas.

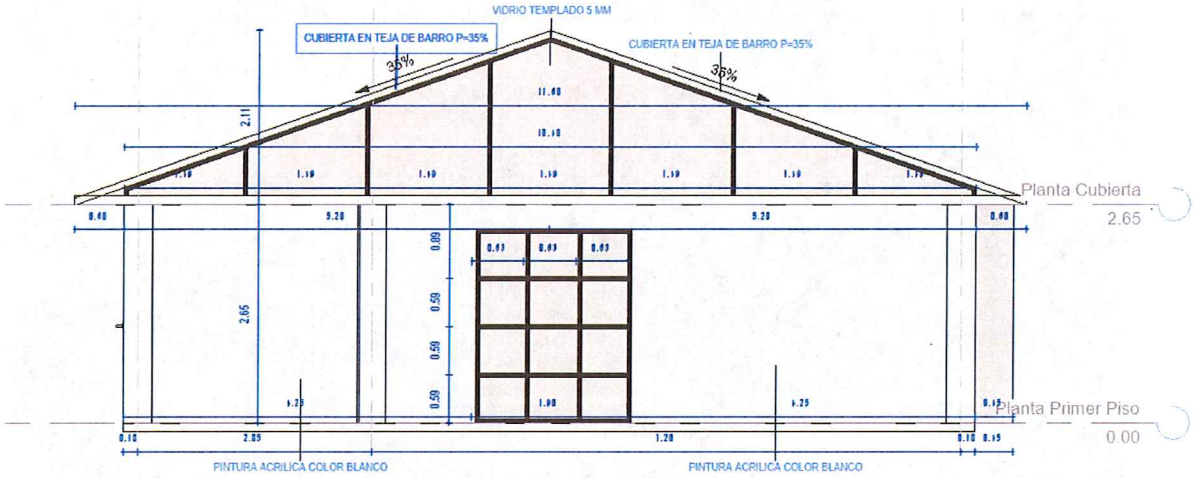


Fuente: Estudio.

Figura 11. Estudios de suelos sector cañuelas.





Fuente: Estudio

Figura 12. Estudios de suelos sector cañuelas.




Fuente: Estudio.

Figura 13. Estudios de suelos sector cañuelas.

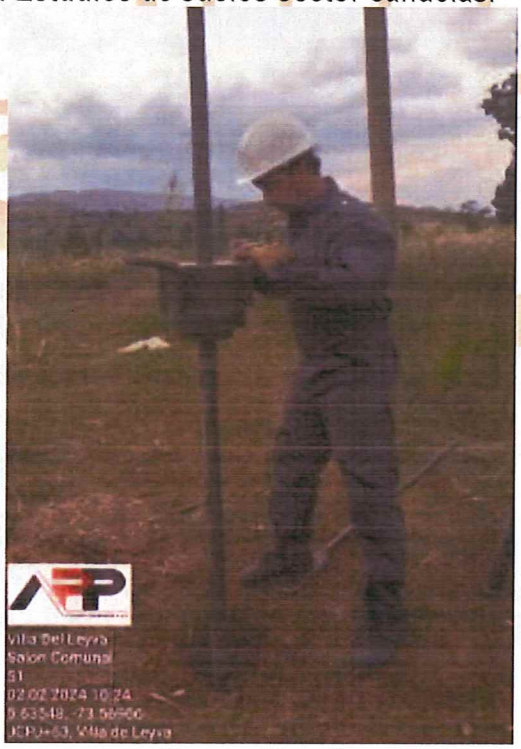



Fuente: Estudio

Figura 14. Estudios de suelos sector cañuelas.

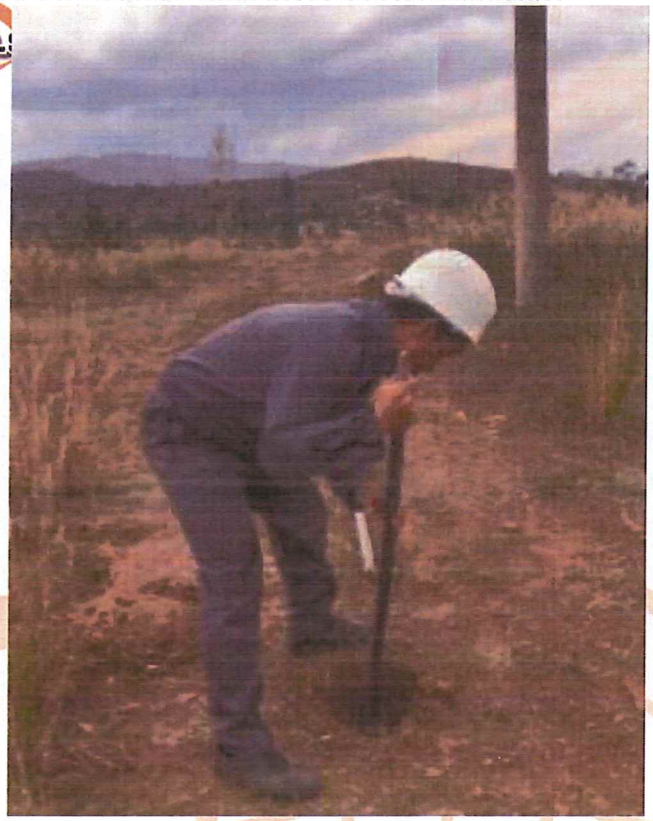


Fuente: Estudio

**Figura 15. Estudios de suelos sector cañuelas.**

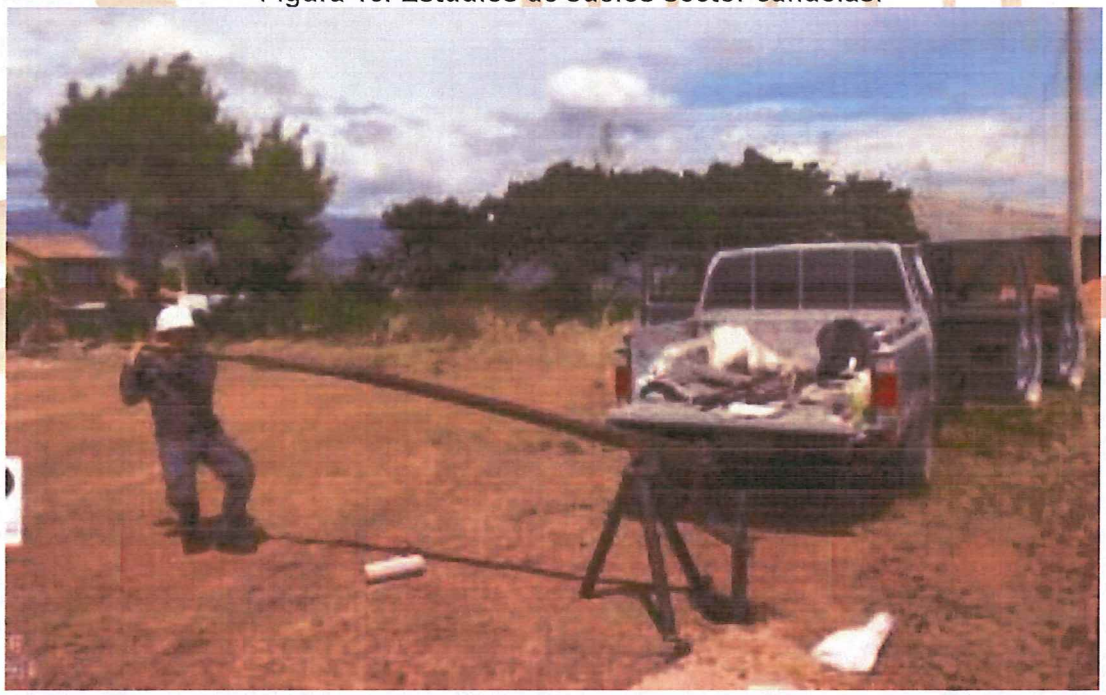

Fuente: Estudio

Figura 16. Estudios de suelos sector cañuelas.

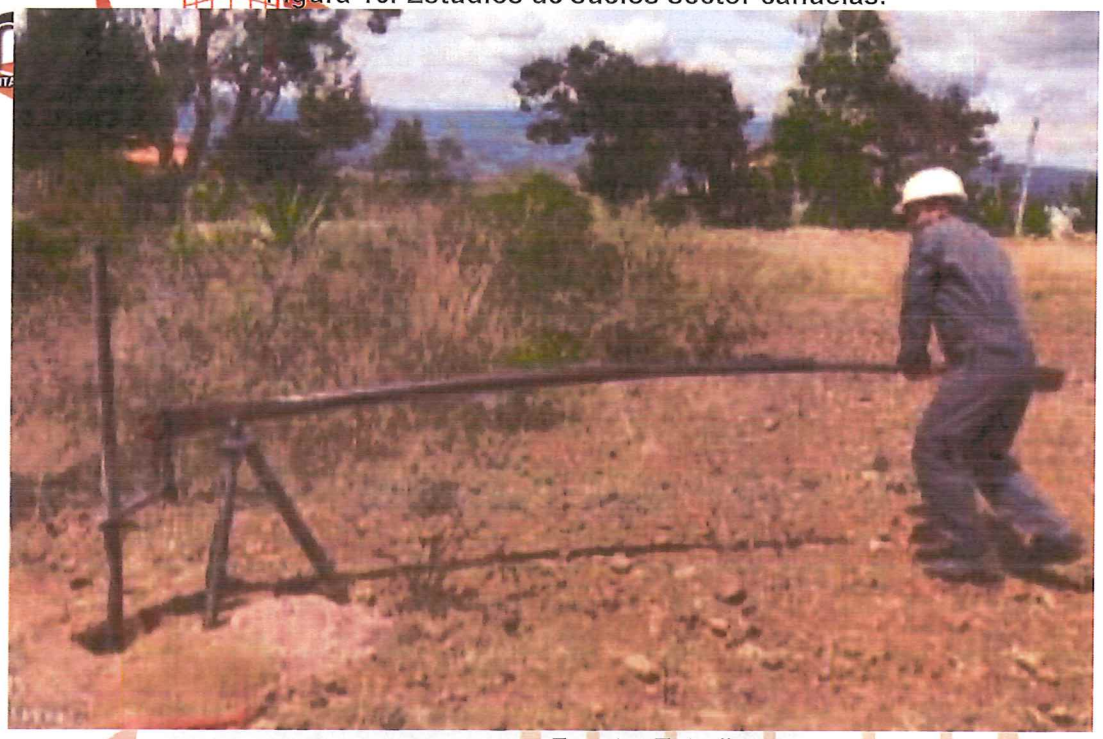


Fuente: Estudio

Figura 17. Estudios de suelos sector cañuelas.




Fuente: Estudio

Figura 18. Levantamiento topográfico sector Santander.

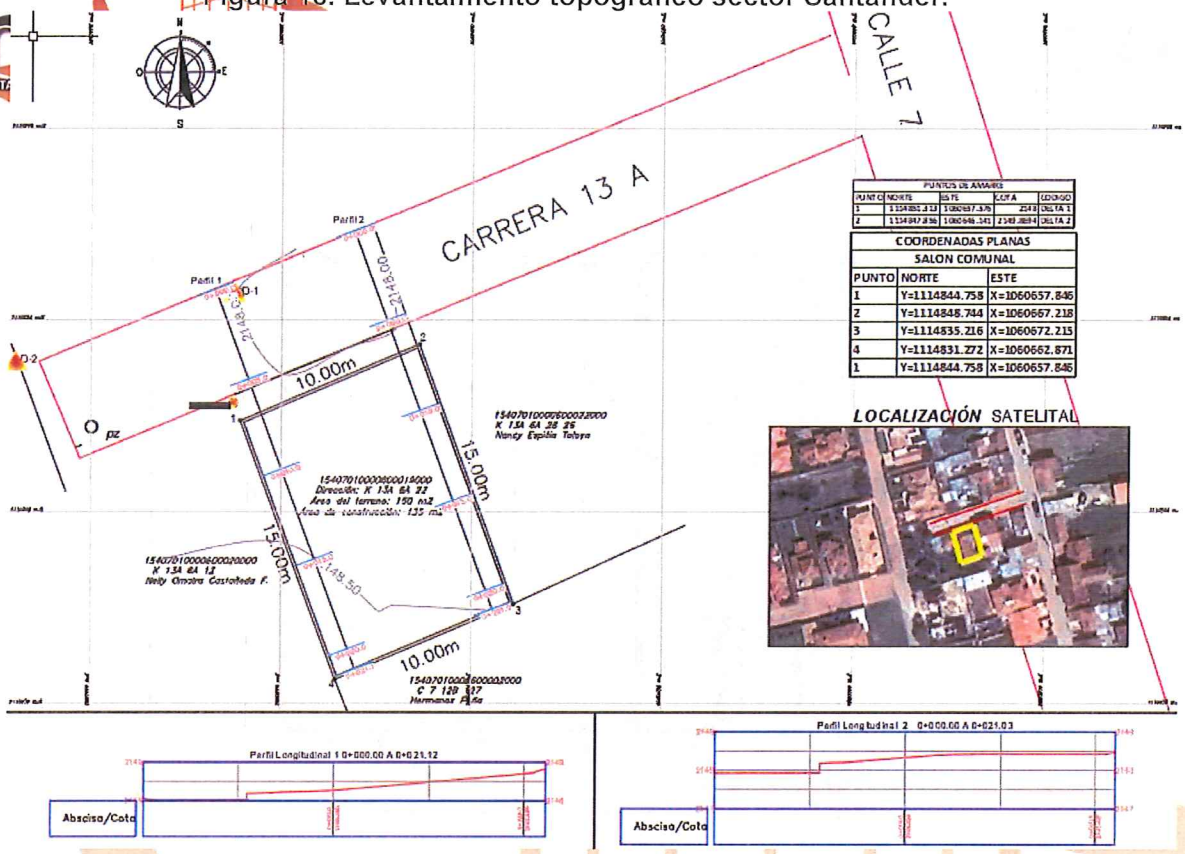



Fuente: Estudio.

Figura 19. 3D salón comunal sector Santander.

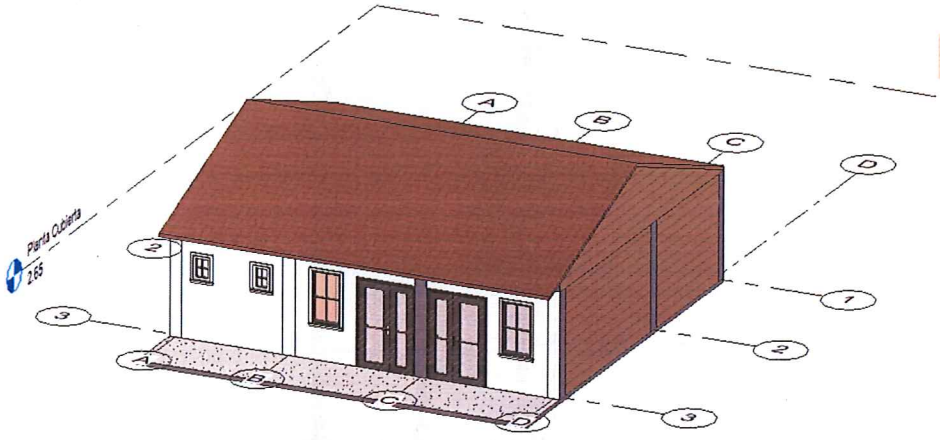



Fuente: Estudio.

Figura 20. Planta piso 1 salón comunal sector Santander.

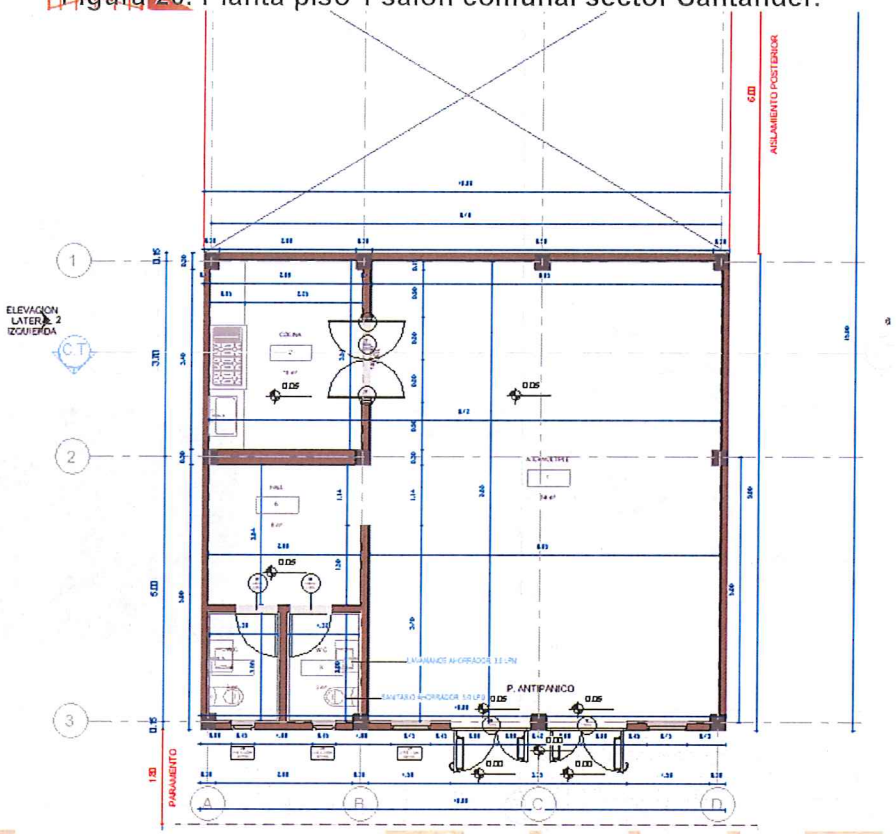



Fuente: Estudio.

Figura 21. Planta tanques salón comunal sector Santander.

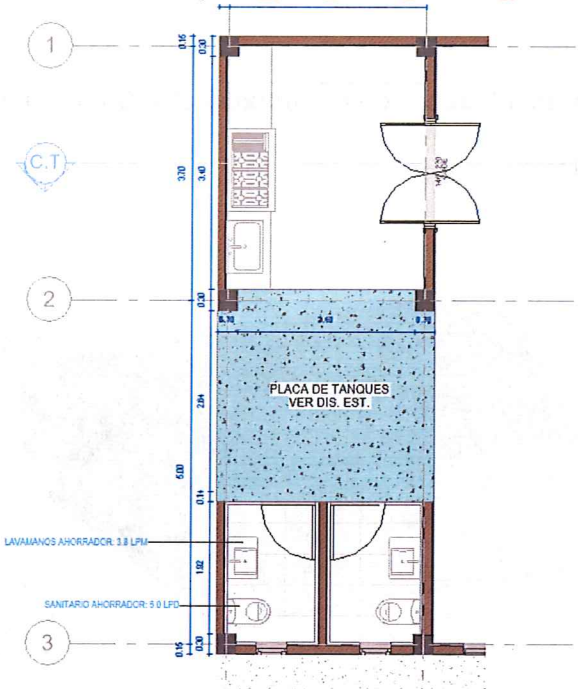


Fuente: Estudio.

Figura 22. Fachada principal salón comunal sector Santander.

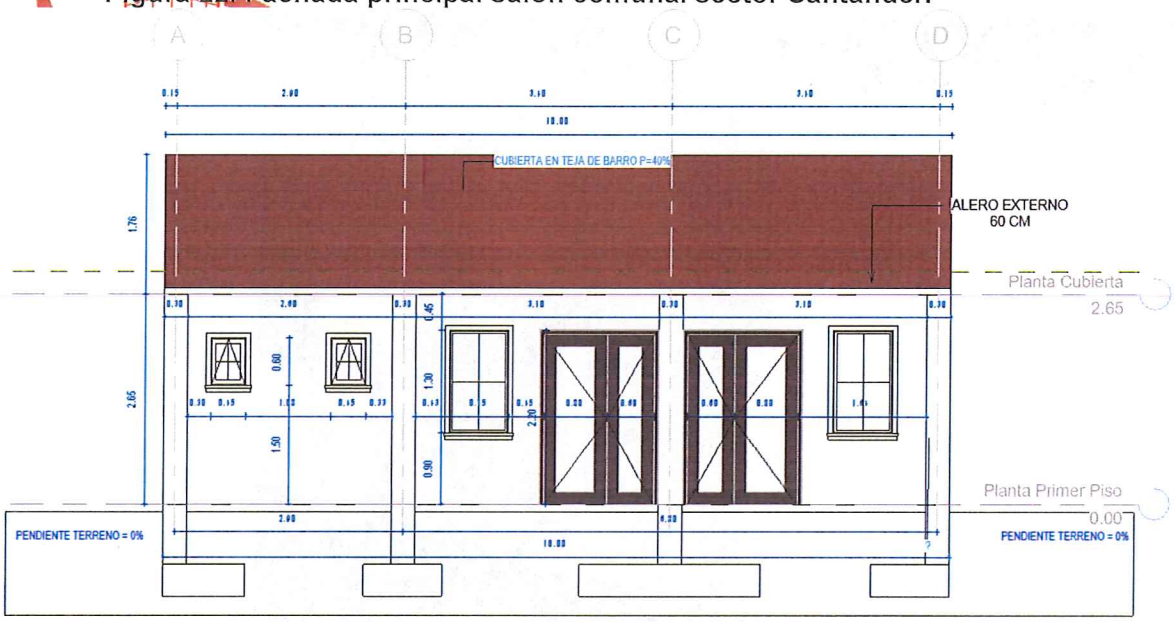


Fuente: Estudio.

Figura 23. Estudios de suelos sector Santander.




Fuente: Estudio

Figura 24. Estudios de suelos sector Santander.



Fuente: Estudio

Figura 25. Estudios de suelos sector Santander.



Fuente: Estudio

Figura 26. Estudios de suelos sector Santander.



Fuente: Estudio

Figura 27. Estudios de suelos sector Santander.



Fuente: Estudio

Figura 28. Estudios de suelos sector Santander.



Fuente: Estudio

Figura 29. Estudios de suelos sector Santander.




Fuente: Estudio

Figura 30. Estudios de suelos sector Santander.




Fuente: Estudio

Figura 31. Estudios de suelos sector Santander.

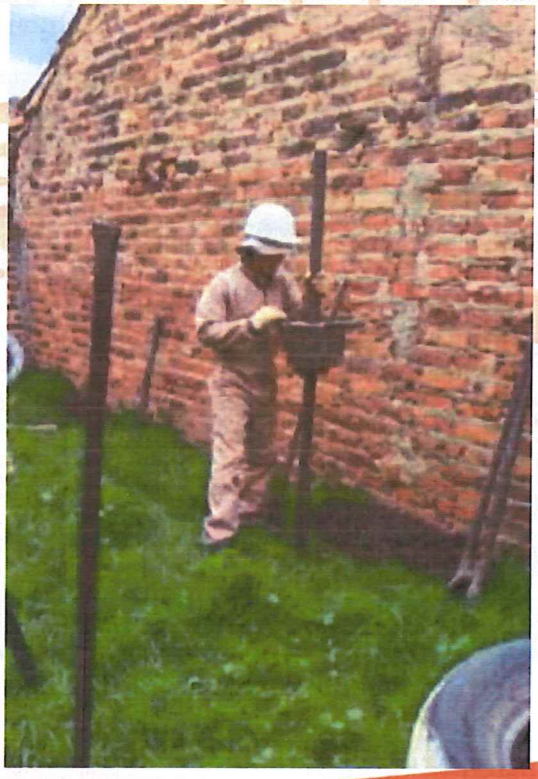


Fuente: Estudio

Figura 32. Estudios de suelos sector Santander.

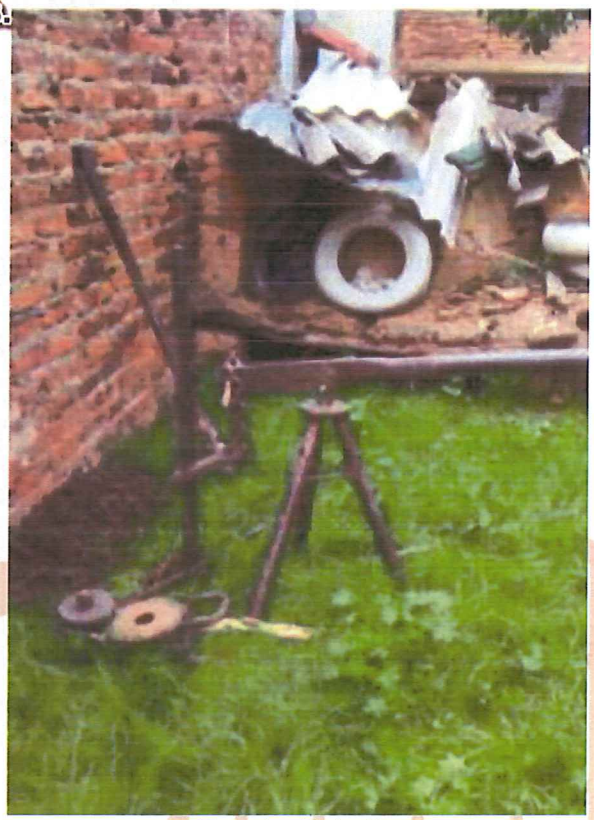

Fuente: Estudio

Figura 33. Estudios de suelos sector Santander.

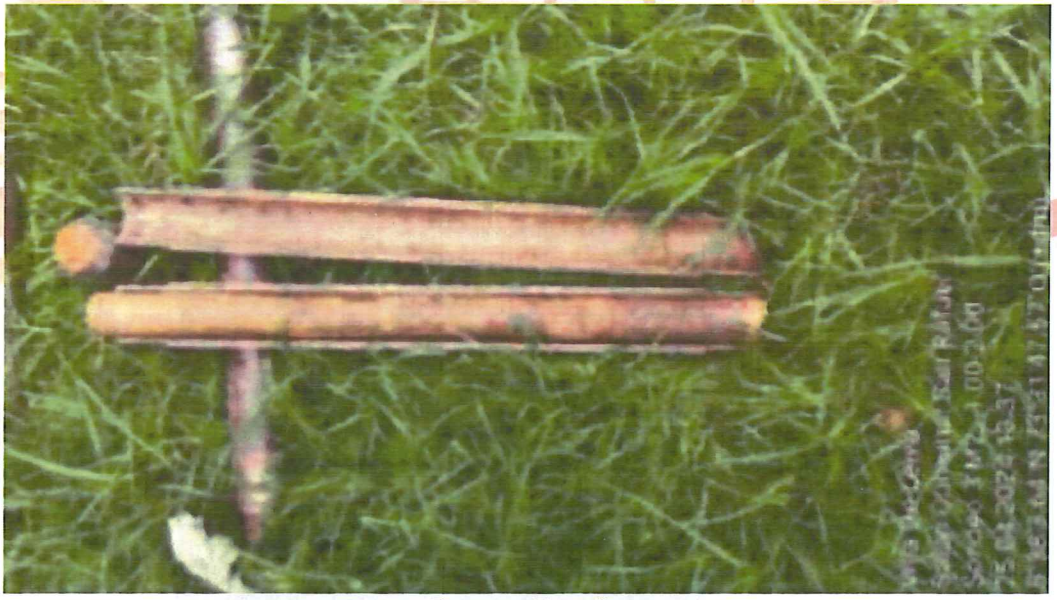

Fuente: Estudio

### 4.4. REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES.

Durante la ejecución del contrato no se realizaron solicitudes de multas y sanciones para el Contratista.

### 4.5. COMPONENTE AMBIENTAL – SST - SOCIAL.

Teniendo en cuenta que el presente proyecto no contempla actividades de PMA, PAGA, PGIO, SOCIAL o similares, no se realiza formulación ni seguimiento a los mismos.

## 5. RELACIÓN DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA.

A continuación, se resumen las pólizas actualizadas, las cuales fueron debidamente aprobadas por el Municipio de Villa de Leyva en la Plataforma Secop II. **Ver Anexo No. 1.**

**Tabla 6. Relación Pólizas Vigentes Contrato de Obra**

| PÓLIZA | AMPAROS | VIGENCIA DEL AMPARO | | MONTO DEL AMPARO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA | | |
| PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL<br><br>No 39-44-101157723 Anexo 5 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 27/12/2023 | 20/07/2025 | $ 118.291.684,43 | |
| | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 27/12/2023 | 20/07/2025 | $ 59.145.842,22 | |
| | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | | | $ 177.437.526,65 | 2 años, 0 meses y 0 días |
| PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE CONTRATOS<br><br>No 39-40-101041254 Anexo 4 | PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 27/12/2023 | 20/07/2024 | $ 232.000.000,00 | |

**Nota:** Las presentes pólizas fueron actualizadas según acta de reinicio y prorroga de fecha 27 de enero de 2024.

## 6. RECOMENDACIONES.

- Ninguna.

## 7. CONCLUSIONES.

- Durante el presente periodo de tiempo se realizaron levantamientos topográficos, estudios de suelos y diseños arquitectónicos de los salones comunales a realizar, de la mima manera fueron enviados para su posterior aprobación por parte de la supervisión.
- Se realizó suspensión No. 02 del contrato a partir del 05 de Marzo de 2024.
- Teniendo en cuenta que el presente proyecto no contempla actividades, PMA, PAGA, PGIO, SOCIAL o similares, no se realiza formulación ni seguimiento a los mismos.

RODOLFO ALBERTO BUITRAGO MEDINA
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No. 267 DE 2023

IMOES S.A.S
R.L. MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
CONTRATO DE OBRA No. 267 DE 2023

# RELACIÓN DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| TUNJA | TUNJA | 39 | 39-40-101041254 | 4 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 01 | 2024 | 27 | 12 | 2023 | 00:00 | 20 | 07 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN | DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| IMOES S.A.S. | NIT: 900.518.247-1 | CALLE 129 MP 7 C 15 AP 201 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 3138307269 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN | DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA | NIT: 891.801.268-7 | CARRERA 9 NO 13 11 | VILLA DE LEYVA, BOYACA | 7320411 |

BENEFICIARIO: 891801268 - MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONTRATO ANEXO AL CONTRATO LICITACION PUBLICA N 267 DE 2023-LPAMVL-011-2023

CUYO OBJETO ES:

CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA LA CONSTRUCCION DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, DEPARTAMENTO DE BOYACA

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **PREDIOS LABORES Y OPERACIONES** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | 27/12/2023 | 20/07/2024 | $232,000,000.00 | $232,000,000.00 |

### ACLARACIONES

SEGUN PRORROGA No 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 267 DE 2023 DE FECHA 30/01/2024 SE AMPLIA LA VIHGENCIAS DE LA GARANTIA RCE

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****191,956.00 | $ *******3,000.00 | $ ******37,041.00 | $ **********231,997.00 | $ ******232,000,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| VIRNEIS VIVIANA OROZCO SANCHEZ | 132892 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA***

39-40-101041254

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| TUNJA | TUNJA | 39 | 39-40-101041254 | 4 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 01 | 2024 | 27 | 12 | 2023 | 00:00 | 20 | 07 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IMOES S.A.S. | IDENTIFICACIÓN | NIT: 900.518.247-1 |
|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN: CALLE 129 MP 7 C 15 AP 201 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO: | 3138307269 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA | IDENTIFICACIÓN | NIT: 891.801.268-7 |
|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN: CARRERA 9 NO 13 11 | CIUDAD: VILLA DE LEYVA, BOYACA | TELÉFONO: | 7320411 |

BENEFICIARIO: 891801268 - MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA

TEXTO ACLARATORIO

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA***

39-40-101041254

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| TUNJA | TUNJA | 39 | 39-44-101157723 | 5 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 01 | 2024 | 27 | 12 | 2023 | 00:00 | 20 | 07 | 2027 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN | DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| IMOES S.A.S. | NIT: 900.518.247-1 | CALLE 129 MP 7 C 15 AP 201 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 3138307269 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN | DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA | NIT: 891.801.268-7 | CARRERA 9 NO 13 11 | VILLA DE LEYVA, BOYACA | 7320411 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ANEXO AL CONTRATO LICITACION PUBLICA N 267 DE 2023- LPAMVL-011-2023

CUYO OBJETO ES:

CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA LA CONSTRUCCION DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, DEPARTAMENTO DE BOYACA

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 27/12/2023 | 20/07/2025 | $118,291,684.43 | $118,291,684.43 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * | | $177,437,526.65 | $177,437,526.65 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 27/12/2023 | 20/07/2027 | $59,145,842.22 | $59,145,842.22 |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

SEGUN PRORROGA No 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 267 DE 2023 DE FECHA 30/01/2024 SE AMPLIA LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****145,839.00 | $ *******8,000.00 | $ ******29,229.00 | $ **********183,068.00 | $ ******354,875,053.30 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| VIRNEIS VIVIANA OROZCO SANCHEZ | 132892 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA***

39-44-101157723

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| TUNJA | TUNJA | 39 | 39-44-101157723 | 5 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 01 | 2024 | 27 | 12 | 2023 | 00:00 | 20 | 07 | 2027 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| IMOES S.A.S. | | NIT: 900.518.247-1 | |
| **DIRECCIÓN:** CALLE 129 MP 7 C 15 AP 201 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** 3138307269 | |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA | | NIT: 891.801.268-7 | |
| **DIRECCIÓN:** CARRERA 9 NO 13 11 | **CIUDAD:** VILLA DE LEYVA, BOYACA | **TELÉFONO:** 7320411 | |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA***

39-44-101157723

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| TUNJA | TUNJA | 39 | 39-40-101041254 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 01 | 2024 | 27 | 12 | 2023 | 00:00 | 20 | 02 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| IMOES S.A.S. | NIT: 900.518.247-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 129 MP 7 C 15 AP 201 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 3138307269 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA | NIT: 891.801.268-7 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CARRERA 9 NO 13 11 | VILLA DE LEYVA, BOYACA | 7320411 |

BENEFICIARIO: 891801268 - MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONTRATO ANEXO AL CONTRATO LICITACION PUBLICA N 267 DE 2023-LPAMVL-011-2023

CUYO OBJETO ES:

CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA LA CONSTRUCCION DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, DEPARTAMENTO DE BOYACA

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **PREDIOS LABORES Y OPERACIONES** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **27/12/2023** | **20/02/2024** | **$232,000,000.00** | **$232,000,000.00** |

### ACLARACIONES

SEGUN ACTA DE SUSPENSION NUMERO 01 DE FECHA 28/12/2023.

ACTA DE REINICIO NUMERO 01 DE FECHA 27/01/2024 SE AMPLIA LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE RCE

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******38,136.00 | $ *******3,000.00 | $ *******7,816.00 | $ **********48,953.00 | $ ******232,000,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| VIRNEIS VIVIANA OROZCO SANCHEZ | 132892 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA***

39-40-101041254

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| TUNJA | TUNJA | 39 | 39-40-101041254 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 01 | 2024 | 27 | 12 | 2023 | 00:00 | 20 | 02 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | IMOES S.A.S. | | NIT: 900.518.247-1 |
| **DIRECCIÓN:** CALLE 129 MP 7 C 15 AP 201 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** | 3138307269 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA | | NIT: 891.801.268-7 |
| **DIRECCIÓN:** CARRERA 9 NO 13 11 | **CIUDAD:** VILLA DE LEYVA, BOYACA | **TELÉFONO:** | 7320411 |

BENEFICIARIO: 891801268 - MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA

TEXTO ACLARATORIO

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA***

39-40-101041254

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| TUNJA | TUNJA | 39 | 39-44-101157723 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 01 | 2024 | 27 | 12 | 2023 | 00:00 | 20 | 02 | 2027 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN | DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| IMOES S.A.S. | NIT: 900.518.247-1 | CALLE 129 MP 7 C 15 AP 201 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 3138307269 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN | DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA | NIT: 891.801.268-7 | CARRERA 9 NO 13 11 | VILLA DE LEYVA, BOYACA | 7320411 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ANEXO AL CONTRATO LICITACION PUBLICA N 267 DE 2023- LPAMVL-011-2023

CUYO OBJETO ES:

CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA LA CONSTRUCCION DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, DEPARTAMENTO DE BOYACA

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 27/12/2023 | 21/01/2025 | $118,291,684.43 | |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * | | $177,437,526.65 | $177,437,526.65 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 27/12/2023 | 20/02/2027 | $59,145,842.22 | $59,145,842.22 |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO SEGUN ACTA DE SUSPENSION NUMERO 01 DE FECHA 28/12/2023.

ACTA DE REINICIO NUMERO 01 DE FECHA 27/01/2024 SE AMPLIA LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *******9,722.00 | $ *******8,000.00 | $ *******3,367.00 | $ ************21,089.00 | $ ******354,875,053.30 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| VIRNEIS VIVIANA OROZCO SANCHEZ | 132892 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA***

39-44-101157723

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.POLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| TUNJA | TUNJA | 39 | 39-44-101157723 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 01 | 2024 | 27 | 12 | 2023 | 00:00 | 20 | 02 | 2027 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| IMOES S.A.S. | | NIT: 900.518.247-1 | |
| **DIRECCIÓN:** CALLE 129 MP 7 C 15 AP 201 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** 3138307269 | |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA | | NIT: 891.801.268-7 | |
| **DIRECCIÓN:** CARRERA 9 NO 13 11 | **CIUDAD:** VILLA DE LEYVA, BOYACA | **TELÉFONO:** 7320411 | |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA***

39-44-101157723

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| TUNJA | TUNJA | 39 | 39-44-101157723 | 4 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 01 | 2024 | 27 | 12 | 2023 | 00:00 | 20 | 02 | 2027 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN | DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| IMOES S.A.S. | NIT: 900.518.247-1 | CALLE 129 MP 7 C 15 AP 201 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 3138307269 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN | DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA | NIT: 891.801.268-7 | CARRERA 9 NO 13 11 | VILLA DE LEYVA, BOYACA | 7320411 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ANEXO AL CONTRATO LICITACION PUBLICA N 267 DE 2023- LPAMVL-011-2023

CUYO OBJETO ES:

CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA LA CONSTRUCCION DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, DEPARTAMENTO DE BOYACA

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 27/12/2023 | 20/02/2025 | $118,291,684.43 | $118,291,684.43 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * | | $177,437,526.65 | $177,437,526.65 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 27/12/2023 | 20/02/2027 | $59,145,842.22 | $59,145,842.22 |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO SEGUN ACTA DE SUSPENSION NUMERO 01 DE FECHA 28/12/2023.

ACTA DE REINICIO NUMERO 01 DE FECHA 27/01/2024 SE AMPLIA LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ ******354,875,053.30 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| VIRNEIS VIVIANA OROZCO SANCHEZ | 132892 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA***

39-44-101157723

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| TUNJA | TUNJA | 39 | 39-44-101157723 | 4 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 01 | 2024 | 27 | 12 | 2023 | 00:00 | 20 | 02 | 2027 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | IMOES S.A.S. | | NIT: 900.518.247-1 |
| **DIRECCIÓN:** CALLE 129 MP 7 C 15 AP 201 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** | 3138307269 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA | | NIT: 891.801.268-7 |
| **DIRECCIÓN:** CARRERA 9 NO 13 11 | **CIUDAD:** VILLA DE LEYVA, BOYACA | **TELÉFONO:** | 7320411 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA***

39-44-101157723

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 900518247 | 1 | IMOES SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | IMOES SAS | CALLE 45C No. 2A - 24 | TUNJA-BOYACA | 7402585 | No |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-01 | 2024-02 | 1000000757 | 9462824997 | E | 2024/02/12 | 2024/02/12 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $2,622,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| **Sucursal: IMOES SAS (2 Afiliados)** | | | | | | $3,800,000 | $608,000 | | | $3,800,000 | $475,000 | | | $3,800,000 | $152,000 | | | $3,800,000 | $264,500 | | $3,800,000 | $190,000 |
| **Centro de Trabajo: IMOES ( 2 Afiliados)** | | | | | | $3,800,000 | $608,000 | | | $3,800,000 | $475,000 | | | $3,800,000 | $152,000 | | | $3,800,000 | $264,500 | | $3,800,000 | $190,000 |
| Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA ( 2 Afiliados) | | | | | | $3,800,000 | $608,000 | | | $3,800,000 | $475,000 | | | $3,800,000 | $152,000 | | | $3,800,000 | $264,500 | | $3,800,000 | $190,000 |
| 1 | CC | 1049614172 | BUITRAGO RODOLFO | 25-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $162,500 | CCF10 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $1,300,000 | $65,000 |
| 2 | CC | 1049609995 | MORENO MARIA | 231001 | 30 | $2,500,000 | $400,000 | EPS005 | 30 | $2,500,000 | $312,500 | CCF10 | 30 | $2,500,000 | $100,000 | 14-11 | 30 | $2,500,000 | $174,000 | 30 | $2,500,000 | $125,000 |

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| **Sucursal: OFICINA TUNJA (2 Afiliados)** | | | | | | $2,600,002 | $416,200 | | | $2,600,002 | $325,200 | | | $2,036,668 | $81,600 | | | $2,600,002 | $7,600 | | $2,036,668 | $102,300 |
| **Centro de Trabajo: OF TUNJA ( 2 Afiliados)** | | | | | | $2,600,002 | $416,200 | | | $2,600,002 | $325,200 | | | $2,036,668 | $81,600 | | | $2,600,002 | $7,600 | | $2,036,668 | $102,300 |
| Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA ( 2 Afiliados) | | | | | | $2,600,002 | $416,200 | | | $2,600,002 | $325,200 | | | $2,036,668 | $81,600 | | | $2,600,002 | $7,600 | | $2,036,668 | $102,300 |
| 3 | CC | 1051211881 | CANO ANGIE | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | ESSC24 | 17 | $736,667 | $92,100 | CCF10 | 17 | $736,667 | $29,500 | 14-11 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $736,667 | $37,000 |
| 4 | CC | 1051211881 | CANO ANGIE | 230301 | 13 | $563,334 | $90,200 | ESSC24 | 13 | $563,334 | $70,500 | CCF10 | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 13 | $563,334 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 1049643685 | VELANDIA PEDRO | 25-14 | 16 | $693,334 | $111,000 | EPS008 | 16 | $693,334 | $86,700 | CCF10 | 16 | $693,334 | $27,800 | 14-11 | 16 | $693,334 | $3,700 | 16 | $693,334 | $34,800 |
| 6 | CC | 1049643685 | VELANDIA PEDRO | 25-14 | 14 | $606,667 | $97,100 | EPS008 | 14 | $606,667 | $75,900 | CCF10 | 14 | $606,667 | $24,300 | 14-11 | 14 | $606,667 | $0 | 14 | $606,667 | $30,500 |
| **Total** | **Afiliados( 4)** | | | | | $6,400,002 | $1,024,200 | | | $6,400,002 | $800,200 | | | $5,836,668 | $233,600 | | | $6,400,002 | $272,100 | | $5,836,668 | $292,300 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900518247 | 1 | IMOES SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | IMOES SAS | CALLE 45C No. 2A - 24 | TUNJA-BOYACA | 7402585 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-01 | 2024-02 | 1000000757 | 9462824997 | E | 2024/02/12 | 2024/02/12 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $2,622,400 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 4 | $1,024,200 | $0 | $0 | $1,024,200 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $400,000 | $0 | $0 | $400,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | $416,100 | $0 | $0 | $416,100 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $208,100 | $0 | $0 | $208,100 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $272,100 | $0 | $0 | $272,100 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 4 | $272,100 | $0 | $0 | $272,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $233,600 | $0 | $0 | $233,600 |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 4 | $233,600 | $0 | $0 | $233,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 4 | $800,200 | $0 | $0 | $800,200 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $162,600 | $0 | $0 | $162,600 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | $162,600 | $0 | $0 | $162,600 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $475,000 | $0 | $0 | $475,000 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $175,400 | $0 | $0 | $175,400 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 4 | $175,400 | $0 | $0 | $175,400 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $116,900 | $0 | $0 | $116,900 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 4 | $116,900 | $0 | $0 | $116,900 |
| TOTAL | | | | 4 | $2,622,400 | $0 | $0 | $2,622,400 |



2024/02/15 09:25 AM

# CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que JEIMY ALEXANDRA con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1049608109, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) JEIMY ALEXANDRA REYES VARGAS con documento CC 1049608109, como se detalla a continuación:

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | |
|---|---|---|---|
| Número de Planilla | 4557825502 | Tipo de Planilla | N-CORRECCIONES |
| Periodo Cotizado Otros | ENERO/2024 | Periodo Cotización Salud | ENERO/2024 |
| Fecha Pago | 2024/06/26 | Número de Autorización | 4062669694 |

| APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL | | | |
|---|---|---|---|
| PENSIÓN | | Administradora | 230301 - PORVENIR |
| Días | 30 | Tarifa | 16,000 % |
| Indicador tarifa especial | Normal | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALUD | | Administradora | EPS005 - SANITAS S.A |
| Días | 30 | Tarifa | 12,500 % |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RIESGOS PROFESIONALES | | Administradora | 14-11 - ARL SURA |
| Días | 30 | Tarifa | 0,522 % |
| Clase de Riesgo | 1 | | |

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada

# RESUMEN PLANILLA PAGADA




## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1053334805 | 0 | YEISON GILBERTO SANCHEZ SANCHEZ | I | 0 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 7112 | Natural |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 15-638 | CRA 3 N 4 79 | | 3174419370 | | | TOPOGRAFIA.YEISONSANCHEZ@GMAIL.COM | | N |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

| PERIODO PENSION | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 2024-01 | 28610579 | I | 2024-02-09 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 431.100 | 2.900 | NEQUI |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 28610579 | 2024-02-02 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot | ARL | IBC | Cot | Cot | Cot | Cot | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | | | |
| 1 | CC 1053334805 | SANCHEZ SANCHEZ YEISON GILBERTO | 1.300.000 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | FAMISANAR-EPS017 | 1.300.000 | 162.500 | COMFABOY-CCF10 | 1.300.000 | 26.000 | 1.300.000 | 31.700 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5G | 0 | 428.200 | N | 1711001 |


# RESUMEN PLANILLA PAGADA




## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1053334805 | 0 | YEISON GILBERTO SANCHEZ SANCHEZ | I | 0 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 7112 | Natural |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 15-638 | CRA 3 N 4 79 | | 3174419370 | | | TOPOGRAFIA.YEISONSANCHEZ@GMAIL.COM | | N |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

| PERIODO PENSION | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 2024-01 | 28610579 | I | 2024-02-09 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 431.100 | 2.900 | NEQUI |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 28610579 | | Pagada | | | | | | | |


## TOTALES IBC

| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
|---|---|---|---|---|
| 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 208.000 | 0 | 1.400 | 0 | 209.400 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 1 | 208.000 | 0 | 1.400 | 0 | 209.400 |
| EPS(Administradoras: 1) | | | | 1 | 162.500 | 0 | 1.100 | 0 | 163.600 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830003564 | 7 | 1 | 162.500 | 0 | 1.100 | 0 | 163.600 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 31.700 | 0 | 200 | 0 | 31.900 |
| POSITIVA | 14-23 | 860011153 | 6 | 1 | 31.700 | 0 | 200 | 0 | 31.900 |
| CCF(Administradoras: 1) | | | | 1 | 26.000 | 0 | 200 | 0 | 26.200 |
| COMFABOY | CCF10 | 891800213 | 8 | 1 | 26.000 | 0 | 200 | 0 | 26.200 |
| Gran Total | | | | | 428.200 | 0 | 2.900 | 0 | 431.100 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900518247 | 1 | IMOES SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | IMOES SAS | CALLE 45C No. 2A - 24 | TUNJA-BOYACA | 7402585 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-02 | 2024-03 | 1000000498 | 9463582391 | E | 2024/03/12 | 2024/03/14 | BANCO DE BOGOTA | 2 | $2,683.200 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| **Sucursal: IMOES SAS (2 Afiliados)** | | | | | $3,800,000 | $608,000 | | | $3,800,000 | $475,000 | | | $3,800,000 | $152,000 | | | $3,800,000 | $264,500 | | $3,800,000 | $190,000 |
| **Centro de Trabajo: IMOES ( 2 Afiliados)** | | | | | $3,800,000 | $608,000 | | | $3,800,000 | $475,000 | | | $3,800,000 | $152,000 | | | $3,800,000 | $264,500 | | $3,800,000 | $190,000 |
| Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA ( 2 Afiliados) | | | | | $3,800,000 | $608,000 | | | $3,800,000 | $475,000 | | | $3,800,000 | $152,000 | | | $3,800,000 | $264,500 | | $3,800,000 | $190,000 |
| 1 | CC | 1049614172 | BUITRAGO RODOLFO | 25-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $162,500 | CCF10 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $1,300,000 | $65,000 |
| 2 | CC | 1049609995 | MORENO MARIA | 231001 | 30 | $2,500,000 | $400,000 | EPS005 | 30 | $2,500,000 | $312,500 | CCF10 | 30 | $2,500,000 | $100,000 | 14-11 | 30 | $2,500,000 | $174,000 | 30 | $2,500,000 | $125,000 |

| EMPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| **Sucursal: OFICINA TUNJA (2 Afiliados)** | | | | | $2,600,000 | $416,000 | | | $2,600,000 | $325,000 | | | $2,600,000 | $104,000 | | | $2,600,000 | $13,600 | | $2,600,000 | $130,000 |
| **Centro de Trabajo: OF TUNJA ( 2 Afiliados)** | | | | | $2,600,000 | $416,000 | | | $2,600,000 | $325,000 | | | $2,600,000 | $104,000 | | | $2,600,000 | $13,600 | | $2,600,000 | $130,000 |
| Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA ( 2 Afiliados) | | | | | $2,600,000 | $416,000 | | | $2,600,000 | $325,000 | | | $2,600,000 | $104,000 | | | $2,600,000 | $13,600 | | $2,600,000 | $130,000 |
| 3 | CC | 105121188I | CANO ANGIE | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | ESSC24 | 30 | $1,300,000 | $162,500 | CCF10 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $1,300,000 | $65,000 |
| 4 | CC | 1049643685 | VELANDIA PEDRO | 25-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS008 | 30 | $1,300,000 | $162,500 | CCF10 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $1,300,000 | $65,000 |
| **Total** | **Afiliados( 4)** | | | | $6,400,000 | $1,024,000 | | | $6,400,000 | $800,000 | | | $6,400,000 | $256,000 | | | $6,400,000 | $278,100 | | $6,400,000 | $320,000 |

aportes en línea

# Resum General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900518247 | 1 | IMOES SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | IMOES SAS | CALLE 45C No. 2A - 24 | TUNJA-BOYACA | 7402585 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-02 | 2024-03 | 1000000498 | 9463582391 | E | 2024/03/12 | 2024/03/14 | BANCO DE BOGOTA | 2 | $2,683,200 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 4 | $1,024,000 | $1,900 | $0 | $1,025,900 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $400,000 | $700 | $0 | $400,700 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | $416,000 | $800 | $0 | $416,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $208,000 | $400 | $0 | $208,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $278,100 | $500 | $0 | $278,600 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 4 | $278,100 | $500 | $0 | $278,600 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $256,000 | $500 | $0 | $256,500 |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 4 | $256,000 | $500 | $0 | $256,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 4 | $800,000 | $1,500 | $0 | $801,500 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $162,500 | $300 | $0 | $162,800 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | $162,500 | $300 | $0 | $162,800 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $475,000 | $900 | $0 | $475,900 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $192,000 | $400 | $0 | $192,400 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 4 | $192,000 | $400 | $0 | $192,400 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $128,000 | $300 | $0 | $128,300 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 4 | $128,000 | $300 | $0 | $128,300 |
| TOTAL | | | | 4 | $2,678,100 | $5,100 | $0 | $2,683,200 |



2024/03/14 11:17 AM

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2024-02
Período Salud : 2024-02

Se certifica que en la fecha 2024-03-12 la empresa YEISON GILBERTO SANCHEZ SANCHEZ con documento de identificación CC 1053334805 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante SANCHEZ SANCHEZ YEISON GILBERTO identificado con CC-1053334805, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

| Datos Aportante | |
|---|---|
| Identificación | Razón Social |
| CC-1053334805 | YEISON GILBERTO SANCHEZ SANCHEZ |

| Datos Planilla | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | Tipo Planilla | Fecha de Pago | Tarifa Riesgos Laborales |
| 28706283 | I | 2024-03-12 | 0,02436 |

Datos Administradoras

| Tipo | NIT | Código | Nombre | Días |
|---|---|---|---|---|
| AFP | 800224808 | 230301 | PORVENIR | 30 |
| EPS | 830003564 | EPS017 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO | 30 |
| ARL | 860011153 | 14-23 | ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | 30 |
| CCF | 891800213 | CCF10 | Caja de Compensacion Familiar de Boyaca COMFABOY | 30 |

# CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que JEIMY ALEXANDRA con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1049608109, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) JEIMY ALEXANDRA REYES VARGAS con documento CC 1049608109, como se detalla a continuación:

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | |
|---|---|---|---|
| Número de Planilla | 4557826266 | Tipo de Planilla | N-CORRECCIONES |
| Periodo Cotizado Otros | FEBRERO/2024 | Periodo Cotización Salud | FEBRERO/2024 |
| Fecha Pago | 2024/06/26 | Número de Autorización | 4062669705 |

| APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL | | | |
|---|---|---|---|
| PENSIÓN | | Administradora | 230301 - PORVENIR |
| Días | 30 | Tarifa | 16,000 % |
| Indicador tarifa especial | Normal | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALUD | | Administradora | EPS005 - SANITAS S.A. |
| Días | 30 | Tarifa | 12,500 % |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RIESGOS PROFESIONALES | | Administradora | 14-11 - ARL SURA |
| Días | 30 | Tarifa | 0,522 % |
| Clase de Riesgo | 1 | | |

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900518247 | 1 | IMOES SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | IMOES SAS | CALLE 45C No. 2A - 24 | TUNJA-BOYACA | 7402585 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-03 | 2024-04 | 1000001353 | 9465244202 | E | 2024/04/10 | 2024/04/09 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $2,678,100 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| Sucursal: IMOES SAS (2 Afiliados) | | | | | $3,800,000 | $608,000 | | | $3,800,000 | $475,000 | | | $3,800,000 | $152,000 | | | $3,800,000 | $264,500 | | $3,800,000 | $190,000 |
| **Centro de Trabajo: IMOES ( 2 Afiliados)** | | | | | $3,800,000 | $608,000 | | | $3,800,000 | $475,000 | | | $3,800,000 | $152,000 | | | $3,800,000 | $264,500 | | $3,800,000 | $190,000 |
| Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA ( 2 Afiliados) | | | | | $3,800,000 | $608,000 | | | $3,800,000 | $475,000 | | | $3,800,000 | $152,000 | | | $3,800,000 | $264,500 | | $3,800,000 | $190,000 |
| 1 | CC | 1049614172 | BUITRAGO RODOLFO | 25-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $162,500 | CCF10 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $1,300,000 | $65,000 |
| 2 | CC | 1049609995 | MORENO MARIA | 231001 | 30 | $2,500,000 | $400,000 | EPS005 | 30 | $2,500,000 | $312,500 | CCF10 | 30 | $2,500,000 | $100,000 | 14-11 | 30 | $2,500,000 | $174,000 | 30 | $2,500,000 | $125,000 |

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| Sucursal: OFICINA TUNJA (2 Afiliados) | | | | | $2,600,000 | $416,000 | | | $2,600,000 | $325,000 | | | $2,600,000 | $104,000 | | | $2,600,000 | $13,600 | | $2,600,000 | $130,000 |
| **Centro de Trabajo: OF TUNJA ( 2 Afiliados)** | | | | | $2,600,000 | $416,000 | | | $2,600,000 | $325,000 | | | $2,600,000 | $104,000 | | | $2,600,000 | $13,600 | | $2,600,000 | $130,000 |
| Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA ( 2 Afiliados) | | | | | $2,600,000 | $416,000 | | | $2,600,000 | $325,000 | | | $2,600,000 | $104,000 | | | $2,600,000 | $13,600 | | $2,600,000 | $130,000 |
| 3 | CC | 1051211881 | CANO ANGIE | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | ESSC24 | 30 | $1,300,000 | $162,500 | CCF10 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $1,300,000 | $65,000 |
| 4 | CC | 1049643685 | VELANDIA PEDRO | 25-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS008 | 30 | $1,300,000 | $162,500 | CCF10 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $1,300,000 | $65,000 |
| **Total** | **Afiliados( 4)** | | | | $6,400,000 | $1,024,000 | | | $6,400,000 | $800,000 | | | $6,400,000 | $256,000 | | | $6,400,000 | $278,100 | | $6,400,000 | $320,000 |

aportes en línea

# Resum General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900518247 | 1 | IMOES SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | IMOES SAS | CALLE 45C No. 2A - 24 | TUNJA-BOYACA | 7402585 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-03 | 2024-04 | 1000001353 | 9465244202 | E | 2024/04/10 | 2024/04/09 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $2,678,100 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 4 | $1,024,000 | $0 | $0 | $1,024,000 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $400,000 | $0 | $0 | $400,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | $416,000 | $0 | $0 | $416,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $278,100 | $0 | $0 | $278,100 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 4 | $278,100 | $0 | $0 | $278,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $256,000 | $0 | $0 | $256,000 |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 4 | $256,000 | $0 | $0 | $256,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 4 | $800,000 | $0 | $0 | $800,000 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $162,500 | $0 | $0 | $162,500 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | $162,500 | $0 | $0 | $162,500 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $475,000 | $0 | $0 | $475,000 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $192,000 | $0 | $0 | $192,000 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 4 | $192,000 | $0 | $0 | $192,000 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $128,000 | $0 | $0 | $128,000 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 4 | $128,000 | $0 | $0 | $128,000 |
| TOTAL | | | | 4 | $2,678,100 | $0 | $0 | $2,678,100 |



2024/04/09 12:14 PM

# CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que JEIMY ALEXANDRA con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1049608109, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) JEIMY ALEXANDRA REYES VARGAS con documento CC 1049608109, como se detalla a continuación:

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | |
|---|---|---|---|
| Número de Planilla | 4557828846 | Tipo de Planilla | N-CORRECCIONES |
| Periodo Cotizado Otros | MARZO/2024 | Periodo Cotización Salud | MARZO/2024 |
| Fecha Pago | 2024/06/26 | Número de Autorización | 4062669713 |

| APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL | | | |
|---|---|---|---|
| PENSIÓN | | Administradora | 230301 - PORVENIR |
| Días | 30 | Tarifa | 16,000 % |
| Indicador tarifa especial | Normal | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALUD | | Administradora | EPS005 - SANITAS S.A |
| Días | 30 | Tarifa | 12,500 % |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RIESGOS PROFESIONALES | | Administradora | 14-11 - ARL SURA |
| Días | 30 | Tarifa | 0,522 % |
| Clase de Riesgo | 1 | | |

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla pagada

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2024-03
Período Salud : 2024-03

Se certifica que en la fecha 2024-04-10 la empresa YEISON GILBERTO SANCHEZ SANCHEZ con documento de identificación CC 1053334805 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante SANCHEZ SANCHEZ YEISON GILBERTO identificado con CC-1053334805, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

| Datos Aportante | |
|---|---|
| Identificación | Razón Social |
| CC-1053334805 | YEISON GILBERTO SANCHEZ SANCHEZ |

| Datos Planilla | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | Tipo Planilla | Fecha de Pago | Tarifa Riesgos Laborales |
| 29545305 | I | 2024-04-10 | 0,02436 |

Datos Administradoras

| Tipo | NIT | Código | Nombre | Días |
|---|---|---|---|---|
| AFP | 800224808 | 230301 | PORVENIR | 30 |
| EPS | 830003564 | EPS017 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO | 30 |
| ARL | 860011153 | 14-23 | ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | 30 |
| CCF | 891800213 | CCF10 | Caja de Compensacion Familiar de Boyaca COMFABOY | 30 |
