CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.461-1

IDRD-4080-G1-2024-117

Bogotá D. C., 15 de enero de 2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20252100013912 Código Web: Y8hX=W
FECHA:16-01-2025 14:38:04 FOLIOS: 7
RADICADOR: JAVIER ANDRES GACHA RODRIGUEZ
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 28 RAUL ORLANDO
ASUNTO: REMISIÓN PROGRAMACIÓN DE OBRA
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 6400

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato No. IDRD-SG-4041-2024, cuyo objeto es **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD."**

Asunto: **Remisión programación de obra.**

Cordial Saludo,


Por medio del presente nos permitimos remitir la programación de obra remitida vía correo electrónico el 14/01/2025 de acuerdo a observaciones realizadas por interventoría, la cual cumple con lo requerido y se valida para seguimiento del contrato.

Sin otro particular,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Lo referido en (06) folios + (01) CD
Con copia: N/A
Elaboró: MCMM
Revisó: N/A


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Costo
1		**CONSORCIO INNOVAPARQUES CONTRATO IDRD 4041 DE 2024 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CAMPOS SI**	**198,88 días**	**mar 19/11/2**	**sáb 19/07/25**		**$ 5.200.000.000,00**
2		INICIO	0 días	mar 19/11/2	mar 19/11/2		$ 0,00
244		MATENIMIETO POR ASIGNAR	103 días	lun 17/03/25	vie 18/07/25	2	$ 597.210.715,00
3		**INICIO MANTENIMIENTO**	**198,88 días**	**mar 19/11/2**	**sáb 19/07/25**		**$ 4.602.789.285,00**
62		**INNOVAPARQUES MANTENIMIENTOS PIJAOS-PALERMO 2024**	**51 días**	**lun 2/12/24**	**lun 3/02/25**		**$ 1.688.909.639,00**
63		**CONSORCIO INNOVAPARQUES CONTRATO IDRD 4041 DE 2024 RECAMBIO GRAMA SINTETICA**	**51 días**	**lun 2/12/24**	**lun 3/02/25**		**$ 1.688.909.639,00**
64		**INICIO MANTENIMIENTO**	**51 días**	**lun 2/12/24**	**lun 3/02/25**		**$ 1.688.909.639,00**
65		**CAMPOS SINTETICOS RECAMBIO GRAMA**	**51 días**	**lun 2/12/24**	**lun 3/02/25**		**$ 1.688.909.639,00**
66		**CAMPO PALERMO SUR COD: 18-035**	**25 días**	**lun 2/12/24**	**jue 2/01/25**		**$ 210.038.715,00**
67		02 Cerramiento lona h=1.00 mt(Exc) **	1 día	lun 2/12/24	mar 3/12/24		$ 2.448.727,00
68		04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	5 días	mar 3/12/24	lun 9/12/24	67	$ 1.677.000,00
69		06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	8 días	mar 3/12/24	jue 12/12/24	67	$ 24.737.510,00
71		06 Grava Triturada 1-3/4 (Suministro e Instalac.)	1 día	jue 12/12/24	vie 13/12/24	69	$ 1.351.637,00
70		01 GRAMA SINTETICA Fijación a Cerco de Madera	2 días	jue 12/12/24	sáb 14/12/24	69	$ 2.681.190,00
72		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	1 día	vie 13/12/24	sáb 14/12/24	71	$ 529.421,00
73		04 VIBROCOMP. BENITIN 1.5TON(Oper+Comb)**	3 días	vie 13/12/24	mar 17/12/2	71	$ 744.928,00
74		09 Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**	1 día	mar 17/12/2	mié 18/12/2	73	$ 12.736.310,00
76		02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1 día	mié 18/12/24	jue 19/12/24	74	$ 644.691,00
77		08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	1 día	mié 18/12/24	jue 19/12/24	74	$ 677.610,00
78		03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	jue 19/12/24	vie 20/12/24	74;77;	$ 1.944.801,00
75		02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	11 días	mié 18/12/24	jue 2/01/25	74;70	$ 159.864.890,00
79		**CAMPO PIJAOS COD: 18-090**	**40 días**	**sáb 14/12/24**	**lun 3/02/25**		**$ 1.478.870.924,00**
80		02 Cerramiento lona h=1.00 mt(Exc) **	2 días	sáb 14/12/24	mar 17/12/2	72	$ 6.494.832,00
81		04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	6 días	mar 17/12/2	mar 24/12/2	80	$ 5.031.000,00
82		06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	14 días	mar 17/12/2	vie 3/01/25	80	$ 180.956.580,00
84		06 Grava Triturada 1-3/4 (Suministro e Instalac.)	2 días	sáb 4/01/25	mar 7/01/25	82	$ 2.896.365,00
85		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	1 día	mar 7/01/25	mié 8/01/25	84	$ 529.421,00
83		01 GRAMA SINTETICA Fijación a Cerco de Madera	4 días	sáb 4/01/25	jue 9/01/25	82	$ 7.111.400,00
86		04 VIBROCOMP. BENITIN 1.5TON(Oper+Comb)**	6 días	mar 7/01/25	mar 14/01/2	84	$ 4.469.568,00
87		09 Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**	1 día	mar 14/01/2	mié 15/01/2	86	$ 93.166.980,00
89		02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1 día	mié 15/01/2	jue 16/01/25	87	$ 1.934.073,00
90		08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	2 días	mié 15/01/2	vie 17/01/25	87	$ 903.480,00
91		03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	2 días	vie 17/01/25	lun 20/01/25	87;89;	$ 3.889.602,00
92		04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	2 días	vie 17/01/25	lun 20/01/25	87;89;	$ 2.065.003,00
88		02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	15 días	mié 15/01/2	lun 3/02/25	87	$ 1.169.422.620,00
93		TERMINACION	0 días	lun 3/02/25	lun 3/02/25	92;88	$ 0,00
4		**CAMPOS SINTETICOS USAQUEN**	**94,38 días**	**mar 19/11/2**	**vie 14/03/25**		**$ 243.191.052,00**
5		**CAMPO TOBERIN COD: 01-079**	**5 días**	**mar 26/11/2**	**lun 2/12/24**		**$ 64.379.622,00**
11		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	1 día	mar 19/11/2	mié 20/11/2	2	$ 1.058.842,00
7		06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	1 día	jue 21/11/24	vie 22/11/24	11	$ 1.355.480,00
8		02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	1 día	vie 22/11/24	sáb 23/11/24	7	$ 8.759.720,00

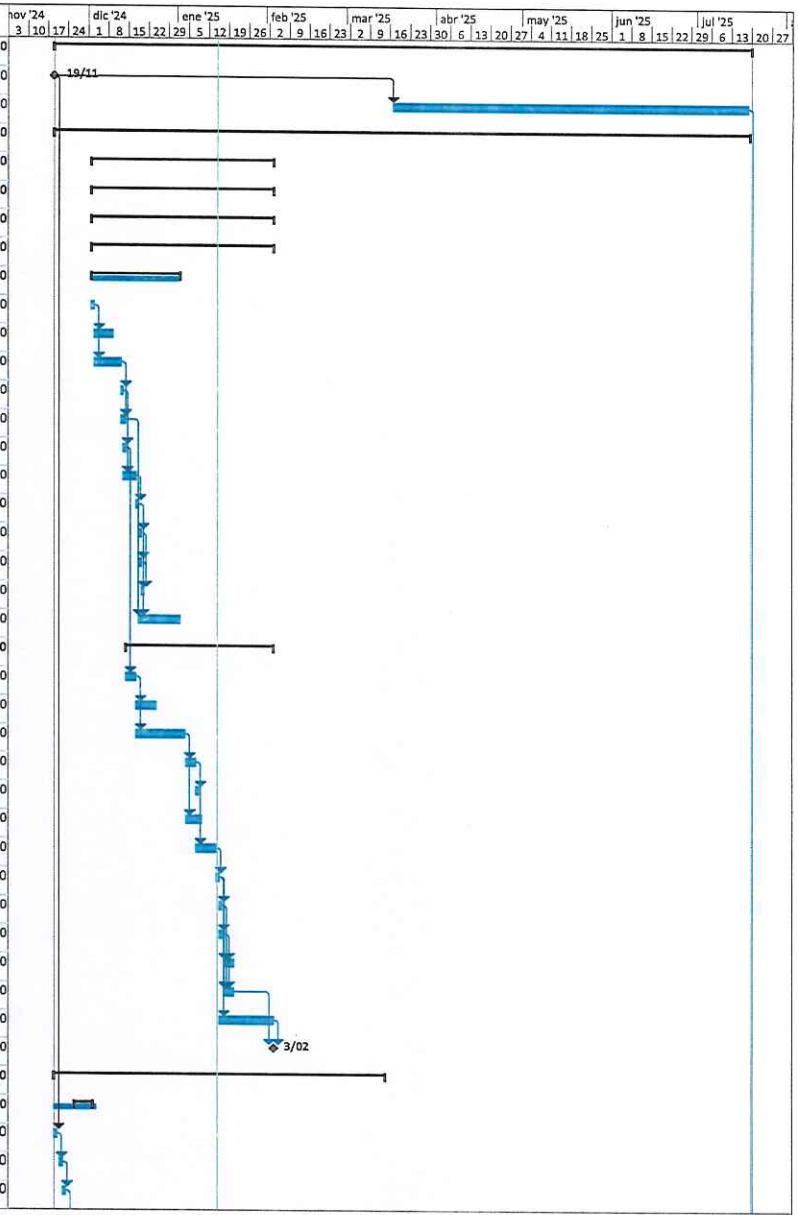

Proyecto: INNOVAPARQUES MAN
Fecha: mié 15/01/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Costo
12		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1 día	sáb 23/11/24	lun 25/11/24	8	$ 7.236.600,00
13		05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	1 día	lun 25/11/24	mar 26/11/2	12	$ 18.540.000,00
14		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1 día	mar 26/11/2	mié 27/11/2	13	$ 4.989.600,00
9		02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1 día	mié 27/11/2	jue 28/11/24	14	$ 644.691,00
10		08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	1 día	jue 28/11/24	vie 29/11/24	9	$ 677.610,00
15		01 Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)**	1 día	vie 29/11/24	sáb 30/11/24	10	$ 8.990.076,00
16		04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	sáb 30/11/24	lun 2/12/24	15	$ 2.065.003,00
6		04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	1 día	lun 2/12/24	mar 3/12/24	16	$ 10.062.000,00
17		**CAMPO ALAMEDA CALLE 170 COD: 01-540**	**9 días**	**mar 3/12/24**	**vie 13/12/24**		**$ 39.352.902,00**
23		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	1 día	mar 3/12/24	mié 4/12/24	6	$ 529.421,00
19		06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	1 día	mié 4/12/24	jue 5/12/24	23	$ 17.519.440,00
20		02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	1 día	jue 5/12/24	vie 6/12/24	19	$ 2.710.960,00
24		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1 día	vie 6/12/24	lun 9/12/24	20	$ 1.704.047,00
25		05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	1 día	lun 9/12/24	mar 10/12/2	24	$ 7.416.000,00
26		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1 día	mar 10/12/2	mié 11/12/2	25	$ 1.174.932,00
27		03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	mar 10/12/2	mié 11/12/2	25	$ 1.944.801,00
21		02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1 día	mié 11/12/2	mié 11/12/2	26;27	$ 644.691,00
22		08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	1 día	jue 12/12/24	jue 12/12/24	21	$ 677.610,00
18		04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	1 día	jue 12/12/24	vie 13/12/24	22	$ 5.031.000,00
28		**CAMPO VERBENAL COD: 01-313**	**9 días**	**vie 13/12/24**	**jue 26/12/24**		**$ 42.823.533,00**
34		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	1 día	vie 13/12/24	lun 16/12/24	18	$ 529.421,00
30		06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	1 día	lun 16/12/24	mar 17/12/2	34	$ 2.134.881,00
31		02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	1 día	mar 17/12/2	mié 18/12/2	30	$ 13.796.559,00
35		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1 día	mié 18/12/2	jue 19/12/24	31	$ 1.206.100,00
36		05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	1 día	jue 19/12/24	vie 20/12/24	35	$ 7.416.000,00
37		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1 día	vie 20/12/24	sáb 21/12/24	36	$ 831.600,00
32		02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1 día	sáb 21/12/24	lun 23/12/24	37	$ 644.691,00
33		08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	1 día	lun 23/12/24	mar 24/12/2	32	$ 903.480,00
29		04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	1 día	mar 24/12/2	jue 26/12/24	33	$ 13.416.000,00
38		03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	mar 24/12/2	jue 26/12/24	33	$ 1.944.801,00
39		**CAMPO CEDRITOS COD: 01-031**	**11 días**	**jue 26/12/24**	**jue 9/01/25**		**$ 43.601.392,00**
45		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	1 día	jue 26/12/24	vie 27/12/24	38	$ 529.421,00
41		06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	1 día	vie 27/12/24	sáb 28/12/24	45	$ 1.355.480,00
42		02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	1 día	lun 30/12/24	lun 30/12/24	41	$ 8.759.720,00
46		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1 día	lun 30/12/24	mar 31/12/2	42	$ 3.881.919,00
47		05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	1 día	mar 31/12/2	mié 1/01/25	46	$ 11.124.000,00
48		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1 día	mié 1/01/25	jue 2/01/25	47	$ 2.676.564,00
43		02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1 día	jue 2/01/25	vie 3/01/25	48	$ 1.934.073,00
44		08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	1 día	vie 3/01/25	lun 6/01/25	43	$ 677.610,00
49		03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	lun 6/01/25	mar 7/01/25	44	$ 3.889.602,00
50		04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	mar 7/01/25	mié 8/01/25	49	$ 2.065.003,00

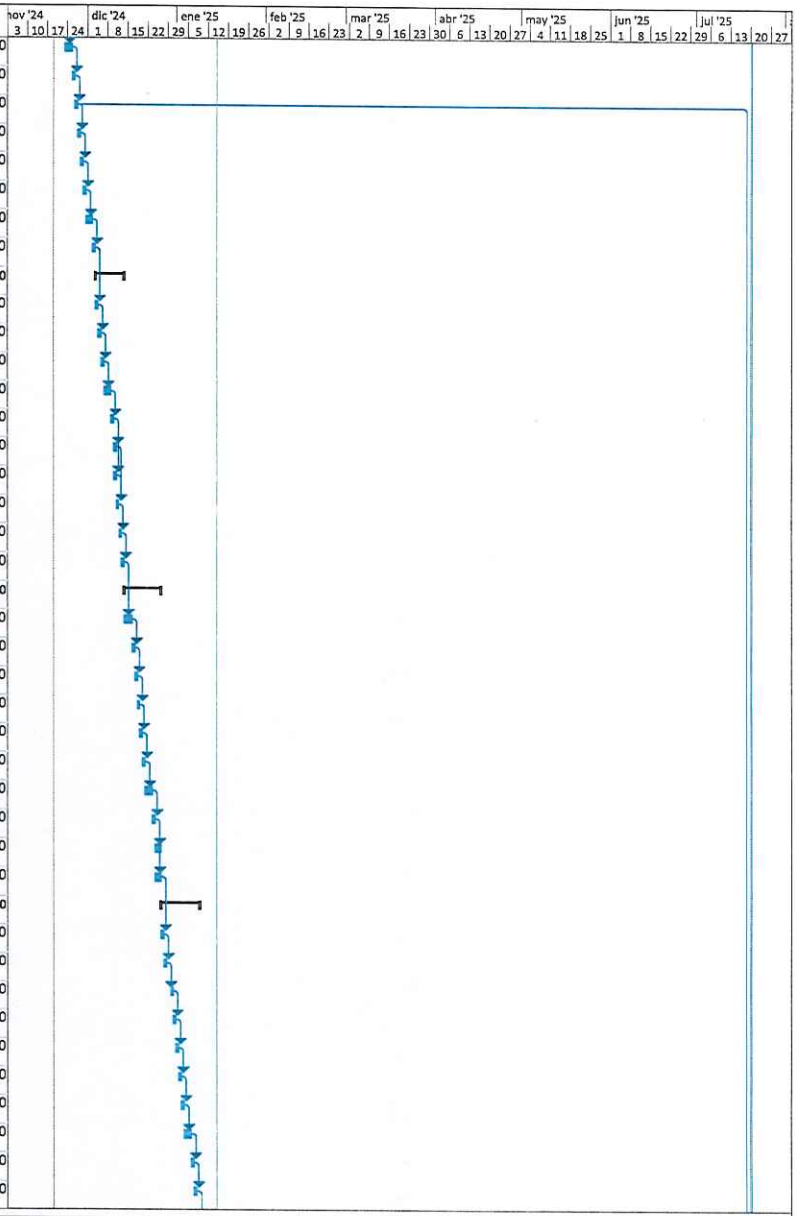


Proyecto: INNOVAPARQUES MAN
Fecha: mié 15/01/25

Tarea · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Informe de resumen manual · Fecha límite · Progreso manual
División · Tareas externas · Resumen inactivo · Resumen manual · Tareas críticas
Hito · Hito externo · Tarea manual · Sólo el comienzo · División crítica
Resumen · Tarea inactiva · Sólo duración · Sólo fin · Progreso

2


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Costo
40		04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	1 día	mié 8/01/25	jue 9/01/25	50	$ 6.708.000,00
51		**CAMPO SERVITA F11 COD: 01-023**	**16 días**	**lun 24/02/25**	**vie 14/03/25**		**$ 53.033.603,00**
57		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	1 día	lun 24/02/25	mar 25/02/2	40	$ 529.421,00
53		06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	1 día	mar 25/02/2	mié 26/02/2	57	$ 677.740,00
54		02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	2 días	mié 26/02/2	jue 27/02/25	53	$ 4.379.860,00
58		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1 día	vie 28/02/25	vie 28/02/25	54	$ 14.245.764,00
59		05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	1 día	vie 28/02/25	lun 3/03/25	58	$ 18.540.000,00
60		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1 día	lun 3/03/25	mar 4/03/25	59	$ 9.822.384,00
55		02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	2 días	mar 4/03/25	jue 6/03/25	60	$ 644.691,00
56		08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	1 día	jue 6/03/25	vie 7/03/25	55	$ 451.740,00
61		03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	2 días	vie 7/03/25	lun 10/03/25	56	$ 2.065.003,00
52		04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	4 días	lun 10/03/25	vie 14/03/25	61	$ 1.677.000,00
94		**TERCER PRIORIZACIÓN DE CANCHAS**	**49 días**	**lun 20/01/25**	**jue 20/03/25**		**$ 387.989.596,00**
95		**CANCHAS PRIORIZADAS ENERO**	**49 días**	**lun 20/01/25**	**jue 20/03/25**		**$ 387.989.596,00**
110		**PARQUE MIRAVALLE F8-2 COD: 05-042**	**10 días**	**lun 20/01/25**	**vie 31/01/25**		**$ 28.059.095,00**
111		INICIO	0 días	lun 20/01/25	lun 20/01/25		$ 0,00
123		06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	1 día	lun 20/01/25	mar 21/01/2	111	$ 1.084.384,00
122		02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	1 día	mar 21/01/2	mié 22/01/2	123	$ 7.007.776,00
113		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	1 día	mié 22/01/25	jue 23/01/25	122	$ 529.421,00
114		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1 día	jue 23/01/25	jue 23/01/25	113	$ 1.473.096,00
121		05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	1 día	vie 24/01/25	vie 24/01/25	114	$ 5.562.000,00
112		05 Cepillado de Campo Sintético**	1 día	vie 24/01/25	lun 27/01/25	121	$ 1.478.838,00
115		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1 día	lun 27/01/25	mar 28/01/2	112	$ 1.015.692,00
116		02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1 día	mar 28/01/2	mié 29/01/2	115	$ 1.934.073,00
119		08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	1 día	mié 29/01/25	jue 30/01/25	116	$ 677.610,00
117		03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	jue 30/01/25	vie 31/01/25	119	$ 3.889.602,00
118		04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	jue 30/01/25	vie 31/01/25	119	$ 2.065.003,00
120		04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	1 día	jue 30/01/25	vie 31/01/25	119	$ 1.341.600,00
124		FIN	0 días	vie 31/01/25	vie 31/01/25	122;11	$ 0,00
96		**PARQUE MIRAVALLE F8-1 COD: 05-042**	**10,81 días**	**lun 20/01/25**	**vie 31/01/25**		**$ 22.476.019,00**
97		INICIO	0 días	lun 20/01/25	lun 20/01/25		$ 0,00
108		06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	1 día	mar 21/01/2	mar 21/01/2	97	$ 677.740,00
99		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	1 día	mar 21/01/2	mié 22/01/2	108	$ 529.421,00
107		02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	1 día	mié 22/01/25	jue 23/01/25	99	$ 4.379.860,00
100		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1 día	jue 23/01/25	vie 24/01/25	107	$ 1.473.096,00
106		05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	1 día	vie 24/01/25	lun 27/01/25	100	$ 7.416.000,00
98		05 Cepillado de Campo Sintético**	1 día	lun 27/01/25	mar 28/01/2	106	$ 1.478.838,00
101		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1 día	mar 28/01/2	mié 29/01/2	98	$ 1.015.692,00
102		02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1 día	mié 29/01/25	jue 30/01/25	101	$ 644.691,00
104		08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	1 día	jue 30/01/25	vie 31/01/25	102	$ 903.480,00
103		03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	vie 31/01/25	vie 31/01/25	104	$ 1.944.801,00

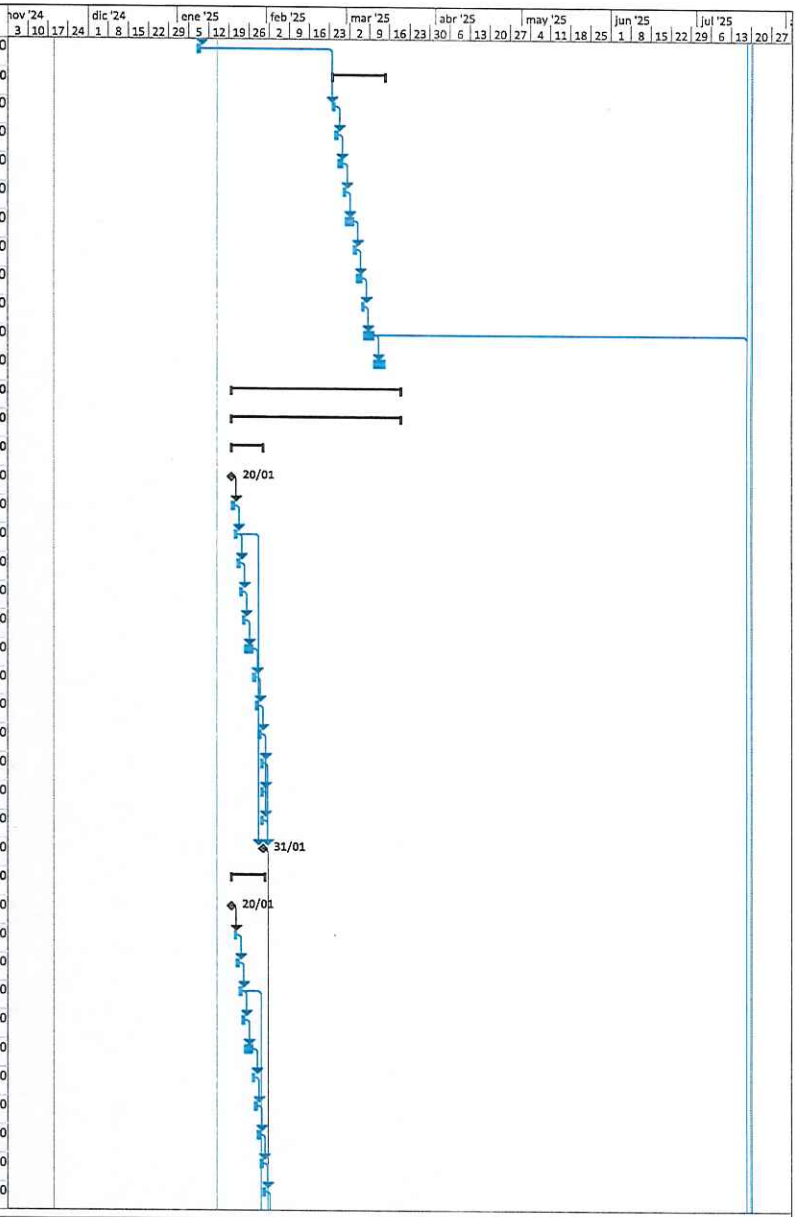

Proyecto: INNOVAPARQUES MAN
Fecha: mié 15/01/25

Tarea · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Informe de resumen manual · Fecha límite · Progreso manual
División · Tareas externas · Resumen inactivo · Resumen manual · Tareas críticas
Hito · Hito externo · Tarea manual · Sólo el comienzo · División crítica
Resumen · Tarea inactiva · Sólo duración · Sólo fin · Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeci	Costo
105		04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	1 día	vie 31/01/25	vie 31/01/25	104	$ 2.012.400,00
109		FIN	0 días	vie 31/01/25	vie 31/01/25	107;10	$ 0,00
125		**PARQUE MIRAVALLE F5 COD: 05-042**	**8 días**	**vie 31/01/25**	**mar 11/02/2**		**$ 11.845.691,00**
126		INICIO	0 días	vie 31/01/25	vie 31/01/25	124;10	$ 0,00
128		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	1 día	sáb 1/02/25	lun 3/02/25	126	$ 529.421,00
129		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1 día	lun 3/02/25	mar 4/02/25	128	$ 1.033.800,00
135		05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	1 día	mar 4/02/25	mié 5/02/25	129	$ 3.708.000,00
127		05 Cepillado de Campo Sintético**	1 día	mié 5/02/25	jue 6/02/25	135	$ 1.478.838,00
130		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1 día	jue 6/02/25	vie 7/02/25	127	$ 712.800,00
131		02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1 día	vie 7/02/25	sáb 8/02/25	130	$ 644.691,00
133		08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	1 día	sáb 8/02/25	lun 10/02/25	131	$ 451.740,00
132		03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	lun 10/02/25	mar 11/02/2	133	$ 1.944.801,00
134		04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	1 día	lun 10/02/25	mar 11/02/2	133	$ 1.341.600,00
136		FIN	0 días	mar 11/02/2	mar 11/02/2	132;13	$ 0,00
137		**PARQUE MARRUECOS COD: 18-041**	**11,19 días**	**vie 31/01/25**	**vie 14/02/25**		**$ 27.526.831,00**
138		INICIO	0 días	vie 31/01/25	vie 31/01/25	126	$ 0,00
149		06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	1 día	lun 3/02/25	lun 3/02/25	138	$ 1.355.480,00
140		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	1 día	lun 3/02/25	mar 4/02/25	149	$ 529.421,00
148		02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRInc arena+caucho+ins	1 día	mar 4/02/25	mié 5/02/25	140	$ 8.759.720,00
141		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1 día	mié 5/02/25	jue 6/02/25	148	$ 2.267.192,00
147		05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	1 día	jue 6/02/25	vie 7/02/25	141	$ 7.416.000,00
139		05 Cepillado de Campo Sintético**	1 día	lun 10/02/25	lun 10/02/25	147	$ 1.478.838,00
142		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1 día	lun 10/02/25	mar 11/02/2	139	$ 1.563.218,00
143		02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1 día	mar 11/02/2	mié 12/02/2	142	$ 644.691,00
145		08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	1 día	mié 12/02/2	jue 13/02/25	143	$ 225.870,00
144		03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	jue 13/02/25	vie 14/02/25	145	$ 1.944.801,00
146		04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	1 día	jue 13/02/25	vie 14/02/25	145	$ 1.341.600,00
150		FIN	0 días	vie 14/02/25	vie 14/02/25	148;14	$ 0,00
229		**PARQUE ESTADIO TABORA NATURAL**	**7 días**	**vie 14/02/25**	**lun 24/02/25**		**$ 52.086.862,00**
230		INICIO	0 días	vie 14/02/25	vie 14/02/25	150;13	$ 0,00
238		01 Descapote resiembra tapete cesped (SinTierr-arena)	1 día	vie 14/02/25	lun 17/02/25	230	$ 4.641,00
231		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	1 día	lun 17/02/25	mar 18/02/2	238	$ 529.421,00
234		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1 día	lun 17/02/25	mar 18/02/2	238	$ 8.523.900,00
232		06 Verticutter + ayudante **	1 día	mar 18/02/2	mié 19/02/2	234	$ 9.743.650,00
233		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1 día	mié 19/02/2	jue 20/02/25	232	$ 12.362.525,00
236		05 FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMUS (aplicacion)	1 día	jue 20/02/25	jue 20/02/25	233	$ 13.123.500,00
237		08 Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	1 día	vie 21/02/25	vie 21/02/25	236	$ 6.027.000,00
235		04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	1 día	vie 21/02/25	lun 24/02/25	237	$ 1.772.225,00
239		FIN	0 días	lun 24/02/25	lun 24/02/25	235	$ 0,00
163		**PARQUE CAFAM SUBA II (LOS GAVILANES) COD: 11-1101**	**8 días**	**vie 14/02/25**	**mar 25/02/2**		**$ 42.862.553,00**
164		INICIO	0 días	vie 14/02/25	vie 14/02/25	230	$ 0,00

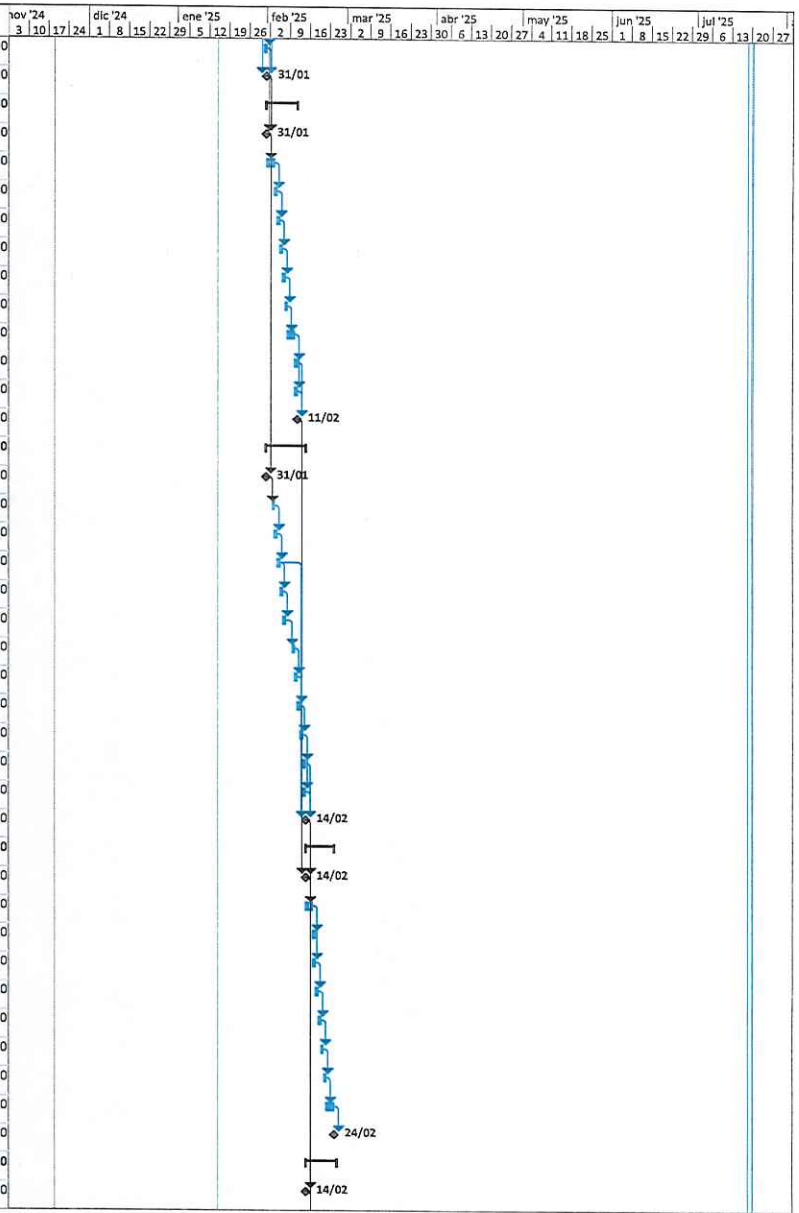

Proyecto: INNOVAPARQUES MAN
Fecha: mié 15/01/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeci	Costo
166		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	1 día	vie 14/02/25	lun 17/02/25	164	$ 529.421,00
167		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1 día	lun 17/02/25	mar 18/02/2!	166	$ 8.615.000,00
173		05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	1 día	mar 18/02/2!	mié 19/02/25	167	$ 22.248.000,00
165		05 Cepillado de Campo Sintético**	1 día	mié 19/02/25	jue 20/02/25	173	$ 1.478.838,00
168		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1 día	jue 20/02/25	jue 20/02/25	165	$ 5.940.000,00
169		01 Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)**	1 día	vie 21/02/25	vie 21/02/25	168	$ 0,00
170		02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1 día	vie 21/02/25	lun 24/02/25	169	$ 644.691,00
171		04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	lun 24/02/25	mar 25/02/2!	170	$ 2.065.003,00
172		04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	1 día	lun 24/02/25	mar 25/02/2!	170	$ 1.341.600,00
174		FIN	0 días	mar 25/02/2!	mar 25/02/2!	171;17	$ 0,00
151		**PARQUE VILLA DE LOS SAUCES COD: 08-180**	**8,94 días**	**vie 14/02/25**	**mié 26/02/2!**		**$ 27.286.445,00**
152		INICIO	0 días	vie 14/02/25	vie 14/02/25	150	$ 0,00
154		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	1 día	vie 14/02/25	lun 17/02/25	152	$ 529.421,00
155		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1 día	lun 17/02/25	mar 18/02/2!	154	$ 2.584.500,00
161		05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	1 día	mar 18/02/2!	mié 19/02/25	155	$ 11.124.000,00
153		05 Cepillado de Campo Sintético**	1 día	jue 20/02/25	jue 20/02/25	161	$ 1.478.838,00
156		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1 día	jue 20/02/25	vie 21/02/25	153	$ 1.782.000,00
157		02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1 día	vie 21/02/25	lun 24/02/25	156	$ 1.934.073,00
159		08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	1 día	lun 24/02/25	mar 25/02/2!	157	$ 677.610,00
158		03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	mar 25/02/2!	mié 26/02/25	159	$ 5.834.403,00
160		04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	1 día	mar 25/02/2!	mié 26/02/25	159	$ 1.341.600,00
162		FIN	0 días	mié 26/02/25	mié 26/02/25	159;15	$ 0,00
189		**PARQUE BURGOS BRITALIA - 2 COD: 11-058**	**8 días**	**mar 25/02/2**	**jue 6/03/25**		**$ 16.637.771,00**
190		INICIO	0 días	mar 25/02/2!	mar 25/02/2!	176	$ 0,00
192		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	1 día	mar 25/02/2!	mié 26/02/25	190	$ 529.421,00
193		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1 día	mié 26/02/25	jue 27/02/25	192	$ 1.809.150,00
199		05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	1 día	jue 27/02/25	vie 28/02/25	193	$ 7.416.000,00
191		05 Cepillado de Campo Sintético**	1 día	vie 28/02/25	sáb 1/03/25	199	$ 1.478.838,00
194		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1 día	sáb 1/03/25	lun 3/03/25	191	$ 1.247.400,00
195		02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1 día	lun 3/03/25	mar 4/03/25	194	$ 644.691,00
197		08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	1 día	mar 4/03/25	mié 5/03/25	195	$ 225.870,00
196		03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	mié 5/03/25	jue 6/03/25	197	$ 1.944.801,00
198		04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	1 día	mié 5/03/25	jue 6/03/25	197	$ 1.341.600,00
200		FIN	0 días	jue 6/03/25	jue 6/03/25	196;19	$ 0,00
175		**PARQUE BURGOS BRITALIA - 1 COD: 11-058**	**10 días**	**mar 25/02/2**	**sáb 8/03/25**		**$ 52.711.771,00**
176		INICIO	0 días	mar 25/02/2!	mar 25/02/2!	174	$ 0,00
187		06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	1 día	mar 25/02/2!	mié 26/02/25	176	$ 4.744.180,00
178		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	1 día	mié 26/02/25	jue 27/02/25	187	$ 529.421,00
186		02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	1 día	jue 27/02/25	vie 28/02/25	178	$ 30.659.020,00
179		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1 día	vie 28/02/25	sáb 1/03/25	186	$ 1.809.150,00
185		05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	1 día	sáb 1/03/25	lun 3/03/25	179	$ 7.416.000,00

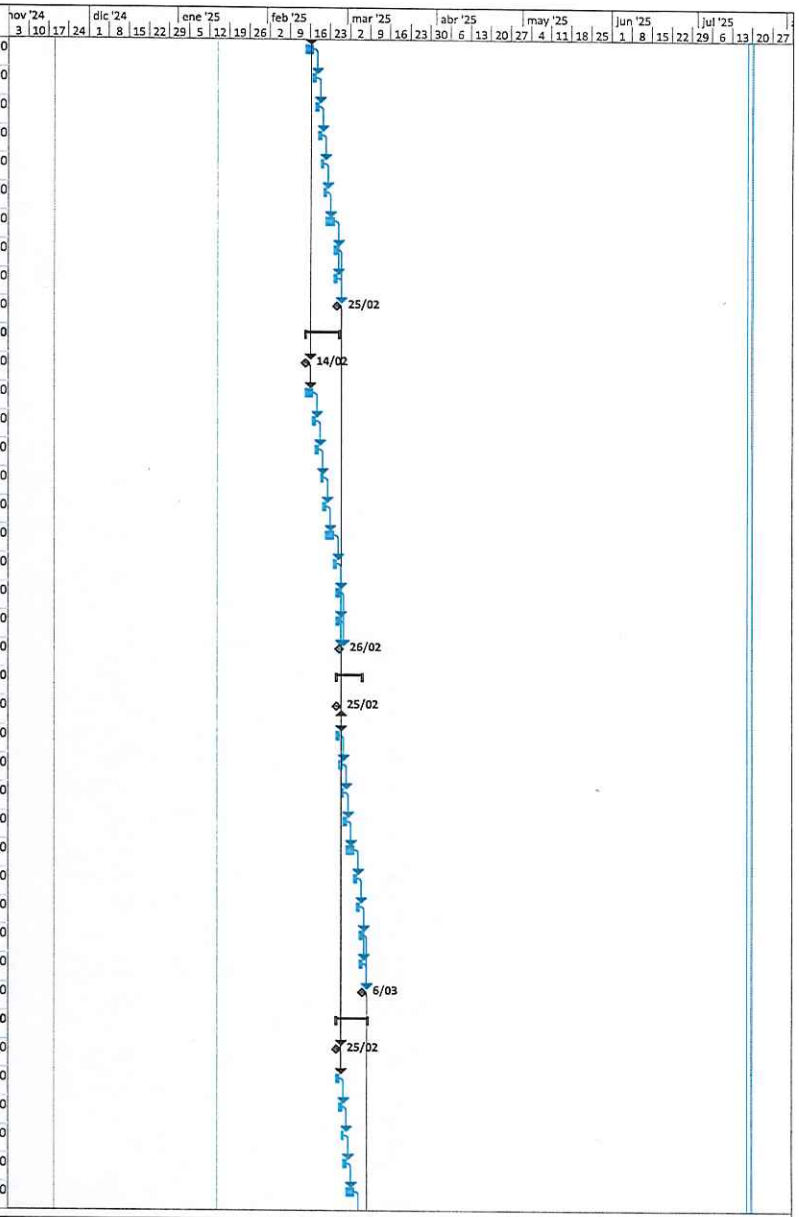

Proyecto: INNOVAPARQUES MAN
Fecha: mié 15/01/25

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Sólo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · Sólo el comienzo · Sólo fin · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Costo
177		05 Cepillado de Campo Sintético**	1 día	lun 3/03/25	mar 4/03/25	185	$ 1.478.838,00
180		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1 día	mar 4/03/25	mié 5/03/25	177	$ 1.247.400,00
181		02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1 día	mié 5/03/25	jue 6/03/25	180	$ 644.691,00
183		08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	1 día	jue 6/03/25	vie 7/03/25	181	$ 225.870,00
182		03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	vie 7/03/25	sáb 8/03/25	183	$ 1.944.801,00
184		04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	1 día	vie 7/03/25	sáb 8/03/25	183	$ 2.012.400,00
188		FIN	0 días	sáb 8/03/25	sáb 8/03/25	182;18	$ 0,00
201		**PARQUE TIBABUYES 1 COD: 11-084**	**10 días**	**jue 6/03/25**	**mié 19/03/2**		**$ 43.450.397,00**
202		INICIO	0 días	jue 6/03/25	jue 6/03/25	200	$ 0,00
212		06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	1 día	jue 6/03/25	vie 7/03/25	202	$ 2.033.220,00
204		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	1 día	vie 7/03/25	sáb 8/03/25	212	$ 529.421,00
211		02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	1 día	lun 10/03/25	lun 10/03/25	204	$ 13.139.580,00
205		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1 día	lun 10/03/25	mar 11/03/2	211	$ 2.791.260,00
210		05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	1 día	mar 11/03/2	mié 12/03/2	205	$ 11.124.000,00
203		05 Cepillado de Campo Sintético**	1 día	mié 12/03/2	jue 13/03/25	210	$ 1.478.838,00
206		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1 día	jue 13/03/25	vie 14/03/25	203	$ 1.924.560,00
207		01 Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)**	1 día	vie 14/03/25	lun 17/03/25	206	$ 4.495.038,00
208		08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	1 día	lun 17/03/25	mar 18/03/2	207	$ 903.480,00
209		04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	1 día	mar 18/03/2	mié 19/03/2	208	$ 5.031.000,00
213		FIN	0 días	mié 19/03/2	mié 19/03/2	209;21	$ 0,00
214		**PARQUE TIBABUYES 2 COD: 11-084**	**11 días**	**jue 6/03/25**	**jue 20/03/25**		**$ 63.046.161,00**
215		INICIO	0 días	jue 6/03/25	jue 6/03/25	202	$ 0,00
227		06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	1 día	jue 6/03/25	vie 7/03/25	215	$ 3.388.700,00
217		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	1 día	vie 7/03/25	sáb 8/03/25	227	$ 529.421,00
226		02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	1 día	lun 10/03/25	lun 10/03/25	217	$ 21.899.300,00
218		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1 día	lun 10/03/25	mar 11/03/2	226	$ 4.135.200,00
225		05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	1 día	mar 11/03/2	mié 12/03/2	218	$ 14.832.000,00
216		05 Cepillado de Campo Sintético**	1 día	mié 12/03/2	jue 13/03/25	225	$ 1.478.838,00
219		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1 día	jue 13/03/25	vie 14/03/25	216	$ 2.851.200,00
220		01 Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)**	1 día	vie 14/03/25	lun 17/03/25	219	$ 4.495.038,00
221		02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1 día	lun 17/03/25	mar 18/03/2	220	$ 1.289.382,00
223		08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	1 día	mar 18/03/2	mié 19/03/2	221	$ 903.480,00
222		03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	mié 19/03/2	jue 20/03/25	223	$ 3.889.602,00
224		04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	1 día	mié 19/03/2	jue 20/03/25	223	$ 3.354.000,00
228		FIN	0 días	jue 20/03/25	jue 20/03/25	222;22	$ 0,00
240		**MANTENIMIENTO RUTINARIO**	**196,75 día**	**jue 21/11/24**	**sáb 19/07/2**		**$ 2.282.698.998,00**
242		MANTENIMIENTO GRAMA SINTETICA	196 días	jue 21/11/24	vie 18/07/25		$ 1.501.720.184,00
241		MANTENIMIETO GRAMA NATURAL	196 días	jue 21/11/24	sáb 19/07/25		$ 780.978.814,00
243		FIN	0 días	sáb 19/07/25	sáb 19/07/25	244;14	$ 0,00

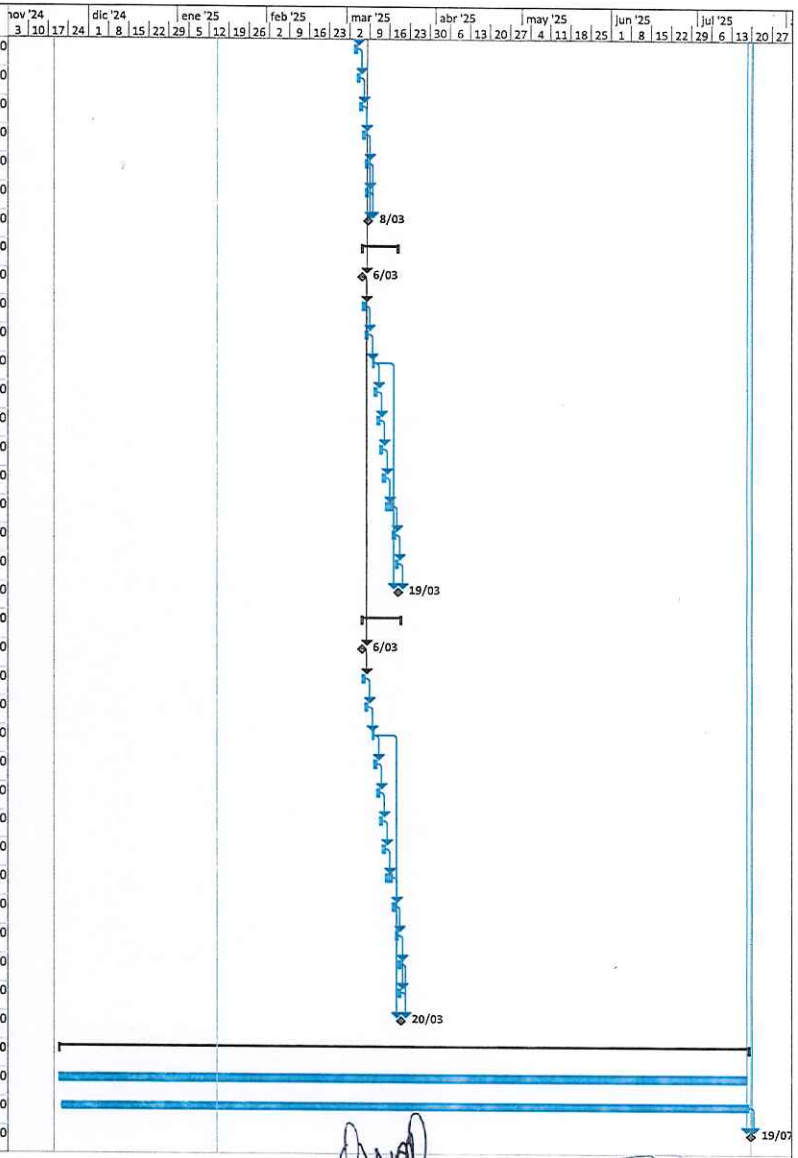

CONSORCIO INNOVAPARQUES
REPRESENTANTE
OSCAR VELASQUEZ

CONSORCIO SANTA TERESA 28
REPRESENTANTE LEGAL
RAUL DELGADO

Proyecto: INNOVAPARQUES MAN
Fecha: mié 15/01/25

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Sólo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · Sólo el comienzo · Sólo fin · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

9
