	PROCESO APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCN
	FORMATO INFORME DE AVANCE MENSUAL CON

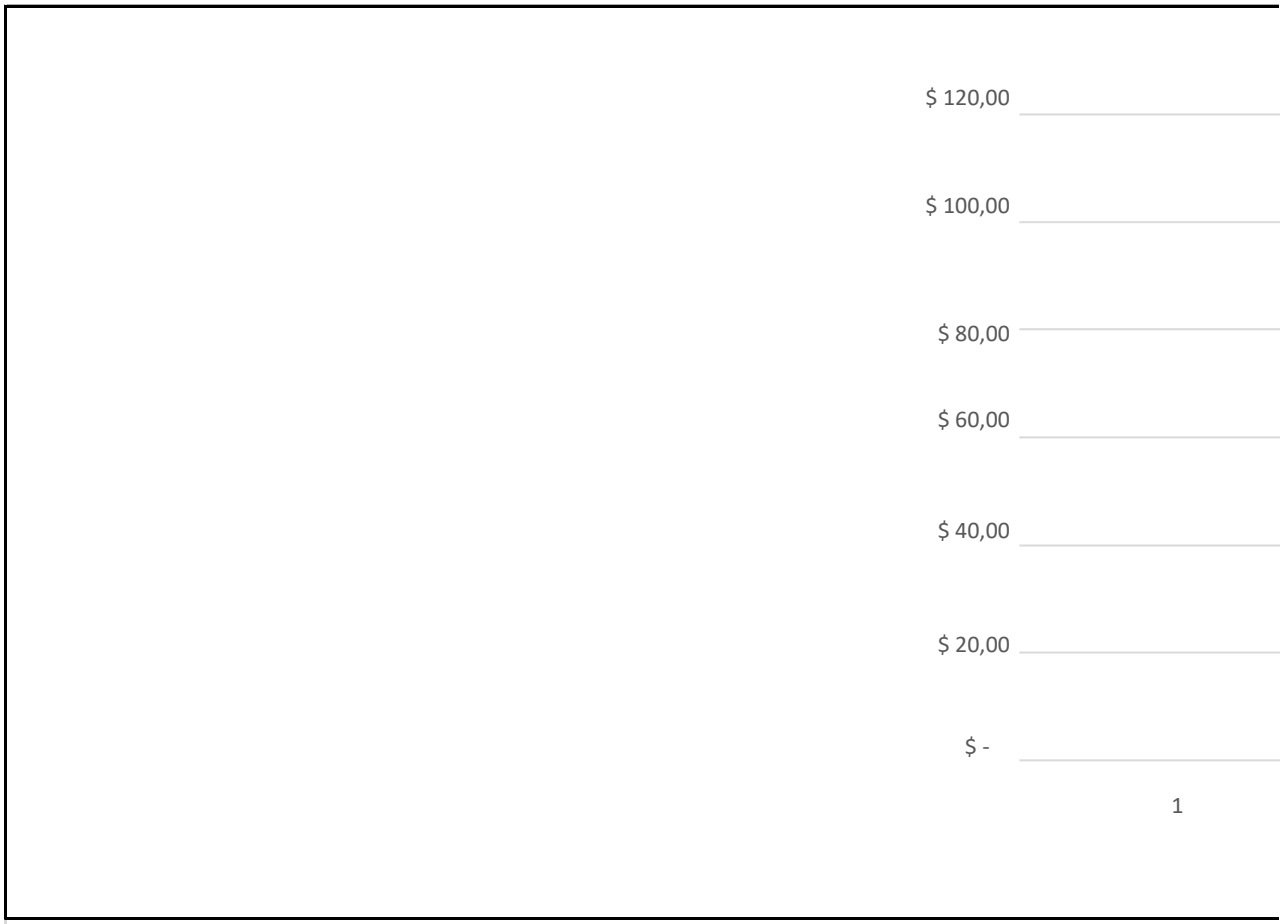
Objeto del Convenio:	Aunar esf
Valor del Convenio:	$ 1.741.380.664
Valor Adición:	
Valor Total:	$ 1.741.38
Plazo de Ejecución:	4
Fecha de Inicio:	16 de marz
Vencimiento:	16 de julic
Póliza de garantía única: Aseguradora solidaria	Desde

Informe Nº	16	Período comprendi
Proyecto		
Localización	Corregimiento de Balsamo, Municipio de Cor	
		CONTRATO DE INTE

Objeto:	CONTRATAR INTERVENTORÍA TÉCNIC EN EL MARCO DEL CONTRATO INTER DEPORTE Y LA EIA, PARA LA CON CONCORDIA, MAG
Contrato Nº:	
Contratista:	C
Plazo Inicial:	
Fecha de Inicio:	
*Fecha de Suspensión No. 1:	
*Fecha de Suspensión No. 2:	
*Fecha de Suspensión No. 3:	
*Fecha de Suspensión No. 4:	
*Fecha de Reinicio No.1:	
*Fecha de Suspensión No. 5:	
*Fecha de Reinicio No.2:	
Fecha de Terminación:	
Prórrogas:	
Plazo Actualizado:	
Valor Inicial:	
Valor Adiciones:	
Valor Actualizado:	
Valor pagado:	
Valor por pagar:	
Nombre Supervisor:	

CONTRATO DE INTERVE
CONCEPTO
CONTRATAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, PRESUPUESTAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI 735 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LA EIA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO PARA BÁLSAMO CORREGIMIENTO DE CONCORDIA, MAGDALENA, EN DESARROLLO DEL CONVENIO 1264 DE 2020
N/A
N/A
N/A
Nombre de la Aseguradora
CONTRATO DE INTERVE
CONCEPTO
N/A
AVANCE FISIC

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR
% Programado	83,05%
% Ejecutado	0,00%
Diferencia	-83,05%


$ 120,00
$ 100,00
$ 80,00
$ 60,00
$ 40,00
$ 20,00
$ -
1

	DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEX
1,	Balance Presupuestal de la obra
2,	Registro Fotográfico
3,	Mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos
4,	Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica
5,	Copia último informe de interventoría
6,	Copia actas de comité de obra
7,	Copia libro de obra/bitácora

Elaborado por:

GUSTAVO ALVAREZ LINDADO
SECRETARIO DE PLANEACION

Proyecto

Contrato Nº:

Período:

Director de obra:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN SEGÚN CONTRATO
º	**ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS**
II	**CANCHA DE MULTIPLE CUBIERTA**
1	**PRELIMINARES**
1,1	Localización y replanteo general
1,2	Descapote manual capa vegetal esp= 0.10 m, apile hasta 250 mts
2	**EXCAVACIONES**
2,1	Excavación Maquina l en material común, incluye cargue y retiro de sobrantes hasta 2 km
3	**RELLENOS**
3,1	Subbase granular en material seleccionado compactado
3,2	Relleno en recebo común, compactación mecánica
3,3	Relleno en arena negra
4	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**
4,1	Concreto 3000 psi para zapatas y vigas de amarre
4,2	Concreto para tarima
4,3	Concreto para columnas y pedestal soporte de cubiertas 3000 psi
4,4	Estructura de Concreto graderias 3000 psi
4,5	Concreto Losa maciza y rampas e=0.10 m, concreto 3000 psi, acabado con helicoptero
4,6	Acero de refuerzo 60000 psi, 1/2"-5/8" y 37000 psi, 3/8"
5	**CUBIERTA**
5,1	Suministro e instalacion de Estructura Metalica de cubierta para soporte de lamina según planos (inc pernos ,soldadura ,platinas ,pintura anticorosiva.
5,2	pasamanos y barandas de proteccion en tuberia galvanizada de 2"
5,3	cubierta en lamina trapezoidal master 1000 o similar color azul incluye accesorios
6	**MAMPOSTERIA**
6,1	Muro en block vibrado de cemento 15x20x40 cm.
6,2	Dinteles en concreto y vigas de amarre 10 x 15 cms
6,3	Baldosa cerámica para piso y enchape de pared
6,4	Alfajia en concreto de 20x15 cms. Acabado a la vista, incluye acero de refuerzo
7	**DESAGUES**
7,1	Punto desague pvc, 2" y 4"
7,2	Colector de aguas negras de 4"
7,3	Colector de aguas negras de 2"
7,4	Caja de inspección de 0,60 x0,60 x 0.60 m (dimensiones interiores), en ladrillo tolete recocido , pañet interiormente, base y tapa en concreto reforzado de 2500 psi

7,5	Caja de inspección de 0.80 x0.80 x 080 m (dimensiones interiores), en ladrillo tolete recocido , pañet interiormente, base y tapa en concreto reforzado de 2500 psi
8	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**
8,1	Punto agua potable en pvc 1/2"
8,2	Tuberia 3/4" pvc
8,3	Registro 1/2 y 3/4" red white
8,4	Tanque plástico elevado 1000 litros (incluye accesorios)
9	**INSTALACIONES SANITARIAS**
9,1	Sanitario Acuacer, incluye manguera flexible plástica
9,2	Lavamanos Acuacer de sobreponer incluye grifería
9,3	Orinal mediano incluye grifería
9,4	Rejilla con sosco 2" y 3"
9,5	Punto de Ducha sencilla
10	**CARPINTERIA METALICA**
10,1	Puertas en lámina galvanizada cal 18 incluye marco,hoja, cerradura, pintura anticorrosiva y esmalte, según diseño
10,2	Ventana en aluminio con vidrio crudo 6 mil , incluye reja, pintura anticorrosiva y esmalte
10,3	Sumnistro e Instalacion de regilla metalica en platina de 1" ,20 x 1,00
10,4	Porteria y tableros cancha múltiple - en tubo metalico de 3" y 2"incluye pintura anticorrosivo y esmalte
10,5	División y puertas de baños en lámina galvanizada calibre 18, entablerada, incluye pintura anticorrosiva y esmalte
III	**PARQUE INFANTIL Y TERCERA EDAD**
1	**PRELIMINARES**
1,1	Localización y replanteo general
2	**EXCAVACIONES**
2,1	Descapote manual e= 0.15 m, apile hasta 250 mts
3,2,1	Excavación manual en material común, incluye cargue y retiro de sobrantes a 2Km
3	**RELLENOS**
3,3,1	Extendida y compactación de materiales sobrantes dispuestos en el predio
3,3,2	Subbase granular en material seleccionado compactado
3,3,3	Relleno en recebo común, compactación mecánica
3,3,4	Relleno en arena negra
4	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**
3,4,1	Concreto ciclópeo, concreto 2500 psi (40%), piedra (60%)
4,2	Viga de cimentación 3000 psi 30X30, Incluye acero de refuerzo
3,4,2	Acero de refuerzo 60000 psi, 1/2"-5/8" y 40000 psi, 3/8"
5	**MAMPOSTERIA**

5,1	Sobrecimiento en ladrillo doble pañetado H= .30 prom.
5,2	Muro en Block abusardado de 15x20x40 rayado a la vista
3,5,1	Pañete liso muro, mortero 1:4, e= 1.5 cm
5,4	Alfajia en concreto de 20x5 cms. Acabado a la vista, incluye acero de refuerzo
6	**DESAGUES**
6,1	Punto desague pvc, 2" y 4"
6,2	Tubería para drenaje 4" pvc
3,6,1	Tubería 4" pvc ALL
6,4	Tubería 2" pvc ALL
3,6,2	Tubería 8" pvc A LL
3,6,3	Caja de inspección de 0,60 x0,60 x 0.60 m (dimensiones interiores), en ladrillo tolete recocido , pañet interiormente, base y tapa en concreto reforzado de 2500 psi
3,6,4	Caja de inspección de 0.80 x0.80 x 080 m (dimensiones interiores), en ladrillo tolete recocido , pañet interiormente, base y tapa en concreto reforzado de 2500 psi
7	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**
3,7,1	Punto agua potable en pvc 1/2"
3,7,2	Tuberia 1 1/2" pvc
3,7,3	Tuberia 1 pvc
3,7,4	Registro 1 1/2" red white
3,7,5	Registro 1 " red white
8	**PISOS**
3,8,1	Adoquin en gris e= 6 cm inncluye arena esp ,10 cm
3,8,2	Rampas en concreto estriado 2500 psi e= 0.10 m
9,3	Adoquin en gris e= 6 cm incluye base en arena
3,8,3	Bordillo en concreto 3000 psi (según diseño)
9	**VARIOS**
3,9,1	Bancas ornamentales en hierro forjado y madera inmunizada
3,9,2	Caneca para basuras, según diseño
10,3	Plan de manejo ambiental
10,4	Señalectica
IV	**CANCHA MICROFUTBOL, ABIERTA**
1	**PRELIMINARES**
1,1	Localización y replanteo general
2	**EXCAVACIONES**
4,2,1	Excavación manual en material común, incluye cargue y retiro de sobrantes hasta 2 km
3	**RELLENOS**

4,3,1	Subbase granular en material seleccionado compactado
4,3,2	Relleno en recebo común, compactación mecánica
4,3,3	Relleno en tierra negra
4	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**
4,1	Concreto ciclópeo, concreto 2500 psi (40%), piedra (60%)
4,2,2	Concreto para viga de cimentación 3000 psi
	
4,4	Acero de refuerzo 60000 psi, 1/2"-5/8" y 37000 psi, 3/8"
8	**PISOS**
7,1	Anden fundido en el sitio E=.08 m concreto 3000 psi
4,8,1	Rampas en concreto estriado 2500 psi e= 0.10 m
4,8,2	Adoquin en gris e= 6 cm inncluye arena esp ,10 cm
4,8,3	Losa maciza e=0.10 m, concreto 3000 psi, acabado con helicoptero
4,8,4	Pintura para demarcar Cancha múltiple
9	**CARPINTERIA METALICA**
4,9,1	Cerramiento en malla eslabonada calibre 18, forrada H= 2.2 mts, incluye tuberia metalica de 2" para soporte a/c 3 mts.
V	**MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL**
1	**PRELIMINARES**
1,1	Localización y replanteo
2	**EXCAVACIONES**
5,2,1	Excavación manual en material común, incluye cargue y retiro de sobrantes hasta 2 km
5,2,2	Excavacion Cimiento (,30 X ,30) Mts
3	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**
5,3,1	Solado En Concreto 2000 Psi, Esp: ,05 Mts
5,3,2	Viga De Cimiento En Concreto 3000 Psi, Ref, 4ø1/2" 60000 Psi, Estribo Ø3/8" 40000 Psi, A/C .15 Mt Sec:(,25x,30) Mts
5,3,3	Zapata y columneta En Concreto 3000 Psi, Reforzado 4ø1/2", Ambos Sentidos A/C ,18 M, Dim: (,80x,80x,30) M,
5,3,4	Columna En Concreto 3000 Psi, Ref, 4ø1/2" 60000 Psi, Estribos Ø3/8" 40000 Psi, A/C ,20 Mts, Secc (,25 X ,25) Mts
5,3,5	Viga De Amarre En Concreto De 3000 Psi,Ref,4ø1/2" Estribos Ø3/8" A/C, ,25 Mts Secc:(,15 X ,25) Mts, Acabado a la vista
4	**MAMPOSTERIA**
5,4,1	Muro en Block abusardado de 15x20x40 rayado a la vista

5,4,2	Alfajia en concreto de 20x5 cms. Acabado a la vista, incluye acero de refuerzo
5	**CARPINTERIA METALICA**
5,5,1	Porton Doble Hoja En Tubo Galvanizado Ø2" Y Ø1", Incluye : Pintura Anticorrosivo, Esmalte E Instalac (Segun Detalle) Dim: (2,00 X2,00) Mts
5,5,2	Canal cuneta de aguas lluvias
VI	**INSTALACIONES ELECTRICAS**
1	**SUBESTACION**
6,1,1	Transformador en aceite bifasico de 25 Kva , 13200/208-120 v
6,1,2	Poste de concreto de 12m * 500 dan
6,1,3	Descargadores de sobretensión 15 kV - 10 kA
6,1,4	Cortacircuitos 15 kV - 100 A
6,1,5	Estructura Primaria para protecciones
6,1,6	Bajante en Media Tensión
6,1,7	Acometida a Tablero general 1No2/0(F)+1No2/0(N)+1No2(T)
6,1,8	Excavacion y relleno
2	**Alimentadores**
6,2,1	Alimentador 2No.6(F)++1No.6(N)+1No8 (TD-1)
6,2,2	Alimentador 2No.8+1No8+1No10T (TD-2 Y TD-3)
6,2,3	Alimentador 2No.10+1No12
6,2,4	Alimentador 2No.12+1No14
6,2,5	Cable encauchetado 3*10 para salida de iluminacion de cada reflector
6,2,6	Cable encauchetado 3*14 para salida de iluminacion de cada luminaria peatonal
3	**Tableros**
6,3,1	Tablero general con espacio para totalizador, barraje de 200 Amp, 1 breaker industrial de 3*150, 3 b de 30 amp, 1 breaker de 40 amp. 1 contactor de 30 amp en ac3 y 1 contactor de 40 amp
6,3,2	Tablero bifasico de 24 ctos TD-1
6,3,3	Tablero bifasico de 12 ctos TD-3
6,3,4	Tablero bifasico de 8 ctos TD-2
6,3,5	Breaker enchufable de 2*20 Amp
6,3,6	Breaker enchufable de 1*20 Amp
4	**Iluminacion Exterior e Interior**
6,4,1	Poste de concreto con tuberia interna de 9 mts x 510kgs/f (300DAN)
6,4,2	Poste metalico de 6 mts para luminaria venecia
6,4,3	Luminaria Ap - Alurban s - 20 w ip66-277va 5000 con base fotocelda 7 pines

6,4,4	proyector industrial antares M- 60 w IP - 65 -100 -5000K
6,4,5	proyector industrial antares M- 40 w IP - 65 -100 -5000K
6,4,6	Lampara hermetica de 2*32 W
6,4,7	Lampara tipo bala de 1x32 w
5	**Salidas electricas**
6,5,1	Salida de iluminacion a 110 V , en promedio 10 mts (2 alambres No 12 + 1No14)
6,5,2	Salida de tomas a 110V , en promedio 10 mts en (2 cables No 12 + 1 No14)
6,5,3	Salida de tomas a 220V , en promedio 10 mts en (2 cables No 12 + 1 No14)
6,5,4	Salida de 110V, con toma GFCI
6	**Tramites y certificación**
6,6,1	Trámites ante operador de red
6,6,2	Certificación retie para transformacion y uso final,
7	**Paisajismo**
6,7,1	Arboles de roble ,alistonia ,almendro ,guayacan
6,7,2	setos ,swingla , Durantas
6,7,3	Grama tifany

	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS

Nº	

}

Nº	



A

INFORM

A N E X O N º 2: R

CONVENIO Nº COID-1264-2020 SUSC

REGISTRO FOTOGRÁFICO - PROYECTO "

Proyecto	Construcción de Polideportivo en el corregimiento de Balsamo, M	
Contratista:	ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE ARCA	
Interventor:	CWE CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	
Fecha del registro fotográfico:	31/09/2022	
FOTOGRAFÍA Nº 1		
		
el contrato se encuentra actualmente suspendido		el contrato se e
FOTOGRAFÍA Nº 4		
		

el contrato se encuentra actualmente suspendido	el contrato se e

IICA Y CIENTÍFICA

VENIOS DE INFRAESTRUCTURA

INFORME DE AVANCE DE 01 A 31 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO Nº COID-1264-2020 DE 29 / 12 / 2020 SUSCRITO ENT

uerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Deporte y el M
Muncipio d

	Aporte de Mindeporte:		
$ 0,00			
30.664,00			
4 meses	Suspensión 1	N/A	Reinicio:
o de 2021	Suspensión 2	N/A	Reinicio:
o de 2021			
Vigencia póliza (Fechas)			
5/02/2021	Hasta	31/01/2023	

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

do entre el 1 de septien

"CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL CORREG

ıcordia, Departamento de Magdalena

RVENTORÍA	

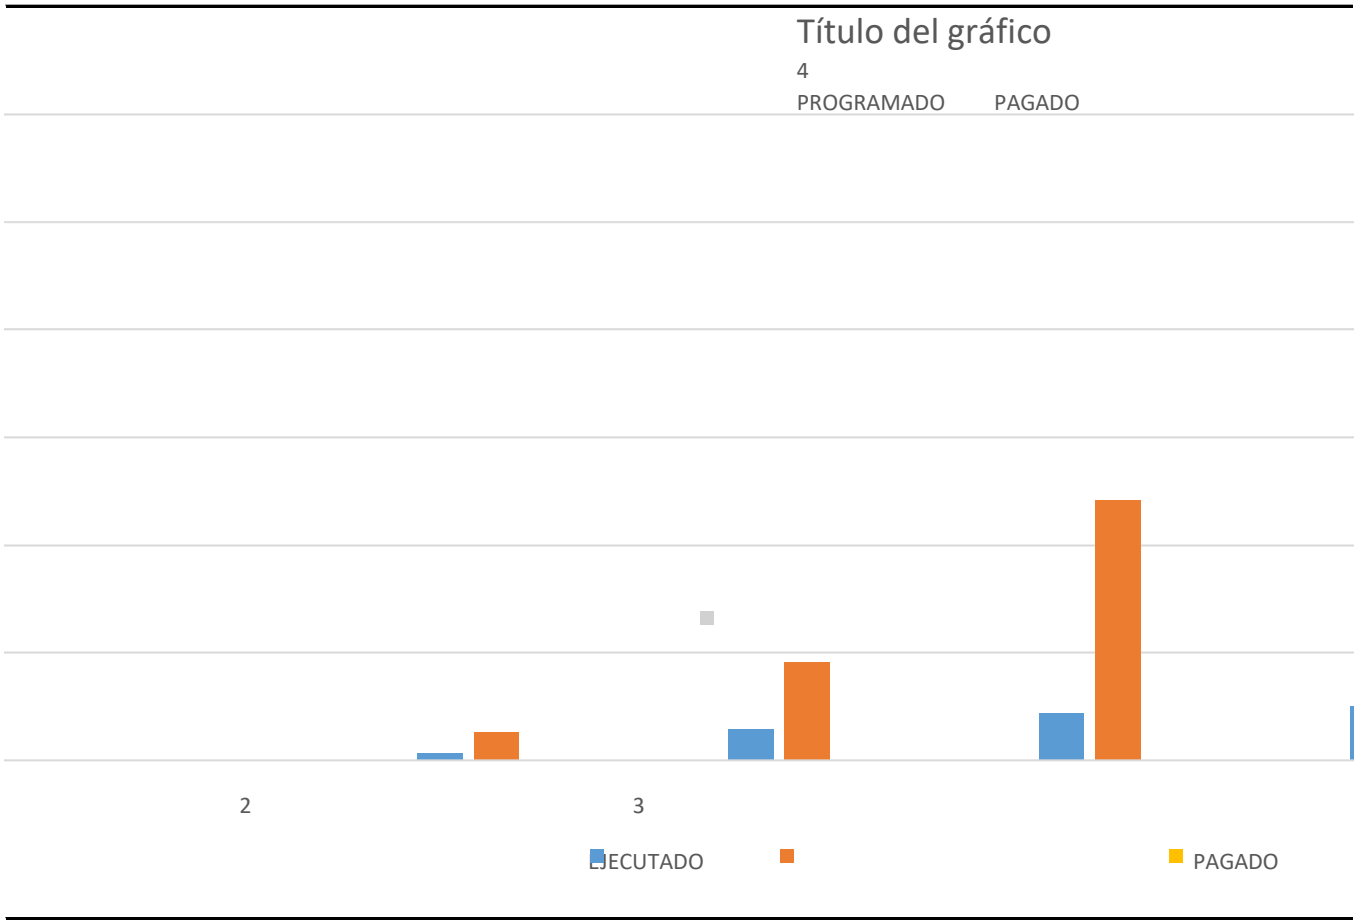
A, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, PRESUPUESTAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA RADMINISTRATIVO COI 735 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DEL STRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO PARA BÁLSAMO CORREGIMIENTO DE DALENA, EN DESARROLLO DEL CONVENIO 1264 DE 2020	Objeto:
CPS 277 DE 2021	Contrato Nº:
CWE CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	Contratista:
7,5 Meses	Plazo Inicial:
16 de julio de 2021	Fecha de Inic
Del 13/08/2021 hasta el 01/09/2021	*Fecha de Su
Del 02/09/2021 hasta el 20/09/2021	*Fecha de Re
Del 21/09/2021 hasta el 18/11/2021	*Fecha de Su
Del 19/11/2021 hasta el 18/12/2021	*Fecha de Re
19 de diciembre de 2021	*Fecha de Su
Del 19/11/2021 hasta el 18/12/2021	*Fecha de Su
11 de enero de 2022	*Fecha de Re
31 de enero de 2022	Fecha de Ter
N/A	Prórrogas:
7,5 meses	Plazo Actualiz
$ 147.887.250,00	Valor Inicial:
-	Valor Adicion
$ 147.887.250,00	Valor Actualiz
0	Valor pagado
$ 147.887.250,00	Valor por pag
EDGAR MUÑOZ DAVID	Nombre Inter
	ESTADO DE LA

NTORÍA Nº 277			
VIGENTE (Fechas)		VALOR	
DESDE	HASTA		
16/07/2021	5/03/2021	$ 147.887.250,00	"CONSTF M
N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	
Póliza N°			
			RESUMEN

NTORÍA Nº 277		
FECHA DE PAGO	VALOR	
N/A	N/A	
		SEGUIMIENT

O (%)		
AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	
0,00%	83,05%	
1,66%	1,66%	
1,66%	-81,39%	
		DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES

3. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO -


Título del gráfico
4
PROGRAMADO
PAGADO
2
3
EJECUTADO
PAGADO

4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES
A LA FECHA LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTO

5. RELACIÓN DE ANEXOS			
XO	S/N/N.A.	Nº Folios	
	SI	0	8,
	SI	0	9,
	N/A	0	10,
	N/A	0	11,
	SI	0	12,
	N/A	0	13,
	SI	0	14,

	Revisado por: 
	KELLY JOHANA SOCARRAS GARCIA SECRETARIO DE PLANEACION

	PROCESO
	FORMATO

A N E X O N º 1: BALANCE PRESUPUESTAL

CONVENIO Nº COID-1264-2020 SUSCRITO ENTRE MINDEPORTE Y MUNICIPIC

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA	
	Construcción de Polideportivo en el corregir Muncipio de Concordia
	LP-002-2021
	6 meses a partir de la suscripcion del a
	LORENS VILLANUEVA

1. CONTRATO DE OBRA Nº LP-002-2021 - CONTROL AL PRESUPUESTO

	UNIDAD	CONTRATO		
		cantidad contrato	valor unitario	valor to
	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
	M2	5626	$ 2.313,33	$
	M2	5626	$ 2.783,33	$
	M3	500	$ 28.200,00	$
	0	0	$ -	$
	M3	175,05	$ 84.083,33	$
	M3	176,39	$ 78.750,00	$
	M3	20,02	$ 66.533,33	$
	M3	66,52	$ 708.634,89	$
	M3	23,73	$ 702.626,89	$
	M3	28,81	$ 787.740,19	$
	M3	37,57	$ 707.661,86	$
	M2	1250	$ 129.223,79	$
	KG	15480	$ 4.332,23	$
luye	KG	21156,2	$ 12.278,68	$
	ML	52	$ 190.451,50	$
	M2	1258	$ 86.060,00	$
	M2	483,24	$ 55.682,98	$
	ML	13	$ 48.693,40	$
	M2	153,6	$ 49.975,00	$
	ML	138	$ 44.111,69	$
	UN	26	$ 133.424,17	$
	ML	30	$ 86.658,50	$
	ML	8	$ 56.978,04	$
to	UN	3	$ 171.851,37	$

o	UN	2	$	288.383,53	$
	UN	18	$	65.782,25	$
	ML	40	$	22.182,50	$
	UN	7	$	95.553,00	$
	UN	1	$	774.661,50	$
	UN	7	$	431.333,33	$
	UN	7	$	233.333,33	$
	UN	2	$	326.333,33	$
	UN	6	$	20.050,00	$
	UN	6	$	54.600,00	$
	UN	3	$	558.671,67	$
	M2	5,4	$	389.331,43	$
	UN	5	$	132.807,56	$
	UN	2	$	2.469.292,22	$
	UN	13	$	421.410,00	$
				SUBTOTAL	**$**
	M2	-	$	2.313,33	-
	M2	-	$	2.783,33	-
	M3	354,14	$	23.200,00	$
	0	0	$	-	$
	M3	10	$	9.180,00	$
	M3	46,93	$	84.083,33	$
	M3	209	$	78.750,00	$
	M3	30	$	66.533,33	$
	M3	0	$	409.042,25	$
	ML	90	$	92.185,73	$
	KG	1000	$	4.332,23	$

	ML	0	$	61.139,46	$
	M2	0	$	68.744,20	$
	M2	95	$	24.136,81	$
	ML	0	$	44.111,69	$
	UN	0	$	133.424,17	$
	ML	0	$	86.658,50	$
	ML	96	$	86.658,50	$
	ML	0	$	56.978,04	$
	ML	90	$	93.150,59	$
to	UN	4	$	172.355,37	$
o	UN	1	$	289.265,53	$
	UN	3	$	65.782,25	$
	ML	110	$	16.378,93	$
	ML	80	$	11.354,72	$
	UN	4	$	84.121,33	$
	UN	2	$	70.591,25	$
	M2	600	$	76.824,17	$
	M2	20	$	63.896,46	$
	M2	0	$	84.624,17	$
	ML	600	$	76.942,28	$
	UN	5	$	691.502,50	$
	UN	4	$	317.900,00	$
	GL	0	$	11.999.999,81	$
	GL	0	$	5.000.000,20	$
				SUBTOTAL	**$**
	M2	0	$	2.313,33	$
	M3	20	$	23.200,00	$

	M3	20	$ 84.083,33	$
	M3	20	$ 78.750,00	$
	M3	20	$ 66.533,33	$
	M3	0	$ 409.042,25	$
	M3	0	$ 702.626,89	$
				PROCESO
				FORMATO
	KG	0	$ 4.332,23	$
	M2	0	$ 65.473,10	$
	M2	10	$ 63.896,46	$
	M2	0	$ 84.624,17	$
	M2	0	$ 117.223,79	$
	31,8	300	$ 24.885,00	$
	M2	180	$ 179.321,19	$
			SUBTOTAL	**$**
	M2	0	$ 2.313,33	$
	M3	5	$ 23.200,00	$
	ML	90	$ 11.866,67	$
	M2	90,62	$ 34.486,22	$
	ML	91	$ 92.746,00	$
	UN	4	$ 195.540,35	$
	ML	12	$ 97.620,91	$
	ML	0	$ 46.759,71	$
	M2	90	$ 68.744,20	$

	ML	90	$ 44.111,69	$
	0	0	$ -	$
cion				
	UN	2	$ 2.960.383,33	$
	ML	80	$ 243.200,30	$
			SUB. TOTAL	**$**
	UN	1	$ 9.159.756,00	$
	UN	1	$ 3.454.467,00	$
	UN	2	$ 872.138,00	$
	UN	1	$ 5.570.070,00	$
	UN	1	$ 1.538.028,00	$
	U	1	$ 1.049.262,00	$
	ML	40	$ 175.791,00	$
	ML	250	$ 19.506,26	$
	ML	70	$ 33.803,00	$
	ML	20	$ 26.906,00	$
	ML	350	$ 17.553,00	$
	ML	350	$ 22.825,00	$
	ML	150	$ 21.318,00	$
	ML	200	$ 18.910,00	$
reakers				
	UN	1	$ 9.556.985,18	$
	UN	1	$ 1.199.160,00	$
	UN	1	$ 612.156,67	$
	UN	1	$ 431.645,04	$
	UN	12	$ 48.357,52	$
	UN	4	$ 49.357,52	$
	UN	4	$ 3.389.830,08	$
	UN	29	$ 1.580.230,08	$
	UN	43	$ 560.000,00	$

	UN	12	$ 847.271,42	$
	UN	12	$ 571.000,00	$
	UN	4	$ 275.868,42	$
	UN	6	$ 665.628,42	$
	UN	71	$ 288.112,16	$
	UN	6	$ 337.464,01	$
	UN	4	$ 313.953,68	$
	UN	4	$ 313.953,68	$
	GL	0	$ 3.000.000,00	$
	GL	0	$ 4.100.000,00	$
	UN	10	$ 289.999,74	$
	UN	100	$ 12.000,25	$
	M2	233,7954258	$ 33.400,00	$
	SUBTOTAL			
	TOTAL COSTOS DIRECTOS			**$**
	AIU 30%			**$**
	COSTO TOTAL DE OBRA			**$**

IVA 16%

2. RELACIÓN DE PAGOS - CONTRATO DE OBRA Nº _____

V/R INICIAL CONTRATO:

V/R ADICIONES:

V/R ACTUAL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN PAGO / ACTA NÚMERO	
N/A	
N/A	
TOTAL	

3. RELACIÓN DE PAGOS - CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº _____

V/R INICIAL CONTRATO:

V/R ADICIONES:

V/R ACTUAL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN PAGO / ACTA NÚMERO	
N/A	
N/A	
N/A	
TOTAL	

POYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA

ME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA

EGISTRO FOTOGRÁFICO



RITO el 30/12/2020 ENTRE MINDEPORTE Y MUNICIPIO DE CONCORDIA - MAGDALENA

Construcción de Polideportivo en el corregimiento de Balsamo, Muncipio de Concordia

Muncipio de Concordia.	Localización	Corregimiento de Balsamo, en el municipio d
	Director de obra:	LORENS VILLANUEVA
	Director Interventoría:	Cindy jhoana Espejo

FOTOGRAFÍA Nº 2	**FOT**
	
encuentra actualmente suspendido	el contrato se encuentra actualmente
FOTOGRAFÍA Nº 5	**FOT**
	

ncuentra actualmente suspendido	el contrato se encuentra actualmente



'RE MINDEPORTE Y EL MUNICIPIO DE CONCORDIA - MAGDALENA

Municipio Concordia, para la ejecución del proyecto denominado “Construcción
e Concordia

$ 1.741.380.664,00	Aporte del Municipio:
N/A	Prórroga Nº 1
N/A	Prórroga Nº 2
	Plazo Actualizado
Valor	Modificación fecha
$ 522.414.199,20	Hasta

nbre de 2022 y el

IMIENTO DE BALSAMO, MUNCIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE

CONTRATO DE O

	“CONSTRUCCIÓN DE POLIDEP DEPARTAMENTO DEL MAGDA
	REGI
io:	
spensión No. 1:	
inicio:	
spensión:	
inicio:	
spensión:	
spensión:	
inicio:	
minación:	
zado:	
	$
es:	
zado:	
:	
gar:	$
rventor:	C

AS GARANTÍAS

CONTRATO DE OBRA Nº °

CONCEPTO
RUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, UNCIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”
N/A
N/A
N/A
SEGUROS MUNDIAL

DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA Nº °

CONCEPTO
N/A

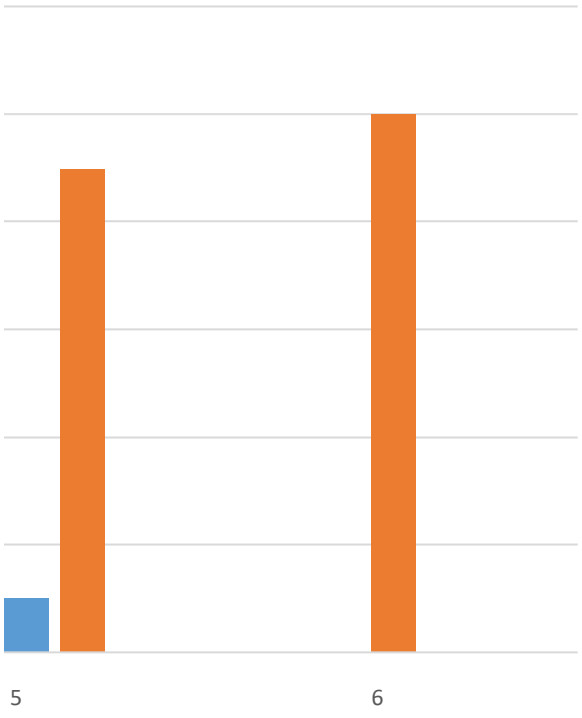
O AL AVANCE

AVANCE FINANCIERO (Mi

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVA
% Programado	$ 1.446.216.641,45	$
% Ejecutado	$ -	$
Diferencia	-$ 1.446.216.641,45	$

EJECUTADAS EN EL PERÍODO

CURVA "S"



PRO

EJEC
Inte

PAG


cont

LA C

INV

RIA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO
Copia certificado de pago a contratistas
Seguimiento plan de manejo ambiental
Control pagos seguridad social y parafiscales contratistas
Control programa de seguridad industrial
Control maquinaria y equipo
Control de calidad / inspecciones / ensayos
Extracto bancario de la cuenta de uso exclusivo del convenio

	Aprobado por: 
	KELLY JOHANA SOCARRAS GARCIA SECRETARIO DE PLANEACION

APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA

INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA

) DE CONCORDIA - MAGDALENA

niento de Balsamo,	Corregimiento de Balsamo, en el municipio de Concordia -
acta de inicio	

	Director de interventoria	Cindy jhoana Espejo

	CANTIDADES						VALORES				
otal	Acumulado Anterior		Acumulado este mes		Acumulado total		Acumulado Anterior		Acumulado este mes		Acu
13.014.813,33											
15.659.033,33											
14.100.000,00											
-											
14.718.787,50											
13.890.712,50											
1.331.997,33											
47.138.392,79											
16.673.336,07											
22.694.794,92											
26.586.856,02											
161.529.731,50											
67.062.843,00											
259.770.269,65											
9.903.478,00											
108.263.480,00											
26.908.243,66											
633.014,15											
7.676.160,00											
6.087.413,77											
3.469.028,33											
2.599.755,10											
455.824,35											
515.554,12											

576.767,07											
1.184.080,50											
887.300,00											
668.871,00											
774.661,50											
3.019.333,33											
1.633.333,33											
652.666,67											
120.300,00											
327.600,00											
1.676.015,00											
2.102.389,71											
664.037,80											
4.938.584,44											
5.478.330,00											
865.387.789,79											
8.216.048,00											
-											
91.800,00											
3.946.030,83											
16.458.750,00											
1.996.000,00											
-											
8.296.715,87											
4.332.225,00											

-											
-											
2.292.996,95											
-											
-											
-											
8.319.216,32											
-											
8.383.552,80											
689.421,49											
289.265,53											
197.346,75											
1.801.682,14											
908.377,78											
336.485,33											
141.182,50											
46.094.500,00											
1.277.929,13											
-											
46.165.366,80											
3.457.512,50											
1.271.600,00											
-											
-											
164.964.005,73											
-											
464.000,00											

1.681.666,67											
1.575.000,00											
1.330.666,67											
-											
-											

APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA

INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA

-											
-											
638.964,57											
-											
-											
7.465.500,00											
32.277.813,69											
45.433.611,59											
-											
116.000,00											
1.068.000,00											
3.125.140,80											
8.439.885,83											
782.161,39											
1.171.450,89											
-											
6.186.978,00											

3.970.052,46											
-											
5.920.766,67											
19.456.023,64											
50.236.459,68											
9.159.756,00											
3.454.467,00											
1.744.276,01											
5.570.070,00											
1.538.028,00											
1.049.262,00											
7.031.640,08											
4.876.564,85											
2.366.210,18											
538.120,04											
6.143.550,53											
7.988.748,71											
3.197.700,17											
3.782.000,30											
9.556.985,18											
1.199.160,00											
612.156,67											
431.645,04											
580.290,23											
197.430,08											
13.559.320,30											
45.826.672,18											
24.080.000,11											

10.167.257,07											
6.852.000,03											
1.103.473,66											
3.993.770,49											
20.455.963,26											
2.024.784,03											
1.255.814,73											
1.255.814,73											
-											
-											
2.899.997,40											
1.200.025,00											
7.808.767,22											
213.501.721,27											
1.339.523.588,06											
401.857.076,42											
1.741.380.664,47											

			0,00			
Administración						
Imprevistos						
Utilidad						
% Sobre Utilidad						
			0,00			

V/R ANTICIPO:

% ANTICIPO:

% RETEGARANTÍA:

		AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	
		N/A	N/A	N/A	
		N/A	N/A	N/A	
		$ 0,00	**$ 0,00**	**$ 0,00**	

V/R ANTICIPO:

% ANTICIPO:

% RETEGARANTIA:

		AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	
		N/A	N/A	N/A	
		N/A	N/A	N/A	
		N/A	N/A	N/A	
		$ 0,00	**$ 0,00**	**$ 0,00**	

Revisado por:



KELLY JOHANA SOCARRAS

Secretario de Planeación

ALCALDÍA DE CONCORDIA MAGDALENA

."

e Concordia - Magdalena

OGRAFÍA Nº 3



suspendido

OGRAFÍA Nº 6



suspendido

DÍA DE CORDIA DALENA

de Polideportivo en el corregimiento de Balsamo,

	$ 0,00
	N/A
	N/A
	31 de Septiembre de 2022
	Modificación Valor
N/A	$ 0,00

31 de septiembre de 2022

L MAGDALENA”

BRA

ORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, MUNCIPIO DE CONCORDIA, LENA”
° LP-002-2021
ASOCIACION ONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE ARCA
N/A
N/A
ENERO 11 DE 2022
ENERO 31 DE 2022
NA
NA
NA
NA
NA
4 de julio de 2022
N/A
4/07/2022
1.741.380.664,00
-
1.741.380.664,00
0
1.741.380.664,00
WE CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

LP-002-2021

VIGENTE (Fechas)		VALOR
DESDE	HASTA	
13/05/2011	13/11/2021	$ 905.517.945,00
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
Póliza N° 8Q-100010481		$ 905.517.945,00

LP-002-2021

FECHA DE PAGO	VALOR
N/A	N/A

les de pesos)

ANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
-	$ 1.446.216.641,45	
28.906.919,02	$ 28.906.919,02	
28.906.919,02	-$ 1.417.309.722,43	

)GRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

:UTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la rventoría.

;ADO: Valor acumulado efectivamente pagado al

tratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

GRÁFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS

ERTIDOS DEL CONVENIO

	S/N/N.A.	Nº Folios
	N/A	0
	N/A	0
	SI	0
	SI	0
	N/A	0
	N/A	0
	N/A	0
	Elaborado: 31/09/2022	
	Total de Páginas: 1	

	Versión: 1
	CÓDIGO: ATC-FR-003
	Página 2 de 4

ALCALDÍA DE CONCORDIA MAGDALENA

Magdalena

		SALDOS			
mulado total		Cantidad		Valor	

		Versión: 1			
		CÓDIGO:			
		ATC-FR-003			
		Página 2 de 4			

0,00		0,00
0,00		0,00

$ 0,00
0,00%
0,00%

SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
N/A	N/A
N/A	N/A
$ 0,00	

$ 0,00

0,00%

0,00%

SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
$ 0,00	

	Elaborado:	31/09/2022
	Total de Páginas: 1	
