
Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	Nombres de los recursos	CPTP
1		**MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ESTACION VILLA, MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL -**	**174 días**	**mar 26/09/23**	**vie 26/04/24**			**$ 4.521.844.365,86**
2		**INICIO**	0 días	mar 26/09/23	mar 26/09/23			$ 0,00
3		**MANTENIMIENTO PERIODICO**	**96 días**	**sáb 30/09/23**	**sáb 27/01/24**			**$ 18.334.832,40**
4		Conformacion de la banca existente	96 días	sáb 30/09/23	sáb 27/01/24			$ 18.334.832,40
5		**PAVIMENTO RIGIDO**	**167 días**	**mié 4/10/23**	**vie 26/04/24**			**$ 4.210.385.947,08**
6		Excavaciones varias en material común en seco.	48 días	mié 4/10/23	vie 1/12/23			$ 165.064.005,59
7		Subbase Clase C	120 días	sáb 7/10/23	sáb 2/03/24			$ 607.179.532,29
8		Pavimento de concreto hidráulico MR 3.8 Mpa.	144 días	mié 1/11/23	vie 26/04/24			$ 2.827.671.904,00
9		Bordillo en concreto	120 días	vie 1/12/23	vie 26/04/24			$ 298.053.800,00
10		Acero de refuerzo Fy = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	150 días	mié 25/10/23	vie 26/04/24			$ 312.416.705,20
11		**ESTRUCTURAS DE DRENAJE**	**87 días**	**vie 17/11/23**	**vie 1/03/24**			**$ 114.951.420,38**
12		Excavaciones varias en material común en seco.	24 días	vie 1/12/23	sáb 30/12/23			$ 10.372.132,42
13		Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	48 días	lun 4/12/23	jue 1/02/24			$ 5.410.248,48
14		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) para estructura	72 días	mar 5/12/23	vie 1/03/24			$ 29.888.578,08
15		Acero de refuerzo de Fy = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	87 días	vie 17/11/23	vie 1/03/24			$ 16.669.629,40
16		Relleno para estructura con material de afirmado	24 días	lun 29/01/24	sáb 24/02/24			$ 52.610.832,00
17		**TRANSPORTE**	**76 días**	**lun 30/10/23**	**jue 1/02/24**			**$ 63.082.720,00**
18		Transporte de materiales provenientes de excavaciones y derrumbes	76 días	lun 30/10/23	jue 1/02/24			$ 63.082.720,00
19		PMT	174 días	mar 26/09/23	vie 26/04/24	2		$ 33.528.400,00
20		PAGA	174 días	mar 26/09/23	vie 26/04/24			$ 43.956.919,00
21		CARACTERIZACION VIAL	174 días	mar 26/09/23	vie 26/04/24			$ 37.604.127,00




Proyecto: PROGRAMACION PA
Fecha: jue 5/10/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	Nombres de los recursos	CPTP	25 sep D L
22		**FIN**	0 días	vie 26/04/24	vie 26/04/24	21		$ 0,00	


Proyecto: PROGRAMACION PA
Fecha: jue 5/10/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

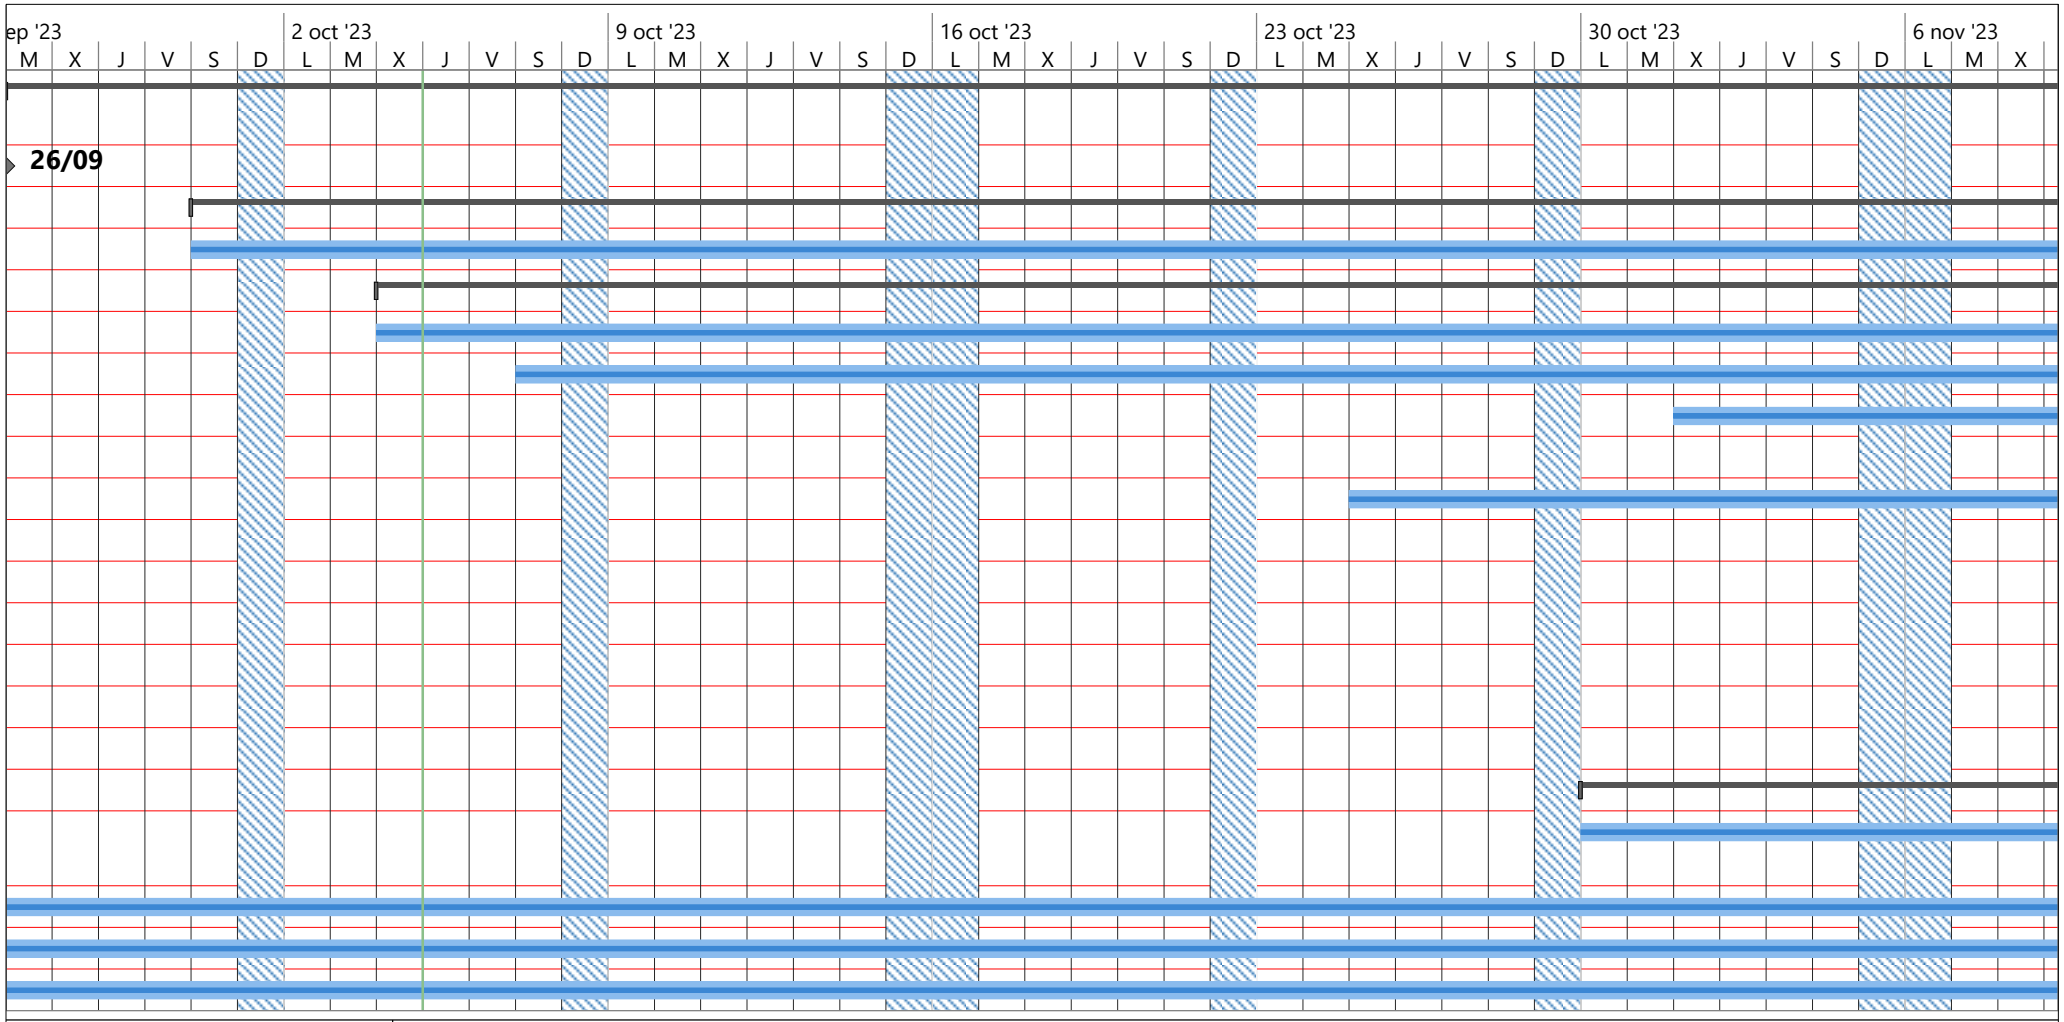


Proyecto: PROGRAMACION PA
Fecha: jue 5/10/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual




Proyecto: PROGRAMACION PA
Fecha: jue 5/10/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

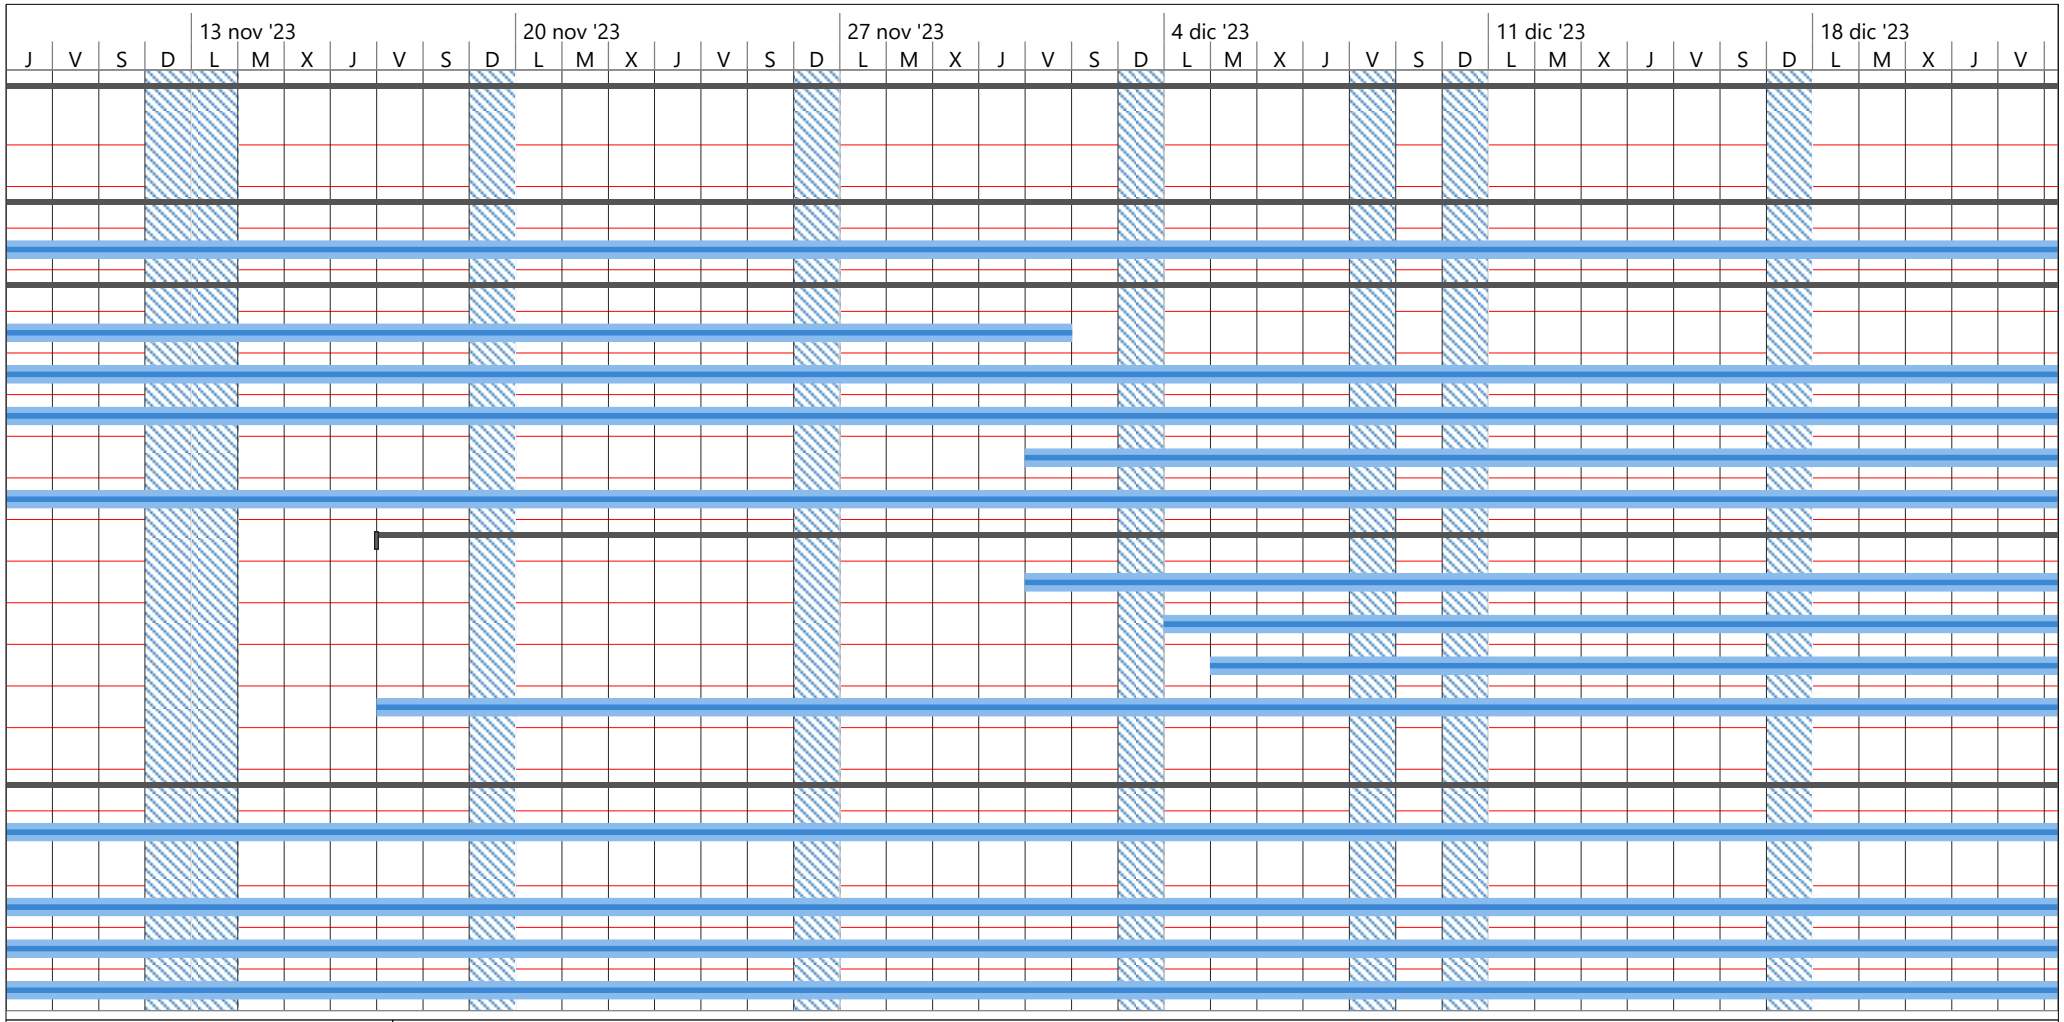


Proyecto: PROGRAMACION PA
Fecha: jue 5/10/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual




Proyecto: PROGRAMACION PA
Fecha: jue 5/10/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

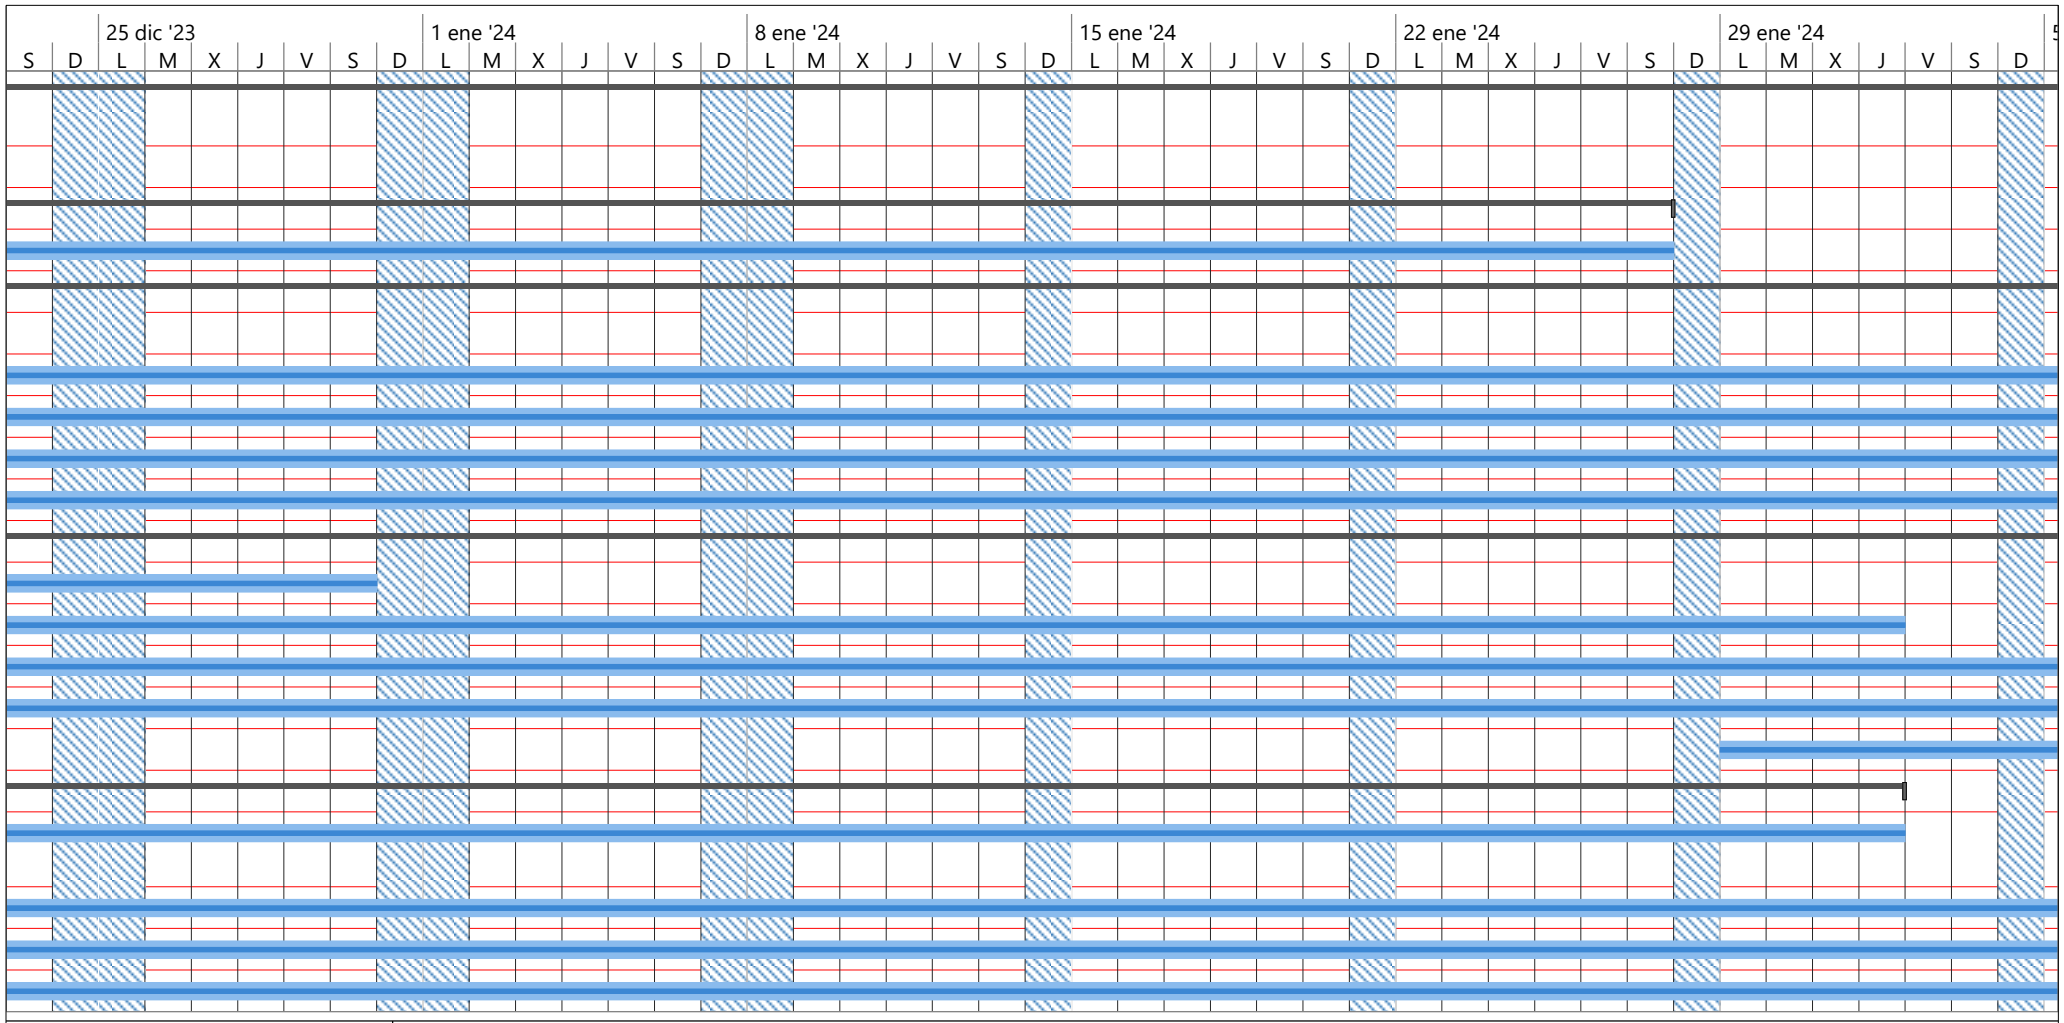


Proyecto: PROGRAMACION PA
Fecha: jue 5/10/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual




Proyecto: PROGRAMACION PA
Fecha: jue 5/10/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

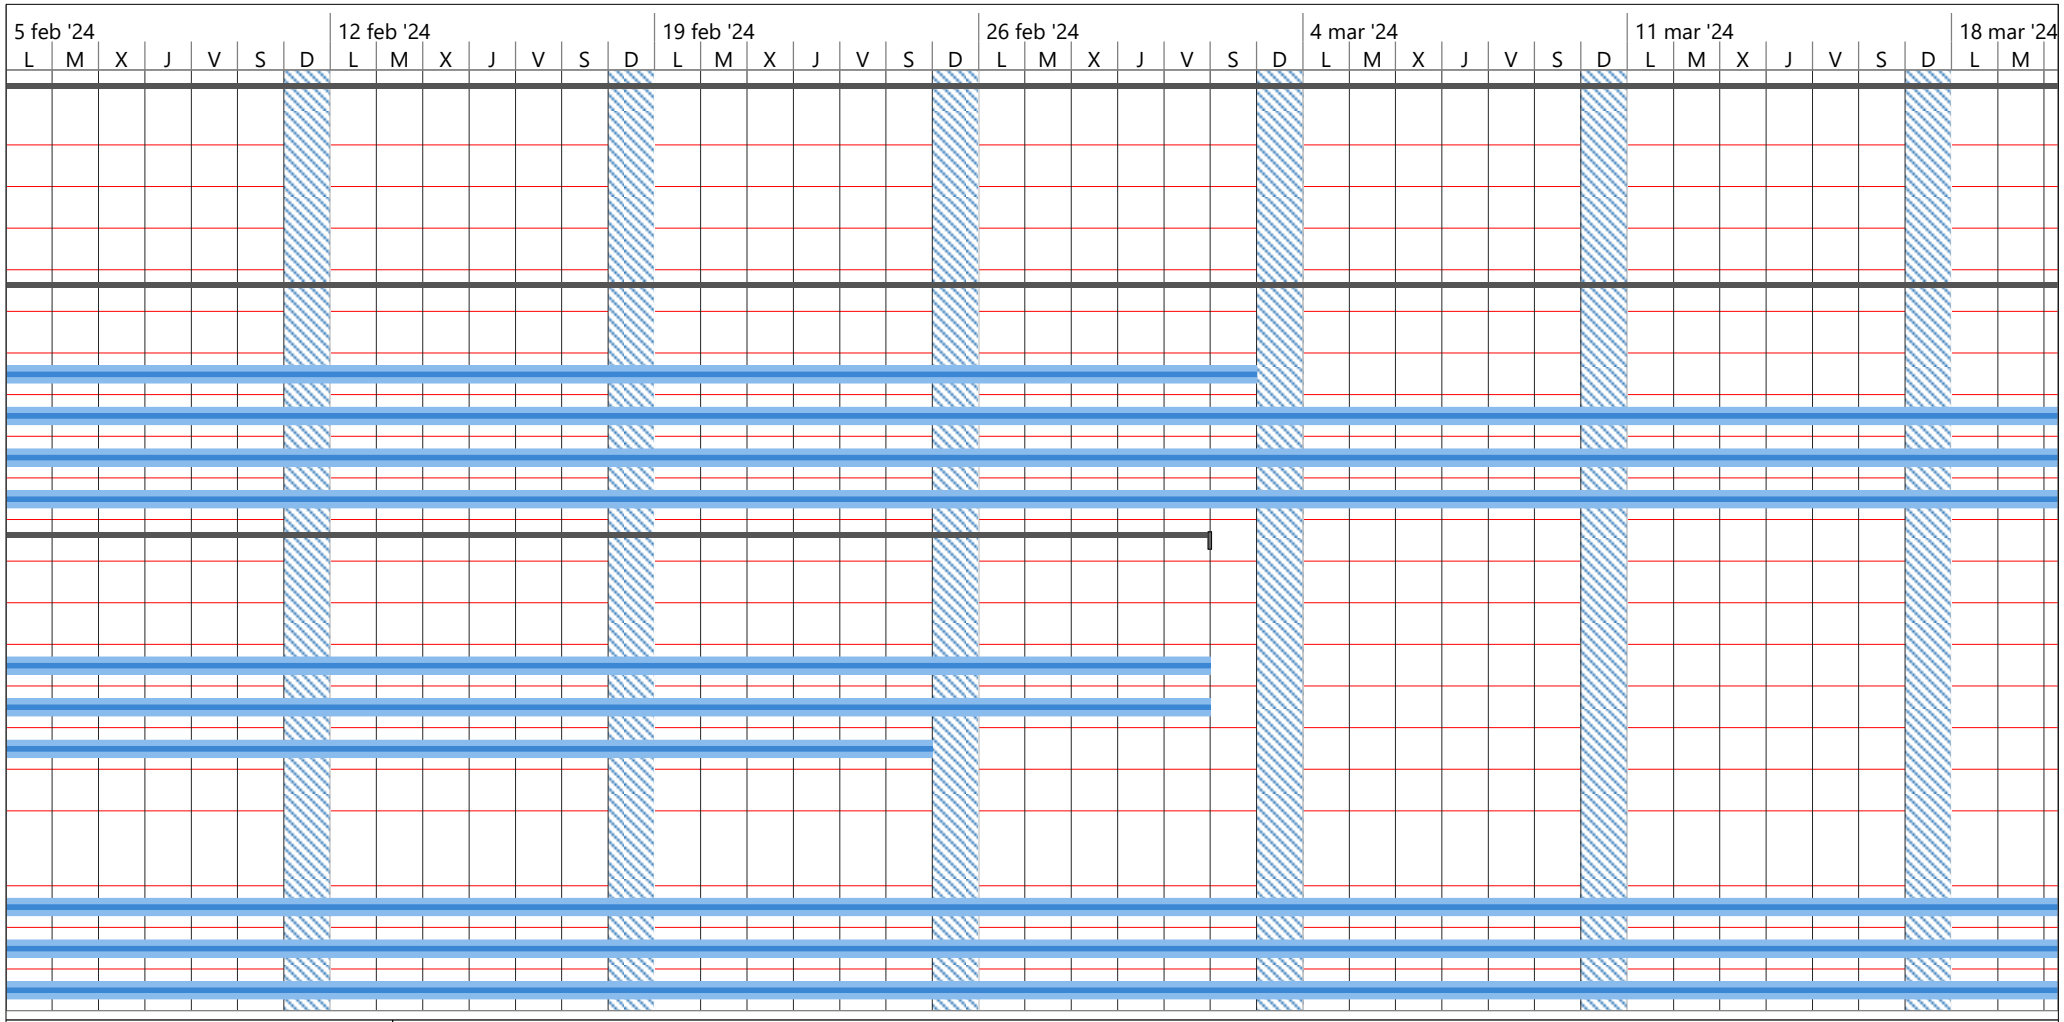


Proyecto: PROGRAMACION PA
Fecha: jue 5/10/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual




Proyecto: PROGRAMACION PA
Fecha: jue 5/10/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

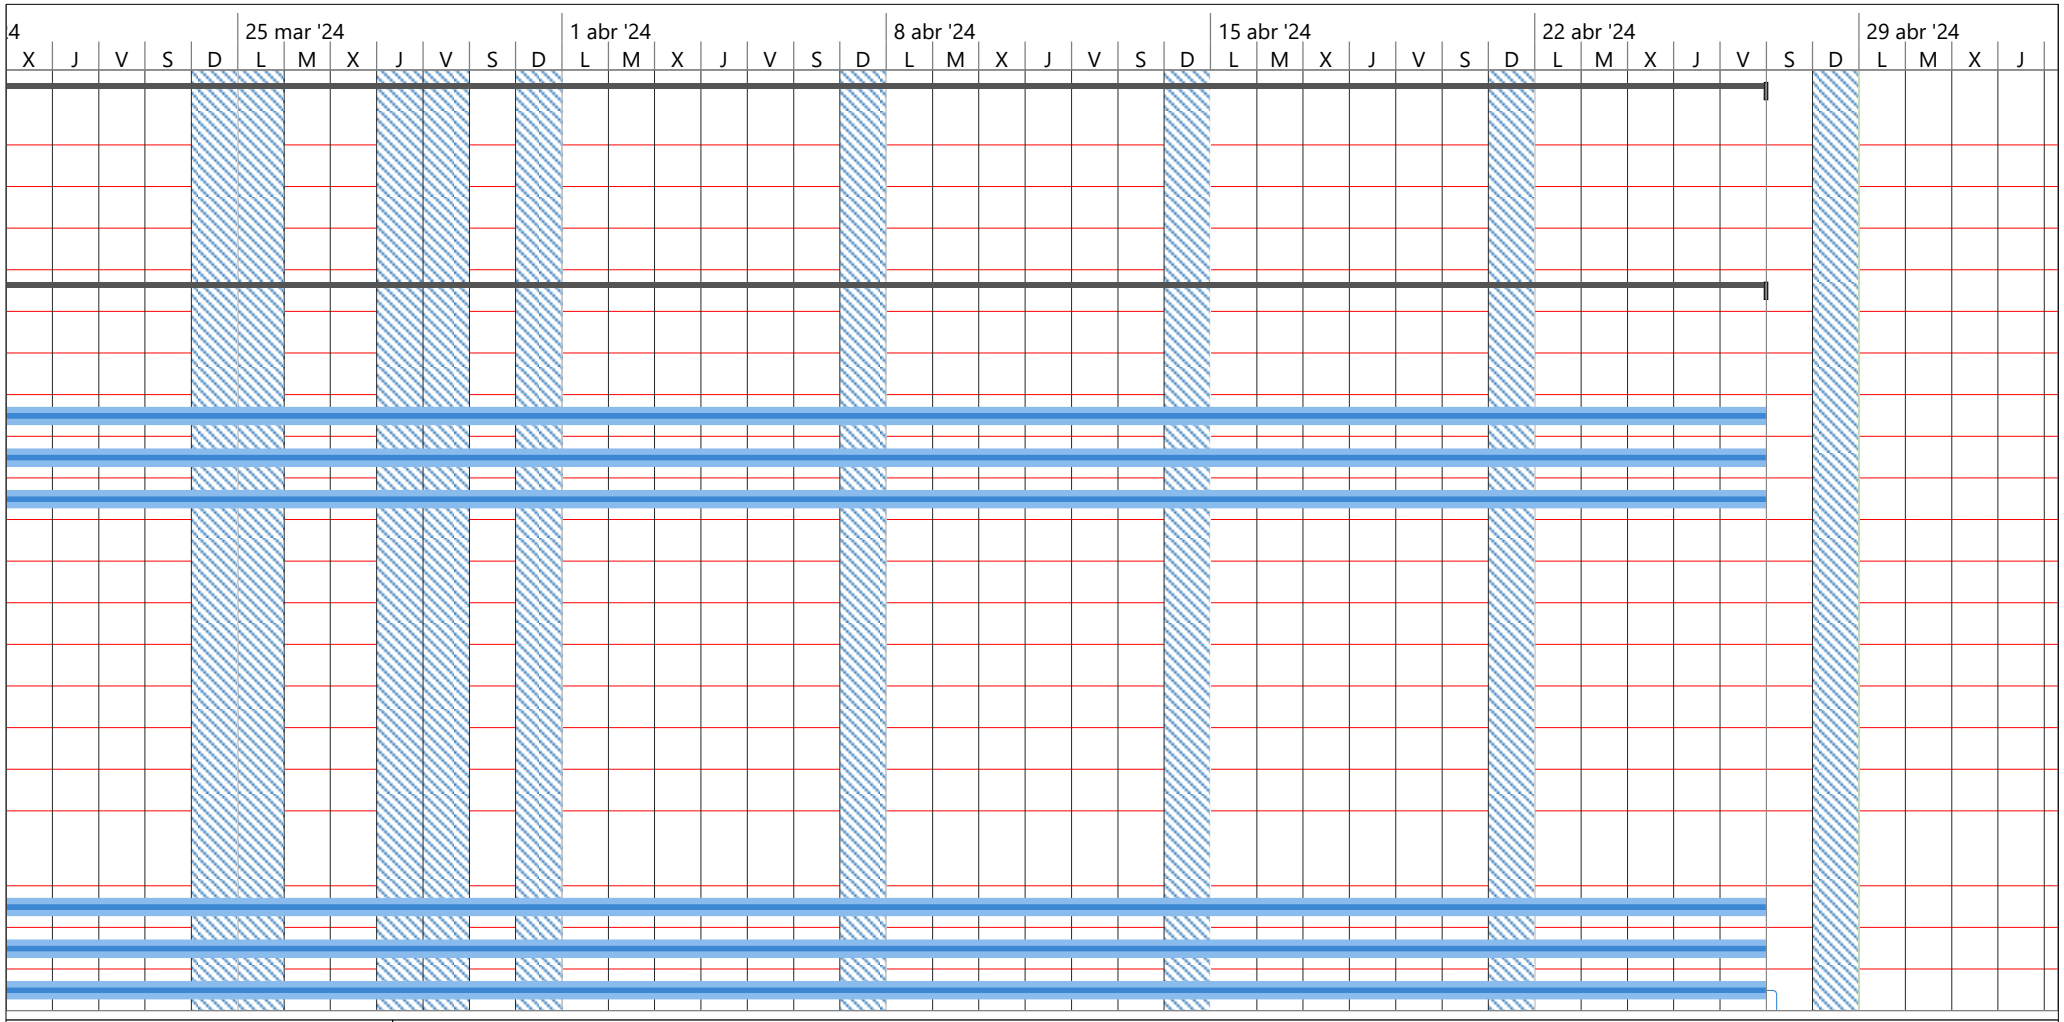

Proyecto: PROGRAMACION PA
Fecha: jue 5/10/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	



Proyecto: PROGRAMACION PA
Fecha: jue 5/10/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	
