


GOBERNACIÓN DE
ARAUCA

INFORME DE SUPERVISION No. 4

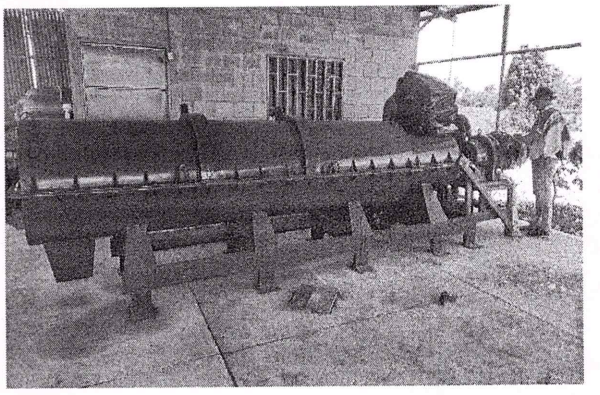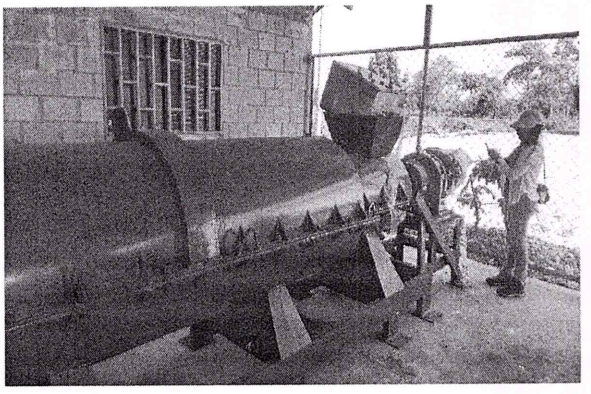


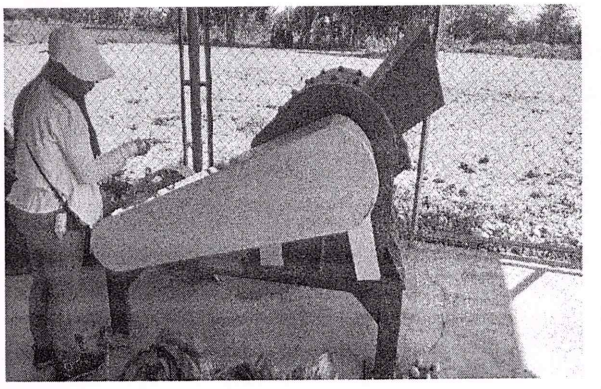


CONTRATO DE CONSULTORIA (INTERVENTORIA TECNICA) No. 001 DE 2024

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO "APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE CONSULTORIA (INTERVENTORIA TECNICA) No. 001 DE 2024

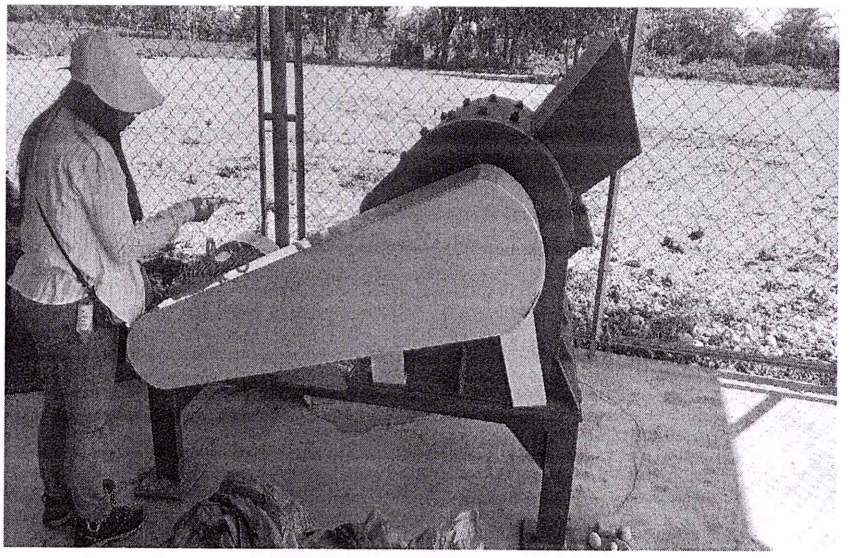PERIODO: PERIODO: 21 DE OCTUBRE DE 2024 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 627 DE 2023

CONTRATISTA: YARLE PATRICIA CARDENAS LIDUEÑEZ
R/ CONSORCIO TRANSFORMACION AGROPINDUSTRIAL

OBJETO: APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE CONSULTORIA (INTERVENTORIA TECNICA) No. 001 DE 2024

CONTRATISTA: JULIE ANDREA PEREZ VILLAMIL R/ CORPORACION POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA (COAMDESOR)

OBJETO: NTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO "APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

SUPERVISOR: FRANCISCO JAVIER MENDOZA NIÑO – RESOLUCIÓN No. 762 DE 2024

ARAUCA, NOVIEMBRE DEL 2024

CONTENIDO

	INTRODUCCIÓN	3
1.	ASPECTOS DEL PROYECTO SEGÚN LOS TÉRMINOS DE CADA CONTRATO	4
1.1	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 627 DE 2024 CO1.PCCNTR.5696480	4
1.1.1	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO	4
1.1.2	ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO	5
1.1.3	ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO	11
1.2	CONTRATO DE CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA TÉCNICA) No. 001 DE 2024, CO1.PCCNTR.5696011	11
1.2.1	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO	11
1.2.2	ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO	12
1.2.3	ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO	13
1.3	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 619 de 202, CO1.PCCNTR.5688823	13
1.3.1	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO	13
1.3.2	ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO	14
2.	INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO	20
2.1	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	20
2.2	ASPECTOS TÉCNICOS	20
3.	CONCLUSIONES	29
4.	ANEXOS	30

INTRODUCCIÓN

Este informe técnico expone los resultados de las actividades de supervisión realizadas al contrato de consultoría No. 001/2024 durante el periodo comprendido entre el 04 de OCTUBRE al 18 de NOVIEMBRE de 2024. El seguimiento se centró en verificar el cumplimiento de los indicadores de desempeño que la interventoría ha establecido para el contrato de prestación de servicios No. 627/2023.


Este documento presenta el avance de cada contrato asociado al proyecto con código BPIN 2023005810187 y detalla el seguimiento realizado por la interventoría en cuanto a los indicadores de desempeño establecidos al contrato principal, que en particular representa la evaluación de la calidad, especificaciones técnicas y cantidad de los equipos entregados conforme a las especificaciones técnicas, la efectividad del acompañamiento técnico a los beneficiarios y el grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los actores involucrados. Este análisis permite reflejar el progreso general del proyecto y su alineación con los objetivos planteados.

1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO- GESPROY

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO GESPROY

CÓDIGO BPIN:	2023005810187
ALCANCE:	Mejorar la capacidad de transformación de los productos del sector agroindustrial de los municipios de Arauquita y Saravena mediante el fortalecimiento de asociaciones.
FECHA DE APROBACIÓN:	30/10/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL :	31/07/2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN :	17/11/2024
ESTADO:	Contratado en ejecución
VALOR TOTAL PROYECTO APROBADO SGR:	$1.498.917.000,00

Línea de tiempo de ejecución del proyecto

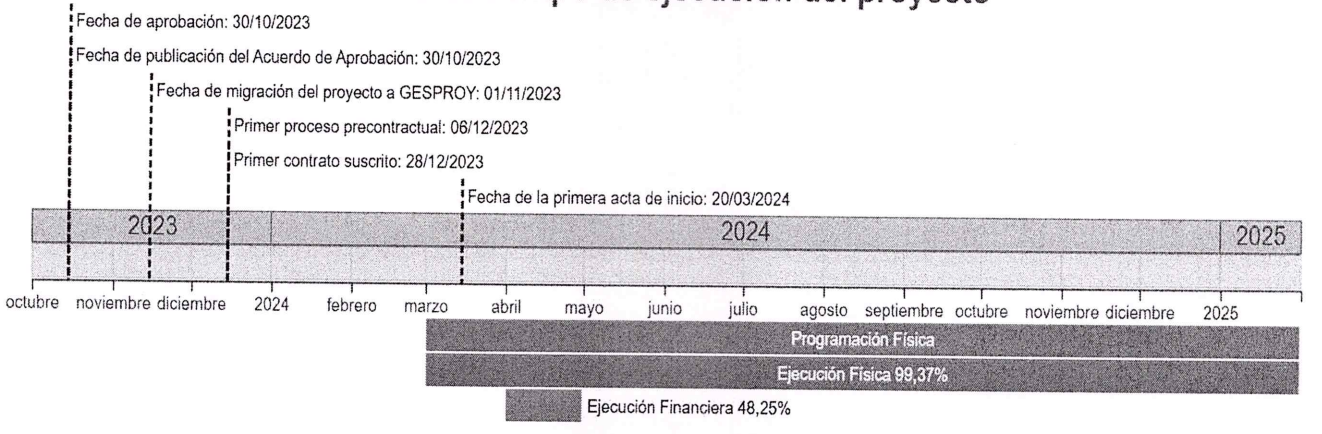

1.2. APROBACIÓN

a. Información de Formulación

- ✓ **Objetivo del proyecto:** Mejorar la capacidad de trasformación de los productos del sector agroindustrial de los municipios de Arauquita y Saravena del departamento de Arauca.
- ✓ **Sector:** Agricultura y Desarrollo Rural
- ✓ **Localización:** Arauquita y Saravena
- ✓ **Población Objetivo:** 1.025

✓ **Indicadores de producto:**

Objetivo específico	Producto	Indicador	Cantidad
Mejorar el acceso a activos productivos para el mejoramiento de la productividad del sector agroindustrial de los municipios de Arauquita y Saravena.	Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria	Productores agropecuarios apoyados	1.025

b. Información de Aprobación

✓ **Acuerdo de aprobación**

Número Acuerdo	Fecha Acuerdo	OCAD	SUIFP SGR
950	30/10/2023	Departamental-DEPARTAMENTO DE ARAUCA	Si

✓ **Entidad ejecutora:** Departamento de Arauca.
✓ **Entidad designada para la supervisión del proyecto:** Departamento de Arauca.

c. Fuentes de Financiación

✓ **Fuentes de financiación SGR registradas en SUIFP-SGR:** Asignación para la inversión regional 60%, vigencia 2023.

1.3. PROGRAMACIÓN

a. Alcance

Mejorar la capacidad de transformación de los productos del sector agroindustrial de los municipios de Arauquita y Saravena mediante el fortalecimiento de asociaciones.

✓ **Indicadores Principales del Proyecto**

Objetivo Específico	Producto	Unidad Producto	Cantidad Producto	Nombre Indicador	Año Inicio Meta	Año Fin Meta	U. Indicador	Vlr Meta
Mejorar el acceso a activos productivos para el mejoramiento de la productividad del sector agroindustrial de los municipios de Arauquita y Saravena	Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (Producto principal del proyecto)	Número de productores agropecuarios	1.025	Productores agropecuarios apoyados	2023	2023	Número	1.025

1.4. CONTRATACIÓN

a. Contratistas

✓ Información contratistas

Identificación del Contratista	Nombre del Contratista	Número ID Representante Legal	Representante Legal	Detalle Tipo Contratista	Dirección	Teléfonos	Correo Electrónico	Creado por	Fecha creación
901784517	CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL	1.116.792.298	YARLE PATRICIA CÁRDENAS LIDEÑE	Consorcio	Calle 15 No. 26.33	3209973441	ingconsugroupsas@gmail.com	SPGR	07/01/2024
900199755	CORPORACION POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL - COAMDESOR	37.391.228	JULIE ANDREA PEREZ VILLAMIL	Entidad sin ánimo de lucro	Carrera 23 No 21 - 34	3114478062	coamdesogerencia@gmail.com	Por aplicación	05/02/2024
60.331206	SANDRA LILIANA FRANCO COLLAZOS	60.331.206	SANDRA LILIANA FRANCO COLLAZOS	Persona natural	Calle 19 No. 19 19	3212060183	sanlifrancoc@gmail.com	SPGR	03/02/2023

b. Supervisores

✓ Supervisor por la Entidad

Documento	Interventor	Nombre del funcionario	Dependencia	Cargo	Teléfono	email
Cédula de Ciudadanía	93.302.472	FRANCISCO JAVIER MENDOZA NIÑO	Secretaria De Desarrollo Agropecuario Y Sostenible	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	3113908376	fmendoza@arauca.gov.co

c. Presupuestal

✓ Rubros

Rubro	Descripción del Rubro	Creado por	Fecha creación
00AR-1702-1100-2023-00581-0187	APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	SPGR	24/11/2023

✓ Incorporación Presupuestal al Departamento de Arauca

Vigencia	Fuente	Rubro - Descripción	Valor Incorporado	Número del Acto Administrativo	Fecha de Acto Administrativo	Aplica Vigencia Futura	Creado por	Fecha creación
2023	SGR - Asignación para la inversión regional 60%	00AR-1702-1100-2023-00581-0187 APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	1.498.917.000,00	981	08/11/2023	NO	SPGR	24/11/2023

✓ Certificado de Disponibilidad presupuestal

Número	Fecha CDP	Valor Total	Valor RP	Valor Saldo	Maneja Múltiples Proyectos	Creado por	Fecha creación
29123	15/11/2023	1.399.431.000,00	1.399.431.000,00	9.431.000,00	NO	SPGR	24/11/2023
29223	15/11/2023	70.686.000,00	70.686.000,00	00,00	NO	SPGR	24/11/2023
29323	15/11/2023	24.000.000,00	24.000.000,00	00,00	NO	SPGR	24/11/2023
29423	15/11/2023	4.800.000,00	4.800.000,00	00,00	NO	SPGR	24/11/2023

d. Procesos Precontractuales

✓ Gestión precontractual

No. de Proceso Precontractual	Modalidad de Contratación	Número Acto Adminis-trativo	Fecha Acto Adminis-trativo	Número de Constancia	No. Acto Adminis-trativo de Cierre	Contratos Relacio-nados	CDP Proceso Precontractual	Creado Por	Fecha Creación
LP-07-06-2023	LICITACIÓN PÚBLICA	3930	06/12/2023	CO1.PCCNTR.5427363	4587	627	**No. 29123** 15/11/2023 $1.399.431.000 Vigencia 2023	SPGR	07/01/2024
CD-07-41-2023	Contratación directa	N/A	22/12/2023	CO1.PCCNTR.5688823	N/A	619	**No. 29423** 15/11/2023 $4.800.000 Vigencia 2023 **No. 29323** 15/11/2023 $24.000.000 Vigencia 2023	SPGR	07/01/2024
CM-07-04-2023	Concurso de Méritos	4675	29/12/2023	CO1.PCCNTR.5796011	107	001	**No. 29223** 15/11/2023 $70.686.000 Vigencia 2023	SPGR	19/02/2024

e. Contratos

✓ Contratos del Proyecto

Contrato No.	Fecha Suscripción del Contrato	Tipo de Contrato	Número del Documento de Identificación del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato para el Proyecto	Creado por	Fecha Creación
619	28/12/2023	Prestación de Servicios	60.331.206	60331206-FRANCO COLLAZOS SANDRA LILIANA	$28.800.000	SPGR	07/01/2024
627	28/12/2023	Prestación de Servicios	901.784.517	901784517-CONSORCIO TRANSFORMACION AGROINDUSTRIAL	$1.390.000.000	SPGR	07/01/2024
001	14/02/2024	Interventoría	07/01/2024	900199755-CORPORACION POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL - COAMDESOR	$70.686.000	SPGR	19/02/2024

2. ANTECEDENTES Y REVISIÓN DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO BPIN 2023005810187

2.1.1 NECESIDADES POR SATISFACER

La Agroindustria es la actividad económica que comprende la producción, industrialización y comercialización de productos agrarios, pecuarios, forestales y biológicos para el departamento de Arauca se encarga de la transformación de los productos de la agricultura, ganadería, riqueza forestal y pesca, en productos de elaboración para el consumo alimenticio, en esta transformación se incluye los procesos de selección de calidad, clasificación (por tamaño), embalaje-empaque y almacenamiento de la producción agrícola, a pesar que no haya transformación en sí y también las transformaciones posteriores de los productos y subproductos obtenidos de la primera transformación de la materia prima agrícola.

Si bien las asociaciones del departamento de Arauca que participan de manera activa generando desarrollo, empleo y mejorando la calidad de vida de sus socios reciben apoyo técnico en la producción, se detecta que aún se puede mejorar la productividad mediante el fortaleciendo empresarial, donde se permitirá mejorar sus estándares de calidad e inocuidad para los procesos de recepción, almacenamiento, elaboración, envase, empaque y transporte de los productos elaborados. También es imperativo incorporar esquemas de transformación, procesamiento y valor agregado en los productos, para que las organizaciones campesinas puedan avanzar hacia los mercados finales y tener una mayor remuneración sobre sus productos.

La vocación agrícola una de las más importantes del departamento de Arauca se encuentra en el cultivo de cacao muy específicamente en el municipio de Arauquita, en el que la producción regional asciende de manera acelerada en los últimos años, se produce de excelente calidad y abundancia.

A partir de la necesidad planteada, y en búsqueda por seleccionar las asociaciones la Administración Departamental el 22 de septiembre de 2023, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Sostenible, lanzó una convocatoria con el propósito de seleccionar a los beneficiarios del proyecto, en concordancia con las políticas del Gobierno Nacional, particularmente las delineadas en el Plan de Desarrollo "CONSTRUYENDO FUTURO 2020-2023". Esta convocatoria se enfocó especialmente en proporcionar apoyo para el acceso a maquinaria y equipos.

La convocatoria estuvo dirigida a Asociaciones Campesinas o Agropecuarias de Segundo y Tercer Grado. Los proyectos o ideas presentadas debían cumplir con los plazos y requisitos estipulados en el documento oficial. Los perfiles que cumplían con estos requisitos fueron habilitados para participar en las etapas de Prefactibilidad y fases subsecuentes, con la posibilidad de acceder a recursos de financiación proporcionados por la Administración Departamental, siempre que se ajustaran a la disponibilidad presupuestal aprobada en el Sistema General de Regalías para el período 2022-2023. La asignación y distribución de estos recursos fue gestionada por las Secretarías de Planeación y Desarrollo Agropecuario y Sostenible, orientadas a la ejecución de proyectos productivos integrales enmarcados en las líneas de Innovación y Transformación del sector agropecuario.

Una vez completadas todas las etapas de la convocatoria, se seleccionaron los perfiles presentados por la COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE "LA DELICIA"

y la ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPESINA JOSÉ ANTONIO GALÁN ZORRO. Esta elección se basó en el cumplimiento integral de los requisitos establecidos en los términos de la convocatoria y en el potencial impacto positivo de los proyectos propuestos.

Es esencial resaltar el proceso de selección llevado a cabo, el cual definió la población objetivo y sentó las bases para la estructuración del proyecto actual. La iniciativa no solo busca mejorar las condiciones socioeconómicas de las asociaciones beneficiarias en Arauquita y Saravena, sino también revitalizar el desarrollo empresarial que se encontraba estancado debido a la falta de inversiones institucionales. Este esfuerzo conjunto tiene como objetivo reactivar el sector agroindustrial local, proporcionando una visión clara sobre las oportunidades reales de desarrollo en la región. Los documentos relacionados con el proceso de selección están archivados en el banco de proyectos del Sistema General de Regalías, sirviendo como soporte fundamental para la formulación y estructuración del proyecto.

2.1.2 PROBLEMA CENTRAL

Baja capacidad de trasformación de los productos del sector agroindustrial de los municipios de Arauquita y Saravena del departamento de Arauca.

2.1.3 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN


Apoyo para la gestión y aumento de la productividad del sector agroindustrial de los municipios de Arauquita y Saravena del departamento de Arauca. La alternativa de solución planteada tiene como objetivo Mejorar la productividad y competitividad de las asociaciones del sector agroindustrial de los municipios de Saravena y Arauquita del Departamento de Arauca, con el propósito de impulsar las cadenas productivas, contribuir a aumentar el nivel de producción, aprovechamiento y transformación de materias primas para potencializar el sector de esta manera generar la reactivación económica y la generación de ingresos Para ello y teniendo en cuenta las funciones y competencias de cada entidad, se ha sugerido desarrollar las siguientes actividades y componentes:

- ☑ COMPONENTE 1. Fortalecimiento de las capacidades empresariales para la gestión y mejoramiento de la productividad de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro.
- ☑ COMPONENTE 2. Fortalecimiento de las capacidades empresariales para la gestión y mejoramiento de la productividad de la cooperativa procesadora de cacao del oriente la Delicia.
- ☑ COMPONENTE 3. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EMPRESARIAL
- ☑ COMPONENTE 4. INTERVENTORÍA EXTERNA
- ☑ COMPONENTE 5. APOYO A LA SUPERVISION

2.2 LOCALIZACION

El área de intervención del proyecto serán la Cooperativa Procesadora de Cacao de Oriente La Delicia en el municipio de Arauquita, y la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro en el municipio de Saravena.

Figura 1. Lugar de intervención del proyecto.

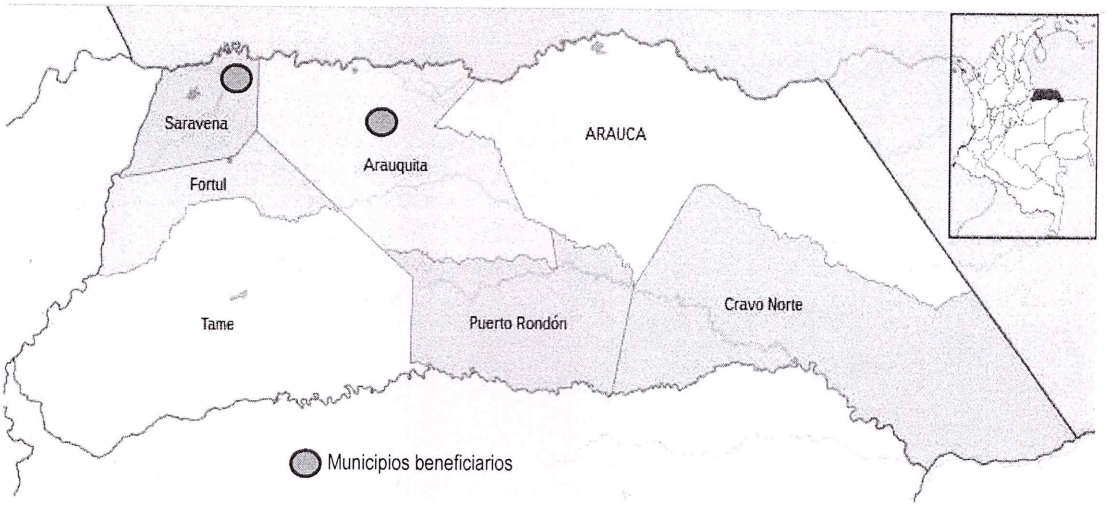

Fuente: https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mapa_de_Arauca_%28pol%C3%ADtico%29.svg

2.3 FUENTE DE FINANCIACIÓN

Los recursos financieros destinados al proyecto " **APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA** " contrato de prestación de servicios No. 627 de 2024, Certificado de Disponibilidad Presupuestal SPGR No. 29123 y SGR202324-00366 del 15/11/2023 y Registro presupuestal Registros Presupuestales SPGR 29223 y SGR202324-00358 del 28/12/2023, por un monto total de MIL TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS ($1.390.000.000,00), contrato de consultoría (interventoría técnica) No.001-2024, Certificado de Disponibilidad Presupuestal SPGR No. 29223 y SGR202324-00367 del 15/11/2023 y Registro Presupuestal SPGR 824 y SGR202324-00378 del 14/02/2024 por un monte de SETENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($70.686.000,00) y Contrato de prestación de servicios No. 619 de 2023 Certificado de Disponibilidad Presupuestal SPGR No. 29423 y SGR202324-00369 del 15/11/2023 y Registros Presupuestales SPGR 29023, SGR202324-00356, SPGR29123, SGR202324-00357 del 28/12/2023, fondos específicamente de la Fuente de Financiación: SGR - Asignación para la inversión regional 60% - 2023005810069, correspondiente al bienio 2023-2024, bajo el RUBRO 00AR-2201-0700-2023-00581-0069.

2.4 ALCANCE

Mediante el desarrollo del proyecto **APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA**, se busca fortalecimiento de las capacidades empresariales para la gestión y mejoramiento de la productividad de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro en el municipio de Saravena y de la Cooperativa Procesadora de Cacao de Oriente La Delicia en el municipio de Arauquita. El proyecto incluye el acompañamiento empresarial y seguimiento al fortalecimiento a la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro en el municipio de Saravena, mediante la adquisición y

suministro de las herramientas y equipos requeridos para la dotación de una planta de producción de bio fertilizantes y mejorar sus procesos de producción, así como también, el acompañamiento empresarial y seguimiento al fortalecimiento a la Cooperativa Procesadora de Cacao de Oriente La Delicia en el municipio de Arauquita mediante la adquisición y suministro de las herramientas y equipos requeridos para mejorar el proceso de transformación de cacao.

2.5 OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.5.1 OBJETIVO GENERAL

Mejorar la capacidad de trasformación de los productos del sector agroindustrial de los municipios de Arauquita y Saravena del departamento de Arauca.

Indicador: Número de asociaciones fortalecidas.
Meta: 2

2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Mejorar el acceso a activos productivos para el mejoramiento de la productividad del sector agroindustrial de los municipios de Arauquita y Saravena.

Producto: Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria.
Unidad de producto: Número de productores agropecuarios
Cantidad de producto: 1.025

2.6 METODOLOGÍA

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos, se han implementado los aspectos clave en el seguimiento del proyecto. Esto es fundamental para comprender la relevancia del proyecto y los elementos críticos a considerar. En la Tabla 1 se detalla el nivel de participación dentro del proyecto, un punto crucial para el seguimiento efectivo del mismo.

El proyecto se centra en un solo objetivo específico-OE1: "Mejorar el acceso a activos productivos para aumentar la productividad del sector agroindustrial de los municipios de Arauquita y Saravena". Este objetivo se descompone en cinco componentes prioritarios, cada uno con un nivel jerárquico basado en su participación en el proyecto. Es fundamental prestar atención a estos componentes, especialmente a las actividades críticas identificadas como las 3, 4 y 5 según la MGA (Matriz de Gestión de Actividades). Esto garantiza que se mantenga un enfoque adecuado durante el seguimiento del proyecto.

Tabla 1. Porcentaje participación del proyecto por componente

COMPONENTE	VALOR TOTAL	% PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO
COMPONENTE 1. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EMPRESARIALES PARA LA GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPECINA JOSÉ ANTONIO GALÁN ZORRO	$750.974.000	50.10
COMPONENTE 2. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EMPRESARIALES PARA LA GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA	$576.457.000	38.46

PRODUCTIVIDAD DE LA COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA		
COMPONENTE 3. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EMPRESARIAL	$ 72.000.000	4.80
COMPONENTE 4. INTERVENTORÍA	$ 70.686.000	4.72
COMPONENTE 5. APOYO A LA SUPERVISION	$ 28.800.000	1.92

2.7 POBLACIÓN OBJETIVO

La población objetivo es 1.025 personas.

2.8 ACTIVIDADES CONTRATADAS

De acuerdo con la formulación del proyecto este cuenta con la siguiente estructura de trabajo:

Tabla 1. Actividades del proyecto

Producto	Actividad
1.1 Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de productores agropecuarios **Cantidad:** 1.025,0000 **Costo:** $ 1.498.917.000	**1.1.1** REALIZAR EL APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPECINA JOSÉANTONIO GALÁN ZORRO **Costo:** $ 750.974.000 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No **1.1.2** REALIZAR EL APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DELORIENTE LA DELICIA **Costo:** $ 576.457.000 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No **1.1.3** IMPLEMENTAR EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTOEMPRESARIAL **Costo:** $ 72.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si **1.1.4** IMPLEMENTAR INTERVENTORÍA EXTERNA **Costo:** $ 70.686.000 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si **1.1.5** IMPLEMENTAR EL APOYO A LA SUPERVISION **Costo:** $ 28.800.000 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

2.9 CRONOGRAMA INICIAL DE ACTIVIDADES

ITEM	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	UNID.	CANT.	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
GESTION PRESUPUESTAL				X	X								
ETAPA PRECONTRACTUAL						X	X						
COMPONENTE 1. APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPECINA JOSÉ ANTONIO GALÁN ZORRO													
1.1	MANGUERA REFORZADA DE 1" 3 CAPAS ROLLO DE 100MTCALIBRE 80	UNIDAD	10					X					
1.2	CARRETILLA ANTI-PINCHAZO. TIPO CARRETILLA. MODELO VERSÁTIL, CAPACIDAD DE LEVANTE 5 FT. CARACTERÍSTICAS. CARRETILLA DE TOLVA DE 5 FT, MATERIAL DE LA TOLVA METÁLICA, RIN METÁLICO, RUDA ANTI-PINCHAZO	UNIDAD	10					X					

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	UNID.	CANT.	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
1.3	BALANZA BASCULA DE 500KG ELÉCTRICA DE PEDESTAL: BALANZA 500KG, MEDIDAS PLATAFORMA 50X60CM APROX. TABLERO DOBLE VISOR COLOR NÚMEROS: ROJO, RECARGABLE 8 A 10 HORAS CONTINUAS, PLEGABLE Y PORTÁTIL INCLUYE: 1. BALANZA PLATAFORMA, 1. INDICADOR, 1. CARGADOR,4 PATAS PARA LA PLATAFORMA	UNIDAD	2					X					
1.4	TRITURADORA DE PIEDRA 2 METROS CÚBICOS HORA: TRITURADORA DE PIEDRA DE 3 TONELADAS HORA CON MOTOR TRIFÁSICO O DIÉSEL, DE 10 CABALLOS NOBSE	UNIDAD	1					X					
1.5	TRITURADORA INDUSTRIAL PARA RESIDUOS SÓLIDOS: PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS CON REVERSIÓN AUTOMÁTICA, CON SISTEMA AVANZADO DE PROTECCIÓN DE RODAMIENTOS: MÚLTIPLES OBSTÁCULOS DE LABERINTO MECÁNICO Y SELLOS CONVENCIONALES, Y ASEGURANDO LA MÁXIMA FIABILIDAD EN LÍNEA, EFICIENCIA DE TRITURACIÓN EN LOS EJES ROTATORIOS DE CONTRAPESO QUE AUMENTEN LA EFICIENCIA DE LA ACCIÓN DE CORTE Y ROTURA, DE SISTEMA DE CONDUCCIÓN ELECTROMECÁNICA DE BAJA VELOCIDAD Y ALTO CON ROBUSTO DISEÑO DE CÁMARA DE CORTE. FUNCIONAMIENTO NO BALÍSTICO Y DE BAJO RUIDO Y NO CREAR POLVO NI PARTÍCULAS VOLADORAS, CON PROTECTORES DE GOLPES GRAVES EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DEL COJÍN, CON CORTADOR DE ALTA ALEACIÓN CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA UNA VIDA EXTRA-LARGA, ANTICORROSIVO Y RESISTENTE AL DESGASTE. RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS NSK, EJES DE CORTE HEXAGONALES DISEÑADOS PARA UNA MAYOR DURABILIDAD, DE 500KG	UNIDAD	1					X					
1.6	CANECA PLÁSTICA DE 55 GALONES CON TAPA Y ARO DE SEGURIDAD: ALTURA 90 CM DIÁMETRO O ANCHO 60 CM MATERIAL: POLIETILENO ORIGINAL DE ALTA DENSIDAD	UNIDAD	38					X					
1.7	MEDIDOR DE PLANTAS 5 EN 1, TEMPERATURA DE PH DEL SUELO. PROBADOR DE SUELO 5 EN 1: PUEDE MEDIR EL VALOR DE PH DEL SUELO (3,0 A 9,5, 10 NIVELES), INTENSIDAD DE MEDIDOR DE PLANTAS 5 EN 1, TEMPERATURA DE PH DEL SUELO. PROBADOR DE SUELO 5 EN 1: PUEDE MEDIR EL VALOR DE PH DEL SUELO (3,0 A 9,5, 10 NIVELES), INTENSIDAD DE LA LUZ SOLAR (9 NIVELES), HUMEDAD (5 NIVELES), HUMEDAD (20% -99%) Y TEMPERATURA DEL SUELO.	UNIDAD	4					X					
1.8	ZARANDA CLASIFICADORA 2 Y 3 NIVELES: ZARANDA CLASIFICADORA DE MATERIALES MALLA 100, 50 .05	UNIDAD	1					X					
1.9	CERRADORA DE SACOS Y COSTALES + HILO NUEVA: VOLTAJE: 110V AC, CORRIENTE: 0.73ª, PODER: 90 VOLTIOS FRECUENCIA: 50/60HZ, VELOCIDAD: 1100 RPM, ANCHO MÁXIMO DE LA BOLSA A COSER:: 0.16 PULGADAS (4MM), ESPACIO ENTRE PUNTADAS: 0.27 PULGADAS -0.33 PULGADAS (7-8.5MM), TAMAÑO DE LA MÁQUINA: 14.25 PULGADAS (361 MM) (L) X 9.25 PULGADAS (234 MM) (W) X 12 PULGADAS (304 MM)(H), PESO DE LA MÁQUINA: 12 LBS. (5.5 KG), TAMAÑO DE LA CAJA: 16 PULGADAS (406.4 MM)(L) X 11 PULGADAS (279.4 MM)(W) X 13 PULGADAS (330.2 MM)(H). DETALLES TÉCNICOS: 1. COSTURA PUNTO DE CADENA DE HILO ÚNICO 2. RANGO DE PUNTADA (MM) 6.5 (FIJO) 3. REVOLUCIÓN (RPM) 1250 4. AGUJA DN X 1 # 25 5. HILO (VINILÓN, SINTÉTICO O ALGODÓN) 20/6 6. MATERIAL DEL BOLSO QUE SE CERRARÁ EL PAPEL DE KRAFT, PP / PE, PAÑO TEJIDO, ALGODÓN, YUTE DE LA ARPILLERA 7. MOTOR DE ACCIONAMIENTO 90 W 8. FUENTE DE ALIMENTACIÓN 110, 220 O 240 V A.C 9.PESO NETO (KG) 5.9 KG. ACCESORIOS ESTANDAR; AGUJAS DN X 1 #	UNIDAD	2					X					

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	UNID.	CANT.	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
	25 10PCS, HILO DE VINILO EN 20/6 1 ROLLO, ARBUSTOS DEL MOTOR 2PCS, DESTORNILLADOR 1PCS, PINZAS 1PCS, LLAVE HEXAGONAL 1PCS, ENGRASADOR 1PCS												
1.10	GRANULADOR DE FERTILIZANTE ORGÁNICO: PRODUCTIVIDAD HASTA 3.000 KG POR HORA, DIMENSIONES DEL GRANULADOR; LONGUITUD 4.5 METROS, DIÁMETRO 820 MM. FORMA DE PELLETS ESFÉRICA. TAMAÑO DE GRANULOS DE 2 A 8 MM DE DIÁMETRO, CONSUMO 75 KW. FUENTE DE ALIMENTACIÓN 380V	UNIDAD	1					X					
1.11	ESCRITORIO METÁLICO OPERATIVO 73X120X60CM: CARACTERÍSTICAS; 3 FRENTES DE GAVETA EN LÁMINA COL ROLLED CALIBRE 24. TAPA SUPERIOR EN AGLOMERADO DE 25 MM, ENCHAPADO EN FÓRMICA, CON CANTO FORRADO EN BOCEL DE PVC. GAVETA SUPERIOR CON CHAPA. LARGO 60 CENTÍMETROS, ANCHO 73 CM, PROFUNDIDAD 150 CENTÍMETROS ALTO 150 CENTÍMETROS	UNIDAD	1					X					
1.12	ARCHIVADOR 4 GAVETAS METÁLICO. ELABORADO EN LÁMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 22, RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, CORREDERAS INDEPENDIENTES FULL EXTENSIÓN, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA Y CHAPA DE ACCIÓN CON LLAVE. MEDIDAS134X47CMX60CM	UNIDAD	1					X					
1.13	SILLA ESCRITORIO CON BRAZOS Y RESPALDO NEGRA: MATERIAL CUERO SINTÉTICO, ANCHO 65 CENTÍMETROS ALTO 120, MATERIAL ESTRUCTURA METAL, ESPUMA, NYLON, POLIPROPILENO CAPACIDAD (RESISTENCIA - CARGA MÁXIMA) 120 KG GIRA 360 GRADOS, MEDIDAS 124X51X52	UNIDAD	1					X					
1.14	SILLA OFICINA INTERLOCUTORA ESCRITORIO ESTRUCTURA NEGRA PLAS: ESPALDA Y ASIENTO: EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. ESTRUCTURA: METÁLICA EN TUBO RECTANGULAR 30X15 CON AMARRES EN EL ASIENTO EN TUBO REDONDO 5/8 CALIBRE 18. RECUBRIMIENTO: PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA. TAPONES: ELÍPTICOS PLÁSTICOS NEGROS. MEDIDAS 82.5cmx42.5cmx47.5cm	UNIDAD	2					X					
1.15	LOCKER METÁLICO 9 PUESTOS AZUL DE 180X93X30 CM: LOCKER CON MÓDULOS DE DIFERENTES NÚMEROS DE CASILLAS DE UN CUERPO Y VARIOS COMPARTIMIENTOS VERTICALES CON PUERTAS Y SEGUROS PARA CANDADO. ZAPATERA Y MANIJAS PLÁSTICAS EN POLIPROPILENO. LAS PUERTAS DEL LOCKER POSEE CELOSÍAS QUE PERMITEN LA CIRCULACIÓN DE AIRE, SUPERFICIE TERMINADA COMPLETAMENTE LISA, SISTEMA DE SEGURIDAD SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE USO. EL LOCKER ESTÁ APOYADO SOBRE SISTEMA RÍGIDO, BISAGRAS DESARMABLES ÚNICAMENTE CON LA PUERTA ABIERTA.	UNIDAD	1					X					
1.16	COMPUTADOR DE ESCRITORIO, DISCO DURO 1 TB, DDR4 4GB, NO DVD, MONITOR 18,5 E1916HV LINUX (7PF82)	UNIDAD	1					X					
1.17	IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIÓN: IMPRIME, ESCANEA Y HACE COPIAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: INYECCIÓN DE TINTA. TIENE ENTRADA USB. CUENTA CON 2 BANDEJAS. CAPACIDAD MÁXIMA DE 130 HOJAS. SOPORTA PAPEL TAMAÑO A4, OFICIO, OFICIO MÉXICO, OFICIO 9, FOLIO, EJECUTIVO, MEDIA CARTA, A6, CARTA, FOTO 10 X 15 CM, SOBRE N10, 215.9 X 1.200 MM, FOTO 13 X 18 CM, FOTO 16:9, SOBRE PERSONALIZADO (54 X 86 MM - 215.9 X 1.200 MM). INCLUYE ACCESORIOS. PRÁCTICA Y FUNCIONAL TANTO PARA USO PERSONAL COMO PROFESIONAL	UNIDAD	1					X					
COMPONENTE 2. APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA													
2,1	REFINADOR DE PIEDRAS A MÁQUINA, CAPACIDAD DE 120 KG BACHE, POTENCIA INSTALADA: 3,5 KW	UNIDAD	1						X				
2,2	ELEVADOR DE CANGILONES DE 3 MTRS	UNIDAD	1						X				

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	UNID.	CANT.	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
2,3	PLANTA ELÉCTRICA DIÉSEL CABINADA: POTENCIA STAND BY 25KVA, POTENCIA PRIME 22KVA, POTENCIA NOMINAL 20KW HASTA 1000, FACTOR DE POTENCIA 0.8, CORRIENTE NOMINAL 164A/82A/47.5A, NÚMERO DE FASES 3 FRECUENCIA NOMINAL 60HZ, POTENCIA MÁXIMA DEL MOTOR 35hp, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO (12 VOLTIOS), CAPACIDAD DE ACEITE EN EL CARTER 8L, CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 50L, PESO NETO 680Kg Y PESO BRUTO 700Kg. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: VOLTÍMETRO, AMPERIMETRO, FRECUENCÍMETRO Y HORÓMETRO.	UNIDAD	1						X				
2,4	MOLDE EN POLICARBONATO PARA CHOCOLATE DE MESA 180GR: UNA BARRA POR 180 GRAMOS (250 CC) APROX. CON 10 DIVISIONES. BRILLO PERFECTO Y UNIFORMIDAD EN TUS PRODUCTOS	UNIDAD	300						X				
2,5	BÁSCULA PLEGABLE 300 KILOS ACERO INOXIDABLE: BRAZO DE DOBLAR ES IDEAL PARA SU TRABAJO Y TRANSPORTE. INDICADOR EN ACERO INOXIDABLE. CAPA ANTIDESLIZANTE. MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL. TECLADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO PULSADOR. TECLAS CON TONO AL OPRIMIR. INDICADOR LED ROJO AJUSTABLE A 3 TONOS DE BRILLO. PATAS AJUSTABLES NIVELADORAS. INCLUYE ADAPTADOR 6V. CELDA CON PROTECTOR FLUIDOS Y HUMEDAD. IDEAL PARA CUARTOS FRÍOS O MANEJO DE LÍQUIDOS. CON BANDEJA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE RESISTENTE AL TRABAJO COTIDIANO Y COMERCIAL, CON UN ANCHO DE 40CM X UN LARGO DE 50CM	UNIDAD	2						X				
2,6	BANDA TRANSPORTADORA DE 5 METROS: ESTRUCTURA Y BASE EN ACERO INOX. SUMINISTRO DE CORRIENTE 110 VOL. AC. 60 HZ. BANDA EN LONA TIPO SIN FIN, VULCANIZADA SIN FIN COLOR BLANCO, ANCHO DE LA BANDA TRANSPORTADORA 30 CMS, LARGO DE LA BANDA TRANSPORTADORA 5 MTRS, DOS GUÍAS AL COMIENZO DE LA BANDA CON ANCHO Y ALTURA VARIABLE PARA COLOCAR EL PRODUCTO. ALTURA DE TRABAJO 90 CMS. VELOCIDAD DE TRANSPORTE VARIABLE DE 3 A 6 MTRS/MIN. RODACHINAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, Y SISTEMA DE FRENO A LAS MISMAS, PESO MÁXIMO DE TRANSPORTE 15 KG. PESO APROX. DE TODO EL CONJUNTO 90 KG.	UNIDAD	1						X				
2,7	TÚNEL DE ENFRIAMIENTO DE CHOCOLATE SS DE ALTO RENDIMIENTO DE 280MM DE ANCHO; FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO, GRADO AUTOMATICO SEMIAUTOMÁTICO, APLICACIÓN CARAMELO – CHOCOLATE LONGITUD 4.2 M. ANCHO DEL CINTURÓN 280MM.	UNIDAD	1						X				
2,8	MÁQUINA AUTOMÁTICA DE MOLDEO DE CHOCOLATE DE LA MÁQUINA DEL DEPOSITANTE DE LA BARRA DE CHOCOLATE DE UN TIRO. COMPONENTES PRINCIPALES PLC, MOTOR, COJINETE, CAJA DE CAMBIOS, MOTOR, RECIPIENTE A PRESIÓN. ESTA MÁQUINA DEPOSITADORA DE CHOCOLATE TOTALMENTE AUTOMÁTICA CON SERVOCONTROL ESTÁ EQUIPADA CON UN SERVOMOTOR DE MARCA INTERNACIONAL Y ESTÁ CONTROLADA POR UN SISTEMA PLC. ESTA MÁQUINA DEPOSITADORA PUEDE FABRICAR TIPOS DE PRODUCTOS DE CHOCOLATE, COMO CHOCOLATE ESFÉRICO, CHOCOLATE CON TROZOS, CHOCOLATE PARA SÁNDWICH, CHOCOLATE CON GOTAS DE AGUA, ETC.	UNIDAD	1						X				
2,9	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LICOR DE CHOCOLATE: EQUIPADO CON TEMPERATURA NOMINAL (TEMPERATURA AJUSTABLE) SE UTILIZA PARA ALMACENAR EL BIEN MOLIDO PASTA DE CHOCOLATE A TRAVÉS DE AGITACIÓN PARA CUMPLIR CON DESGASIFICACIÓN DE DESODORIZACIÓN DE 500 LTR	UNIDAD	1						X				
COMPONENTE 3. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EMPRESARIAL													
3.1	ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL Y SEGUIMIENTO AL FORTALECIMIENTO	MES	4					X	X	X	X		

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	UNID.	CANT.	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
	ENTREGADO A LA ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPESINA JOSÉ ANTONIO GALÁN ZORRO Y COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA.												
3.2	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO OPERATIVO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPESINA JOSÉ ANTONIO GALÁN ZORRO.	MES	4					X	X	X	X		
3.3	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO OPERATIVO DE LA COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA.	MES	4					X	X	X	X		
COMPONENTE 4. INTERVENTORÍA EXTERNA													
4.1	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	MES	4					X	X	X	X		
COMPONENTE 5. APOYO A LA SUPERVISION													
5.1	ASISTENCIA PROFESIONAL COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO, A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ACTIVIDADES TÉCNICAS EN CAMPO, EN LOS MUNICIPIOS DE, ARAUQUITA, SARAVENA	MES	6					X	X	X	X	X	X
5.2	APOYO LOGÍSTICO, DESPLAZAMIENTO EN CAMPO COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO AL ÁREA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ACTIVIDADES TÉCNICAS EN CAMPO, EN LOS MUNICIPIOS DE, ARAUQUITA, SARAVENA.	MES	4					X	X	X	X		
LIQUIDACIÓN Y CIERRE FINANCIERO												X	X

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO

3.1 PROCESO PRECONTRACTUALES

El Departamento de Arauca llevó a cabo los procesos de selección de los contratistas para la ejecución del contrato principal, interventoría y apoyo a la supervisión, en cumplimiento con los aspectos técnicos estipulados en el proyecto aprobado mediante el Acuerdo No. 950 del 30/10/2023, código BPIN 2023005810187.

La Administración departamental del Departamento de Arauca, mediante la Resolución No. 3930 del 06/12/2023, inició el proceso de **Licitación Pública LP-07-06-2023** y lo publicó en su página web. Esta acción se basó en el estudio previo realizado por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Sostenible, que identificó la necesidad de ejecutar el contrato para "APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA". El valor del contrato asciende a MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS ($1.399.431.000,00), financiado con recursos del bienio 2023-2024, respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal SPGR No. 29123 y SGR202324-00366 del 15/11/2023.

Igualmente, a través de la Resolución No. 4675 del 29/12/2023, la Administración Departamental autorizó el proceso de Concurso de Méritos No. **CM-07-04-2023**, destinado a la "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA". El valor de este concurso es de SETENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($70.686.000,00), y los recursos están respaldados por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal SPGR No. 29223 y SGR202324-00367 del 15/11/2023, provenientes de la asignación para la inversión regional del bienio 2023-2024.

Por otra parte, mediante el proceso de Contratación Directa **CD-07-41-2023**, se inició el proceso para la vinculación de un profesional para llevar a cabo la "ASISTENCIA PROFESIONAL COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ACTIVIDADES TÉCNICAS EN CAMPO EN LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA". El valor de este contrato fue de VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L ($28.800.000,00), y fue respaldado mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal SPGR No. 29423 y SGR202324-00369 del 15/11/2023.

3.2 CELEBRACION CONTRATOS DEL PROYECTO

De los procesos precontractuales mencionados en el numeral anterior, surgieron los siguientes contratos:

3.2.1 LICITACIÓN PÚBLICA LP-07-06-2023

El 27 de diciembre de 2023, mediante la Resolución No. 4587, la Administración Departamental adjudicó el contrato resultante de la Licitación Pública LP-07-06-2023 al **CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL**, identificado con Nit. 901.784.517-8, integrado por: INGCONSU GROUP SAS Nit. 901503327-0, representante legal el señor Kevin Eduardo Rojas Quiroga, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.075.666.622 de Zipaquira, con una

participación del 45% y FENIBAL ANDRES ZULUAGA QUINTERO, número de identificación 80.094.351 de Bogotá con el 55% de participación, quienes otorgaron la representación a la señora **YARLE PATRICIA CÁRDENAS LIDUEÑEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.116.792.298 de Arauca. Tras completar las evaluaciones correspondientes, se confirmó que el consorcio cumplía con todos los requisitos financieros, técnicos y jurídicos, logrando un puntaje total de 74.75 puntos. La audiencia de adjudicación se llevó a cabo tanto en las instalaciones de la Gerencia de Contratación como a través de la plataforma Meet. El valor acordado para la oferta económica fue de **MIL TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS ($1.390.000.000,00)**. Posteriormente, se generó en el SECOP el contrato electrónico **No. CO1.PCCNTR.5696480**, identificado con el **contrato de prestación de servicios No. 627 de 2023**, con un plazo contractual establecido de **4 meses** y se respaldaron con los Registros Presupuestales SPGR 29223 y SGR202324-00358 del 28/12/2023.

3.2.2 CONCURSO DE MÉRITOS CM-07-04-2023

El 23 de enero de 2024, según la Resolución 107 de 2024, la Administración Departamental adjudicó el contrato derivado del proceso del Concurso de Méritos CM-07-04-2023 a la entidad **CORPORACIÓN POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA "COAMDESOR"**, identificada con NIT 900199755-1, representada jurídicamente por **JULIE ANDREA PÉREZ VILLAMIL**, identificada con C.C. No. 37.391.228 de Cúcuta, por un valor de **SETENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($70.686.000,00)**. En continuidad con el proceso, se registró en el SECOP el contrato electrónico **No. CO1.PCCNTR.5696011**, bajo el número de contrato de consultoría (interventoría técnica) **No. 001-2024**, con un plazo de ejecución de **4 meses** y respaldado con el Registro Presupuestal SPGR 824 y SGR202324-00378 del 14/02/2024.

3.2.3 CONTRATACIÓN DIRECTA CD-07-41-2023

El 23 de enero de 2024, según el contrato electrónico CO1.PCCNTR.5688823, la Administración Departamental adjudicó el contrato resultante del proceso de contratación directa a la profesional **SANDRA LILIANA FRANCO COLLAZOS**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 60.331.206 de Cúcuta. El contrato de prestación de servicios No. 619 de 2023 fue por un valor de **VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L ($28.800.000,00)**, con un plazo de ejecución de **6 meses** y respaldado con los Registros Presupuestales SPGR 29023, SGR202324-00356, SPGR29123, SGR202324-00357 del 28/12/2023.

4. EJECUCIÓN DEL PROYECTO SEGÚN LOS TÉRMINOS DE CADA CONTRATO

4.1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 627 DE 2024- CO1.PCCNTR.5696480

4.1.1 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE ARAUCA
INTERVENTOR EXTERNO:	CORPORACION POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA (COAMDESOR)
NIT:	900199755-1
SUPERVISOR:	FRANCISCO JAVIER MENDOZA NIÑO
CONTRATO No:	627
OBJETO DEL CONTRATO:	APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA:	CONSORCIO TRANFORMACION AGROINDUSTRIAL R/ YARLE PATRICIA CARDENAS LIDUEÑEZ
NIT:	901784517-8
VALOR DEL CONTRATO:	$ 1.390.000.000,00
PLAZO CONTRACTUAL:	4 MESES
VALOR DEL ANTICIPO 50%:	$695.000.000,00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	SGR202324-00366 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 POR $1.399.431.000,00, FUENTE DE FINANCIACIÓN ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS-SSF-BIENIO 2023-2024.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	SGR202324-00358 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 POR $1.390.000.000,00, FUENTE DE FINANCIACIÓN ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS-SSF-BIENIO 2023-2024.
FECHA INICIO:	20 DE MARZO /2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	20 DE JULIO /2024
FECHA DE SUSPENSION No. 1:	06 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE PRORROGA No. 1 DE LA SUSPENSION No. 1:	06 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE PRORROGA No. 2 DE LA SUSPENSION No. 1:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO No. 1:	04 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA NUEVA TERMINACIÓN	18 DE NOVIEMBRE DE 2024
PERIODO DEL INFORME	
FECHA DE CORTE DEL INFORME:	DESDE EL VEINTINUEVE (29) DE OCTUBRE AL DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE 2024.

GARANTIAS DEL CONTRATO

☑ Pólizas de legalización

Las pólizas iniciales fueron expedidas el 27 de diciembre de 2023 por la Compañía de Seguros **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**, tomadas por el **CONSORCIO TRANFORMACION AGROINDUSTRIAL R/ YARLE PATRICIA CARDENAS LIDUEÑEZ** y como beneficiario el Departamento de Arauca. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Gerencia Técnica de Contratación Administrativa, mediante certificación firmada por la Gerente de Contratación **LUPITA GRANADOS CHAPARRO** el día 28 de diciembre de 2023.

Pólizas iniciales del Contrato de Prestación de Servicios No. 627 de 2023: Compañía de Seguros – **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** Póliza No. **475-47-994000063661 - ANEXO 0**

GARANTÍA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	27/12/2023	27/10/2024	$278.000.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	27/12/2023	27/04/2025	$278.000.000,00
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/12/2023	27/04/2027	$208.500.000,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	27/12/2023	27/10/2024	$695.000.000,00
CALIDAD DE LOS BIENES	27/12/2023	27/10/2024	$139.000.000,00

La **Póliza No 475-74-994000011044 Anexo 1** de fecha 27 de diciembre de 2023 que garantiza la responsabilidad civil extracontractual del Contrato de Prestación de Servicios No 627 de 2024, fue aprobada para efectos de legalización con vigencia desde el 27 de diciembre de 2023 hasta el día 28 de abril de 2024.

☑ **Pólizas actualizadas, según Acta de Inicio**

La **Póliza No. 475-47-994000063661** fue actualizada, según acta de inicio de fecha 20/03/2024, mediante el Anexo 1 expedido por la Compañía de Seguros **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** el día 21 de marzo de 2024. Dicha Póliza fue aprobada por la Gerencia Técnica de Contratación Administrativa, mediante certificación firmada por el Gerente de Contratación **LUZ LILIANA MARCHENA PINZON** el 11 de abril de 2024, quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera:

Póliza No. 475-47-994000063661 Compañía de Seguros ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - ANEXO 1

GARANTÍA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	20/03/2024	20/01/2025	$278.000.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	20/03/2024	21/01/2025	$278.000.000,00
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/03/2024	21/07/2027	$208.500.000,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	20/03/2024	20/01/2025	$695.000.000,00
CALIDAD DE LOS BIENES	20/03/2024	20/01/2025	$139.000.000,00

La **Póliza No 475-74-994000011044 Anexo 1** de fecha 21 de marzo de 2024 que garantiza la responsabilidad civil extracontractual del Contrato de Prestación de Servicios No 627 de 2024, la cual fue ajustada según acta de inicio de fecha 20 de marzo de 2024 con vigencia desde el 28 de abril de 2024 hasta el día 22 de julio de 2024.

☑ **Pólizas actualizadas, según acta de Suspensión No.1, prorroga No. 1 y 2 y Reinicio No. 1.**

La **Póliza No. 475-47-994000063661** fue actualizada, según acta de Suspensión No. 1, prorroga No. 1 y 2 a la suspensión No.1 y Reinicio No.1 mediante el Anexo 2 expedido por la Compañía de Seguros **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** el día 07/10/2024. Dicha Póliza fue aprobada por la Gerencia Técnica de Contratación Administrativa, mediante certificación firmada por el Gerente de Contratación **LUZ LILIANA MARCHENA PINZON** el 28/10/2024, quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera:

Póliza No. 475-47-994000063661 Compañía de Seguros ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - ANEXO 2

GARANTÍA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	20/03/2024	22/05/2025	$278.000.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	20/03/2024	20/11/2025	$278.000.000,00
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/03/2024	20/11/2027	$208.500.000,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	20/03/2024	22/05/2025	$695.000.000,00
CALIDAD DE LOS BIENES	20/03/2024	20/01/2025	$139.000.000,00

La **Póliza No 475-74-994000011044 Anexo 2** de fecha 07 de octubre de 2024 que garantiza la responsabilidad civil extracontractual del Contrato de Prestación de Servicios No 627 de 2024, la cual fue ajustada según acta de inicio de fecha 20 de marzo de 2024 con vigencia desde el 22 de abril de 2024 hasta el día 21 de noviembre de 2024.

PLAZO CONTRACTUAL

El proyecto, inicialmente planificado para finalizar en cuatro meses, experimentó varias modificaciones en su cronograma debido a la necesidad de realizar mejoras locativas en las instalaciones, solicitadas por las asociaciones. Estas modificaciones obligaron a suspender las actividades en tres ocasiones durante un mes cada una, siendo la última suspensión el 6 de septiembre de 2024. A pesar de estos inconvenientes, gracias a un seguimiento riguroso y a la autorización de la interventoría, se logró reanudar las actividades el 4 de octubre de 2024 y cumplir con los objetivos del proyecto.

A pesar de estos desafíos, se logró adaptar el cronograma y completar el proyecto con éxito. Esta experiencia permitió identificar la importancia de contar con márgenes de tiempo adicionales para imprevistos y la necesidad de establecer mecanismos de comunicación más eficientes con las partes involucradas.

ACTOS ADMINISTRATIVOS

Durante la ejecución del Contrato hasta la fecha del presente informe, se han formalizado los siguientes actos administrativos:

Actos Administrativos Contrato de Prestación de Servicios No. 627 de 2023

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
27/12/2023	Contrato	Suscripción del contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023	WILINTON RODRÍGUEZ BENAVIDEZ GOBRNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA YARLE PATRICIA CÁRDENAS LIDUEÑEZ
06/06/2024	Acta de Suspensión No. 1	El Consorcio Transformación Agroindustrial, a través de la comunicación radicada bajo el número CTA.627/23_28052024 del 28 de mayo de 2024, presentó una solicitud en representación de los beneficiarios del proyecto, motivada por la necesidad de adelantar los arreglos de infraestructura física comprometidos para garantizar el adecuado uso y funcionamiento de los equipos industriales que serán entregados. Mediante el Acta No. 7 del Comité Técnico, las partes acordaron aprobar la suspensión solicitada, considerando los requerimientos planteados por el consorcio. Esta decisión tiene como objetivo facilitar la ejecución de los arreglos necesarios y asegurar las condiciones óptimas para el uso de los equipos industriales.	CARLOS OCTAVIO SARMIENTO G. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE JULIE ANDREA PEREZ VILLAMIL R/L COAMDESOR YARLE PATRICIA CARDENAS L. R/ CONSORCIO TRANSFORMACION AGROINDUSTRIAL

06/08/2024	Acta Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 1	El 26 de julio, se realizó un comité técnico con la participación del Consorcio Transformación Agroindustrial, la interventoría COAMDESOR, y los representantes de ASONALCA y la Cooperativa Procesadora de Cacao La Delicia. Se revisaron las condiciones para reiniciar el contrato, enfocándose en la coordinación de fichas técnicas de los equipos y la adecuación de áreas de instalación para asegurar el óptimo funcionamiento de estos. Se resaltaron los avances en el acompañamiento técnico para mejorar la operatividad y productividad de las organizaciones beneficiarias, con énfasis en la instalación y uso de nueva maquinaria. Esto incluye estandarización de procesos, ajustes en tiempos de producción, y capacitación al personal para una transición eficiente hacia los nuevos equipos. Además, se enfatizó la importancia del acompañamiento durante la instalación para resolver dudas y garantizar el correcto uso de la maquinaria, contribuyendo a una operación eficiente y prolongada. La representante del consorcio, Yarle Patricia Cárdenas, confirmó la fabricación y disponibilidad de los equipos. A su vez, ASONALCA y la Cooperativa La Delicia reportaron avances en la infraestructura eléctrica, contando con el apoyo de la empresa de energía ENELAR y el respaldo técnico del consorcio. Sin embargo, solicitaron una extensión de dos meses para completar las adecuaciones necesarias antes de la puesta en marcha de los equipos.	CARLOS OCTAVIO SARMIENTO G. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE JULIE ANDREA PEREZ VILLAMIL R/L COAMDESOR YARLE PATRICIA CARDENAS L. R/ CONSORCIO TRANSFORMACION AGROINDUSTRIAL
06/09/2024	Acta Prórroga No. 2 a la Suspensión No. 1	El 6 de septiembre de 2024, se reunieron representantes de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Sostenible, COAMDESOR, y el Consorcio Transformación Agroindustrial para firmar el Acta de Prórroga No. 2 a la Suspensión No. 1 del contrato en curso. Este ajuste responde a la necesidad de completar las adecuaciones de infraestructura y eléctricas en las instalaciones de la Cooperativa Procesadora de Cacao La Delicia y la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro. A la fecha, ambas entidades han avanzado en el proceso de instalación de equipos y ajustes locativos necesarios, pero aún quedan pendientes algunas tareas clave para garantizar el correcto funcionamiento de la maquinaria en sus respectivos espacios. Durante el encuentro, se detallaron los progresos alcanzados, incluyendo la adecuación de instalaciones eléctricas y la adquisición de materiales, aunque ciertos retrasos surgieron debido a la logística de envío de suministros. La representante del consorcio, Yarle Patricia Cárdenas, solicitó formalmente una prórroga de un mes para que ambas organizaciones culminen las adecuaciones requeridas. La interventoría apoyó esta solicitud tras considerar que la extensión permitirá la finalización completa de los ajustes y garantizará que los equipos estén listos para operar según los objetivos del proyecto.	CARLOS OCTAVIO SARMIENTO G. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE JULIE ANDREA PEREZ VILLAMIL R/L COAMDESOR YARLE PATRICIA CARDENAS L. R/ CONSORCIO TRANSFORMACION AGROINDUSTRIAL
04/10/2024	Acta de reinicio No. 1	Se superan los motivos que mantenían suspendidas las actividades del proyecto.	CARLOS OCTAVIO SARMIENTO G. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE JULIE ANDREA PEREZ VILLAMIL R/L COAMDESOR YARLE PATRICIA CARDENAS L. R/ CONSORCIO TRANSFORMACION AGROINDUSTRIAL
18/11/2024	Acta de Recibo Final	Suscripción del Acta dado que se ha confirmado el cumplimiento de todos los requisitos acordados sin quedar pendientes por parte del contratista.	CARLOS OCTAVIO SARMIENTO G. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE JULIE ANDREA PEREZ VILLAMIL R/L COAMDESOR YARLE PATRICIA CARDENAS L. R/ CONSORCIO TRANSFORMACION AGROINDUSTRIAL

VINCULACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

Según el informe de la interventoría externa, manifiesta que el contratista ha cumplido satisfactoriamente con la vinculación del personal necesario para ejecutar y desarrollar los componentes y actividades requeridas dentro del alcance del proyecto. La interventoría externa certifica que se realizaron las verificaciones correspondientes y que el contratista ha efectuado puntualmente el pago mensual de los aportes a salud, pensión, riesgos laborales, de acuerdo con las planillas de pago presentadas en los informes del contrato principal.

☑ Personal vinculado

El equipo técnico y profesional asignado al proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios No. 627 de 2023, ha mantenido una composición estable durante el periodo evaluado. Dicho equipo, liderado por la señora Yarle Patricia Cárdenas Lidueñez en representación del CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL, ha sido el responsable de ejecutar las actividades contempladas en el contrato, garantizando así el cumplimiento de los objetivos planteados.

DATOS GENERALES					
No.	**PRIMER APELLIDO**	**SEGUNDO APELLIDO**	**NOMBRES**	**CC**	**CARGO**
1	CÁRDENAS	LIDUEÑEZ	YARLE PATRICIA	1.116.792.298	REPRESENTANTE
2	LÓPEZ	MORENO	RENAN	17.588.795	DIRECTOR DEL PROYECTO
3	CORTES	GÓMEZ	LUZ YANNID	68.293.453	PROFESIONAL EN COMERCIO ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
4	CASTRO	VERA	GABRIEL ALONSO	1.098.611.653	INGENIERO DE ALIMENTOS ESPECIALISTA EN GERENCIA ESTRATEGICA DE PROYECTOS
5	ROBIN	RODIL	JULIO ENRIQUE	17.588.787	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS ESPECIALISTA EN GERENCIA DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

De acuerdo con los registros revisados por la interventoría, el consorcio ha cumplido a cabalidad con los aportes a la seguridad social correspondientes, así como los profesionales vinculados al proyecto durante el periodo contemplado en el presente informe, tal como se evidencia en las planillas y certificados de pago presentados.

Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627de 2023:

MARZO 2024										
DATOS GENERALES						AFILIADO A				
No.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALUD	PENSIÓN	CCF	RIESGO	No PLANILLA
1	CÁRDENAS	LIDUEÑEZ	YARLE PATRICIA	1.116.792 298	REPRESENTANTE	SANITAS S.A	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	9465565655
2	LÓPEZ	MORENO	RENAN	17.588.795	COORDINADOR DEL PROYECTO	SANITAS S.A	PORVENIR	COMFIAR	POSITIVA	7919210537
3	CORTES	GÓMEZ	LUZ YANNID	68.293.453	ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL.	SANITAS S.A	COLPENSIONES		POSITIVA	7917397982 7936993375
4	CASTRO	VERA	GABRIEL ALONSO	1.098.611.653	ESPECIALISTA EN ALIMENTOS	SANITAS S.A	PORVENIR		SURA	79475752
5	ROBIN	RODIL	JULIO ENRIQUE	17.588.787	ESPECIALISTA EN GERENCIA AGROPECUARIA	SANITAS S.A	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	75621100

ABRIL 2024										
DATOS GENERALE						AFILIADO A				
No.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALUD	PENSIÓN	CCF	RIESGO	No PLANILLA
1	CÁRDENAS	LIDUEÑEZ	YARLE PATRICIA	1.116.792.298	REPRESENTANTE	SANITAS S.A	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	9466977886
2	LÓPEZ	MORENO	RENAN	17.588.795	COORDINADOR DEL PROYECTO	SANITAS S.A	PORVENIR	COMFIAR	POSITIVA	1743396927
3	CORTES	GÓMEZ	LUZ YANNID	68.293.453	ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL.	SANITAS S.A	COLPENSIONES			7923260050
4	CASTRO	VERA	GABRIEL ALONSO	1.098.611.653	ESPECIALISTA EN ALIMENTOS	SANITAS S.A	PORVENIR		SURA	625455518
5	ROBIN	RODIL	JULIO ENRIQUE	17.588.787	ESPECIALISTA EN GERENCIA AGROPECUARIA	SANITAS S.A	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	76332554

MAYO 2024										
DATOS GENERALES						AFILIADO A				
No.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALUD	PENSIÓN	CCF	RIESGO	No PLANILLA
1	CÁRDENAS	LIDUEÑEZ	YARLE PATRICIA	1.116.792.298	REPRESENTANTE	SANITAS S.A	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	9467508774
2	LÓPEZ	MORENO	RENAN	17.588.795	COORDINADOR DEL PROYECTO	SANITAS S.A	PORVENIR	COMFIAR	POSITIVA	7931833515
3	CORTES	GÓMEZ	LUZ YANNID	68.293.453	ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL.	SANITAS S.A	COLPENSIONES		POSITIVA	7925714687
4	CASTRO	VERA	GABRIEL ALONSO	1.098.611.653	ESPECIALISTA EN ALIMENTOS	SANITAS S.A	PORVENIR		SURA	77586154
5	ROBIN	RODIL	JULIO ENRIQUE	17.588.787	ESPECIALISTA EN GERENCIA AGROPECUARIA	SANITAS S.A	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	77167327

JUNIO 2024										
DATOS GENERALES						AFILIADO A				
No.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALUD	PENSIÓN	CCF	RIESGO	No PLANILLA
1	CÁRDENAS	LIDUEÑEZ	YARLE PATRICIA	1.116.792.298	REPRESENTANTE	SANITAS S.A	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	9470020589
2	LÓPEZ	MORENO	RENAN	17.588.795	COORDINADOR DEL PROYECTO	SANITAS S.A	PORVENIR	COMFIAR	POSITIVA	7931838721
3	CORTES	GÓMEZ	LUZ YANNID	68.293.453	ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL.	SANITAS S.A	COLPENSIONES		POSITIVA	7930477235
4	CASTRO	VERA	GABRIEL ALONSO	1.098.611.653	ESPECIALISTA EN ALIMENTOS	SANITAS S.A	PORVENIR		SURA	78334392
5	ROBIN	RODIL	JULIO ENRIQUE	17.588.787	ESPECIALISTA EN GERENCIA AGROPECUARIA	SANITAS S.A	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	77948715

OCTUBRE 2024										
DATOS GENERALES						AFILIADO A				
No.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALUD	PENSIÓN	CCF	RIESGO	No PLANILLA
1	CÁRDENAS	LIDUEÑEZ	YARLE PATRICIA	1.116.792.298	REPRESENTANTE	SANITAS S.A	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	9478751479
2	LÓPEZ	MORENO	RENAN	17.588.795	COORDINADOR DEL PROYECTO	SANITAS S.A	PORVENIR	COMFIAR	POSITIVA	7953262252
3	CORTES	GÓMEZ	LUZ YANNID	68.293.453	ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL.	SANITAS S.A	COLPENSIONES		POSITIVA	7946152395
4	CASTRO	VERA	GABRIEL ALONSO	1.098.611.653	ESPECIALISTA EN ALIMENTOS	SANITAS S.A	PORVENIR		SURA	81202599
5	ROBIN	RODIL	JULIO ENRIQUE	17.588.787	ESPECIALISTA EN GERENCIA AGROPECUARIA	SANITAS S.A	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	81148744

NOVIEMBRE 2024										
DATOS GENERALES						AFILIADO A				
No.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALUD	PENSIÓN	CCF	RIESGO	No PLANILLA
1	CÁRDENAS	LIDUEÑEZ	YARLE PATRICIA	1.116.792.298	REPRESENTANTE	SANITAS S.A	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	9478753189
2	LÓPEZ	MORENO	RENAN	17.588.795	COORDINADOR DEL PROYECTO	SANITAS S.A	PORVENIR	COMFIAR	POSITIVA	7953263003
3	CORTES	GÓMEZ	LUZ YANNID	68.293.453	ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL.	SANITAS S.A	COLPENSIONES		POSITIVA	7950542841
4	CASTRO	VERA	GABRIEL ALONSO	1.098.611.653	ESPECIALISTA EN ALIMENTOS	SANITAS S.A	PORVENIR		SURA	81979850
5	ROBIN	RODIL	JULIO ENRIQUE	17.588.787	ESPECIALISTA EN GERENCIA AGROPECUARIA	SANITAS S.A	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	81983461

AVANCE DEL PLAZO CONTRACTUAL

El plazo contractual a corte del presente informe ha llegado a su fin, y con ello se ha cumplido al 100% con las condiciones contractuales acordadas.

4.1.2 ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO

☑ Condiciones contractuales iniciales

El Contrato de Prestación de Servicios No. 627 de 2023 suscrito entre el Departamento de Arauca y el **CONSORCIO TRANSFORMACION AGROINDUSTRIAL R/ YARLE PATRICIA CARDENAS LIDUEÑEZ** contempla las siguientes actividades a desarrollar dentro del plazo contractual establecido de 4 meses.

Condiciones contractuales iniciales del Contrato

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO IMPUESTOS INCLUIDOS	VALOR TOTAL
COMPONENTE 1. APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPECINA JOSÉ ANTONIO GALÁN ZORRO					
1.1	MANGUERA REFORZADA DE 1" 3 CAPAS ROLLO DE 100MTCALIBRE 80	UNIDAD	10	$ 933.400	$ 9.334.000
1.2	CARRETILLA ANTI-PINCHAZO. TIPO CARRETILLA. MODELO VERSÁTIL, CAPACIDAD DE LEVANTE 5 FT. CARACTERÍSTICAS. CARRETILLA DE TOLVA DE 5 FT, MATERIAL DE LA TOLVA METÁLICA, RIN METÁLICO, RUDA ANTI-PINCHAZO	UNIDAD	10	$ 1.000.000	$ 10.000.000
1.3	BALANZA BASCULA DE 500KG ELÉCTRICA DE PEDESTAL: BALANZA 500KG, MEDIDAS PLATAFORMA 50X60CM APROX. TABLERO DOBLE VISOR COLOR NÚMEROS: ROJO, RECARGABLE 8 A 10 HORAS CONTINUAS, PLEGABLE Y PORTÁTIL INCLUYE: 1. BALANZA PLATAFORMA, 1. INDICADOR, 1. CARGADOR,4 PATAS PARA LA PLATAFORMA	UNIDAD	2	$ 2.445.000	$ 4.890.000
1.4	TRITURADORA DE PIEDRA 2 METROS CÚBICOS HORA: TRITURADORA DE PIEDRA DE 3 TONELADAS HORA CON MOTOR TRIFÁSICO O DIÉSEL, DE 10 CABALLOS NOBSE	UNIDAD	1	$ 95.000.000	$ 95.000.000
1.5	TRITURADORA INDUSTRIAL PARA RESIDUOS SÓLIDOS: PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS CON REVERSIÓN AUTOMÁTICA, CON SISTEMA AVANZADO DE PROTECCIÓN DE RODAMIENTOS: MÚLTIPLES OBSTÁCULOS DE LABERINTO MECÁNICO Y SELLOS CONVENCIONALES, Y ASEGURANDO LA MÁXIMA FIABILIDAD EN LÍNEA, EFICIENCIA DE TRITURACIÓN EN LOS EJES ROTATORIOS DE CONTRAPESO QUE AUMENTEN LA EFICIENCIA DE LA ACCIÓN DE CORTE Y ROTURA, DE SISTEMA DE CONDUCCIÓN ELECTROMECÁNICA DE BAJA VELOCIDAD Y ALTO CON ROBUSTO DISEÑO DE CÁMARA DE CORTE. FUNCIONAMIENTO NO BALÍSTICO Y DE BAJO RUIDO Y NO CREAR POLVO NI PARTÍCULAS VOLADORAS, CON PROTECTORES DE GOLPES GRAVES EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DEL COJÍN, CON CORTADOR DE ALTA ALEACIÓN CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA UNA VIDA EXTRA-LARGA, ANTICORROSIVO Y RESISTENTE AL DESGASTE. RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS NSK, EJES DE CORTE HEXAGONALES DISEÑADOS PARA UNA MAYOR DURABILIDAD, DE 500KG	UNIDAD	1	$ 108.116.000	$ 108.116.000
1.6	CANECA PLÁSTICA DE 55 GALONES CON TAPA Y ARO DE SEGURIDAD: ALTURA 90 CM DIÁMETRO O ANCHO 60 CM MATERIAL: POLIETILENO ORIGINAL DE ALTA DENSIDAD	UNIDAD	38	$ 711.500	$ 27.037.000
1.7	MEDIDOR DE PLANTAS 5 EN 1, TEMPERATURA DE PH DEL SUELO. PROBADOR DE SUELO 5 EN 1: PUEDE MEDIR EL VALOR DE PH DEL SUELO (3,0 A 9,5, 10 NIVELES), INTENSIDAD DE MEDIDOR DE PLANTAS 5 EN 1, TEMPERATURA DE PH DEL SUELO. PROBADOR DE SUELO 5 EN 1: PUEDE MEDIR EL VALOR DE PH DEL SUELO (3,0 A 9,5, 10 NIVELES), INTENSIDAD DE LA LUZ SOLAR (9 NIVELES), HUMEDAD (5 NIVELES), HUMEDAD (20% -99%) Y TEMPERATURA DEL SUELO.	UNIDAD	4	$ 700.000	$ 2.800.000
1.8	ZARANDA CLASIFICADORA 2 Y 3 NIVELES. ZARANDA CLASIFICADORA DE MATERIALES MALLA 100, 50 .05	UNIDAD	1	$ 103.445.000	$ 103.445.000
1.9	CERRADORA DE SACOS Y COSTALES + HILO NUEVA: VOLTAJE: 110V AC, CORRIENTE: 0.73ª, PODER: 90 VOLTIOS FRECUENCIA: 50/60HZ, VELOCIDAD: 1100 RPM, ANCHO MÁXIMO DE LA BOLSA A COSER:: 0.16 PULGADAS (4MM), ESPACIO ENTRE PUNTADAS: 0 27 PULGADAS -0.33 PULGADAS (7-8.5MM), TAMAÑO DE LA MÁQUINA: 14.25 PULGADAS (361 MM) (L) X 9.25 PULGADAS (234 MM) (W) X 12 PULGADAS (304 MM)(H),	UNIDAD	2	$ 1.823.000	$ 3.646.000

	PESO DE LA MÁQUINA: 12 LBS. (5.5 KG), TAMAÑO DE LA CAJA: 16 PULGADAS (406.4 MM)(L) X 11 PULGADAS (279.4 MM)(W) X 13 PULGADAS (330.2 MM)(H). DETALLES TÉCNICOS: 1. COSTURA PUNTO DE CADENA DE HILO ÚNICO 2. RANGO DE PUNTADA (MM) 6.5 (FIJO) 3. REVOLUCIÓN (RPM) 1250 4. AGUJA DN X 1 # 25 5. HILO (VINILÓN, SINTÉTICO O ALGODÓN) 20/6 6. MATERIAL DEL BOLSO QUE SE CERRARÁ EL PAPEL DE KRAFT, PP / PE, PAÑO TEJIDO, ALGODÓN, YUTE DE LA ARPILLERA 7. MOTOR DE ACCIONAMIENTO 90 W 8.FUENTE DE ALIMENTACIÓN 110, 220 O 240 V A.C 9.PESO NETO (KG) 5.9 KG. ACCESORIOS ESTANDAR; AGUJAS DN X 1 # 25 10PCS, HILO DE VINILO EN 20/6 1 ROLLO, ARBUSTOS DEL MOTOR 2PCS, DESTORNILLADOR 1PCS, PINZAS 1PCS, LLAVE HEXAGONAL 1PCS, ENGRASADOR 1PCS				
1.10	GRANULADOR DE FERTILIZANTE ORGÁNICO: PRODUCTIVIDAD HASTA 3.000 KG POR HORA, DIMENSIONES DEL GRANULADOR; LONGUITUD 4.5 METROS, DIÁMETRO 820 MM. FORMA DE PELLETS ESFÉRICA. TAMAÑO DE GRANULOS DE 2 A 8 MM DE DIÁMETRO, CONSUMO 75 KW. FUENTE DE ALIMENTACIÓN 380V	UNIDAD	1	$ 369.000.000	$ 369.000.000
1.11	ESCRITORIO METÁLICO OPERATIVO 73X120X60CM: CARACTERÍSTICAS; 3 FRENTES DE GAVETA EN LÁMINA COL ROLLED CALIBRE 24. TAPA SUPERIOR EN AGLOMERADO DE 25 MM, ENCHAPADO EN FÓRMICA, CON CANTO FORRADO EN BOCEL DE PVC. GAVETA SUPERIOR CON CHAPA. LARGO 60 CENTÍMETROS, ANCHO 73 CM, PROFUNDIDAD 150 CENTÍMETROS ALTO 150 CENTÍMETROS	UNIDAD	1	$ 1.933.300	$ 1.933.300
1.12	ARCHIVADOR 4 GAVETAS METÁLICO. ELABORADO EN LÁMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 22, RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, CORREDERAS INDEPENDIENTES FULL EXTENSIÓN, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA Y CHAPA DE ACCIÓN CON LLAVE. MEDIDAS134X47CMX60CM	UNIDAD	1	$ 3.090.000	$ 3.090.000
1.13	SILLA ESCRITORIO CON BRAZOS Y RESPALDO NEGRA: MATERIAL CUERO SINTÉTICO, ANCHO 65 CENTÍMETROS ALTO 120, MATERIAL ESTRUCTURA METAL, ESPUMA, NYLON, POLIPROPILENO CAPACIDAD (RESISTENCIA - CARGA MÁXIMA) 120 KG GIRA 360 GRADOS, MEDIDAS 124X51X52	UNIDAD	1	$ 2.112.000	$ 2.112.000
1.14	SILLA OFICINA INTERLOCUTORA ESCRITORIO ESTRUCTURA NEGRA PLAS: ESPALDA Y ASIENTO: EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. ESTRUCTURA: METÁLICA EN TUBO RECTANGULAR 30X15 CON AMARRES EN EL ASIENTO EN TUBO REDONDO 5/8 CALIBRE 18. RECUBRIMIENTO: PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA. TAPONES: ELÍPTICOS PLÁSTICOS NEGROS. MEDIDAS 82.5cmx42.5cmx47.5cm	UNIDAD	2	$ 212.000	$ 424.000
1.15	LOCKER METÁLICO 9 PUESTOS AZUL DE 180X93X30 CM: LOCKER CON MÓDULOS DE DIFERENTES NÚMEROS DE CASILLAS DE UN CUERPO Y VARIOS COMPARTIMIENTOS VERTICALES CON PUERTAS Y SEGUROS PARA CANDADO. ZAPATERA Y MANIJAS PLÁSTICAS EN POLIPROPILENO. LAS PUERTAS DEL LOCKER POSEE CELOSÍAS QUE PERMITEN LA CIRCULACIÓN DE AIRE, SUPERFICIE TERMINADA COMPLETAMENTE LISA, SISTEMA DE SEGURIDAD SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE USO. EL LOCKER ESTÁ APOYADO SOBRE SISTEMA RÍGIDO, BISAGRAS DESARMABLES ÚNICAMENTE CON LA PUERTA ABIERTA.	UNIDAD	1	$ 2.780.000	$ 2.780.000
1.16	COMPUTADOR DE ESCRITORIO, DISCO DURO 1 TB, DDR4 4GB, NO DVD, MONITOR 18,5 E1916HV LINUX (7PF82)	UNIDAD	1	$ 5.300.000	$ 5.300.000
1.17	IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIÓN: IMPRIME, ESCANEA Y HACE COPIAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: INYECCIÓN DE TINTA. TIENE ENTRADA USB. CUENTA CON 2 BANDEJAS. CAPACIDAD MÁXIMA DE 130 HOJAS. SOPORTA PAPEL TAMAÑO A4, OFICIO, OFICIO MÉXICO, OFICIO 9, FOLIO, EJECUTIVO, MEDIA CARTA, A6, CARTA, FOTO 10 X 15 CM, SOBRE N10, 215.9 X 1.200 MM, FOTO 13 X 18 CM, FOTO 16:9, SOBRE PERSONALIZADO (54 X 86 MM - 215.9 X 1.200 MM). INCLUYE ACCESORIOS. PRÁCTICA Y FUNCIONAL TANTO PARA USO PERSONAL COMO PROFESIONAL	UNIDAD	1	$ 2.066.700	$ 2.066.700
	SUB TOTAL COMPONENTE 1				**$ 750.974.000**
	COMPONENTE 2. APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA				
2.1	REFINADOR DE PIEDRAS A MÁQUINA, CAPACIDAD DE 120 KG BACHE, POTENCIA INSTALADA: 3,5 KW	UNIDAD	1	$ 74.450.000	$ 74.450.000
2.2	ELEVADOR DE CANGILONES DE 3 MTRS	UNIDAD	1	$ 95.560.000	$ 95.560.000
2.3	PLANTA ELÉCTRICA DIÉSEL CABINADA: POTENCIA STAND BY 25KVA, POTENCIA PRIME 22KVA, POTENCIA NOMINAL 20KW HASTA 1000, FACTOR DE POTENCIA 0.8, CORRIENTE NOMINAL 164A/82A/47.5A, NÚMERO DE FASES 3 FRECUENCIA NOMINAL 60HZ, POTENCIA MÁXIMA DEL MOTOR 35hp, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO (12 VOLTIOS), CAPACIDAD DE ACEITE EN EL CARTER 8L, CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 50L, PESO NETO 680Kg Y PESO BRUTO 700Kg. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: VOLTÍMETRO, AMPERIMETRO, FRECUENCÍMETRO Y HORÓMETRO.	UNIDAD	1	$ 81.112.000	$ 81.112.000
2.4	MOLDE EN POLICARBONATO PARA CHOCOLATE DE MESA 180GR: UNA BARRA POR 180 GRAMOS (250 CC) APROX. CON 10 DIVISIONES. BRILLO PERFECTO Y UNIFORMIDAD EN TUS PRODUCTOS	UNIDAD	300	$ 84.500	$ 25.350.000

2.5	BÁSCULA PLEGABLE 300 KILOS ACERO INOXIDABLE: BRAZO DE DOBLAR ES IDEAL PARA SU TRABAJO Y TRANSPORTE. INDICADOR EN ACERO INOXIDABLE. CAPA ANTIDESLIZANTE. MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL. TECLADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO PULSADOR. TECLAS CON TONO AL OPRIMIR. INDICADOR LED ROJO AJUSTABLE A 3 TONOS DE BRILLO. PATAS AJUSTABLES NIVELADORAS. INCLUYE ADAPTADOR 6V. CELDA CON PROTECTOR FLUIDOS Y HUMEDAD. IDEAL PARA CUARTOS FRÍOS O MANEJO DE LÍQUIDOS. CON BANDEJA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE RESISTENTE AL TRABAJO COTIDIANO Y COMERCIAL, CON UN ANCHO DE 40CM X UN LARGO DE 50CM	UNIDAD	2	$ 1.467.000	$ 2.934.000
2.6	BANDA TRANSPORTADORA DE 5 METROS: ESTRUCTURA Y BASE EN ACERO INOX. SUMINISTRO DE CORRIENTE 110 VOL. AC. 60 HZ. BANDA EN LONA TIPO SIN FIN, VULCANIZADA SIN FIN COLOR BLANCO, ANCHO DE LA BANDA TRANSPORTADORA 30 CMS, LARGO DE LA BANDA TRANSPORTADORA 5 MTRS, DOS GUÍAS AL COMIENZO DE LA BANDA CON ANCHO Y ALTURA VARIABLE PARA COLOCAR EL PRODUCTO. ALTURA DE TRABAJO 90 CMS. VELOCIDAD DE TRANSPORTE VARIABLE DE 3 A 6 MTRS/MIN. RODACHINAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, Y SISTEMA DE FRENO A LAS MISMAS, PESO MÁXIMO DE TRANSPORTE 15 KG. PESO APROX. DE TODO EL CONJUNTO 90 KG. UNIDAD 1 $ 75.903.000,00 $ 75.903.000,00 2,7 TÚNEL DE ENFRIAMIENTO	UNIDAD	1	$ 75.903.000	$ 75.903.000
2.7	TÚNEL DE ENFRIAMIENTO DE CHOCOLATE SS DE ALTO RENDIMIENTO DE 280MM DE ANCHO; FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO, GRADO AUTOMATICO SEMIAUTOMÁTICO, APLICACIÓN CARAMELO – CHOCOLATE LONGITUD 4.2 M. ANCHO DEL CINTURÓN 280MM.	UNIDAD	1	$ 79.667.000	$ 79.667.000
2.8	MÁQUINA AUTOMÁTICA DE MOLDEO DE CHOCOLATE DE LA MÁQUINA DEL DEPOSITANTE DE LA BARRA DE CHOCOLATE DE UN TIRO. COMPONENTES PRINCIPALES PLC, MOTOR, COJINETE, CAJA DE CAMBIOS, MOTOR, RECIPIENTE A PRESIÓN. ESTA MÁQUINA DEPOSITADORA DE CHOCOLATE TOTALMENTE AUTOMÁTICA CON SERVOCONTROL ESTÁ EQUIPADA CON UN SERVOMOTOR DE MARCA INTERNACIONAL Y ESTÁ CONTROLADA POR UN SISTEMA PLC. ESTA MÁQUINA DEPOSITADORA PUEDE FABRICAR TIPOS DE PRODUCTOS DE CHOCOLATE, COMO CHOCOLATE ESFÉRICO, CHOCOLATE CON TROZOS, CHOCOLATE PARA SÁNDWICH, CHOCOLATE CON GOTAS DE AGUA, ETC..	UNIDAD	1	$ 53.050.000	$ 53.050.000
2.9	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LICOR DE CHOCOLATE: EQUIPADO CON TEMPERATURA NOMINAL (TEMPERATURA AJUSTABLE) SE UTILIZA PARA ALMACENAR EL BIEN MOLIDO PASTA DE CHOCOLATE A TRAVÉS DE AGITACIÓN PARA CUMPLIR CON DESGASIFICACIÓN DE DESODORIZACIÓN DE 500 LTR	UNIDAD	1	$ 79.000.000	$ 79.000.000
SUB TOTAL COMPONENTE 2					**$ 567.026.000**
COMPONENTE 3. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EMPRESARIAL					
3.1	ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL Y SEGUIMIENTO AL FORTALECIMIENTO ENTREGADO MEDIANTE UN PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, ECONOMISTA, CONTADOR O PROFESIONES AFINES	MES	4	$ 6.000.000	$ 24.000.000
3.2	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO OPERATIVO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPECINA JOSÉ ANTONIO GALÁN ZORRO MEDIANTE UN PROFESIONAL EN INGENIERIA AGROINDUSTRIAL, AGROINDUSTRIALES Y PROFESIONES AFINES	MES	4	$ 6.000.000	$ 24.000.000
3.3	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO OPERATIVO DE LA COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA EN INGENIERIA AGROINDUSTRIAL, AGROINDUSTRIALES Y PROFESIONES AFINES	MES	4	$ 6.000.000	$ 24.000.000
SUB TOTAL COMPONENTE 3					**$ 72.000.000**
TOTAL					**$ 1.390.000.000**

☑ Análisis de ejecución por ítem

Para el periodo de corte del presente informe, se ejecutaron las siguientes cantidades en los ítems del Contrato de Prestación de Servicios No. 627 de 2023 que se describen a continuación:

CANTIDADES CONTRACTUALES						CANTIDADES EJECUTADAS 04 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE/24		
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO IMPUESTOS INCLUIDOS	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR PARCIAL	%
COMPONENTE 1. APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPESINA JOSÉ ANTONIO GALÁN ZORRO								
1.1	MANGUERA REFORZADA DE 1" 3 CAPAS ROLLO DE 100MTCALIBRE 80	UNIDAD	10	$ 933.400,00	$ 9.334.000,00			
1.2	CARRETILLA ANTI-PINCHAZO.	UNIDAD	10	$ 1.000.000,00	$ 10.000.000,00			
	BALANZA BASCULA DE 500KG	UNIDAD	2	$ 2.445.000,00	$ 4.890.000,00			

1.3	ELÉCTRICA DE PEDESTAL							
1.4	TRITURADORA DE PIEDRA 2 METROS CÚBICOS HORA: TRITURADORA DE PIEDRA DE 3 TONELADAS HORA CON MOTOR TRIFÁSICO O DIÉSEL, DE 10 CABALLOS NOBSE	UNIDAD	1	$ 95.000.000,00	$ 95.000.000,00			
1.5	TRITURADORA INDUSTRIAL PARA RESIDUOS SÓLIDOS	UNIDAD	1	$ 108.116.000,00	$ 108.116.000,00			
1.6	CANECA PLÁSTICA DE 55 GALONES CON TAPA Y ARO DE SEGURIDAD: ALTURA 90 CM DIÁMETRO O ANCHO 60 CM MATERIAL: POLIETILENO ORIGINAL DE ALTA DENSIDAD	UNIDAD	38	$ 711.500,00	$ 27.037.000,00			
1.7	MEDIDOR DE PLANTAS 5 EN 1	UNIDAD	4	$ 700.000,00	$ 2.800.000,00			
1.8	ZARANDA CLASIFICADORA 2 Y 3 NIVELES: ZARANDA CLASIFICADORA DE MATERIALES MALLA 100, 50 .05	UNIDAD	1	$ 103.445.000,00	$ 103.445.000,00			
1.9	CERRADORA DE SACOS Y COSTALES + HILO NUEVA ARPILLERA 7.	UNIDAD	2	$ 1.823.000,00	$ 3.646.000,00			
1.10	GRANULADOR DE FERTILIZANTE ORGÁNICO	UNIDAD	1	$ 369.000.000,00	$ 369.000.000,00			
1.11	ESCRITORIO METÁLICO OPERATIVO 73X120X60CM: CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	1	$ 1.933.300,00	$ 1.933.300,00			
1.12	ARCHIVADOR 4 GAVETAS METÁLICO.	UNIDAD	1	$ 3.090.000,00	$ 3.090.000,00			
1.13	SILLA ESCRITORIO CON BRAZOS Y RESPALDO NEGRA	UNIDAD	1	$ 2.112.000,00	$ 2.112.000,00			
1.14	SILLA OFICINA INTERLOCUTORA ESCRITORIO	UNIDAD	2	$ 212.000,00	$ 424.000,00			
1.15	LOCKER METÁLICO 9 PUESTOS AZUL DE 180X93X30 CM	UNIDAD	1	$2.780.000,00	$ 2.780.000,00			
1.16	COMPUTADOR DE ESCRITORIO, DISCO DURO 1 TB, DDR4 4GB, NO DVD, MONITOR 18,5 E1916HV LINUX (7PF82)	UNIDAD	1	$ 5.300.000,00	$ 5.300.000,00			
1.17	IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIÓN: IMPRIME, ESCANEA Y HACE COPIAS.	UNIDAD	1	$ 2.066.700,00	$ 2.066.700,00			
SUB TOTAL COMPONENTE 1					**$ 750.974.000,00**		**$00,00**	**0.0%**
COMPONENTE 2. APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA								
2,1	REFINADOR DE PIEDRAS A MÁQUINA, CAPACIDAD DE 120 KG BACHE, POTENCIA INSTALADA: 3,5 KW	UNIDAD	1	$ 74.450.000,00	$ 74.450.000,00			
2,2	ELEVADOR DE CANGILONES DE 3 MTRS	UNIDAD	1	$ 95.560.000,00	$ 95.560.000,00			
2,3	PLANTA ELÉCTRICA DIÉSEL CABINADA	UNIDAD	1	$ 81.112.000,00	$ 81.112.000,00			
2,4	MOLDE EN POLICARBONATO PARA CHOCOLATE DE MESA 180GR	UNIDAD	300	$ 84.500,00	$ 25.350.000,00			
2,5	BÁSCULA PLEGABLE 300 KILOS ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	2	$ 1.467.000,00	$ 2.934.000,00			
2,6	BANDA TRANSPORTADORA DE 5 METROS	UNIDAD	1	$ 75.903.000,00	$ 75.903.000,00			
2,7	TÚNEL DE ENFRIAMIENTO DE CHOCOLATE 4.2 M. ANCHO DEL CINTURÓN 280MM.	UNIDAD	1	$ 79.667.000,00	$ 79.667.000,00	1	$ 79.667.000,00	5,31
2,8	MÁQUINA AUTOMÁTICA DE MOLDEO DE CHOCOLATE DE LA MÁQUINA DEL DEPOSITANTE DE LA BARRA DE CHOCOLATE DE UN TIRO.	UNIDAD	1	$ 53.050.000,00	$ 53.050.000,00	1	$ 53.050.000,00	3,54
2,9	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LICOR DE CHOCOLATE:	UNIDAD	1	$ 79.000.000,00	$ 79.000.000,00			
SUB TOTAL COMPONENTE 2					**$ 567.026.000,00**		**$132.717.000,00**	**8.85**
COMPONENTE 3. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EMPRESARIAL								
3.1	ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIALY SEGUIMIENTO AL ORTALECIMIENTO ENTREGADO A LA ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPECINA JOSÉ ANTONIO GALÁN ZORRO Y COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA.	MES	4	$ 6.000.000,00	$ 24.000.000,00	1	$ 4.400.000,00	0.29
3.2	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO OPERATIVO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPESINA JOSÉ ANTONIO GALÁN ZORRO.	MES	4	$ 6.000.000,00	$ 24.000.000,00	1	$ 4.400.000,00	0.29
S	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO OPERATIVO DE LA COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA.	MES	4	$ 6.000.000,00	$ 24.000.000,00	1	$ 4.400.000,00	0.29
SUB TOTAL COMPONENTE 3					**$ 72.000.000,00**		**$13.200.000,00**	**0.87**
VALOR TOTAL					**$ 1.390.000.000,00**	**SUBTOTAL**	**$145.917.000,00**	**9.72**

De acuerdo con el informe de interventoría, el contrato No. 627 de 2023, a la fecha de corte, reporta que el Consorcio Transformación Agroindustrial ha cumplido con el 100% de los componentes estipulados en el mismo.

Asimismo, según el comprobante de ingreso al almacén 2024-00072, fechado el 06 de noviembre de 2024, se confirma el ingreso de los equipos pendientes, correspondientes al Túnel de Enfriamiento de Chocolate (4.2 m de ancho del cinturón de 280 mm) y la Máquina Automática de Moldeo de Chocolate, específicamente la máquina del depositante de la barra de chocolate de un tiro. Dichos equipos, cuyo valor asciende a $132.717.000,00, están debidamente respaldados por la documentación pertinente, incluyendo los comprobantes de ingreso y las constancias de entrega a los beneficiarios.

Comprobante de entrada Almacén No. 2024-00072 ($132.717.000,00)

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Comprobante de Entrada a Almacén No. 2024-00072 - Oficializado

Fecha:2024-11-06

UBICACION

Dependencia: SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Ubicacion: Almacen Departamental
Direccion: Calle 1 N° 11 - 84 B
Codigo DANE: Ciudad: ARAUCA Tel: 8852285
Recibe: 17594187-JESUS ORLANDO SUAVITA CORDERO

ORIGEN

Compromiso: CONTRATO
Tipo Entrada: COMPRA DE ELEMENTOS N° Contrato: 627 Vigencia 2023
Tipo Comprobante: Entrada a Almacen Contratista: NIT - 901784517-CONSORCIO TRANSFORMACION AGROINDUSTRIAL

Concepto:

APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CodigoArticulo	Cantidad	Unidad	ValorUnitario	ValorTotal
1514916505-1	1.00	UNIDAD	79.667.000,00	79.667.000,00

Serial de fabrica:NA

Articulo: TUNEL DE ENFRIAMIENTO DE CHOCOLATE SS DE ALTO RENDIMIENTO DE 280MM DE ANCHO. FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO. GRADO AUTOMATICO SEMIAUTOMÁTICO, APLICACIÓN CARAMELO – CHOCOLATE LONGITUD 4.2 M. ANCHO DEL CINTURÓN 280MM

1514916506-1	1.00	UNIDAD	53.050.000,00	53.050.000,00

Serial de fabrica:NA

Articulo: MÁQUINA AUTOMÁTICA DE MOLDEO DE CHOCOLATE DE LA MÁQUINA DEL DEPOSITANTE DE LA BARRA DE CHOCOLATE DE UN TIRO. COMPONENTES PRINCIPALES PLC, MOTOR, COJINETE, CAJA DE CAMBIOS, MOTOR, RECIPIENTE A PRESIÓN. ESTA MÁQUINA DEPOSITADORA DE CHOCOLATE TOTALMENTE AUTOMÁTICA CON SERVOCONTROL ESTÁ EQUIPADA CON UN SERVOMOTOR DE MARCA INTERNACIONAL Y ESTÁ CONTROLADA POR UN SISTEMA PLC. ESTA MÁQUINA DEPOSITADORA PUEDE FABRICAR TIPOS DE PRODUCTOS DE CHOCOLATE, COMO CHOCOLATE ESFÉRICO, CHOCOLATE CON TROZOS, CHOCOLATE PARA SANDWICH, CHOCOLATE CON GOTAS DE AGUA, ETC.

Total General 132.717.000,00

Grupo	Cantidad	Total x Cuenta
15 - INVENTARIO	2,00	132.717.000,00

Codigo PUC	Nombre	Debito	Credito
1514900003001	Materiales y suministros almacén	132.717.000,00	0,00
2404000003004	Bienes entregados al almacen	0,00	132.717.000,00

NURY INGRID MANOSALVA
CC LLANOS

UBICACION

Dependencia: SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Ubicacion: Almacen Departamental
Direccion: Calle 1 N° 11 - 84 B
Codigo DANE: Ciudad: ARAUCA Tel: 8852285
Recibe: 17594187-JESUS ORLANDO SUAVITA CORDERO

ORIGEN

Compromiso: CONTRATO
Tipo Entrada: COMPRA DE ELEMENTOS N° Contrato: 627 Vigencia 2023
Tipo Comprobante: Entrada a Almacen Contratista: NIT - 901784517-CONSORCIO TRANSFORMACION AGROINDUSTRIAL

Concepto:

APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA


CodigoArticulo	Cantidad	Unidad	ValorUnitario	ValorTotal

Firmas

Almacenista	Contratista	Supervisor / Interventor
JESUS O. SUAVITA	Estiven Cardenas Indaveri	
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
17.594.187	1.116.797.298	37.391.277 Cúcuta
C.C. y Lugar de Expedición	C.C. y Lugar de Expedición	C.C. y Lugar de Expedición

NURY INGRID MANOSALVA
CC LLANOS

Comprobante de baja 2024-00765 COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA (132.717.000,00)

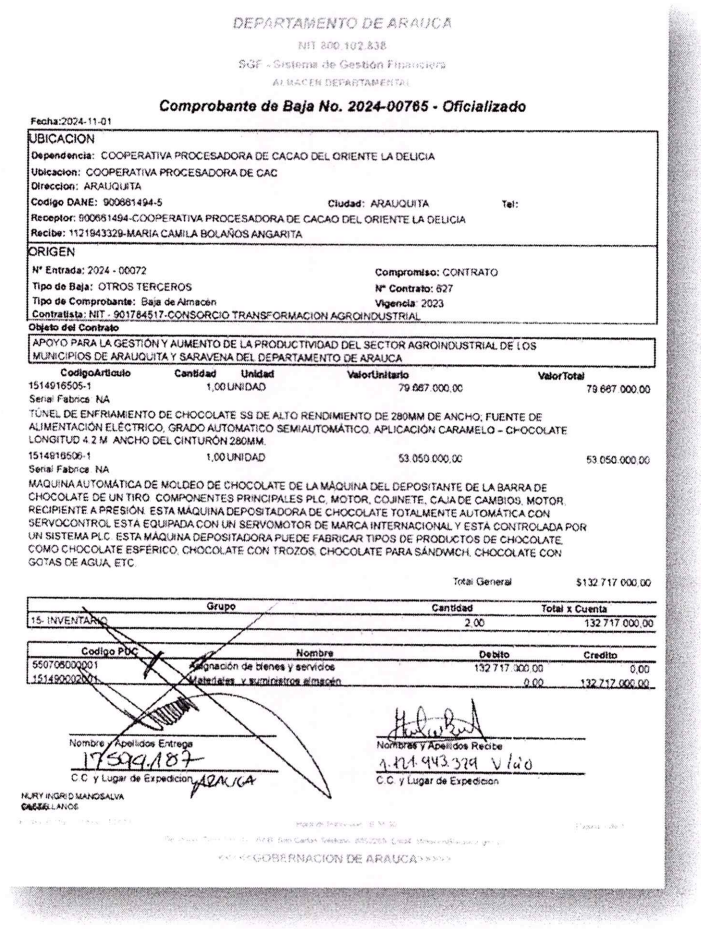

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
NIT 800.102.838
SGF - Sistema de Gestión Financiera
ALMACEN DEPARTAMENTAL

Comprobante de Baja No. 2024-00765 - Oficializado

Fecha:2024-11-01

UBICACION
Dependencia: COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA
Ubicacion: COOPERATIVA PROCESADORA DE CAC
Direccion: ARAUQUITA
Codigo DANE: 900681494-5 **Ciudad:** ARAUQUITA **Tel:**
Receptor: 900681494-COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA
Recibe: 1121943329-MARIA CAMILA BOLAÑOS ANGARITA

ORIGEN
N° Entrada: 2024 - 00072 **Compromiso:** CONTRATO
Tipo de Baja: OTROS TERCEROS **N° Contrato:** 627
Tipo de Comprobante: Baja de Almacén **Vigencia:** 2023
Contratista: NIT - 901784517-CONSORCIO TRANSFORMACION AGROINDUSTRIAL

Objeto del Contrato
APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CodigoArticulo	Cantidad	Unidad	ValorUnitario	ValorTotal
1514916505-1	1,00	UNIDAD	79.667.000,00	79.667.000,00

Serial Fabrica NA
TÚNEL DE ENFRIAMIENTO DE CHOCOLATE SS DE ALTO RENDIMIENTO DE 280MM DE ANCHO; FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO, GRADO AUTOMATICO SEMIAUTOMÁTICO, APLICACIÓN CARAMELO – CHOCOLATE LONGITUD 4.2 M ANCHO DEL CINTURÓN 280MM.

1514916506-1	1,00	UNIDAD	53.050.000,00	53.050.000,00

Serial Fabrica NA
MAQUINA AUTOMÁTICA DE MOLDEO DE CHOCOLATE DE LA MÁQUINA DEL DEPOSITANTE DE LA BARRA DE CHOCOLATE DE UN TIRO COMPONENTES PRINCIPALES PLC, MOTOR, COJINETE, CAJA DE CAMBIOS, MOTOR, RECIPIENTE A PRESIÓN. ESTA MÁQUINA DEPOSITADORA DE CHOCOLATE TOTALMENTE AUTOMÁTICA CON SERVOCONTROL ESTA EQUIPADA CON UN SERVOMOTOR DE MARCA INTERNACIONAL Y ESTÁ CONTROLADA POR UN SISTEMA PLC. ESTA MÁQUINA DEPOSITADORA PUEDE FABRICAR TIPOS DE PRODUCTOS DE CHOCOLATE, COMO CHOCOLATE ESFÉRICO, CHOCOLATE CON TROZOS, CHOCOLATE PARA SÁNDWICH, CHOCOLATE CON GOTAS DE AGUA, ETC.

Total General $132.717.000,00

Grupo	Cantidad	Total x Cuenta
15- INVENTARIO	2,00	132.717.000,00

Codigo PDC	Nombre	Debito	Credito
550706000001	Asignación de bienes y servicios	132.717.000,00	0,00
151490002001	Materiales y suministros almacén	0,00	132.717.000,00

Nombre y Apellidos Entrega
1.759.187
C.C. y Lugar de Expedicion ARAUCA
NURY INGRID MANOSALVA CASTELLANOS

Nombres y Apellidos Recibe
1.121.943.329 V Ldo
C.C. y Lugar de Expedicion

<<< GOBERNACION DE ARAUCA >>>>>

4.1.3 ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO

☑ Manejo del anticipo

De acuerdo con el PARAGRAFO PRIMERO de la Cláusula DECIMA SEPTIMA del Contrato de Prestación de Servicios No. 627 de 2023: FORMA DE PAGO, tenemos que *El Departamento concederá al contratista un anticipo de hasta un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total del contrato, una vez se haya perfeccionado y legalizado, el contrato y se halle aprobada la garantía que lo ampare y se surtan los trámites previos para su reconocimiento y posterior desembolso, dicho valor deberá amortizarse en cada acta parcial tramitada por el mismo porcentaje del que fue entregado. El contratista constituirá fiducia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011.*

VALOR DEL CONTRATO:	$1.390.000.000,00
PORCENTAJE DEL ANTICIPO:	50%
VALOR DEL ANTICIPO:	$ 695.000.000

☑ Apertura del Contrato Fiduciario

De acuerdo con la minuta del contrato y tipo de proceso, el CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL, hizo entrega de la certificación del contrato fiduciario:

ENTIDAD BANCARIA:	Banco De Bogotá
CONTRATO FIDUCIARIO No.	3-1-119139
FECHA DE APERTURA.	26-02-2024
CUENTA BANCARIA No	000219337
TIPO DE CUENTA:	Ahorro
TITULAR:	Fidubogota S.A-C.C.A Fidugob
VALOR DEL ANTICIPO:	$695.000.000,00
FECHA DE CONSIGNACIÓN DEL ANTICIPO:	11/08/2023
VALOR CONSIGNADO A LA FIDUCIA:	$695.000.000,00
VALOR DESEMBOLSADO AL CONTRATISTA:	$666.250.000,00

☑ Plan de inversión del anticipo

A continuación, se relaciona el plan de inversión de anticipo firmado y aprobado la interventoría y el contratista:

DESCRIPCIÓN	% ANTICIPO RECURSOS PROPIOS	VALOR ANTICIPO RECURSOS PROPIOS
COMPONENTE: 1 APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPESINA JOSÉ ANTONIO GALÁN ZORRO	54%	$ 375.487.000,00
COMPONENTE 2: APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA	41%	$ 283.513.000,00
COMPONENTE 3: ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EMPRESARIAL	5%	$ 36.000.000,00
TOTALES	100%	$ 695.000.000,00

El día 29 de abril de 2024, de acuerdo con el Comprobante de egreso No. SGR202324-00731 y la Orden de Pago No. SGR202324-00727, se realizaron las transferencias de recursos al Consorcio Transformación Agroindustrial.

☑ Estado del encargo fiduciario

El CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL conformo el fideicomiso. No. 3-1-119139, que administrará los recursos del anticipo el día 21 de febrero de 2024, por la compañía FIDUBOGOTA S.A- C.C.A. FIDUGOB. Para el periodo del informe ya fueron consignados a la fiducia el anticipo por parte de la gobernación, sin embargo, a la fecha del presente informe se presenta que la interventoría externa ha autorizado cuatro (04) ordenes de operación

Fecha Radicado	No. Orden De Operación	Valor Del Desembolso	Beneficiario	Estado
23/04/2024	1	$ 7.250.000,00	LUZ YANNID CORTEZ GÓMEZ	Aprobada
24/04/2024	2	$ 375.487.000,00	CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL	Aprobada
26/04/2023	3	$ 283.513.000,00	CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL	Aprobada
16/05/2024	4	$ 28.750.000,00	CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL	Aprobada

☑ Acta parcial

Aunque el único desembolso realizado hasta la fecha corresponde al anticipo, para fines de este informe se ha calculado una ejecución financiera provisional del 39.26% basada en un Acta

Parcial No. 1 por valor de $545.722.000,00, contra la cual se ha amortizado un anticipo de $272.861.000,00. Equivalentes a las cantidades ejecutadas acumuladas:

BALANCE A LA FECHA DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO PRINCIPAL	$ 1.390.000.000,00	
VALOR CONTRATO ADICIONAL		
VALOR EJECUTADO ACUMULADO		$ 545.722.000,00
SALDO POR EJECUTAR		$ 844.278.000,00
SUMAS IGUALES	**$ 1.390.000.000,00**	**$ 1.390.000.000,00**

BALANCE DEL ANTICIPO		
VALOR ANTICIPO	$ 695.000.000,00	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO		$ 272.861.000,00
SALDO POR AMORTIZAR		$ 422.139.000,00
SUMAS IGUALES	**$ 695.000.000,00**	**$ 695.000.000,00**

VALOR A CANCELAR	
VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 545.722.000,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA	$ 272.861.000,00
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 272.861.000,00
% DE AVANCE FINANCIERO PRESENTE ACTA	39,26%
% AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	39,26%

ANEXO 1. Informe Contrato de Prestación No 627 de 2023

4.2 CONTRATO DE CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA TÉCNICA) No. 001 DE 2024, CO1.PCCNTR.5696011

4.2.1 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE ARAUCA
SUPERVISOR:	FRANCISCO JAVIER MENDOZA NIÑO Resolución No.762 del 22/03/2024
CONTRATO No:	001
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO "APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
CONTRATISTA:	CORPORACION POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA (COAMDESOR) R/ JULIE ANDREA PEREZ VILLAMIL
NIT.:	900199755-1
VALOR DEL CONTRATO:	$ 70.686.000,00
PLAZO CONTRACTUAL:	4 MESES
VALOR DEL ANTICIPO 40%:	$28.744.400,00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	SGR202324-00367
REGISTRO PRESUPUESTAL:	SGR202324-00378
FECHA INICIO:	20 DE MARZO 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	20 DEJULIO 2024
FECHA DE SUSPENSION No. 1:	06 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE PRORROGA No. 1 DE LA SUSPENSION No. 1:	06 DE AGOSTO DE 2024

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
FECHA DE PRORROGA No. 2 DE LA SUSPENSION No. 1:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO No. 1:	04 DE OCTUBRE DE 2024
SUPERVISOR:	FRANCISCO JAVIER MENDOZA NIÑO
PERIODO DEL INFORME	
FECHA DE CORTE DEL INFORME:	DESDE EL VEINTINUEVE (29) DE OCTUBRE AL DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE 2024
DÍAS TRANSCURRIDOS:	CUATRO (04) MESES

GARANTIAS DEL CONTRATO

☑ Pólizas de Legalización

Las pólizas iniciales fueron expedidas el 01 de febrero de 2024 por la Compañero de Seguros **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**, tomadas por la **CORPORACION POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA (COAMDESOR)** representada por la Ingeniera **JULIE ANDREA PEREZ VILLAMIL** y como beneficiario el Departamento de Arauca. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Gerencia Técnica de Contratación Administrativa, mediante certificación firmada por la Gerente de Contratación **LUZ LILIANA MARCHENA PINZON** el 19 de febrero de 2024.

Pólizas iniciales del Contrato de Consultoría (Interventoría Técnica) No. 001 de 2024: Compañía de Seguros – ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. Póliza No. 475-47-994000064110 - ANEXO 0

GARANTÍA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/02/2024	01/12/2024	$ 17.137.200,00
CALIDAD DEL SERVICIO	01/02/2024	01/06/2025	$ 14.137.200,00
PAGOS DE SALARIOS E INDEMNIZACIONES	01/02/2024	01/06/2027	$ 10.602.900,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	01/02/2024	01/12/2024	$ 28.274.400,00

☑ Pólizas actualizadas según acta de Inicio

La **Póliza No. 475-47-994000064110** fue actualizada, según acta de inicio mediante el Anexo 1 expedido por la Compañía de Seguros **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** el día 21 de marzo de 2024. Dicha Póliza fue aprobada por la Gerencia Técnica de Contratación Administrativa, mediante certificación firmada por el Gerente de Contratación **LUZ LILIANA MARCHENA PINZON** el 02de abril de 2024, quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera:

Póliza No. 475-47-994000063661 Compañía de Seguros ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - ANEXO 1

GARANTÍA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/03/2024	20/02/2025	$ 17.137.200,00
CALIDAD DEL SERVICIO	20/03/2024	20/07/2025	$ 14.137.200,00
PAGOS DE SALARIOS E INDEMNIZACIONES	20/03/2024	20/07/2027	$ 10.602.900,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	20/03/2024	20/02/2025	$ 28.274.400,00

☑ Pólizas actualizadas, según acta de Suspensión No.1, prorroga 1 y 2 a la Suspensión y Reinicio No. 1.

La **Póliza No. 475-47-994000064110** fue actualizada, según acta de Suspensión No. 1, prorroga No. 1 y 2 a la suspensión No.1 y Reinicio No.1 mediante el Anexo 2 expedido por la Compañía de Seguros **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** el día 07/10/2024. Dicha Póliza fue aprobada por la Gerencia Técnica de Contratación Administrativa, mediante certificación firmada por el Gerente de Contratación **LUZ LILIANA MARCHENA PINZON** el 17/10/2024, quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera:

Póliza No. 475-47-994000064110 Compañía de Seguros ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - ANEXO 1

GARANTÍA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/03/2024	22/06/2025	$ 17.137.200,00
CALIDAD DEL SERVICIO	20/03/2024	19/11/2025	$ 14.137.200,00
PAGOS DE SALARIOS E INDEMNIZACIONES	20/03/2024	19/11/2027	$ 10.602.900,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	20/03/2024	22/06/2025	$ 28.274.400,00

PLAZO CONTRACTUAL

El proyecto, originalmente planificado para finalizar en cuatro meses, sufrió modificaciones en su cronograma debido a la necesidad de realizar mejoras locativas solicitadas por las asociaciones, lo que ocasionó tres suspensiones de un mes cada una, siendo la última el 6 de septiembre de 2024. Las actividades se reanudaron el 4 de octubre de 2024 y se logró cumplir con los objetivos. Esta experiencia subrayó la importancia de contar con márgenes de tiempo adicionales para imprevistos y de mejorar la comunicación con todas las partes involucradas.

ACTOS ADMINISTRATIVOS

Durante la ejecución del Contrato hasta la fecha del presente informe, se han formalizado los siguientes actos administrativos:

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
27/12/2023	Contrato	Suscripción del contrato de Consultoría (interventoría técnica) No. 001 de 2024	WILINTON RODRÍGUEZ BENAVIDEZ GOBERNADOR DEPARTAMENTO DE ARAUCA JULIE ANDREA PÉREZ VILLAMIL R/L CORPORACIÓN POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA
20/03/2024	Acta de inicio	Suscripción del acta de inicio del contrato Consultoría (interventoría técnica) No. 001 de 2024	CARLOS OCTAVIO SARMIENTO G. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE JULIE ANDREA PEREZ VILLAMIL R/L COAMDESOR FRANCISCO JAVIER MENDOZA NIÑO SUPERVISOR resolución 627 del 22 de marzo de 2024

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
06/06/2024	Acta de suspensión No. 1	Adecuación de las instalaciones locativas de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro y la cooperativa procesadora de cacao la delicia.	CARLOS OCTAVIO SARMIENTO G. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE JULIE ANDREA PEREZ VILLAMIL R/L COAMDESOR FRANCISCO JAVIER MENDOZA NIÑO SUPERVISOR resolución 627 del 22 de marzo de 2024
06/08/2024	Acta de prorroga No.1 de la suspensión No. 1	Se prorroga la suspensión No. 1 en razón a que a la fecha no han sido superados los motivos que generaron dicha suspensión.	CARLOS OCTAVIO SARMIENTO G. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE JULIE ANDREA PEREZ VILLAMIL R/L COAMDESOR FRANCISCO JAVIER MENDOZA NIÑO SUPERVISOR resolución 627 del 22 de marzo de 2024
06/09/2024	Acta de prorroga No.2 de la suspensión No. 1	En razón a que se mantienen sin superar las condiciones que generaron la suspensión.	CARLOS OCTAVIO SARMIENTO G. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE JULIE ANDREA PEREZ VILLAMIL R/L COAMDESOR FRANCISCO JAVIER MENDOZA NIÑO SUPERVISOR resolución 627 del 22 de marzo de 2024
04/10/2024	Acta de reinicio No. 1	Se superan los motivos que mantenían suspendidas las actividades del proyecto.	CARLOS OCTAVIO SARMIENTO G. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE JULIE ANDREA PEREZ VILLAMIL R/L COAMDESOR FRANCISCO JAVIER MENDOZA NIÑO SUPERVISOR resolución 627 del 22 de marzo de 2024
18/11/2024	Acta de Recibo Final	Formalización y aceptación del contrato confirmando que se ha cumplido con todos los requisitos acordados y que no quedan pendientes por parte del contratista	CARLOS OCTAVIO SARMIENTO G. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE JULIE ANDREA PEREZ VILLAMIL R/L COAMDESOR FRANCISCO JAVIER MENDOZA NIÑO SUPERVISOR resolución 627 del 22 de marzo de 2024

ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO

FECHA	No. DE ACTA DE COMITÉ	TEMAS TRATADOS	PARTICIPANTES DEL COMITÉ
18/04/2024	001	Revisión de especificaciones técnicas del proyecto, socialización de fichas técnicas construidas por contratista y aprobadas por interventoría con las especificaciones detalladas de cada quipo o elementos a comprar para someterlas a revisión de las asociaciones en comités de compras.	Yarle Cárdenas - Julie Pérez - Sandra franco - Francisco Mendoza
19/04/2024	002	Revisión de especificaciones técnicas del proyecto, socialización de fichas técnicas construidas por contratista y aprobadas por interventoría con las especificaciones detalladas de cada quipo o elementos	Yarle Cárdenas - Julie Pérez - Omar Lombana - Sonia López - Joana pinzón - Eleazar Jaimes

FECHA	No. DE ACTA DE COMITÉ	TEMAS TRATADOS	PARTICIPANTES DEL COMITÉ
		a comprar para someterlas a revisión de las asociaciones en comités de compras. Asociaciones solicitan tener en cuenta algunas características adicionales y se da la definición de fechas para desarrollo de comités de compras.	
30/04/2024	003	Visita de verificación de avance en la ejecución de compromisos de socialización de COOPROCOR LA DELICIA LTDA.	Yarle Cárdenas - Sandra franco - Francisco Mendoza – Jorge Giraldo – Gabriel Contreras – Jeferson Laguado – María Camila bolaños – Zulay Núñez.
02/05/2024	004	Visita técnica a la asociación Asonalca, revisión final de información para recolección de información y proceder al proceso de compra	Yarle Cárdenas - Sandra franco - Francisco Mendoza –Dairo Ortiz – Joana Pinzón - Dixon Torres – Eleazar Jaimes – Julie Pérez.
08/05/2024	005	Comité de compras No. 1, donde se aprueba 13 fichas técnicas de la asociación Asonalca y 5 fichas técnicas de Cooprocor, previa revisión y aprobación por la interventoría.	Yarle Cárdenas - Julie Pérez - Sonia López - Joana pinzón – Héctor Martínez – Eduardo Sogamoso.
31/05/2024	006	Comité de compras No. 2, donde se aprueba 4 fichas técnicas de la asociación Asonalca y 4 fichas técnicas de Cooprocor, previa revisión y aprobación por la interventoría.	Yarle Cárdenas – José Ramon Gómez – Jorge Giraldo – Gabriel Contreras – Julie Pérez– Joana pinzón - María Camila bolaños – Zulay Núñez
06/06/2024	007	Comité técnico donde se analizan los inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto, motivos por los cuales se solicita la suspensión del contrato.	Yarle Cárdenas – Julie Andrea Pérez Villamil- francisco Javier Mendoza Niño – Sandra franco– Zulay Núñez.
26/07/2024	008	Verificación de avance en adecuación de infraestructura.	Yarle Cárdenas - Julie Pérez Villamil - Joana pinzón - María Camila bolaños
05/09/2024	009	Comité de verificación de avance en adecuación eléctrica y locativas	Julie Pérez Villamil - Joana pinzón - María Camila bolaños
01/10/2024	010	Comité de verificación de avance en adecuación eléctrica y locativas	Yarle Cárdenas - Julie Pérez Villamil - Joana pinzón - María Camila bolaños

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

La ejecución del contrato de prestación de servicios estuvo acompañada de una intensa actividad documental, evidenciada en la correspondencia intercambiada entre la interventoría, el contratista y el Departamento de Arauca.

- Correspondencia enviada

Fecha	Remitente	Destinatario	Descripción
26/03/2024	COAMDESOR	Consorcio Transformación Agroindustrial	Solicitud De Información
09/04/2024	COAMDESOR	Consorcio Transformación Agroindustrial	Solicitud De Fichas Técnicas
09/04/2024	COAMDESOR	Consorcio Transformación Agroindustrial. Cooprocar La Delicia Ltda. Asonalca	Invitación A Comité Técnico
10/04/2024	COAMDESOR	Consorcio Transformación Agroindustrial COOPROCOR LA DELICIAS ASONALCA Francisco Mendoza – Supervisor	Invitación a comité técnico
16/04/2024	COAMDESOR	Consorcio Transformación Agroindustrial COOPROCOR LA DELICIAS ASONALCA Francisco Mendoza – Supervisor	Reprogramación de comité técnico
03/05/2024	COAMDESOR	Consorcio Transformación Agroindustrial	Solicitud de planillas de pago de seguridad social.
10/05/2024	COAMDESOR	Francisco Mendoza – Supervisor	Entrega de informe de ejecución No. 1
27/05/2024	COAMDESOR	Consorcio Transformación Agroindustrial COOPROCOR LA DELICIAS ASONALCA	Invitación a comité de compras No. 2
29/05/2024	COAMDESOR	Consorcio Transformación Agroindustrial	Solicitud de información

Fecha	Remitente	Destinatario	Descripción
29/05/2024	COAMDESOR	Consorcio Transformación Agroindustrial	Solicitud de suspensión de plazo contractual
30/05/2024	COAMDESOR	Francisco Mendoza – Supervisor	Traslado de solicitud de certificación de equipos.
31/05/2024	COAMDESOR	Francisco Mendoza – Supervisor	Solicitud de comité técnico
17/06/2024	COAMDESOR	Francisco Mendoza – Supervisor	Entrega de plan de choque y reprogramación
10/07/2024	COAMDESOR	Francisco Mendoza – Supervisor	Remisión de informe mensual No. 1 con ajustes solicitados por la supervisión del proyecto.
12/07/2024	COAMDESOR	Francisco Mendoza – Supervisor	Remisión de informe mensual No. 2 con ajustes solicitados por la supervisión del proyecto.
05/09/2024	COAMDESOR	Francisco Mendoza – Supervisor	Traslado de solicitud de prorroga No. 2 a la suspensión No. 1 del plazo contractual.

- Correspondencia Recibida

Fecha	Remitente	Destinatario	Descripción
05/04/2024	CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL	COAMDESOR	Solicitud de información según oficio OFCAG-001-24-26032024
11/04/2024	CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL	COAMDESOR	Según oficio remitido OFCAG-001-24-09042024, Entrega de fichas técnicas para revisión y aprobación
23/04/2024	CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL	COAMDESOR	Solicitud de desembolso 1 y 2
25/04/2024	CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL	COAMDESOR	Solicitud de desembolso 3
15/05/2024	CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL	COAMDESOR	Solicitud de desembolso orden de operación 4 FIDUCIARIO BOGOTÁ
27/05/2024	CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL	COAMDESOR	Solicitud de certificación de cumplimiento de los elementos eléctricos.
28/05/2024	CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL	COAMDESOR	Solicitud de suspensión del plazo contractual
10/07/2024	CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL	COAMDESOR	Entrega de informe No. 1 con sus respectivos anexos.
04/09/2024	CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL	COAMDESOR	Solicitud de prorroga No. 2 de la suspensión No. 2.
30/09/2024	CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL	COAMDESOR	Solicitud de evaluación de condiciones para el reincido del contrato de la referencian y mesa técnica.

VINCULACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

En el periodo comprendido entre marzo y octubre de 2024, la firma contratista ha cumplido cabalmente con sus obligaciones en materia de pagos parafiscales, según lo evidencian los documentos presentados.

☑ Personal vinculado al Contrato

El equipo de trabajo proporcionado por el contratista se ha mantenido estable a lo largo del periodo evaluado.

Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional

MES: MARZO DE 2024											
DATOS GENERALES						AFILIADO A				No PLANILLA	FECHA DE PAGO
No.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALUD	PENSIÓN	CCF	RIESGO		
1	PÉREZ	VILLAMIL	JULIE ANDREA	37.391.228	ING. EN PRODUCCIÓN BIOTECNOLÓGICA	SANITAS S.A	PORVENIR	COMFIAR	POSITIVA	9465431112	09/04/2024
2	NÚÑEZ	CABARCAS	LIDIAN ZULAY	1.116.782.383	COORDINADOR DEL PROYECTO	NUEVA EPS	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	9465456299	09/04/2024

MES: ABRIL DE 2024											
DATOS GENERALES						AFILIADO A				No PLANILLA	FECHA DE PAGO
No.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALUD	PENSIÓN	CCF	RIESGO		
1	PÉREZ	VILLAMIL	JULIE ANDREA	37.391.228	ING. EN PRODUCCIÓN BIOTECNOLÓGICA	SANITAS S.A	PORVENIR	COMFIAR	POSITIVA	9466979067	10/05/2024
2	NÚÑEZ	CABARCAS	LIDIAN ZULAY	1.116.782.383	COORDINADOR DEL PROYECTO	NUEVA EPS	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	9466979067	10/05/2024

MES: MAYO DE 2024											
DATOS GENERALES						AFILIADO A				No PLANILLA	FECHA DE PAGO
No.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALUD	PENSIÓN	CCF	RIESGO		
1	PÉREZ	VILLAMIL	JULIE ANDREA	37.391.228	ING. EN PRODUCCIÓN BIOTECNOLÓGICA	SANITAS S.A	PORVENIR	COMFIAR	POSITIVA	9468346961	12/06/2024
2	NÚÑEZ	CABARCAS	LIDIAN ZULAY	1.116.782.383	COORDINADOR DEL PROYECTO	NUEVA EPS	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	9468346961	12/06/2024

MES: JUNIO DE 2024											
DATOS GENERALES						AFILIADO A				No PLANILLA	FECHA DE PAGO
No.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALUD	PENSIÓN	CCF	RIESGO		
1	PÉREZ	VILLAMIL	JULIE ANDREA	37.391.228	ING. EN PRODUCCIÓN BIOTECNOLÓGICA	SANITAS S.A	PORVENIR	COMFIAR	POSITIVA	9469752711	17/072024
2	NÚÑEZ	CABARCAS	LIDIAN ZULAY	1.116.782.383	COORDINADOR DEL PROYECTO	NUEVA EPS	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	9469752711	17/07/2024

MES: OCTUBRE DE 2024											
DATOS GENERALES						AFILIADO A				No PLANILLA	FECHA DE PAGO
No.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALUD	PENSIÓN	CCF	RIESGO		
1	PÉREZ	VILLAMIL	JULIE ANDREA	37.391.228	ING. EN PRODUCCIÓN BIOTECNOLÓGICA	SANITAS S.A	PORVENIR	COMFIAR	POSITIVA	9477006216	07/11/2024
2	NÚÑEZ	CABARCAS	LIDIAN ZULAY	1.116.782.383	COORDINADOR DEL PROYECTO	NUEVA EPS	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	9477006216	07/11/2024

MES: NOVIEMBRE DE 2024											
DATOS GENERALES						AFILIADO A				No PLANILLA	FECHA DE PAGO
No.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALUD	PENSIÓN	CCF	RIESGO		
1	PÉREZ	VILLAMIL	JULIE ANDREA	37.391.228	ING. EN PRODUCCIÓN BIOTECNOLÓGICA	SANITAS S.A	PORVENIR	COMFIAR	POSITIVA	9478564953	06/12/2024
2	NÚÑEZ	CABARCAS	LIDIAN ZULAY	1.116.782.383	COORDINADOR DEL PROYECTO	NUEVA EPS	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	9478564953	06/12/2024

4.2.2 ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO

☑ Condiciones contractuales iniciales

El Contrato de Consultoría (Interventoría Técnica) No. 001 de 2024 suscrito entre el Departamento de Arauca y el contratista **COAMDESOR** representado por la señora **JULIE ANDREA PEREZ VILLAMIL** contempla las siguientes actividades a desarrollar dentro del plazo contractual establecido de 4 meses.

Condiciones contractuales iniciales del Contrato

1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)						
CARGO / OFICIO/PROFESIÓN	CANTIDAD	SALARIO MES	No. MESES	DEDICACIÓN	VALOR BÁSICO = (BxCxD)	VALOR PARCIAL =(G)
	A	B	C	D		G
PERSONAL PROFESIONAL						
PROFESIONAL CON TITULO DE PREGRADO EN EL ÁREA DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN O PRODUCCIÓN BIOTECNOLÓGICA CON POSGRADO. CON 80 MESES DE EXPERIENCIA MAS COMO PROFESIONAL EN INTERVENTORÍA.	1	$ 4.000.000,00	4	100%	$ 16.000.000,00	$ 16.000.000,00
					SUBTOTAL, COSTOS PROFESIONAL	$ 16.000.000,00

					FACTOR MULTIPLICADOR	2,1
					TOTAL, COSTOS PROFESIONAL	$ 33.600.000,00
2. OTROS COSTOS DIRECTOS (B)						
CONCEPTO	MES	VALOR MENSUAL	No. MESES	DEDICACIÓN	VALOR BÁSICO = (BxCxD)	VALOR PARCIAL =(G)
	A	B	C	D		G
COSTOS APOYO LOGÍSTICO Y TRANSPORTE						
APOYO DE UN TÉCNICO ADMINISTRATIVO	MES	$ 1.500.000,00	4	100%	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00
APOYO LOGÍSTICO Y TRANSPORTE A MUNICIPIOS PARA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.	UNIDAD	$ 4.200.000,00	4	100%	$ 16.800.000,00	$ 16.800.000,00
COSTOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTACIÓN Y PAPELERÍA.						
ELABORACIÓN Y EDICIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN	UNIDAD	$ 750.000,00	4	100%	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00
					SUBTOTAL, OTROS COSTOS DIRECTOS=B	$ 25.800.000,00
					SUBTOTAL (A+B)=C	$ 59.400.000,00
					IVA 19%	$ 11.286.000,00
					VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA	$ 70.686.000,00

☑ Análisis de ejecución por ítem

El siguiente informe presenta un resumen de las actividades realizadas y los indicadores de desempeño asociados al Contrato de Consultoría (Interventoría Técnica) No. 001 de 2024, durante el periodo establecido.

ITEM	CARGO / OFICIO	UNIDAD	DEDICACION	HOMBRE / MES CANTIDAD	VALOR	FACTOR PRESTACIONAL	TIEMPO MESES	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION	VALOR PARCIAL
1	COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL									
1,1	PERSONAL PROFESIONAL									
1.1.1	Ingeniero de producción, producción biotecnológica o afines con especialización y 5 o más años de experiencia	MES	100,00%	1	$4.500.000,00	2,2	4	4	0.11	$1.766.800,00
								TOTAL COSTOS DE PERSONAL		$1.766.800,00
2	OTROS COSTOS DIRECTOS									
2.3	Técnico Administrativo	MES	50%	1	$1.500.000,00		4	1	0.06	$ 892.500,00
2.4	Servicio de Transporte de Personal	MES	100%	1	$4.200.000,00		4	1	0.45	$ 6.765.500,00
								TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	0.51	$7.658.000,00
								SUBTOTAL COSTO	0.62	$9.424.800,00

Al cierre del periodo evaluado, se registró una ejecución acumulada del contrato por un valor de $9.424.800,00, lo que representa un avance final del 100%.

Para asegurar el avance y la calidad del contrato, la interventoría estableció indicadores de eficiencia y eficacia. Estos indicadores evaluaron: 1) el cumplimiento de plazos en la entrega de infraestructura, y 2) la efectividad de los equipos en la optimización de los procesos productivos de las entidades beneficiarias.

La interventoría monitoreo cuidadosamente el uso de recursos y el cumplimiento de cronogramas, destacando los tiempos requeridos para finalizar las adecuaciones de infraestructura y los ajustes en la instalación eléctrica. Se evidencia que, a pesar de ciertos retrasos, la interventoría apoyó la gestión de prórrogas como mecanismo para garantizar que las instalaciones cumplan con los requisitos necesarios antes de la entrega y puesta en marcha de los equipos. Este enfoque

permite minimizar desperdicios y asegurar que las actividades se realicen en el orden y con los recursos adecuados, optimizando así el tiempo y los costos del proyecto.

En cuanto a la eficacia, la interventoría adoptó indicadores orientados a verificar que los equipos proporcionados cumplieran con las especificaciones técnicas necesarias para optimizar las actividades de producción. La revisión de la infraestructura instalada, los ajustes eléctricos, y el seguimiento de la instalación de cada equipo buscó asegurar que cada elemento del contrato tuviese un impacto directo y positivo en la productividad de los beneficiarios, como se evidencia en el caso de la Cooperativa Procesadora de Cacao La Delicia y la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro. Además, se enfocó en la capacitación y acompañamiento técnico de las asociaciones, lo cual fue fundamental para que el personal pudiera operar los equipos de forma adecuada, garantizando una mayor durabilidad y funcionalidad.

En resumen, los indicadores de eficiencia y eficacia de la interventoría fueron cruciales para mantener la supervisión del contrato, asegurando tanto el uso adecuado de los recursos y tiempos como la alineación con los objetivos de productividad y calidad proyectados. La aprobación de prórrogas estratégicas refleja un enfoque flexible y adaptativo para alcanzar los resultados contractuales sin comprometer la calidad del proyecto.

El actuar de la interventoría con respecto al alcance, costo y tiempo del contrato fue estratégico, centrado en asegurar que las metas y objetivos se cumplieran de manera efectiva. En cuanto al alcance, la interventoría mantuvo un enfoque claro, supervisando de cerca las actividades relacionadas con la instalación y adecuación de los equipos. A través de reuniones técnicas y visitas de seguimiento, se garantizó que las adecuaciones necesarias en infraestructura y parte eléctrica se alinearan con las necesidades operativas de las entidades beneficiarias. Además, se implementaron ajustes en los procesos operativos, como la estandarización de procedimientos y la capacitación del personal, lo que optimizó la funcionalidad de los equipos adquiridos y permitió identificar y abordar desviaciones o riesgos a tiempo.

En lo que respecta al costo, la interventoría realizó un seguimiento exhaustivo de la gestión financiera del proyecto, vigilando de cerca los avances en la utilización de recursos para las adecuaciones y la instalación eléctrica. Aseguró que los costos de materiales y mano de obra se mantuvieran dentro del presupuesto establecido. No obstante, se presentaron desafíos debido a los retrasos en el despacho de materiales por paros, lo que impactó en los costos indirectos del proyecto. Ante esta situación, la interventoría adoptó medidas correctivas, como la aprobación de prórrogas, las cuales, aunque generaron un costo adicional en tiempo, fueron necesarias para asegurar que los recursos se utilizaran de manera eficiente y que el proyecto cumpliera con los estándares de calidad.

La gestión del tiempo fue otro aspecto crítico en la intervención de la interventoría. Mediante una evaluación constante del progreso de las actividades, se identificaron oportunidades de mejora y áreas que requerían mayor atención. Las prórrogas solicitadas por el Consorcio Transformación Agroindustrial fueron una muestra clara de cómo la interventoría manejó proactivamente el tiempo, permitiendo que las entidades beneficiarias concluyeran las adecuaciones sin comprometer la calidad. La intervención aseguró que el tiempo adicional se utilizara de manera productiva, enfocándose en finalizar las actividades del componente No. 3 y entregando satisfactoriamente los productos del contrato.

En conclusión, la intervención de la interventoría fue efectiva, proactiva y flexible, logrando un manejo integral del alcance, costo y tiempo. Su capacidad para adaptarse a los cambios y desafíos, como los retrasos en los materiales y la gestión de las prórrogas, fue clave para

asegurar el éxito del proyecto. Gracias a su enfoque orientado a resultados, se mantuvo un equilibrio adecuado entre la calidad, los costos y los plazos, lo que permitió cumplir con los objetivos del contrato y garantizar la satisfacción de las entidades beneficiarias.

4.2.3 ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO

☑ **Manejo del anticipo**

El valor y forma de pago del Contrato de Interventoría No. 001 de 2024, se realiza conforme a lo establecido en los estudios previos, así: VALOR : El valor del presente Contrato es SETENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($70.686.000,00) Y LA FORMA DE PAGO: el Departamento de Arauca pagará de la siguiente forma: Hasta un NOVENTA por ciento (90%) del valor del contrato, se pagara mediante presentación de actas parciales del contrato ejecutado, formuladas por el contratista de acuerdo con las cantidades aceptadas por la supervisión y a satisfacción del departamento.

El pago del DIEZ (10%) neto restante del valor total se hará efectivo con la presentación del acta de recibo final y la suscripción del acta de liquidación del contrato y su correspondiente aprobación por parte del Departamento de Arauca.

VALOR DEL CONTRATO: $ 70.686.000,00
PORCENTAJE DEL ANTICIPO: 40%
VALOR DEL ANTICIPO: $ 28.274.400,00

☑ **Apertura de la cuenta bancaria**

ENTIDAD BANCARIA: BANCO DE BOGOTA
FIDUCIA No. /CUENTA BANCARIA No.: 137530135
FECHA DE APERTURA: ACTIVA
NOMBRE DE LA CUENTA O ENCARGO FIDUCIARIO: COAMDESOR
VALOR DEL ANTICIPO: $28.274.400,00

☑ **Plan de inversión del anticipo**

ITEM	CARGO / OFICIO	UNIDAD	DEDICACION	HOMBRE / MES CANTIDAD	VALOR	FACTOR PRESTACIONAL	TIEMPO MESES	VALOR PARCIAL
1	COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL							
1,1	PERSONAL PROFESIONAL							
1.1.1	Ingeniero de producción , producción biotecnológica o afines con especialización y 5 o más años de experiencia	MES	100,00%	1	$ 4.500.000,00	2,20	4	$ 15.993.600,00
							TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 15.993.600,00
2	OTROS COSTOS DIRECTOS							
2.1	Técnico Administrativo	MES	50%	1	$ 1.500.000,00		4	$ 2.856.000,00
	Elaboración y edición de informe de ejecución							$ 1.428.000,00
2.2	Servicio de Transporte de Personal	MES	100%	1	$ 4.200.000,00		4	$ 7.996.800,00
							TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 12.280.800,00
							COSTO TOTAL (IVA INCLUIDO)	$ 28.274.400,00

El día 29 de abril de 2024, de acuerdo con el Comprobante de egreso No. SGR202324-00734 y la Orden de Pago No. SGR202324-00749, se realizaron las transferencias de recursos al Consorcio Transformación Agroindustrial.

Dado que no se han generado actas parciales que certifiquen avances en la ejecución del contrato, la situación financiera permanece inalterada desde el desembolso inicial del anticipo. No se han registrado pagos adicionales ni variaciones en el saldo pendiente.

ANEXO 2. Informe Contrato de Consultoría (Interventoría Técnica) No 001 de 2024

4.3 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 619 de 202, CO1.PCCNTR.5688823

4.3.1 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA:	SANDRA LILIANA FRANCO COLLAZOS
DOCUMENTO:	60.331.206 DE CÚCUTA
SUPERVISOR:	FRANCISCO JAVIER MENDOZA NIÑO Resolución No.763 del 22/03/2024
CONTRATO No:	619
OBJETO DEL CONTRATO:	APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO:	$ 28.800.000,00
PLAZO CONTRACTUAL:	6 MESES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	SGR202324-00366
REGISTRO PRESUPUESTAL:	SGR202324-00358
FECHA INICIO:	20 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	20 DE JULIO DE 2024
FECHA DE SUSPENSION No. 1:	06 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE PRORROGA No. 1 DE LA SUSPENSION No. 1:	06 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE PRORROGA No. 2 DE LA SUSPENSION No. 1:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO No. 1:	04 DE OCTUBRE DE 2024
SUPERVISOR:	FRANCISCO JAVIER MENDOZA NIÑO
PERIODO DEL INFORME	
FECHA DE CORTE DEL INFORME:	DESDE EL VEINTINUEVE (29) DE OCTUBRE AL DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE 2024
DÍAS TRANSCURRIDOS:	CUATRO (04) MESES

ACTOS ADMINISTRATIVOS

Durante la ejecución del contrato de Prestación de servicios, se suscribieron los siguientes actos administrativos:

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
09/10/2024	Contrato	Suscripción del contrato de Prestación de servicios No. 619 de 2023	WILINTON RODRÍGUEZ BENAVIDEZ GOBERNADOR DEPARTAMENTO DE ARAUCA

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
			SANDRA LILIANA FRANCO COLLAZOS CONTRATISTA
20/03/2024	Acta de inicio	Inicio del periodo de ejecución del Contrato Prestación de Servicios No. 619 de 2023	CARLOS OCTAVIO SARMIENTO G. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE SANDRA LILIANA FRANCO C. CONTRATISTA
22/03/2024	Resolución No. 763 de 2024	Designación de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios No.001 de 2023	CARLOS OCTAVIO SARMIENTO G. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE
06/06/2024	Acta de suspensión No. 1	Adecuación de las instalaciones locativas de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro y la cooperativa procesadora de cacao la delicia.	CARLOS OCTAVIO SARMIENTO G. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE SANDRA LILIANA FRANCO C. CONTRATISTA FRANCISCO JAVIER MENDOZA NIÑO SUPERVISOR resolución 627 del 22 de marzo de 2024
06/08/2024	Acta de prorroga No.1 de la suspensión No. 1	Se prorroga la suspensión No. 1 en razón a que a la fecha no han sido superados los motivos que generaron dicha suspensión.	CARLOS OCTAVIO SARMIENTO G. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE SANDRA LILIANA FRANCO C. CONTRATISTA FRANCISCO JAVIER MENDOZA NIÑO SUPERVISOR resolución 627 del 22 de marzo de 2024
06/09/2024	Acta de prorroga No.2 de la suspensión No. 1	En razón a que se mantienen sin superar las condiciones que generaron la suspensión.	CARLOS OCTAVIO SARMIENTO G. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE SANDRA LILIANA FRANCO C. CONTRATISTA FRANCISCO JAVIER MENDOZA NIÑO SUPERVISOR resolución 627 del 22 de marzo de 2024
04/10/2024	Acta de reinicio No. 1	Se superan los motivos que mantenían suspendidas las actividades del proyecto.	CARLOS OCTAVIO SARMIENTO G. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE SANDRA LILIANA FRANCO C. CONTRATISTA FRANCISCO JAVIER MENDOZA NIÑO SUPERVISOR resolución 627 del 22 de marzo de 2024

AVANCE DEL PLAZO CONTRACTUAL

A pesar de los avances logrados, el proyecto aún cuenta con un plazo de dos meses para su culminación, equivalente al 33.33% del plazo total.

4.3.2 ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO

☑ Condiciones contractuales iniciales

El Contrato de Prestación de Servicios No. 619 de 2023, suscrito entre el Departamento de Arauca y Sandra Liliana Franco Collazos, establece un plazo contractual de seis meses para la ejecución de las siguientes actividades.

Condiciones contractuales iniciales del Contrato

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO IMPUESTOS INCLUIDOS	VALOR TOTAL
APOYO A LA SUPERVISION					
1	ASISTENCIA PROFESIONAL COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO, A LA SECRETARÍA DE PLANEACION DEPARTAMENAL PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ACTIVIDADES TÉCNICAS EN CAMPO, EN LOS MUNICIPIOS DE, ARAUQUITA, SARAVENA	MES	6	$ 4.000.000,00	$ 24.000.000,00
2	APOYO LOGÍSTICO, DESPLAZAMIENTO EN CAMPO COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO AL ÁREA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ACTIVIDADES TÉCNICAS EN CAMPO, EN LOS MUNICIPIOS DE, ARAUQUITA, SARAVENA.	MES	4	$ 1.200.000,00	$ 4.800.000,00
TOTAL COMPONENTE 3					$ 28.800.000,00

☑ Análisis de ejecución técnica por ítem

En el presente informe se presenta un análisis pormenorizado de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 619/2023, correspondiente al periodo establecido.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT.	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION	VALOR PARCIAL
APOYO A LA SUPERVISION						
1	ASISTENCIA PROFESIONAL COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO, A LA SECRETARÍA DE PLANEACION DEPARTAMENAL PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ACTIVIDADES TÉCNICAS EN CAMPO, EN LOS MUNICIPIOS DE, ARAUQUITA, SARAVENA	MES	6	$ 4.000.000,00	0.26	$ 4.000.000,00
2	APOYO LOGÍSTICO, DESPLAZAMIENTO EN CAMPO COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO AL ÁREA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ACTIVIDADES TÉCNICAS EN CAMPO, EN LOS MUNICIPIOS DE, ARAUQUITA, SARAVENA.	MES	4	$ 1.200.000,00	0.05	$ 759.999,00
TOTAL COMPONENTE					0.31	$ 4.759.999,00

Con un avance del 79.72%, el contrato ha ejecutado un total de $22.960.666 desde su inicio hasta el 18 de noviembre de 2024. Aún queda por ejecutar un 20.28%, lo que equivale a dos meses de trabajo pendiente.

Visita verificación técnica Asociación José Antonio Galán Zorro (13/11/2024)

Asistentes:

- ☺ Francisco Mendoza Niño- Supervisor

- Yarle Cárdenas- Representante Consorcio Transformación Agroindustrial
- Sandra Franco, profesional de apoyo- Gobernación de Arauca

Temas:

- Visita de verificación equipos





Desarrollo:

El 13 de noviembre de 2024, se llevó a cabo una visita de inspección a las instalaciones de la Asociación José Antonio Galán Zorro, con el objetivo de verificar la correcta instalación de los equipos. En el transcurso de la inspección, estuvo presente el supervisor, quien verificó de manera detallada el proceso de instalación, garantizando el cumplimiento de los estándares técnicos establecidos.

Compromisos:

- Terminar las instalaciones locativas para la instalación de los equipos.

Registro fotográfico:

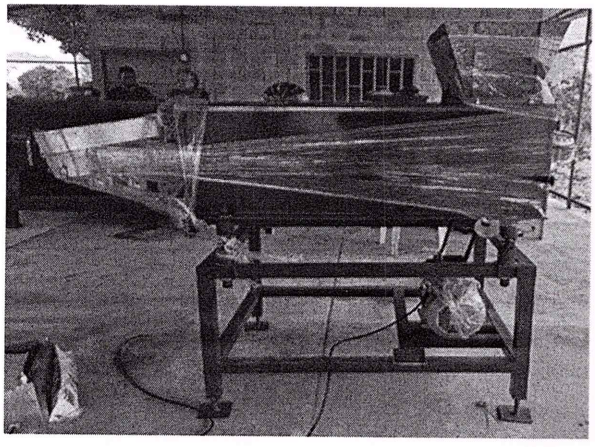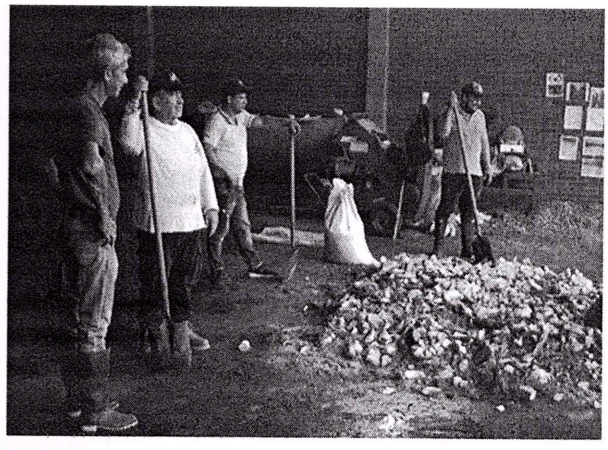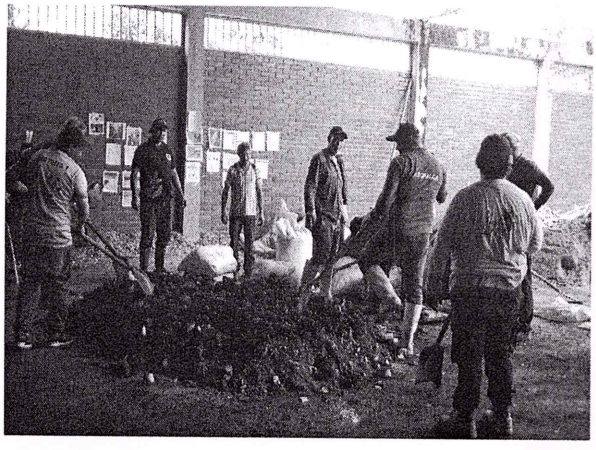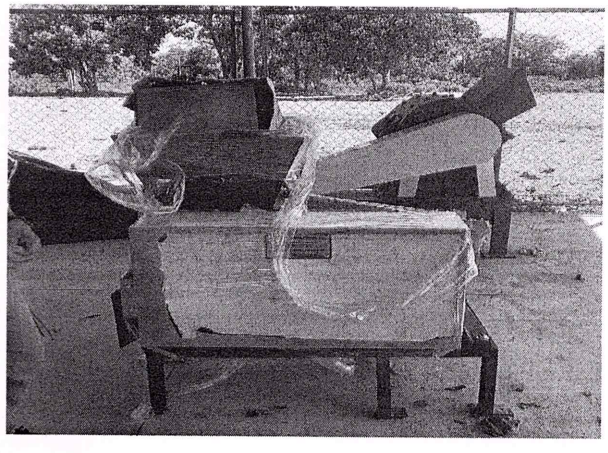ANEXO 3. Informe Contrato de prestación de Servicios No. 619 de 2024

5. INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

5.1 ASPECTOS TÉCNICOS

El proyecto SGR con código BPIN 2023005810187 registró un avance físico del 99.37% al cierre de noviembre de 2024, lo que representa un valor acumulado de $1.489.486.000,00. Este avance se atribuye en gran medida a la entrega de maquinaria para los componentes 2, con una inversión de $352.002.300. La recepción de estos equipos ha fortalecido la capacidad operativa del proyecto y ha permitido alcanzar un avance físico sustancial.

COMPONENTE 1. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EMPRESARIALES PARA LA GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPECINA JOSÉ ANTONIO GALÁN ZORRO						04/10/2024 al 18/11/2024	
1.1	MANGUERA REFORZADA DE 1" 3 CAPAS ROLLO DE 100MT	UNIDAD	10	$ 933.400	$ 9.334.000	$ -	0,00%
1.2	CARRETILLA ANTI PINCHAZO. TIPO CARRETILLA. MODELO VERSÁTIL, CAPACIDAD DE LEVANTE 5 FT. CARACTERÍSTICAS. CARRETILLA DE TOLVA DE 5 FT, MATERIAL DE LA TOLVA METÁLICA, RIN METÁLICO, RUDA ANTI PINCHAZO	UNIDAD	10	$ 1.000.000	$ 10.000.000	$ -	0,00%
1.3	BALANZA BASCULA DE 500KG ELÉCTRICA DE PEDESTAL: BALANZA 500KG, MEDIDAS PLATAFORMA 50X60CM APROX. TABLERO DOBLE VISOR COLOR NÚMEROS: ROJO, RECARGABLE 8 A 10 HORAS CONTINUAS, PLEGABLE Y PORTÁTIL INCLUYE: 1. BALANZA PLATAFORMA, 1. INDICADOR, 1. CARGADOR,4 PATAS PARA LA PLATAFORMA	UNIDAD	2	$ 2.445.000	$ 4.890.000	$ -	0,00%
1.4	TRITURADORA DE PIEDRA 2 METROS CÚBICOS HORA: TRITURADORA DE PIEDRA DE 3 TONELADAS HORA CON MOTOR TRIFÁSICO O DIÉSEL, DE 10 CABALLOS NOBSE	UNIDAD	1	$ 95.000.000	$ 95.000.000	$ -	0,00%
1.5	TRITURADORA INDUSTRIAL PARA RESIDUOS SÓLIDOS: PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS CON REVERSIÓN AUTOMÁTICA-LAS TRITURADORAS INCLUYEN UN SISTEMA DE PROTECCIÓN ELECTRÓNICO PARA DETENER Y DAR MARCHA ATRÁS AUTOMÁTICAMENTE LA ACCIÓN DE TRITURACIÓN EN CASO DE SOBRECARGA DEL SISTEMA. EL SISTEMA PERMITE QUE LA TRITURADORA SE DESPEJE Y LUEGO CONTINÚA EL PROCESO DE TRITURACIÓN AUTOMÁTICAMENTE. ♦SISTEMA AVANZADO DE PROTECCIÓN DE RODAMIENTOS: MÚLTIPLES OBSTÁCULOS DE LABERINTO MECÁNICO Y SELLOS CONVENCIONALES, PROTEGIENDO RODAMIENTOS COSTOSOS Y ASEGURANDO LA MÁXIMA FIABILIDAD EN LÍNEA. ♦EFICIENCIA TRITURACIÓN-LOS EJES ROTATORIOS DE CONTRAPESO GIRAN A VELOCIDADES LIGERAMENTE DIFERENTES, LO QUE AUMENTA LA EFICIENCIA DE LA ACCIÓN DE CORTE Y ROTURA. ♦ECONÓMICO Y PRÁCTICO-DESDE EL SISTEMA DE CONDUCCIÓN ELECTROMECÁNICA DE BAJA VELOCIDAD Y ALTO PAR HASTA NUESTRO ROBUSTO DISEÑO DE CÁMARA DE CORTE, LAS TRITURADORAS ESTÁN DISEÑADAS PARA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y BAJO COSTO DE MANTENIMIENTO. ♦FUNCIONAMIENTO NO BALÍSTICO Y DE BAJO RUIDO: LAS TRITURADORAS INDUSTRIALES DE BAJA VELOCIDAD Y ALTO PAR FUNCIONAN A BAJOS NIVELES DE RUIDO SIN CREAR POLVO NI PARTÍCULAS VOLADORAS. ♦PROTECCIÓN DE GOLPES GRAVES-EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DEL COJÍN ABSORBE CARGAS DE CHOQUE MENORES Y DETIENE AUTOMÁTICAMENTE LA ACCIÓN DE TRITURACIÓN EN EL CASO DE QUE SE INTRODUCE UN ARTÍCULO NO TRITURABLE EN LA CÁMARA DE CORTE.	UNIDAD	1	$ 108.116.000	$ 108.116.000	$ -	0,00%

	♦CORTADOR DE ALTA ALEACIÓN CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA UNA VIDA EXTRA LARGA, ANTICORROSIVO Y RESISTENTE AL DESGASTE. ♦RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS NSK, EJES DE CORTE HEXAGONALES DISEÑADOS PARA UNA MAYOR DURABILIDAD, DE 500KG						
1.6	CANECA PLÁSTICA DE 55 GALONES CON TAPA Y ARO DE SEGURIDAD: ALTURA 90 CM DIÁMETRO O ANCHO 60 CM MATERIAL: POLIETILENO ORIGINAL DE ALTA DENSIDAD	UNIDAD	38	$ 711.500	$ 27.037.000	$ -	0,00%
1.7	MEDIDOR DE PLANTAS 5 EN 1, TEMPERATURA DE PH DEL SUELO. PROBADOR DE SUELO 5 EN 1: PUEDE MEDIR EL VALOR DE PH DEL SUELO (3,0 A 9,5, 10 NIVELES), INTENSIDAD DE LA LUZ SOLAR (9 NIVELES), HUMEDAD (5 NIVELES), HUMEDAD (20% -99%) Y TEMPERATURA DEL SUELO. ES ÚTIL PARA USTED CONTROLAR EL RIEGO, LA TEMPERATURA, EL VALOR DEL PH EL TIEMPO DE SOL PARA QUE SUS PLANTAS CREZCAN SANAS Y FUERTES. GRAN PANTALLA LCD RETROILUMINADA - MUESTRA FÁCILMENTE VARIAS LECTURAS CON LA GRAN PANTALLA LCD, Y LA RETROILUMINACIÓN VERDE LE PERMITE LEER EL ÍNDICE EN OSCURIDAD CONDICIONADO POR UNA BATERÍA DE 9V (NO INCLUIDA). UNA FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO AYUDA A AHORRAR LA DURACIÓN DE LA BATERÍA, HAY INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA EN LA PANTALLA	UNIDAD	4	$ 700.000	$ 2.800.000	$ -	0,00%
1.8	ZARANDA CLASIFICADORA 2 Y 3 NIVELES: ZARANDA CLASIFICADORA DE MATERIALES MALLA 100, 50 .05	UNIDAD	1	$ 103.445.000	$ 103.445.000	$ -	0,00%
1.9	CERRADORA DE SACOS Y COSTALES + HILO NUEVA: VOLTAJE: 110V AC, CORRIENTE: 0.73ª, PODER: 90 VOLTIOS FRECUENCIA: 50/60HZ, VELOCIDAD: 1100 RPM, ANCHO MÁXIMO DE LA BOLSA A COSER:: 0.16 PULGADAS (4MM), ESPACIO ENTRE PUNTADAS: 0.27 PULGADAS -0.33 PULGADAS (7-8.5MM), TAMAÑO DE LA MÁQUINA: 14.25 PULGADAS (361 MM) (L) X 9.25 PULGADAS (234 MM) (W) X 12 PULGADAS (304 MM)(H), PESO DE LA MÁQUINA: 12 LBS. (5.5 KG), TAMAÑO DE LA CAJA: 16 PULGADAS (406.4 MM)(L) X 11 PULGADAS (279.4 MM)(W) X 13 PULGADAS (330.2 MM)(H). DETALLES TÉCNICOS: 1. COSTURA PUNTO DE CADENA DE HILO ÚNICO 2. RANGO DE PUNTADA (MM) 6.5 (FIJO) 3. REVOLUCIÓN (RPM) 1250 4. AGUJA DN X 1 # 25 5. HILO (VINILÓN, SINTÉTICO O ALGODÓN) 20/6 6. MATERIAL DEL BOLSO QUE SE CERRARÁ EL PAPEL DE KRAFT, PP / PE, PAÑO TEJIDO, ALGODÓN, YUTE DE LA ARPILLERA 7. MOTOR DE ACCIONAMIENTO 90 W 8.FUENTE DE ALIMENTACIÓN 110, 220 O 240 V A.C 9.PESO NETO (KG) 5.9 KG. ACCESORIOS ESTANDAR; AGUJAS DN X 1 # 25 10PCS, HILO DE VINILO EN 20/6 1 ROLLO, ARBUSTOS DEL MOTOR 2PCS, DESTORNILLADOR 1PCS, PINZAS 1PCS, LLAVE HEXAGONAL 1PCS, ENGRASADOR 1PCS	UNIDAD	2	$ 1.823.000	$ 3.646.000	$ -	0,00%
1.10	GRANULADOR DE FERTILIZANTE ORGÁNICO: PRODUCTIVIDAD HASTA 3.000 KG POR HORA, DIMENSIONES DEL GRANULADOR; LONGUITUD 4.5 METROS, DIÁMETRO 820 MM. FORMA DE PELLETS ESFÉRICA. TAMAÑO DE GRANULOS DE 2 A 8 MM DE DIÁMETRO, CONSUMO 75 KW. FUENTE DE ALIMENTACIÓN 380V	UNiDAD	1	$ 369.000.000	$ 369.000.000	$ -	0.00%
1.11	ESCRITORIO METÁLICO OPERATIVO 73X120X60CM: CARACTERÍSTICAS; 3 FRENTES DE GAVETA EN LÁMINA COL ROLLED CALIBRE 24. TAPA SUPERIOR EN AGLOMERADO DE 25 MM, ENCHAPADO EN FÓRMICA, CON CANTO FORRADO EN BOCEL DE PVC. GAVETA SUPERIOR CON CHAPA. LARGO 60 CENTÍMETROS, ANCHO 73 CM, PROFUNDIDAD 150 CENTÍMETROS ALTO 150 CENTÍMETROS	UNIDAD	1	$ 1.933.300	$ 1.933.300	$ -	0,00%


1.12	ARCHIVADOR 4 GAVETAS METÁLICO, ELABORADO EN LÁMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 22, RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, CORREDERAS INDEPENDIENTES FULL EXTENSIÓN, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA Y CHAPA DE ACCIÓN CON LLAVE MEDIDAS 134X47 CMX60CM	UNIDAD	1	$ 3.090.000	$ 3.090.000	$ -	0,00%
1.13	SILLA ESCRITORIO CON BRAZOS Y RESPALDO NEGRA: MATERIAL CUERO SINTÉTICO, ANCHO 65 CENTÍMETROS ALTO 120, MATERIAL ESTRUCTURA METAL, ESPUMA, NYLON, POLIPROPILENO CAPACIDAD (RESISTENCIA - CARGA MÁXIMA) 120 KG GIRA 360 GRADOS, MEDIDAS 124X51X52	UNIDAD	1	$ 2.112.000	$ 2.112.000	$ -	0,00%
1.14	SILLA OFICINA INTERLOCUTORA ESCRITORIO ESTRUCTURA NEGRA PLAS: ESPALDA Y ASIENTO: EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. ESTRUCTURA: METÁLICA EN TUBO RECTANGULAR 30X15 CON AMARRES EN EL ASIENTO EN TUBO REDONDO 5/8 CALIBRE 18. RECUBRIMIENTO: PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA. TAPONES: ELÍPTICOS PLÁSTICOS NEGROS. MEDIDAS 82,5 cmx42.5 cmx47.5cm	UNIDAD	2	$ 212.000	$ 424.000	$ -	0,00%
1.15	LOCKER METÁLICO 9 PUESTOS AZUL DE 180X93X30 CM: LOCKER CON MÓDULOS DE DIFERENTES NÚMEROS DE CASILLAS DE UN CUERPO Y VARIOS COMPARTIMIENTOS VERTICALES CON PUERTAS Y SEGUROS PARA CANDADO. ZAPATERA Y MANIJAS PLÁSTICAS EN POLIPROPILENO. LAS PUERTAS DEL LOCKER POSEE CELOSÍAS QUE PERMITEN LA CIRCULACIÓN DE AIRE, SUPERFICIE TERMINADA COMPLETAMENTE LISA, SISTEMA DE SEGURIDAD SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE USO. EL LOCKER ESTÁ APOYADO SOBRE SISTEMA RÍGIDO, BISAGRAS DESARMABLES ÚNICAMENTE CON LA PUERTA ABIERTA.	UNIDAD	1	$ 2.780.000	$ 2.780.000	$ -	0,00%
1.16	COMPUTADOR DE ESCRITORIO, DISCO DURO 1 TB, DDR4 4GB, NO DVD, MONITOR 18,5 E1916HV LINUX (7PF82)	UNIDAD	1	$ 5.300.000	$ 5.300.000	$ -	0,00%
1.17	IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIÓN: IMPRIME, ESCANEA Y HACE COPIAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: INYECCIÓN DE TINTA. TIENE ENTRADA USB. CUENTA CON 2 BANDEJAS. CAPACIDAD MÁXIMA DE 130 HOJAS. SOPORTA PAPEL TAMAÑO A4, OFICIO, OFICIO MÉXICO, OFICIO 9, FOLIO, EJECUTIVO, MEDIA CARTA, A6, CARTA, FOTO 10 X 15 CM, SOBRE N10, 215.9 X 1.200 MM, FOTO 13 X 18 CM, FOTO 16:9, SOBRE PERSONALIZADO (54 X 86 MM - 215.9 X 1.200 MM). INCLUYE ACCESORIOS. PRÁCTICA Y FUNCIONAL TANTO PARA USO PERSONAL COMO PROFESIONAL	UNIDAD	1	$ 2.066.700	$ 2.066.700	$ -	0,00%
SUB TOTAL COMPONENTE 1					**$ 750.974.000**	**$ 00,00**	**0.00%**
					EJECUTADO MENSUAL	**$ 00,00**	**0.00%**
					EJECUTADO ACUMULADO	**$ 750.974.000,00**	**50.10%**
COMPONENTE 2. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EMPRESARIALES PARA LA GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA							
2.1	REFINADOR DE PIEDRAS A MÁQUINA, CAPACIDAD DE 120 KG BACHE, POTENCIA INSTALADA: 3,5 KW	UNIDAD	1	$ 74.450.000	$ 74.450.000	$ -	0,00%
2.2	ELEVADOR DE CANGILONES DE 3 MTRS	UNIDAD	1	$ 95.560.000	$ 95.560.000	$ -	0,00%
2.3	PLANTA ELÉCTRICA DIÉSEL CABINADA: POTENCIA STAND BY 25KVA, POTENCIA PRIME 22KVA, POTENCIA NOMINAL 20KW HASTA 1000, FACTOR DE POTENCIA 0.8, CORRIENTE NOMINAL 164A/82A/47,5A, NÚMERO DE FASES 3 FRECUENCIA NOMINAL 60 HZ, POTENCIA MÁXIMA DEL MOTOR 35hp, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO (12 VOLTIOS), CAPACIDAD DE ACEITE EN EL CARTER 8L, CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 50L, PESO NETO 680kg, Y PESO BRUTO 700KG. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: VOLTIMETRO, AMPERIMETRO, FRECUENCIMETRO Y HORÓMETRO	UNIDAD	1	$ 81.112.000	$ 81.112.000	$ -	0,00%

2.4	MOLDE EN POLICARBONATO PARA CHOCOLATE DE MESA 180GR: UNA BARRA POR 180 GRAMOS (250 CC) APROX. CON 10 DIVISIONES. BRILLO PERFECTO Y UNIFORMIDAD EN TUS PRODUCTOS	UNIDAD	300	$ 84.500	$ 25.350.000	$ -	0,00%
2.5	BÁSCULA PLEGABLE 300 KILOS ACERO INOXIDABLE: BRAZO DE DOBLAR ES IDEAL PARA SU TRABAJO Y TRANSPORTE, INDICADOR EN ACERO INOXIDABLE. CAPA ANTIDESLIZANTE, MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL. TECLADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO PULSADOR. TECLAS CON TONO AL OPRIMIR, INDICADOR LED ROJO AJUSTABLE A 3 TONOS DE BRILLO. PATAS AJUSTABLES NIVELADORAS. INCLUYE ADAPTADOR 6V. CELDA CON PROTECTOR FLUIDOS Y HUMEDAD. IDEAL PARA CUARTOS FRÍOS O MANEJO DE LIQUIDOS CON BANDEJA LAMINA DE ACERO INOXIDABLE RESISTENTE AL TRABAJO COTIDIANO Y COMERCIAL, CON UN ANCHO DE 40CM X UN LARGO DE 50CM	UNIDAD	2	$ 1.467.000	$ 2.934.000	$ -	0,00%
2.6	BANDA TRANSPORTADORA DE 5 METROS: ESTRUCTURA Y BASE EN ACERO INOX. SUMINISTRO DE CORRIENTE 110 VOL. AC. 60 HZ. BANDA EN LONA TIPO SIN FIN, VULCANIZADA SIN FIN COLOR BLANCO, ANCHO DE LA BANDA TRANSPORTADORA 30 CMS, LARGO DE LA BANDA TRANSPORTADORA 5 MTRS, DOS GUÍAS AL COMIENZO DE LA BANDA CON ANCHO Y ALTURA VARIABLE PARA COLOCAR EL PRODUCTO. ALTURA DE TRABAJO 90 CMS. VELOCIDAD DE TRANSPORTE VARIABLE DE 3 A 6 MTRS/MIN. RODACHINAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, Y SISTEMA DE FRENO A LAS MISMAS, PESO MÁXIMO DE TRANSPORTE 15 KG. PESO APROX. DE TODO EL CONJUNTO 90 KG.	UNIDAD	1	$ 85.334.000	$ 85.334.000	$ -	0,00%
2.7	TÚNEL DE ENFRIAMIENTO DE CHOCOLATE SS DE ALTO RENDIMIENTO DE 280MM DE ANCHO; FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO, GRADO AUTOMATICO SEMIAUTOMÁTICO, APLICACIÓN CARAMELO – CHOCOLATE LONGITUD 4.2 M. ANCHO DEL CINTURÓN 280MM.	UNIDAD	1	$ 79.667.000	$ 79.667.000	$ 79.667.000	5,31%
2.8	MÁQUINA AUTOMÁTICA DE MOLDEO DE CHOCOLATE DE LA MÁQUINA DEL DEPOSITANTE DE LA BARRA DE CHOCOLATE DE UN TIRO. COMPONENTES PRINCIPALES PLC, MOTOR, COJINETE, CAJA DE CAMBIOS, MOTOR, RECIPIENTE A PRESIÓN. ESTA MÁQUINA DEPOSITADORA DE CHOCOLATE TOTALMENTE AUTOMÁTICA CON SERVOCONTROL ESTÁ EQUIPADA CON UN SERVOMOTOR DE MARCA INTERNACIONAL Y ESTÁ CONTROLADA POR UN SISTEMA PLC. ESTA MÁQUINA DEPOSITADORA PUEDE FABRICAR TIPOS DE PRODUCTOS DE CHOCOLATE, COMO CHOCOLATE ESFÉRICO, CHOCOLATE CON TROZOS, CHOCOLATE PARA SÁNDWICH, CHOCOLATE CON GOTAS DE AGUA, ETC.	UNIDAD	1	$ 53.050.000	$ 53.050.000	$ 53.050.000	3,54%
2.9	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LICOR DE CHOCOLATE: EQUIPADO CON TEMPERATURA NOMINAL (TEMPERATURA AJUSTABLE) SE UTILIZA PARA ALMACENAR EL BIEN MOLIDO PASTA DE CHOCOLATE A TRAVÉS DE AGITACIÓN PARA CUMPLIR CON DESGASIFICACIÓN DE DESODORIZACIÓN DE 500 LTR	UNIDAD	1	$ 79.000.000	$ 79.000.000	$ -	0,00%
SUB TOTAL COMPONENTE 2					**$ 576.457.000**	**$ 132.717.000,00**	**8.85%**
					EJECUTADO MENSUAL	**$ 132.717.000,00**	**8.85%**
					EJECUTADO ACUMULADO	**$ 567.026.000,00**	**37.83%**
					POR EJECUTAR	**$ 9.431.000,00**	**0.63%**
COMPONENTE 3. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EMPRESARIAL							
3.1	ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL Y SEGUIMIENTO AL FORTALECIMIENTO ENTREGADO A LA ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPECINA JOSÉ ANTONIO GALÁN ZORRO Y COOPERATIVA	MES	4	$ 6.000.000	$ 24.000.000	$ 4.400.000,00	0.29%

	PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA.						
3.2	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO OPERATIVO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPESINA JOSÉ ANTONIO GALÁN ZORRO.	MES	4	$ 6.000.000	$ 24.000.000	$ 4.400.000,00	0,29%
3.3	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO OPERATIVO DE LA COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA	MES	4	$ 6.000.000	$ 24.000.000	$ 4.400.000,00	0,29%
SUB TOTAL COMPONENTE 3					**$ 72.000.000**	**$ 13.200.000,00**	**0.87%**
					EJECUTADO MENSUAL	**$ 13.200.000,00**	**0.87%**
					EJECUTADO ACUMULADO	**$ 72.000.000,00**	**4.80%**
COMPONENTE 4. INTERVENTORÍA							
4.1	INGENIERO DE PRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN BIOTECNOLÓGICA O AFINES CON ESPECIALIZACIÓN Y 5 O MÁS AÑOS DE EXPERIENCIA	MES	4	$ 11.781.000	$ 47.124.000	$ 1.786.800,00	0.11%
4.2	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	MES	4	$ 892.500	$ 3.570.000	$ 892.500,00	0.06%
4.3	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL	MES	4	$ 4.998.000	$ 19.992.000	$ 6.765.500,00	0.45%
SUB TOTAL COMPONENTE 4 INTERVENTORIA					**$ 70.686.000**	**$ 9.424.800,00**	**0.62%**
					EJECUTADO MENSUAL	**$ 9.424.800,00**	**0.62%**
					EJECUTADO ACUMULADO	**$ 70.686.000,00**	**4.72%**
COMPONENTE 5. APOYO SUPERVISIÓN							
5.1	ASISTENCIA PROFESIONAL COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO, A LA SECRETARÍA DE PLANEACION DEPARTAMENAL PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ACTIVIDADES TÉCNICAS EN CAMPO, EN LOS MUNICIPIOS DE, ARAUQUITA, SARAVENA	MES	6	$ 4.000.000	$ 24.000.000	$ 4.000.000,00	0.26%
5.2	APOYO LOGÍSTICO, DESPLAZAMIENTO EN CAMPO COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO AL ÁREA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ACTIVIDADES TÉCNICAS EN CAMPO, EN LOS MUNICIPIOS DE, ARAUQUITA, SARAVENA.	MES	4	$ 1.200.000	$ 4.800.000	$ 759.999,00	0.05%
SUB TOTAL COMPONENTE 5 APOYO SUPERVISIÓN					**$ 28.800.000**	**$ 4.759.999,00**	**0.31%**
					EJECUTADO MENSUAL	**$ 4.759.999,00**	**0.31%**
					EJECUTADO ACUMULADO	**$ 22.960.666,00**	**1,51%**
					POR EJECUTAR	**$ 5.839.334,00**	**0,41%**
				Total ejecución mensual		**$ 160.101.799,00**	**10.65%**
				Ejecución acumulada		**$ 1.483.646.666,00**	**98.94%**
				Por ejecutar		**$ 15.270.334,00**	**1.06%**

Ahora, basado en los datos proporcionados por el GESPROY con respecto a la medición del indicador de desempeño de la Eficiencia, el proyecto actualmente se encuentra en una situación positiva. Todas las métricas indican un desempeño adecuado, tanto en términos de tiempo como de costo. Sin embargo, es importante analizar a detalle cada indicador para comprender a fondo la situación del proyecto.

Curva S, indicadores de desempeño en la Eficiencia.

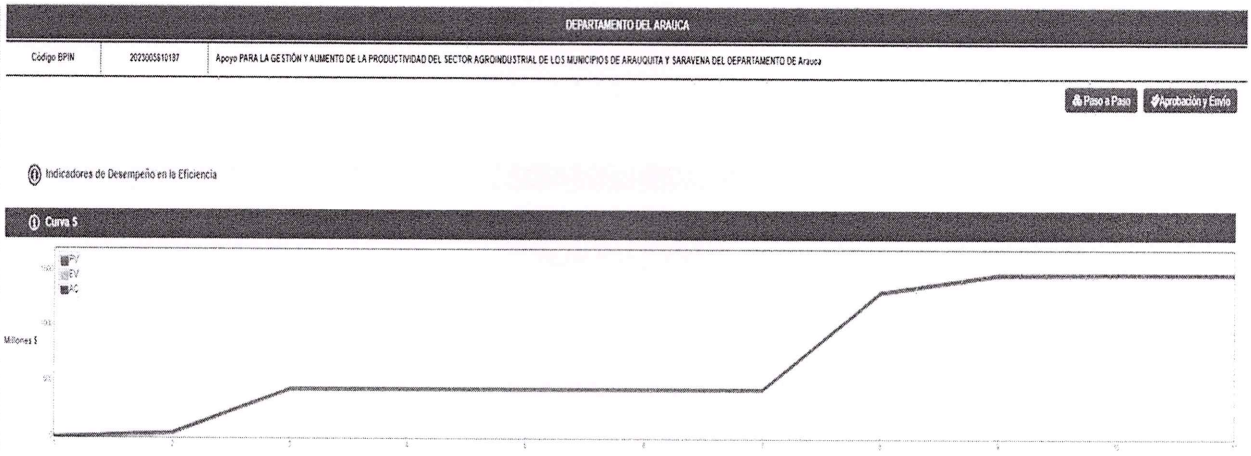

LÍNEA	PERIODO										
	1 mar-24	2 abr-24	3 may-24	4 jun-24	5 jul-24	6 ago-24	7 sep-24	8 oct-24	9 nov-24	10 dic-24	11 Ene-25
* Valor Planeado (PV)	15	56	449	453	453	453	453	1333	1494	1499	1499
* Valor Ganado (EV)	15	56	449	453	453	453	453	1324	1484		
* Costo Actual (AC)	15	56	449	453	453	453	453	1324	1484		
Cumplimiento en la programación (SPI)	1	1	1	1	1	1	1	0.99	0.99		
Cumplimiento del costo (CPI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Retraso SV(t) Meses		0.07	0.03	0.07	1.07	2.10	3.13	0.07	0.13		

El análisis de los datos muestra que el proyecto cumplió con los objetivos establecidos en cuanto a costos, aunque tuvo un leve retraso en la programación.

En términos de cumplimiento del costo (CPI), el valor de 1 indica que el proyecto estuvo dentro del presupuesto, ya que el costo real (AC) coincide con el valor ganado (EV). Esto sugiere que los recursos financieros fueron utilizados de manera eficiente y no se generaron sobrecostos hasta la fecha.

En cuanto al cumplimiento de la programación (SPI), el índice de 0.99 refleja que el proyecto estuvo ligeramente por detrás del cronograma, ya que el valor ganado fue de un 99% del valor planeado. Aunque el retraso no fue significativo, generó una variación negativa del cronograma de -10 unidades, lo que el retraso fue de aproximadamente 0.13 meses. Esto indicó que el avance de las actividades fue un poco más lento de lo esperado, pero el impacto no fue crítico y puedo ser corregido con la toman las medidas adecuadas para realizar las tareas pendientes.

En resumen, aunque el proyecto mantuvo un buen control de los costos, se monitoreó el retraso en la programación y con ello se evitó que se ampliara con el tiempo. La clave fue identificar las causas del retraso y aplicar las acciones correctivas necesarias para asegurar que el proyecto recuperara el tiempo perdido sin afectar la calidad ni los recursos asignados.

6. CONCLUSIONES

Basado en la información proporcionada, se puede concluir que el proyecto, estuvo dentro de los parámetros establecidos en términos de alcance, tiempo y costo.

1. **Alcance**: El proyecto cumplió adecuadamente con los objetivos y entregables establecidos en su alcance. No se identificaron desviaciones significativas en cuanto a los requisitos o las actividades programadas, lo que indicó que el trabajo se realizó conforme a lo previsto, dentro de los límites establecidos.

2. **Tiempo**: Aunque el proyecto presentó un leve retraso, con un índice SPI de 0.99 y una variación de -10 unidades, el impacto en el cronograma fue mínimo, con un retraso estimado de solo 0.13 meses. Este retraso, aunque no crítico, debió ser monitoreado para evitar que se ampliara en las fases posteriores del proyecto. Fue recomendable implementar acciones correctivas para recuperar el tiempo perdido y asegurar que el proyecto se mantuviera lo más cercano posible a los plazos establecidos.

3. **Costo**: El control del presupuesto fue efectivo, como lo indicó el índice CPI de 1, lo que demostró que el proyecto se mantuvo dentro de los costos planificados. No se generaron sobrecostos, y los recursos financieros fueron utilizados de manera eficiente. Esto fue un indicio positivo de la gestión financiera del proyecto y su viabilidad económica hasta la fecha.

En general, el proyecto estuvo bajo control en cuanto a costos y se identificaron áreas de mejora en términos de tiempo. La clave fue mantener la vigilancia sobre el cronograma y tomar medidas para evitar que el retraso se agravara. Si se gestionaron adecuadamente estos aspectos, el proyecto tuvo altas probabilidades de cumplir con sus objetivos finales en términos de alcance, tiempo y costo.

7. ANEXOS

ANEXO 1. Informe Contrato de Prestación No 627 de 2023

ANEXO 2. Informe Contrato de Consultoría (Interventoría Técnica) No 001 de 2024

ANEXO 3. Informe Contrato de prestación de Servicios No. 619 de 2024

Revisó:

FRANCISCO JAVIER MENDOZA NIÑO
Supervisor designado

Aprobó:

CARLOS OCTAVIO SARMIENTO GRANADOS
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Sostenible

Elaboró:

SANDRA LILIANA FRANCO C.
Profesional de apoyo a supervisión
