CONTRATO DE CONSULTORIA N° CC 0110 DE 2024

"DESARROLLAR EL PROCESO DE PRE CONSULTA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO ESTUDIO PARA LA DELIMITACION DE LOS CAUCES PERMANENTE Y LINEA DE MAREAS MAXIMAS EN EL PROCESO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO RANCHERIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. BPIN 20233218000004"

INFORME FINAL

CONTRATISTA: CONSORCIO PRECONSULTA RH RANCHERIA

RIOHACHA, LA GUAJIRA

MARZO DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. CONSULTA PREVIA 6
3. ETAPAS DE LA CONSULTA PREVIA 7
ETAPA 1. PRECONSULTA Y APERTURA 9
ETAPA 2. CONSULTA PREVIA 11
ETAPA 3. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 13
4. AVANCES DE LA PRE - CONSULTA Y APERTURA 16
ETAPA 1. PRECONSULTA Y APERTURA 16
5. TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 21
5.1 GENERALIDADES 21
5.2 TALLERES REALIZADOS 21
CONTRATO DE CONSULTORÍA 0110 DE 2024 35
6. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERA 36
6.1 INDICADORES DE PRODUCTO DEL PROYECTO 38
6.2 AVANCE TIEMPO 39
6.3 INFORME DE EJECUCIÓN FISICA 39
6.4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 39
6.5 EJECUCIÓN FINANCIERA 42
6.6 ASPECTOS DE SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 44
7. CONCLUSIONES 45

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Fechas de la apertura con las comunidades afros 18
Tabla 2. Comunidades afrodescendientes aperturadas..... 18
Tabla 3. Ruta metodológica consejo comunitario Luis Enrique Martínez 19
Tabla 4. Ruta metodológica consejo comunitario de Oreganal “Macha, Cabo y Lole” 20
Tabla 5. Talleres realizados 22
Tabla 6. Comunidad de Manaure.....23
Tabla 7. Comunidad de Manaure.....24
Tabla 8. Principales resultados de los talleres 25
Tabla 9. Información general del contrato 35
Tabla 10. Presupuesto Oficial.....36
Tabla 11. Ejecución presupuestal.....37
Tabla 12. Ejecución presupuestal y grafica.....38
Tabla 13. Avance en tiempo.....39
Tabla 14. Porcentajes de avance físicos 39
Tabla 15. Relación de Equipo técnico de trabajo de Consulta Previa 40
Tabla 16. Relación de actas 41
Tabla 17. Póliza del contrato 0110 de 2024.....42
Tabla 18. El plan de inversión de anticipo se revisión y aprobó por parte de la interventoría...43
Tabla 19. Planillas personal de Consultoría.....44

1. INTRODUCCIÓN

El ordenamiento del recurso hídrico es una práctica esencial para garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos y el acceso equitativo al agua, un recurso natural de vital importancia. En muchos países, especialmente aquellos con una fuerte protección de los derechos de los grupos étnicos y comunitarios, los proyectos que afectan al agua deben someterse a un proceso de consulta previa. Este proceso tiene como objetivo principal asegurar que las comunidades y pueblos que dependen directamente de los recursos hídricos puedan participar de manera informada y consentida en los proyectos que puedan modificar el uso o distribución del agua en sus territorios.

La definición del acotamiento y las mareas máximas de los ríos es crucial para las comunidades ribereñas por varias razones, tanto en términos de seguridad como de sostenibilidad ambiental y económica. Adicionalmente, la definición del acotamiento es fundamental para garantizar la seguridad, la sostenibilidad y la adaptación ante los cambios naturales y climáticos, así como para promover el desarrollo de una gestión eficiente de los recursos hídricos y territoriales.

Los ejercicios de socialización de proyectos que buscan el acotamiento del recurso hídrico, especialmente en donde se presentan comunidades étnicas y colonos, son fundamentales para garantizar un proceso de ordenamiento territorial inclusivo, técnicamente sólido y sostenible.

La consulta previa, consagrada en diversas normativas internacionales y nacionales, busca reconocer los derechos colectivos de las comunidades, en especial de los pueblos indígenas, y su derecho a decidir sobre el uso de los recursos naturales que tienen un impacto directo en su vida y cultura. En el contexto de proyectos de ordenamiento del recurso hídrico y en especial los planes de manejo ambientales de los acuíferos, las consultas previas son fundamentales para promover una gestión responsable del agua, respetando la diversidad de intereses y promoviendo la equidad en el acceso a este recurso esencial.

Este proceso incluye la entrega de información clara y comprensible a las comunidades afectadas, el diálogo abierto sobre los posibles impactos sociales, culturales y ambientales, y la obtención del consentimiento previo, libre e informado antes de la ejecución de los proyectos. Así, las consultas previas en proyectos de ordenamiento del recurso hídrico no solo son una herramienta legal, sino también un mecanismo que fortalece la gobernanza del agua, fomentando la participación activa y la colaboración entre los diferentes actores involucrados.

También se incluye la socialización del proyecto y sus alcances a las comunidades asentadas en el área de influencia directa del río Ranchería, como un diálogo abierto en donde se abordaran las definiciones que se requieren para el abordaje del tema, como ronda hídrica, acotamiento, cauce principal, línea de mareas, etc. Así como los criterios técnicos, marco metodológico y las etapas que se siguen en el desarrollo de este tipo de proyectos. Al igual, que los impactos potenciales del mismo.

En el desarrollo del proyecto “DESARROLLAR EL PROCESO DE PRE CONSULTA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO ESTUDIO PARA LA DELIMITACION DE LOS CAUCES PERMANENTE Y LINEA DE MAREAS MAXIMAS EN EL PROCESO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO RANCHERIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”, se sigue lo planteado en las directivas presidenciales No. 10 de 2013 y No 8 de 2020, apoyándonos en diferentes propuestas metodológicas para el abordaje de los diferentes actores para garantizar una efectiva participación de una manera diferencial teniendo en cuenta las características de las comunidades étnicas del área de estudio.

En el presente informe, se describen los principales aspectos en el desarrollo del proyecto, iniciando con una conceptualización en la Consulta Previa, resaltando que el alcance de este proyecto es solamente el desarrollo de la preconsulta y apertura del proceso consultivo. Seguidamente, se mencionan algunos aspectos relativos al desarrollo metodológico y finalmente se describen los principales resultados del ejercicio participativo.

2. CONSULTA PREVIA

2.1 Contextualización general

La consulta previa es un derecho fundamental de las comunidades étnicas y comunidades locales que se reconoce en diversas normativas internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este derecho busca asegurar que las comunidades sean consultadas de manera libre, informada y de buena fe antes de la implementación de proyectos o actividades que puedan afectar sus territorios, recursos naturales, cultura o modo de vida.

Este derecho lo tienen los grupos étnicos, como mecanismo para poder decidir sobre medidas (legislativas y administrativas) o proyectos, obras o actividades que se vayan a realizar dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación. Este mecanismo de participación es un derecho constitucional colectivo y un proceso de carácter público especial y obligatorio que debe realizarse previamente, siempre que se vaya a adoptar, decidir o ejecutar alguna medida administrativa o proyecto público o privado, susceptible de afectar directamente las formas de vida de los grupos étnicos nacionales en sus aspectos territorial, ambiental, cultural, espiritual, social, económico y de salud, y otros aspectos que incidan en su integridad étnica.

En el contexto de una consulta previa para definir la ronda de un río, este proceso implica consultar a las comunidades locales que dependen directamente de los recursos hídricos y que pueden verse afectadas por el acotamiento y definición de las líneas máximas de mareas sobre la ronda del rio, dado que deberán armonizar sus formas de vida a modelos que por una parte sean seguros desde el punto de vista de la prevención de riesgos de desastres para las comunidades ribereñas y por otra, que sean actividades sostenibles compatibles con la conservación del río y los ecosistemas asociados.

Estos procesos consultivos y sus diferentes etapas, tiene una serie de características claves que podemos mencionar, tales como:

- Libertad e imparcialidad: La consulta debe ser voluntaria, libre de coacción y ofrecer un ambiente donde las comunidades puedan expresar sus opiniones sin temor a represalias.

•Cultura y tradiciones: El proceso debe respetar las costumbres y formas de organización de las comunidades, promoviendo el uso de sus lenguas nativas y adaptándose a sus formas de participación.

- Fase temprana: La consulta debe llevarse a cabo en una etapa temprana del proceso de toma de decisiones, cuando las opciones todavía pueden modificarse o ajustarse según las opiniones de las comunidades.
- Transparencia: Toda la información proporcionada debe ser clara y accesible, permitiendo que las comunidades tomen decisiones informadas sobre su participación y los posibles impactos.

Estas características, permiten garantizar que las comunidades ribereñas y las comunidades étnicas certificadas, tengan un rol activo en las decisiones que afectan sus territorios y recursos naturales, como la definición de la ronda de un río, asegurando que sus derechos, necesidades y conocimientos sean respetados y valorados en el proceso.

3. ETAPAS DE LA CONSULTA PREVIA

En Colombia los lineamientos para la Consulta Previa con comunidades étnicas, son establecidos por las directivas presidenciales No 10 de 2013 y No. 8 de 2020, las cuales se enmarcan en el respeto por garantizar el respeto por sus derechos fundamentales. Este proceso se realiza para garantizar la participación de dichas comunidades en decisiones que puedan afectar su integridad cultural, social, económica o ambiental. A continuación, se describen las principales etapas y en qué consisten:

1. Certificación.

2. Coordinación y preparación.

3. Preconsulta y apertura.

4. Consulta Previa.

5. Seguimiento de acuerdos.

Estas, a su vez, comprenden dos momentos o fases misionales que son:

A. Certificación: En esta, una persona natural o jurídica interesada en ejecutar un proyecto, obra o actividad solicita una certificación a la Dirección de Consulta Previa

para saber si hay presencia de grupos étnicos en el área de influencia del proyecto. Después, la Dirección de Consulta Previa emite un concepto en relación a la solicitud hecha por la persona natural o jurídica, haciendo uso de las bases de datos de las cuales dispone (provenientes de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías; la Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras; el INCODER; y la información cartográfica IGAC DCP). Posteriormente, se realiza una verificación de campo con presencia del solicitante y de las autoridades de las comunidades étnicas para recopilar información que le permita a la Dirección de Consulta Previa emitir el concepto geográfico y especial. Cuando la información disponible es suficiente para emitir el concepto sobre presencia de grupos étnicos, se procede a la certificación. Y al finalizar, se envía citatorio para notificación personal. En caso de no notificarse personalmente, se notifica por aviso.

B. Gestión: Si se determina que hay presencia de grupos étnicos, y en la medida que la actividad lo requiera, se debe solicitar el inicio de la Consulta Previa. La Consulta Previa, por su parte, persigue la siguiente ruta de trabajo: coordinación y preparación; preconsulta; consulta; seguimiento y cierre.

Las dos primeras etapas, corresponde a un proceso administrativo interno que se desarrolla entre el ejecutor del proyecto y la dirección de la autoridad nacional de la consulta previa DANCP, en la cual se determina si hay presencia de grupos étnicos y se determinan la procedencia y oportunidad para el desarrollo de la consulta previa, y finalmente, se establecen los mecanismos para su abordaje y la Ruta Metodológica que se propondrá a las comunidades.

Durante la reunión de coordinación y preparación (que puede ser virtual o presencial), se diseña las estrategias para facilitar el proceso de consulta. Además, identificar si el proceso de consulta requiere consentimiento previo, libre e informado, según si se configura alguna de las tres hipótesis que lo requieren, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional: a. Cuando la intervención implique el traslado o desplazamiento de las comunidades. b. Cuando la intervención esté relacionada con el almacenamiento o vertimiento de desechos tóxicos en las

tierras étnicas. c. Cuando la intervención represente un alto impacto social, cultural y ambiental en una comunidad étnica, que conlleve poner en riesgo la existencia de la misma.


Etapa 1. Preconsulta y Apertura

Esta etapa busca realizar un dialogo previo con los representantes de las comunidades étnicas involucradas, con el propósito de definir la ruta metodológica que debe seguir el ejecutor del POA, y los términos en que será realizado el proceso según las especificidades culturales de cada una de las comunidades étnicas. Esta etapa puede considerarse la primera etapa de un proceso consultivo y es la que se busca alcanzar bajo el objeto contractual del contrato de consultoría No. 0110 de 2024.

En esta etapa, se deben convocar a los representantes de las comunidades étnicas certificadas, al ejecutor, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, a través de todos los medios que estén a su disposición.

La DANCP debe presentar a las comunidades el marco jurídico de la consulta previa. La información debe incluir qué es la consulta previa, cuál es su fundamento normativo en Colombia, y que derechos y obligaciones implica. La información que se brinde debe ser completa y clara. Igualmente, el ejecutor debe presentar el programa, proyecto, obra o actividad - POAs a las comunidades, garantizando la gestión oportuna y transparente de información suficiente y clara.

Figura 1. *Pasos específicos: Etapa de Preconsulta*

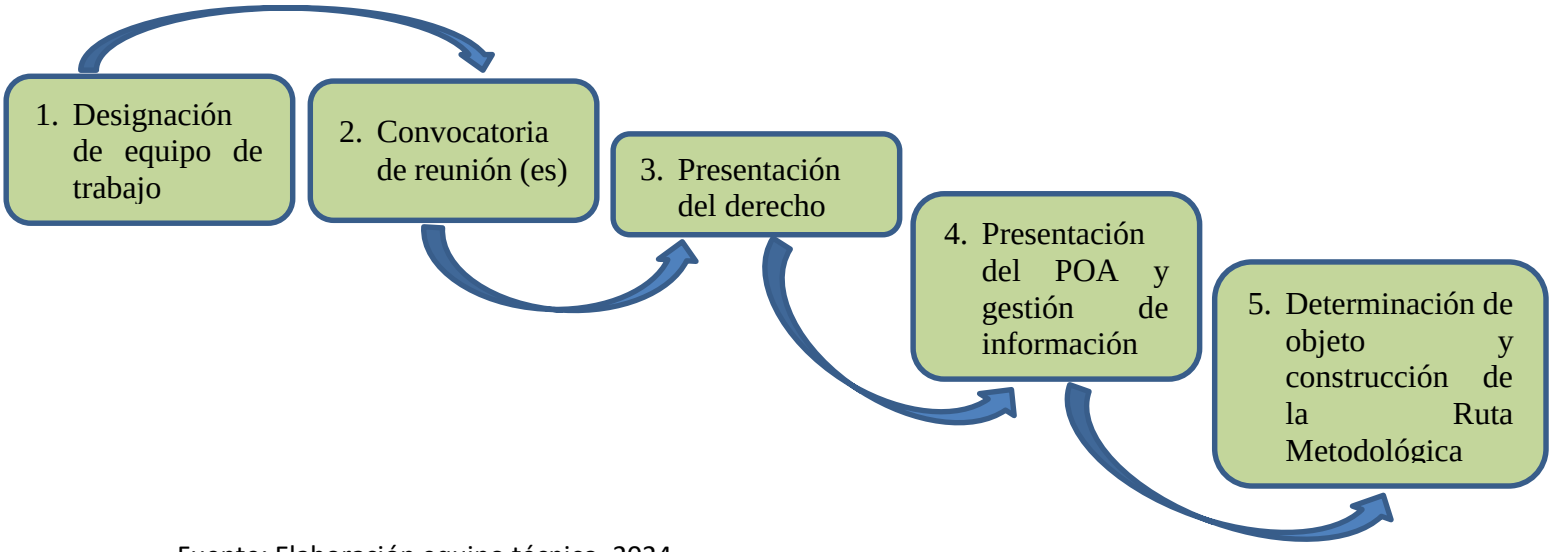

Fuente: Elaboración equipo técnico, 2024.

En la Ruta Metodológica, se definen las fechas para las etapas siguientes, en un cronograma claro con un presupuesto concertado por las partes. Además, se plantean las formas en las que se convocaran los representantes de las comunidades según los medios a las que éstas tengan mejor y más fácil acceso. El lugar donde se van a llevar a cabo cada una de las actividades relacionadas al proceso de consulta previa.

La evidencia de surtir la etapa corresponde al acta de la reunión de pre – consulta y apertura. Con sus respectivos soportes tales como. La presentación del marco normativo de la consulta previa, la presentación del ejecutor, la ruta metodológica concertada y la lista de asistencia.


Acciones:

- Reunión inicial con las comunidades y sus representantes.
- Acordar cronograma, idioma, lugar y metodología del proceso.

Etapa 2. Consulta Previa

Esta etapa, se encuentra por fuera del objetivo contractual, sin embargo, para efectos descriptivos e informativos se aborda. En ella se desarrolla un diálogo entre el Estado, el Ejecutor y las Comunidades Étnicas, para que la DANCP asegure el cumplimiento del deber de garantizar su participación real, oportuna y efectiva sobre la toma de decisiones de POAs que puedan afectar directamente a las comunidades, con el fin de proteger su integridad étnica y cultural.

Figura 2. *Pasos específicos: Etapa de Consulta Previa*

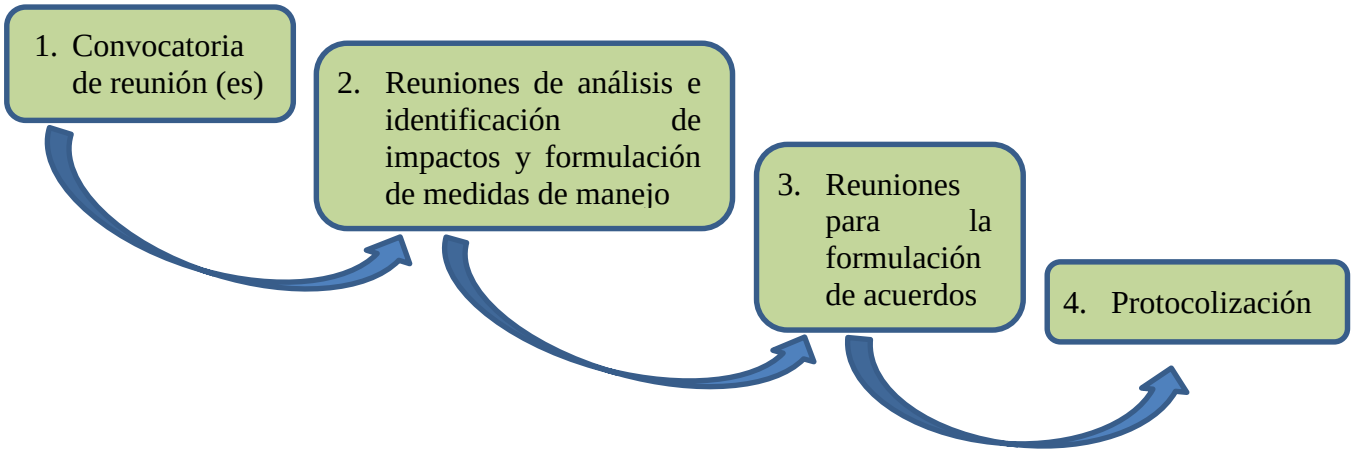

Fuente: Elaboración equipo técnico, 2024

Paso 1. Convocatorias a las reuniones de Consulta.

Se convoca a las partes, a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo según la certificación o resolución de procedencia vigente que reposa en el Ministerio del Interior.

Paso 2. Desarrollo de reuniones de análisis e identificación de impactos y formulación de medidas de manejo.

En esta fase de la etapa de Consulta Previa, el ejecutor siempre explicara la información del proyecto de manera adecuada teniendo en cuenta los usos y costumbres y en la lengua de la comunidad étnica de ser necesario.

Las medidas de manejo propuestas deben estar relacionadas con la afectación que potencialmente generará el proyecto. Las medidas que se determinen deben cumplir alguno de los siguientes criterios:

-Prevenir
-Corregir
-Mitigar
-Compensar

Las medidas de manejo deberán guardar proporción y relación directa con los impactos generados por el POA consultado a la comunidad. Así mismo, si las comunidades étnicas solicitan alguna medida de manejo que requiera la autorización o participación de otras entidades públicas, la DANCP convocará a la entidad pública competente.

El resultado de este ejercicio es la construcción participativa, es una matriz de identificación de impactos y medidas de manejo, que hace parte integral del acta generada durante la reunión.

Paso 3. Desarrollo de reuniones para la formulación de acuerdos

La DANCP debe convocar a los representantes de las comunidades étnicas, al ejecutor del proyecto. a las entidades públicas, a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo en los lugares y fechas acordados en la ruta metodológica para tratar de alcanzar acuerdos producto de la consulta previa con las medidas de manejo acordadas y los plazos para ejecutarlas.

Si el proyecto no necesita la obtención del consentimiento previo. libre e informado, según lo dispuesto por la jurisprudencia constitucional, y no es posible llegar a un acuerdo con la comunidad, las entidades competentes deberán valorar plenamente las inquietudes y expectativas de las comunidades étnicas con el fin de evitar, mitigar, corregir, prevenir o compensar la afectación que eventualmente pueda derivarse de la ejecuci6n del proyecto. La decisión de las autoridades competentes debe estar desprovista de arbitrariedad; en consecuencia, debe ser objetiva, razonable y proporcionada a la finalidad constitucional que le exige al estado la protección de la identidad social, cultural y económica de la comunidad.
Producto de esta fase, se genera un acta que contiene una matriz de preacuerdos, que responden a las medidas de manejo y a la proporcionalidad de los impactos derivados del proyecto.

Paso 4. Protocolización

Esta fase de la consulta previa, consiste en validar los pre-acuerdos planteados en la etapa anterior y llevarlos a acuerdos, que la entidad ejecutora se compromete a realizar en los tiempos y la magnitud acordados. Igualmente, se establece un comité de seguimiento para hacerle requerimientos periódicos al responsable del POA para verificar los avances de los acuerdos.

Etapa 3. Seguimiento de acuerdos


Esta etapa permite asegurar, que los acuerdos protocolizados en la consulta previa sean efectivamente realizados por las partes, según los plazos acordados con las comunidades étnicas.

La DANCP funge como garante del proceso y debe hacer requerimientos periódicos al responsable del POA para verificar que se están cumpliendo los acuerdos, Igualmente, liderará la conformación del Comité de Seguimiento y definirá sus miembros. Así mismo, debe

convocar a las partes, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a las autoridades ambientales a las reuniones de seguimiento según lo pactado en la consulta previa.

Finalmente, la DANCP debe comunicarse de manera periódica con las comunidades para verificar que sí se están cumpliendo los acuerdos. Si dado el caso, se cumplen la totalidad de los acuerdos, deberá convocar a las partes, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a las autoridades ambientales a la reunión de **cierre** de la consulta previa.

Figura 3. *Pasos Específicos: Etapa De Seguimiento De Acuerdos*



Fuente: Elaboración equipo técnico, 2024

Paso 1. Requerimientos periódicos a los responsables en los plazos acordados con las comunidades.

La DANCP tiene la obligación de hacer requerimientos periódicos al responsable del proyecto para verificar el cumplimiento de los acuerdos en los plazos acordados con las comunidades.

Paso 2. Cierre de consulta

La DANCP convocará a las comunidades étnicas, al ejecutor del proyecto, a las entidades competentes, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a las

autoridades ambientales a la reunión de cierre de la consulta previa, una vez se cumplan **la totalidad de los acuerdos** acordados entre el ejecutor y las comunidades étnicas. El producto de esta reunión, corresponde a un acta en el cual se establece el cierre formal de la Consulta Previa.

Acciones:

- Establecimiento de comités de seguimiento.
- Presentación de informes periódicos a las comunidades y entidades competentes.

Resultado: Evidencia documentada del cumplimiento de los acuerdos.

4. AVANCES DE LA PRE - CONSULTA Y APERTURA

En el marco del proyecto de DESARROLLAR EL PROCESO DE PRE CONSULTA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO ESTUDIO PARA LA DELIMITACION DE LOS CAUCES PERMANENTE Y LINEA DE MAREAS MAXIMAS EN EL PROCESO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO RANCHERIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, el proceso de *consulta previa* es clave para garantizar la participación y los derechos de las comunidades que podrían verse afectadas por el uso o manejo de este recurso vital (el agua).

Los avances del proceso de pre - consulta y apertura, no solo se limitan a cumplir con las normativas legales, sino que se traducen en un proceso más inclusivo, transparente y respetuoso de los derechos de las comunidades, que legitima la participación de las comunidades étnicas. Esto, a su vez, potencia la sostenibilidad y el éxito a largo plazo del proyecto, garantizando una gestión más equitativa y eficiente del agua y sus ecosistemas asociados. A continuación, se describen los principales avances del proceso de pre – consulta y apertura.

ETAPA 1. PRECONSULTA Y APERTURA

En el desarrollo del PROCESO DE PRE CONSULTA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO ESTUDIO PARA LA DELIMITACION DE LOS CAUCES PERMANENTE Y LINEA DE MAREAS MAXIMAS EN EL PROCESO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO RANCHERIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, registrado en la DANCP bajo el código de identificación interno No. PROY-03142, pudimos Surtir la etapa de la pre-consulta y apertura con los dos consejos comunitarios certificados, tales como: Luis Enrique Martínez del corregimiento de Sitio Nuevo en jurisdicción del municipio de Fonseca y Negros Cimarrones de Oreganal “Macha, Cabo y Lole” localizado en el corregimiento de Oreganal en jurisdicción del municipio de Barrancas. Este avance, suponen un avance del 100 % con las comunidades certificadas para el proceso, sin embargo, teniendo en cuenta lo

establecido en el alcance contractual, se debieron adelantar de manera complementaria, una serie de 34 talleres, para un total de 36 talleres para la socialización del proyecto y darle mayor cobertura al ejercicio de participación del proyecto de acotamiento. Ver actas anexas.

En el desarrollo de las reuniones se iniciaron con espacios de armonización con oraciones y un mensaje de bienvenida y reconocimiento cultural.



Imagen 1. Espacio de armonización CC Negros cimarrones de Oreganal “Macha, Cabo y Lole”.

Tabla 1. Fechas de la apertura con las comunidades afros

Etapa/Reunión	Fecha	REUNIÓN CUMPLIDA		Observaciones
		Sí	No	
Coordinación y Preparación	24 septiembre 2024	X		Surtida
Preconsulta y apertura	13 diciembre 2024	X		Surtida
Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo				
Formulación de Acuerdos y Protocolización				
Seguimiento de Acuerdos				
Cierre de Consulta				

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Comunidades afro descendientes aperturadas

Nombres	Cargo	Consejo comunitario
Julián Andrés Brito Gámez	Representante Legal	Consejo comunitario Luis Enrique Martínez
María Manuela Ureche	Representante Legal	Consejo comunitario Negros Cimarrones de Oreganal "Macha, Cabo y Lole"

Fuente: Elaboración propia

Las rutas metodológicas concertadas, se presentan a continuación:

Tabla 3. Ruta metodológica consejo comunitario Luis Enrique Martínez

RUTA METODOLÓGICA CONSEJO COMUNITARIO LUIS ENRIQUE MARTINEZ					
Etapa	**Fase**	**Lugar**	**Fecha**	**Hora**	**Participantes**
Pre - Consulta y apertura	Pre - consulta	Corregimiento de Sitio Nuevo - Fonseca	13 de diciembre 2024	9 a.m	CORPOGUAJIRA, comunidad y DANCP
Consulta Previa	Socialización del proyecto a la comunidad	Sede del Consejo Comunitario - Cto. Sitio Nuevo	25 de Enero de 2025	9 a.m	Comunidad
	Pre - taller	Sede del Consejo Comunitario - Cto. Sitio Nuevo	8 de Febrero de 2025	9 a.m	CORPOGUAJIRA y comunidad
	Taller de Análisis e identificación de impactos y definición de medidas de manejo	Sede del Consejo Comunitario - Cto. Sitio Nuevo	29 de Marzo de 2025	9 a.m	CORPOGUAJIRA, comunidad y DANCP
	Pre - acuerdos	Sede del Consejo Comunitario - Cto. Sitio Nuevo	10 de Mayo de 2025	9 a.m	CORPOGUAJIRA y comunidad
	Formulación de acuerdo y protocolización	Sede del Consejo Comunitario - Cto. Sitio Nuevo	14 de Junio de 2025	9 a.m	CORPOGUAJIRA, comunidad y DANCP

Para el consejo comunitario Luis Enrique Martínez, según la ruta concertada se requerirán el desarrollo de cinco reuniones para protocolizar el proceso consultivo, teniendo en cuenta que proponen la realización de dos encuentros entre la comunidad y CORPOGUAJIRA, cada uno previo al espacio formal de consulta previa. Además de un espacio, solo para la participación de las comunidades.

Tabla 4. Ruta metodológica consejo comunitario ancestral de Oreganal “Macha, Cabo y Lole”

RUTA METODOLÓGICA CONSEJO COMUNITARIO ANCESTRAL DE OREGANAL "MACHA, CABO Y LOLE”						
Etapa	**Fase**	**Lugar**	**Fecha**	**Hora**	**Participantes**	**Observación**
Pre - Consulta y apertura	Pre - consulta	Corregimiento de Oreganal	13 de diciembre 2024	2 p.m	CORPOGUAJIRA, comunidad y DANCP	
Consulta Previa	Pre - taller	Salón comunal del Corregimiento de Oreganal	15 de Febrero de 2025	9 a.m	CORPOGUAJIRA y comunidad	Se adelantará un recorrido con algunos miembros de la comunidad en sitios de interes sobre la ronde del Río Ranchería y el arroyo de PozoHondo
	Taller de Análisis e identificación de impactos y definición de medidas de manejo	Salón comunal del Corregimiento de Oreganal	22 de Marzo de 2025	9 a.m	CORPOGUAJIRA, comunidad y DANCP	
	Pre - acuerdos	Salón comunal del Corregimiento de Oreganal	17 de Mayo de 2025	9 a.m	CORPOGUAJIRA y comunidad	
	Formulación de acuerdo y protocolización	Salón comunal del Corregimiento de Oreganal	21 de Junio de 2025	9 a.m	CORPOGUAJIRA, comunidad y DANCP	

De la misma manera, el consejo comunitario ancestral de Oreganal “Macha, Cabo y Lole”, propone la realización de dos espacios entre la comunidad y CORPOGUAJIRA, cada uno previo a los espacios formales de protocolización definidos, como son taller de análisis e identificación de impactos y definición de medidas de manejo y formulación de acuerdos y protocolización.

5. TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO

5.1 Generalidades

Los ejercicios de socialización de proyectos que buscan el acotamiento del recurso hídrico, especialmente en donde se presentan comunidades étnicas y colonos, son fundamentales para garantizar un proceso de ordenamiento territorial inclusivo, técnicamente sólido y sostenible. Principalmente, si se tiene en cuenta que sus prácticas productivas y usos y costumbres, son el resultado de la acumulación de experiencia, basada en el ensayo y error y trasmitidas de generación en generación. Lo que supone, que la interacción con estos actores en los talleres de participación son fundamentales, porque por una parte, permite conocer su interacción con el recurso hídrico desde el punto de vista de los riesgos naturales, como la vulnerabilidad a inundaciones y erosión, y por otra parte, porque permite identificar los usos del recurso hídrico por estas comunidades.

Las comunidades locales poseen conocimientos tradicionales sobre la dinámica del agua y su relación con el territorio. Por lo tanto, la participación de estas es clave para un ordenamiento territorial participativo y efectivo, garantizando la conservación de las rondas y la sostenibilidad del recurso. En donde juegan un papel fundamental para la definición de la línea máxima de mareas, teniendo en cuenta los procesos históricos de inundaciones y las afectaciones que estas les pueden generar y permitan acotar de manera participativa de las rondas hídricas.

Los ejercicios comunitarios para la definición del acotamiento de la ronda hídrica de una cuenca hidrográfica, obedecen a los establecidos en la ley 1450 de 2011 y lo contenido en el decreto 2245 de 2017 y la resolución 957 de 2018 y suman de manera significativa a los ejercicios de interpretación de imágenes de satélites, la fotointerpretación, análisis geográficos, hidrológicos y geomorfológicos y demás trabajos de campo en el desarrollo de los criterios para el acotamiento.

5.2 Talleres realizados

A continuación, se describen los principales resultados de los talleres adelantados en el desarrollo del proyecto. Además, se adelantaron dos talleres con los funcionarios de las secretarias de asuntos indígenas de los municipios de Manaure y Maicao, espacio que sirvió además para la identificación de las autoridades tradicionales, líderes y localizaciones de las

comunidades. Se realizaron en total 36 talleres con la participación de 595 asistentes en total. Ver actas anexas.

Tabla 5. Talleres realizados

Municipio	No Talleres	No total de participantes
Manaure	23	400
Riohacha	6	94
Albania	4	64
Fonseca	1	12
Barrancas	1	18
Maicao	1	7

Fuente: Elaboración propia.

Durante la reunión en Manaure, contamos con el apoyo de varios funcionarios en donde destacamos al Dr. Felipe Epiayú quien conoce muy bien el territorio y maneja las bases de datos de las comunidades del municipio, con el cual pudimos identificar el contacto y nombre de los líderes y de las autoridades de más del 80 % de las comunidades, lo que facilitará el proceso de socialización. De las 62 comunidades registradas para esta jurisdicción, se encontraron dos comunidades mal identificadas como son: EL MAMÓN – IPAKA y PIRRAWAITAMANA – PIRRUWAITAMANA, siendo realmente la primera reconocida como El MAMÓN y la segunda como PIRRUWAITAMANA.

Tabla 6. Comunidad de Manaure

Comunidades - Manaure	
MULUJUICHÓN	POROMANA
ISHAKAT	ALUISIRA
PANERAKAT	SAINN
PALENSAMANA	VILLANCAL
PAKIMANA	PATSOAIN (UTALERA)
EL MAMÓN - IPAKA	KEPISCHONT
WARUTTAIN II	BUENAVISTA
WARUTTAIN I	PERRAKAT
WALAPAIJIMANA	SANTA FE
KAYUSHUWARALU	PIRRAWAITAMANA - PIRRUWAITAMANA
SANTA CRUZ	CHISPANA
EL GUAJIRO	LA FLORIDA
JALIJANAKAT	PIRUAITAKAT
BUENOS AIRES - WINPIRAREN	WANARE
MAUWAEIRRA	WAYALAIN
ANALIPA	KAQUETAMANA
JASAINAPO	PIPAMANA
PIPAMANA	CANAAN
PANCHO	ASAALEKAT
LOS CARACOLES I (VARUTTOU)	ANTOMASOMANA
LAS TRES HERMANAS (LOS CARACOLES II)	CHIBOLO/CHIVOLO
WASIMO	CARCLOCTAMANA (KARROLOUTAMANA)
MARBELLA	ERAPU - LA RAYA
EIRATAMANA	JAWAPIAKAT
KARALOUTAMANA	KATURALINCE
MAISHIT (Vía a Mayapo - Comunidad Arenal)	PACTALIA
PANMANA (PETSHOSHI)	PERROHULIA - PERROHURIA
PORUMATCHON (MATNASIRA)	PIRRUWAITAMANA
KATÜRÜLÜINSE	PIULAKA
YALETSHI	MAUROUYEN - MARAUYEN
MAKULEMA	WAIMARAL

Fuente: Elaboración propia.

En el municipio de Maicao, hicimos igualmente un ejercicio para la identificación de las autoridades y líderes de las comunidades y contamos con el apoyo del dr. Luis Montenegro, con el cual, pudimos identificar que de las 13 comunidades listadas en el documento técnico, cinco (5) no están reconocidas a nivel municipal (LAS DOS COSAS, WAIROULIAT, SHIPOKOT, PATTAPA, WARAKAMANA, una se encuentra al interior del casco urbano del municipio de Maicao (TALOULAMANA) y una que estaría por fuera de la jurisdicción de la cuenca del Ranchería por encontrarse en la zona del Cerro de la Teta en la zona limítrofe con el municipio de Uribia (LA MONTAÑITA).

Tabla 7. Comunidades de Maicao

Comunidades Maicao
LAS DOS COSAS
IRRUANARI - IRRUALU
WEPIAPA
JAMANARE - AMARE
ULUWAMANA - URUWAMANA
WAIROULIAT
SHIPOKOT
PATTAPA
LA MONTAÑITA
EL PORVENIR
ACUARÚ
TALOULAMANA
WARAKAMANA

Fuente: Elaboración propia.

Estos ejercicios con los entes territoriales en donde se concentraba la mayoría de comunidades contenidas en documento técnico, permitieron identificar y la gestión de la información de las autoridades, líderes y localización de las comunidades, especialmente asentadas en la cuenca hidrográfica del rio Ranchería.

Tabla 8. Principales resultados de los talleres

Ítem	Reunión	Fecha	Lugar	Hora	Asistentes	Observaciones
1	Reunión de Preconsulta y apertura – PROY-03142. Consejo comunitario Luis Enrique Martínez.	13/12/2024	Corregimiento de Sitio Nuevo- Municipio de Fonseca	9:00 a.m	12	Se adelantó la etapa de pre consulta y apertura del "Estudio de Acotamiento de las Rondas Hídricas de la Subzona Hidrográfica del Río Ranchería en el departamento de La Guajira "PROY-03142, con los representantes del consejo comunitario y miembros de la comunidad.
2	Reunión de Preconsulta y apertura – PROY-03142. Consejo comunitario Negros Cimarrones de Oreganal "Macha, Cabo y Lole".	13/12/2024	Corregimiento de Oreganal- Municipio de Barrancas	2:00 p.m	18	Se adelantó la etapa de pre consulta y apertura del "Estudio de Acotamiento de las Rondas Hídricas de la Subzona Hidrográfica del Río Ranchería en el departamento de La Guajira "PROY-03142, con los representantes del consejo comunitario y miembros de la comunidad.
3	Taller Oficina de Asuntos Indígena de Manaure	23/01/2025	Municipio de Manaure	10 a.m	4	Revisión de base de datos de comunidades indígenas para identificar a las autoridades y líderes de las comunidades, así como la localización de las mismas comunidades contenidas en el documento técnico del ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HÍDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RÍO RANCHERÍA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
4	Taller comunidad de El Rocio	24/01/2025	Comunidad de El Rocio, municipio de Albania	10:00 a.m	13	La comunidad está en una zona alta, por esta razón no se inunda, pero a pocos metros tienen el afluente hídrico.

5	Taller comunidad Jawapiakat	27/01/2025	Comunidad Jawapiakat, municipio de Manaure	2:00 p.m	26	Esta comunidad manifestó la importancia de estos espacios para la sensibilización de la comunidad frente a los procesos de inundaciones.
6	Taller Oficina de Asuntos Indígenas de Maicao	29/01/2025	Municipio de Maicao	9:00 a.m	7	Se revisaron las bases de datos de las comunidades indígenas para identificar a las autoridades y líderes de las comunidades, así como la localización de las mismas comunidades contenidas en el documento técnico. Es preciso resaltar que en el municipio se desconoce la injerencia de éste en la cuenca del río Ranchería, a pesar de tener algunas comunidades en esta cuenca hidrográfica.
7	Taller comunidad de Cangrejito	30/01/2025	Comunidad de Cangrejito, Municipio de Manaure	9:00 a.m	37	La comunidad pidió que se adelantará otro espacio, dado que consideran que esta información debía llegar a más miembros de la comunidad.
8	Taller comunidad La Raya	05/02/2025	Comunidad de La Raya, Municipio de Manaure	2:30 p.m	16	En la comunidad quedan incomunicados en invierno, quedan en medio del agua sin poder desplazarse en la misma comunidad Quedan sin leña lo que se traduce en una gran problemática al momento de realizar sus alimentos
9	Taller comunidad de Chispana	06/02/2025	Comunidad de Chispana, Municipio de Manaure	9:00 a.m	13	El rio queda a 3 kilómetros de la comunidad y en la última temporada invernal quedo a distancia de 1 kilómetro las inundaciones, perjudicando los animales, quienes se enferman y mueren. Quedan sin leña lo que se traduce en una gran

						problemática al momento de realizar sus alimentos.
10	Taller comunidad Pancho	07/02/2025	Comunidad de Pancho, Municipio de Manaure	3:00 p.m	20	Participantes a la reunión manifiestan que el mayor impacto de inundación en la comunidad es cuando abren la represa del rio ranchería, antes de esta represa no se había presentado tanta agua en la comunidad. Las viviendas se afectan grandemente teniendo en cuenta su material
11	Taller comunidad de Aluisira	12/02/2025	Comunidad de Aluisira, Municipio de Manaure	2:00 p.m	16	El líder manifiesta que el rio se colmato y perdió el borde del rio en la zona • No hay orilla para los animales • Quedan sin leña lo que se traduce en una gran problemática al momento de realizar sus alimentos.
12	Taller comunidad Buenavista	13/02/2025	Comunidad de Buenavista, Municipio de Manaure	10:00 a.m	26	En la comunidad se pierden los caminos en época de lluvia. • Quedan sin leña lo que se traduce en una gran problemática al momento de realizar sus alimentos.
13	Taller comunidad de Poromana	13/02/2025	Comunidad de Poromana, Municipio de Manaure	4:00 p.m	21	La comunidad se llena de agua pero por fortuna no pierde acceso por que está a pocos metros de la troncal del Caribe.
14	Taller comunidad de Kalerakimana	14/02/2025	Comunidad de Kalerakimana, municipio de Riohacha	8:30 a.m	13	La comunidad la cual se encuentra basta retirada de la carretera queda totalmente bajo el agua, sin ningún tipo de acceso, con dificultades a nivel de salud por la exposición por largos periodos a la humedad y agua acumulada, la imposibilidad de salir de las comunidades a buscar un centro de salud con los enfermos, la dificultad de acceder a los servicios de alimentación que se deben adquirir fuera de la comunidad Kalerakimana

						y 10 más comunidades que se encuentran alrededor.
15	Taller comunidad de Kurrati	14/02/2025	Comunidad de Kurrati, Municipio de Riohacha	4:00 p.m	20	Quedan sin leña lo que se traduce en una gran problemática al momento de realizar sus alimentos
16	Taller comunidad de Alijunakimana	15/02/2025	Comunidad de Alijunakimana, Municipio de Riohacha	2:30 P.M	13	La comunidad queda bajo el agua en época de lluvia, quedan sin vía, para sacar a los niños al colegio lo deben hacer en poncheras y cambiar en la carretera. • Se están presentando procesos erosivos tanto en la comunidad como en su cementerio.
17	Taller comunidad La Gloria	17/02/2025	Comunidad La Gloria, Municipio de Manaure	3:00 p.m	15	El rio queda a 4 kilómetros de la comunidad y en la última temporada invernar quedo a distancia de 1 kilómetro las inundaciones, perjudicando los animales, quienes se enferman y mueren. Resaltan la importancia de este proyecto para las comunidades y agradecen la presencia de representantes de CORPOGUAJIRA.
18	Taller comunidad de Palmarete	19/02/2025	Comunidad de Palmarete, Municipio de Manaure	9:00 a.m	19	En temporada de invierno la comunidad se inunda, perjudicando los animales, quienes se enferman y mueren. • Quedan sin leña lo que se traduce en una gran problemática al momento de realizar sus alimentos.
19	Taller comunidad de Eirratamana	19/02/2025	Comunidad de Eirratamana, Municipio de Manaure	4:00 p.m	10	Resaltan la importancia de este proyecto para las comunidades y agradecen la presencia de representantes de CORPOGUAJIRA, dado que nunca se habían acercado a esta comunidad.

20	Taller comunidad de Aujero	20/02/2025	Comunidad de Aujero, Municipio de Riohacha	10:00 a.m	11	Se deforesto una zona importante en la ronda del rio y su zona de influencia. • Se Inunda y llega hasta la carretera el agua en época invernal, causando problemas en la calidad de vida se sus habitantes. • Manifiesta que siempre han estado abandonados por el Estado.
21	Taller comunidad de Makurema	21/02/2025	Comunidad de Makurema, Municipio de Riohacha	2:30 p.m	17	Las autoridades presentes en la reunión representan a 8 comunidades cercanas y manifiestan que son afectados en época invernal, el agua llega a sus comunidades, afectando las viviendas, daña los caminos, se enferman y mueren los animales y nunca hay presencia del estado en la emergencia. • Todas las ayudas se concentran en Cucurumana, a ellos los convocan les piden firmas y nunca ven la materialización de las ayudas.
22	Taller comunidad de Wasimo	22/02/2025	Comunidad de Wasimo, Municipio de Manaure	9:00 a.m	13	El líder de la comunidad indica que quedan totalmente incomunicados en invierno, el agua alcanza hasta un metro en la comunidad, les toca salir a la carretera para poder resguardar su integridad y las familias. • Siempre han estado abandonados por el gobierno local y nacional
23	Taller comunidad de 4 de Noviembre	24/02/2025	comunidad de 4 de Noviembre, Municipio de Albania	9:30 a.m	8	Los vigías manifiestan cuidar las fuentes hídricas de su territorio • Hay predios privados que se prestan para extraer arena del rio y ellos denuncian cuando lo evidencian.

24	Taller comunidad de Los Olivos	24/02/2025	Comunidad de Los Olivos, Municipio de Albania	2:00 p.m	19	Hay una fuerte deforestación en las rondas del rio • La comunidad está en un cerro en parte alta por esta razón el agua en época invernal no llega hasta la misma, pero si hacen daño a los alrededores.
25	Taller comunidad El Pasito	25/02/2025	Comunidad El Pasito, Municipio de Riohacha	10:00 a.m	20	La comunidad queda incomunicada en épocas de invierno • Las vías son altamente afectadas, con gran preocupación por el puente de entrada al rio que está bastante deteriorado. • Se Inunda y llega hasta la carretera el agua en época invernal, causando problemas en la calidad de vida se sus habitantes.
26	Taller comunidad de Ware waren	26/02/2025	Comunidad de Ware waren, Municipio de Albania	9:00 a.m	24	La comunidad queda incomunicada en épocas de invierno • Las vías son altamente afectadas, con gran preocupación por que el puente de entrada al rio que está bastante deteriorado. • Se Inunda y llega hasta la carretera el agua en época invernal, causando problemas en la calidad de vida se sus habitantes.
27	Taller comunidad de Guaymaral	26/02/2025	Comunidad de Guaymaral, Municipio de Manaure	2:00 p.m	13	El rio está a 300 metros de la comunidad • En la ribera del rio, hay una Ceiba que gracias a sus raíces se ha fijado el suelo de la orilla. Sin embargo, el rio está socavando y erosionando fuertemente las riberan en la zona. La escuela esta a solo 20 metros del cauce principal del rio. • En la zona extraían arena del rio y se les prometió soluciones de proyectos productivos que no han llegado y esta

						problemática bajo un poco la intensidad, pero continua la extracción de arena.
28	Taller comunidad El Molino	27/02/2025	Comunidad El Molino. Municipio de Manaure	9:00 a.m	26	La comunidad está a pocos metros de la laguna la raya • En épocas de invierno en la comunidad se pierden los caminos • Quedan sin leña lo que se traduce en una gran problemática al momento de realizar sus alimentos.
29	Taller comunidad Cangrejito	28/02/2025	Comunidad Cangrejito. Municipio de Manaure	3:00 p.m	26	En época de invierno el rio se crece y quedan aislados, la única forma de salida es por el mismo rio con altos costos en gasolina para las embarcaciones artesanales de la zona. • El agua sube unos metros dentro de la comunidad generando afectación en la salud de los niños y animales. • Las casas de barro se están dañando y cayendo por las inundaciones esto provoca que haya mayor tala de árboles para reparar las casas dañadas por las inundaciones. Uso de cemento después de hacer la casa de barro para tener mayor duración.
30	Taller comunidad Maschichón	05/03/2025	Comunidad Maschichón, Municipio de Manaure	9:00 a.m	14	La comunidad es un poco alta y queda como una isla totalmente aislada, con gran dificultad principalmente para los niños y estudiantes que deben desplazarse lo que se imposibilita por que el agua sube aproximadamente 1metros 30 centímetros. • El rio queda aproximadamente a 150 metros de la comunidad •

						En época invernal cuando con damnificados no reciben ninguna ayuda.
31	Taller comunidad Santa Cruz	05/03/2025	Comunidad Santa Cruz, Municipio de Manaure	2:30 p.m	21	Existe un arroyo cerca a la comunidad que se desborda e inunda la comunidad. • El rio este retirado de la comunidad el daño lo realizan los arroyos y aguas estancadas en la época invernal. • Han asistido a diferentes reuniones donde manifiestan le dan la información, muy superficial no se les explican bien los procesos • Quedan sin acceso al cementerio ancestral • Manifiestan absoluto abandono del gobierno • Primera vez que Corpoguajira llega a su comunidad con nuestra visita.
32	Taller comunidad Cuikar	06/03/2025	Comunidad Kuicar, Municipio de Manaure	9:00 a.m	12	En la comunidad no cuenta con acceso al agua, años atrás se suministraban con el rio pero a causa de la contaminación del afluente dejaron de consumir el agua. • Se trasladan hasta la comunidad de Pancho para abastecerse de agua a unos 5 kilómetros de su comunidad con un gran desgaste físico. • Es primera vez que reciben una visita de Corpoguajira • El rio queda aproximadamente a 500 metros de la comunidad.
33	Taller comunidad Kajutchón	06/03/2025	Comunidad Kajutchón, Municipio de Manaure	2:30 p.m	13	El líder de la comunidad indica que la comunidad queda totalmente incomunicada en invierno, el agua alcanza hasta un metro en la comunidad, les toca salir a la carretera para poder resguardar su integridad y

						las familias. • En la comunidad no cuenta con acceso al agua, años atrás se suministraban con el rio pero a causa de la contaminación del afluente dejaron de consumir el agua. • Es primera vez que reciben una visita de CORPOGUAJIRA • El rio queda aproximadamente a 800 metros de la comunidad.
34	Taller comunidad Makutchon	07/03/2025	Comunidad Makutchon, Municipio de Manaure	4:00 p.m	13	• El rio queda a 4 kilómetros de la comunidad y en la última temporada invernar quedo a distancia de 1 kilómetro las inundaciones, perjudicando los animales, quienes se enferman y mueren. • Quedan sin leña lo que se traduce en una gran problemática al momento de realizar sus alimentos • Solicitan que se proyecten programas que mejoren las vías en la comunidad en época de invierno • Siempre han estado abandonados las ayudas solo llegan hasta la Gloria • Primera visita que reciben de CORPOGUAJIRA.
35	Taller comunidad Aremasahín	07/03/2025	Comunidad Aremasahín, Municipio de Manaure	2:00 p.m	13	El cauce permanente del rio queda aproximadamente a 800 metros de la comunidad • El corregimiento no se inunda, pero comunidades cercanas si son afectadas.
36	Taller comunidad Panerrakat	08/03/2025	Comunidad Panerrakat, Municipio de Manaure	9:30 a.m	13	El rio queda a 500 metros de la comunidad, pasa un arroyo cercano inundando zonas de la comunidad con una altura de hasta 1metro 40 centímetros, perjudicando

						los animales, quienes se enferman y mueren. • Quedan sin leña lo que se traduce en una gran problemática al momento de realizar sus alimentos • Solicitan que se proyecten programas que mejoren las vías en la comunidad en época de invierno • Siempre han estado abandonados • Primera visita que reciben de CORPOGUAJIRA
Número Total de Asistentes					**595**	

Fuente: Elaboración propia.

CONTRATO DE CONSULTORÍA 0110 DE 2024

Tabla 9. Información general del contrato

CONTRATO	No. 0110 de 2024
OBJETO:	DESARROLLAR EL PROCESO DE PRE CONSULTA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO ESTUDIO PARA LA DELIMITACION DE LOS CAUCES PERMANENTE Y LINEA DE MAREAS MAXIMAS EN EL PROCESO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO RANCHERIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. BPIN: 20233218000004
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRECONSULTA RH RANCHERÍA
INTERVENTOR:	INGESARA GROUP.
FECHA ACTA DE INICIO:	DICIEMBRE 9 DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	MARZO 8 DE 2025
VALOR TOTAL:	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($299.135.840,00) M/L IVA incluido.
PLAZO:	TRES (03) Meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.

6. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERA

A continuación, se presenta el informe financiero, en donde se detallan de la ejecución financiera del proyecto.

Tabla 10. Presupuesto Oficial

PRESUPUESTO CONTRATO CC 110-2024. CONSORCIO PRECONSULTA RH RANCHERIA

NIT	NOMBRE	Diciembre	Enero	Febrero	Total
84.086.301	Henry Medina	8.717.842	8.717.842	8.717.842	26.153.526
84.451.532	Lenix Lazaro	9.081.099	9.081.099	9.081.099	27.243.297
5.172.472	Deider Valdez	9.081.099	9.081.099	9.081.099	27.243.297
1.122.411.054	Adrea Cuello Orozco	4.414.423	4.414.423	4.414.423	13.243.269
15.186.304	Rafael Ramirez Herrera	4.414.423	4.414.423	4.414.423	13.243.269
1.131.072.874	Didierson Epiayu	2.268.000	2.268.000	2.268.000	6.804.000
1.010.065.686	Minerva Mejia Pimineta	2.268.000	2.268.000	2.268.000	6.804.000
		40.244.885	40.244.886	40.244.886	120.734.657
					-
					-
901748628-4	ServiWajira sas	10.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000
		10.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000
					-
					-
901823424-1	SurtiLogic sas	33.546.667	33.546.667	33.546.667	100.640.001
Subtotal		33.546.667	33.546.667	33.546.667	100.640.001
total		83.791.552	83.791.553	83.791.553	251.374.658
iva		15.920.395	15.920.395	15.920.395	47.761.185
gran total		99.711.947	99.711.947	99.711.947	**299.135.841**

Tabla 11. Ejecución presupuestal


Corpoguajira

COSTOS DEL PROCESO DE PRECONSULTA DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO "ESTUDIO PARA LA DELIMITACION DE LOS CAUCES PERMANENTE Y LINEA DE MAREAS MAXIMAS EN EL PROCESO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO RANCHERIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA". BPIN 20233218000004 INFORME FINAL

Detalle	Tmp	Unidad	Cant	Valor unitario	Valor total	Nit	Nombre
Equipo profesional y técnico de base							
1. Mano de obra calificada							
Director de la consulta previa	3	Profesional	3	8.717.842	26.153.526	84086301	HENRY MEDINA DELUQUE
Facilitador experto en participación 1	3	Profesional	3	9.081.099	27.243.297	84451532	LENIX J. LAZARO MOLINA
Facilitador experto en participación 2	3	Profesional	3	9.081.099	27.243.297	5172472	DEIDER VALDEZ
Auxiliar social 1	3	Profesional	3	4.414.423	13.243.268	1122411054	ANDREA P. CUELLO OROZCO
Auxiliar social 2	3	Profesional	3	4.414.423	13.243.268	15186304	RAFAEL RAMIREZ HERRERA
Traductor e interprete 1	3	Técnico	3	2.268.000	6.804.000	1131072874	DIDERSON EPIAYU
Traductor e interprete 2	3	Tecnico	3	2.268.000	6.804.000	1010065686	MINERVA MEJIA P.
SUBTOTAL EQUIPO PROFESIONAL Y TECNICO					**120.734.656**		
TOTAL EQUIPO PROFESIONAL Y					**120.734.656**		
OTROS GASTOS DIRECTOS							
TRANSPORTE							
Transporte (alquiler de vehículos 4X4) cilindraje 2000 cc o superior modelo			3	10.000.000	30.000.000	901.748.628-4	SERVIWAJIIRA SAS
MATERIALES, INSUMOS,EQUIPOS,							
Logística para talleres de concertación y socialización comunidad el tigre pozo y el rocío, personal de asuntos indígenas de Manaure y la comunidad jawapiakat, realizadas en el mes de enero de 2025, proyecto estudio de acotamiento de las rondas hídricas de la subzona hidrográfica del rio ranchería en la La Guajira.			34	2.960.000	100.640.000	901823424-1	SURTILOGIC SAS
"							
SUBTOTAL OTROS GASTOS					**$ 130.640.000**		
TOTAL ACTIVIDAD					**251.374.656**		
IVA (19%)					**47.761.184**		
GRAN TOTAL ACTIVIDAD					**$299.135.840**		

Tabla 12. Ejecución presupuestal y grafica

EJECUCION PRESUPUESTAL				
	Proyectado	99.711.947	99.711.947	99.711.947
	Ejecutado	71.691.414	90.374.414	137.070.014
	Ejecucion acumul	100%		

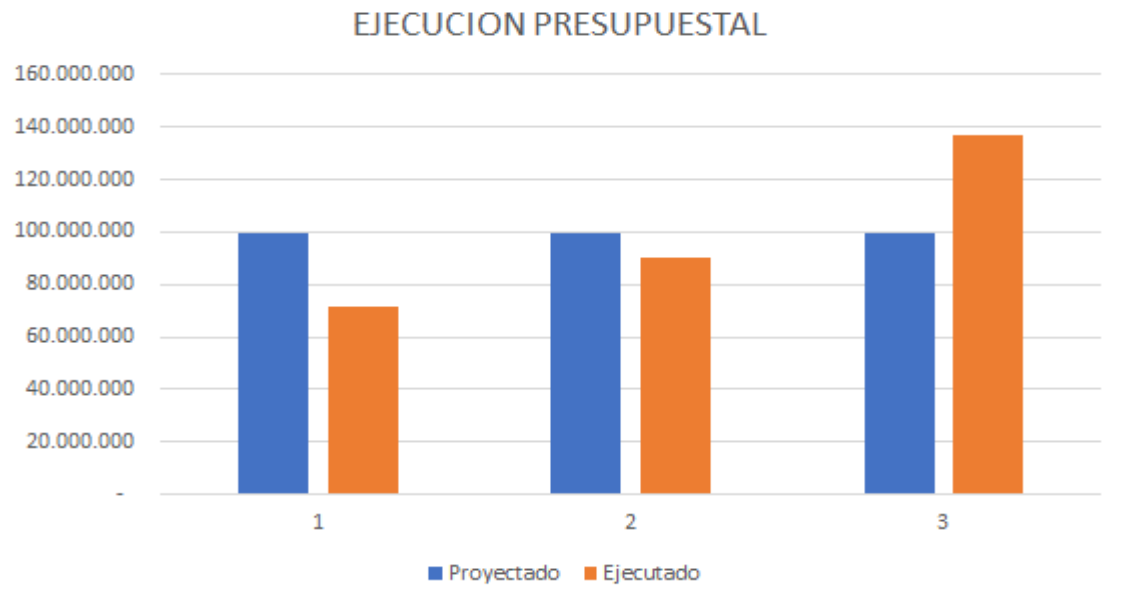

6.1 INDICADORES DE PRODUCTO DEL PROYECTO

De acuerdo a los requerimientos del proyecto, se realizaron 36 talleres, es decir, se realizaron dos (2) talleres adicionales.

6.2 AVANCE TIEMPO

A continuación, se muestra el avance del tiempo en la consultoría 0110 de 2024

Tabla 13. Avance en tiempo

Meses proyecto	**Mes**	**Plazo transcurrido** (días)	**Plazo transcurrido** (meses)	**% avance**
03	Dic - Febrero	90	3	100 %
Total Estimado				100%

Fuente: Elaboración propia

6.3 INFORME DE EJECUCIÓN FISICA

6.3.1 AVANCE DE ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO

De acuerdo con las condiciones iniciales, se presenta el resumen de las cantidades ejecutadas durante el periodo de marzo de 2025, han sido conforme al plan operativo establecido.
Al presente mes, se especifican en el informe de actividades la totalidad de lo realizado, se tiene conocimiento de varias actividades de campo y los talleres realizados.

Tabla 14. Porcentaje de Avance físico acumulado de actividades de consultoría

AVANCE DE EJECUCIÓN FISICA CONTRATO 002 DE 2024		
DESCRIPCION	**% PORCENTAJE AVANCE PROGRAMADO**	**% PORCENTAJE AVANCE REALIZADO**
AVANCE FISICO INFORME N° 1	16,70%	24%
AVANCE FISICO INFORME N° 2	16,66%	30%
AVANCE FISICO INFORME N° 3	16,66%	**46%**
TOTAL ESTIMADO	**100,0 %**	**100%**

Se puede evidenciar que las actividades programadas se cumplieron en un 100%.

6.4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

A continuación, se hace una descripción de lo que administrativamente se ha realizado en la ejecución del proyecto.

6.4.1 Relación de equipos técnicos de Consultoría

Se presenta el recurso humano del personal de la Consultoría 0110 de 2024.

Tabla 15. Relación de Equipo técnico de trabajo de pre consulta y apertura

EQUIPO DE TRABAJO	CANT.	PERFIL REQUERIDO	EXPERIENCIA PROFESIONAL	NOMBRE	PERFIL / CONCEPTO INTERVENTORIA
1. Director de la Consulta previa	**1**	Ingeniero Civil, Ambiental, Forestal, Geólogo, suelos o hidrólogo, con posgrado en gerencia de proyectos ambientales o de investigación y desarrollo.	Diez años de experiencia en proyectos ambientales que involucre comunidades étnicas y haber participado en mínimo tres consultas previas	**HENRY MEDINA DE LUQUE**	Ingeniero del Medio Ambiente **Cumple Perfil y Experiencia**
2. Facilitador experto en participación 1	**1**	Ingeniero Civil, Ambiental, Forestal, Geólogo, de suelos o hidrólogo, Geógrafo, con posgrado.	Cinco años de experiencia en proyectos ambientales que involucre comunidades étnicas y haber participado en mínimo una consulta previa	**LENIX LAZARO**	Ingeniero del Medio Ambiente **Cumple Perfil y Experiencia**
3. Facilitador experto en participación 2	**1**	Ingeniero Civil, Ambiental, Forestal, Geólogo, de suelos o hidrólogo, Geógrafo, con posgrado.	Cinco años de experiencia en proyectos ambientales que involucre comunidades étnicas y haber participado en mínimo una consulta previa	**DEIDER VALDEZ**	**Cumple Perfil y Experiencia**
4. Auxiliar social 1	**1**	Técnico o tecnólogo, Trabajador social, sociólogo, psicólogo, antropólogo o ingeniero.	Un año de experiencia en trabajo con comunidades étnicas	**CUELLO OROZCO ANDREA PATRICIA**	Ingeniero Geólogo **Cumple Perfil y Experiencia**

5. Auxiliar social 2	**1**	Técnico o tecnólogo, Trabajador social, sociólogo, psicólogo, antropólogo o ingeniero.	Un año de experiencia en trabajo con comunidades étnicas	**RAFAEL RAMIREZ**	**Cumple Perfil y Experiencia**
6. Traductor o interprete 1	**1**	Bachiller	N.A	**MEJIA PIMIENTA MINERVA**	**Cumple Perfil y Experiencia**
7. Traductor o interprete 2	**1**	Bachiller	N.A	**DIDIERON EPIAYU**	**Cumple Perfil y Experiencia**

6.4.2 Relación de Actas

De conformidad a la Cláusula uno, del Contrato No 0110 de 2024, se realiza el acta de inicio debidamente firmada por el contratista, y el supervisor, la cual se suscribió luego de la revisión y cumplimiento con los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.

Tabla 16. Relación de actas

Descripción	Fecha	Objeto de la reunión
ACTA DE INICIO	Diciembre 9 de 2024	Firma de acta de inicio junto con el contratista, el supervisor, y la interventoría

6.4.3 Relación de Comités y Reuniones

No se han realizado reuniones adicionales a la firma del acta de inicio y los espacios de acercamientos, espacios formales de pre consulta y apertura y los talleres de socialización.

6.4.4 Control de Correspondencia

A continuación, se presentan la lista de contactos telefónicos de los representantes o líderes de cada comunidad en la que se realizaron talleres de socialización, al igual que evidencias de contactos vía Watsapp. (Ver los anexos correspondientes).

6.5 EJECUCIÓN FINANCIERA

A continuación, se muestra la relación de gastos financieros a la fecha por cada una de las actividades del contrato entre ellas pólizas, anticipos, seguridad social entre otros.

6.5.1. Control de pólizas

Aprobación de garantías de cumplimiento, manejo del anticipo, pago de salarios, estabilidad y responsabilidad civil del contrato No. 0110 de 2024, amparados según BQ-100094132 expedida por SEGUROS MUNDIAL.

Tabla 17. Pólizas del contrato 0110 de 2024

No. de Póliza	Amparo	Fecha de expedición	Valor Asegurado	Vigencia
BQ-100094132	Cumplimiento de contrato	25/11/2024	$59,827,168.00	25/11/2024 25/08/2025
BQ-100094132	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	25/11/2024	$149,567,920.00	25/11/2024 25/08/2025
BQ-100094132	Prestaciones sociales	25/11/2024	$14,956,792.00	25/11/2024 25/08/2025
BQ-100094132	Calidad	25/11/2024	$59,827,168.00	25/11/2024 25/08/2025

6.5.2 Plan de Inversión del Anticipo

Tabla 18. El plan de inversión de anticipo, se revisó y aprobó por parte de la interventoría.

CONSORCIO PRECONSULTA RH RANCHERIA PRESUPUESTO OFICIAL					
RECURSO HUMANO	TIEMPO	VALORMENSI	F.M	DEDICACION	VALOR TOTAL
DIRECTOR DE LA CONSULTA PREVIA	2	6.054.057	1,8	0,8	17.435.684
Facilitador experto en participación 1	2	5.045.055	1,8	1,0	18.162.198
Facilitador experto en participación 2	2	5.045.055	1,8	1,0	18.162.198
AUXILIAR SOCIAL 1	2	2.452.457	1,8	1,0	8.828.845
AUXILIAR SOCIAL 2	2	2.452.457	1,8	1,0	8.828.845
Traductor o interprete 1	2	1.260.000	1,8	1,0	4.536.000
Traductor o interprete 2	2	1.260.000	1,8	1,0	4.536.000
SUBTOTAL					80.489.771
TRANSPORTE	TIEMPO	VALORMENSI	F.M	DEDICACION	VALOR TOTAL
Alquiler de vehículo 4 X 4 (incluye conductor, comb	2	10.000.000	1	1	20.000.000
SUBTOTAL					20.000.000
MATERIALES/INSUMOS/EQUIPOS/ES TUDIOS	CANT	UNIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
LOGISTICA PARA LOS TALLERES DE CONCERTACION Y S	13	Número	2.960.000		49.078.149
SUBTOTAL					49.078.149
VALOR TOTAL					149.567.920
IVA (19%)					-
TOTAL					149.567.920

Ejecución Financiera mes a mes General.

EJECUCION PRESUPUESTAL DICIEMBRE 2024

NIT	NOMBRE	Diciembre
84.086.301	Henry Medina	8.717.842
84.451.532	Lenix Lazaro	9.081.099
5.172.472	Deider Valdez	9.081.099
1.122.411.054	Andrea Cuello Orozco	4.414.423
15.186.304	Rafael Ramirez Herrera	4.414.423
1.131.072.874	Didierson Epiayu	2.268.000
1.010.065.686	Minerva Mejia Pimineta	2.268.000
		40.244.885
901748628-4	ServiWajira sas	10.000.000
		10.000.000
901823424-1	SurtiLogic sas	10.000.000
Subtotal		10.000.000
total		60.244.885
iva		11.446.528
gran total		71.691.414

EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO 2025

NIT	NOMBRE	Enero
84.086.301	Henry Medina	8.717.842
84.451.532	Lenix Lazaro	9.081.099
5.172.472	Deider Valdez	9.081.099
1.122.411.054	Andrea Cuello Orozco	4.414.423
15.186.304	Rafael Ramirez Herrera	4.414.423
1.131.072.874	Didierson Epiayu	2.268.000
1.010.065.686	Minerva Mejia Pimineta	2.268.000
		40.244.886
901748628-4	ServiWajira sas	10.000.000
		10.000.000
901823424-1	SurtiLogic sas	25.700.000
Subtotal		25.700.000
total		75.944.886
iva		14.429.528
gran total		90.374.414

EJECUCION PRESUPUESTAL FEBRERO 2025

NIT	NOMBRE	Febrero
84.086.301	Henry Medina	8.717.842
84.451.532	Lenix Lazaro	9.081.099
5.172.472	Deider Valdez	9.081.099
1.122.411.054	Andrea Cuello Orozco	4.414.423
15.186.304	Rafael Ramirez Herrera	4.414.423
1.131.072.874	Didierson Epiayu	2.268.000
1.010.065.686	Minerva Mejia Pimineta	2.268.000
		40.244.886
901748628-4	ServiWajira sas	10.000.000
		10.000.000
901823424-1	SurtiLogic sas	64.940.000
Subtotal		64.940.000
total		115.184.886
iva		21.885.128
gran total		137.070.014

6.6 ASPECTOS DE SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Sistema de Seguridad Social y parafiscales

La fundación Biota presenta los soportes de pago de la seguridad social (Salud, Pensión, ARL) y los aportes parafiscales del equipo de trabajo que se encuentra vinculado a través de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales.

Tabla 19. Planillas Personal de Consultoria

No	Nombre del trabajador	No. Planilla Diciembre	No. Planilla Enero	No. Planilla Febrero
1	HENRY MEDINA DE LUQUE	83144609	83673155	84552478
2	CUELLO OROZCO ANDREA PATRICIA	83144609	83673155	84552478
3	EPIAYU DIDERSON	83144609	83673155	84552478
4	RAMIREZ HERRERA RAFAEL F.	83144609	83673155	84552478
5	VALDEZ GONZALEZ DEIDER ELIAS	83144609	83673155	84552478
6	LENIX LAZARO	83144609	83673155	84552478
7	MEJIA PIMIENTA MINERVA PATRICIA	83144609	83673155	84552478


7. CONCLUSIONES

I. Se realizaron treinta y seis talleres en total (36) con la participación de 595 asistentes. Además, se adelantaron los ejercicios de búsqueda de información y socialización del proyecto en las secretarias de asuntos indígenas de los municipios de Manaure y Maicao.

II. Se adelantó el proceso de pre consulta y apertura con las dos (2) consejos comunitarios de Afro descendientes certificados.

III. Se presenta un informe financiero y soportes y los soportes de pago a la seguridad social en la ejecución presupuestal del proyecto.

Cordialmente,



REYNALDO JOSÉ ARTETA BONIVENTO
Rep. Legal Consorcio Preconsulta RH Ranchería
Anexos: Actas, asistencia, registros fotográficos, informe financiero y demás evidencias.

ANEXOS

Enlace Drive (Actas y asistencias_)

https://drive.google.com/drive/folders/1Vs29LU_LFvR_Q6p8z1idkja8o4K9S_vU?usp=drive_link

Enlace Drive (Fotos de reuniones de preconsulta y talleres)

https://drive.google.com/drive/folders/1Rr6_8FFYkI83ed31fFn3fKdMq2i3sUnQ?usp=drive_link

Listado de contactos con comunidades

Ver abajo.

Evidencias de contactos vía WhatsApp

Ver abajo.

Planillas de pago a seguridad social

Ver abajo.

REGISTRO DE CONTACTO TELEFONICO

FECHA	TELEFONO	EMAIL	NOMBRE CONTACTO	MENSAJE
20/01/2025	3106239309	oladisepieyu@gmail.com	OLADIS CAROLINA EPIEYU PEREZ - LIDER	Se hace convocatoria a reunion de socializacion del proyecto denominado ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO RANCHERIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, para el dia 27 de enero de 2025, a las 2:00pm en la comunidad JAWAPIAKAT.
21/01/2025	3114018737	comunidadcangrejito@gmail.com	MAXIMO LOPEZ - LIDER	Se hace convocatoria a reunion de socializacion del proyecto denominado ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO RANCHERIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, para el dia 30 de enero de 2025, a las 9:00am en la comunidad CANGREJITO 1.
30/01/2025	3145119003	laidaredondo@uniguajira.edu.co	LAIDA BEATRIZ REDONDO- LIDER	Se hace convocatoria a reunion de socializacion del proyecto denominado ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO RANCHERIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, para el dia 5 de febrero de 2025, a las 2:00pm en la comunidad LA RAYA.
31/01/2025	3045733134	rosadolibardo2012@hotmail.com	LIBARDO ROSADO	Se hace convocatoria a reunión de socialización del proyecto denominado ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO RANCHERIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, para el día 6 de febrero de 2025, a las 9:00am en la comunidad CHISPANA.
3/02/2025	3237931862		AMOS HERRERA PINO - LUDER	Se hace convocatoria a reunión de socialización del proyecto denominado ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO RANCHERIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, para el día 7 de febrero de 2025, a las 2:00pm en la comunidad de PANCHO.

12/02/2025	3135160280	nellyduarte485@gmail.com	NELLYS DUARTE - LIDER	Se hace convocatoria a reunión de socialización del proyecto denominado ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO RANCHERIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, para el día 12 de febrero de 2025, a las 2:30pm en la comunidad de ALUISIRA.
11/02/2025	3136261036	manegu1982@gmail.com	MANUEL GUTIERREZ DELUQUE-AUTORIDAD	Se hace convocatoria a reunión de socialización del proyecto denominado ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO RANCHERIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, para el día 13 de febrero de 2025, a las 8:30pm en la comunidad de BUENAVISTA.
10/02/2025	3116128512	poromana@gmail.com	ELIER CUADRADO - AUTORIDAD	Se hace convocatoria a reunión de socialización del proyecto denominado ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO RANCHERIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, para el día 13 de febrero de 2025, a las 2:30pm en la comunidad de POROMANA.
11/02/2025	3205761605	wayuvloliyve@gmail.com	WILDER AGUILAR-AUTORIDAD	Se hace convocatoria a reunión de socialización del proyecto denominado ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO RANCHERIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, para el día 14 de febrero de 2025, a las 3:00pm en la comunidad de KURRATI.
11/02/2025	3205761605	wayuvloliyve@gmail.com	WILDER AGUILAR-LIDER	Se hace convocatoria a reunión de socialización del proyecto denominado ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO RANCHERIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, para el día 14 de febrero de 2025, a las 8:30am en la comunidad de KALERAKIMANA.
12/02/2025	3042421613	claradeluque184@gmail.com	CLARA GONZALEZ-LIDER	Se hace convocatoria a reunión de socialización del proyecto denominado ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO RANCHERIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, para el día 15 de febrero de 2025, a las 2:30pm en la comunidad de ALIJUNAKIMANA.

9/02/2025	3114387947		GENARO MARQUEZ- AUTORIDAD	Se hace convocatoria a reunión de socialización del proyecto denominado ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO RANCHERIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, para el día 17 de febrero de 2025, a las 2:30pm en la comunidad de la GLORIA.
10/02/2025	3124481248	jhonbonivento@gmail.com	JHON JAIRO BONIVENTO-LIDER	Se hace convocatoria a reunión de socialización del proyecto denominado ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO RANCHERIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, para el día 19 de febrero de 2025, a las 9:00am en la comunidad de PALMARETE.
17/02/2025	3008867303		LOLA PUSHAINA- AUTORIDAD	Se hace convocatoria a reunión de socialización del proyecto denominado ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO RANCHERIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, para el día 19 de febrero de 2025, a las 4:00pm en la comunidad de EIRRATAMANA.
17/02/2025	3046207921	rubyespeletaaujero@gmail.com	RUBIA ESPELETA - LIDER	Se hace convocatoria a reunión de socialización del proyecto denominado ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO RANCHERIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, para el día 20 de febrero de 2025, a las 9:00am en la comunidad de AUJERO.
20/02/2025	3135216626		ELOY COTES EPIEYU- AUTORIDAD	Se hace convocatoria a reunión de socialización del proyecto denominado ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO RANCHERIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, para el día 21 de febrero de 2025, a las 2:30pm en la comunidad de MAKUREMA.
14/02/2025	3148134778		ALEJANDRA SAPUANA- HIJA DE LA AUTORIDAD	Se hace convocatoria a reunión de socialización del proyecto denominado ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO RANCHERIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, para el día 22 de febrero de 2025, a las 9:30am en la comunidad de WASIMO.
18/02/2025	3156351918		ELOY PLATA - LIDER CABILDO	Se hace convocatoria a reunión de socialización del proyecto denominado ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO RANCHERIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, para el día 24 de febrero de 2025, a las 9:00am en la comunidad 4 DE NOVIEMBRE.

21/02/2025	3135277180	miladisgonzalezamaya@gmail.com	MILADIS GONZALEZ AMAYA-AUTORIDAD	Se hace convocatoria a reunión de socialización del proyecto denominado ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO RANCHERIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, para el día 24 de febrero de 2025, a las 2:00pm en la comunidad LOS OLIVOS.
18/02/2025	3216696803		ENOR COTES-LIDER	Se hace convocatoria a reunión de socialización del proyecto denominado ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO RANCHERIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, para el día 25 de febrero de 2025, a las 9:00am en la comunidad EL PASITO.
19/02/2025	3117889048		FEDERIKO VANGRIEKEN-AUTORIDAD	Se hace convocatoria a reunión de socialización del proyecto denominado ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO RANCHERIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, para el día 26 de febrero de 2025, a las 9:00am en la comunidad WARE WAREN.
15/02/2025	3043655575	guaymaralkm12@gmail.com	KENYA BOLAÑO-LIDER	Se hace convocatoria a reunión de socialización del proyecto denominado ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO RANCHERIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, para el día 26 de febrero de 2025, a las 2:00pm en la comunidad GUAYMARAL.
18/02/2025	3014612318		SANDRA	Se hace convocatoria a reunión de socialización del proyecto denominado ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO RANCHERIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, para el día 27 de febrero de 2025, a las 9:00am en la comunidad EL MOLINO.
25/02/2025	3114018737	comunidadcangrejito@gmail.com	MAXIMO LOPEZ - LIDER	Se hace convocatoria a reunión de socialización del proyecto denominado ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO RANCHERIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, para el día 28 de febrero de 2025, a las 9:00am en la comunidad CANGREJITO 2.
4/03/2025	3185276404		RAQUEL ESPELETA- LIDER	Se hace convocatoria a reunión de socialización del proyecto denominado ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO RANCHERIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, para el día 5 de marzo de 2025, a las 9:00am en la comunidad MASCHICHON.

4/03/2025	3205646734		ADELINA EPIAYU MACHADO- HIJA DE AUTORID	Se hace convocatoria a reunión de socialización del proyecto denominado ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO RANCHERIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, para el día 5 de marzo de 2025, a las 2:00pm en la comunidad SANTA CRUZ.
4/03/2025	3136817237		FERNANDO EPIAYU-HIJO AUTORIDAD	Se hace convocatoria a reunión de socialización del proyecto denominado ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO RANCHERIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, para el día 6 de marzo de 2025, a las 9:00am en la comunidad CUAIKAR.
4/03/2025	3126742619		ALFREDO EPIAYU- AUTORIDAD	Se hace convocatoria a reunión de socialización del proyecto denominado ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO RANCHERIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, para el día 6 de marzo de 2025, a las 2:00pm en la comunidad KAJUTCHON.
5/03/2025	3114301131		ENRIQUE FREYLE-LIDER	Se hace convocatoria a reunión de socialización del proyecto denominado ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO RANCHERIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, para el día 7 de MARZO de 2025, a las 2:00Pm en la comunidad AREMASAIN.

ANEXO

EVIDENCIAS DEL PROCESO DE CONVOCATORIA
















Clara González Alij...
últ. vez hoy a las 4:08 p. m.
leerlos ni escucharlos. Toca para obtener más información.
Buenos dias 7:26 a. m.
Para recordarte la reunión de mañana con la comunidad a las 8am De parte de Corpoguajira 7:27 a. m.
Me indicas cuántas personas más o menos para el tema refrigerios 7:27 a. m.
0:08 7:44 a. m.
Vale 7:44 a. m.
Amiga usted disculpe, será que me podría repetir la información acerca del proyecto que usted me comentó, ese día no pude escucharle bien 1:19 p. m.
Tú
Me indicas cuántas personas más o menos para el tema refrigerios
Unas 20 personas 1:20 p. m.
1:10 1:21 p. m.
Mensaje


Genaro la gloria la...
últ. vez ayer a las 8:47 p. m.
de este chat, ni siquiera WhatsApp, puede leerlos ni escucharlos. Toca para obtener más información.
10 de febrero de 2025
Buenas tardes señor Genaro 3:25 p. m.
Como esta usted 3:25 p. m.
1:00 3:26 p. m.
1:16 3:29 p. m.
Así es podemos tener un espacio el miércoles 3pm
Quisieramos un espacio con usted y algunos miembros más de ella comunidad para que quede el sentir y las necesidades de la comunidad
Usted me dirá si nos ayuda en el colegio para mostrarles proyectarles la información 3:32 p. m.
0:44 3:36 p. m.
Excelente
Nos vemos entonces el miércoles a
Mensaje


Jhon Jairo Boniven...
últ. vez hoy a las 4:18 p. m.
Gracias 8:44 p. m.
Me recuerdas el nombre del profe q nos acompaño en la reunión pasada y nos pidió q fuéramos a su comunidad por favor 8:45 p. m.
Wilder Aguilar 9:20 p. m.
Gracias 9:25 p. m.
17 de febrero de 2025
Hola
Buena tardes 5:39 p. m.
Jhon Jairo Bonivento Autoridad Cucur...
Para el día miércoles 19 de febrero
Te recuerdo el espacio que acordamos para este miércoles a las 2:30 5:39 p. m.
18 de febrero de 2025
Buenos días
Me confirmas el espacio q ya tenemos cuadrado para mañana.
Feliz dia 7:10 a. m.
Hola jhon 2:26 p. m.
Mensaje


RUBIA ESPELETA E...
últ. vez hoy a las 3:50 p. m.
17 de febrero de 2025
Los mensajes y las llamadas están cifrados de extremo a extremo. Nadie fuera de este chat, ni siquiera WhatsApp, puede leerlos ni escucharlos. Toca para obtener más información.
Hola buenos dias 8:19 a. m.
Te escribe Yeinni Licona de fundación biota 8:19 a. m.
Si contacto me lo regaló Reinaldo arteta 8:19 a. m.
Buenos días.
Hola Yeinni, para que seria? 8:27 a. m.
1:00 8:28 a. m.
0:48 8:32 a. m.
Puede ser por tu lado está bien
Podríamos cuadrar el jueves a las 9am 8:40 a. m.
0:21 9:02 a. m.
Mensaje


Eloy Cotes Makure...
20 de febrero de 2025
Los mensajes y las llamadas están cifrados de extremo a extremo. Nadie fuera de este chat, ni siquiera WhatsApp, puede leerlos ni escucharlos. Toca para obtener más información.
Buenas tardes Eloy 3:33 p. m.
Te escribe Yeinni Licona 3:33 p. m.
De fundación biota 3:33 p. m.
Podemos ir mañana a tu comunidad a las 2:30pm 3:33 p. m.
Para tener el espacio 3:36 p. m.
Buenas tardes 3:39 p. m.
Tú
Podemos ir mañana a tu comunidad a las 2:30pm
0k 3:39 p. m.
Listo 3:40 p. m.
Me indicas cómo llegamos 3:40 p. m.
21 de febrero de 2025
Mensaje


MILADIS Líder Los...
21 de febrero de 2025
Los mensajes y las llamadas están cifrados de extremo a extremo. Nadie fuera de este chat, ni siquiera WhatsApp, puede leerlos ni escucharlos. Toca para obtener más información.
Buenas tardes 5:09 p. m.
Le escribe Yeinni Licona de parte de Corpoguajira 5:09 p. m.
Le estuve llamando pero no logré comunicacion 5:10 p. m.
El lunes estaremos visitando las comunidades
4 de noviembre
Y los olivos
Nos compartieron su contacto como lider de los olivos 5:10 p. m.
0:11 5:11 p. m.
0:55 5:11 p. m.
0:06 5:13 p. m.
Mensaje

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901891877-2	CONSORCIO PRECONSULTA RH RANCHERIA	CALLE 2 4 26	3114392983	heros616@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		LA GUAJIRA	RIOHACHA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	Y	07/01/2025	83144609	$4.900.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	220.800	0		0		0	0	0	0	220.800	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.564.900	0		0		0	0	0	0	1.564.900	4
EPSIC4	ANAS WAYUU EPS	839000495-6	325.000	0		0		0	0	0	0	325.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.279.800	0	0	0	0	0	0		1.279.800	4
231001	Colfondos	800227940-6	282.600	0	0	0	0	0	0		282.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.139.200	0	0	0	0	0	0		1.139.200	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	88.500				88.500	0	0	88.500			885	88.500	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	2.110.700	2.110.700
Pensión	3	2.701.600	2.701.600
Riesgos Laborales	1	88.500	88.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	4.900.800	4.900.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901891877-2	CONSORCIO PRECONSULTA RH RANCHERIA		CALLE 2 4 26	3114392983	heros616@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			LA GUAJIRA	RIOHACHA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	Y	07/01/2025	83144609	$4.900.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010065686	MEJIA PIMIENTA MINERVA PATRICIA	59	0			N	X																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSIC4	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1122411054	CUELLO OROZCO ANDREA PATRICIA	59	0			N	X																230301	1.765.769	282.600	0	0	0	0	EPS037	1.765.769	220.800	14-23	1.765.769	1	9.300		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1131072874	EPIAYU DIDERSON	59	0			N	X																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSIC4	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	15186304	RAMIREZ HERRERA RAFAEL FRANCISCO	59	0			N	X																231001	1.765.769	282.600	0	0	0	0	EPS005	1.765.769	220.800	14-23	1.765.769	1	9.300		0	0	0	0	0	0	0	0
5	CC	5172472	VALDES GONZALEZ DEIDER ELIAS	59	0			N	X																25-14	3.632.440	581.200	0	0	0	0	EPS037	3.632.440	454.100	14-23	3.632.440	1	19.000		0	0	0	0	0	0	0	0
6	CC	84086301	MEDINA DE LUQUE HENRY ALEJANDRO	59	0			N	X																25-14	3.487.137	558.000	0	0	0	0	EPS037	3.487.137	435.900	14-23	3.487.137	1	18.300		0	0	0	0	0	0	0	0
7	CC	84451532	LAZARO MOLINA LENIX JOSE	59	0			N	X																230301	3.632.440	581.200	0	0	0	0	EPS037	3.632.440	454.100	14-23	3.632.440	1	19.000		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901891877-2	CONSORCIO PRECONSULTA RH RANCHERIA	CALLE 2 4 26	3114392983	heros616@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		LA GUAJIRA	RIOHACHA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	Y	03/02/2025	83673155	$4.972.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	220.800	0		0		0	0	0	0	220.800	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.564.900	0		0		0	0	0	0	1.564.900	4
EPSIC4	ANAS WAYUU EPS	839000495-6	356.000	0		0		0	0	0	0	356.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.319.400	0	0	0	0	0	0		1.319.400	4
231001	Colfondos	800227940-6	282.600	0	0	0	0	0	0		282.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.139.200	0	0	0	0	0	0		1.139.200	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	89.900				89.900	0	0	89.900			899	89.900	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	2.141.700	2.141.700
Pensión	3	2.741.200	2.741.200
Riesgos Laborales	1	89.900	89.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	4.972.800	4.972.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901891877-2	CONSORCIO PRECONSULTA RH RANCHERIA		CALLE 2 4 26	3114392983	heros616@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			LA GUAJIRA	RIOHACHA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	Y	03/02/2025	83673155	$4.972.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010065686	MEJIA PIMIENTA MINERVA PATRICIA	59	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSIC4	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1122411054	CUELLO OROZCO ANDREA PATRICIA	59	0			N																	230301	1.765.769	282.600	0	0	0	0	EPS037	1.765.769	220.800	14-23	1.765.769	1	9.300		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1131072874	EPIAYU DIDERSON	59	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSIC4	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0
4	CC	15186304	RAMIREZ HERRERA RAFAEL FRANCISCO	59	0			N																	231001	1.765.769	282.600	0	0	0	0	EPS005	1.765.769	220.800	14-23	1.765.769	1	9.300		0	0	0	0	0	0	0
5	CC	5172472	VALDES GONZALEZ DEIDER ELIAS	59	0			N																	25-14	3.632.440	581.200	0	0	0	0	EPS037	3.632.440	454.100	14-23	3.632.440	1	19.000		0	0	0	0	0	0	0
6	CC	84086301	MEDINA DE LUQUE HENRY ALEJANDRO	59	0			N																	25-14	3.487.137	558.000	0	0	0	0	EPS037	3.487.137	435.900	14-23	3.487.137	1	18.300		0	0	0	0	0	0	0
7	CC	84451532	LAZARO MOLINA LENIX JOSE	59	0			N																	230301	3.632.440	581.200	0	0	0	0	EPS037	3.632.440	454.100	14-23	3.632.440	1	19.000		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901891877-2	CONSORCIO PRECONSULTA RH RANCHERIA	CALLE 2 4 26	3114392983	heros616@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		LA GUAJIRA	RIOHACHA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	Y	03/03/2025	84552478	$4.972.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	220.800	0		0		0	0	0	0	220.800	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.564.900	0		0		0	0	0	0	1.564.900	4
EPSIC4	ANAS WAYUU EPS	839000495-6	356.000	0		0		0	0	0	0	356.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.319.400	0	0	0	0	0	0		1.319.400	4
231001	Colfondos	800227940-6	282.600	0	0	0	0	0	0		282.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.139.200	0	0	0	0	0	0		1.139.200	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	89.900				89.900	0	0	89.900			899	89.900	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	2.141.700	2.141.700
Pensión	3	2.741.200	2.741.200
Riesgos Laborales	1	89.900	89.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	4.972.800	4.972.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901891877-2	CONSORCIO PRECONSULTA RH RANCHERIA		CALLE 2 4 26	3114392983	heros616@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			LA GUAJIRA	RIOHACHA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	Y	03/03/2025	84552478	$4.972.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010065686	MEJIA PIMIENTA MINERVA PATRICIA	59	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSIC4	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1122411054	CUELLO OROZCO ANDREA PATRICIA	59	0			N																	230301	1.765.769	282.600	0	0	0	0	EPS037	1.765.769	220.800	14-23	1.765.769	1	9.300		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1131072874	EPIAYU DIDERSON	59	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSIC4	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0
4	CC	15186304	RAMIREZ HERRERA RAFAEL FRANCISCO	59	0			N																	231001	1.765.769	282.600	0	0	0	0	EPS005	1.765.769	220.800	14-23	1.765.769	1	9.300		0	0	0	0	0	0	0
5	CC	5172472	VALDES GONZALEZ DEIDER ELIAS	59	0			N																	25-14	3.632.440	581.200	0	0	0	0	EPS037	3.632.440	454.100	14-23	3.632.440	1	19.000		0	0	0	0	0	0	0
6	CC	84086301	MEDINA DE LUQUE HENRY ALEJANDRO	59	0			N																	25-14	3.487.137	558.000	0	0	0	0	EPS037	3.487.137	435.900	14-23	3.487.137	1	18.300		0	0	0	0	0	0	0
7	CC	84451532	LAZARO MOLINA LENIX JOSE	59	0			N																	230301	3.632.440	581.200	0	0	0	0	EPS037	3.632.440	454.100	14-23	3.632.440	1	19.000		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
