**TIPO DE SOLICITUD**

**Adicional:** Usado para el incremento de valor o el plazo de contrato o convenio.

**Otrosí:** Usado para modificar o aclarar el texto o clausulado del contrato o convenio.

Adicional [ x ] Otrosí [ ]

## 1. INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No:** | 20240972 | **CONVENIO No:** | NA |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA QUE INCLUYE EL CERRAMIENTO DEL LOTE, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTÉTICA Y LA PROVISIÓN DE BAÑOS Y VESTIERES PROVENIENTES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 202303009 CON LA GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO | | |
| **CONTRATISTA:** | HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S. | **SUPERVISOR:** | MARÍA JOSÉ OSPINA FIGUEROA |

## 2. ADICIONAL

### 2.1. PLAZO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Inicial:** | 31.dic.2024 | **Ampliar a:** | días calendarios | **Final:** | 21.ago.2025 |

**Justificación del tipo de solicitud:**

En calidad de supervisor del contrato No. 20240972 suscrito con **HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S.** identificado con número de NIT. 900.234.357-3, cuyo objeto es:

*"INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA QUE INCLUYE EL CERRAMIENTO DEL LOTE, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTÉTICA Y LA PROVISIÓN DE*

*BAÑOS Y VESTIERES PROVENIENTES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 202303009 CON LA GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO"*

Previa solicitud por parte del interventor, se solicita prorrogar el contrato hasta el veintiuno (21) de agosto de la vigencia 2025. Lo anterior, soportado de la siguiente manera:

El contrato de obra No. 20240949 suscrito con PRIMAVERA INGENIERIA S.A.S., al cual se le ejerce seguimiento por parte de esta interventoría requiere una prórroga por cinco (05) meses para el desarrollo de las Etapa I de complementación de estudios y diseños, y Etapa II desarrollo del objeto del mismo, fundamentado en el cronograma adjunto a este documento.

Que se considera la misma alternativa como viable en aras de garantizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental a la obra objeto del contrato 20240949.

**2.2. VALOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Inicial:** | No aplica | **Valor Adicional:** | No aplica |
| **Valor Total:** | No aplica | | |

**Justificación del tipo de solicitud:** No Aplica

**3. OTROSI**

NO APLICA

**4. ADICIONAL**

**Cláusula a Modificar:**

**CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución será hasta el día 31 de diciembre de 2024, una vez ejecución y se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en vigencia del artículo 41 de la ley 80 de 1993.

**Clausula Modificada:**

**CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución será hasta el día 21 de agosto de 2025, una vez cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.

Que la Secretaría General de la Institución Universitaria de Barranquilla, previa verificación del expediente contractual y teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente, en aras de prevenir cualquier situación que afecte el desarrollo del Contrato y atendiendo la solicitud del supervisor procede a firmar la presente solicitud.

Se firma la presente solicitud de adición u otrosí por quienes en ella han intervenido en Barranquilla a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2025.

**MARÍA JOSÉ OSPINA FIGUEROA**
Supervisor de Contrato

**ANGELA VICTORIA HERNÁNDEZ VERGARA**
Secretaria General

**ARCESIO JULIAN CASTRO AGUDELO**
Ordenador del Gasto

**PROYECTO:** Juana Fuentes – Contratista Profesional de rectoría IUB

Bogotá, D.C., 06 de marzo de 2025.

003-2025

Señores
**PRIMAVERA INGENIERÍA S.A.S.**
**Luis Fernando Leguizamo**
**Representante Legal**
C.C.
**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA**
Barranquilla, Atlántico.

ASUNTO: CONTRATO No. **24240972** – **"INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA QUE INCLUYE EL CERRAMIENTO DEL LOTE, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTÉTICA Y LA PROVISIÓN DE BAÑOS Y VESTIERES PROVENIENTES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 202303009 CON LA GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO"**.

REF: RESPUESTA OFICIO No. PR-026-010.

Respetados señores:

Acusamos recibo de su oficio de la referencia donde se nos hace entrega de la programación para el desarrollo total del proyecto del contrato de obra No. **20240949** cuyo objeto es: "**ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, EN EL INMUEBLE IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 041-161089 QUE INCLUYE EL CERRAMIENTO DEL LOTE, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTÉTICA Y LA PROVISIÓN DE BAÑOS Y VESTIERES PROVENIENTES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202303009 CON LA GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO**", donde claramente se establece que el plazo total del contrato son **CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS** incluida la **ETAPA 1** prevista en un periodo de **TREINTA (30) DÍAS** calendario, donde claramente se contempla trabajar días corridos durante ese periodo. (ver foto de la programación enviada por ustedes)



| | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | 16 feb '25 16:02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA EN EL INMUEBLE IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 041-161089 QUE INCLUYE EL CERRAMIENTO DEL LOTE, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA C | 150 días | dom 2/03/25 | mar 29/07/25 | |
| 2 | | ETAPA 1 - DISEÑOS | 30 días | dom 2/03/25 | lun 31/03/25 | |

Respecto de lo anterior nos permitimos aclarar:

- Consideramos que el tiempo para optimización de diseños, es válido y es aprobado por esta interventoría.

- Consideramos que la información necesaria para la Gestión del Tramite de Licencia de Construcción y obtención de permisos ambientales se le debería dar inicio con mayor antelación, teniendo en cuenta que esta gestión ante los entes pertinentes dependen de un tercero, en consecuencia, su entrega puede variar y esto podría retrasar el inicio de la etapa II. Proceso que es necesario mejorar en el desarrollo de la Etapa I.

- En cuanto a los tiempos por ustedes propuestos para la entrega, estudio y aprobación de esta Interventoría, pese a que en la programación ustedes mantienen las entregas parciales, esta Interventoría reitera que solo realizara el análisis y revisión con la entrega de toda la información unificada, para poder engranar las mismas y así poder conceptualizar en forma completa de los alcances de todos los ítems.

- Se les recuerda que se debe enviar un balance presupuestal donde se establezcan las mayores, menores cantidades e ítems adicionales. En el evento que sea necesario incluir actividades no previstas, se deben allegar estos APUS con mínimo tres cotizaciones para materiales y/o equipos no previstos en las actividades contractuales e incluir un estudio de mercado con precios adoptados en proyectos similares.

En consecuencia, esta Interventoría en aras de avanzar en el reinicio de los trabajos de la etapa I da aval a el tiempo total de 150 días del proyecto incluido 30 días de la Etapa I, que el contratista considera necesarios para la entrega de la información para cada especialidad, aclarando que los tiempos por ustedes emitidos para el estudio y conceptualización de esta interventoría no son avalados, y reitera que una vez se entregue toda la información de todas las especialidades procederemos a la revisión y en caso de estar acorde se emitirá la aprobación. Recordamos que la información entregada debe estar lo suficientemente soportada técnicamente y con los requisitos establecidos para tal fin, y así evitar atrasos en el tiempo de entrega de la etapa I.

En caso de que para la fecha establecida para la entrega de los estudios y optimización de diseños el contratista no haga entrega de la totalidad de la información, se podrá establecer un acta donde se indique los porcentajes de ejecución y entrega a la fecha, las observaciones a que haya lugar, las nuevas fechas para la entrega y cumplimiento de la totalidad de actividades a cargo del Contratista, pero aclaramos que el tiempo de ejecución del proyecto sigue siendo los 150 días aprobados, tiempo que no se modificara por atrasos en la entrega tardía de los trabajos de la etapa I .

Adicionalmente, requerimos allegar:

- La información detallada de los profesionales y/o empresas que realizaran cada uno de los estudios, diseños y ensayos para la etapa I.

- Para el personal que estará realizando los ensayos en campo es necesario que nos hagan llegar la documentación de cada uno y el soporte de afiliación al Sistema de Seguridad Social (Pensión, Salud y ARL) y así poder garantizar el ingreso al área de trabajo. De igual forma todo el personal debe estar dotado de uniformes y elementos para su seguridad.

- Para los equipos de topografía a emplear se deben presentar los documentos de calibración de cada uno de los equipos a emplear, así como la licencia del topógrafo que llevara a cabo esta actividad.

- Para los equipos, que se emplearan para la toma de muestras de los sondeos se debe enviar la información de los equipos y la metodología a emplear para la realización de dichos ensayos. Es menester que se nos indique el inicio de los sondeos en campo para el respectivo acompañamiento por parte del personal de la interventoría.

Por último, y en aras de garantizar el acompañamiento técnico, administrativo, financiera, entre otros a las obras contratadas, solicitamos sea ampliado el plazo del contrato de la presente interventoría en la misma medida que el contratista, de acuerdo con la programación avalada.

Sin otro particular,



**KEYVEEN GUILLERMO CASTRO AMARANTO**
Representante Legal
**HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S.**

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos | 23 feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA EN EL INMUEBLE IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 041-161089 QUE INCLUYE EL CERRAMIENTO DEL LOTE, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA C** | **150 días** | **mar 25/03/25** | **jue 21/08/25** | | | |
| 2 | | **ETAPA 1 - DISEÑOS** | **30 días** | **mar 25/03/25** | **mié 23/04/25** | | | |
| 3 | | **Acta de inicio etapa 1** | 0 días | mar 25/03/25 | mar 25/03/25 | | | |
| 4 | | **Verificacion** | **2 días** | **mar 25/03/25** | **mié 26/03/25** | | | |
| 5 | | Revisión preliminar de estudios y diseños | 1 día | mar 25/03/25 | mar 25/03/25 | 3 | | |
| 6 | | Visita de verificación | 1 día | mié 26/03/25 | mié 26/03/25 | 5 | | |
| 7 | | **Topografia** | **11 días** | **jue 27/03/25** | **dom 6/04/25** | | | |
| 8 | | Carteras de Campo | 3 días | jue 27/03/25 | sáb 29/03/25 | 6 | | |
| 9 | | Informe tecnico | 1 día | dom 30/03/25 | dom 30/03/25 | 8 | | |
| 10 | | Planos | 2 días | lun 31/03/25 | mar 1/04/25 | 9 | | |
| 11 | | **Revision y aprobacion de Interventoria. Topografia** | 5 días | mié 2/04/25 | dom 6/04/25 | 10 | | |
| 12 | | ~~Estudio de suelos~~ | ~~18 días~~ | ~~mié 2/04/25~~ | ~~sáb 19/04/25~~ | | | |
| 13 | | ~~Trabajos de campo, elaboración de sondeos según la NSR-10~~ | ~~3 días~~ | ~~mié 2/04/25~~ | ~~vie 4/04/25~~ | ~~10~~ | | |

Proyecto: programacion 14-08-
Fecha: jue 20/03/25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | Resumen inactivo | Tareas externas |
| División | Tarea manual | Hito externo |
| Hito | solo duración | Fecha límite |
| Resumen | Informe de resumen manual | Tareas críticas |
| Resumen del proyecto | Resumen manual | División crítica |
| Tarea inactiva | solo el comienzo | Progreso |
| Hito inactivo | solo fin | Progreso manual |

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos | 23 feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | | ~~Ensayos de laboratorio~~ | ~~8 días~~ | ~~sáb 5/04/25~~ | ~~sáb 12/04/25~~ | ~~13~~ | | |
| 15 | | ~~Elaboracion de informe~~ | ~~2 días~~ | ~~dom 13/04/25~~ | ~~lun 14/04/25~~ | ~~14~~ | | |
| 16 | | ~~**Revision y aprobacion de Interventoria. Estudios de suelos y Geologia**~~ | ~~5 días~~ | ~~mar 15/04/25~~ | ~~sáb 19/04/25~~ | ~~15~~ | | |
| 17 | | **Diseño Arquitectonico** | **12 días** | **mié 2/04/25** | **dom 13/04/25** | | | |
| 18 | | Diseño arquitectonico | 5 días | mié 2/04/25 | dom 6/04/25 | 10 | | |
| 19 | | Planos | 2 días | lun 7/04/25 | mar 8/04/25 | 18 | | |
| 20 | | **Revision y aprobacion de Interventoria. Estudio Geometrico** | 5 días | mié 9/04/25 | dom 13/04/25 | 19 | | |
| 21 | | **Diseño Hidráhulico e hidrosanitario** | **12 días** | **lun 7/04/25** | **vie 18/04/25** | | | |
| 22 | | Diseño Hidráhulico e hidrosanitario | 5 días | lun 7/04/25 | vie 11/04/25 | 18 | | |
| 23 | | Planos | 2 días | sáb 12/04/25 | dom 13/04/25 | 22 | | |
| 24 | | **Revision y aprobacion de Interventoria. Estudios de hidrologia e hidraulico** | 5 días | lun 14/04/25 | vie 18/04/25 | 23 | | |
| 25 | | **Diseño estructural** | **13 días** | **lun 7/04/25** | **sáb 19/04/25** | | | |
| 26 | | Memorias de diseño | 5 días | lun 7/04/25 | vie 11/04/25 | 18 | | |
| 27 | | Planos estructurales | 3 días | sáb 12/04/25 | lun 14/04/25 | 26 | | |
| 28 | | **Revision y aprobacion de Interventoria. Estudios Estructural** | 5 días | mar 15/04/25 | sáb 19/04/25 | 27 | | |

Proyecto: programacion 14-08-
Fecha: jue 20/03/25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | | Resumen inactivo | | Tareas externas | |
| División | | Tarea manual | | Hito externo | |
| Hito | | solo duración | | Fecha límite | |
| Resumen | | Informe de resumen manual | | Tareas críticas | |
| Resumen del proyecto | | Resumen manual | | División crítica | |
| Tarea inactiva | | solo el comienzo | | Progreso | |
| Hito inactivo | | solo fin | | Progreso manual | |

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos | 23 feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | | **Diseño electrico** | **16 días** | **lun 7/04/25** | **mar 22/04/25** | | | |
| 30 | | Memorias de diseño | 8 días | lun 7/04/25 | lun 14/04/25 | 18 | | |
| 31 | | Planos electrico | 3 días | mar 15/04/25 | jue 17/04/25 | 30 | | |
| 32 | | **Revision y aprobacion de Interventoria. Estudios Electrico** | 5 días | vie 18/04/25 | mar 22/04/25 | 31 | | |
| 33 | | **Presupuesto** | **9 días** | **mar 15/04/25** | **mié 23/04/25** | | | |
| 34 | | Entrega presupuesto | 4 días | mar 15/04/25 | vie 18/04/25 | 27;31CC | | |
| 35 | | Analisis de precios unitarios | 4 días | mar 15/04/25 | vie 18/04/25 | 34CC | | |
| 36 | | Memoria de cantidades y lista de insumos | 4 días | mar 15/04/25 | vie 18/04/25 | 35CC | | |
| 37 | | Flujo de caja | 1 día | sáb 19/04/25 | sáb 19/04/25 | 38CC | | |
| 38 | | Cronograma detallado de ejecucion | 1 día | sáb 19/04/25 | sáb 19/04/25 | 34 | | |
| 39 | | **Revision y aprobacion de Interventoria. Presupuesto** | 4 días | dom 20/04/25 | mié 23/04/25 | 38 | | |
| 40 | | **Plan de manejo de transito PMT** | **3 días** | **sáb 19/04/25** | **lun 21/04/25** | | | |
| 41 | | Plan de manejo de transito | 2 días | sáb 19/04/25 | dom 20/04/25 | 36 | | |
| 42 | | **Revision y aprobacion de Interventoria. Estudio de Transito** | 1 día | lun 21/04/25 | lun 21/04/25 | 41 | | |
| 43 | | **Plan de manejo Ambiental PMA** | **3 días** | **sáb 19/04/25** | **lun 21/04/25** | | | |
| 44 | | Plan de PMA | 2 días | sáb 19/04/25 | dom 20/04/25 | 36 | | |

Proyecto: programacion 14-08-
Fecha: jue 20/03/25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | | Resumen inactivo | | Tareas externas | |
| División | | Tarea manual | | Hito externo | |
| Hito | | solo duración | | Fecha límite | |
| Resumen | | Informe de resumen manual | | Tareas críticas | |
| Resumen del proyecto | | Resumen manual | | División crítica | |
| Tarea inactiva | | solo el comienzo | | Progreso | |
| Hito inactivo | | solo fin | | Progreso manual | |

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos | 23 feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | | **Revision y aprobacion de Interventoria. Plan de seguridad y salud** | 1 día | lun 21/04/25 | lun 21/04/25 | 44 | | |
| 46 | | **Plan de PGS** | **3 días** | **sáb 19/04/25** | **lun 21/04/25** | | | |
| 47 | | Plan PGS | 2 días | sáb 19/04/25 | dom 20/04/25 | 36 | | |
| 48 | | **Revision y aprobacion de Interventoria. PGIO** | 1 día | lun 21/04/25 | lun 21/04/25 | 47 | | |
| 49 | | ~~AJUSTE FINAL ETAPA 1~~ | ~~13 días~~ | ~~lun 21/04/25~~ | ~~sáb 3/05/25~~ | | | |
| 50 | | ~~Ajuste final observaciones Interventoria~~ | ~~8 días~~ | ~~lun 21/04/25~~ | ~~lun 28/04/25~~ | ~~47~~ | | |
| 51 | | ~~**Revision y aprobacion de Interventoria. Estudios Estructural**~~ | ~~5 días~~ | ~~mar 29/04/25~~ | ~~sáb 3/05/25~~ | ~~50~~ | | |
| 52 | | **TRAMITE PARA LICENCIA DE CONSTRUCCION Y PERMISOS AMBIENTALES** | **10 días** | **lun 14/04/25** | **mié 23/04/25** | | | |
| 53 | | Gestion Tramite de licencia de construccion y obtencion de permisos ambientales | 10 días | lun 14/04/25 | mié 23/04/25 | 20 | | |
| 54 | | **Fin de etapa 1** | 0 días | mié 23/04/25 | mié 23/04/25 | 53 | | |
| 55 | | **ETAPA 2 - CONSTRUCCION -** | **120 días** | **mié 23/04/25** | **jue 21/08/25** | | | |
| 56 | | **Inicio etapa Construcción** | 0 días | mié 23/04/25 | mié 23/04/25 | 54 | | |
| 57 | | PRELIMINARES | 10 días | jue 24/04/25 | sáb 3/05/25 | 56 | | |
| 58 | | CERRAMIENTO | 30 días | dom 4/05/25 | lun 2/06/25 | 57 | | |
| 59 | | CANCHA SINTETICA | 40 días | mar 3/06/25 | sáb 12/07/25 | 58 | | |

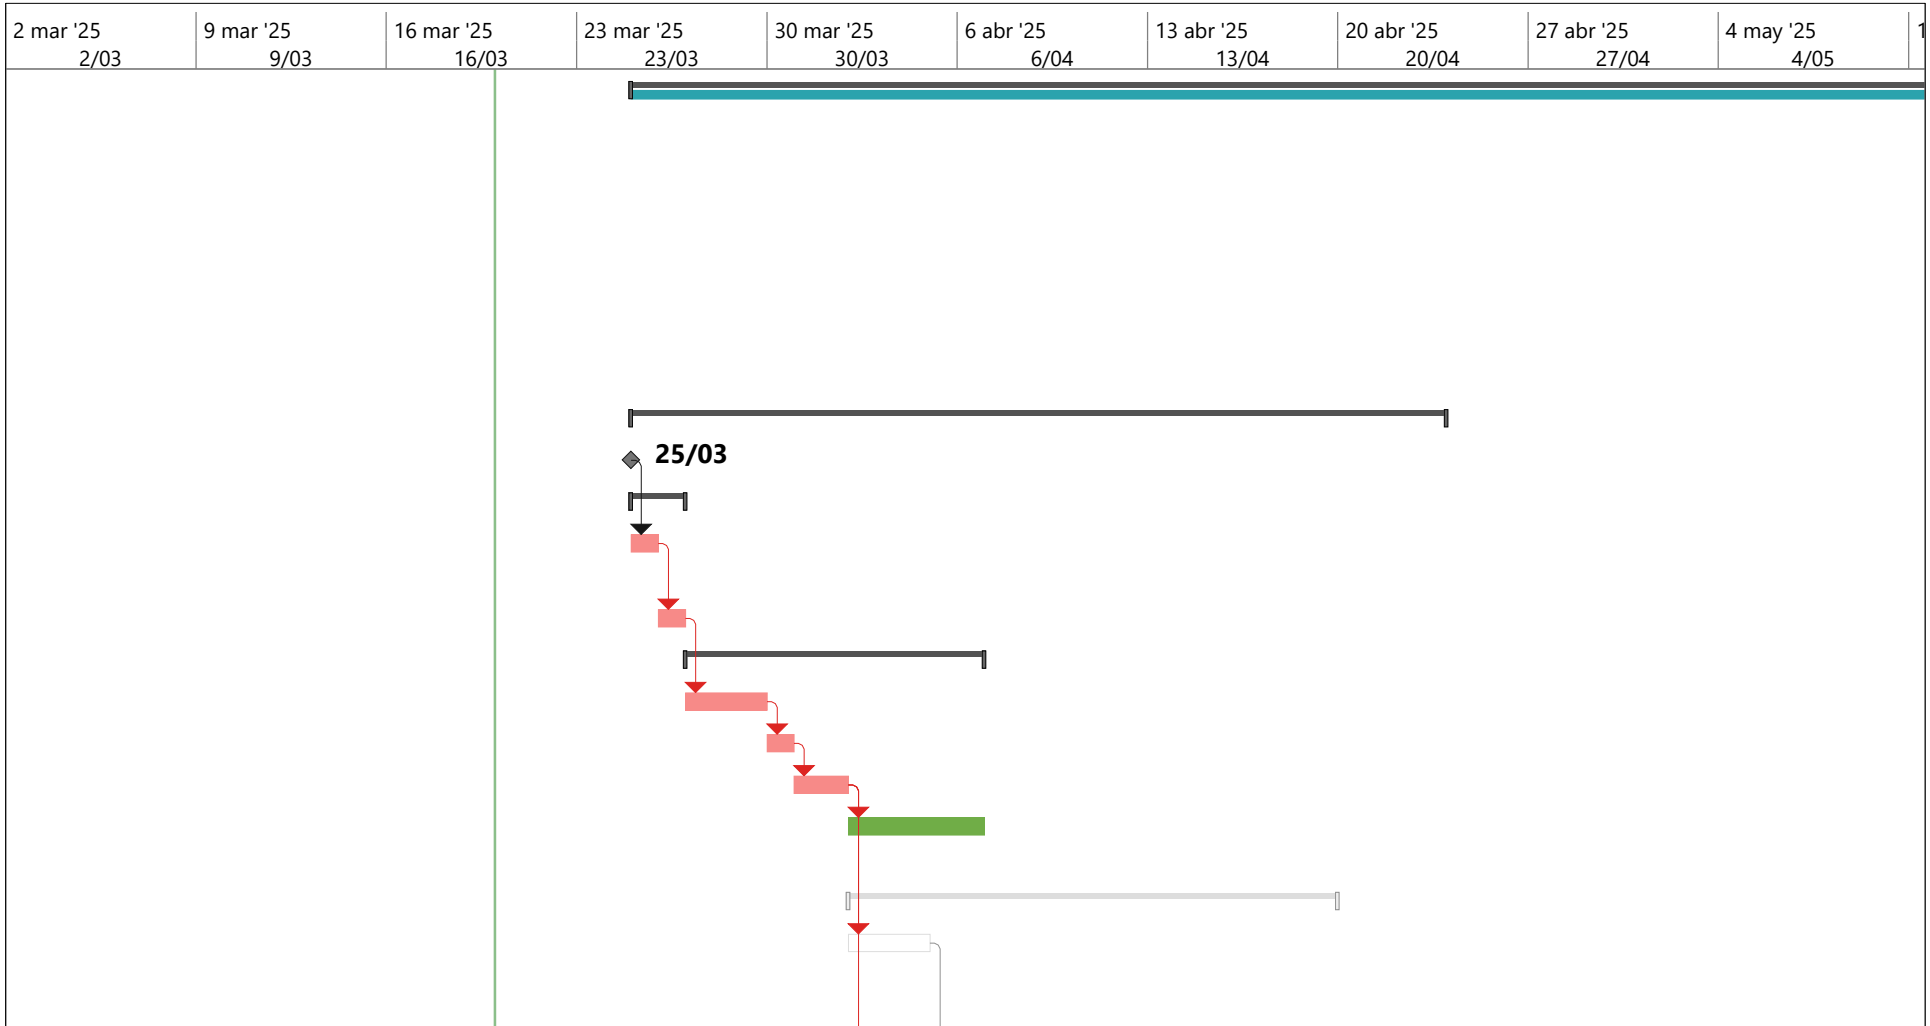
Proyecto: programacion 14-08-
Fecha: jue 20/03/25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | | Resumen inactivo | | Tareas externas | |
| División | | Tarea manual | | Hito externo | |
| Hito | | solo duración | | Fecha límite | |
| Resumen | | Informe de resumen manual | | Tareas críticas | |
| Resumen del proyecto | | Resumen manual | | División crítica | |
| Tarea inactiva | | solo el comienzo | | Progreso | |
| Hito inactivo | | solo fin | | Progreso manual | |

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos | 23 feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | | BAÑOS Y VESTIER | 30 días | dom 13/07/25 | lun 11/08/25 | 59 | | |
| 61 | | PROVISIONES | 10 días | mar 12/08/25 | jue 21/08/25 | 60 | | |
| 62 | | **Fin etapa Construcción** | 0 días | jue 21/08/25 | jue 21/08/25 | 61 | | |

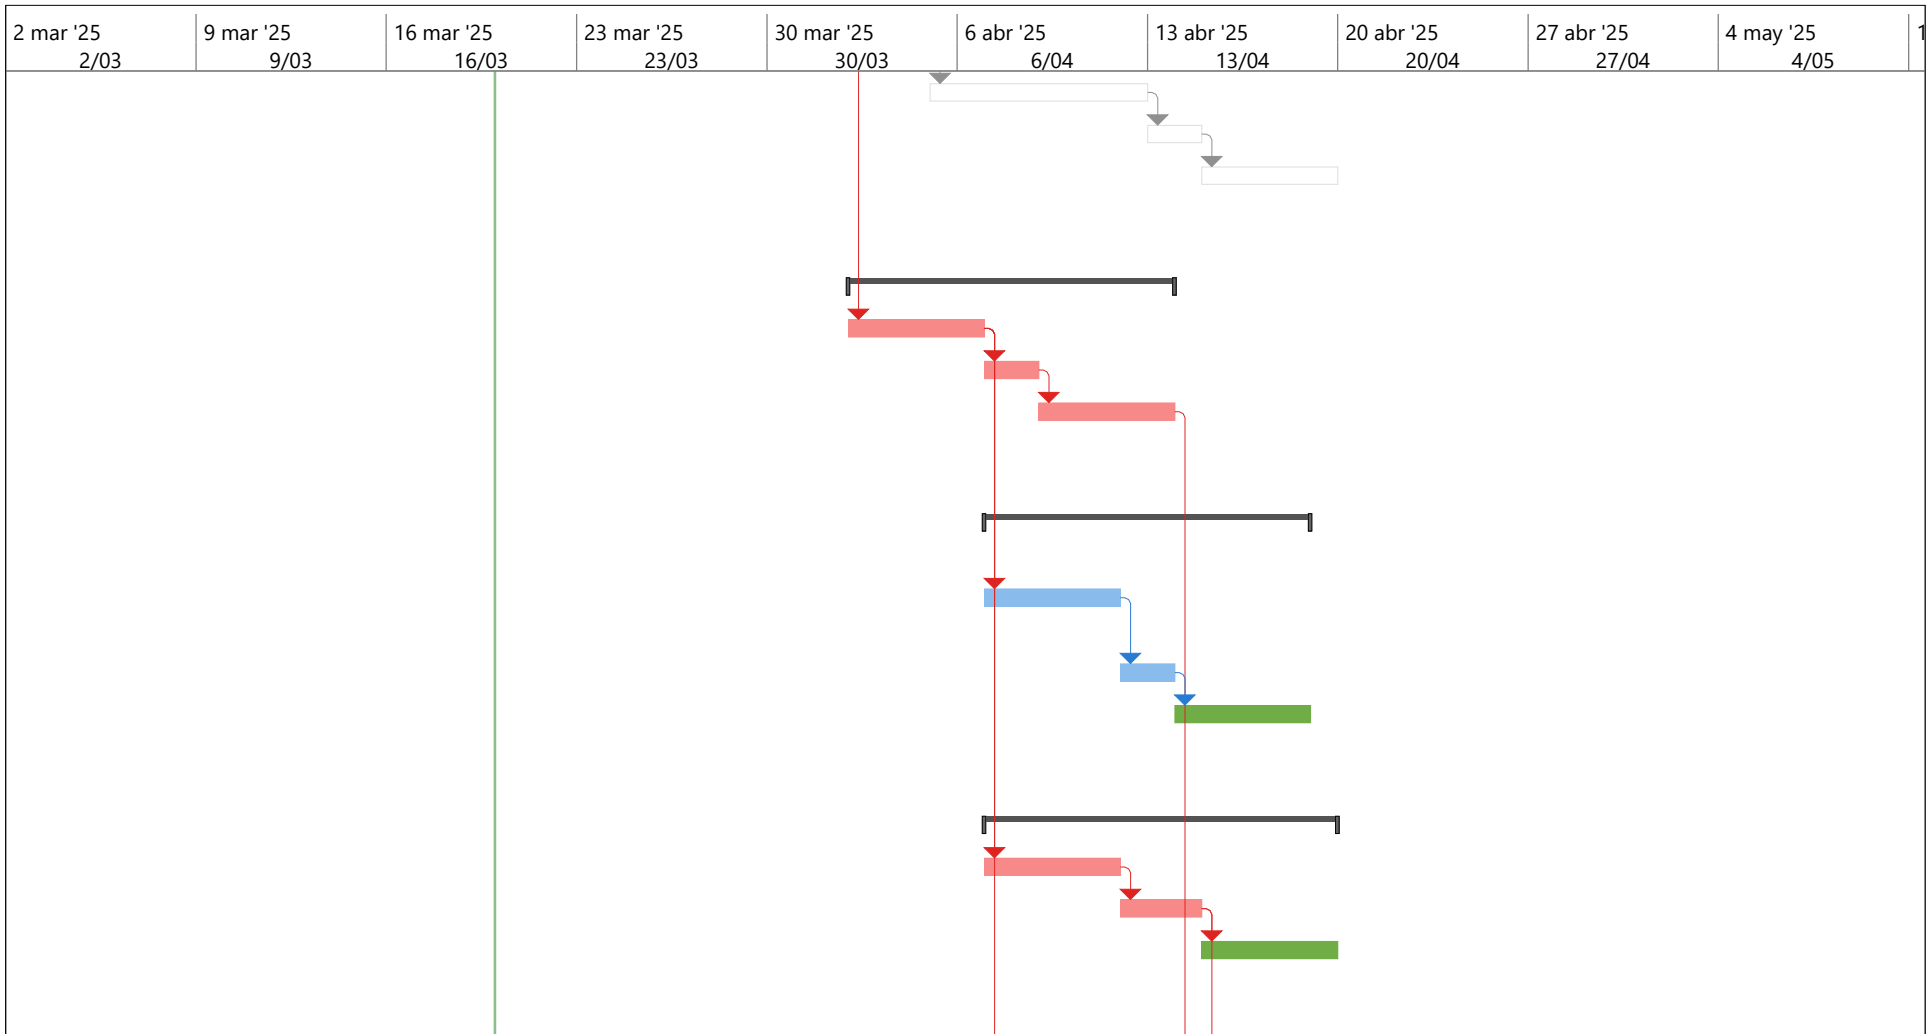
Proyecto: programacion 14-08-
Fecha: jue 20/03/25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | Resumen inactivo | Tareas externas |
| División | Tarea manual | Hito externo |
| Hito | solo duración | Fecha límite |
| Resumen | Informe de resumen manual | Tareas críticas |
| Resumen del proyecto | Resumen manual | División crítica |
| Tarea inactiva | solo el comienzo | Progreso |
| Hito inactivo | solo fin | Progreso manual |



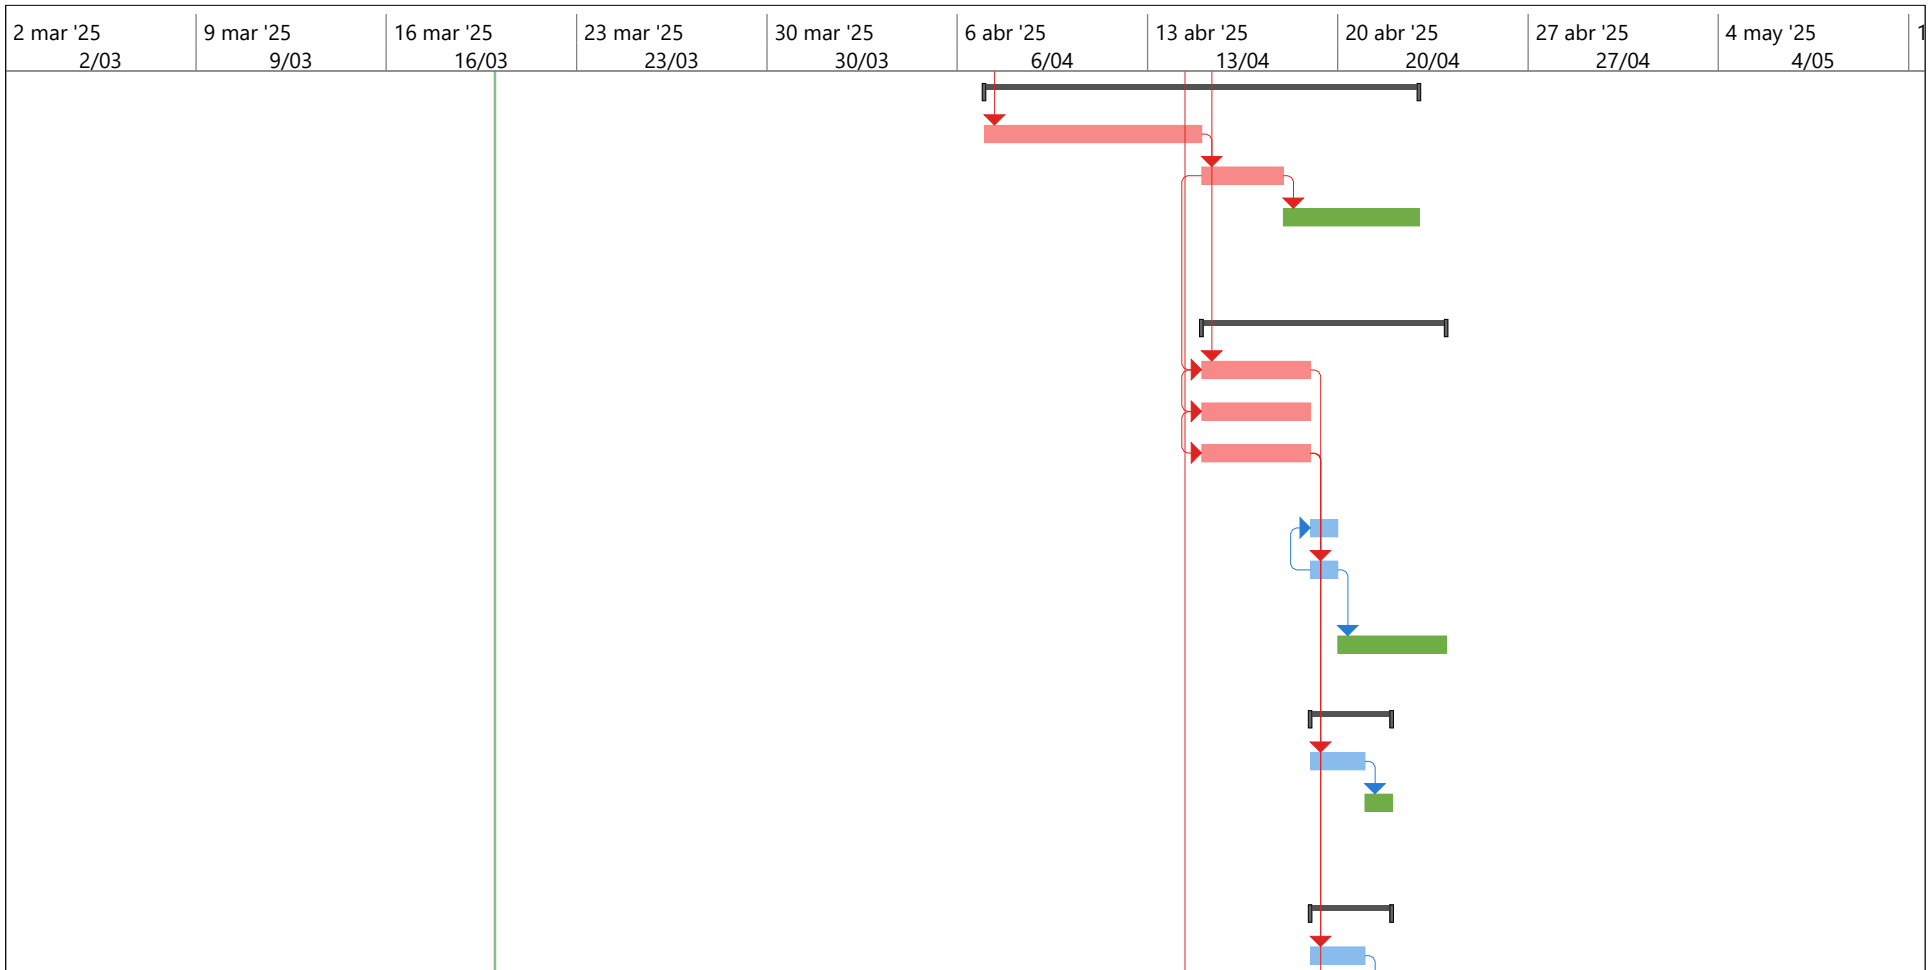

Proyecto: programacion 14-08-
Fecha: jue 20/03/25

| | | |
|---|---|---|
| Tarea | Resumen inactivo | Tareas externas |
| División | Tarea manual | Hito externo |
| Hito | solo duración | Fecha límite |
| Resumen | Informe de resumen manual | Tareas críticas |
| Resumen del proyecto | Resumen manual | División crítica |
| Tarea inactiva | solo el comienzo | Progreso |
| Hito inactivo | solo fin | Progreso manual |



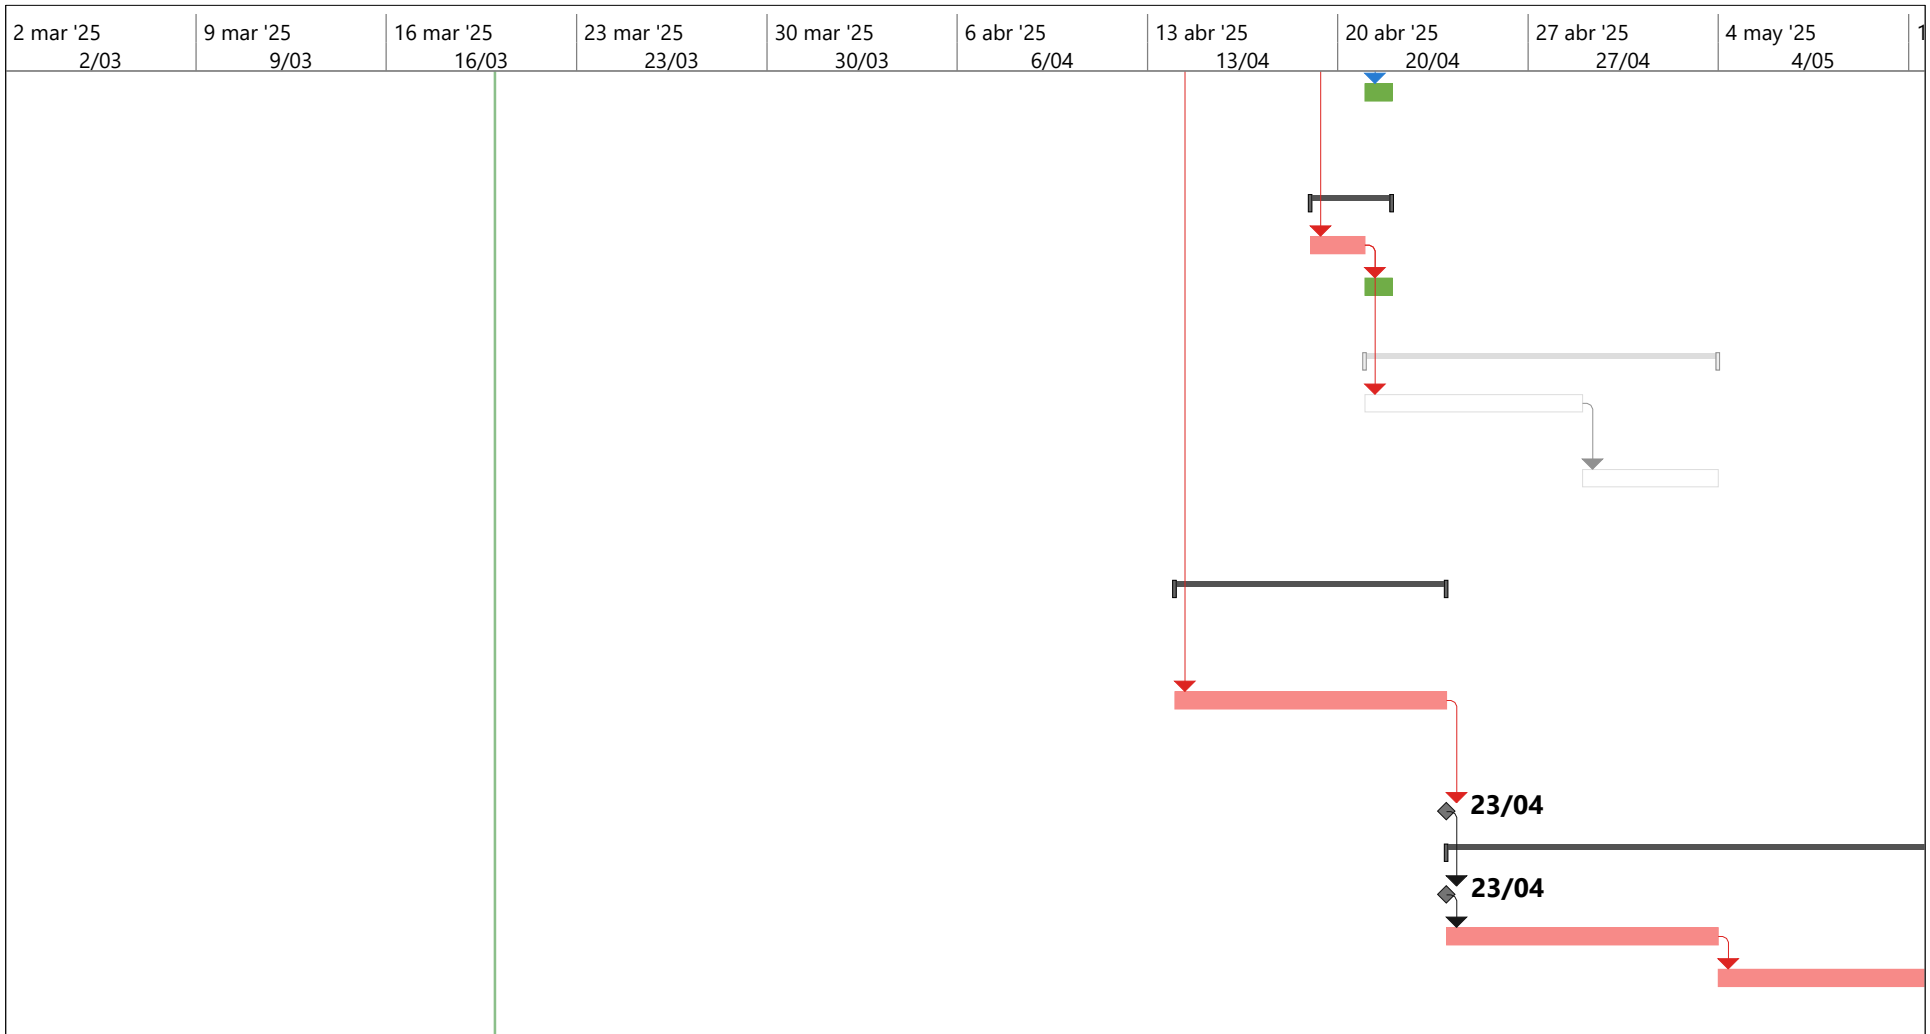

Proyecto: programacion 14-08-
Fecha: jue 20/03/25

| | | |
|---|---|---|
| Tarea | Resumen inactivo | Tareas externas |
| División | Tarea manual | Hito externo |
| Hito | solo duración | Fecha límite |
| Resumen | Informe de resumen manual | Tareas críticas |
| Resumen del proyecto | Resumen manual | División crítica |
| Tarea inactiva | solo el comienzo | Progreso |
| Hito inactivo | solo fin | Progreso manual |





Proyecto: programacion 14-08-
Fecha: jue 20/03/25

| | | |
|---|---|---|
| Tarea | Resumen inactivo | Tareas externas |
| División | Tarea manual | Hito externo |
| Hito | solo duración | Fecha límite |
| Resumen | Informe de resumen manual | Tareas críticas |
| Resumen del proyecto | Resumen manual | División crítica |
| Tarea inactiva | solo el comienzo | Progreso |
| Hito inactivo | solo fin | Progreso manual |



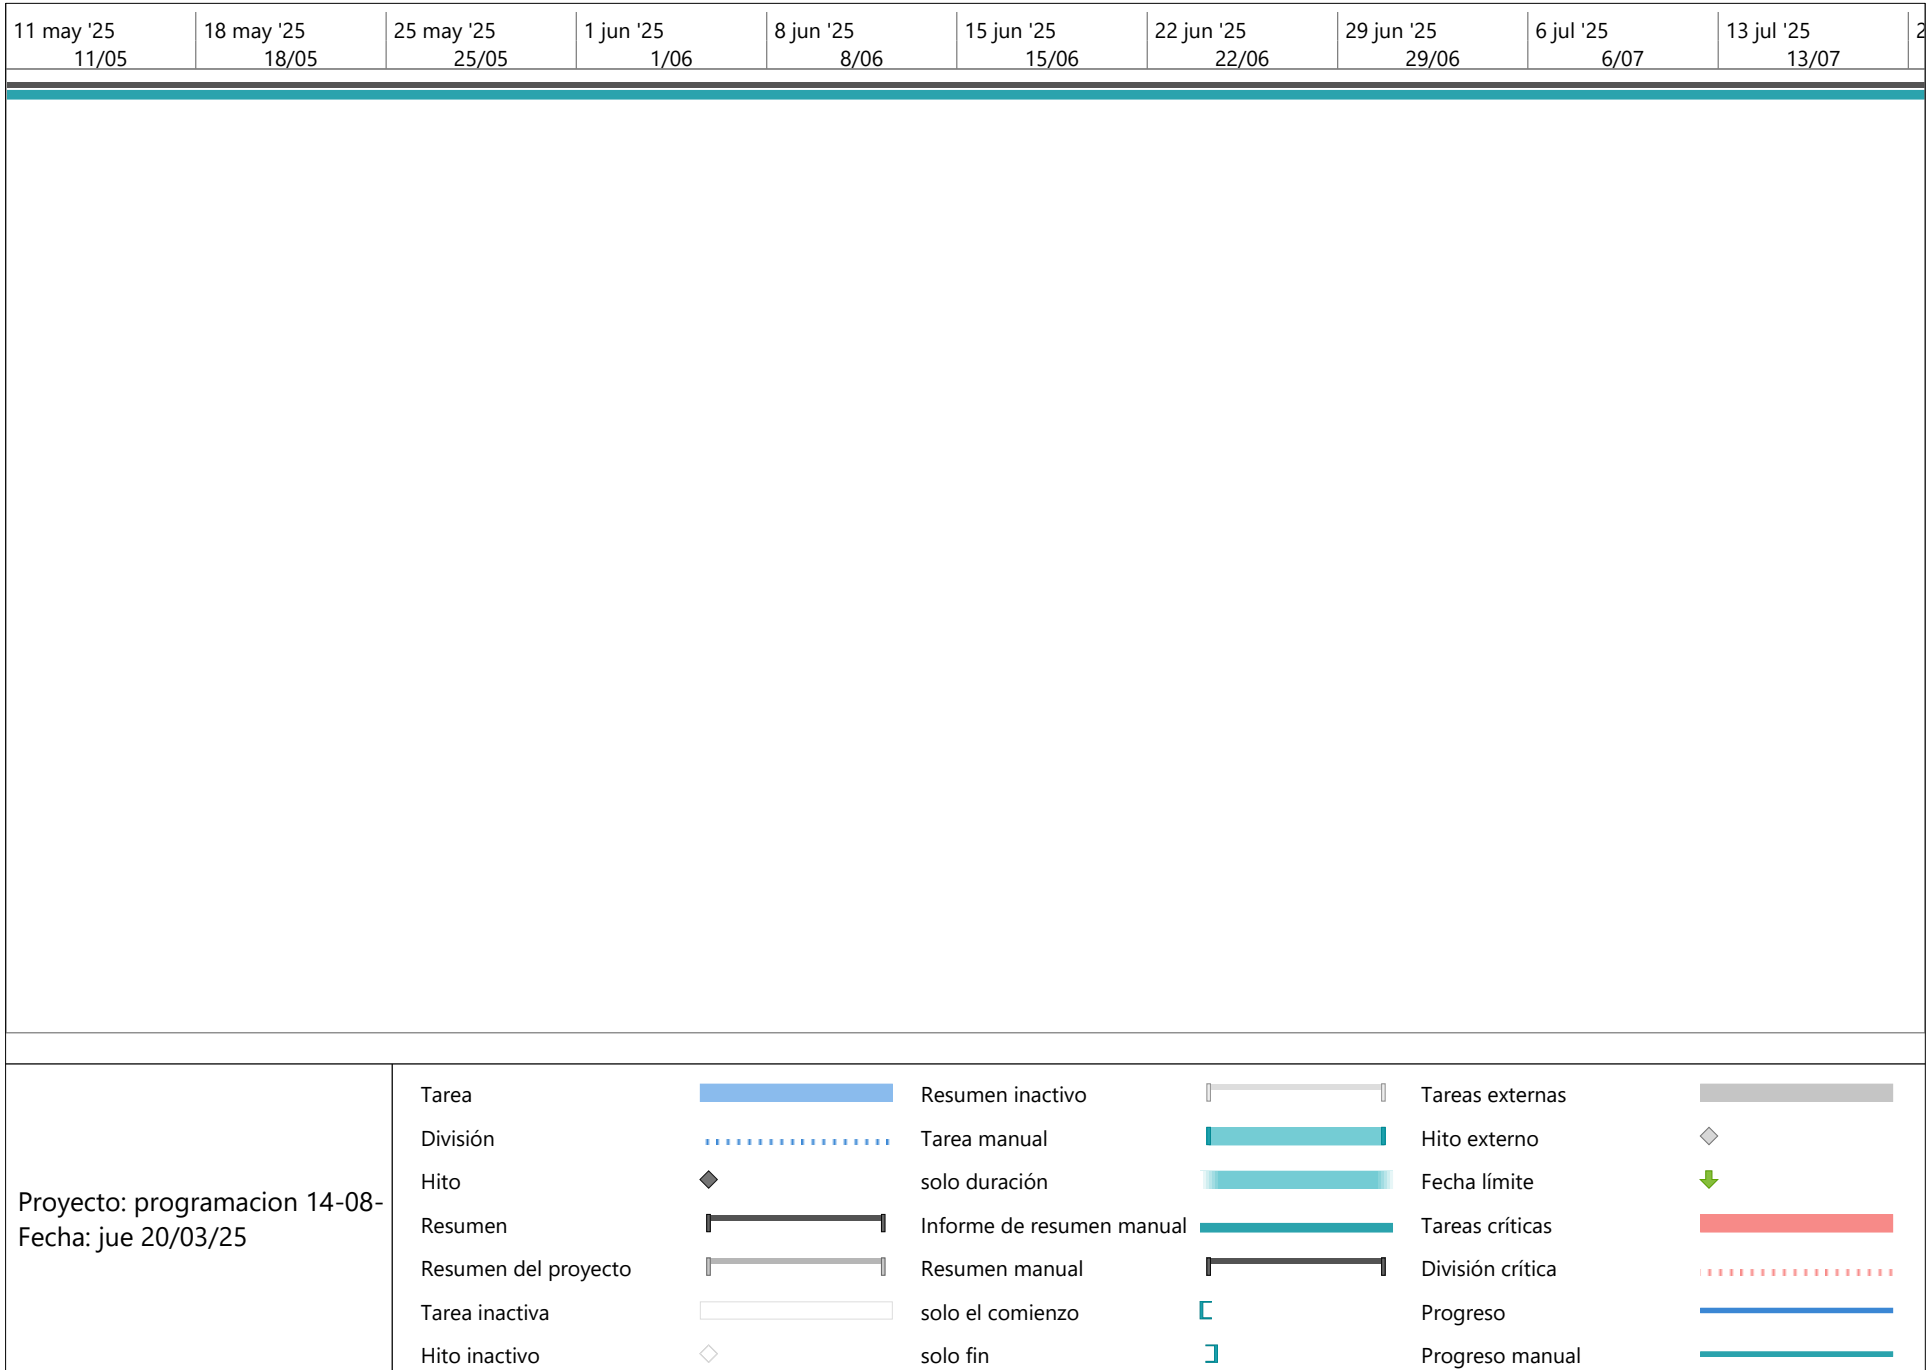

Proyecto: programacion 14-08-
Fecha: jue 20/03/25

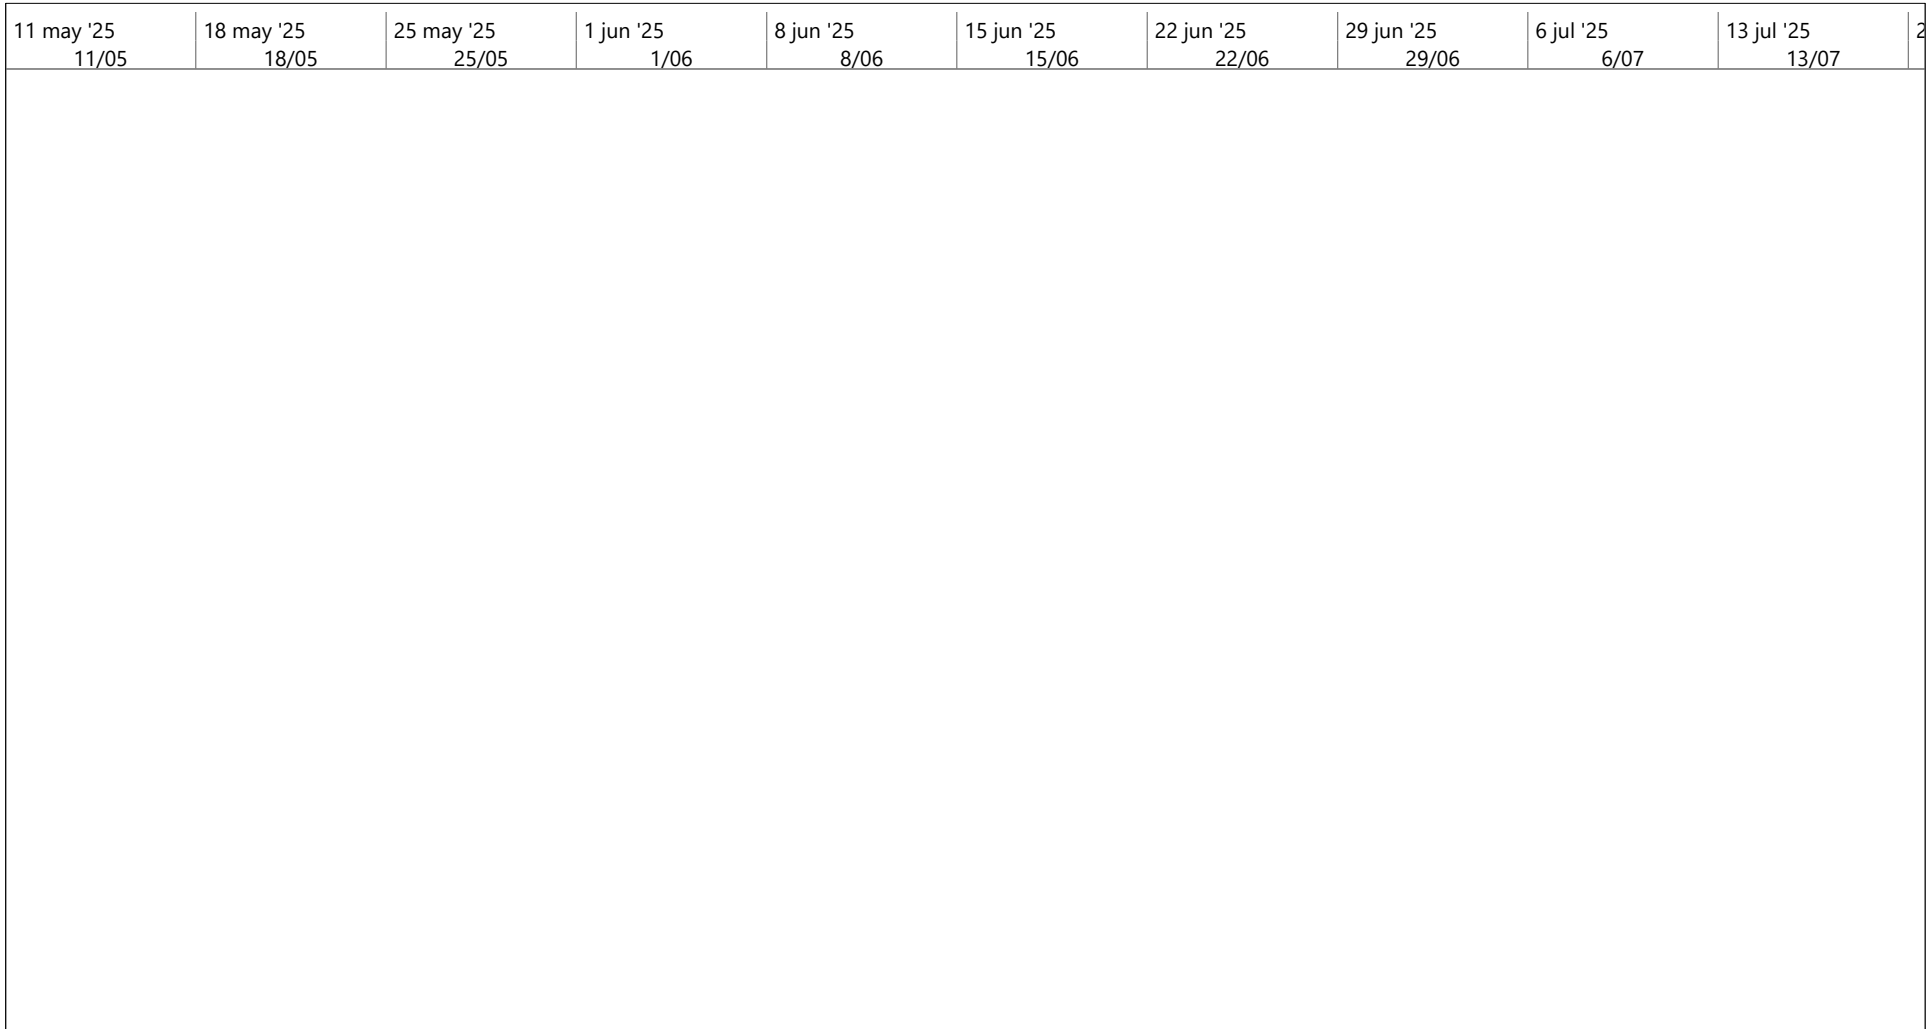
| | | |
|---|---|---|
| Tarea | Resumen inactivo | Tareas externas |
| División | Tarea manual | Hito externo |
| Hito | solo duración | Fecha límite |
| Resumen | Informe de resumen manual | Tareas críticas |
| Resumen del proyecto | Resumen manual | División crítica |
| Tarea inactiva | solo el comienzo | Progreso |
| Hito inactivo | solo fin | Progreso manual |




Proyecto: programacion 14-08-
Fecha: jue 20/03/25

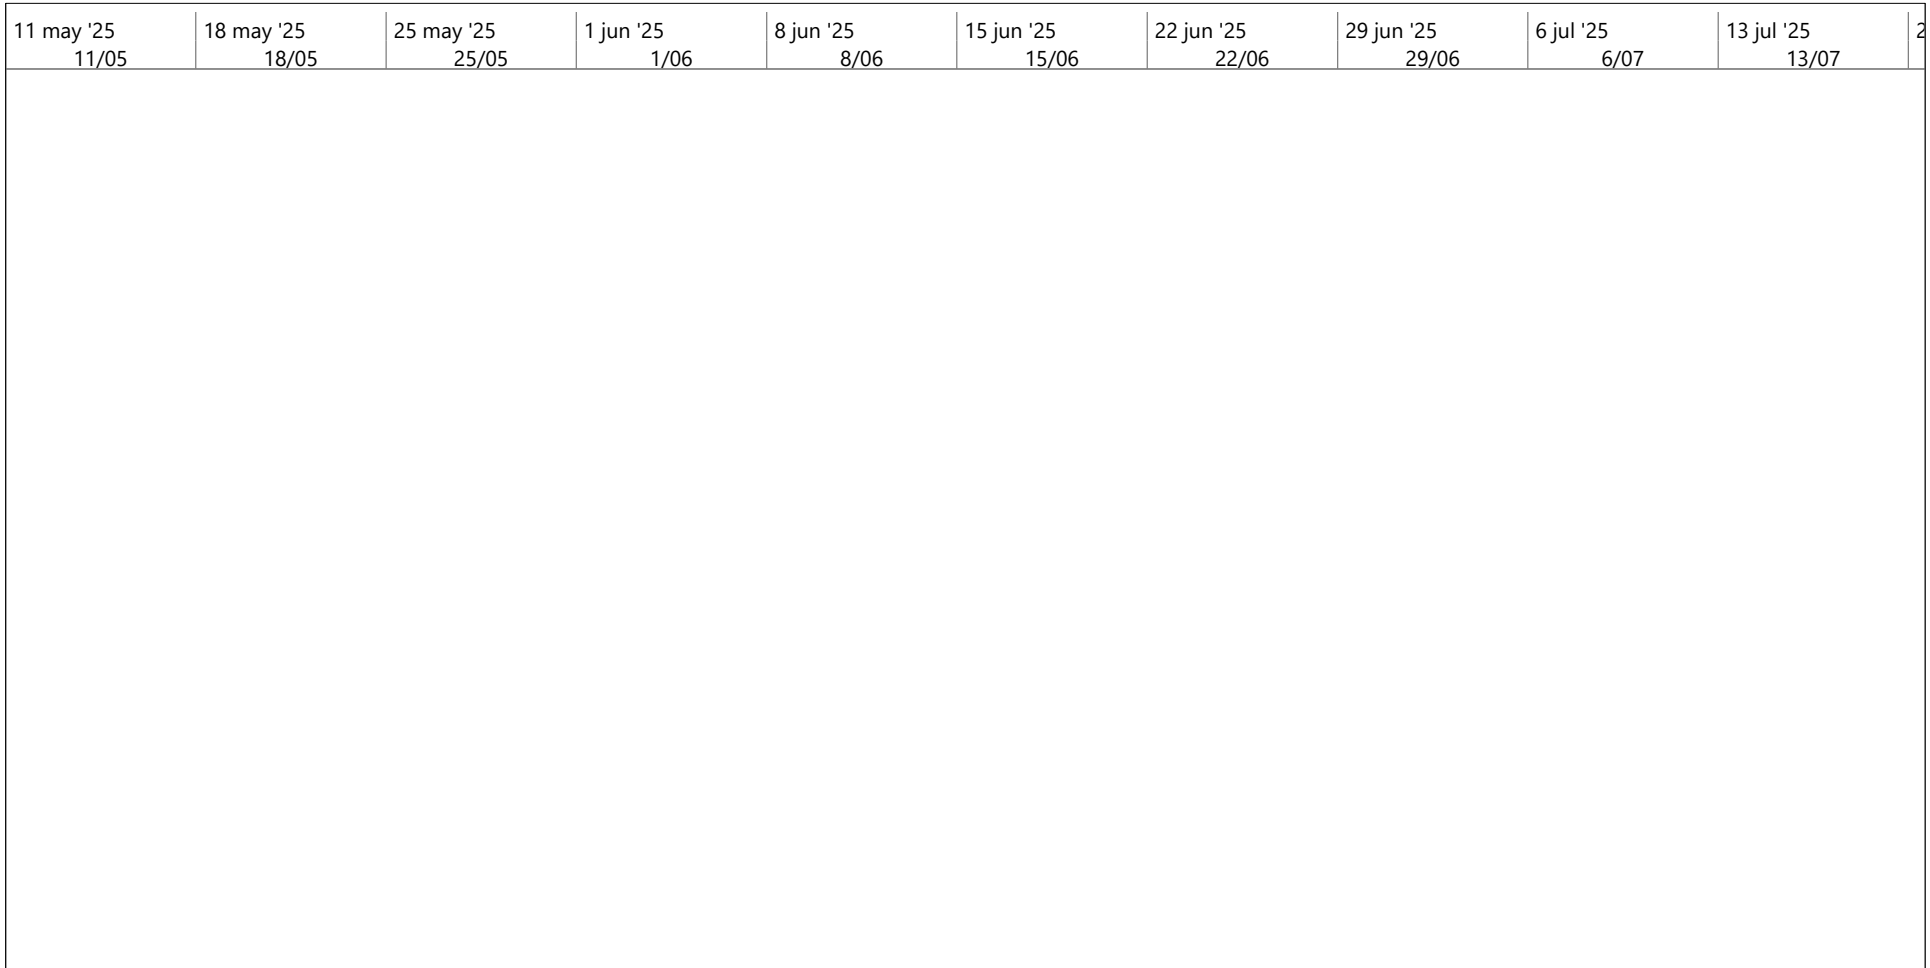
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | | Resumen inactivo | | Tareas externas | |
| División | | Tarea manual | | Hito externo | |
| Hito | | solo duración | | Fecha límite | |
| Resumen | | Informe de resumen manual | | Tareas críticas | |
| Resumen del proyecto | | Resumen manual | | División crítica | |
| Tarea inactiva | | solo el comienzo | | Progreso | |
| Hito inactivo | | solo fin | | Progreso manual | |


11 may '25
11/05
18 may '25
18/05
25 may '25
25/05
1 jun '25
1/06
8 jun '25
8/06
15 jun '25
15/06
22 jun '25
22/06
29 jun '25
29/06
6 jul '25
6/07
13 jul '25
13/07
Proyecto: programacion 14-08-
Fecha: jue 20/03/25
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual



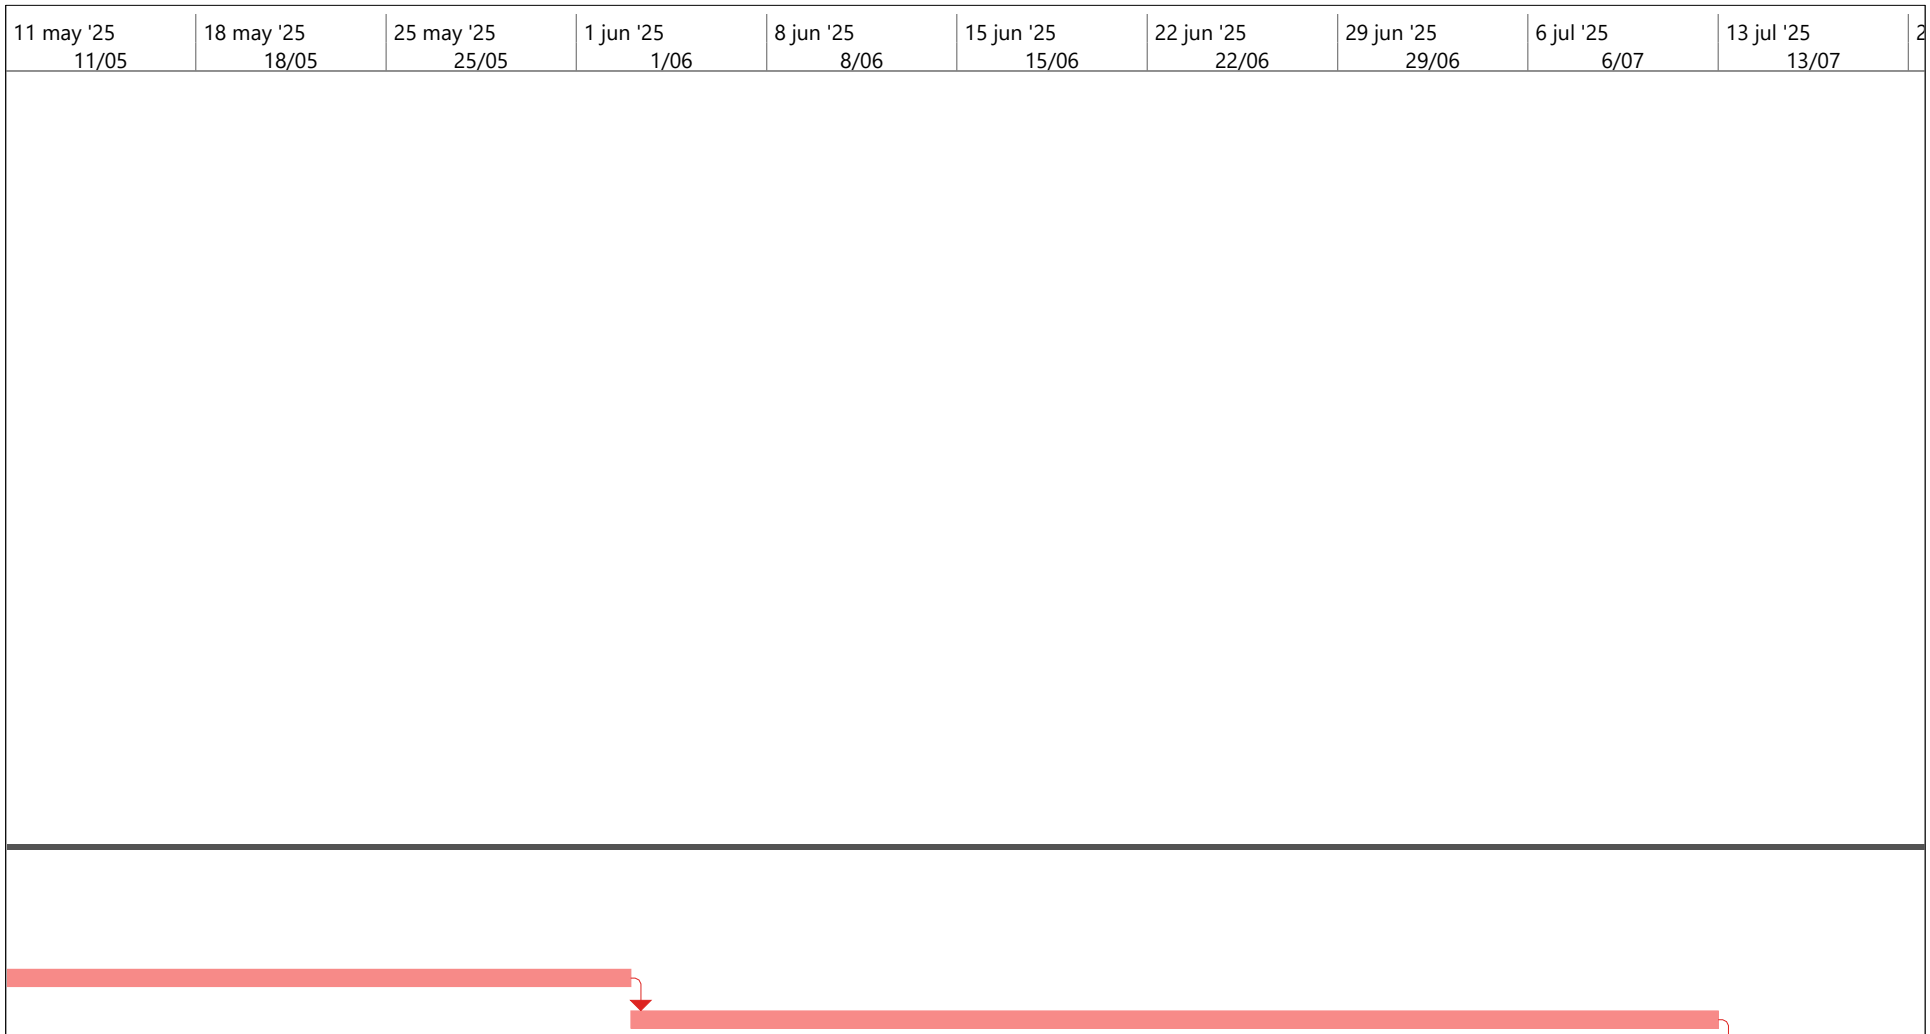

Proyecto: programacion 14-08-
Fecha: jue 20/03/25

| | | |
|---|---|---|
| Tarea | Resumen inactivo | Tareas externas |
| División | Tarea manual | Hito externo |
| Hito | solo duración | Fecha límite |
| Resumen | Informe de resumen manual | Tareas críticas |
| Resumen del proyecto | Resumen manual | División crítica |
| Tarea inactiva | solo el comienzo | Progreso |
| Hito inactivo | solo fin | Progreso manual |





Proyecto: programacion 14-08-
Fecha: jue 20/03/25

| | | |
|---|---|---|
| Tarea | Resumen inactivo | Tareas externas |
| División | Tarea manual | Hito externo |
| Hito | solo duración | Fecha límite |
| Resumen | Informe de resumen manual | Tareas críticas |
| Resumen del proyecto | Resumen manual | División crítica |
| Tarea inactiva | solo el comienzo | Progreso |
| Hito inactivo | solo fin | Progreso manual |



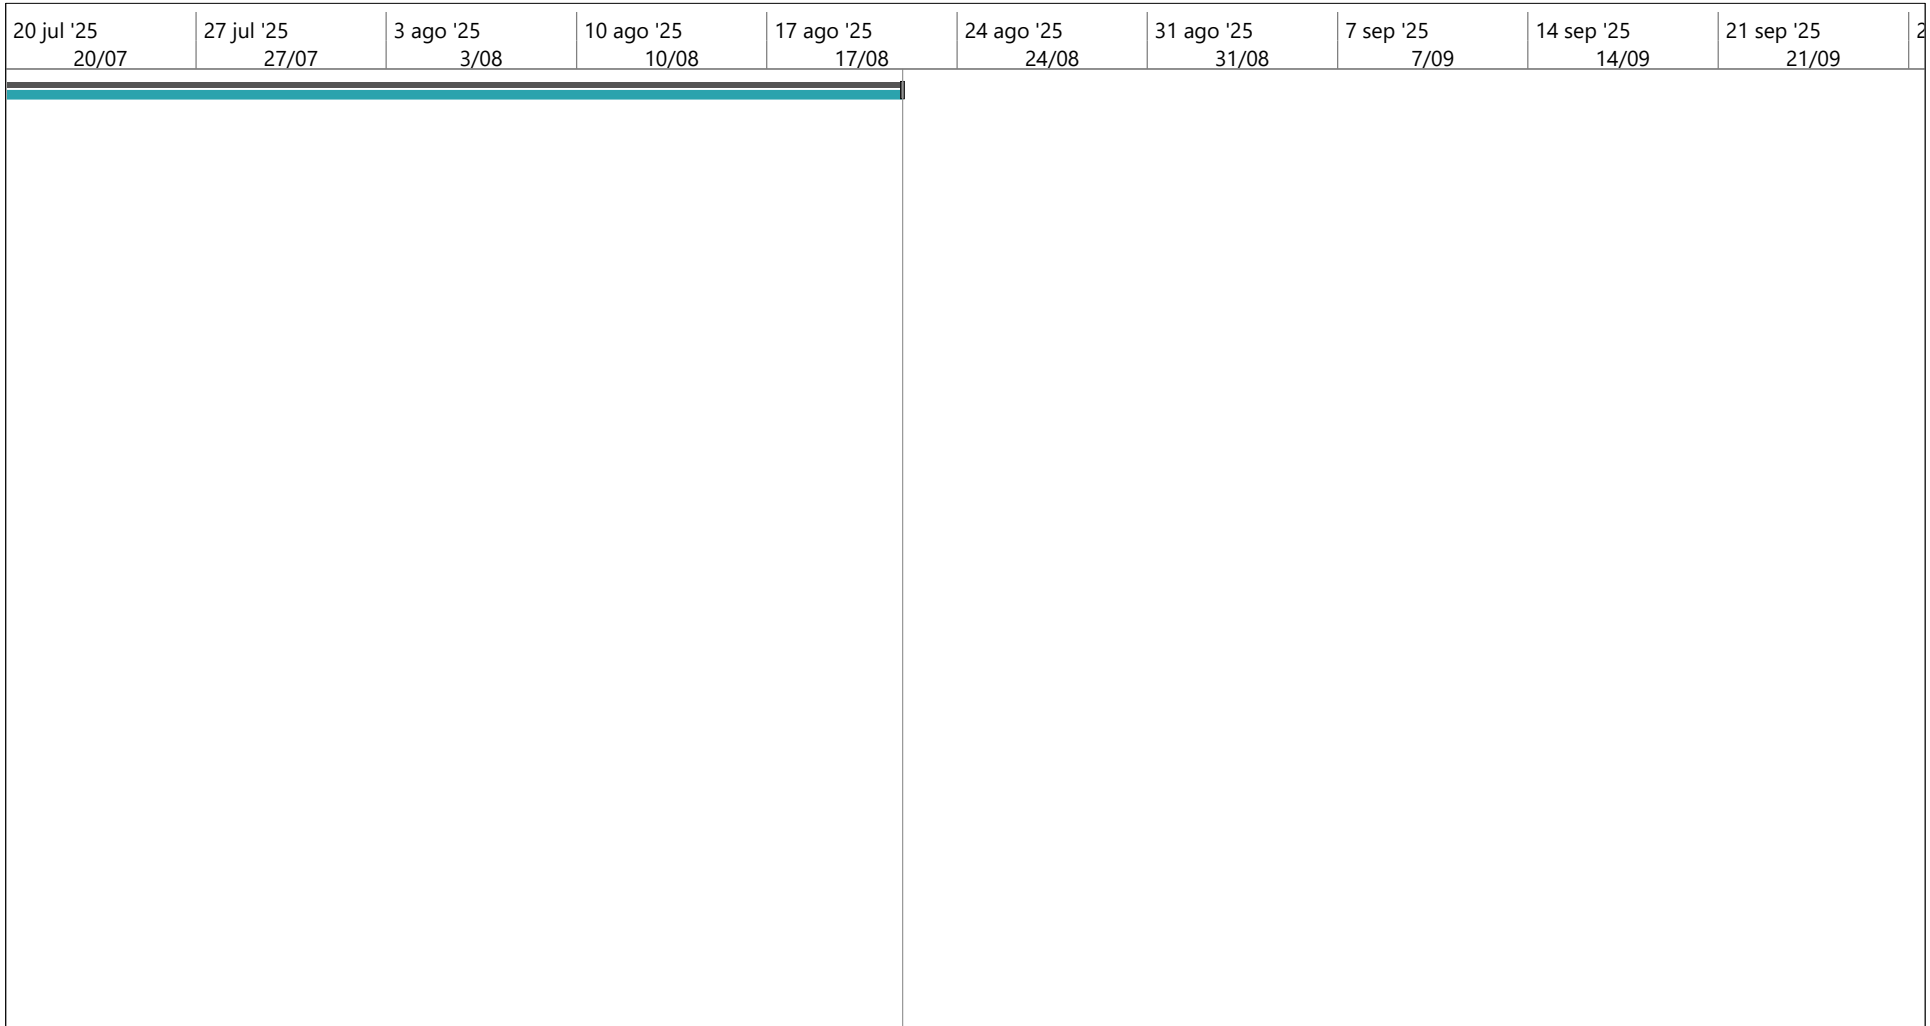

Proyecto: programacion 14-08-
Fecha: jue 20/03/25

| | | |
|---|---|---|
| Tarea | Resumen inactivo | Tareas externas |
| División | Tarea manual | Hito externo |
| Hito | solo duración | Fecha límite |
| Resumen | Informe de resumen manual | Tareas críticas |
| Resumen del proyecto | Resumen manual | División crítica |
| Tarea inactiva | solo el comienzo | Progreso |
| Hito inactivo | solo fin | Progreso manual |



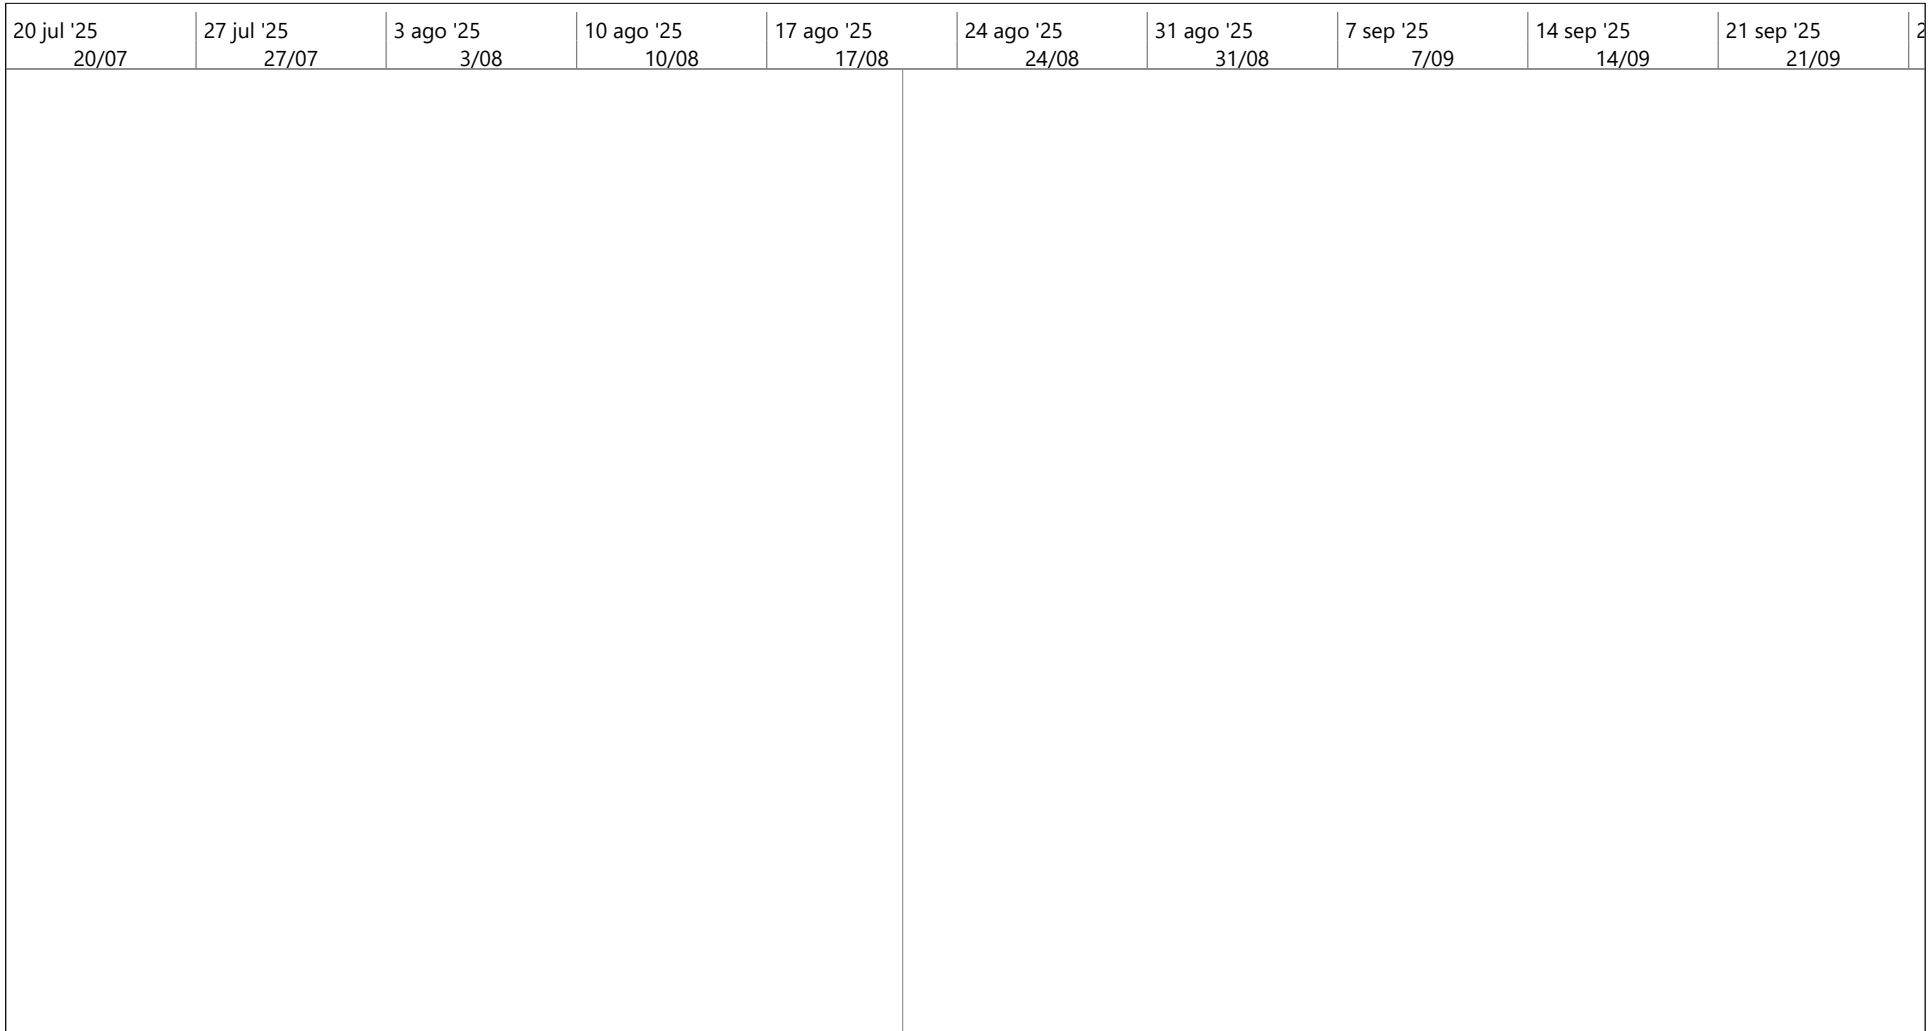

Proyecto: programacion 14-08-
Fecha: jue 20/03/25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | | Resumen inactivo | | Tareas externas | |
| División | | Tarea manual | | Hito externo | |
| Hito | | solo duración | | Fecha límite | |
| Resumen | | Informe de resumen manual | | Tareas críticas | |
| Resumen del proyecto | | Resumen manual | | División crítica | |
| Tarea inactiva | | solo el comienzo | | Progreso | |
| Hito inactivo | | solo fin | | Progreso manual | |




Proyecto: programacion 14-08-
Fecha: jue 20/03/25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | | Resumen inactivo | | Tareas externas | |
| División | | Tarea manual | | Hito externo | |
| Hito | | solo duración | | Fecha límite | |
| Resumen | | Informe de resumen manual | | Tareas críticas | |
| Resumen del proyecto | | Resumen manual | | División crítica | |
| Tarea inactiva | | solo el comienzo | | Progreso | |
| Hito inactivo | | solo fin | | Progreso manual | |




Proyecto: programacion 14-08-
Fecha: jue 20/03/25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | | Resumen inactivo | | Tareas externas | |
| División | | Tarea manual | | Hito externo | |
| Hito | | solo duración | | Fecha límite | |
| Resumen | | Informe de resumen manual | | Tareas críticas | |
| Resumen del proyecto | | Resumen manual | | División crítica | |
| Tarea inactiva | | solo el comienzo | | Progreso | |
| Hito inactivo | | solo fin | | Progreso manual | |





Proyecto: programacion 14-08-
Fecha: jue 20/03/25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | | Resumen inactivo | | Tareas externas | |
| División | | Tarea manual | | Hito externo | |
| Hito | | solo duración | | Fecha límite | |
| Resumen | | Informe de resumen manual | | Tareas críticas | |
| Resumen del proyecto | | Resumen manual | | División crítica | |
| Tarea inactiva | | solo el comienzo | | Progreso | |
| Hito inactivo | | solo fin | | Progreso manual | |




Proyecto: programacion 14-08-
Fecha: jue 20/03/25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | | Resumen inactivo | | Tareas externas | |
| División | | Tarea manual | | Hito externo | |
| Hito | | solo duración | | Fecha límite | |
| Resumen | | Informe de resumen manual | | Tareas críticas | |
| Resumen del proyecto | | Resumen manual | | División crítica | |
| Tarea inactiva | | solo el comienzo | | Progreso | |
| Hito inactivo | | solo fin | | Progreso manual | |




Proyecto: programacion 14-08-
Fecha: jue 20/03/25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | | Resumen inactivo | | Tareas externas | |
| División | | Tarea manual | | Hito externo | |
| Hito | | solo duración | | Fecha límite | |
| Resumen | | Informe de resumen manual | | Tareas críticas | |
| Resumen del proyecto | | Resumen manual | | División crítica | |
| Tarea inactiva | | solo el comienzo | | Progreso | |
| Hito inactivo | | solo fin | | Progreso manual | |

Primavera
Ingeniería s.a.s

07 de marzo de 2024 PR-026-011

**Señores:**

**INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA**
Dirección. Calle 42 # 45-22. Sede Centro- Colsamiro
Correo electrónico. procesoscontractuales@unibarranquilla.edu.co
Teléfono. 605 3112370. Barranquilla

**Con copia a:**

**KEYVEEN GUILLERMO CASTRO AMARANTO**
Representante Legal
HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S
Interventoría.

**REFERENCIA: CONTRATO No. 20240949** cuyo objeto es: "adecuación de infraestructura física para la construcción del polideportivo de la institución universitaria de barranquilla en el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria no. 041-161089 que incluye el cerramiento del lote, la construcción de una cancha sintetica y la provisión de baños y vestieres provenientes del convenio interadministrativo no. 202303009 con la gobernación del atlántico"

**ASUNTO:** Solicitud de reinicio de obra y prórroga.

Cordial saludo,

De acuerdo con la comunicación 003-2025 emitida el día 06 de marzo de 2025 por parte de la interventoría, en la cual aprueban la programación propuesta para el desarrollo de la Etapa 1 y 2 del contrato en referencia, nos permitimos solicitar el reinicio del contrato con fecha del lunes 10 de marzo, una vez superados las causales que dieron motivo a la suspensión.

PRIMAVERA INGENIERÍA S.A.S NIT.900.495.107-8

Primavera
Ingeniería s.a.s

En consecuencia, a lo anterior, y con el fin de garantizar el cumplimiento óptimo de los términos acordados del contrato en referencia, solicitamos respetuosamente, una prórroga al tiempo de ejecución del contrato de 150 días calendario, tiempo prudente para el desarrollo de las Etapa I de complementación de estudios y diseños, y Etapa II desarrollo del objeto del mismo.

En este contexto dejamos a su consideración la pertinencia de nuestra solicitud. Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente:



**LUIS FERNANDO LEGUIZAMO**
Representante Legal.

PRIMAVERA INGENIERÍA S.A.S NIT.900.495.107-8

Cra. 5 N° 12-09
Of. 504 Edificio Calle Real
Neiva - Huila
(8) 873 09 16
primaveraingenieria@gmail.com
info@primaveraingenieria.com
