SOLICITUD DE MODIFICACIÓN No. 001 AL CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO Y HURTADO CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO GENOVA E INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GENOVA QUINDIO
CONTRATISTA:	HURTADO CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT	901.282.482-4
REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ
C.C.	89.008.186 DE ARMENIA Q.
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS ($155.418.806) M/CTE.
PLAZO EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato.
FECHA DE INICIO:	10 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	26 DE MARZO DE 2025

El Ingeniero **JOSE GUILLERMO VALENCIA VASQUEZ**, jefe de Oficina de Infraestructura Social de la Secretaria de Aguas e Infraestructura del Departamento del Quindío, en calidad de supervisor del Contrato De Obra No. 020 de 2024, cuyo objeto es *"ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO GENOVA E INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GENOVA QUINDIO"*.

1. Que el Departamento del Quindío adelanto proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 042 de 2024, el cual se adjudicó a HURTADO CONSTRUCCIONES S.A.S. con Nit., 901.282.482-4 Representada Legalmente por OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ identificado con Cedula de Ciudadanía 89.008.186 de Armenia Q., con el cual se suscribió el Contrato de Obra No. 020 de 2024, cuyo objeto corresponde a *"ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO GENOVA E INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GENOVA QUINDIO"*.

2. Que de conformidad con la Clausula Tercera del Contrato de Obra No. 020 de 2024, se pactó como *VALOR DEL CONTRATO* la suma de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS ($155.418.806) M/CTE., respaldado bajo el Certificado de Disponibilidad No. 5178 del 24 de octubre de 2024.


3. Que de conformidad a la Clausula Cuarta del Contrato de Obra No. 020 de 2024, se pactó como *PLAZO DE EJECUCION* cuarenta y cinco (45) días Calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

4. Que conforme a lo anterior se firmó el acta de inicio el día 10 de febrero de 2025 con fecha de terminación el día 26 de marzo de 2025.

5. Mediante oficio con radicado No. 2025110004175-2, identificado con Id. 164494 y fechado el 17 de marzo de 2025, la representante legal de **HURTADO CONSTRUCCIONES S.A.S. OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ,** solicitó a la Supervisión una prórroga DE TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, para la ejecución del contrato, argumentando que:

> ***Por medio de la presente, nos dirigimos a usted con el fin de solicitar una prórroga de 30 días en el plazo contractual del contrato de obra en referencia nombrado, debido a las condiciones climáticas presentadas en las últimas semanas, las cuales han afectado el desarrollo normal de las actividades programadas.***
>
> ***Las siguientes consideraciones han generado demoras en la ejecución de ciertas tareas, impactando la movilidad y operatividad de la obra.***
>
> - ***Las condiciones climáticas presentadas durante el periodo de ejecución de la obra han afectado el desarrollo normal de las actividades programadas en el Municipio de Génova.***
>
> ***Se presentan reportes del periódico en donde nos indican las fuertes lluvias caídas en el departamento del Quindío y principalmente en la vía a Génova.***
>
> *Adjuntos:*
> - *Reporte de prensa de lluvia Génova, Quindío.*
> - *Histograma de lluvias en el sur del Quindío.*


Imagen1. Tiempo observado de 2025 en el Armenia / El Edén

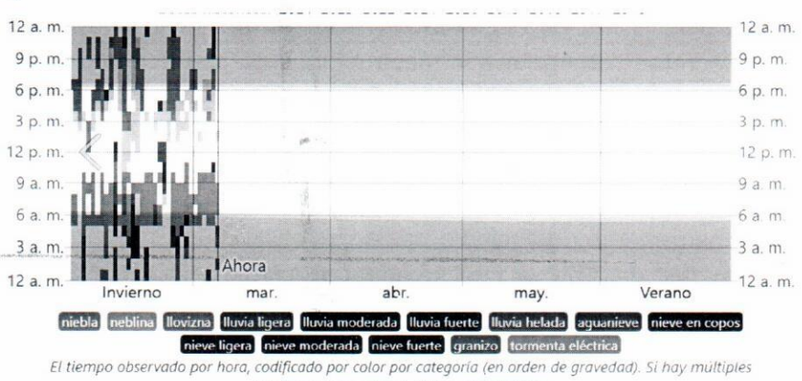

El tiempo observado por hora, codificado por color por categoría (en orden de gravedad). Si hay múltiples informes, se muestra el código más drástico.

Fuente: Weather Spark, Link: https://es.weatherspark.com/h/s/149851/2025/0/Datos-hist%C3%B3ricos-meteorol%C3%B3gicos-de-la-primavera-2025-en-el-Armenia-El-Eden-Colombia#Figures-ObservedWeather

REPORTES DE LA CRONICA

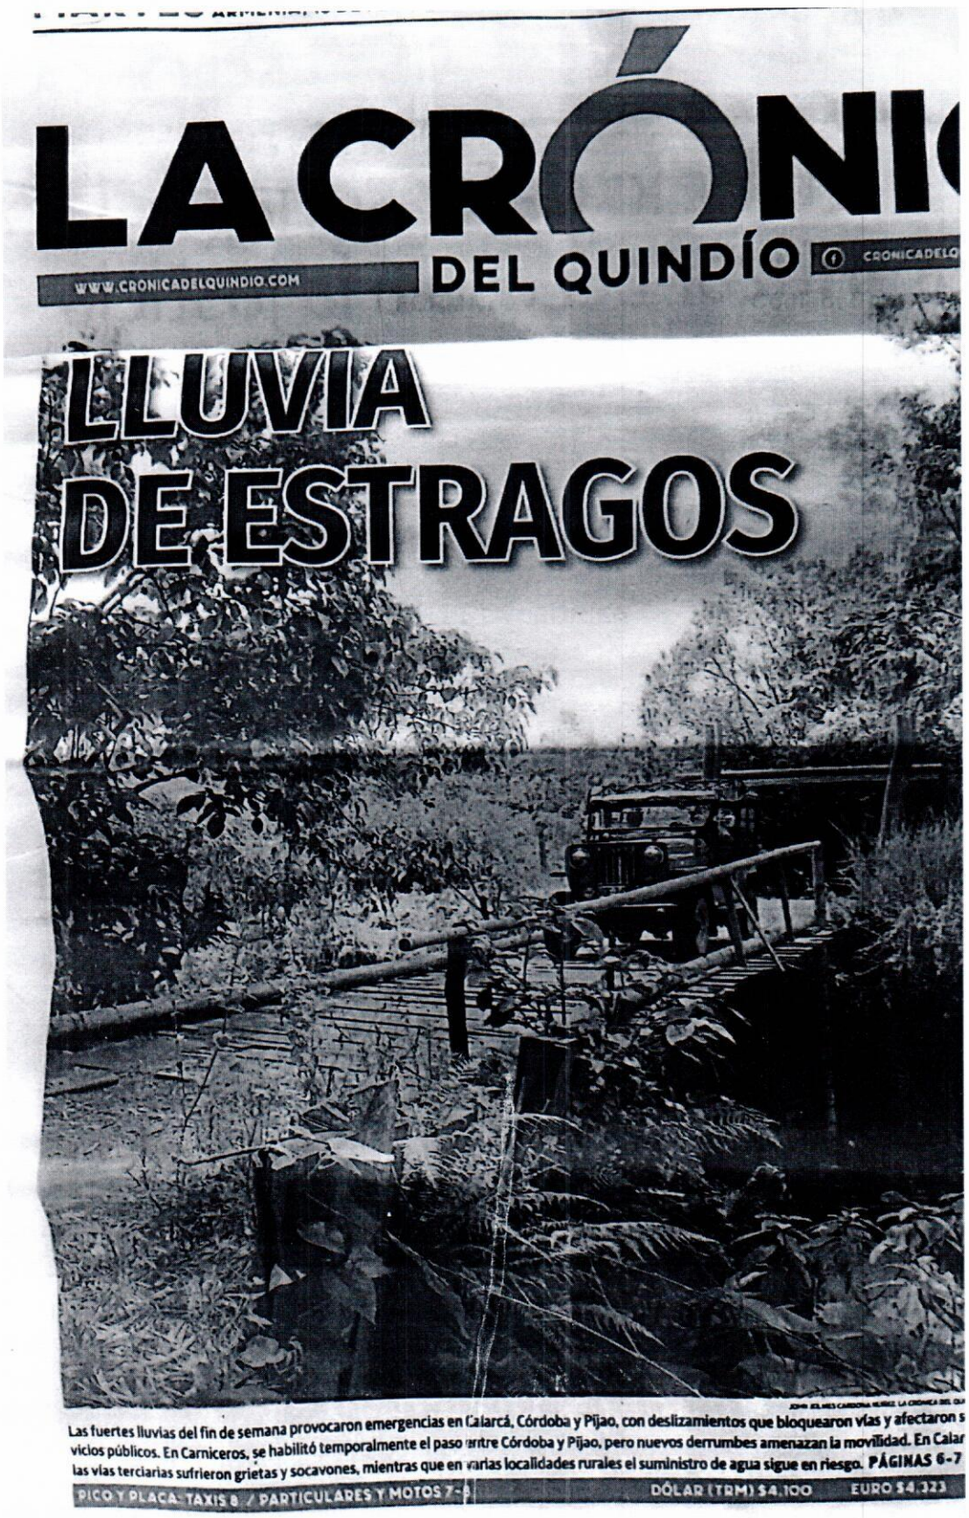

LA CRÓNIC
DEL QUINDÍO
WWW.CRONICADELQUINDIO.COM

LLUVIA DE ESTRAGOS

Las fuertes lluvias del fin de semana provocaron emergencias en Calarcá, Córdoba y Pijao, con deslizamientos que bloquearon vías y afectaron s
vicios públicos. En Carniceros, se habilitó temporalmente el paso entre Córdoba y Pijao, pero nuevos derrumbes amenazan la movilidad. En Calar
las vías terciarias sufrieron grietas y socavones, mientras que en varias localidades rurales el suministro de agua sigue en riesgo. PÁGINAS 6-7

PICO Y PLACA: TAXIS 8 / PARTICULARES Y MOTOS 7-8 DÓLAR (TRM) $4.100 EURO $4.323

LA CRÓNICA DEL QUINDÍO MIÉRCOLES ARMENIA, 19 DE FEBRERO DE 2025

EFECTOS DE 'LA NIÑA'

Alerta en el sur del Quindío por lluvias: Génova, el más afectado

Las lluvias de las últimas 24 horas han generado emergencias por derrumbes que han afectado vías, puentes y servicios públicos.

Por Andrés Felipe Ramos Gómez
regional@cronicadelquindio.com

Los municipios del sur del Quindío, junto con Calarcá, permanecen en máxima alerta tras las intensas lluvias de las últimas horas, que han debilitado el terreno y provocado deslizamientos.

La situación más crítica se registra en Génova, donde varios derrumbes han bloqueado vías. Uno de ellos cubrió por completo el acceso principal a la zona urbana desde Barragán.

Este deslizamiento ocurrió en el sector de Río Lejos, finca Volga. La obstrucción, de entre 30 y 40 metros de longitud, impide el tránsito vehicular en ambos sentidos.

Al cierre de esta edición, miembros de la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (Omgerd) y de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (Udegerd) trabajaban con maquinaria amarilla para despejar la vía y restablecer el tránsito.

MÁS EMERGENCIAS EN 24 HORAS

Las fuertes lluvias también han generado otras situaciones de emergencia en el 'Bello Rincón Quindiano'.

El alcalde de Génova, Diego Fernando Sicua Galvis, informó que en cinco sectores se han registrado deslizamientos, pérdida de banca y daños en puentes.

"En la vereda San Juan, los derrumbes afectaron las fincas El Descanso, La Frontera y La Ilusión. En la vereda El Cedral, se perdió parte de la banca y hubo daños en un cabezote de obra. En La Venada, un deslizamiento afectó la escuela del sector", explicó el mandatario.

En Cumaral y San Juan, las crecientes súbitas de las quebradas La Borrascosa y El Brasil han impedido el paso vehicular. Además, en El Dorado, el puente Las Marías colapsó.

Las autoridades han instado a la comunidad a mantenerse atenta a la información oficial y tomar precauciones. "Seguiremos informando sobre el avance de los trabajos", aseguraron.

AFECTACIONES EN OTRAS LOCALIDADES


Jaider Alexánder Hidalgo González, coordinador de la Udegerd, entregó un balance de los daños recientes en el Quindío.

"En Córdoba, deslizamientos en las veredas La Española y San José de La Cocha contaminaron el agua del acueducto principal, dejando al municipio sin suministro hídrico por un día. En Buenavista, un derrumbe afectó la vereda La Mina, sector Concorde. Pijao también sufrió un movimiento en masa en la vereda La Cumbre", señaló.

Agregó que ingenieros, geólogos y geógrafos realizan visitas técnicas para evaluar los terrenos y mitigar riesgos. "Se han identificado erosiones severas y deslizamientos que requieren medidas preventivas, como la instalación de plásticos protectores en las zonas más vulnerables", detalló.

Hidalgo González también hizo un llamado a la comunidad para tomar precauciones adicionales, como mantener limpias las canaletas y bajantes, asegurar los techos y evitar arrojar basura en las calles para prevenir inundaciones.

"Pedimos a los conductores manejar con precaución, ya que las vías mojadas aumentan el riesgo de accidentes. En caso de emergencia, pueden comunicarse con las líneas 123 y 119 del Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia para una atención rápida", concluyó.

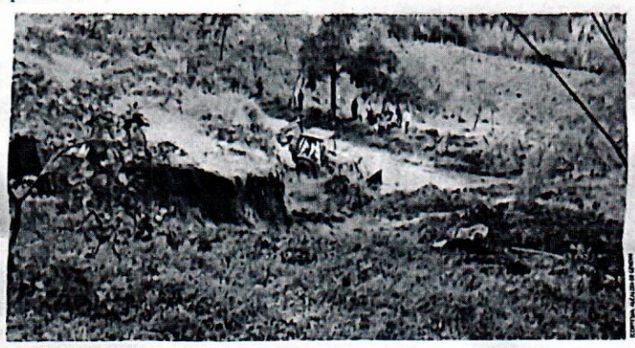

En Génova, un deslizamiento bloqueó la vía principal de ingreso al municipio desde Barragán, lo que requirió el uso de maquinaria amarilla para su despeje.

ALERTA EN CALARCÁ

Calarcá también enfrenta afectaciones por las fuertes lluvias, especialmente en sus vías terciarias.

El incidente más reciente ocurrió en la noche del lunes 17 de febrero en la vía que conecta Potosí con Quebradanegra.

El alcalde de la 'Villa del Cacique', Juan Sebastián Ramos Velasco, explicó que la comunidad alertó de inmediato sobre un derrumbe, lo que permitió una rápida intervención.

"El equipo de maquinaria amarilla de la Secretaría de Infraestructura actuó de inmediato, ya que muchas personas dependen de esta vía para llegar a sus fincas y corregimientos. No podíamos esperar hasta el día siguiente para solucionar la situación", afirmó.

A esta emergencia se suman deslizamientos en la vereda Planadas, donde también fue necesario despejar el paso con maquinaria amarilla. En La Paloma Alta, transportadores reportaron grietas en la vía destapada, lo que dificulta el tránsito de vehículos camperos.

Finalmente, en Balboa, intersección que conecta Calarcá con el sur del Quindío y Armenia, un deslizamiento afectó uno de los sentidos de la vía. Sin embargo, funcionarios y maquinaria amarilla lograron despejar el material para restablecer la movilidad.

PRONÓSTICO DEL IDEAM

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, pronosticó que las lluvias intensas en el Quindío y otras regiones del país se prolongarán hasta el viernes 21 de febrero.

Las precipitaciones afectarán principalmente los departamentos de las regiones Andina, Pacífica y Amazónica.

El Ideam advirtió que, aunque el fenómeno de 'La Niña' ha sido corto y de intensidad débil, actualmente se encuentra en su punto máximo o cerca de él. Se espera que comience a debilitarse entre marzo y mayo, lo que explica las lluvias persistentes en el territorio colombiano.



1. INVIERNO

Hasta mediados del mes de Febrero del presente año se ha presentado un fuerte invierno en esta zona del país el cual ha incidido en el normal funcionamiento de los trabajos a cielo abierto, lo que ha repercutido en el plan de trabajo ocasionando retraso en las obras inicialmente proyectadas.

Como justificación de lo anterior podemos anexar informes del clima citados en bitácora durante los meses de Febrero y Marzo del 2025, justificados con los informes del IDEAM y la CRQ.

Debido a este invierno se han ocasionado derrumbes en las vías de acceso al municipio de Genova, lo cual le corresponde a las alcaldías y gobernaciones hacer los mantenimientos y retiro de derrumbes correspondientes, lo cual nos ha

perjudicado con la llevada de los materiales desde la ciudad de Armenia y la cantera del río La Vieja en Barragán
Es así como en este tramo se han presentado 11 derrumbes que impiden el paso de maquinaria y volquetas

Durante el período comprendido entre el 15 de Febrero y el 12 de Marzo 2025 se presentaron lluvias en los días laborados, dichos periodos de lluvia se presentaron tanto en jornada laboral como en fines de semana y las noches, obligando a tiempos de espera para el inicio de labores con el personal y reparación de obras ejecutadas previamente, lo que implica pérdidas de tiempo en el normal desarrollo de la obra, generando retrasos en las actividades contractuales

Hubo intensas lluvias en las noches las cuales causaban destrozos en las actividades realizadas en el día como excavaciones y solados , lo cual obligaba a realizar al día siguiente reparaciones a los daños causados por estas lluvias, todo esto implicó pérdidas de tiempo en el normal funcionamiento de la obra.

BOLETINES HIDROMETEOROLOGICOS
De acuerdo con los reportes de precipitación diaria del IDEAM, se puede apreciar el registro de precipitaciones del 66,39% de los días calendario durante el periodo de Febrero y MARZO de 2025.
En estos dos meses se han incrementado las lluvias en un 36% con relación a los años anteriores, sin embargo las precipitaciones que aparecen en el cuadro no han permitido el normal desarrollo de las actividades.

Mes	Días del mes	Días de lluvia	
02/15/2025	28	11	39%
03/22/2025	22 (transcurridos)	8	36%
TOTAL	50	19	37,5%

REPORTES DE PRECIPITACION CRQ

La CRQ entrega reportes de precipitación cada cuatrimestre, de manera que a la fecha se cuentan con los reportes hasta diciembre del 2024, sin embargo los informes diarios que reportan nos dan esta información.

Con respecto al seguimiento diario en obra y soportados con los registros del IDEAM, se evidenciaron lluvias irregulares durante los meses Febrero y Marzo del 2025, algunos de estos días que debían de corresponder a la estación seca.
Estos días, en los cuales se presentaron lluvias, así no se tengan en cuenta la intensidad de las mismas, son días en los que no se pudieron desarrollar de manera normal, las actividades programadas, pues la presencia de lluvia durante la jornada laboral o durante la noche, obliga al personal operativo a realizar reprocesos o repetir actividades ejecutadas con anterioridad, las cuales fueron dañadas total o parcialmente por las lluvias presentadas, viéndonos en muchos de estos días lluviosos obligados a no ejecutar las actividades programadas, pues existen actividades que no se pueden realizar en medio de la lluvia.

A pesar de los esfuerzos para minimizar estos efectos, consideramos necesario solicitar esta ampliación del plazo, garantizando así la correcta ejecución de los trabajos.

En virtud de lo expuesto y con el fin de garantizar la correcta ejecución de la obra solicitamos la ampliación del plazo contractual en 30 días a partir del 25 de Marzo del 2025 hasta el 24 de Abril del 2025

6. De esta manera, la Supervisión ejercida por el ingeniero JOSÉ GUILLERMO VALENCIA VÁSQUEZ, Jefe de Oficina de Infraestructura Social, ha aceptado la prórroga del plazo de ejecución del contrato, tras validar que las condiciones climáticas adversas han afectado el desarrollo normal de las actividades y dificultado el cumplimiento del cronograma establecido.

7. Que de conformidad a lo anterior y teniendo en cuenta que el contrato se encuentra en ejecución y se ha venido ejecutando en los términos y plazos establecidos en la minuta contractual, esta supervisión considera técnicamente viable **PRORROGAR** el plazo de ejecución por un término de **TREINTA (30) DIAS CALENDARIO MAS,** contados desde el 27 de marzo de 2025 hasta el 25 de abril de 2025 quedando con un plazo de ejecución total de **SETENTA Y CINCO (75) CALENDARIO,** lo anterior con el fin de dar cumplimiento al alcance de objeto contractual.

Con base en lo anterior y como supervisor del contrato, recomiendo:

1. Autorizar la modificación del Contrato de Obra No. 020 de 2024, en su CLASULA CUARTA – PLAZO DE EJECUCION, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución inicialmente estipulado por un término de **TREINTA (30) DIAS CALENDARIO MAS,** contados desde el 27 de marzo de 2025 hasta el 25 de abril de 2025 quedando con un plazo de ejecución total de **SETENTA Y CINCO (75) CALENDARIO,** lo anterior con el fin de dar cumplimiento al alcance de objeto contractual.

2. Autorizar la modificación del Contrato de Obra No. 020, en el sentido de que el contratista deberá ampliar las vigencias de los riesgos amparados en las garantías establecidas en la Clausula Vigésima – *GARANTIAS CONTRACTUALES,* por el termino prorrogado, es decir TREINTA (30) DIAS CALENDARIO MAS.

3. El contratista asumirá los gastos de legalización que llegare a generar el contrato modificatorio.

4. Las demás estipulaciones contractuales contenidas en el Contrato de Obra No. 020 de 2024, continuaran vigentes y no sufren modificación alguna.

Se firma a los veintiséis (26) días del mes de marzo de 2025, en Armenia Quindío.

JOSÉ GUILLERMO VALENCIA VÁSQUEZ
Jefe de Oficina de Infraestructura Social
Secretaría de Aguas e Infraestructura
Departamento del Quindío

Elaboró Aspectos Técnicos: Mariana Quintero. Arquitecta - contratista SAID Quindío.
Revisó: Vanessa Katherine Rincón Gaviria - Director Operativo Vial y Social

HURTADO
CONSTRUCCIONES S.A.S.

Armenia, Quindío 25 de marzo de 2025

Al contestar cite Radicado: 20251100041752 Id: 164494
Fecha: 2025-03-17 10:42
Destinatario: SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
Remitente: HURTADO CONSTRUCCIONES S.A.S
Tipología Documental: AJUSTES PRESUPUESTALES
Folios: 3
Anexos: 0
Funcionario que radicó: DANIELA SOLIS CASTAÑO

Señores
GOBERNACIÓN DEL QUINDIO
ANT. ING. JOSE GUILLERMO VALENCIA VASQUEZ
JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Carrera 20 # 13-22 Ed. Gobernación

Ref. contrato de obra Nro. 014-2024 cuyo objeto es "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA INSTITUTO GENOVA E INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE DE PAUL, DE GENOVA QUINDIO."

Asunto: Solicitud de prórroga de tiempo.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos dirigimos a usted con el fin de solicitar una prórroga de 30 días en el plazo contractual del contrato de obra en referencia nombrado, debido a las condiciones climáticas presentadas en las últimas semanas, las cuales han afectado el desarrollo normal de las actividades programadas.

Las siguientes consideraciones han generado demoras en la ejecución de ciertas tareas, impactando la movilidad y operatividad de la obra.


- Las condiciones climáticas presentadas durante el periodo de ejecución de la obra han afectado el desarrollo normal de las actividades programadas en el Municipio de Génova.

Se presentan reportes del periódico en donde nos indican las fuertes lluvias caídas en el departamento del Quindío y principalmente en la vía a Genova.

Adjuntos:
- Reporte de prensa de lluvia Génova, Quindío.
- Histograma de lluvias en el sur del Quiundío.

AV CENTENARIO SAN JUAN EL REFUGIO CS 1
Tel: (606) 7321690
hurtadoconstruccionessas@gmail.com
Armenia, Quindío.

Imagen1. Tiempo observado de 2025 en el Armenia / El Edén

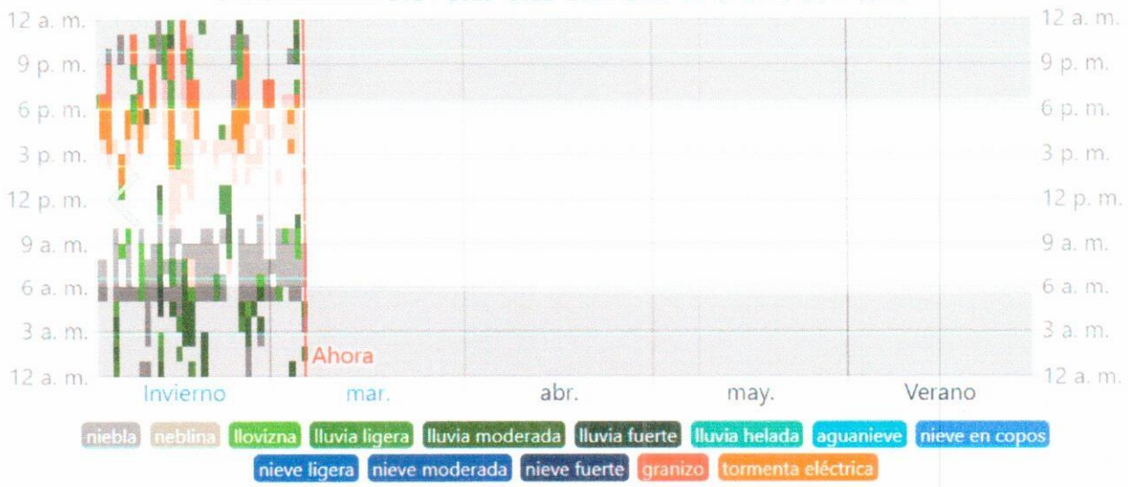

El tiempo observado por hora, codificado por color por categoría (en orden de gravedad). Si hay múltiples informes, se muestra el código más drástico.

Fuente: Weather Spark, Link: https://es.weatherspark.com/h/s/149851/2025/0/Datos-hist%C3%B3ricos-meteorol%C3%B3gicos-de-la-primavera-2025-en-el-Armenia-El-Eden-Colombia#Figures-ObservedWeather

AV CENTENARIO SAN JUAN EL REFUGIO CS 1
Tel: (606) 7321690
hurtadoconstruccionessas@gmail.com
Armenia, Quindío.

HURTADO
CONSTRUCCIONES S.A.S.

REPORTES DE LA CRONICA

LA CRÓNICA DEL QUINDÍO
MIÉRCOLES ARMENIA, 19 DE FEBRERO DE 2025

EFECTOS DE 'LA NIÑA'

Alerta en el sur del Quindío por lluvias: Génova, el más afectado

Las lluvias de las últimas 24 horas han generado emergencias por derrumbes que han afectado vías, puentes y servicios públicos.

Por Andrés Felipe Ramos Gámez
regional@cronicadelquindio.com

Los municipios del sur del Quindío, junto con Calarcá, permanecen en máxima alerta tras las intensas lluvias de las últimas horas, que han debilitado el terreno y provocado deslizamientos.

La situación más crítica se registra en Génova, donde varios derrumbes han bloqueado vías. Uno de ellos cubrió por completo el acceso principal a la zona urbana desde Barragán.

Este deslizamiento ocurrió en el sector de Río Lejos, finca Volga. La obstrucción, de entre 30 y 40 metros de longitud, impide el tránsito vehicular en ambos sentidos.

Al cierre de esta edición, miembros de la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (Omgerd) y de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (Udegerd) trabajaban con maquinaria amarilla para despejar la vía y restablecer el tránsito.

MÁS EMERGENCIAS EN 24 HORAS


Las fuertes lluvias también han generado otras situaciones de emergencia en el 'Bello Rincón Quindiano'.

El alcalde de Génova, Diego Fernando Sicua Galvis, informó que en cinco sectores se han registrado deslizamientos, pérdida de banca y daños en puentes.

"En la vereda San Juan, los derrumbes afectaron las fincas El Descanso, La Frontera y La Ilusión. En la vereda El Cedral, se perdió parte de la banca y hubo daños en un cabezote de obra. En La Venada, un deslizamiento afectó la escuela del sector", explicó el mandatario.

En Cumaral y San Juan, las crecientes súbitas de las quebradas La Borrascosa y El Brasil han impedido el paso vehicular. Además, en El Dorado, el puente Las Marías colapsó.

Las autoridades han instado a la comunidad a mantenerse atenta a la información oficial y tomar precauciones. "Seguiremos informando sobre el avance de los trabajos", aseguraron.

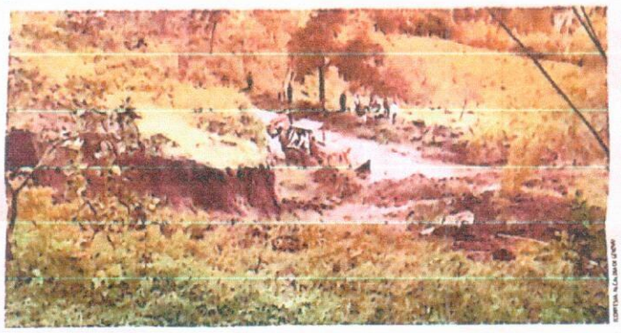

En Génova, un deslizamiento bloqueó la vía principal de ingreso al municipio desde Barragán, lo que requirió el uso de maquinaria amarilla para su despeje.

AFECTACIONES EN OTRAS LOCALIDADES

Jaider Alexánder Hidalgo González, coordinador de la Udegerd, entregó un balance de los daños recientes en el Quindío.

"En Córdoba, deslizamientos en las veredas La Española y San José de La Cocha contaminaron el agua del acueducto principal, dejando al municipio sin suministro hídrico por un día. En Buenavista, un derrumbe afectó la vereda La Mina, sector Concorde. Pijao también sufrió un movimiento en masa en la vereda La Cumbre", señaló.

Agregó que ingenieros, geólogos y geógrafos realizan visitas técnicas para evaluar los terrenos y mitigar riesgos. "Se han identificado erosiones severas y deslizamientos que requieren medidas preventivas, como la instalación de plásticos protectores en las zonas más vulnerables", detalló.

Hidalgo González también hizo un llamado a la comunidad para tomar precauciones adicionales, como mantener limpias las canaletas y bajantes, asegurar los techos y evitar arrojar basura en las calles para prevenir inundaciones.

"Pedimos a los conductores manejar con precaución, ya que las vías mojadas aumentan el riesgo de accidentes. En caso de emergencia, pueden comunicarse con las líneas 123 y 119 del Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia para una atención rápida", concluyó.

ALERTA EN CALARCÁ

Calarcá también enfrenta afectaciones por las fuertes lluvias, especialmente en sus vías terciarias.

El incidente más reciente ocurrió en la noche del lunes 17 de febrero en la vía que conecta Potosí con Quebradanegra.

El alcalde de la 'Villa del Cacique', Juan Sebastián Ramos Velasco, explicó que la comunidad alertó de inmediato sobre un derrumbe, lo que permitió una rápida intervención.

"El equipo de maquinaria amarilla de la Secretaría de Infraestructura actuó de inmediato, ya que muchas personas dependen de esta vía para llegar a sus fincas y corregimientos. No podíamos esperar hasta el día siguiente para solucionar la situación", afirmó.

A esta emergencia se suman deslizamientos en la vereda Planadas, donde también fue necesario despejar el paso con maquinaria amarilla. En La Paloma Alta, transportadores reportaron grietas en la vía destapada, lo que dificulta el tránsito de vehículos camperos.

Finalmente, en Balboa, intersección que conecta Calarcá con el sur del Quindío y Armenia, un deslizamiento afectó uno de los sentidos de la vía. Sin embargo, funcionarios y maquinaria amarilla lograron despejar el material para restablecer la movilidad.

PRONÓSTICO DEL IDEAM

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, pronosticó que las lluvias intensas en el Quindío y otras regiones del país se prolongarán hasta el viernes 21 de febrero.

Las precipitaciones afectarán principalmente los departamentos de las regiones Andina, Pacífica y Amazónica.

El Ideam advirtió que, aunque el fenómeno de 'La Niña' ha sido corto y de intensidad débil, actualmente se encuentra en su punto máximo o cerca de él. Se espera que comience a debilitarse entre marzo y mayo, lo que explica las lluvias persistentes en el territorio colombiano.



AV CENTENARIO SAN JUAN EL REFUGIO CS 1
Tel: (606) 7321690
hurtadoconstruccionessas@gmail.com
Armenia, Quindío.

TOTAL	50	19	37,5%

REPORTES DE PRECIPITACION CRQ

La CRQ entrega reportes de precipitación cada cuatrimestre, de manera que a la fecha se cuentan con los reportes hasta diciembre del 2024, sin embargo los informes diarios que reportan nos dan esta información.

Con respecto al seguimiento diario en obra y soportados con los registros del IDEAM, se evidenciaron lluvias irregulares durante los meses Febrero y Marzo del 2025, algunos de estos días que debían de corresponder a la estación seca.
Estos días, en los cuales se presentaron lluvias, así no se tengan en cuenta la intensidad de las mismas, son días en los que no se pudieron desarrollar de manera normal, las actividades programadas, pues la presencia de lluvia durante la jornada laboral o durante la noche, obliga al personal operativo a realizar reprocesos o repetir actividades ejecutadas con anterioridad, las cuales fueron dañadas total o parcialmente por las lluvias presentadas, viéndonos en muchos de estos días lluviosos obligados a no ejecutar las actividades programadas, pues existen actividades que no se pueden realizar en medio de la lluvia.

A pesar de los esfuerzos para minimizar estos efectos, consideramos necesario solicitar esta ampliación del plazo, garantizando así la correcta ejecución de los trabajos.
En virtud de lo expuesto y con el fin de garantizar la correcta ejecución de la obra solicitamos la ampliación del plazo contractual en 30 días a partir del 26 de Marzo del 2025 hasta el 25 de Abril del 2025

Oscar Andres Hurtado Fernandez
Ingeniero Civil
T.P. 63202 103293 QND

OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ
Representante Legal
CC 89.008.186 de Armenia, Quindio
